



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga

**GOBERNAR
ES HACER**

**INFORME DE GESTION - 01 Octubre – 31 Diciembre de 2020
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**

INFORME DE GESTION A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

En el presente informe se resume los principales avances que la Secretaria de Infraestructura ha generado en el Cuarto trimestre del año, en el cual ha ejecutado y realizado las gestiones pertinentes para el control del avance de las diferentes obras que ejecuta la Secretaria.

A continuación, se detalla la gestión que ha realizado la Secretaria de Infraestructura en el Cuarto trimestre de 2020.

1. CONTRATOS EN EJECUCION VIGENCIA 2019

Contrato No.	objeto	Valor Inicial	Fecha Inicio	Fecha Terminación
323 de 2019	ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.000.392.123,45	01/10/2019	18/12/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$300.117.637,00	Adicional 1. \$ 243.305.920,44	1. NOVENTA (90) DIAS 2. TRES (03) MESES	Avance de Obra: 100%	TERMINADO

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-11834>



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
338 de 2019	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO URBANO MEDIANTE EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO I	\$ 1.475.498.399,47	15/10/2019	29/10/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 565.653.753,98	\$ 107.851.016,90 \$ 302.163.063,55 \$16.888.568,00	DOS (02) MESES TREINTA (30) DIAS	Avance de Obra: 100%	EN PROCESO DE LIQUIDACION

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-12132>

Nota: Pendiente tramite de certificación RETIE, RETILAP y legalización ante Alumbrado Público

LOCALIZACIÓN SITIOS INTERVENIDOS Y % DE AVANCE

N°	BARRIO	UBICACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR FINAL	% AVANCE
1	KENNEDY	Cra 12 entre calles 10 y 11 Norte	\$391.884.670,85	\$376.568.430,81	100%
2	ALTOS DEL KENNEDY	Cra 11 entre calles 28A y 28 Norte	\$94.378.805,43	\$197.799.429,32	100%
3	VILLA ROSA III	Carrera 18A con calle 11 ^a	\$81.645.836,37	\$ 89.769.834,64	100%
4	NUEVA COLOMBIA	Calle 2 entre Cra 16D y 17	\$157.956.736,56	\$193.861.377,00	100%
5	LOS ÁNGELES	Carrera 31 con calle 16 norte	\$175.133.258,15	\$239.866.591,11	100%
6	CENTRO	Carrera 15 entre calles 33 y 34	\$70.786.693,03	\$58.399.468,13	100%
7	LA JOYA	Carrera 8 oeste entre calles 36 y 37	\$120.142.439,07	\$120.121.017,40	100%
8	CAMPO HERMOSO	Carrera 12 Oeste entre calles 46 y 47	\$ 383.569.960,01	\$472.102.995,64	100%
9	ESTORAQUES	Carrera 43 Oeste entre calle 58 ^a y 59	\$107.851.016,90	\$137.023.335,88	100%



MEJORAMIENTO PARQUE LOS ANGELES



MEJORAMIENTO PARQUE NUEVA COLOMBIA



MEJORAMIENTO PARQUE CAMPO HERMOSO MEJORAMIENTO PUENTE PEATONAL PLAZA CENTRAL

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
339 de 2019	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO URBANO MEDIANTE EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO 2	\$ 1.152.739.167,19	15/10/2019	29/11/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 345.821.750,10	Adicional 1 \$ 22.406.073,26 Adicional 2 \$ 141.014.280,87 \$57.454.437,00	DOS (2) MESES TREINTA (30) DIAS SIETE (07) DIAS	Avance de Obra: 100%	EN PROCESO DE LIQUIDACION

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-12132>

Nota: Pendiente tramite de certificación RETIE, RETILAP y legalización ante Alumbrado Público

LOCALIZACIÓN SITIOS INTERVENIDOS Y % AVANCE

N°	BARRIO	UBICACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR FINAL	% DE AVANCE
1	SANTANDER	Carrera 5 oeste con calle 31	237.461.031,40	267.351.648,74	100%
2	BALCONCITOS	Calle 55 con cra 5 Occidente	\$ 357.476.396,12	\$406.326.313,33	100%
3	NARANJOS	Carrera 5 # 58-42	113.313.860,39	130.675.487,27	100%
4	URBANIZACION LOS ALMENDROS	Carrera 8 64-63	\$ 11.669.428,47	\$ 14.237.985,15	100%
5	CIUDAD BOLIVAR – SECTOR 20 DE JULIO	Calle 64 # 64-16	\$ 41.292.107,57	\$ 48.175.591,28	100%
6	CIUDAD BOLIVAR – SECTOR GUAYACANES	Calle 64 Cra 6ª	\$ 34.941.077,32	\$ 37.318.785,01	100%
7	PLAZUELA REAL	Calle 65 Cra 10	38.631.738,09	48.418.016,66	100%
8	HÉROES	Calle 65 Cra 6 Oeste	\$ 92.116.253,17	\$ 65.544.282,39	100%
9	MONTERREDONDO	Carrera 36 oeste calle 65	\$ 238.457.069,35	\$ 307.897.690,05	100%



PARQUE BALCONCITOS



PARQUE GUAYACANES

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
340 de 2019	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO URBANO MEDIANTE EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO 3	\$ 1.092.913.615,91	15/10/2019	04/07/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
No acepto anticipo	Adicional 1 \$ 32.248.246,29	DOS (02) MESES	Avance de Obra: 100%	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-12132>

Nota: Pendiente tramite de certificación RETIE, RETILAP y legalización ante Alumbrado Público

LOCALIZACIÓN SITIOS INTERVENIDOS Y % AVANCE

N°	BARRIO	UBICACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR FINAL	% DE AVANCE
1	SANTA MARIA	Calle 103B entre carreras 12A y 13	\$30.149.474,92	\$32.747.787,00	100%
2	MANUELA BELTRAN	Calle 103F con carrera 11A	\$190.248.672,28	\$192.150.645,00	100%
3	CRISTAL BAJO	Carrera 15 con calle 127 ^a	\$68.318.270,87	\$62.426.568,00	100%
4	SAN PEDRO CLAVER	Calle 74 con cra 30	\$174.720.416,87	\$196.657.016,95	100%
5	EL SOL	Calle 73 Bis con cra 31	\$266.884.984,32	\$266.031.801,60	100%
6	ANTONIA SANTOS SUR	Calle 71 con cra 30 ^a	\$58.030.699,75	\$35.474.247,00	100%
7	MERCEDES	Carrera 28 entre calles 62 y 63	\$304.561.096,90	\$321.067.600,89	100%



MEJORAMIENTO PARQUE ANTONIA SANTOS SUR



MEJORAMIENTO CANCHA LAS MERCEDES



MEJORAMIENTO PARQUE MANUELA BELTRAN

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
326 de 2019	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES MAGUEYES, MONSERRATE, ROSA BLANCA Y LAS GRANJITAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"	\$ 504.058.620	01/10/2019	21/07/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 151.217.586,00	Adicional \$ 102.168.577,00	DOS (2) MESES VEINTE (20) DIAS	Avance de Obra: 100%	LIQUIDADO 17/11/2020

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9753936>

MEJORAMIENTO ACUEDUCTO	% DE AVANCE
Acueducto Monserrate	100%
Acueducto Magueyes	100%
Acueducto Rosa Blanca	100%
Acueducto Las Granjitas	100%



BOCATOMA V. ROSA BLANCA



BOCATOMA V. GRANJITAS



BOCATOMA V. MAGUEYES

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC RDE-21



DESARENADOR ACUEDUCTO V. ROSA BLANCA DESARENADOR EXISTENTE V. MAGUEYES – V. PEDRAGL SECTOR GRANJITAS

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
204 de 2019	MEJORAMIENTO DEL CENTRO VIDA AÑOS MARAVILLOSOS EN LA CIUADAELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.068.967.088,83	22/07/2019	15/10/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 682.945.707,90	Adicional 1. \$ 207.518.604,37 Adicional 2 \$ 277.220.522,16	1. UN (1) MES 2. SESENTA (60) DIAS 3. UN (1) MES	Avance de Obra: 100%	RECIBIDO CON ACTA DE EJECUCION FINAL

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-200755>



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
303 de 2019	CONSTRUCCION DE SENDEROS DE LOS CAMINANTES EN LOS CERROS ORIENTALES DE BUCARAMANGA. - GRUPO 1- Puerta Corcovado	\$ 4.835.552.381,69	30/08/2019	26/09/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 1.934.220.953,67	0	Tres (03) meses y Quince (15) días SIETE (07) DIAS DIEZ (10) DIAS CUARENTA Y TRES (43) DIAS TREINTA (30) DIAS	Avance de Obra: 100%	TERMIANDO EN PROCESO DE LIQUIDACION

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-10760>

FOTOGRAFIAS



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
307 de 2019	CONSTRUCCION DE SENDEROS DE LOS CAMINANTES EN LOS CERROS ORIENTALES DE BUCARAMANGA. - GRUPO 2- Puerta Jardín	\$ 5.605.876.851	16/09/2019	30/12/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 2.242.350.740,40	0	Tres (03) meses y siete (7) días SIETE (07) DIAS DIEZ (10) DIAS CUARENTA Y TRES (43) DIAS CUARENTA Y UN (41) DIAS	Avance de Obra: 85,89%	EN EJECUCION

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-10760>

FOTOGRAFIAS:



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
151 de 2019	MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 7.297.395.222,86	04/06/2019	28/07/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 2.918.958.089,14 \$ 264.047.620,67 \$ 295.355.328,83	1. \$ 660.119.051,67 2. \$ 738.388.322,08	1. 27 DIAS CALENDARIO 2. DOS (2) MESES 3. DOS (2) MESES 4. OCHO (08) DIAS	Avance de Obra: 100%	TERMINADO Y RECIBIDO

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-198829>



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
112 de 2019	ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA FUNDACION TEATRO SANTANDER, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS, TECNICOS, FINANCIEROS, Y ADMINISTRATIVOS PARA LA TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DE APOYO TEATRO SANTANDER Y TEATRINO DE LA ESCUALA MUNICIPAL DE ARTES (EMA) EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 4.057.438.420	22/03/2019	30/12/2020

Desembolsos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
1.\$ 2.020.719.210,00 2.\$ 1.217.231.526,00 3.\$ 405.743.842,00 4.\$ 1.546.994.255,41	\$ 1.933.742.819,25	1.UN (01) MES 2. UN (01) MES Y NUEVE (09) DIAS 3. TRES (03) MESES 4. TRES (03) MESES 5. TRES (03) MESES 6. DOCE (12) DIAS	Avance de Obra: 85%	SUSPENDIDO

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9194143>



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga

**GOBERNAR
ES HACER**



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
205 de 2019	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DE ATLETISMO LUIS ENRIQUE FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER	\$ 7.328.306.699,1	10/07/2019	25/12/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$2.198.492.009,73 \$ 812.031.315,45	Adicional 1. \$ 2.706.771.051,53 Adicional 2. \$ 1.177.207.736,98	7 MESES Y 20 DIAS 1 MESES Y 15 DIAS	Avance de Obra: 100%	TERMINADO

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-199761>

Las obras fueron terminadas el 23 de diciembre de 2020. Se encuentra en proceso de atención de algunos detalles, así como la entrega de las certificaciones RETIE, RETILAB, y la certificación de la pista por parte de la IAAF, obligaciones que debe cumplir el contratista para el recibo a satisfacción del contrato y posterior liquidación.



INSTALACION ACABADO SINTETICO PREFABRICADO PISTA



DEMARACION LINEAS DE SEPARACION CARRILES



ACABADO SINTETICO CON DEMARCACION Y AREAS ADYACENTES AL 100%



GRADERIAS AMPLIADAS



CUBIERTA GRADERIAS

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
265 de 2019	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LA CEIBA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA FASE II.	\$ 5.156.747.554	06/08/2019	15/12/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$2.242.350.740.80	Adicional \$630.467.244,66	1. Siete (07) días 2. Tres (03) meses y quince (15) días 3. Dos (02) meses	Avance de Obra: 100%	LIQUIDADO

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-201924>



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
241 de 2019	CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL METROPOLITANO DEL RÍO SURATÁ EN EL BARRIO EL CLAVERIANO, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA..	\$ 6.103.224.070,59	16/07/2019	30/12/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 1.830.967.221,30	\$ 59.384.739,09 \$ 275.965.531,09	5 MESES Y 10 DÍAS 1 MES Y 22 DIAS	Avance de Obra: 95%	SUSPENDIDO

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-201761>

El contrato se encuentra suspendido y a la espera de la aprobación del permiso de intervención del cauce sobre el río surata, para la construcción de las estructuras de entrega del alcantarillado pluvial del proyecto.



ACCESO PEATONAL A VIVIENDAS - SECTOR 1



PLAZOLETA DE ACCESO - SECTOR 1




CANCHA MULTIFUNCIONAL - SECTOR 1



ZONA DE RAMPA PEATONAL HACIA EL RIO - SECTOR 1



EQUIPOS DE GIMNASIO – SECTOR 2

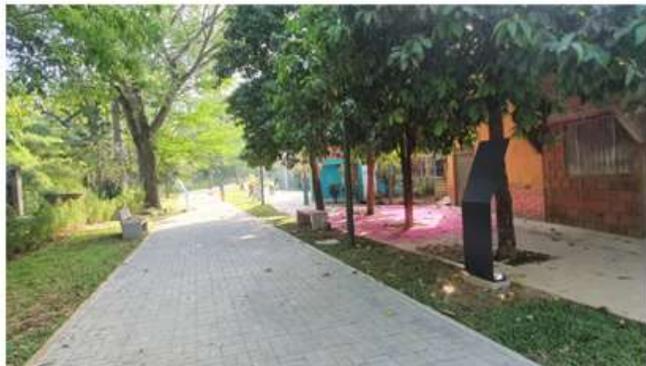

CIRCULACIONES Y ZONAS VERDES SECTOR 2



PLAZOLETA DE ARBOLES – SECTOR 2



JUEGOS INFANTILES – SECTOR 2



EQUIPOS DE GIMNASIO – SECTOR 2



CIRCULACIONES Y ZONAS VERDES SECTOR 2

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
266 de 2019	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LOS SALONES COMUNALES EN LOS BARRIOS. GRUPO 1 (BUCARAMANGA, EL GAITAN, LA FERIA, SAN MIGUEL Y VILLA DEL PRADO)	\$ 2.041.243.497,09	06/08/2019	30/12/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 670.554240.928,78	\$ 193.939.598.84 \$ 44.327.504,35	1. SETENTA Y CINCO (75) DIAS 2. CUARENTA Y CINCO (45) DIAS 3. I MES Y 22 DIAS	Avance de Obra: 85%	SUSPENDIDO

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-9962>



SALON COMUNAL BARRIO LA FERIA




AREA DE GIMNASIO SALON COMUNAL LA FERIA



SALON COMUNAL BARRIO BUCARAMANGA



SALON COMUNAL BARRIO GAITAN

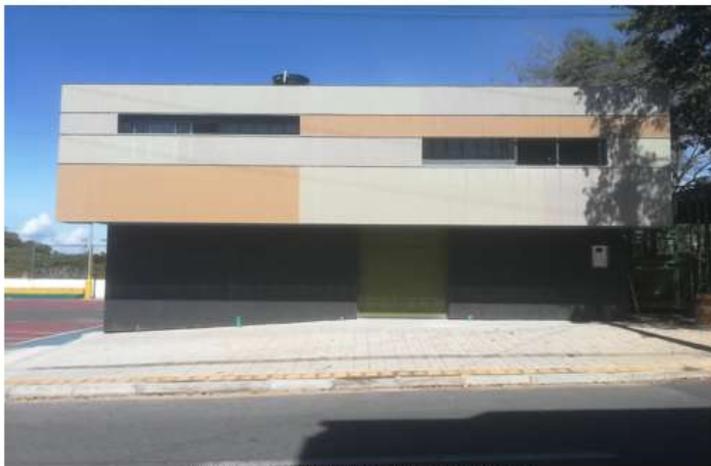

SALON COMUNAL BARRIO SAN MIGUEL



SALON COMUNAL BARRIO VILLA DEL PRADO

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
267 de 2019	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LOS SALONES COMUNALES EN LOS BARRIOS. GRUPO 2 (DIAMANTE – LA LIBERTAD – NORTE BAJO – NUEVA COLOMBIA – CAFÉ MADRID)	\$ 2.005.639.450,19	06/08/2019	04/09/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 601.691.835,06	\$ 211.412.157,16	1. TREINTA (30) DIAS 2. CUARENTA Y CINCO (45) DIAS	Avance de Obra: 100%	LIQUIDADO

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-9962>

El proyecto incluyó la intervención de cinco salones comunales en los Barrios: Bucaramanga, Diamante I, La Libertad, Café Madrid, Nueva Colombia y Norte Bajo. El contrato se encuentra recibido y liquidado.



SALON COMUNAL BARRIO DIAMANTE I



INTERIOR SALON COMUNAL DIAMANTE I



SALON COMUNAL BARRIO LA LIBERTAD



SALON COMUNAL BARRIO CAFÉ MADRID



SALON COMUNAL BARRIO NUEVA COLOMBIA



SALON COMUNAL BARRIO NORTE BAJO

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
316 de 2019	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL SANTA TERESITA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-UIMIST"	\$ 927.076.940	20/09/2019	28/04/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 278.123.082	0	1. 3 MESES	Avance de Obra: 40%	SUSPENDIDO MARZO 24 DEL 2020 (CAPACIDAD INSTALADA EN TRAMITE GOBERNACION DE SANTANDER)

Link : <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9415399>



RENDER PROPUESTA GANADORA UIMIST.



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
161 de 2019	CONSTRUCCIÓN DE CICLO-INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO I	\$ 6.518.280.839	30/05/2019	30/12/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 1.955.484.251,70	\$ 422.256.412,70	1. SEIS (6) MES	Avance de Obra: 100%	TERMINADO


Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-199190>

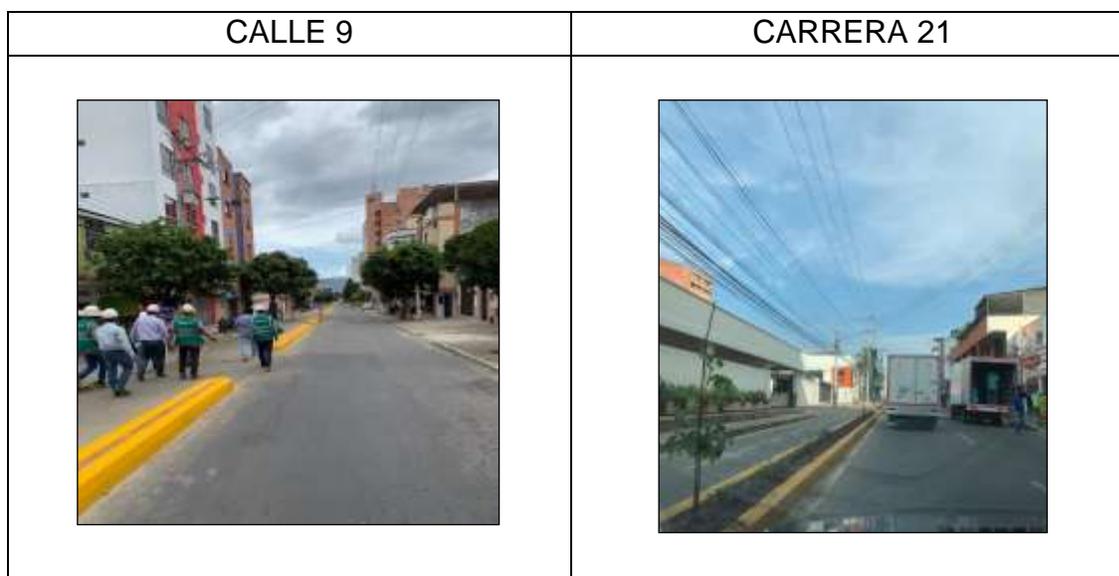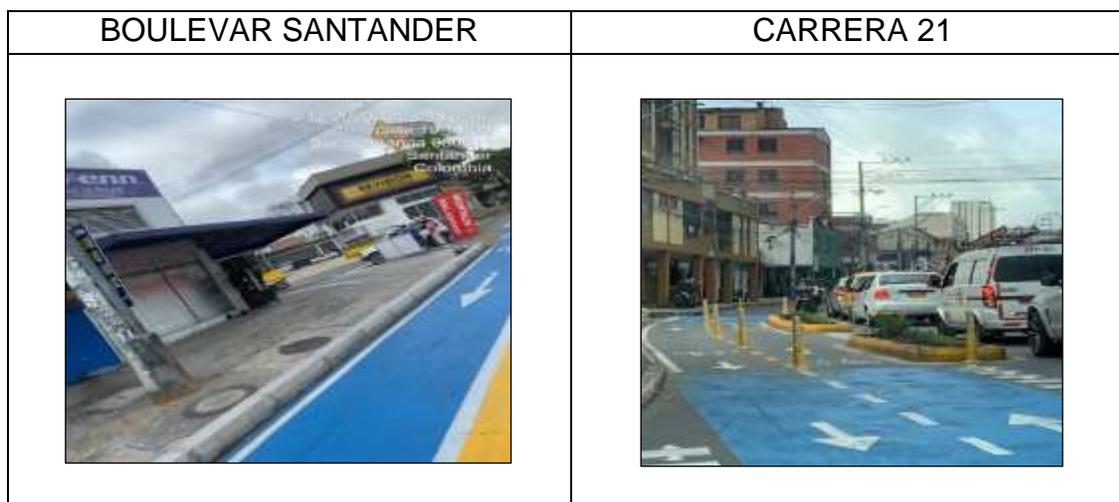

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
162 de 2019	CONSTRUCCIÓN DE CICLO-INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO II	\$ 6.260.637.436,76	30/05/2019	11/12/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 1.878.191.231,03	0	N/A	Avance de Obra: 100%	TERMINADO


Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-199190>

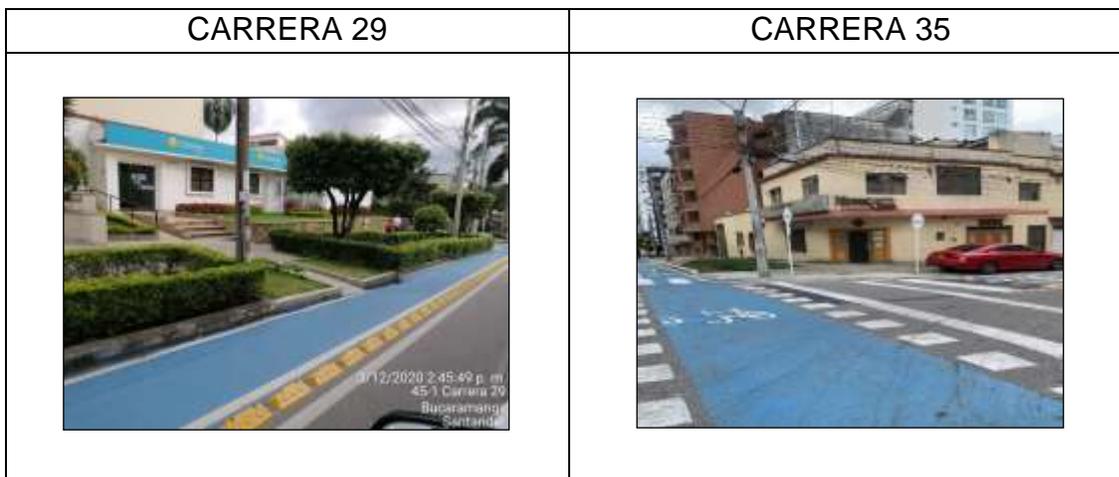

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
261 de 2019	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - GRUPO 1	\$ 4.446.523.289	06/08/2019	15/12/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 1.333.956.986,70	Adicional 1 \$ 515.036.515,00 Adicional 2 \$ 1.699.812.040,00	1. dos (2) meses y quince (15) días 2. ocho (8) días 3. TREINTA Y SIETE (37) DIAS	Avance de Obra: 100%	LIQUIDADO

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-202047>

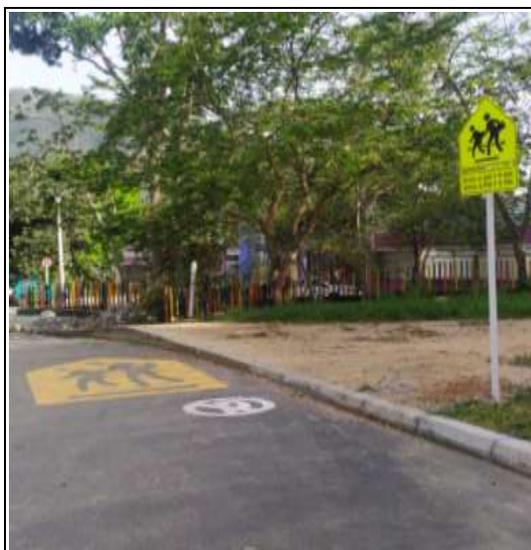

Jardín Luz del Cielo Sector: Bavaria 2 Comuna1.



Vía de acceso a Mega colegio Barrio Los Colorados

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
263 de 2019	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - GRUPO 2	\$ 4.316.014.490	06/08/2019	10/06/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 1.294.804.347,00	Adicional 1 \$ 555.273.906,00 Adicional 2 \$ 1.602.364.927,00	1. dos (2) meses y quince (15) días 2. ocho (8) días	Avance de Obra: 100%	LIQUIDADO

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-202047>



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
264 de 2019	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. - GRUPO 3	\$ 3.838.463.454,08	06/08/2019	15/10/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 1.149.831.503,00	Adicional 1 \$ 449.425.391,00 Adicional 2 \$ 1.466.954.740,20	1. dos (2) meses y quince (15) días 2. ocho (8) días	Avance de Obra: 100%	LIQUIDADO

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-202047>



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
282 de 2019	CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 1	\$ 1.136.548.602	15/08/2019	27/06/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 340.904.560,00	Adicional 1 \$162.523.356 Adicional 2 \$185.304.138,46 Adicional 3 \$ 5.134.940,11	1. UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS 2. DOS (02) MESES	Avance de Obra: 100%	EN PROCESO DE LIQUIDACION

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-10778>

INTERVENCIÓN VEREDA SANTA RITA SECTOR FINCA DON DANIEL



ANTES



DESPUES

CONSTRUCCION ALCANTARILLA VEREDA LA ESMERALDA SECTOR SIEMPRE VIVA



ANTES




DESPUES

CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN VEREDA EL ABURRIDO SECTOR FINCA DE LA CDMB



ANTES

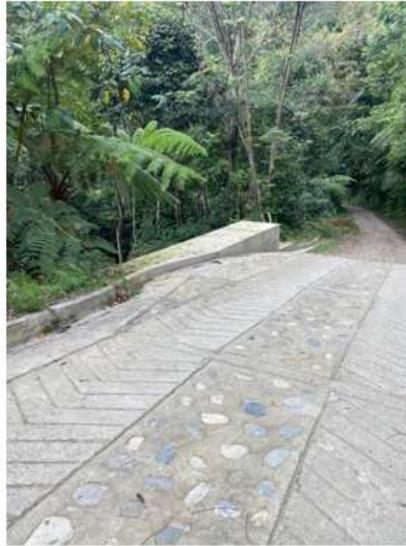

DESPUES

INTERVENCION VEREDA LA ESMERALDA SECTOR FINCA GENY



ANTES



DESPUES

MURO DE CONTENCIÓN EN GAVIONES VEREDA VIJAGUAL



ANTES



DESPUES

INTERVENCIÓN VEREDA LA ESMERALDA SECTOR FINCA EL CALZO



ANTES



DESPUES

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
283 de 2019	CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 2	\$ 1.180.683.854	15/08/2019	26/12/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 354.205.156,00	Adicional \$202.962.104 \$ 57.382.996,28	DOS (2) MESES UN (01) MES	Avance de Obra:100%	EN PROCESO DE LIQUIDACION

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-10778>

MANTENIMIENTO PUENTE COLGANTE EN MADERA DE BOLARQUI BAJO ETAPA 1



ANTES



DESPUES

**MANTENIMIENTO PUENTE COLGANTE EN MADERA DE BOLARQUI BAJO ETAPA 2
(ROTURA DE CABLE SUPERIOR EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020)**



ANTES



DESPUES

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
284 de 2019	CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 3	\$ 1.300.079.710	15/08/2019	29/12/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 340.023.913,00	\$ 502.694.665,00 \$ 136.198350,65	DOS (2) MESES UN (01) MES	Avance de Obra: 100%	EN PROCESO DE LIQUIDACION

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-10778>

INTERVENCIÓN REFUGIO DEL CAMINANTE VEREDA SAN JOSE



ANTES



DESPUES

INTERVENCIÓN TRAMO SANTO DOMINGO VEREDA RETIRO CHIQUITO



ANTES



DESPUES

INTERVENCIÓN TRAMO PORVENIR VEREDA PEDREGAL BAJO



ANTES



DESPUES

INTERVENCIÓN TRAMO GRANJITAS VEREDA PEDREGAL BAJO



ANTES



DESPUES

INTERVENCIÓN TRAMO VIA NACIONAL HASTA LA UDES VEREDA SANTA BARBARA



ANTES



DESPUES

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
343 de 2019	"CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A TRAVÉS DE POZOS SÉPTICOS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER".	\$ 792.800.294,00	17/10/2019	22/10/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 396.400.147,00	\$ 19.359.582,00	N/A	Avance de Obra: 100%	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-13319>

AVANCE DE OBRA

POZOS SEPTICOS A INSTALAR	% DE AVANCE
50 UND CONTRACTUAL	
10 UND ADICIONALES	
60 UNIDADES	100%

REGISTRO FOTOGRAFICO



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
345 de 2019	"CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A TRAVÉS DE POZOS SÉPTICOS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER".	\$ 992.031.676,00	17/10/2019	24/10/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 496.015.838,00	N/A	1. DOS MESES Y QUINCE DIAS	Avance de Obra: 100%	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-13319>

AVANCE DE OBRA

POZOS SEPTICOS A INSTALAR	% DE AVANCE
60 UND CONTRACTUAL	
4 UND ADICIONALES	
64 UNIDADES	100%

REGISTRO FOTOGRAFICO



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
344 de 2019	"CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A TRAVÉS DE POZOS SÉPTICOS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER".	\$ 616.708.569,88	17/10/2019	03/11/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 308.354.285,00	\$ 3.606.638,00	1. UN (1) MES	Avance de Obra: 100%	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-13319>

AVANCE DE OBRA

POZOS SEPTICOS A INSTALAR	% DE AVANCE
38 UND CONTRACTUAL	
3 UND ADICIONALES	
41 UNIDADES	100%

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO

	
DESCRIPCION: EXCAVACION PARA TANQUE SEPTICO	DESCRIPCION: MAMPOSTERIA EN POZO DE ABSORCION
	
DESCRIPCION: EXCAVACION Y PRUEBA DE PERCOLACION	

Contrato No.	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
297 de 2019	Modernización y expansión del alumbrado público perimetral del parque ecológico la flora de Bucaramanga	\$2.327'801.828.00	28 de agosto de 2019	12 de Diciembre de 2020


Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
Valor Anticipo Inicial: \$931.120.731,20 Valor Anticipo Adicional: \$134.141.223,84	Adicional \$335'553.059.60	1. CUARENTA Y CINCO (45) DIAS 2. CUARENTA Y CINCO (45) DIAS	Avance de Obra: 100%	TERMINADO

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-202072>



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga


**GOBERNAR
ES HACER**

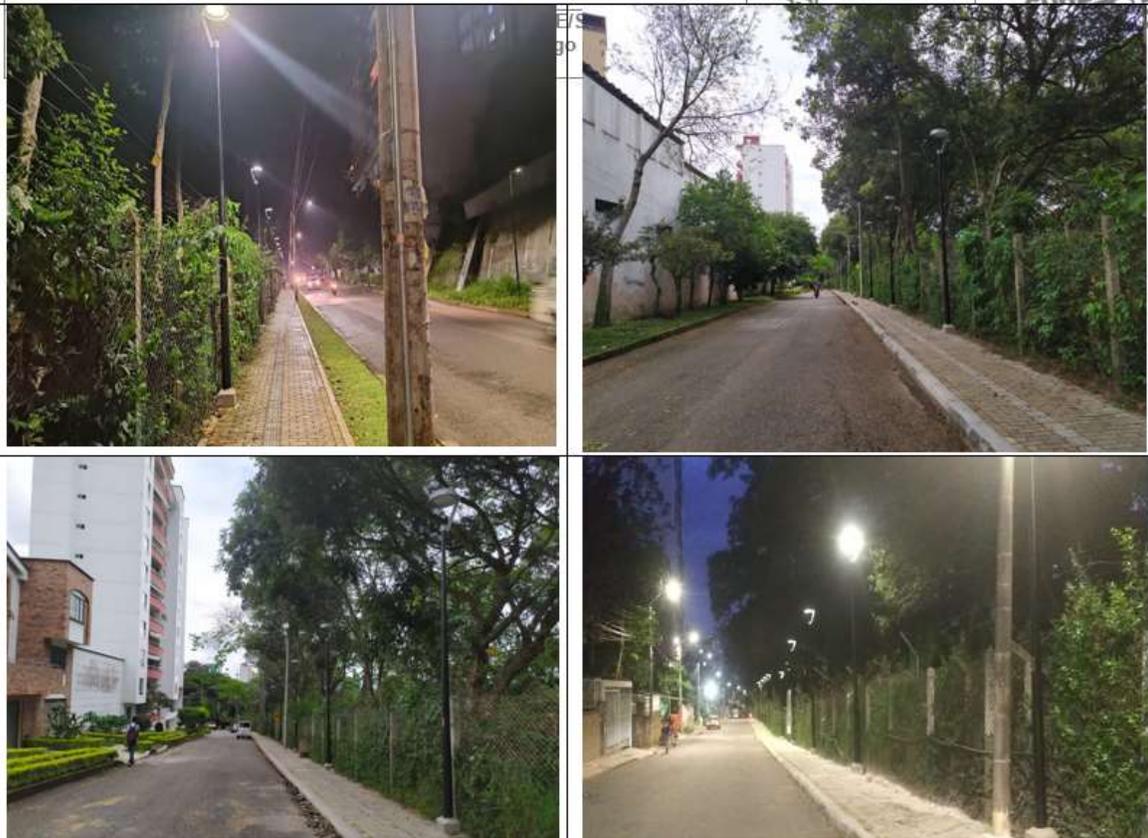

Contrato No.	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
245 de 2019	Modernización del alumbrado público del parque Morrorico del municipio de Bucaramanga	\$2.467'202.721.00	24 de julio 2019	19 de Diciembre de 2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
Valor Anticipo Inicial: \$ 986.881.088,40	Adicional \$278'111.654.74	1. SESENTA Y SIETE (67) DIAS 2. CUARENTA Y CINCO (45) DIAS 3. TREINTA (30) DIAS	Avance de Obra: 100%	TERMINADO


Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-201468>

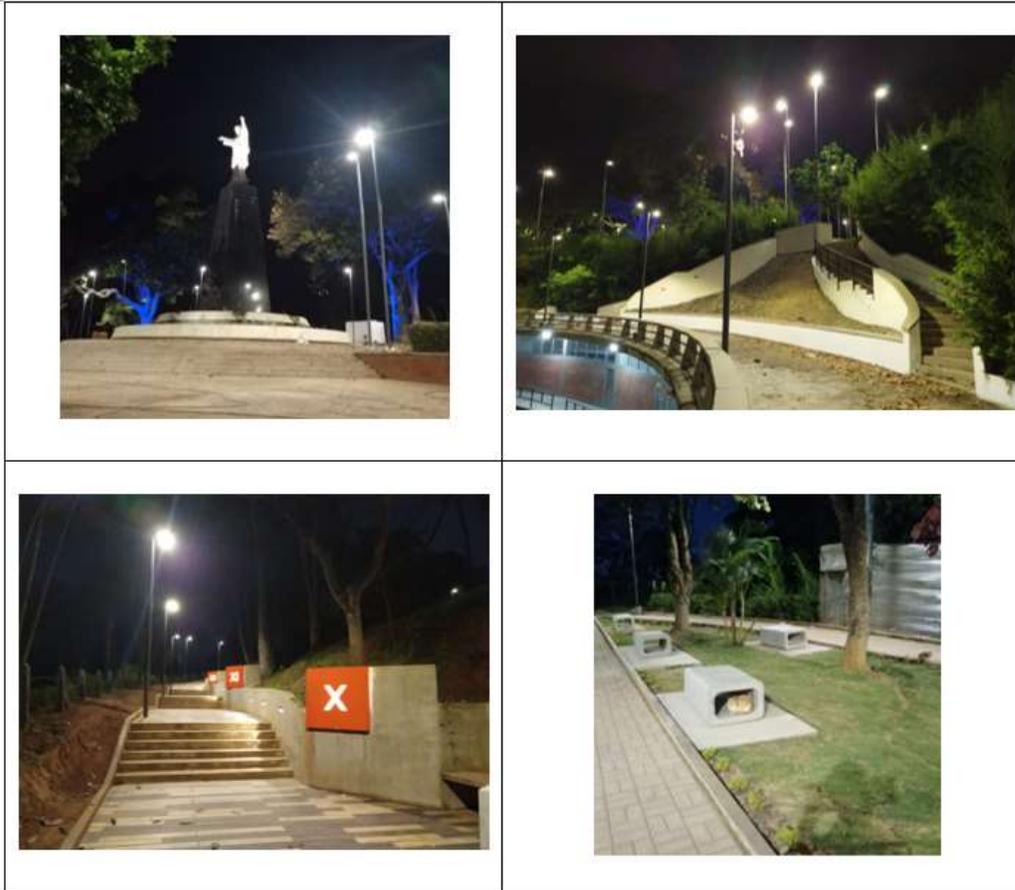

Contrato No.	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
285 de 2019	Modernización del alumbrado público de la calle de los estudiantes entre la calle 54ª y la diagonal 14 municipio de Bucaramanga	\$3.911'411.963.00	15 de agosto de 2019	18 de diciembre de 2020.

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 1.564.564.785,20	Adicional \$39'926.386.00	1. SESENTA Y SIETE (67) DIAS 2. TREINTA (30) DIAS	Avance de Obra: 100%	TERMINADO

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-202236>

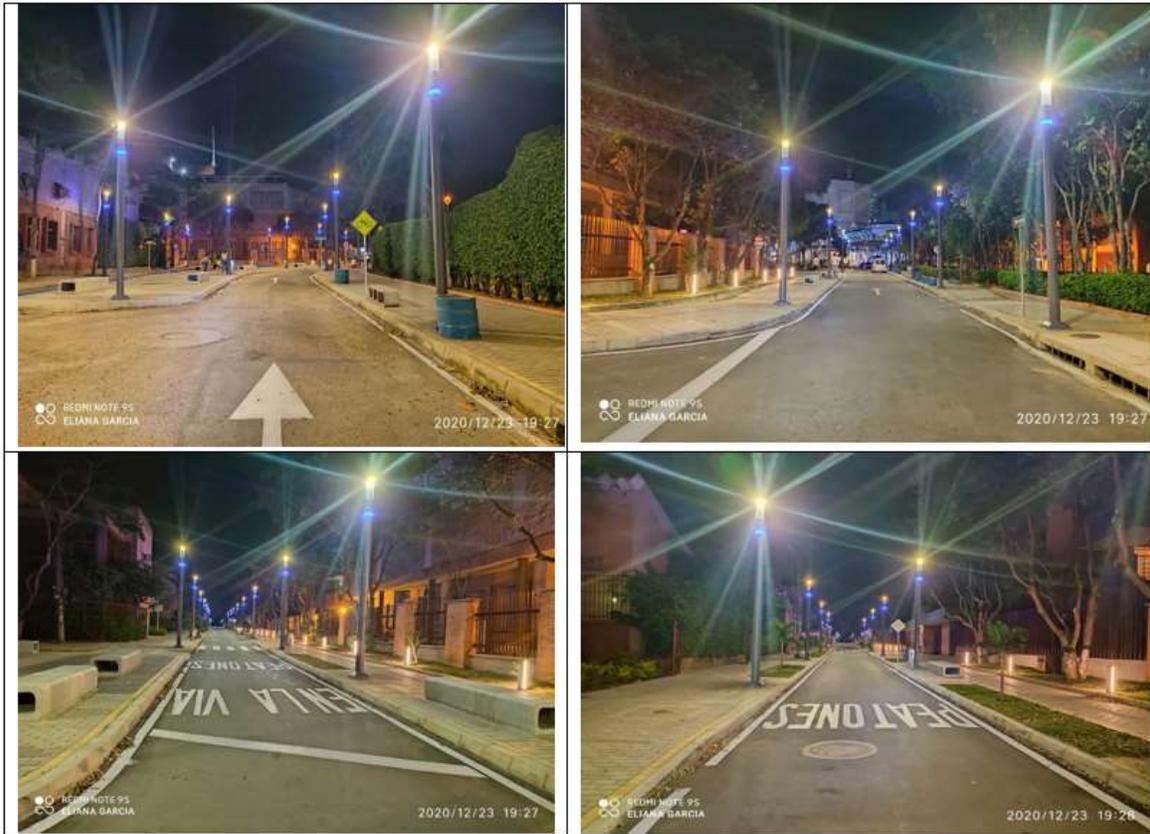

Contrato No.	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
356 de 2019	instalación de luminarias de alumbrado público de tecnología led para el municipio de Bucaramanga - fase III - grupo 1 -	694.559.246,24	03 de Agosto de 2020	01 de noviembre de 2020
357 de 2019	instalación de luminarias de alumbrado público de tecnología led para el municipio de Bucaramanga - fase iii - grupo 2 -	652.338.660,82	03 de Agosto de 2020	01 de noviembre de 2020
358 de 2019	instalación de luminarias de alumbrado público de tecnología led para el municipio de Bucaramanga - fase iii - grupo 3 -	645.033.284,55	03 de Agosto de 2020	15 de octubre de 2020
359 de 2019	instalación de luminarias de alumbrado público de tecnología led para el municipio de Bucaramanga - fase iii - grupo 4	594.056.990,17	03 de Agosto de 2020	01 de noviembre de 2020

Contrato	Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
356	\$ 277.823.698,50	\$ 0	1. CUARENTA (40) DIAS	Avance de Obra: 100%	TERMINADO
357	\$ 260.935.464,33	\$ 0	1. CUARENTA(40) DIAS	Avance de Obra: 100%	TERMINADO
358	\$ 0	\$ 0	1. VEINTITRES(23) DIAS	Avance de Obra: 100%	TERMINADO
359	\$ 237.622.796,07	\$ 0	1. CUARENTA(40) DIAS	Avance de Obra: 100%	TERMINADO



2. CONTRATOS VIGENCIA 2020

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
13 de 2020	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER, EN LOS SECTORES INDICADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO.	\$ 4.677.196.206,20	13/04/2020	12/02/2021

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
0	0	CUARENTA Y DOS (02) DIAS	Avance de Obra: 86%	EN EJECUCION

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10450809>

Mediante el presente Contrato Interadministrativo se realiza el mantenimiento, conservación y recuperación de parques y zonas verdes del municipio de Bucaramanga.

➤ LISTADO DE PARQUES DONDE SE ASIGNO PARQUERO.

PARQUEROS ZONA ORIENTE	
ITEM	PARQUE
1	PARQUE ANTONIA SANTOS
2	BOSQUE ENCANTADO
3	PARQUE DE LOS NIÑOS
4	PLAZOLETA LOS BUCAROS
5	LAS AMERICAS
6	PARQUE BOLIVAR
7	PLAZA DE LAS BANDERAS
8	PARQUE SOLON WILCHES
9	CARRERA 33 ZONAS VERDES
10	PARQUE TURBAY Y BENJAMIN HERRERA

11	PARQUE SAN PIO
12	PARQUE LAS PALMAS
13	PARQUE LAS MERCEDES
14	PARQUE DIVINO NIÑO (CONUCOS)
15	PARQUE LEONES
16	PARQUE LOS PINOS
17	PARQUE SARRAPIOS
18	PARQUE LA FLORA
19	PAN DE AZUCAR BAJO
20	PARQUE LAS MOJARRAS
21	PARQUE CARLOS ENRIQUE VIRVIESCAS

PARQUEROS ZONA NORTE	
ITEM	PARQUE
1	PARQUE LINEAL RIO DE ORO
2	CIUDADELA CAFÉ MADRI
3	PARQUE KENNEDY
4	PARQUE CRISTO REY
5	CARRERA 15
6	CABALLO BOLÍVAR
7	PARQUE SAN FRANCISCO
8	ZONAS VERDES QUEBRADA SECA Y ROMPOY

PARQUEROS ZONA OCCIDENTE	
ITEM	PARQUE
1	PARQUE GARCIA ROVIRA
2	PARQUE CENTENARIO
3	PARQUE SANTANDER
4	PARQUE BRUNO BATELLO
5	SEPARADOR DE LA NOVENA
6	PARQUE SANTANDER
7	PARQUE ROMERO
8	PARQUE ESTORAQUES
9	LA PAZ- FUNDADORES – MARGARITAS
10	PARQUE LA VIDA
11	PARQUE CIGARRAS
12	PARQUE LAS PALMAS-VENADOS
13	CIUDAD BOLIVAR
14	SEPARADOR ACROPOLIS

15	PARQUE MONTERREDONDO
16	PARQUE LAS ARDILLAS-HEROES
17	PARQUE PRADO DEL MUTIS
18	PARQUE DE LOS SUEÑOS
19	PARQUE GUAYACANES (CIUDAD BOLIVAR)
20	PARQUE GIRARDOT

PARQUEROS ZONA SUR	
ITEM	PARQUE
1	CRISTAL ALTO Y BAJO
2	LA SALLE (MARCELINO GILLIBERT)
3	PARQUE LA CONCORDIA
4	PARQUE B. ROCIO (PLAZOLETA)
5	PARQUE LAS TRES B
6	PROVENZA SEPARADOR 105
7	PARQUE B. DIAMANTE II
8	PARQUE B. CORONA Y LA CEIBA
9	PARQUE B. PORVENIR LA PETACA
10	PARQUE VALLEDUPAR
11	PARQUE FONTANA REAL
12	PARQUE EL MOLINO B. PORVENIR
13	PARQUE LOS ENAMORADOS
14	CAMINODROMO DE PROVENZA
15	CANCHA LA MILAGROSA
16	PARQUE SAN LUIS
17	CIUDAD VENECIA Y TOLEDO PLATA
18	ZONAS VERDES B. SAN MIGUEL Y CICLO VIA
19	BARRIO SANTA MARIA Y MANUELA BELTRÁN
20	CARRASCO CONTEMPLATIVO
21	PARQUE B. CANELOS

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES RELEVANTES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:

Según los informes presentados por la Empresa de Aseo de Bucaramanga. EMAB S.A. E.S.P. se suscribieron las actas de desembolso de los meses Octubre, noviembre y diciembre de 2020 que a continuación se relacionan:

Acta desembolso No. 7 de fecha 25 de noviembre de 2020 (octubre de 2020).
Acta desembolso No. 8 de fecha 17 de diciembre de 2020 (noviembre de 2020)

La Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A. E.S.P. de fecha 21 de diciembre de 2020. En carta dirigida a la Secretaría de Infraestructura del municipio de Bucaramanga solicita se suscriba la ampliación en tiempo (42 días) del Contrato Interadministrativo dado que se cuenta con los recursos suficientes para su aval, considerando que para garantizar la inversión de mantenimiento, conservación y recuperación de parques vigencia 2020, y teniendo en cuenta el aumento progresivo de calor y escasez de lluvias en este período del año.

Teniendo en cuenta lo anterior, el día 22 de diciembre de 2020, se suscribió entre las partes el adicional No. 01 en plazo al Contrato Interadministrativo No. 013 de 2020, (hasta 12 de Febrero de 2021), de acuerdo a lo estipulado en la CLAUSULA SEGUNDA del adicional No. 01 se suscribió acta de desembolso de pago anticipado, por valor de \$654.807.468,84 para lo cual de acuerdo a la CLAUSULA TERCERA se adiciona a la Garantía única de Cumplimiento No. 465-47-994000001403 Aseguradora Solidaria, expedida a favor del municipio por la cobertura de devolución de pago anticipado.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTOGRAFIA No. 1. Parque Antonia Santos

FOTOGRAFIA No. 1. Parque Antonia Santos



FOTOGRAFIA No. 2. Parque de los Periodistas



FOTOGRAFIA No. 3. Puente de Provenza.

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
115 de 2020	ACTIVIDADES DE PODA PARA EL DESPEJE DE LUMINARIAS Y REDES QUE INTERFIEREN CON EL ALUMBRADO PÚBLICO Y TALA DE ÁRBOLES Y MANEJO INTEGRAL DEL COMPONENTE ARBÓREO EN EL ESPACIO PÚBLICO, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"	\$ 797.170.873,00	26/06/2020	31/12/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
0	0	0	Avance de Obra: 96.7%	EN EJECUCION

Link:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1237761&isFromPublicArea=True&isModal=False>



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
107 de 2020	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. Grupo 1	\$ 516.105.908,14	11/06/2020	31/12/2020
108 de 2020	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. Grupo 2	\$ 403.133.050,08	11/06/2020	31/12/2020
109 de 2020	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. Grupo 3	\$ 412.472.037,91	11/06/2020	31/12/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
Grupo 1. 0 Grupo 2. 0 Grupo 3. 0	0	0	Avance de Obra: 96,5%	EN EJECUCION

Link:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1224417&isFromPublicArea=True&isModal=False>

FOTOGRAFIAS





Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
123 de 2020	MANTENIMIENTO DE LAS VIAS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-SANTANDER	\$ 452.384.556,00	10/08/2020	29/12/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 135.715.366,80	\$ 171.175.305,03	CUARENTA (40) DIAS	Avance de Obra: 100%	TERMINADO EN PROCESO DE RECIBO Y LIQUIDACION

Link:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1296104&isFromPublicArea=True&isModal=False>

AFECTACION INVERNAL EN EL MANTENIMIENTO DE OBRAS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA



En el sector de la vía de la vereda el Angelinos – Santa Rita se observa la banca de la vía con cárcavas generadas por las escorrentías superficiales de aguas lluvias haciéndola.

OBRAS EJECUTADAS:

REFERENCIAS FOTOGRAFICAS CONDICION DE INTERVENCION PTO No 8:



CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE



3. PROYECTOS CON VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS VIGENCIA 2020

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
271 de 2020	ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS VIABILIZADOS POR EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER - GRUPO 1	\$ 966.053.690,00		
275 de 2020	ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS VIABILIZADOS POR EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER - GRUPO 2	\$ 731.44.8543,00		
300 DE 2020	ADECUACION DEL CENTRO VIDA DEL BARRIO ALVAREZ EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 782.986.622,00		
301 DE 2020	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE EQUIPAMIENTOS URBANOS MEDIANTE EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.205.496.902,19		
303 DE 2020	AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.180.027.147,00		

4. CONVENIOS FIRMADOS

La Secretaria de Infraestructura realizo dos convenios interadministrativos, los cuales se detallan a continuación:

1. Convenio Interadministrativo con el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, cuyo objeto: “AUNAR ESFUERZOS, ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BUCARAMANGA AMB S.A.E.S.P, CON EL FIN DE BRINDAR COLABORACION A TRAVES DE ACCIONES O ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO QUE NO

COMPROMETIENDO SU ESTRUCTURA EMPRESARIAL, GARANTIZANDO EL ADECUADO SEGUIMIENTO, CONTROL Y CONCRECIÓN DE LOS ESTUDIOS DE LA ETAPA DE PREINVERSIÓN CORRESPONDIENTES A PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA PTAR RIO DE ORO. Por valor de \$ 2.040.816.327,00

2. Convenio Interadministrativo No. 9677-PPAL001-1461-2020 con la Unidad de Gestión del riesgo, cuyo objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES DE CAMPOHERMOSO, DON BOSCO, GAITAN Y SAN GERARDO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO No. 0398 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE). Valor Convenio (\$ 47.230.795.743,00) aporte del Municipio \$ 30.000.000.000,00

5. CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 2020-2023

La Secretaría de Infraestructura realizó el seguimiento y monitoreo a las metas programadas para la vigencia 2020, los cuales se detallan a continuación.

LÍNEA ESTRATÉGICA	COMPONENTE	PROGRAMA	TIEMPO PROGRAMADO (en el año)		INDICADORES			
			Fecha Inicial	Fecha Terminación	INDICADOR	META CUATRIENIO	META	LOGRO
2. BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO	BUCARAMANGA UNA ECO-CIUDAD	GOBERNANZA DEL AGUA, NUESTRA AGUA, NUESTRA VIDA	01/01/2020	31/12/2020	Porcentaje de avance en la realización de los estudios y diseños del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Bucaramanga metropolitana.	100%	0%	14%
4. BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA	ESPACIO PÚBLICO VITAL	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES	01/01/2020	31/12/2020	Porcentaje de parques, zonas verdes y su mobiliario mantenido.	100%	100%	100%
		EQUIPAMIENTO COMUNITARIO	01/01/2020	31/12/2020	Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad construido y/o mejorado.	100.000	6.400	6.560
		INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	01/01/2020	31/12/2020	Número de m2 de malla vial urbana mantenidos o mejorados.	100.000	41.000	41.924
			01/01/2020	31/12/2020	Número de puentes peatonales con mantenimiento realizado.	2	1	1
		ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL	01/01/2020	31/12/2020	Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados.	1	1	1
			01/01/2020	31/12/2020	Porcentaje de luminarias operativas en funcionamiento.	100%	100%	100%
			01/01/2020	31/12/2020	Porcentaje de avance en la implementación de la herramienta que permita integrar la gestión y el control de la infraestructura del alumbrado público mediante las TIC.	100%	50%	
01/01/2020	31/12/2020	Número de puntos de luminarias telegestionadas instaladas para construir una red de alumbrado público inteligente basado en sensorica y dispositivos interconectados para la telegestión.	30.000	5.791				
5. BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MODERNA E INNOVADORA	GOBIERNO FORTALECIDO PARA SER Y HACER	01/01/2020	31/12/2020	Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos.	100%	100%	100%

6. PQRSD (Atención y seguimiento a las solicitudes)

De acuerdo a la información del Sistema y reporte de la TICS del 01 de octubre a diciembre 30 de 2020 se radicaron 734 Solicitudes de PQRS, ante la Secretaria de Infraestructura, se dieron respuesta a 416 y están pendientes de respuesta 270 PQRS.

7. PRESUPUESTOS EJECUTADOS (Ejecución presupuestal - Anexo)
8. INFORMES DE INTERVENTORIA (Contratos en ejecución y liquidados - Anexo)
9. GASTO (Relación personal- Anexo)
10. GASTOS (Relación de Inversión – anexo)
11. INFORME JURIDICO (Procesos activos y estado actual – Anexo)
