



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga

**GOBERNAR
ES HACER**

**INFORME DE GESTION - 01 Abril – 30 Junio de 2020
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**

INFORME DE GESTION A 30 DE JUNIO DE 2020

En el presente informe se resume los principales avances que la Secretaria de Infraestructura ha generado en el segundo trimestre del año, en el cual ha ejecutado y realizado las gestiones pertinentes para el control del avance de las diferentes obras que ejecuta la Secretaria.

A continuación, se detalla la gestión que ha realizado la Secretaria de Infraestructura en el segundo trimestre de 2020.

1. CONTRATOS EN EJECUCION VIGENCIA 2019

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
323 de 2019	ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.000.392.123,45	17/10/2019	06/07/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$300.117.637,00	Adicional 1. \$ 243.305.920,44	NOVENTA (90) DIAS	Avance de Obra: 46%	ACTIVO

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-11834>

BARRIO TRANSICION



BARRIO PAN DE AZUCAR



BARRIO CABECERA



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
338 de 2019	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO URBANO MEDIANTE EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO I	\$ 1.475.498.399.47	15/10/2019	04/07/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 565.653.753,98	\$ 107.851.016,90 \$ 302.163.063,55	1. DOS (02) MESES	Avance de Obra: 88,97%	ACTIVO – EN EJECUCION

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-12132>

N°	BARRIO	UBICACIÓN
1	KENNEDY	Cra 12 entre calles 10 y 11 Norte
2	ALTOS DEL KENNEDY	Cra 11 entre calles 28A y 28 Norte
3	VILLA ROSA III	Carrera 18A con calle 11A
4	NUEVA COLOMBIA	Calle 2 entre Cra 16D y 17
5	LOS ÁNGELES	Calle 2 entre Cra 16D y 17
6	CENTRO	Carrera 15 entre calles 33 y 34
7	LA JOYA	Carrera 8 oeste entre calles 36 y 37
8	CAMPO HERMOSO	Carrera 12 Oeste entre calles 46 y 47
9	ESTORAQUES	Carrera 43 Oeste entre calle 58ª y 59

CANCHA MULTIPLE BARRIO LA JOYA



Mantenimiento de pintura de módulo de cerramiento en malla eslabonada



Demolición de piso

PARQUE BARRIO KENNEDY



Piso adoquín demarcador visual amarillo

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
339 de 2019	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO URBANO MEDIANTE EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO 2	\$ 1.152.739.167,19	15/10/2019	04/07/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 345.821.750,10	Adicional 1 \$ 22.406.073,26 Adicional 2 \$ 141.014.280,87	1. DOS (2) MESES	Avance de Obra: 88,97%	ACTIVO – EN EJECUCION

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-12132>

Nº	BARRIO	UBICACIÓN	% DE AVANCE
1	SANTANDER	Carrera 5 oeste con calle 31	60%
2	BALCONCITOS	Calle 55 con cra 5 Occidente	60%
3	NARANJOS	Carrera 5 # 58-42	100%
4	URBANIZACION LOS ALMENDROS	Carrera 8 64-63	100%
5	CIUDAD BOLIVAR – SECTOR 20 DE JULIO	Calle 64 # 64-16	90%
6	CIUDAD BOLIVAR – SECTOR GUAYACANES	Calle 64 Cra 6ª	90%
7	PLAZUELA REAL	Calle 65 Cra 10	100%
8	HÉROES	Calle 65 Cra 6 Oeste	45%
9	MONTERREDONDO	Carrera 36 oeste calle 65	60%

CERRAMIENTO METALICO BARRIO PLAZUELA REAL



Elaboración e instalación de cerramiento en anticorrosivo y esmalte en tubo de 2"

REMODELACION RESTAURANTE INFANTIL BARRIO SANTANDER



REMODELACION CHANCHA DE FUTBOL BARRIO MONTERREDONDO



Construcción Gradería

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
340 de 2019	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO URBANO MEDIANTE EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO 3	\$ 1.092.913.615,91	15/10/2019	04/07/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
No acepto anticipo	Adicional 1 \$ 32.248.246,29	N/A	Avance de Obra: 80%	ACTIVO – EN EJECUCION

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-12132>

N°	BARRIO	UBICACIÓN	% DE AVANCE
1	SANTA MARIA	Calle 103B entre carreras 12A y 13	100%
2	MANUELA BELTRAN	Calle 103F con carrera 11A	100%
3	CRISTAL BAJO	Carrera 15 con calle 127 ^a	100%
4	SAN PEDRO CLAVER	Calle 74 con cra 30	80%
5	EL SOL	Calle 73 Bis con cra 31	70%
6	ANTONIA SANTOS SUR	Calle 71 con cra 30 ^a	90%
7	MERCEDES	Carrera 28 entre calles 62 y 63	80%

PARQUE BARRIO ANTONIA SANTOS



MANTENIMIENTO CANCHA MULTIPLE BARRIO SAN PEDRO



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
326 de 2019	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES MAGUEYES, MONSERRATE, ROSA BLANCA Y LAS GRANJITAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"	\$ 504.058.620	01/10/2019	27/06/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 151.217.586,00	Adicional \$ 102.168.577,00	1. DOS (2) MESES	Avance de Obra: 80%	ACTIVO – EN EJECUCION

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9753936>

MEJORAMIENTO ACUEDUCTO	% DE AVANCE
Acueducto Monserrate	80%
Acueducto Magueyes	80%
Acueducto Rosa Blanca	75%
Acueducto Las Granjitas	85%



Vereda Magueyes línea de aducción al desarenador



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
204 de 2019	MEJORAMIENTO DEL CENTRO VIDA AÑOS MARAVILLOSOS EN LA CIUADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.068.967.088,83	22/07/2019	25/07/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 620.690.126,65	Adicional 1. \$ 484.739.127	1. UN (1) MES 2. SESENTA (60) DIAS 3. UN (1) MES	Avance de Obra: 79.04%	ACTIVO – REINICIADO EL 20-may-20

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-200755>



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
303 de 2019	CONSTRUCCION DE SENDEROS DE LOS CAMINANTES EN LOS CERROS ORIENTALES DE BUCARAMANGA. - GRUPO 1-Puerta Corcovado	\$ 4.835.552.381,69	30/08/2019	17/07/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 1.934.220.953,67	0	1. Tres (03) meses y Quince (15) días	Avance de Obra: 47.56%	ACTIVO

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-10760>



Ajuste niveles de tapas de cajas eléctricas



Compactación subrasante

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
307 de 2019	CONSTRUCCION DE SENDEROS DE LOS CAMINANTES EN LOS CERROS ORIENTALES DE BUCARAMANGA. - GRUPO 2-Puerta Jardín	\$ 5.605.876.851	16/09/2019	17/06/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 2.242.350.740,40	0	1. Tres (03) meses y siete (7) días	Avance de Obra: 44,28%	ACTIVO

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-10760>



Excavación manual para ductería eléctrica

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
151 de 2019	MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 7.297.395.222,86	04/06/2019	20/07/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 2.918.958.089,14 \$ 264.047.620,67	1. \$ 660.119.051,67 2. \$ 738.388.322,08	1. 27 DIAS CALENDARIO 2. DOS (2) MESES 3. DOS (2) MESES	Avance de Obra: 91%	ACTIVO

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-198829>



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
112 de 2019	ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA FUNDACION TEATRO SANTANDER, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS, TECNICOS, FINANCIEROS, Y ADMINISTRATIVOS PARA LA TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DE APOYO TEATRO SANTANDER Y TEATRINO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES (EMA) EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 4.057.438.420	22/03/2019	17/09/2020

Desembolsos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
1.\$ 2.020.719.210,00 2.\$ 1.217.231.526,00 3.\$ 405.743.842,00 4.\$ 1.546.994.255,41	\$ 1.933.742.819,25	1.UN (01) MES 2. UN (01) MES Y NUEVE (09) DIAS 3. TRES (03) MESES 4. TRES (03) MESES	Avance de Obra: 79%	ACTIVO

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9194143>



Fachada principal



Lobby

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
196 de 2019	MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO I (Villa Rosa 4,5,6 , Villa Elena I, los Ángeles, Villa Alegría, Nuevo Horizonte, Villa Helena II)	\$ 1.063.680.300	05/07/2019	19/05/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 319.104.090	\$ 14.763.280,83	1. 37 DIAS	Avance de Obra: 100%	ACTIVO – TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-199485>



CANCHA MÚLTIPLE BARRIO LOS ÁNGELES



CANCHA MÚLTIPLE ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO HORIZONTE



CANCHA MÚLTIPLE BARRIO VILLA HELENA 1



CANCHA MÚLTIPLE BARRIO VILLA HELENA 2



CANCHA MÚLTIPLE BARRIO VILLA ROSA SECTOR 4,5 Y 6



CANCHA MÚLTIPLE BARRIO VILLA

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
197 de 2019	MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO II (San Cristóbal, Villa Mercedes, Colegio Santo Ángel, Esperanza I, María Paz)	\$ 1.371.448.073	05/07/2019	20/05/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 411.434.421,90	\$ 49.128.573,57	1. 46 DIAS	Avance de Obra: 100%	ACTIVO – TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-199485>



CANCHA MULTIPLE BARRIO SAN CRISTOBAL



CANCHA MULTIPLE BARRIO ESPERANZA 1



CANCHA DE FÚTBOL EN GRAMA SINTETICA B. MARÍA PAZ



CANCHA MÚLTIPLE BARRIO MARÍA PAZ



CANCHA MÚLTIPLE BARRIO VILLA MERCEDES



CANCHA MÚLTIPLE BARRIO ESPERANZA 1

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
205 de 2019	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DE ATLETISMO LUIS ENRIQUE FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER	\$ 7.328.306.699,1	10/07/2019	21/07/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$2.198.492.009,73 \$ 812.031.315,45	Adicional \$ 2.706.771.051,53	4 MESES	Avance de Obra: 38,83	ACTIVO

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-199761>



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
234 de 2019	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE CENTRALIDAD NORTE EN EL TEJAR NORTE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 4.528.233.551,23	15/07/2019	09/03/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
1. \$ 1.358.470.065,37 2. 75.997.672,04	\$ 253.325.574,00	1. 20 DIAS CALENDARIO 2. UN (1) MES	Avance de Obra: 100%	ACTIVO – RECIBIDO

Link : <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-200334>




Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
335 de 2019	EJECUCION DE OBRAS Y ACTIVIDADES VARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS SENTENCIAS JUDICIALES ORDENADAS EN PROCESOS DE ACCIONES CONSTITUCIONALES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 377.423.563,75	11/10/2019	26/06/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$113.227.069,13	0	2 MESES	Avance de Obra: 100%	ACTIVO – EN PROCESO DE LIQUIDACION

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9813977>

CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS Y PASAMANOS BARRIO LA INDEPENDENCIA

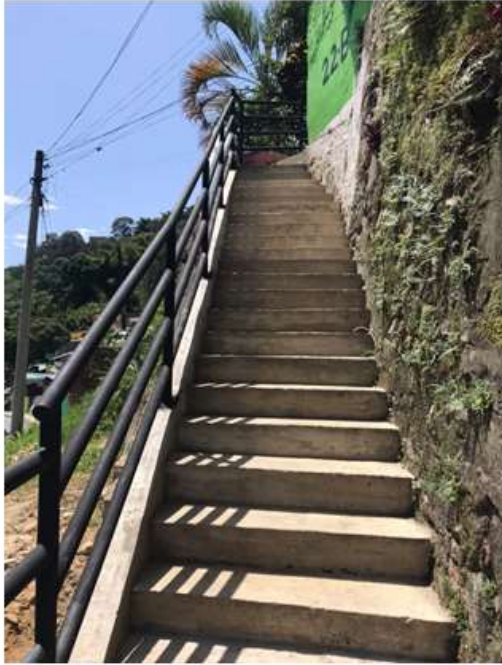

ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO CARRERA 22 # 100-24 BARRIO PROVENZA



CONSTRUCCIÓN ESPACIO PUBLICO PABLO VI



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
265 de 2019	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LA CEIBA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA FASE II.	\$ 5.156.747.554	06/08/2019	25/07/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$2.242.350.740.80	Adicional \$630.467.244,66	1. Siete (07) días 2. Tres (03) meses y quince (15) días	Avance de Obra: 56,72%	ACTIVO

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-201924>



Instalación de puesta tierra (varilla cooperwell)



Suministro e Instalación plataforma de sendero

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
241 de 2019	CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL METROPOLITANO DEL RÍO SURATÁ EN EL BARRIO EL CLAVERIANO, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA..	\$ 6.103.224.070,59	16/07/2019	04/08/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 1.830.967.221,30	0	1. 4 MESES Y 15 DÍAS	Avance de Obra: 79.04%	ACTIVO – REINICIADO EL 20-may-20

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-201761>



VISUAL ZONA CANCHA SINTÉTICA, ESTANCIAS URBANAS Y CIRCULACIONES PERIMETRALES SECTOR 3



ZONA DE CIRCULACIÓN Y JUEGOS PARA NIÑOS SECTOR 3



ZONA DE JUEGOS PARA NIÑOS SECTOR 3

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
266 de 2019	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LOS SALONES COMUNALES EN LOS BARRIOS. GRUPO 1 (BUCARAMANGA, EL GAITAN, LA FERIA, SAN MIGUEL Y VILLA DEL PRADO)	\$ 2.041.243.497,09	06/08/2019	26/08/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 670.554.928,78	\$ 193.939.598.84	1. SETENTA Y CINCO (75) DIAS 2. CUARENTA Y CINCO (45) DIAS 3. En proceso de adición en plazo	Avance de Obra: 50%	ACTIVO – REINICIADO EL 20-may-20

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-9962>

SALON COMUNAL BARRIO BUCARAMANGA



SALON COMUNAL BARRIO SAN MIGUEL



SALON COMUNAL BARRIO



SALON COMUNAL BARRIO LA



SALON COMUNAL BARRIO VILLA DEL



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
267 de 2019	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LOS SALONES COMUNALES EN LOS BARRIOS. GRUPO 2 (DIAMANTE – LA LIBERTAD – NORTE BAJO – NUEVA COLOMBIA – CAFÉ MADRID)	\$ 2.005.639.450,19	06/08/2019	24/07/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 601.691.835,06	\$ 211.412.157,16	1. TREINTA (30) DIAS 2. CUARENTA Y CINCO (45) DIAS	Avance de Obra: 98%	ACTIVO Y REINICIADO EL 20-may-20

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-9962>



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga

**GOBERNAR
ES HACER**

SALON COMUNAL DIAMANTE I



SALON COMUNAL NUEVA



SALON COMUNAL CAFÉ



SALON COMUNAL LA LIBERTAD



SALON COMUNAL NORTE BAJO



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
316 de 2019	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL SANTA TERESITA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- UIMIST"	\$ 927.076.940	20/09/2019	18/06/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 278.123.082	0	1. 3 MESES	Avance de Obra: 40%	SUSPENDIDO MARZO 24 DEL 2020 (CAPACIDAD INSTALADA EN TRAMITE GOBERNACION DE SANTANDER)

Link : <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9415399>

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
376 de 2019	CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	\$ 502.318.195,20	04/12/2019	11/07/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 150.695.458,56	\$ 61.353.938,84	1 MES Y 45 DIAS	Avance de Obra: 67%	ACTIVO – EN EJECUCION

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9941804>



INSTALACIÓN LOSETA PREFABRICADA ACCESO AL CDI



INSTALACIÓN LOSETA PREFABRICADA ZONA URBANA



INSTALACIÓN LOSETA PREFABRICADA ZONA URBANA



INSTALACIÓN LOSETA PREFABRICADA ACCESO PRINCIPAL

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
161 de 2019	CONSTRUCCIÓN DE CICLO-INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO I	\$ 6.518.280.839	30/05/2019	12/11/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 1.955.484.251,70	0	1. SEIS (6) MES	Avance de Obra: 37,23%	ACTIVO – EN EJECUCION

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-199190>



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
162 de 2019	CONSTRUCCIÓN DE CICLO-INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO II	\$ 6.260.637.436,76	30/05/2019	31/12/2019

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 1.878.191.231,03	0	N/A	Avance de Obra: 33,12%	SUSPENDIDO

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-199190>



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
261 de 2019	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - GRUPO 1	\$ 4.446.523.289	06/08/2019	12/06/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 1.333.956.986,70	Adicional 1 \$ 515.036.515,00 Adicional 2 \$ 1.699.812.040,00	1. dos (2) meses y quince (15) días 2. ocho (8) días	Avance de Obra: 94,48%	SUSPENDIDO

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-202047>



Aplicación asfalto carrera 15 No 21- 72



Fresado carrera 15 entre calle 6 y 8

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
263 de 2019	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - GRUPO 2	\$ 4.316.014.490	06/08/2019	10/06/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 1.294.804.347,00	Adicional 1 \$ 555.273.906,00 Adicional 2 \$ 1.602.364.927,00	1. dos (2) meses y quince (15) días 2. ocho (8) días	Avance de Obra: 100%	ACTIVO – EN PROCESO DE RECIBO FINAL

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-202047>



Calle 55 en Real de minas



Carrera 30 con calle 65, Puerta del Sol

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
264 de 2019	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. - GRUPO 3	\$ 3.838.463.454,08	06/09/2019	12/06/2019

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 1.466.954.740,00	Adicional 1 \$ 449.425.391,00 Adicional 2 \$ 1.466.954.740,20	1. dos (2) meses y quince (15) días 2. ocho (8) días	Avance de Obra: 84,35%	SUSPENDIDO

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-202047>



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
282 de 2019	CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 1	\$ 1.136.548.602	15/08/2019	29/06/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 340.904.560,00	Adicional 1 \$162.523.356 Adicional 2 \$185.304.138,46	1. UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS	Avance de Obra: 98%	ACTIVO – EN EJECUCION

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-10778>

INTERVENCIÓN VEREDA SAN PEDRO BAJO TRAMO 1



ANTES



DESPUES

INTERVENCIÓN EN SAN PEDRO BAJO TRAMO 2



ANTES



DESPUES

INTERVENCIÓN VEREDA SECTOR FINCA DON DANIEL



ANTES



DESPUES



CONSTRUCCION ALCANTARILLA VEREDA LA SABANA

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
283 de 2019	CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 2	\$ 1.180.683.854	15/08/2019	29/06/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 354.205.156,00	Adicional \$202.962.104	DOS (2) MESES	Avance de Obra: 92%	ACTIVO – EN EJECUCION

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-10778>

INTERVENCIÓN VEREDA CUCHILLA ALTA SECOTR DORIS ARDILA



ANTES



DESPUES

INTERVENCIÓN VEREDA BOLARQUI BAJO MANTENIMIENTO PUENTE COLGANTE



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
284 de 2019	CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 3	\$ 1.300.079.710	15/08/2019	29/06/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 340.023.913,00	\$ 502.694.665,00	DOS (2) MESES	Avance de Obra: 69%	ACTIVO – EN EJECUCION

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-10778>

VEREDA SAN JOSE SECOTR SANTA BOHEMIA



VEREDA SAN JOSE SECTOR REFUGIO DEL CAMINANTE



VEREDA RETIRO CHIQUITO SECTOR REFUGIO ITZAMA/



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
343 de 2019	"CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A TRAVÉS DE POZOS SÉPTICOS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER".	\$ 792.800.294,00	17/10/2019	14/06/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 396.400.147,00	N/A	N/A	Avance de Obra: 43 Unidades instaladas	ACTIVO – EN EJECUCION

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-13319>



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
345 de 2019	"CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A TRAVÉS DE POZOS SÉPTICOS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER".	\$ 992.031.676,00	17/10/2019	29/06/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 496.015.838,00	N/A	1. DOS MESES Y QUINCE DIAS	Avance de Obra: 40 Unidades instaladas	ACTIVO – EN EJECUCION

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-13319>

		
DESCRIPCION : CAPACITACION INICIAL A TRABAJADORES	DESCRIPCION : INICIO DE EXCAVACIONES EN MONSERRATE	DESCRIPCION : INICIO DE EXCAVACIONES EN MONSERRATE

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
344 de 2019	"CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A TRAVÉS DE POZOS SÉPTICOS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER".	\$ 616.708.569,88	17/10/2019	29/06/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 308.354.285,00	N/A	1. UN (1) MES	Avance de Obra: 40 unidades instaladas	ACTIVO – EN EJECUCION

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-13319>

		
DESCRIPCION: TOMA DE TEMPERATURA A PROVEEDORES	DESCRIPCION: EXCAVACION PARA TANQUE SEPTICO	DESCRIPCION: MAMPOSTERIA EN POZO DE ABSORCION

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
352 de 2019	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ATENDER LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE VIJAGUAL, BOSCONIA, MIRAFLORES Y CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MALAÑA; DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER.	\$ 579.115.188,90	01/11/2019	09/05/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
Valor Anticipo Inicial: \$ 173.734.556,57 Valor Anticipo Adicional: \$ 31.301.877,01	\$ 104.339.590	1. DOS (2) MESES	Avance de Obra: 100%	ACTIVO – POR LIQUIDAR

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9920587>



Contrato No.	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
297 de 2019	Modernización y expansión del alumbrado público perimetral del parque ecológico la flora de Bucaramanga	\$2.327'801.828.00	28 de agosto de 2019	10 de Junio de 2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
Valor Anticipo Inicial: \$931.120.731,20 Valor Anticipo Adicional: \$134.141.223,84	Adicional \$335'553.059.60	1. CUARENTA Y CINCO (45) DIAS	Avance de Obra: 81,83%	SUSPENDIDO

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-202072>



Instalación de postes para luminarias y recuperación de andenes por nuevo banco de ductos asociado a la modernización del alumbrado público.

Contrato No.	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
245 de 2019	Modernización del alumbrado público del parque Morrongo del municipio de Bucaramanga	\$2.467'202.721.00	24 de julio 2019	16 de Junio de 2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
Valor Anticipo Inicial: \$ 986.881.088,40	Adicional \$278'111.654.74	1. SESENTA Y SIETE (67) DIAS	Avance de Obra: 75%	SUSPENDIDO

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-201468>



Instalación de postes para luminarias y recuperación de andenes por nuevo banco de ductos asociado a la modernización del alumbrado público.

Contrato No.	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
275 de 2019	Modernización del alumbrado público de la calle 30 entre las carreras 26 y 27 del municipio de Bucaramanga.	\$1.068.518.465.00	20 de agosto de 2019	24 de mayo de 2020.

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
Valor Anticipo Inicial: \$ 986.881.088,40	Adicional \$259'924.695.88	1. CUARENTA Y CINCO (45) DIAS	Avance de Obra: 96.90%	SUSPENDIDO

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-201827>



Pruebas de iluminación calle 30, parque de los niños frente a la Biblioteca Gabriel Turbay

Contrato No.	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
285 de 2019	Modernización del alumbrado público de la calle de los estudiantes entre la calle 54ª y la diagonal 14 municipio de Bucaramanga	\$3.911'411.963.00	15 de agosto de 2019	30 de junio de 2020.

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 1.564.564.785,20	Adicional \$39'926.386.00	1. SESENTA Y SIETE (67) DIAS	Avance de Obra: 60%	SUSPENDIDO - desde el 26 de junio de 2020.

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-202236>





Modernización del alumbrado público y soterración de redes eléctricas asociadas. Montaje de luminarias.

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
351 de 2019	"CONSTRUCCIÓN DE GALERÍAS DE BÓVEDAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, SANTANDER"	\$ 381.604.728,15	07/11/2019	18/04/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 114.481.418,45	0	1. TREINTA (30) DIAS 2. CUARENTA Y CINCO (45) DIAS	Avance de Obra: 100%	Liquidado

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9893232>



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
348 de 2019	MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCION INMEDIATA CAIS ADSCRITOS A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 468.723.474,98	12/11/2019	17/02/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 140.617.042,49	\$ 230.822.120,63	1. UN (1) MES 2. DOS (2) MESES 3. 3 MES Y 49 DIAS	Avance de Obra: 80%	ACTIVO – EN EJECUCION

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9801851>

Con el contrato mencionado se atenderán los siguientes CAI'S:

- BARRIO CAFÉ MADRID, BARRIO LA ESPERANZA, LA VIRGEN, BARRIO SAN FRANCISCO, BARRIO GIRARDOT, CHIMITA, BARRIO LA JOYA, BARRIO LA CONCORDIA, VIADUCTO GARCIA CADENA, BARRIO CIUDAD VENECIA, TERMINAL DE TRANSPORTES, PARQUE SAN PIO, BARRIO SOTOMAYOR, BARRIO SAN ALONSO, BARRIO ANTONIA SANTOS CENTRO Y BARRIO MORRORICO.

➤ **CAI BARRIO CAMPOHERMOSO**



(ANTES)



(ACTUAL)

➤ **CAI INEM**



(ANTES)



(ACTUAL)

➤ **CAI LA VICTORIA**



(ANTES)



(ACTUAL)

2. CONTRATOS VIGENCIA 2020

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
13 de 2020	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER, EN LOS SECTORES INDICADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO.	\$ 4.677.196.206,20	13/04/2020	30/12/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
0	0	0	Avance de Obra: 26%	ACTIVO

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10450809>

Mediante el presente Contrato Interadministrativo se realizará rocería a las zonas verdes ubicadas en Parques, separadores y vías del Municipio de Bucaramanga, se asignará Parqueros a los Parques Emblemáticos y Parques Principales de cada Sector, Mantenimiento de Prado y Siembra de Prado, a continuación, se relaciona como se tiene proyectado distribuir las zonas de trabajo:

- ✓ 25 Cuadrillas conformadas por 4 personas cada una, ubicadas en los Parques y zonas Verdes de las 17 Comunas del Municipio de Bucaramanga.
- ✓ 4 cuadrillas conformadas por 4 personas cada una, las cuales atienden las entradas principales a Bucaramanga, separadores y rompoys.
- ✓ 3 cuadrillas conformadas por 4 personas, para Siembra y mantenimiento de Prado.
- ✓ Los parqueros están ubicados en noventa y cinco parques y zonas verdes de vital importancia para la ciudad con el fin de cuidar y embellecer estas zonas; sus actividades principales son: barrido, recolección de hojas, cambio de bolsas de las cestas y riego de las zonas asignadas.

El proceso de siembra de prado se realizará una vez inicie el periodo de lluvias y el cual está proyectado a partir del Segundo Semestre.

➤ **LISTADO DE PARQUES DONDE SE ASIGNO PARQUERO.**

PARQUEROS ZONA ORIENTE	
ITEM	PARQUE
1	PARQUE ANTONIA SANTOS
2	BOSQUE ENCANTADO
3	PARQUE DE LOS NIÑOS
4	PLAZOLETA LOS BUCAROS
5	LAS AMERICAS
6	PARQUE BOLIVAR
7	PLAZA DE LAS BANDERAS
8	PARQUE SOLON WILCHES
9	CARRERA 33 ZONAS VERDES
10	PARQUE TURBAY Y BENJAMIN HERRERA
11	PARQUE SAN PIO
12	PARQUE LAS PALMAS
13	PARQUE LAS MERCEDES
14	PARQUE DIVINO NIÑO (CONUCOS)
15	PARQUE LEONES
16	PARQUE LOS PINOS
17	PARQUE SARRAPIOS
18	PARQUE LA FLORA
19	PAN DE AZUCAR BAJO
20	PARQUE LAS MOJARRAS
21	PARQUE CARLOS ENRIQUE VIRVIESCAS

PARQUEROS ZONA NORTE	
ITEM	PARQUE
1	PARQUE LINEAL RIO DE ORO
2	CIUDADELA CAFÉ MADRI
3	PARQUE KENNEDY
4	PARQUE CRISTO REY
5	CARRERA 15
6	CABALLO BOLÍVAR
7	PARQUE SAN FRANCISCO
8	ZONAS VERDES QUEBRADA SECA Y ROMPOY

PARQUEROS ZONA OCCIDENTE	
ITEM	PARQUE
1	PARQUE GARCIA ROVIRA
2	PARQUE CENTENARIO
3	PARQUE SANTANDER
4	PARQUE BRUNO BATELLO
5	SEPARADOR DE LA NOVENA
6	PARQUE SANTANDER
7	PARQUE ROMERO
8	PARQUE ESTORAQUES
9	LA PAZ- FUNDADORES – MARGARITAS
10	PARQUE LA VIDA
11	PARQUE CIGARRAS
12	PARQUE LAS PALMAS-VENADOS
13	CIUDAD BOLIVAR
14	SEPARADOR ACROPOLIS
15	PARQUE MONTERREDONDO
16	PARQUE LAS ARDILLAS-HEROES
17	PARQUE PRADO DEL MUTIS
18	PARQUE DE LOS SUEÑOS
19	PARQUE GUAYACANES (CIUDAD BOLIVAR)
20	PARQUE GIRARDOT
21	BARRIO SANTANDER

PARQUEROS ZONA SUR	
ITEM	PARQUE
1	CRISTAL ALTO Y BAJO
2	LA SALLE (MARCELINO GILLIBERT)
3	PARQUE LA CONCORDIA
4	PARQUE B. ROCIO (PLAZOLETA)
5	PARQUE LAS TRES B
6	PROVENZA SEPARADOR 105
7	PARQUE B. DIAMANTE II
8	PARQUE B. CORONA Y LA CEIBA
9	PARQUE B. PORVENIR LA PETACA
10	PARQUE VALLEDUPAR
11	PARQUE FONTANA REAL
12	PARQUE EL MOLINO B. PORVENIR
13	PARQUE LOS ENAMORADOS
14	CAMINODROMO DE PROVENZA
15	CANCHA LA MILAGROSA
16	PARQUE SAN LUIS
17	CIUDAD VENECIA Y TOLEDO PLATA
18	ZONAS VERDES B. SAN MIGUEL Y CICLO VIA
19	BARRIO SANTA MARIA Y MANUELA BELTRÁN
20	CARRASCO CONTEMPLATIVO
21	PARQUE B. CANELOS

✓ **Rocería:**

Lote Café Madrid

ANTES



DESPUES



La Esperanza Tres

ANTES



DESPUES



Talud El Cacique

ANTES



DESPUES



Glorieta Neomundo

ANTES



DESPUES



✓ **Parqueros:**

Parque Lineal Rio de Oro



Parque Fontana Real



Parque Carlos Enrique Virviescas



Parque Las Palmas Calle 55 Mutis



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
115 de 2020	ACTIVIDADES DE PODA PARA EL DESPEJE DE LUMINARIAS Y REDES QUE INTERFIEREN CON EL ALUMBRADO PÚBLICO Y TALA DE ÁRBOLES Y MANEJO INTEGRAL DEL COMPONENTE ARBÓREO EN EL ESPACIO PÚBLICO, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"	\$ 797.170.873,00	26/06/2020	25/11/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
0	0	0	Avance de Obra: 3%	ACTIVO

Link:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1237761&isFromPublicArea=True&isModal=False>

Lo que corresponde al informe de Parques y Zonas Verdes es Tala de árboles y Manejo Integral del Componente arbóreo en el Espacio Público.

Se realizó Manejo integral de 10 árboles ubicados en la Carrera 37 con Calle 54.

Registro Fotográfico:



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
107 de 2020	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. Grupo 1	\$ 542.453.657,20	11/06/2020	31/12/2020
108 de 2020	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. Grupo 2	\$ 423.713.416,00	11/06/2020	31/12/2020
109 de 2020	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. Grupo 3	\$ 437.470.343,24	11/06/2020	31/12/2020

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
Grupo 1. 0 Grupo 2. 0 Grupo 3. 0	0	0	Avance de Obra: 10,84%	ACTIVO

Link:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1224417&isFromPublicArea=True&isModal=False>



Mantenimiento de alumbrado publico en el sector rural y urbano de todo el municipio de Bucaramanga: 17 comunas y tres corregimientos. Dando respuesta a la PQR's recibidas en AP por medio telefónico, pagina web y en ventanilla de la oficina.

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
114 de 2020	"SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA".	\$ 1.395.000.000	11/06/2020	10/08/2020

Link:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1233240&isFromPublicArea=True&isModal=False>

3. PQRSD (Atención y seguimiento a las solicitudes)

De acuerdo a la información del Sistema y reporte de la TICS del 01 de Abril a Junio 30 de 2020 se radicaron **236** Solicitudes de PQRS ante la Secretaria de Infraestructura y están pendientes de respuesta **51** PQRS.

4. PRESUPUESTOS EJECUTADOS (Ejecución presupuestal - Anexo)
5. INFORMES DE INTERVENTORIA (Contratos en ejecución y liquidados - Anexo)
6. GASTO DE FUNCIONAMIENTO (De Inversión personal- Anexo)
7. INFORME JURIDICO (Procesos activos y estado actual – Anexo)
