



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga

**GOBERNAR
ES HACER**

**INFORME DE GESTION - 01 Enero – 31 Marzo de 2021
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**

INFORME DE GESTION A 31 DE MARZO DE 2021

En el presente informe se resume los principales avances que la Secretaria de Infraestructura ha generado en el primer trimestre del año, en el cual ha ejecutado y realizado las gestiones pertinentes para el control del avance de las diferentes obras que ejecuta la Secretaria.

A continuación, se detalla la gestión que ha realizado la Secretaria de Infraestructura en el primer trimestre de 2021.

LINEA ESTRATEGICA 2. BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO

PROGRAMA: GOBERNANZA DEL AGUA, NUESTRA AGUA, NUESTRA VIDA

La Secretaria de Infraestructura realizo convenio interadministrativo No. 223 del 26 de Noviembre de 2020 con el ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA para:

“AUNAR ESFUERZOS, ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BUCARAMANGA AMB S.A.E.S.P, CON EL FIN DE BRINDAR COLABORACION A TRAVES DE ACCIONES O ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO QUE NO COMPROMETIENDO SU ESTRUCTURA EMPRESARIAL, GARANTICE EL ADECUADO SEGUIMIENTO, CONTROL Y CONCRECION DE LOS ESTUDIOS DE LA ETAPA DE PREINVERSION CORRESPONDIENTES A PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA PTAR RIO DE ORO. **Por valor de \$ 2.040.816.327,00**, con corte a 31 de Marzo de 2021, se han llevado varias gestiones las cuales es preciso mencionar:

El 22 de enero del 2021 se envía una carta desde el Viceministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio MCVT firmada por el Alcalde del Municipio de Bucaramanga: Doctor Juan Carlos Cárdenas, el Gobernador de Santander: Doctor Mauricio Aguilar Hurtado y el Viceministro de Agua y saneamiento Básico: Doctor José Luis acero Vergel dirigida a la Doctora Ludy Elena Alemán Castellanos, Gerente Suplente de la EMPAS S.A ESP.

El objetivo de esta fue exponer de manera clara y veraz los inconvenientes en las cláusulas del convenio marco que imposibilitaron la firma del mismo, pero se hace un evidente llamado a la unidad de esfuerzos y la convergencia de acciones alrededor de la descontaminación de la cuenca del rio de Oro donde se itera la importancia de vincular activamente a las instituciones que acompañaron este proceso desde mediados de la vigencia 2020 los cuales fueron :La Alcaldía Municipal de Bucaramanga ; amb; Gobernación de Santander; La ESANT; La Empresa Prestadora de Servicios Públicos de Girón; EMPAS S.A.; CDMB y el Viceministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio MCV.

Se conformó por parte del Municipio de Bucaramanga un comité exclusivo para tratar todos los temas relacionados con la PTAR Rio de Oro conformado por: Secretaria de

Infraestructura, amb y equipo de proyectos estratégicos del Municipio. Actualmente se han realizado 4 reuniones una por mes.

El día 6 de abril se realizó una reunión en el salón de gobierno presidido por el Secretario de Infraestructura donde se citaron a los principales gremios de la ciudad con el objetivo de informarles el estado de la meta del proyecto estratégico PTAR: Bucaramanga Metropolitana, se realizó un informe de trazabilidad de gestión sobre este proyecto y evidencio los inconvenientes en las cláusulas del convenio marco que imposibilito la firma de este. De igual manera se analizó el convenio interadministrativo 173 firmado entre la CDMB y EMPAS S.A ESP y se concluyó que se deben realizar estrategias para que toda la institucionalidad del Municipio haga parte activa de este proyecto debido a su importancia regional.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES

PROGRAMA: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA INFRAESTRUCTURA

La secretaria de infraestructura realizo la contratación de estudios, los cuales se detalla a continuación:

Contrato No.	objeto	Valor Inicial	Fecha Inicio	Fecha Terminación
17 de 2021	ESTUDIOS DE SUELOS, GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 46.277.775,00	16/02/2021	21/04/2021

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
0	Adicional 1. \$ 23.130.522,00	1. VEINTE (20) DIAS	Avance de Obra: 37,36%	En ejecución

Ensayos geotécnicos para el diseño de proyectos



Así mismo la Secretaria se encuentra estructurando un CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER –UIS., por valor de **(\$1.114.130.000,00)** para la ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS de la SOLUCIÓN VIAL SECTOR CALLE 54 - CALLE 56, CONEXIÓN SECTOR ORIENTE - OCCIDENTE, OCCIDENTE – ORIENTE.

**LÍNEA ESTRATÉGICA 4. BUCARAMANGA CIUDAD VITAL:
LA VIDA ES SAGRADA**

PROGRAMA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES

Durante la presente vigencia, la Secretaria de Infraestructura realizo adicional en valor y plazo al contrato del mantenimiento de parques y zonas verdes así:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
13 de 2020	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER, EN LOS SECTORES INDICADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO.	\$ 4.677.196.206,20	13/04/2020	12/06/2021

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
0	\$ 1.434.700.926	1. CUARENTA Y DOS (42) DIAS 2. CUATRO (4) MESES	Avance de Obra: 82,85%	EN EJECUCION

Link:<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10450809>

El día 12 de Febrero de 2021, se suscribió el Adicional No. 2 en Plazo (4 meses) y Valor (\$1.434.700.926), con fecha de terminación de 12 de Junio de 2021, para poder garantizar la inversión del mantenimiento, conservación y recuperación de parques ya que el aumento progresivo de calor y escasez de lluvias en este período del año podrían afectar considerablemente el alcance de este contrato.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTOGRAFIA No. 1. Puente de Provenza.



FOTOGRAFIA No. 2 Parque San Pio

Igualmente se encuentra en proceso de contratación mediante Licitación Pública No. SI-LP-006-2021, proyecto de "ACTIVIDADES DE PODA PARA EL DESPEJE DE LUMINARIAS Y REDES QUE INTERFIEREN CON EL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y TALA DE ÁRBOLES Y MANEJO INTEGRAL DEL

PROGRAMA: EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

En este programa se encuentran los contratos con vigencias futuras, adjudicados durante la vigencia 2020 así:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
301 de 2020	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE EQUIPAMIENTOS URBANOS VIABILIZADOS MEDIANTE EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.324.998.252	02/02/2021	01/07/2021

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 662.499.126,00	0	N/A	Avance de Obra: 18%	EN EJECUCION

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1550923&isFromPublicArea=True&isModal=False>



PROVENZA



NACUMAS



ALMENDROS

CEIBA

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
300 de 2020	ADECUACION DEL CENTRO VIDA DEL BARRIO ALVAREZ EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 782.986.622,00	08/02/2021	07/05/2021

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 391.493.311	0	N/A	Avance de Obra: 8,97%	EN EJECUCION

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1549595&isFromPublicArea=True&isModal=False>

En el Centro vida Álvarez se ejecuta un proyecto de Adecuación y Mantenimiento, para seguir permitiendo la prestación de los servicios a la población vulnerable, mejorando la calidad de vida de los adultos mayores. La intervención que actualmente se realiza a las instalaciones estarán compuestas por: Fachada, áreas de acceso y espacios interiores.

A la fecha, Se han ejecutado las Actividades preliminares. Se realizan simultáneamente las actividades de Obra Arquitectónica, Intervención de la fachada, Instalaciones eléctricas y de gas.



Instalación Estructura Cieloraso Area Central de Circulación Primer Piso



Instalación Estructura de Soporte de Fachada



Instalación Estructura Cieloraso Primer Piso Area Panaderia



Instalación de Estructura en Area de Talleres 2do. Piso



Estuco sobre muros interiores



Pintura sobre Graniplast Fachada

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
271 de 2020	ADECUACION DE ANDENES ESCALERAS Y PASAMANOS VIABILIZADOS POR EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – GRUPO 1”	\$ 966.053.690,00	12/02/2021	11/07/2021

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 483.026.845,00	0	N/A	Avance de Obra: 8,92%	EN EJECUCION

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1543326&isFromPublicArea=True&isModal=False>

1. BARRIO LOS PINOS



DEMOLICION ANDEN EXISTENTE



DEMOLICION ANDEN EXISTENTE

2. BARRIO LOS ALPES



DEMOLICION ANDEN EXISTENTE



DEMOLICION ANDEN EXISTENTE

3. BARRIO TERRAZAS




DEMOLICION ANDEN EXISTENTE



DEMOLICION ANDEN EXISTENTE

4. BARRIO LA FLORESTA

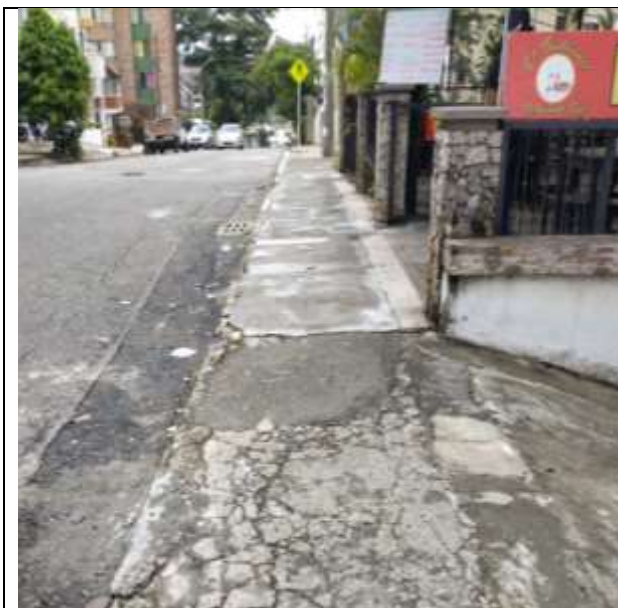

ESTADO INICIAL ESPACIO PUBLICO



ESTADO INICIAL ESPACIO PUBLICO

5. BARRIÓ GIRARDOT




ESTADO INICIAL ESPACIO PUBLICO



ESTADO INICIAL ESPACIO PUBLICO

6. BARRIÓ CENTRO

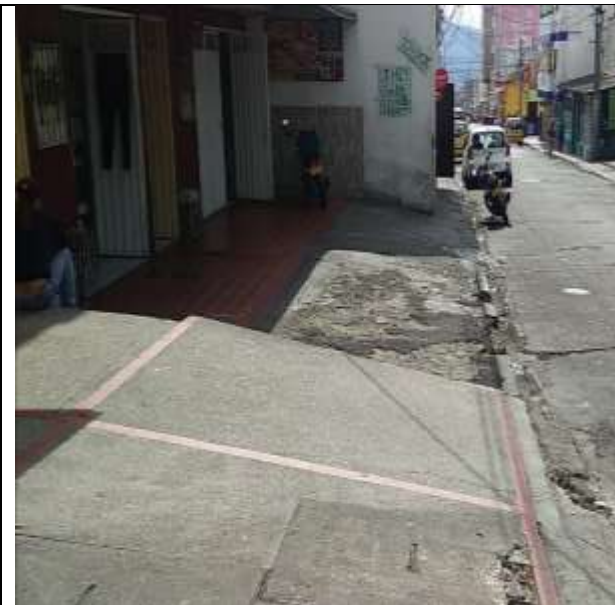

ESTADO INICIAL ESPACIO PUBLICO



ESTADO INICIAL ESPACIO PUBLICO

7. BARRIO MORRORICO



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
275 de 2020	ADECUACION DE ANDENES ESCALERAS Y PASAMANOS VIABILIZADOS POR EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – GRUPO 2	\$ 731.448.543,00	12/02/2021	11/07/2021

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 365.724.286,00	0	N/A	Avance de Obra: 16,40%	EN EJECUCION

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1543326&isFromPublicArea=True&isModal=False>

1. BARRIO MANUELA BELTRAN



ESTADO INICIAL ESPACIO PUBLICO



ESTADO INICIAL ESPACIO PUBLICO

2. CIUDADELA REAL DE MINAS (LOS NARANJOS)



RETIRO ADOQUIN EXISTENTE



EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN

3. PLAZUELA REAL



LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL SECTOR



ESTADO INICIAL ESPACIO PUBLICO

4. GOMEZ NIÑO



DEMOLICION ANDEN EXISTENTE



EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN

5. CIUDAD VENECIA



ESTADO INICIAL ESPACIO PUBLICO



ESTADO INICIAL ESPACIO PUBLICO

6. MANZANARES



EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN



DEMOLICION ANDEN EXISTENTE

7. LA LIBERTAD



Igualmente se encuentra en ejecución el Convenio Interadministrativo No. 9677-PPAL001-1461-2020 con la Unidad de Gestión del riesgo, cuyo objeto es: : AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION EN LOS SECTORES DE CAMPOHERMOSO, DON BOSCO, GAITAN Y SAN GERARDO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO No. 0398 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION ESPECIFICO (PAE).

Valor Convenio: **\$ 47.230.795.743,00**
 Aporte del Municipio **\$ 30.000.000.000,00**

Este convenio que dio inicio el 23 de Diciembre de 2020, durante el primer trimestre de 2021 ha presentado las siguientes actividades:

1. Acta de comité # 1 de fecha 26 de febrero de 2021, en el cual se dio a conocer la supervisión del convenio por parte de la Unidad de gestión del riesgo, la presentación del comité técnico administrativo del convenio, así como el estado de los procesos de contratación.

Por parte de la UNGRD, se informa que actualmente se encuentra en estructuración el proceso de contratación de la obra, informando que se hacía necesario aclarar algunos temas técnicos correspondientes a las coordenadas de los sitios a intervenir y planos de localización de las obras de los cuatro sectores Don Bosco, Campohermoso, Gaitán y San Gerardo.

Compromisos del Acta # 1

COMPROMISOS				
TEMA	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	FIRMA
Ambiental	Iniciar los acercamiento con la Corporación para iniciar los trámites de los permisos ambientales de conformidad con la naturaleza y necesidad del Proyecto.	Municipio de Bucaramanga	N/A	
Predial	Revisar predios donde en cuanto a la propiedad de los inmuebles donde se ejecutará la obra objeto de este convenio y de los contratos derivados.	Municipio de Bucaramanga	N/A	
Contratación	Iniciar la invitación a contratar de la obra, una vez se realicen los ajustes técnicos solicitados al Municipio.	UNGRD	N/A	
Técnico	Reunión en el Municipio y visita conjunta a los sitios donde se ejecutaran los contratos.	Municipio de Bucaramanga - UNGRD	12 de marzo de 2021	
Seguimiento	Presentación del Primer Informe de seguimiento del convenio.	Comité Técnico Administrativo	23 de Marzo de 2021	

2. Acta de comité # 2 de fecha 12 de Marzo de 2021, se realizó el seguimiento a los compromisos adquiridos en la reunión No. 1 celebrada el 26 de febrero de 2021 en el marco del Convenio No. 9677-PPAL001-1461-2020.

- ✓ Solicitud y actualización de los permisos y trámites ambientales de conformidad con la naturaleza y necesidad del proyecto requerido para la ejecución de las obras. **En ejecución.**
- ✓ Revisión de los predios y propiedad de los inmuebles en la zona donde se ejecutará la obra objeto de este convenio y sus contratos derivados. **En ejecución.**
- ✓ Reunión en el Municipio y visita conjunta a los sitios donde se ejecutarán los contratos. **Cumplido**, la reunión se realizó el 12 de marzo del presente año y se realizó la vista de campo en las áreas a intervenir.



Sector SAN GERARDO
Imagen tomada por comisión UNGRD



Sector CAMPOHERMOSO
Imagen tomada por comisión UNGRD



Sector GAITAN
Imagen tomada por comisión UNGRD



Sector DON BOSCO
Imagen tomada por comisión UNGRD



Recorrido a los sectores a intervenir



Reunion de en las instalaciones de la Alcaldía de Bucaramanga

De acuerdo con lo pactado en el convenio y en el acta anterior (Acta No 1 del 26 de febrero de 2021), se realiza seguimiento a los compromisos a cargo de la UNGRD:

a. Adelantar el proceso para la contratación de la obra y la interventoría, necesaria para el cumplimiento del objeto del convenio. Este proceso se llevará a cabo por medio de invitaciones privadas conformes las medidas especiales de contratación que establece el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012. **En Ejecución.** Actualmente cuenta con la viabilidad en aspectos técnicos y jurídicos, se encuentra en el proceso de revisión financiera, fecha aproximada para envío de invitaciones a contratar es el día martes 16 de marzo de 2021.

Actualmente la Secretaria de Infraestructura se encuentra adelantando los siguientes procesos contractuales:

NO. PROCESO	OBJETO	VALOR
SI-LP-003-2021	MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DAMASO ZAPATA FASE I DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. Obra e Interventoría.	\$ 11.035.245.074,00
SI-LP-004-2021	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS Y ESPACIOS PUBLICOS ADYACENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. Obra e Interventoría.	\$ 3.726.948.730,00
SI-LP-005-2021	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. Obra e Interventoría	\$ 17.240.869.934,00
SI-LP-007-2021	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALAN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. Obra e Interventoría	\$ 1.234.550.713,86

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

La Secretaria a la fecha se encuentra adelantado el proceso de contratación No. SI-LP-001-2021 "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER". **Obra e Interventoría** por valor de \$ **20.296.361.142,00**

PROGRAMA: ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL

En este programa se encuentran los contratos con vigencias futuras, adjudicados durante la vigencia 2020 así:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
275 de 2020	AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.180.027.147,00	10/02/2021	09/06/2021

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 590.013.573,50	0	N/A	Avance de Obra: 3%	EN EJECUCION

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1555501&isFromPublicArea=True&isModal=False>





ALCALDIA
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga

**GOBERNAR
ES
GESTIONAR**



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
107 de 2020	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. Grupo 1	\$ 516.105.908,14	11/06/2020	03/05/2021
108 de 2020	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. Grupo 2	\$ 403.133.050,08	11/06/2020	03/05/2021
109 de 2020	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. Grupo 3	\$ 412.472.037,91	11/06/2020	03/05/2021

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
Grupo 1. 0 Grupo 2. 0 Grupo 3. 0	\$ 243.438.184,50 \$ 192.515.115,9 \$ 198.410.941,86	TRES (03) MESES	Avance de Obra: 90,41%	EN EJECUCION

Registro Fotográfico



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga

GOBERNAR
ES HACER



Actualmente la Secretaria de Infraestructura se encuentra adelantando el proceso de contratación No. SI-LP-002-2021

- CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL CORREDOR VIAL TRAMO 7 DESDE LA GLORIETA LA CEMENTO HASTA EL BARRIO COLORADOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA". **Por valor de \$ 1.632.017.983,00**

PROGRAMA: GOBIERNO FORTALECIDO PARA SER Y HACER

En este programa se encuentra todo el recurso humano que requiere la secretaria para el fortalecimiento a la ejecución de los procesos transversales, así como la planificación de las diferentes obras.

GASTOS DE INVERSION	PRIMER TRIMESTRE 2021	
	NUMERO DE CONTRATOS	VALOR
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	127	\$ 4.301.300.000,00
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	32	\$ 437.850.000,00
TOTAL GENERAL	159	\$ 4.739.150.000,00

CONTRATOS VIGENCIA 2019 QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
266 de 2019	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LOS SALONES COMUNALES EN LOS BARRIOS. GRUPO 1 (BUCARAMANGA, EL GAITAN, LA FERIA, SAN MIGUEL Y VILLA DEL PRADO)	\$ 2.041.243.497,09	06/08/2019	13/04/2021

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 683.853.279,00	\$ 193.939.598.84 \$ 44.327.504,35 \$ 36.016.818.97	1.SETENTA Y CINCO (75) DIAS 2. CUARENTA Y CINCO (45) DIAS 3.1 MES Y 22 DIAS 4.TREINTA Y OCHO (38) DIAS	Avance de Obra: 82%	EN EJECUCION

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-9962>

SALON COMUNAL BARRIO BUCARAMANGA



SALON COMUNAL BARRIO SAN MIGUEL



SALON COMUNAL BARRIO GAITAN



SALON COMUNAL BARRIO LA FERIA



SALON COMUNAL BARRIO VILLA DEL PRADO



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
112 de 2019	ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA FUNDACION TEATRO SANTANDER, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS, TECNICOS, FINANCIEROS, Y ADMINISTRATIVOS PARA LA TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DE APOYO TEATRO SANTANDER Y TEATRINO DE LA ESCUALA MUNICIPAL DE ARTES (EMA) EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 4.057.438.420	22/03/2019	30/06/2021

Desembolsos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
1.\$ 2.020.719.210,00 2.\$ 1.217.231.526,00 3.\$ 405.743.842,00 4.\$ 1.546.994.255,41	\$ 1.933.742.819,25	1.UN (01) MES 2. UN (01) MES Y NUEVE (09) DIAS 3. TRES (03) MESES 4. TRES (03) MESES 5. TRES (03) MESES 6. DOCE (12) DIAS 7. CUARENTA (47) DIAS 8. NOVENTA Y CINCO (95) DIAS	Avance de Obra: 87%	SUSPENDIDO

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9194143>



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
241 de 2019	CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL METROPOLITANO DEL RÍO SURATÁ EN EL BARRIO EL CLAVERIANO, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA..	\$ 6.103.224.070,59	16/07/2019	21/04/2021

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 1.830.967.221,30	\$ 59.384.739,09 \$ 275.965.531,09	5 MESES Y 10 DÍAS 1 MES Y 22 DIAS	Avance de Obra: 97,5%	EN EJECUCION

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-201761>

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Pintura acrílica cancha múltiple zona 1.



Instalación adoquín sendero y Mobiliario urbano.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
Instalación de máquinas de gimnasios en la zona verde del sector2.	
	
Instalación de bancas en la zona picnic 1 y 2 de la zona 3.	

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
307 de 2019	CONSTRUCCION DE SENDEROS DE LOS CAMINANTES EN LOS CERROS ORIENTALES DE BUCARAMANGA. - GRUPO 2-Puerta Jardín	\$ 5.605.876.851	16/09/2019	17/04/2021

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 2.242.350.740,40	0	TRES (03) MESES Y SIETE (7) DÍAS SIETE (07) DIAS DIEZ (10) DIAS CUARENTA Y TRES (43) DIAS CUARENTA Y UN (41) DIAS TREINTA (30) DIAS TRES (03) MESES Y 15 DIAS	Avance de Obra: 95%	SUSPENDIDO

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-10760>

FOTOGRAFIAS:



CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 2020-2023

La Secretaría de Infraestructura realiza el seguimiento y monitoreo a las metas programadas para la vigencia 2021, los cuales se detallan a continuación.

LÍNEA ESTRATÉGICA	COMPONENTE	PROGRAMA	TIEMPO PROGRAMADO (en el año)		INDICADORES			
			Fecha Inicial	Fecha Terminación	INDICADOR	META CUATRIENIO	META	LOGRO
2. BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO	BUCARAMANGA UNA ECO-CIUDAD	GOBERNANZA DEL AGUA, NUESTRA AGUA, NUESTRA VIDA	01/01/2021	31/03/2021	Porcentaje de avance en la repotenciación del alcantarillado sanitario y pluvial.	1	45	0
			01/01/2021	31/03/2021	Porcentaje de avance en la realización de los estudios y diseños del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Bucaramanga metropolitana.	100%	20%	0%
3. BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES	CONECTIVIDAD PARA COMPETITIVIDAD Y LA INTERNACIONALIZACIÓN	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA INFRAESTRUCTURA	01/01/2021	31/03/2021	Porcentaje de estudios y/o diseños requeridos realizados para el desarrollo de proyectos de infraestructura.	100%	100%	100%
4. BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA	ESPACIO PÚBLICO VITAL	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES	01/01/2021	31/03/2021	Porcentaje de parques, zonas verdes y su mobiliario mantenidos.	100%	100%	100%
		EQUIPAMIENTO COMUNITARIO	01/01/2021	31/03/2021	Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad construido y/o mejorado.	100.000	40.000	4.273
		INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	01/01/2021	31/03/2021	Número de m2 de malla vial urbana mantenidos o mejorados.	100.000	24.500	0
			01/01/2021	31/03/2021	Número de metros lineales de placa huella construidos en la zona rural.	3.000	1.500	
		ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL	01/01/2021	31/03/2021	Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados.	1	1	0
			01/01/2021	31/03/2021	Porcentaje de luminarias operativas en funcionamiento.	100%	100%	100%
			01/01/2021	31/03/2021	Porcentaje de avance en la implementación de la herramienta que permita integrar la gestión y el control de la infraestructura del alumbrado público mediante las TIC.	100%	100%	0%
			01/01/2021	31/03/2021	Número de puntos de luminarias telegestionadas instaladas para construir una red de alumbrado público inteligente basado en sensorica y dispositivos interconectados para la telegestión.	30.000	11.200	0
			01/01/2021	31/03/2021	Número de sistemas implementados y mantenidos para adquisición, análisis, procesamiento y visualización de información de la red de alumbrado público inteligente e interoperable con otros sistemas.	1	1	0
			01/01/2021	31/03/2021	Porcentaje de avance en la implementación del centro de control y gestión que asegure la interoperabilidad, integración y el análisis de la información proveniente de la red de alumbrado público inteligente y otras.	100%	30%	0%
5. BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MODERNA E INNOVADORA	GOBIERNO FORTALECIDO PARA SER Y HACER	01/01/2021	31/03/2021	Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos.	100%	100%	100%

PQRSD (Atención y seguimiento a las solicitudes)

De acuerdo a la información del Sistema y reporte de la TICS del 01 de Enero a Marzo 31 de 2021 se radicaron 681 Solicitudes de PQRS ante la Secretaria de Infraestructura, se dieron respuesta a 471 y están pendientes de respuesta 210 PQRS.

ANEXO

- PRESUPUESTOS EJECUTADOS (Ejecución presupuestal)
- INFORMES DE INTERVENTORIA (Contratos en ejecución)
- GASTO (Relación personal)
- GASTOS (Relación de Inversión)
- INFORME JURIDICO (Procesos activos y estado actual)
