



ALCALDÍA DE  
BUCARAMANGA  
Municipio de Bucaramanga

**GOBERNAR  
ES HACER**

**INFORME DE GESTION - 01 Abril – 30 Junio de 2021  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**

## INFORME DE GESTION A 30 DE JUNIO DE 2021

En el presente informe se resume los principales avances que la Secretaria de Infraestructura ha generado en el segundo trimestre del año, en el cual ha contrato, ejecutado y realizado las gestiones pertinentes para el control del avance de las diferentes obras que ejecuta la Secretaria.

A continuación, se detalla la gestión que ha realizado la Secretaria de Infraestructura en el segundo trimestre de 2021.

### LINEA ESTRATEGICA 1. BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR

#### PROGRAMA: COBERTURA Y EQUIDAD DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA

La secretaria de infraestructura realizo la contratación del colegio el cual es detallado a continuación:

Contrato No.	objeto	Valor Inicial	Fecha Inicio	Fecha Terminación
104 de 2021	MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DÁMASO ZAPATA FASE I DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 10.161.443.099	28/06/2021	27/01/2022

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 3.048.432.929,70	0	0	Avance de Obra: 1%	EN EJECUCION



**MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DÁMASO ZAPATA FASE I DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**

Contrato No: 104 - 28 mayo 2021  
Plazo: 7 meses  
Valor: \$10.161.443.099  
Contratista: Consorcio Dámaso Zapata  
Interventor: Consorcio Inter Tecnológico CP

En total son \$830.000 millones para mejorar y cuidar las áreas históricas que nos dejó la construcción.  
Conoce todas las obras en: [www.bucaramanga.gov.co](http://www.bucaramanga.gov.co)

**Juan Carlos Cárdenas Ray**  
Alcalde de Bucaramanga



**LINEA ESTRATEGICA 2. BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO**

**PROGRAMA: GOBERNANZA DEL AGUA, NUESTRA AGUA, NUESTRA VIDA**

La Secretaria de Infraestructura realizo convenio interadministrativo No. 223 del 26 de Noviembre de 2020 con el ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA para:

“AUNAR ESFUERZOS, ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BUCARAMANGA AMB S.A.E.S.P, CON EL FIN DE BRINDAR COLABORACION A TRAVES DE ACCIONES O ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO QUE NO COMPROMETIENDO SU ESTRUCTURA EMPRESARIAL, GARANTICE EL ADECUADO SEGUIMIENTO, CONTROL Y CONCRECION DE LOS ESTUDIOS DE LA ETAPA DE PREINVERSION CORRESPONDIENTES A PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA PTAR RIO DE ORO. **Por valor de \$ 2.040.816.327,00**, con corte a 31 de Marzo de 2021, se han llevado varias gestiones las cuales es preciso mencionar:

El día 6 de abril se realizó una reunión en el salón de gobierno presidido por el Secretario de Infraestructura donde se citaron a los principales gremios de la ciudad con el objetivo de informarles el estado de la meta del proyecto estratégico PTAR: Bucaramanga Metropolitana, se realizó un informe de trazabilidad de gestión sobre este proyecto y evidencio los inconvenientes en las cláusulas del convenio marco que imposibilito la firma de este. De igual manera se analizó el convenio interadministrativo 173 firmado entre la CDMB y EMPAS S.A E.S.P se concluyó que se deben realizar estrategias para que toda la institucionalidad del Municipio haga parte activa de este proyecto debido a su importancia regional.

El 13 de abril un equipo multidisciplinario conformado por la secretaria de infraestructura y la subsecretaria de medio ambiente expusieron los principales puntos de contaminación del Rio de Oro, las potenciales causas y consecuencias de este desastre natural, al Director Ejecutivo de Pro Santander, Juan Pablo Remolina, de igual manera se desarrolló una visita de campo a estos lugares donde se evidencia el impacto ambiental.



En la imagen anterior se evidencia el porcentaje de carga de DBO5 y de SST que se deposita al río, encontrando que los mayores vertimientos se realizan por parte de EMPAS S.A E.S.P

A continuación, se anexa registro fotográfico de la visita de campo, en estos tramos del río el ecosistema natural ha desaparecido dando lugar a microorganismos que solo se desarrollan con altos índices de contaminación.



Derivado de la firma del convenio N°223 del 26 de noviembre del 2020 entre el Municipio de Bucaramanga y el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, se desarrollo un comité exclusivo para tratar el tema de la PTAR Rio de Oro, conformado por equipo competente e idoneo de las dos partes, presedido por el Secretario de Infraestructura, en este se han realizado 06 reuniones a fin de cada mes ( enero-junio), se ha evalua las gestiones y estrategias para llevar en buen termino el proyecto PTAR Rio de Oro.

De igual manera en este comité han surgido estrategias paralelas que podrian contribuir a la reduccion de los vertimientos en el Rio de Oro.

La secretaria de infraestructura actualmente realiza gestiones y estrategias con el objeto de reducir de manera significativa este daño ambiental, manifiesta abiertamente su compromiso y decision de encontrar posibles soluciones.

**LÍNEA ESTRATÉGICA 3. BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA:  
EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES**

**PROGRAMA: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA INFRAESTRUCTURA**

La secretaria de infraestructura realizo la contratación de estudios, los cuales se detalla a continuación:

Contrato No.	objeto	Valor Inicial	Fecha Inicio	Fecha Terminación
17 de 2021	ESTUDIOS DE SUELOS, GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 46.277.775,00	16/02/2021	21/04/2021

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
0	Adicional 1. \$ 23.130.522,00	1. VEINTE (20) DIAS	Avance de Obra: 100%	Terminado y liquidado

Ensayos geotécnicos para el diseño de proyectos



Durante el primer trimestre de 2021 la Secretaria dio inicio a la estructuración de un CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER –UIS., por valor de **(\$1.114.130.000,00)** para la ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS de la SOLUCIÓN VIAL SECTOR CALLE 54 - CALLE 56, CONEXIÓN SECTOR ORIENTE - OCCIDENTE, OCCIDENTE – ORIENTE.

Pero en virtud de hacer un solo contrato, se está adelantando una modificación a la estructuración del contrato interadministrativo incluyendo la fase 2 que no se había incluido en la primera etapa, buscando así generar un solo contrato interadministrativo que sea integral para el proyecto y no dejarlo solo con la fase 1, que era lo contemplado en el primer proyecto, dada esta nueva directriz el proyecto se encuentra en fase de ajuste y se espera que en el mes de Julio quede consolidado

**LÍNEA ESTRATÉGICA 4. BUCARAMANGA CIUDAD VITAL:  
LA VIDA ES SAGRADA**

**PROGRAMA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES**

Durante la presente vigencia, la Secretaria de Infraestructura realizo adicional en valor y plazo al contrato del mantenimiento de parques y zonas verdes así:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
13 de 2020	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER, EN LOS SECTORES INDICADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO.	\$ 4.677.196.206,20	13/04/2020	12/06/2021

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
0	\$ 1.434.700.926	1. CUARENTA Y DOS (42) DIAS 2. CUATRO (4) MESES	Avance de Obra: 100%	En proceso de recibo final.

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10450809>

Mediante el presente Contrato Interadministrativo se realiza el mantenimiento, conservación y recuperación de parques y zonas verdes del municipio de Bucaramanga.

El 08 de Abril de 2021 se suscribió el acta de desembolso No 11. De acuerdo al informe de actividades presentado por la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A E.S.P. (Contratista), correspondiente al período comprendido de 13 de Febrero al 12 de Marzo de 2021, según Contrato Interadministrativo No. 013 de 2020.

El 06 de Mayo de 2021 se suscribió el acta de desembolso No 12. De acuerdo al informe de actividades presentado por la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A E.S.P. (Contratista), correspondiente al período comprendido de 13 de Marzo al 12 de Abril de 2021, según Contrato Interadministrativo No. 013 de 2020.

El 04 de Junio de 2021 se suscribió el acta de desembolso No 13. De acuerdo al informe de actividades presentado por la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A E.S.P. (Contratista), correspondiente al período comprendido de 13 de Abril al 12 de Mayo de 2021, según Contrato Interadministrativo No. 013 de 2020.



El 12 de Junio de 2021 termina la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 013 de 2020. Pendiente por suscribir el Acta de desembolso No. 14, recibo final y posterior liquidación.

### **SIEMBRA GRAMA DULCE EN EL TALUD DEL PARQUE LEONES**



### **SIEMBRA DE PRADO JAPONES-RETORNO PUENTE PROVINCIAL LA NOVENA**



**SIEMBRA DE GRAMA DULCE PARQUE BENJAMIN HERRERA**



Igualmente se encuentra en proceso de contratación mediante Licitación Publica No. SI-LP-006-2021, proyecto de “ACTIVIDADES DE PODA PARA EL DESPEJE DE LUMINARIAS Y REDES QUE INTERFIEREN CON EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y TALA DE ÁRBOLES Y MANEJO INTEGRAL DEL COMPONENTE ARBÓREO EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA” por valor de \$ 897.839.422,50

**PROGRAMA: EQUIPAMIENTO COMUNITARIO**

En este programa se encuentran los contratos con vigencias futuras, adjudicados durante la vigencia 2020 así:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
301 de 2020	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE EQUIPAMIENTOS URBANOS VIABILIZADOS MEDIANTE EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.324.998.252	02/02/2021	01/08/2021



Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 662.499.126,00	\$ 120.360.439	Un (01) mes	Avance de Obra: 87%	EN EJECUCION

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1550923&isFromPublicArea=True&isModal=False>



PARQUE PROVENZA



PARQUE LA CEIBA



PARQUE ALMENDROS



PARQUE NACUMAS



PARQUE JARDIN



PARQUE DIAMANTE I





PARQUE TRANSICION

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
300 de 2020	ADECUACION DEL CENTRO VIDA DEL BARRIO ALVAREZ EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 782.986.622,00	08/02/2021	16/07/2021

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 391.493.311	\$ 84.616.121	UN (01) MES	Avance de Obra: 79,11%	EN EJECUCION

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1549595&isFromPublicArea=True&isModal=False>

El proyecto consiste en ejecutar obras de remodelación de la planta física de la edificación donde funciona el Centro Vida del barrio Álvarez, de la ciudad de Bucaramanga, desarrollando principalmente actividades como:

- Mejoramiento de la fachada por medio de la instalación de una lámina micro perforada sistema Aluzinc de Hunter Douglas, que permitirá pasar la luz e impedirá que la temperatura dentro del edificio sea elevada, se implementará la combinación de dos colores diferentes verde y gris que juegue con el dinamismo.
- Pintura de las áreas internas y externas.
- Remodelación en espacios de áreas internas (ampliaciones).
- Adecuación y remodelación del sistema eléctrico
- Remodelación del sistema sanitario



- Adecuación y remodelación
- Mantenimiento e impermeabilización de cubiertas, adecuación de cubiertas y canales en pvc.
- Pulida de piso e instalación de piso en algunos sectores
- Mantenimiento de rampa de acceso y escaleras
- Reubicación de gimnasios
- Recuperación de gimnasios, entre otras; de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas dentro del contrato y planos del proyecto.

A la Fecha, el proyecto se encuentra en Fase final de ejecución en etapa de Acabados de Obra Arquitectónica y Eléctrica con seguimiento riguroso del Cronograma de trabajo, para garantizar el cumplimiento del plazo del Contrato, con la adición N. 1 en plazo y valor suscrita el día 15 de junio de 2021 y que estableció como nueva fecha de terminación el 16 de julio de 2021.

Vista Fachada - Revestimiento Lámina Aluzinc



Vista Fachada de Acceso- revestimiento lámina aluzinc y celosía



Vista Fachada



Fachada vista desde el Parque del Barrio Alvarez



Vista de Interior- Hall Principal



Vista de Interior- circulación principal desde segundo piso



Hall principal: Instalación de luminarias



Adecuación de rampa de acceso,  
por el costado junto al Parque del Barrio Alvarez





Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
271 de 2020	ADECUACION DE ANDENES ESCALERAS Y PASAMANOS VIABILIZADOS POR EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – GRUPO 1”	\$ 966.053.690,00	12/02/2021	11/07/2021

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 483.026.845,00	0	N/A	Avance de Obra: 85,5%	EN EJECUCION

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1543326&isFromPublicArea=True&isModal=False>

**FRENTE: BARRIO CENTRO  
CALLE 31 ENTRE CARRERAS 20 Y 21**






ALCALDÍA DE  
BUCARAMANGA  
Municipio de Bucaramanga

**GOBERNAR  
ES HACER**



**FRENTE: BARRIO MORRORRICO  
CALLE 7 CON CARRERA 41**

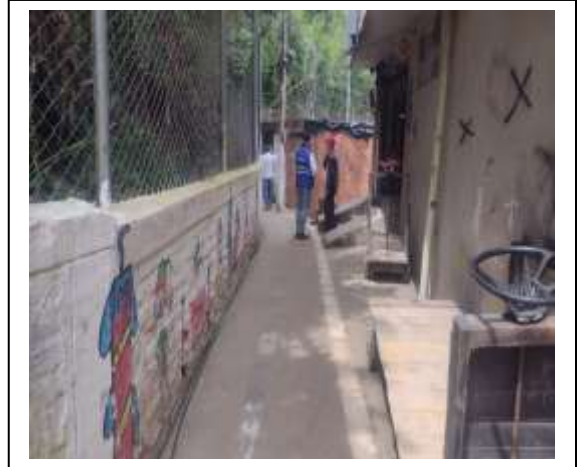





ALCALDÍA DE  
BUCARAMANGA  
Municipio de Bucaramanga

**GOBERNAR  
ES HACER**



**FRENTE: BARRIO LA FLORESTA  
CALLE 7 CON CARRERA 41**



[www.bucaramanga.gov.co](http://www.bucaramanga.gov.co)





**FRENTE: BARRIO GIRARDOT**  
**CALLE 28 ENTRE CARRERAS 4 Y 7**





Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
275 de 2020	ADECUACION DE ANDENES ESCALERAS Y PASAMANOS VIABILIZADOS POR EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – GRUPO 2	\$ 731.448.543,00	12/02/2021	11/07/2021

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 365.724.286,00	0	N/A	Avance de Obra: 89,5%	EN EJECUCION

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1543326&isFromPublicArea=True&isModal=False>

**FRENTE: CIUDADELA REAL DE MINAS SECTOR LOS NARANJOS  
CARRERA 3 ENTRE LA AVENIDA LOS BUCAROS Y LA CALLE 59 COSTADO  
ORIENTAL**






**FRENTE: BARRIO GÓMEZ NIÑO**  
**CALLE 56 ENTRE CARRERAS 14 Y 15 COSTADO SUR**  
**CALLE 56 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 COSTADO NORTE**



**FRENTE: PLAZUELA REAL**

**COSTADO SUR DE LA CALLE 64C ENTRE CARRERAS 3W Y 3BW**

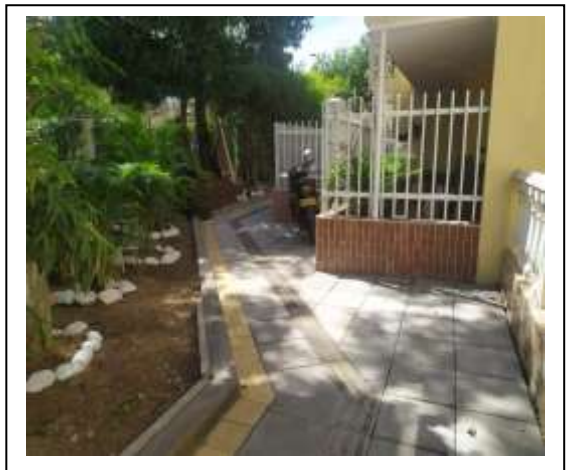



**FRENTE: LA LIBERTAD**

**COSTADO OCCIDENTAL DE LA CARA 31 ENTRE CALLES 102 Y 101**



**FRENTE: CIUDAD VENECIA**

**CALLE 94 CON CARRERA 14ª ESQUINA HASTA LA CALLE 94 CON CARRERA 14**



Igualmente se encuentra en ejecución el Convenio Interadministrativo No. 9677-PPAL001-1461-2020 con la Unidad de Gestión del riesgo, cuyo objeto es: : AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION EN LOS SECTORES DE CAMPOHERMOSO, DON BOSCO, GAITAN Y SAN GERARDO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO No. 0398 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION ESPECIFICO (PAE).



**Valor Convenio: \$ 47.230.795.743,00**  
**Aporte del Municipio \$ 30.000.000.000,00**

Este convenio que dio inicio el 23 de Diciembre de 2020, durante el primer trimestre de 2021 ha presentado las siguientes actividades:

1. Acta de comité # 1 de fecha 26 de febrero de 2021, en el cual se dio a conocer la supervisión del convenio por parte de la Unidad de gestión del riesgo, la presentación del comité técnico administrativo del convenio, así como el estado de los procesos de contratación.

Por parte de la UNGRD, se informa que actualmente se encuentra en estructuración el proceso de contratación de la obra, informando que se hacía necesario aclarar algunos temas técnicos correspondientes a las coordenadas de los sitios a intervenir y planos de localización de las obras de los cuatro sectores Don Bosco, Campohermoso, Gaitán y San Gerardo.

Compromisos del Acta # 1

COMPROMISOS				
TEMA	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE	FIRMA
Ambiental	Iniciar los acercamiento con la Corporación para iniciar los trámites de los permisos ambientales de conformidad con la naturaleza y necesidad del Proyecto.	Municipio de Bucaramanga	N/A	
Predial	Revisar predios donde en cuanto a la propiedad de los inmuebles donde se ejecutará la obra objeto de este convenio y de los contratos derivados.	Municipio de Bucaramanga	N/A	
Contratación	Iniciar la invitación a contratar de la obra, una vez se realicen los ajustes técnicos solicitados al Municipio.	UNGRD	N/A	
Técnico	Reunión en el Municipio y visita conjunta a los sitios donde se ejecutaran los contratos.	Municipio de Bucaramanga - UNGRD	12 de marzo de 2021	
Seguimiento	Presentación del Primer Informe de seguimiento del convenio.	Comité Técnico Administrativo	23 de Marzo de 2021	

2. Acta de comité # 2 de fecha 12 de Marzo de 2021, se realizó el seguimiento a los compromisos adquiridos en la reunión No. 1 celebrada el 26 de febrero de 2021 en el marco del Convenio No. 9677-PPAL001-1461-2020.
  - ✓ Solicitud y actualización de los permisos y trámites ambientales de conformidad con la naturaleza y necesidad del proyecto requerido para la ejecución de las obras. **En ejecución.**
  - ✓ Revisión de los predios y propiedad de los inmuebles en la zona donde se ejecutará la obra objeto de este convenio y sus contratos derivados. **En ejecución.**

- ✓ Reunión en el Municipio y visita conjunta a los sitios donde se ejecutarán los contratos. **Cumplido**, la reunión se realizó el 12 de marzo del presente año y se realizó la vista de campo en las áreas a intervenir.



Sector SAN GERARDO  
Imagen tomada por comisión UNGRD



Sector CAMPOHERMOSO  
Imagen tomada por comisión UNGRD



Sector GAITAN  
Imagen tomada por comisión UNGRD



Sector DON BOSCO  
Imagen tomada por comisión UNGRD



Recorrido a los sectores a intervenir



Reunion de en las instalaciones de la Alcaldía de Bucaramanga

De acuerdo con lo pactado en el convenio y en el acta anterior (Acta No 1 del 26 de febrero de 2021), se realiza seguimiento a los compromisos a cargo de la UNGRD:

a. Adelantar el proceso para la contratación de la obra y la interventoría, necesaria para el cumplimiento del objeto del convenio. Este proceso se llevará a cabo por medio de invitaciones privadas conformes las medidas especiales de contratación que establece el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012. **En Ejecución.** Actualmente cuenta con la viabilidad en aspectos técnicos y jurídicos, se encuentra en el proceso de revisión financiera, fecha aproximada para envío de invitaciones a contratar es el día martes 16 de marzo de 2021.

Que el día 10 de junio el municipio de Bucaramanga mediante S-SdlB1414 de 2021, solicita a la unidad nacional de gestión de riesgo, la fecha de inicio del contrato de obra celebrado con el contratista CONSORCIO MITIGACION BUCARAMANGA 2021 y la fecha de inicio del contrato de interventoría celebrado por el CONSORCIO INTERMITIGACION RIESGO, así como el cronograma de actividades de la obra contratada, que tiene como fin llevar a cabo las Obras de intervención correctiva para mitigar riesgo de deslizamiento y movimientos en masa sectores campo hermoso, don bosco, gaitan y san Gerardo Bucaramanga, Santander.





Actualmente la Secretaria de Infraestructura se encuentra adelantando los siguientes procesos contractuales:

NO. PROCESO	OBJETO	VALOR
SI-LP-004-2021	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS Y ESPACIOS PUBLICOS ADYACENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. <b>Obra e Interventoría.</b>	\$ 3.726.948.730,00
SI-LP-005-2021	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. <b>Obra e Interventoría</b>	\$ 17.240.869.934,00
SI-LP-006-2021	ACTIVIDADES DE PODA PARA EL DESPEJE DE LUMINARIAS Y REDES QUE INTERFIEREN CON EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y TALA DE ÁRBOLES Y MANEJO INTEGRAL DEL COMPONENTE ARBÓREO EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 897.839.420.03
SI-LP-007-2021	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALAN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. <b>Obra e Interventoría</b>	\$ 1.234.550.713,86

#### PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
82 de 2021	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – GRUPO 1.	\$ 5.446.200.902	08/06/2021	07/02/2022

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 1.633.860.270,60	0	N/A	Avance de Obra: 9%	EN EJECUCION

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1776613&isFromPublicArea=True&isModal=False>

### REGISTRO FOTOGRAFICO



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
81 de 2021	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – GRUPO 2.	\$ 6.380.833.557	08/06/2021	07/02/2022

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 1.914.250.067,1	0	N/A	Avance de Obra: 9%	EN EJECUCION

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1776613&isFromPublicArea=True&isModal=False>

### REGISTRO FOTOGRAFICO



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
84 de 2021	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – GRUPO 2.	\$ 5.716.002.371	08/06/2021	07/02/2022

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 1.714.800.711,3	0	N/A	Avance de Obra: 9%	EN EJECUCION

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1776613&isFromPublicArea=True&isModal=False>

### REGISTRO FOTOGRÁFICO



### PROGRAMA: ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL

En este programa se encuentran los contratos con vigencias futuras, adjudicados durante la vigencia 2020 así:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
303 de 2020	AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.180.027.147,00	10/02/2021	09/08/2021



Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 590.013.573,50	\$ 328.453.833,73	DOS (02) MESES	Avance de Obra: 82,5%	EN EJECUCION

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1555501&isFromPublicArea=True&isModal=False>





ALCALDÍA  
BUCARAMANGA  
Municipio de Bucaramanga

**GOBERNAR  
MEJOR**



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
107 de 2020	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. Grupo 1	\$ 516.105.908,14	11/06/2020	03/05/2021
108 de 2020	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. Grupo 2	\$ 403.133.050,08	11/06/2020	03/05/2021
109 de 2020	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. Grupo 3	\$ 412.472.037,91	11/06/2020	03/05/2021

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
Grupo 1. 0 Grupo 2. 0 Grupo 3. 0	\$ 243.438.184,50 \$ 192.515.115,9 \$ 198.410.941,86	TRES (03) MESES	Avance de Obra: 100%	TERMINADO





ALCALDÍA DE  
BUCARAMANGA  
Municipio de Bucaramanga

**GOBERNAR  
HACER**



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
106 de 2021	CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL CORREDOR VIAL TRAMO 7 DESDE LA GLORIETA LA CEMENTO HASTA EL BARRIO COLORADOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 1.583.057.523	15/06/2021	30/12/2021

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 474.917.175.9	0	0	Avance de Obra: 0%	EN EJECUCION

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1841100&isFromPublicArea=True&isModal=False>





ALCALDÍA DE  
BUCARAMANGA  
Municipio de Bucaramanga

**GOBERNAR  
ES HACER**



Actualmente la Secretaria de Infraestructura se encuentra adelantando los siguientes procesos contractuales:

No. PROCESO	OBJETO	VALOR
SI-LP-008-2021	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA OBRA E INTERVENTORIA.	\$ 1.693.018.898,00

SLP-009-2021	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE SAN PIO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. OBRA E INTERVENTORIA	\$ 1.602.487.530
SI-LP-010-2021	MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. OBRA E INTERVENTORIA	\$ 3.064.940.114,00
BOLSA MERCANTIL	DESARROLLAR LA PRIMERA FASE PARA LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PUNTOS DE GESTIÓN INTELIGENTE Y MEDIDAS PARA LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.SUMINISTRO E INTERVENTORIA	\$ 15.512.119.795,56

**LINEA ESTRATEGICA 5. BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN:  
INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES**

**PROGRAMA: GOBIERNO FORTALECIDO PARA SER Y HACER**

En este programa se encuentra todo el recurso humano que requiere la secretaria para el fortalecimiento a la ejecución de los procesos transversales, así como la planificación de las diferentes obras.

GASTOS DE INVERSION	PRIMER TRIMESTRE 2021	
	NUMERO DE CONTRATOS	VALOR
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	127	\$ 4.301.300.000,00
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	32	\$ 437.850.000,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>159</b>	<b>\$ 4.739.150.000,00</b>

GASTOS DE INVERSION	SEGUNDO TRIMESTRE 2021	
	NUMERO DE CONTRATOS	VALOR
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	24	\$ 605.400.000,00
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	06	\$ 55.500.000,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>30</b>	<b>\$ 660.900.000,00</b>

**CONTRATOS VIGENCIA 2019 QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION EN EL  
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021**

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
266 de 2019	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN LOS BARRIOS. GRUPO 1 (BUCARAMANGA, EL GAITAN, LA FERIA, SAN MIGUEL Y VILLA DEL PRADO)	\$ 2.041.243.497,09	06/08/2019	24/07/2021

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 683.853.279,00	\$ 193.939.598.84 \$ 44.327.504,35 \$ 36.016.818.97 \$ 12.229.497,10	1.SETENTA Y CINCO (75) DIAS 2. CUARENTA Y CINCO (45) DIAS 3.1 MES Y 22 DIAS 4.TREINTA Y OCHO (38) DIAS 5.TREINTA (30) DIAS 6.QUINCE (15) DIAS	Avance de Obra: 88,6%	EN EJECUCION

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-9962>

**SALON COMUNAL BARRIO BUCARAMANGA**



**SALON COMUNAL BARRIO SAN MIGUEL**





**SALON COMUNAL BARRIO GAITAN**



**SALON COMUNAL BARRIO LA FERIA**




**SALON COMUNAL BARRIO VILLA DEL PRADO**



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
112 de 2019	ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA FUNDACION TEATRO SANTANDER, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS, TECNICOS, FINANCIEROS, Y ADMINISTRATIVOS PARA LA TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DE APOYO TEATRO SANTANDER Y TEATRINO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES (EMA) EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 4.057.438.420	22/03/2019	30/09/2021

Desembolsos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
1.\$ 2.020.719.210,00 2.\$ 1.217.231.526,00 3.\$ 405.743.842,00 4.\$ 1.546.994.255,41	\$ 1.933.742.819,25 \$ 94.976.390,85	1.UN (01) MES 2. UN (01) MES Y NUEVE (09) DIAS 3. TRES (03) MESES 4. TRES (03) MESES 5. TRES (03) MESES 6. DOCE (12) DIAS 7.CUARENTA (47) DIAS 8. NOVENTA Y SIETE (97) DIAS 9.NOVENTA Y DOS (92) DIAS	Avance de Obra: 87%	EN EJECUCION

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9194143>

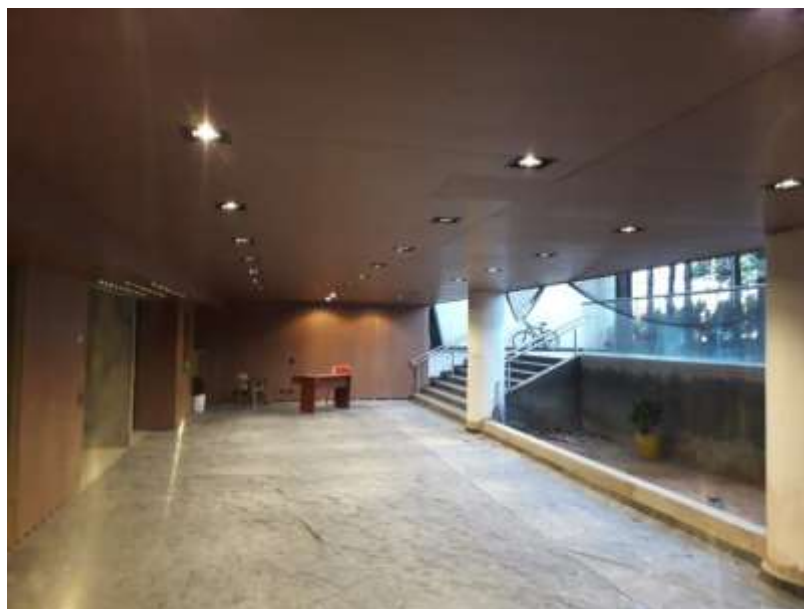

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
241 de 2019	CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL METROPOLITANO DEL RÍO SURATÁ EN EL BARRIO EL CLAVERIANO, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA..	\$ 6.103.224.070,59	16/07/2019	21/04/2021

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 1.830.967.221,30	\$ 59.384.739,09 \$ 275.965.531,09	5 MESES Y 10 DÍAS 1 MES Y 22 DIAS	Avance de Obra: 100%	EN TRAMITE DE LIQUIDACION

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-201761>

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
Siembra arboles e instalación de grama en los contenedores de la plazoleta 3.	

	
Suministro e instalación de bolardos.	



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



Instalación de bancas y mesas en la zona picnic zona 2.

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
307 de 2019	CONSTRUCCION DE SENDEROS DE LOS CAMINANTES EN LOS CERROS ORIENTALES DE BUCARAMANGA. - GRUPO 2-Puerta Jardín	\$ 5.605.876.851	16/09/2019	17//04/2021

Anticipos	Adicionales en Dinero	Adicionales en tiempo	% Ejecución	Estado del Contrato
\$ 2.242.350.740,40	\$ 133.285.804,41	TRES (03) MESES Y SIETE (7) DÍAS SIETE (07) DIAS DIEZ (10) DIAS CUARENTA Y TRES (43) DIAS CUARENTA Y UN (41) DIAS TREINTA (30) DIAS TRES (03) MESES Y 15 DIAS QUINCE (15) DIAS	Avance de Obra: 100%	EN EJECUCION – TRAMITE RECIBO FINAL

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-10760>



Relleno de material Prestamo



Instalación de bolardos



Instalación de señalética.



Instalación de protectores de árboles.



Instalación de protectores de árboles.



Siembra de árboles como compensación ambiental.

## CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 2020-2023

La Secretaría de Infraestructura realiza el seguimiento y monitoreo a las metas programadas para la vigencia 2021, los cuales se detallan a continuación.

### LÍNEA ESTRATÉGICA 1. BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR

#### PROGRAMA: COBERTURA Y EQUIDAD DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA

INDICADOR	META Programada 2021	Meta Ejecutada 2021	AVANCE	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADO
Número de intervenciones realizadas a colegios públicos de Bucaramanga.	1	1	100%	\$ 11.035.245.074	\$ 10.699.323.813

#### PROGRAMA: COBERTURA Y EQUIDAD DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA

INDICADOR	META Programada 2021	Meta Ejecutada 2021	AVANCE	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADO
Número de acciones de restauración, conservación, recuperación, mantenimiento, apropiación, promoción y/o difusión del patrimonio cultural material mueble e inmueble e inmaterial realizados.	1	0	0%	\$ 1.234.550.714	\$ 0

### LÍNEA ESTRATÉGICA 3. BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA: EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES

#### PROGRAMA: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA INFRAESTRUCTURA

INDICADOR	META Programada 2021	Meta Ejecutada 2021	AVANCE	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADO
Porcentaje de estudios y/o diseños requeridos realizados para el desarrollo de proyectos de infraestructura.	100%	100%	100%	\$ 69.408.297	\$ 69.408.297



**PROGRAMA: DESARROLLO DEL CAMPO**

INDICADOR	META Programada 2021	Meta Ejecutada 2021	AVANCE	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADO
Número de acueductos veredales repotenciados.	1	0	0%	\$ 1.279.451.357	\$ 0

INDICADOR	META Programada 2021	Meta Ejecutada 2021	AVANCE	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADO
Construir 50 pozos sépticos para el sector rural.	50	0	0%	\$ 209.501.321	\$ 0

**LÍNEA ESTRATÉGICA 4. BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA**

**PROGRAMA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES**

INDICADOR	META Programada 2021	Meta Ejecutada 2021	AVANCE	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADO
Mantener el 100% de los parques, zonas verdes y su mobiliario.	100%	100%	100%	\$ 1.746.983.198,74	\$ 1.434.700.926

**PROGRAMA: EQUIPAMIENTO COMUNITARIO**

INDICADOR	META Programada 2021	Meta Ejecutada 2021	AVANCE	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADO
Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad construido y/o mejorado.	40.000	4.273	11%	\$ 1.746.983.198,74	\$ 1.434.700.926

INDICADOR	META Programada 2021	Meta Ejecutada 2021	AVANCE	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADO
Número de plaza de mercados a cargo del municipio con acciones de mejoramiento y mantenimiento a la infraestructura.	2	0	0%	\$ 12.197.344.445	\$ 0

**PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**

INDICADOR	META Programada 2021	Meta Ejecutada 2021	AVANCE	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADO
Número de m2 de malla vial urbana mantenidos o mejorados.	24.500	130.000	100%	\$ 20.296.361.142	\$ 19.256.924.334

INDICADOR	META Programada 2021	Meta Ejecutada 2021	AVANCE	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADO
Número de puentes peatonales con mantenimiento realizado.	1	0	0%	\$ 125.329.833	\$ 0

INDICADOR	META Programada 2021	Meta Ejecutada 2021	AVANCE	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADO
Número de metros lineales de placa huella construidos en la zona rural.	1.500	0	0%	\$ 1.339.525.016	\$ 0

**PROGRAMA: ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL**

INDICADOR	META Programada 2021	Meta Ejecutada 2021	AVANCE	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADO
Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados.	1	1	100%	\$ 20.652.495.605	\$ 2.754.782.638

INDICADOR	META Programada 2021	Meta Ejecutada 2021	AVANCE	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADO
Porcentaje de luminarias operativas en funcionamiento.	100%	100%	100%	\$ 25.141.220.809	\$ 8.071.776.699

INDICADOR	META Programada 2021	Meta Ejecutada 2021	AVANCE	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADO
Porcentaje de avance en la implementación de la herramienta que permita integrar la gestión y el control de la infraestructura del alumbrado público mediante las TIC.	50%	0%	0%	\$ 5.510.214.758	\$ 0

INDICADOR	META Programada 2021	Meta Ejecutada 2021	AVANCE	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADO
Número de puntos de luminarias telegestionadas instaladas para construir una red de alumbrado público inteligente basado en sensórica y dispositivos interconectados para la telegestión.	10.000	0	0%	\$ 15.796.911.937	\$ 0
Número de sistemas implementados y mantenidos para adquisición, análisis, procesamiento y visualización de información de la red de alumbrado público inteligente e interoperable con otros sistemas.	1	0	0%	\$ 2.000.0000.000	\$ 0

**LINEA ESTRATEGICA 5. BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN:  
INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES**

**PROGRAMA: GOBIERNO FORTALECIDO PARA SER Y HACER**

INDICADOR	META Programada 2021	Meta Ejecutada 2021	AVANCE	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADO
Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos.	100%	100%	100%	\$ 5.173.811.726	\$ 4.202.683.333

**PQRSD (Atención y seguimiento a las solicitudes)**

De acuerdo a la información del Sistema y reporte de la TICS del 01 de Abril a Junio 30 de 2021 se radicaron 759 Solicitudes de PQRS ante la Secretaria de Infraestructura, se dieron respuesta a 595 y están pendientes de respuesta 164 PQRS.

**ANEXO**

- PRESUPUESTOS EJECUTADOS (Ejecución presupuestal)
- INFORMES DE INTERVENTORIA (Contratos en ejecución)
- GASTO (Relación personal)
- GASTOS (Relación de Inversión)
- INFORME JURIDICO (Procesos activos y estado actual)
