



INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad

El presente informe resume los principales avances que la Secretaria de Infraestructura ha generado en los diferentes programas que conforman el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Gobierno de las Ciudadanas y los Ciudadanos”. Durante la vigencia 2018 ha ejecutado y realizado las gestiones pertinentes para el control del avance de los diferentes proyectos.

A continuación se detalla la gestión que ha realizado la Secretaria de Infraestructura en la vigencia 2018.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: GOBERNANZA DEMOCRÁTICA

1.1 PROGRAMA: PRESUPUESTOS INCLUYENTES

Este programa contempla la ejecución de obras con presupuestos participativos en las diferentes comunas, a la fecha se encuentra estructurada la atención de necesidades con relación a las obras viabilizadas en los grupos de presupuestos participativos vigencias 2016 y 2017, los cuales se encuentran en ejecución, como se relaciona a continuación:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
210 de 2018	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ANDENES, PASAMANOS Y ESCALERAS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER	\$ 1.343.937.014,91	19/09/2018	31/12/2018

Estado: Avance de obra: 23,19% - Actualmente se encuentra suspendido


SECTORES ATENDIDOS Y EN EJECUCIÓN

A. BARRIO SAN CRISTÓBAL: Obras ejecutadas y en ejecución Andenes Sectores:

- ✓ Calle1A entre Carreras 23 y Carrera 23B
- ✓ Carrera 23B entre Calle 1A y 1B
- ✓ Calle 1B con Carrera 12
- ✓ Calle 1AN con Carrera 23
- ✓ Calle 3N y 4N con Carrera 22B
- ✓ Carrera 23 con Calle 4N
- ✓ Carrera23 con Calle 1B y 1C
- ✓ Carrera 23 con Calle 2N
- ✓ Calle 1B con Carrera 22C
- ✓ Calle 1C con carrera 23 B.

B. BARRIO LA JUVENTUD: Obras en ejecución Andenes Sectores:

- ✓ Calle 1N entre Carreras 18B 18C
- ✓ Calle1 entre Carreras 18D
- ✓ Calle1 con Carrera 19B
- ✓ Calle 1 con Carrera 18 D.

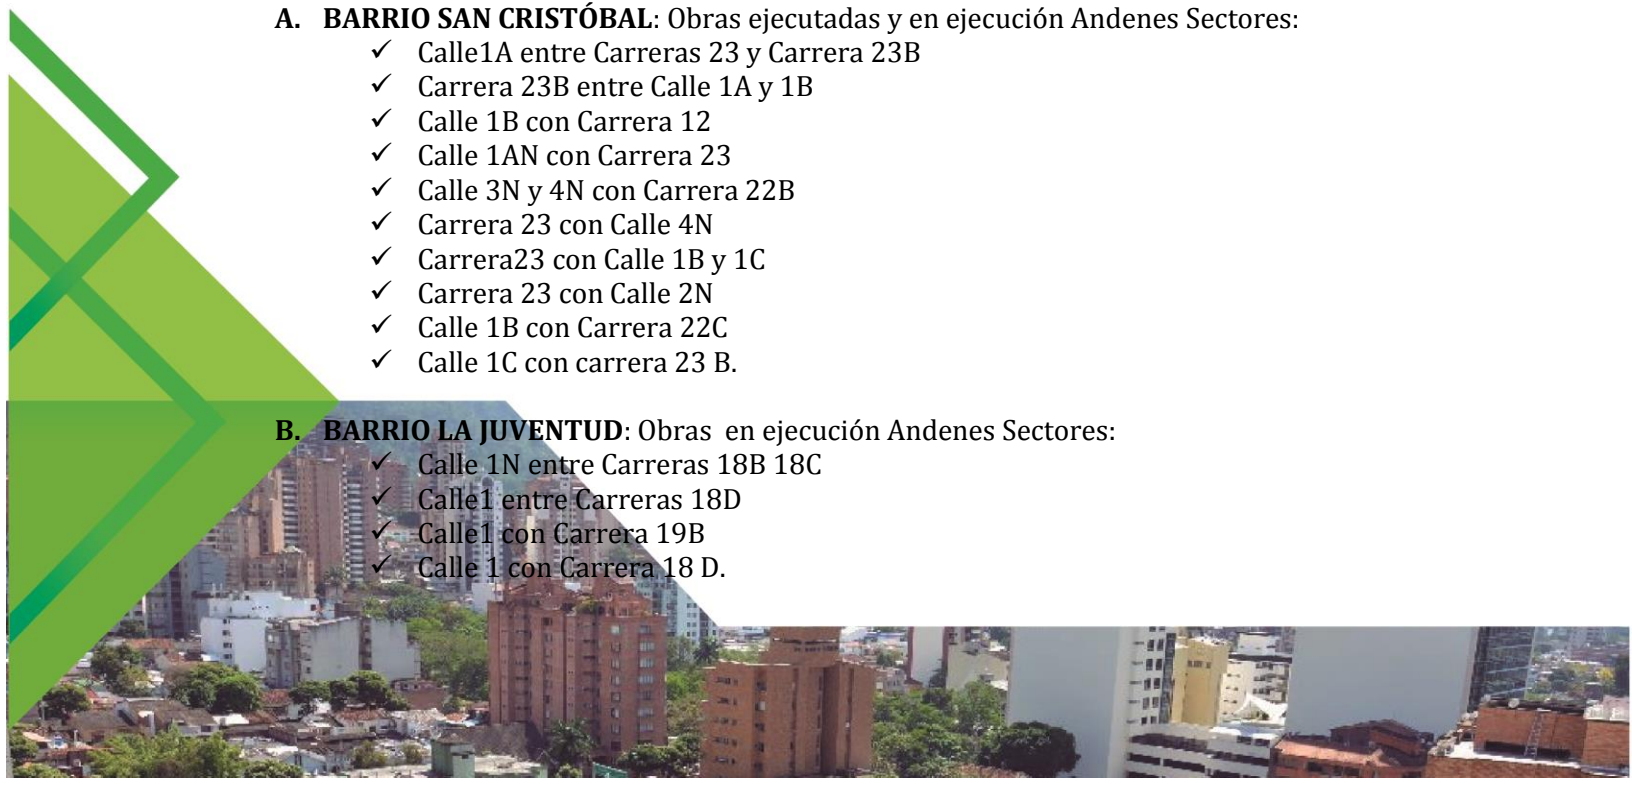

- C. BARRIO BÚCAROS:** Obras ejecutadas y en ejecución Andenes Sectores:
- ✓ Calle 45 con Carrera 8
 - ✓ Calle 45 B.
- D. BARRIO CENTRO (CALLE 31 CON CARRERA 14):** Obras en ejecución Andenes Sectores:
- ✓ Calle 31 entre las Carreras 14 a la Carrera 13
- E. BARRIO TRANSICIÓN:** Obras en ejecución Andenes Sectores:
- ✓ Carrera 17C con Carrera 1ª a Calle 2
- F. BARRIO COAVICONSA:** Obras en ejecución Andenes Sectores:
- ✓ Peatonal Calle 103D con Carrera 13C
 - ✓ Peatonal Calle 103 BIS con Carrera 13D
 - ✓ Carrera 13E entre Calles 103B y 103C
 - ✓ Carrera 103C entre Carreras 13E y 14 costado norte
- G. BARRIO IGSABELLAR:** Obras ejecutadas y en ejecución Andenes Sectores:
- ✓ Calle 103F con Carrera 10
- H. BARRIO ANTONIA SANTOS:** Obras ejecutadas y en ejecución Andenes Sectores:
- ✓ Carreras 25 entre Calles 31 y 32 Frente a Centro Educativo
- I. BARRIO SAUCES:** Obras ejecutadas y en ejecución mantenimiento de pasamanos Sectores:
- ✓ Calle 15, Calle 14 hasta la Calle 14 Interior con Carrera 40
 - ✓ Carrera 40 Km 1 N° 2-46
 - ✓ Carrera 40 Km 1 N° 2-40
 - ✓ Carrera 40 Km 1 N° 14-46
 - ✓ Carrera 40 Km 1 N° 14-60
 - ✓ Carrera 40 Km 1 N° 39-29
- J. BARRIO ÁLVAREZ:** Obras ejecutadas y en ejecución Andenes Sectores:
- ✓ Peatonal Carrera 46a entre las Calles 30 a la 32
 - ✓ Carrera 47 N° 31-06
- K. BARRIO GOMEZ NIÑO:** Obras en ejecución Andenes Sectores:
- ✓ Calle 56 entre Carreras 14 y 15 costado norte
- L. BARRIO PEDREGOSA:** Obras en ejecución Andenes Sectores:
- ✓ Peatonal Carrera 33 entre Calle 90 y 91
- M. BARRIO LAGOS DEL CACIQUE:** Obras en ejecución Andenes Sectores:
- ✓ Carrera 49 con Calle 74ª
- N. SECTOR AFRICA:** Obras ejecutadas y en ejecución mantenimiento de pasamanos Sectores:
- ✓ Peatonal Carrera 10 C con Calle 69
 - ✓ Peatonal Carrera 10 B Con Calle 69



REGISTRO FOTOGRAFICO

SECTOR BUCAROS



SECTOR CENTRO



SECTOR ANTONIA SANTOS



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
159 de 2018	"CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LOS DIFERENTES CORREGIMIENTOS QUE COMPRENDE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"	\$ 1.250.571.151,13	27/08/2018	26/12/2018

Estado: En ejecución, Avance de obra: 100% - En proceso de Liquidación

A continuación los sitios intervenidos en cumplimiento de este contrato:

CORREGIMIENTO No 1 - AVANCE: 100% - 645 ml

1. Vereda la Sabana (sector hubo el paraíso)
2. Vereda Angelinos (sector bosconia)
3. Vereda Angelinos (sector la cemento)
4. Vereda la Esmeralda (Benjamín Flórez)
5. Vereda la Esmeralda (Raimunda Delgado)
6. Vereda San Cayetano (sector curva buenos aires)
7. Vereda Santa Rita (sector curva el cajón)
8. Vereda el Aburrido (sector subida de la quebrada)
9. Vereda San Pedro Alto (sector curva el bambú)



Vereda Angelinos – Sector Bosconia



Vereda Angelinos – Sector La Cemento

CORREGIMIENTO No 2 - AVANCE: 100% - 335 ml

1. Vereda Santos Parte Alta - sector el espino
2. Vereda Capilla Alta (sector finca Iván López)
3. Vereda Magueyes Sector curva el palomar



INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad

4. vereda Bolarquí Alto Sector finca cruz chiquita.
5. Vereda Santa Rita (sector curva el cajón)



Vereda Santos Parte Alta



Vereda Magueyes Sector curva el palomar

CORREGIMIENTO No 3 - AVANCE: 100% - 560 ml

1. Vereda la Malaña (sector hogar santa teresita)
2. Vereda Retiro Chiquito (sector curva la cruz)
3. Vereda Pedregal (sector la pendiente)
4. Vereda Gualilo Alto (sector colmundo radio)
5. Vereda San José sector vía los leones casa no 65
6. Vereda Retiro Grande acueducto km 11 finca rosedal



Vereda Gualilo Alto



Vereda San José

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
256 de 2018	MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS E INSTALACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE Y JUEGOS INFANTILES, VIABILIZADOS POR EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE	\$ 775.839.494,9	02/11/2018	31/12/2018



	BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO II			
--	-------------------------------------	--	--	--

Estado: Avance de obra: 1% - Actualmente se encuentra suspendido

Actualmente se adelantan los trabajos en los siguientes barrios:

BARRIO VILLAROSA

Actividades ejecutadas a la fecha: Localización y replanteo, cerramiento en tela verde, desmontes estructuras deportivas, excavaciones, demolición de muro, demolición frisos.



Antes



Estado Actual

BARRIO

LA CEIBA (Cancha)

Actividades ejecutadas a la fecha: Localización y replanteo, cerramiento en tela verde, desmontes estructuras deportivas, corte y demolición de piso, excavaciones.



Antes



Estado Actual

BARRIO VILLA HELENA

Actividades ejecutadas a la fecha: Localización y replanteo, cerramiento en tela verde.



INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad



Antes



Estado Actual

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
258 de 2018	MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS E INSTALACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE Y JUEGOS INFANTILES, VIABILIZADOS POR EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO I	\$ 865.122.208,42	02/11/2018	31/12/2018

Estado: Avance de obra: 20% - Actualmente se encuentra suspendido

A continuación algunos sitios intervenidos a la fecha.

BARRIO BOSQUES DEL CACIQUE

Actividades ejecutadas a la fecha: Localización y replanteo, desmontes, excavaciones, bordillo de concreto, losa de concreto, friso de muro.



INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad



Antes



Estado Actual

ALTOS DEL CACIQUE

Actividades ejecutadas a la fecha: Localización y replanteo, desmontes, excavaciones, bordillo de concreto, canal de aguas lluvia.



Antes



Estado Actual

BARRIO DIAMANTE I

Actividades ejecutadas a la fecha: Se realizarán las actividades de demolición, excavaciones, viga de cimentación, izado de tubería de cerramiento y mampostería a la vista.



Antes



Estado Actual

BARRIO LA LIBERTAD ESCENARIO DEPORTIVO

Actividades ejecutadas a la fecha: Se han realizado las actividades de demolición de capa asfáltica, excavación para canal y frisos.





Antes

Estado Actual

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
176 de 2018	OBRAS DE PARCHEO DE HUECOS, FALLOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES EN LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.746.373.202	30/08/2018	29/12/2018

Estado: Avance de obra: 46.87 % - Actualmente se encuentra suspendido

En cumplimiento de este contrato se adelanta los presupuestos participativos vigencia 2016 y 2017, además de las obras de malla vial urbana.

A la fecha se encuentran ejecutados los trabajos en los siguientes Barrios:

- ✓ Barrio Pablo VI de la Comuna 8
- ✓ Barrio Puerto Rico de la Comuna 3
- ✓ Barrio Delicias Altas de la Comuna 11
- ✓ Barrio Ciudad Venecia de la Comuna 11

Así mismo se encuentra pendiente por intervenir los siguientes Barrios:

- ✓ Barrio Buena Vista de la Comuna 14
- ✓ Barrio San Rafael de la Comuna 3
- ✓ Barrio San Gerardo de la Comuna 8
- ✓ Barrio Álvarez las Américas de la Comuna 13

✓ **CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO**

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2018	LOGRO 2018
----------	-----------	----------------	-----------	------------



PRESUPUESTOS INCLUYENTES.	Número de comunas con obras comunitarias ejecutadas con presupuesto participativo.	17	17	17
----------------------------------	--	----	----	----

El Cumplimiento a este indicador obedece a los diferentes grupos de presupuestos participativos vigencia 2016 y 2017, que fueron contratados.

2. PROGRAMA: GESTIÓN INTELIGENTE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL

El Municipio adelanto la compra del predio para la reubicación del Centro de Salud Antonia Santos, el cual fue demolido en el año 2015 con ocasión de la ejecución de obras necesarias para la construcción del proyecto denominado “Ampliación del corredor vial primario entre Bucaramanga y Floridablanca en el sector comprendido entre el puente del Barrio Provenza y el intercambiador de tráfico de la Puerta del Sol.

Durante la vigencia 2019, se adelantaran las gestiones pertinentes para la Construcción del Centro de Salud.

✓ CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO


PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2018	LOGRO 2018
GESTIÓN INTELIGENTE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL.	Porcentaje de predios requeridos adquiridos para la ejecución de obras de desarrollo para la ciudad.	100%	100%	100%

El cumplimiento a este indicador, obedece a la compra del predio mencionado anteriormente el cual fue requerido y se adquirió.

1.3 PROGRAMA: UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES

En este programa se encuentran todos los diseños, estudios, consultorías e interventorías para ejecutar los proyectos y las obras del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, los cuales es importante resaltar:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
156 de 2018	ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y GEOLOGICOS PARA LAS DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 220.515.259,00	24/07/2018	08/10/2018

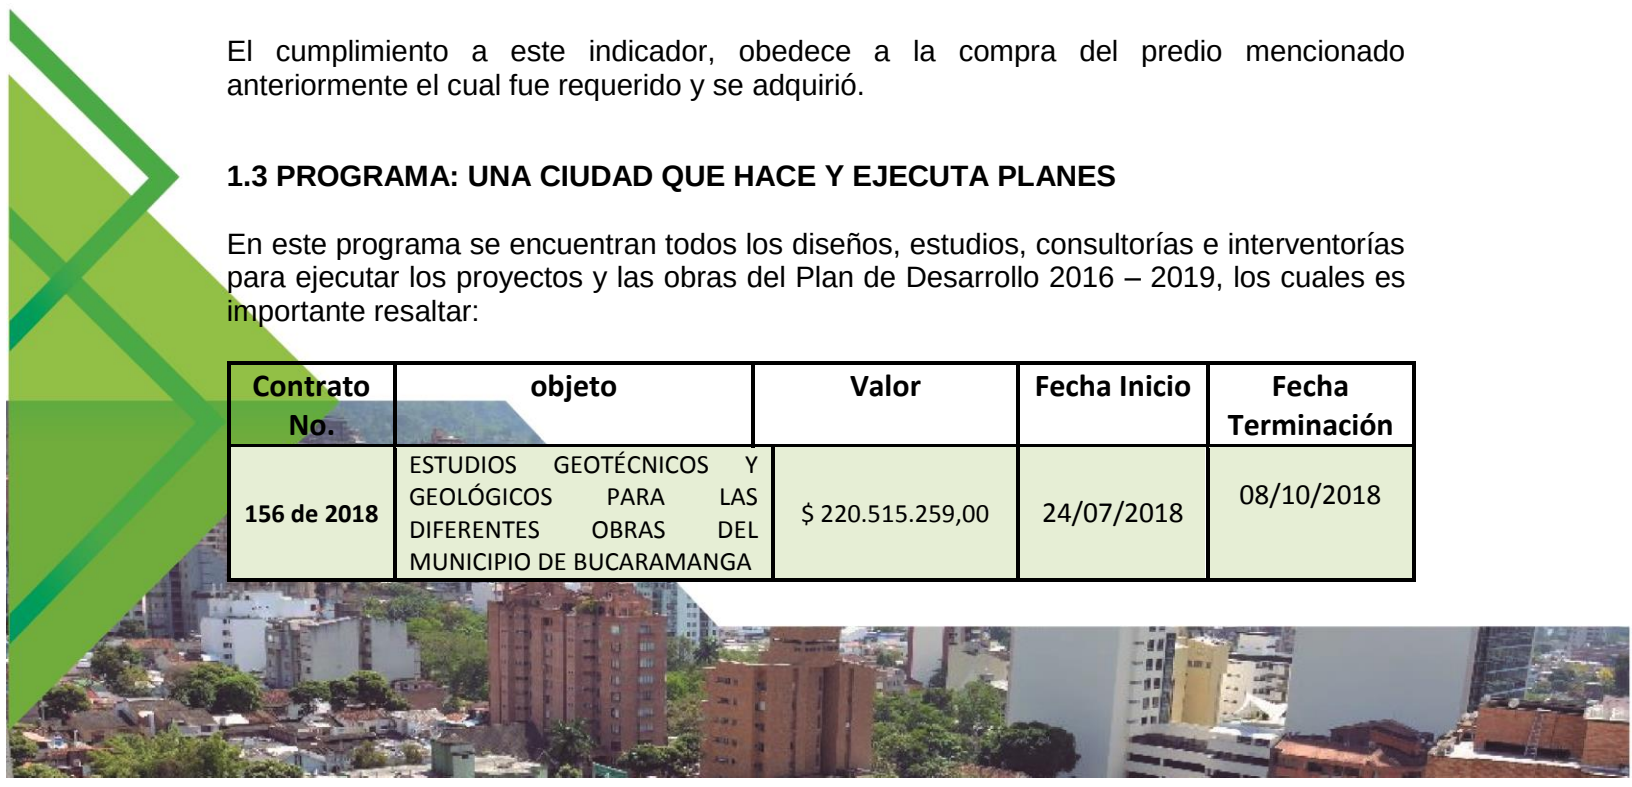

Estado: En Ejecucion, avance de obra: 100% - Liquidado

En cumplimiento de este contrato, se realizaron estudios a 13 sitios, entre los cuales es preciso resaltar:

- Salón Comunal Villa del Prado.
- Salón Comunal Ciudad Bolívar.
- Granjas de Provenza.
- Institución educativa Jorge Gaitán sede B.

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
174 de 2018	CONSULTORÍA PARA DEFINIR LA COTA DE INUNDACIÓN DEL CENTRO ZOONOSIS DE VIJAGUAL EN EL MUNICIPIO DE BUCAR	\$ 15.315.300,00	13/08/2018	12/09/2018

Estado: En Ejecucion, avance de obra: 100% - Liquidado

Se encuentra radicado en la CDMB a la espera de respuesta.

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
186 de 2018	REALIZAR MEDICIONES A LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO EN LOS LUGARES QUE INDIQUE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA UBICADOS EN LAS VÍAS ARTERIALES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 35.916.100,00	21/08/2018	04/09/2018


Estado: En ejecución, avance de obra: 100% - Liquidado

Se realizaron lecturas en una longitud de 113.3 Km-carril, con medidas cada 50 metros.

Igualmente se continúa con la supervisión y control a través de proceso de interventorías de los proyectos que se encuentran en ejecución.

✓ CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2018	LOGRO 2018
UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES	Realizar el 100% de los diseños, estudios, consultorías e interventorías para ejecutar los proyectos y las obras del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 y otros planes de ciudad.	100%	100%	100%

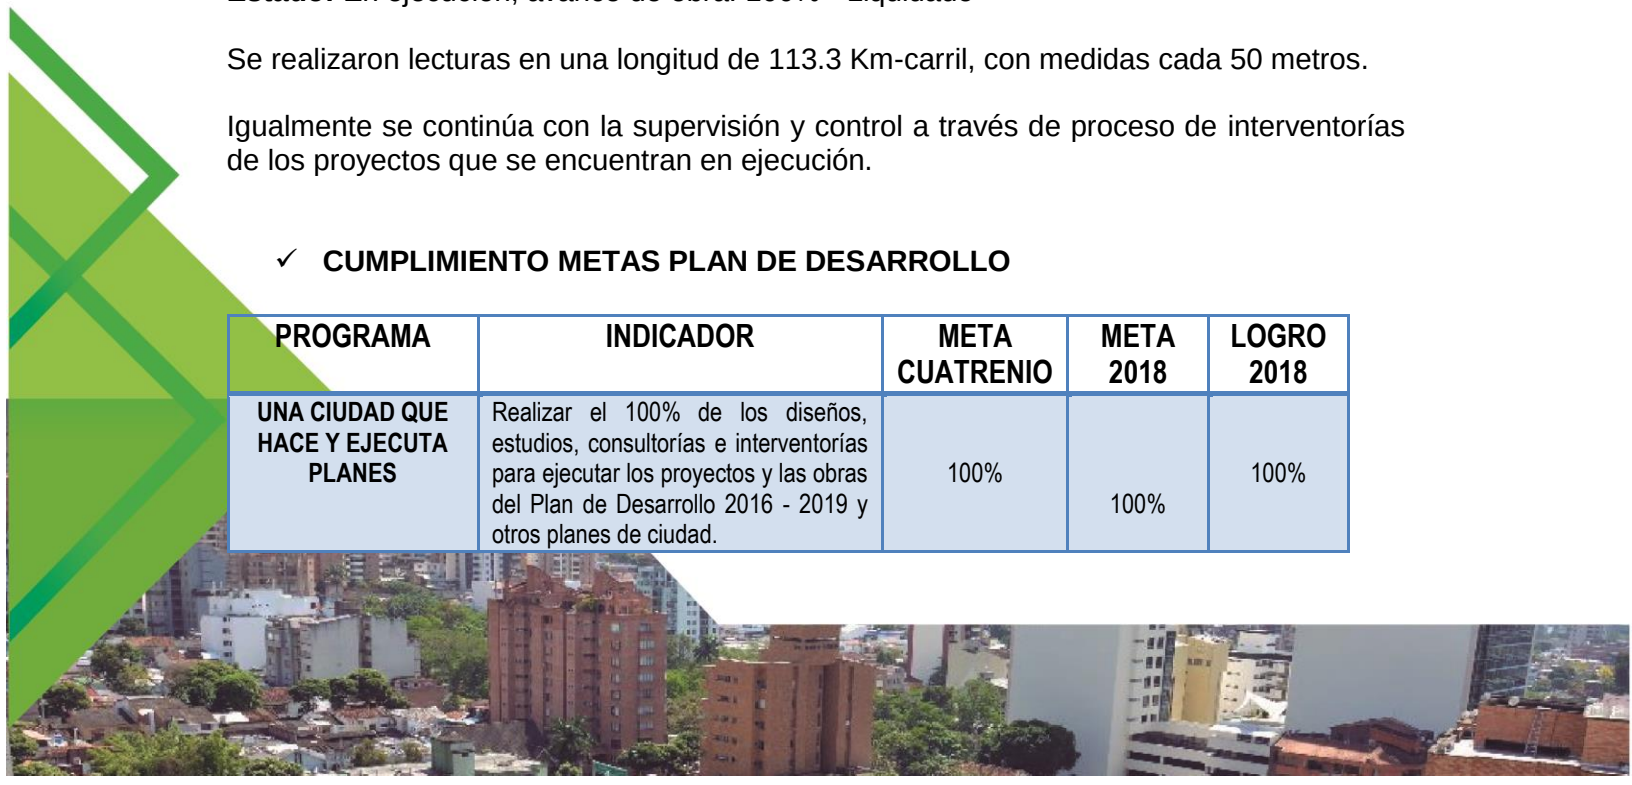

En cuanto a la realización de los diseños, estudios, consultorías e interventorías requeridos, la meta para el cuatrenio es que por cada vigencia se realicen los estudios, diseños, consultorías e interventorías requeridos por cada programa para el correcto funcionamiento de los mismos, por lo tanto esta meta se ha cumplido el 100%.

LINEA ESTRATEGICA 2: INCLUSIÓN SOCIAL

2.1. PROGRAMA: ADULTO MAYOR Y DIGNO

La Secretaria de Infraestructura continúa con la ejecución del contrato relacionado a continuación:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
229 de 2017	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA BARRIO KENNEDY FASE II - MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.024.528.836,64 Adicional \$ 520.033.939,2	01/08/2017	30/07/2018

Estado: Avance de Obra 100% - Recibido Final – en proceso de liquidación.



✓ CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2018	LOGRO 2018
ADULTO MAYOR Y DIGNO	Número de Centros vida adecuados y/o readecuados.	3	1	0

Se tiene proyectado realizar el Mejoramiento Centro Vida Años Maravillosos – Real de Minas, en la próxima vigencia el cual se encuentra en curaduría para aprobación, igualmente se tiene previsto atender el Centro vida Álvarez para dar cumplimiento a este indicador.



LÍNEA ESTRATÉGICA 3: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

3.1. PROGRAMA: SENDEROS PARA LA VIDA

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
330 de 2017	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EN FASE III PARA LA HABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR GRAN BOSQUE DE LOS CERROS ORIENTALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.160.000.000,00	10/11/2017	30/08/2018

Estado: Avance de la consultoria: 100% - en proceso de liquidación.

✓ CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2018	LOGRO 2018
SENDEROS PARA LA VIDA	Número de subsectores del gran bosque de los cerros orientales de escala metropolitana diseñados.	1	0	0

Para la vigencia 2018 no existe meta programada, el cumplimiento a este indicador se realizó con el contrato en mención durante la vigencia 2017.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: CALIDAD DE VIDA

4.1 PROGRAMA: CUIDAR LO QUE ES VALIOSO": RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
118 de 2017	"AUNAR ESFUERZOS, TECNICOS, FINANCIEROS, Y ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INTERES PUBLICO "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PARA TERMINACIÓN DE LA GRAN SALA DEL TEATRO SANTANDER MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER."	\$ 2.500.000.000 Adicional \$ 1.249.000.000	03/05/2017	13/07/2018

Estado: Avance de Obra 85% - Suspendido

La obra presenta un porcentaje de avance aproximado del 85%, representado en las actividades de mecánica teatral, equipos de sonido, cielo raso, aislamiento acústico.





Terminación instalación silletería de la Gran Sala


Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
198 de 2018	AUNAR ESFUERZOS, TECNICOS, FINANCIEROS, Y ADMINISTRATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INTERÉS PÚBLICO Y PROVISIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA GRAN SALA DEL TEATRO SANTANDER – MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.652.000.000	24/08/2018	23/12/2018

Estado: Avance de Obra 51% -Suspendido

La obra presenta un porcentaje de avance aproximado del 51%, representado en las actividades de iluminación técnica, dotación y carpintería.

✓ CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2018	LOGRO 2018
CUIDAR LO QUE ES VALIOSO": RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO	Número de acciones de fortalecimiento para el Teatro Santander.	1	0	1



Para la actual vigencia no existe meta programada, sin embargo se adelantó el convenio antes mencionado con el fin de poner en marcha la gran sala del teatro.

4.2 PROGRAMA: OBSERVAR Y SER OBSERVADO: FOMENTO AL TURISMO

El gran salon se encuentra con un porcentaje de avance del 100% y al servicio de la Comunidad. La construccion para la unificacion de las dos fachadas mediante una columnata, así como la contruccion de un puente que une los edificios en su costado occidental y la integración de los parqueaderos y las oficinas de la estrucura existente con las oficinas de prensa, se encuentra con un avance del 85% y se espera poder terminar para el mes de enero de 2019. Cabe resaltar que el gran salon se encuentra en servicio de la comunidad y los 4 salones de la estructura existente.



✓ CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO


PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2018	LOGRO 2018
OBSERVAR Y SER OBSERVADO: FOMENTO AL TURISMO	Número de espacios garantizados del centro de convenciones de Bucaramanga como eje central del desarrollo del turismo de reuniones en el municipio.	1	0	1
OBSERVAR Y SER OBSERVADO: FOMENTO AL TURISMO	Número de centros de convenciones - NEOMUNDO terminados.	1	0	0

Con respecto a la terminacion del centro de convenciones, este indicador presenta un cumplimiento del 0.5 de la vigencia 2016, el reporte total se hará una vez el Centro de Convenciones sea terminado, el cual se tiene proyectado entregar en la vigencia 2019.

4.3 PROGRAMA: INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO

✓ Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes

La administración Municipal a través de la Secretaria de Infraestructura se encuentra ejecutando los siguientes contratos:



INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
7 de 2018	MANTENIMIENTO DE PARQUES, ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 4.241.198.080,00	30/01/2018	29/12/2018

Estado: Avance de Obra: 100% - En proceso de Liquidación

Instalado de Prado:

Durante el Cuarto Trimestre se realizó siembra de prado en los siguientes sitios:

TOTAL INSTALADO DESDE EL 01 DE OCTUBRE HASTA EL 30 DE OCTUBRE 2018 = 6.600M2

ITEM	DESCRIPCION	AREA METROS CUADRADOS
1	PARQUE LA PAZ MUTIS	140
2	PARQUE VIADUCTO PROVINCIAL MUTIS	3514
3	PARQUE DIAMANTE 2	538
4	SEPARADOR CALLE 56	564
5	PARQUE SOLON WILCHES	787
6	SEPARADOR CALLE 36 DE CR 27 A CR 33	330
7	PARQUE LA INMACULADA	230
8	PARQUE SAN LUIS	497

TOTAL INSTALADO DESDE EL 01 DE NOVIEMBRE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2018 = 4.428 M2

ITEI	DESCRIPCION	AREA METROS CUADRADOS
1	GLORIETA CR 9	490
2	PARQUE VIADUCTO PROVINCIAL MUTIS	15
3	PARQUE DIAMANTE 2	1726
4	SEPARADOR CR 15 DESDE AV ROSITA A PUERTA SOL (1.46 metro cuadrado por alcorque)	107
5	ZONA VERDE SAN MIGUEL	941
6	SEPARADOR CALLE 56 DE CR 27 A CR 33	21
7	PARQUE LA PETACA	395



INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad

8	PARQUE EL ROCÍO	223
9	HOSPITAL CALLE 32	482
10	PARQUE PARROQUIA NIÑO JESUS CIUDAD BOLIVAR	28.8

Instalación de Prado Mes DICIEMBRE:

**TOTAL INSTALADO DESDE EL 01 DE DICIEMBRE HASTA EL 29 DE DICIEMBRE 2018
= 4.500 M2**

ITEM	DESCRIPCION	AREA METROS CUADRADOS
1	GLORIETA CR 9	397
2	PARQUE MANZANARES (B. MUTIS)	431
3	PARQUE ESTORAQUES	1.251
4	PARQUE DE LAS TRES B	2.187
5	PARQUE ALVAREZ	91
6	PARQUE LOS LEONES	143

SIEMBRA DE PRADO JAPONES PARQUE PARROQUIA NIÑO JESUS CIUDAD BOLIVAR



SIEMBRA DE PRADO JAPONES PARQUE LA PETACA



INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad

SIEMBRA DE PRADO JAPONÉS GLORIETA CARRERA 9



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
09 DE 2018	MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y ZONAS VERDES CONSISTENTE EN LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO EN LOS PARQUES INDICADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 251.100.819,00	01/02/2018	30/09/2018

Estado: Avance de Obra: 100% - En proceso de liquidación

El avance de obra es del 100% puesto que se instalaron los puntos de agua de los 50 parques propuestos.

Parques que se les realizó instalación de sistema de riego Durante el Cuarto Trimestre de 2018:

- ❖ Zona verde calle 117 con carrera 22A – Provenza
- ❖ Parque cristal bajo
- ❖ Parque la Ceiba

Zona Verde Calle 117 con Carrera 22ª Provenza



Parque Cristal Bajo



✓ METAS PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2018	LOGRO 2018
INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO	Porcentaje de parques con mantenimiento anual realizado.	100%	100%	100%

El cumplimiento de este indicador obedece a los contratos anteriormente mencionados.

• Equipamientos Comunitarios (Sociales, deportivos, Culturales entre otros).

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
218 DE 2018	CONSTRUCCION DEL PARQUE LA CEIBA EN LA COMUNA 13 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 3.185.372.854,8	24/09/2018	21/12/2018

Estado: Avance de obra: 41% - SUSPENDIDO



INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
216 DE 2018	CONSTRUCCION DEL PARQUE GRANJAS DE PROVENZA EN LA COMUNA 10 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.221.897.961,11	24/09/2018	21/12/2018

Estado: Avance de obra: 49% - Suspendido




Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
138 DE 2018	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA GRUPO 1"	\$ 851.084.220,48	01/08/2018	30/11/2018

Estado: Avance de obra: 93% -Suspendido

El contrato incluye los siguientes escenarios deportivos:

- Cancha múltiple en concreto Barrio Brisas del Mutis (Comuna 17)
- Cancha de Microfútbol y Baloncesto Barrio Monteredondo (Comuna 17)
- Cancha Múltiple en concreto Barrio Altos del Progreso (Comuna 1)
- Cancha múltiple en concreto Barrio Kennedy (Comuna 1)
- Canchas de microfútbol en tierra Campo Madrid (Comuna 1)



INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad



Cancha Múltiple Brisas del Mutis



Cerramiento Sur Cancha de Futbol



CANCHA MULTIPLE MONTEREDONDO



CANCHA DE BALONCESTO MONTEREDONDO



Cancha Múltiple altos del Progreso



Cancha Múltiple de Kennedy



INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad



CANCHA SINTETICA CAMPO MADRID




CANCHA MULTIPLE CAMPO MADRID

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
136 DE 2018	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA GRUPO II"	\$ 912.840.262,83	01/08/2018	30/12/2018

Estado: Avance de obra: 90% -Suspendido

El contrato incluye los siguientes escenarios deportivos:

- Cancha múltiple en concreto Barrio Hacienda San Juan (Comuna 16)
- Canchas de Fútbol en tierra Barrio Santander (Comuna 4)
- Canchas de Microfútbol y Baloncesto Parque de los Niños (Comuna 13)
- Cancha de Microfútbol en asfalto Barrio Álvarez (Comuna 13)
- Cancha múltiple y de mini baloncesto en concreto Parque Los Leones (Comuna 13)
- Cancha múltiple en concreto Barrio La Floresta (Comuna 12)
- Cancha múltiple en concreto Barrio San Gerardo (Comuna 8)
- Cancha de Mini fútbol en tierra Barrio Candiles (Comuna 6)
- Cancha de Baloncesto en concreto Barrio Canelos (Comuna



INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad



CANCHA MULTIPLE HACIENDA SAN JUAN



CANCHA DE FUTBOL SANTANDER



CANCHA MICROFUTBOL-VOLIBOL ALVAREZ



CANCHA MULTIPLE PARQUE LOS LEONES



CANCHA MULTIPLE LA FLORESTA



CANCHA MULTIPLE SAN GERARDO



INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad



CANCHA DE MINIFUTBOL EN TIERRA CANDILES



CANCHA DE BALONCESTO CANELOS

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
178 DE 2018	MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS CANCHAS DE TENIS DEL PARQUE DE LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.359.817.188,38	13/08/2018	31/12/2018

Estado: Avance de obra: 55% - Suspendido

AVANCE DEL PROYECTO:

El contrato alcanza un avance del **55%**, en el cual se ha dado terminación a la estructura de la edificación de dos pisos. Así mismo se construyó el sistema de filtros en la cancha del costado oriental y se adelantó el cerramiento perimetral sobre la cancha del mismo costado.



CERRAMIENTO ORIENTAL-ESTRUCTURA EDIFICIO



ESTRUCTURA DE PISO CON FILTROS CANCHA ORIENTAL



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
192 DE 2018	MEREMODELACION DE CANCHAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO I	\$ 3.773.166.237,58	03/09/2018	31/12/2018

Estado: Avance de Obra de: 16.5% - Suspendido

Canchas a intervenir: La Concordia, Pan de Azúcar, Tejar Norte y Coaviconsá.

Se realizaron las actividades de localización y replanteo, demolición sardinel en concreto, desmonte arcos metálicos, desmonte baranda metálicas, desmonte módulos de cerramiento en ángulo y malla, desmonte postes metálicos alumbrado, excavaciones manuales, excavaciones con máquina, suministro e instalación tubería PVC, excavación para canaleta de desagüe, limpieza de canales, desmonte aparatos eléctricos, retiro de infraestructura existente, figurada acero de refuerzo y excavación para muros de contención.



Coaviconsá



Tejar Norte

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
191 DE 2018	REMODELACION DE CANCHAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO II	\$ 4.073.930.183,1	03/09/2018	31/12/2018

Estado: en Ejecución, Avance de Obra de: 57.93% - Suspendido

Canchas a intervenir: Alfonso López, Esperanza II, Nápoles, y Dangond.

Se realizaron las actividades de localización y replanteo, demolición sardinel en concreto, desmonte arcos metálicos, desmonte baranda metálicas, desmonte módulos de cerramiento en ángulo y malla, desmonte postes metálicos alumbrado, excavaciones



INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad

manuales, excavaciones con máquina, suministro e instalación tubería PVC, construcción de cajas en mampostería, demolición de canaletas en concreto, desmonte aparatos eléctricos, retiro de infraestructura existente, limpieza canaletas, demolición disipador, excavación en roca, figurada acero de refuerzo y fundida de solado en concreto.



ESPERANZA II



NÁPOLES

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
284 DE 2018	ADECUACION DE LA PLAZOLETA DE LOS EDECANES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 1.223.767.860,23	04/12/2018	31/12/2018

Estado: Avance de Obra de: 0% - Suspendido

Se planteó suspensión del contrato por solicitud de la Gobernación de Santander porque están desarrollando el cambio de la cubierta de la Casa de Bolívar y requerían del espacio de la Plaza de Edecanes para utilizarla mientras terminan su contrato. El contrato 284 de 2018, se reanudará el 14 de enero de 2019.



Patio de Edecanes, utilizada como depósito de materiales por Contratista de la Gobernación.



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
274 DE 2018	ADECUACION DEL PARQUE ECOLOGICO LA FLORA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.546.957.564,76	19/11/2018	31/12/2018

Estado: Avance de Obra de: 30% - Suspendido



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
263 DE 2018	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS PUNTOS VIVE DIGITAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	\$ 134.148.150,90	06/11/2018	31/12/2018

Estado: Avance de Obra de: 90% - Suspendido

A continuación algunos sitios intervenidos en cumplimiento de este contrato.

1. P.V.D. COLEGIO INEM



INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad

2. P.V.D. NACIONAL DE COMERCIO



3. P.V.D. MORRORICO



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
292 DE 2018	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO ADYACENTE A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	\$ 145.885.800,00	21/11/2018	31/12/2018

Estado: Avance de Obra de: 100% - En proceso de liquidación



INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad



VISTA CARRERA 19 CON CALLE 65



VISTA CALLE 65 ENTRE CARRERAS 18 Y 19

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
304 DE 2018	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEL COLEGIO INEM CUSTODIO GARCIA ROVIRA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.738.806.431,2	03/12/2018	31/12/2018

Estado: Avance de Obra de: 25% - Suspendido

AVANCE DEL PROYECTO:

El contrato alcanza un avance del **25%**, representado en las demoliciones, movimiento de tierra para el acondicionamiento del piso de la cancha, construcción de filtros y muros de contención, e inicio de construcción de graderías.



ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO –
CONSTRUCCION DE FILTROS



INICIO CONSTRUCCION DE GRADERIAS

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
315 DE 2018	"MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS EN DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE	\$ 137.641.322,51	19/12/2018	31/12/2018



	BUCARAMANGA, SANTANDER"			
--	----------------------------	--	--	--

Estado: Avance de Obra de: 5% - Suspendido

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
349 DE 2018	INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.398.424.293,54	Por iniciar	Por iniciar

Estado: Avance: 0% - no se pudo iniciar porque la interventoría se declaró desierta.

✓ CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2018	LOGRO 2018
INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO	Número de equipamientos comunitarios (sociales, deportivos y culturales: canchas sintéticas, multicentros deportivos, salones comunales, entre otros) intervenidos y/o construidos.	100	30	66

El cumplimiento a este indicador obedece a los contratos antes mencionados.

• Mantenimiento a Plazas de Mercado


Se continua con la ejecucion del contrato relacionado a continuacion:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
359 de 2017	REPOSICIÓN DE LA CUBIERTA DEL MODULO NORTE DE LA PLAZA GUARÍN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 585.620.639,85	23/11/2017	15/12/2018

Estado: En ejecución, avance de Obra 82% - Suspendido

En este momento el contrato se encuentra suspendido y se reanudara a mediados del mes de enero, para terminar en la segunda semana del febrero.

El contratista ya realizó el cambio total de la cubierta, correspondiente al contrato, y en el mes de enero se inicia el cambio de los elementos de fachada, del costado norte de la Plaza Guarín.

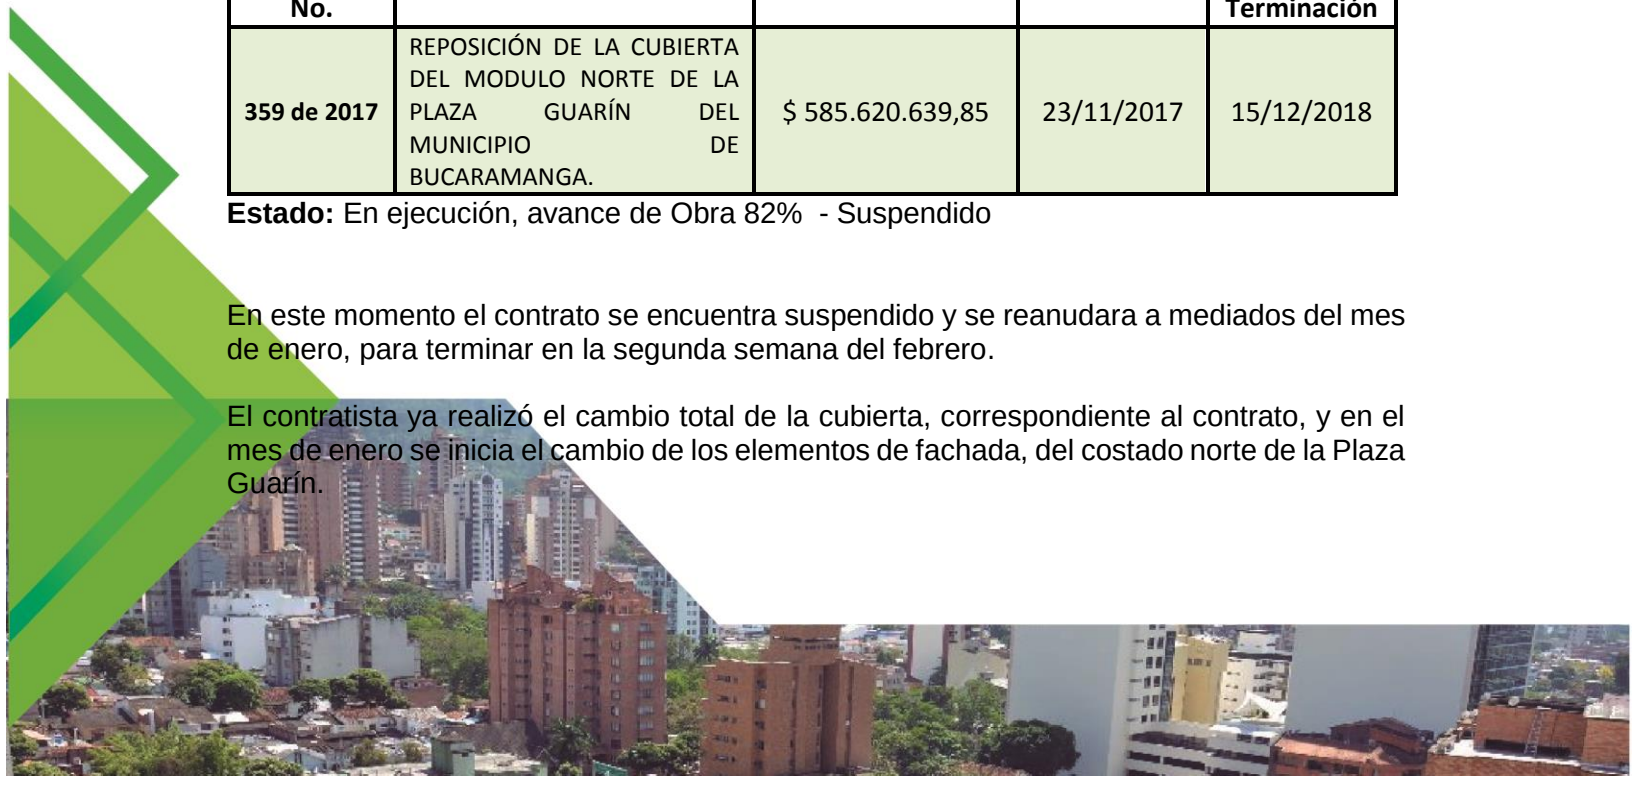

INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad



CUBIERTA COSTADO NORTE DE LA PLAZA GUARÍN,
EXTERNA



CUBIERTA COSTADO NORTE DE LA PLAZA GUARÍN

✓ CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2018	LOGRO 2018
INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO	Número de adecuaciones y/o mantenimientos realizados a las plazas de mercado a cargo del municipio.	4	1	0

Se espera terminar con la intervención a la plaza de mercado Guarín y realizar las gestiones para lograr dar cumplimiento a este indicador.

• Andenes Construidos

Se continua con la ejecucion del contrato relacionado a continuacion:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
182 de 2018	MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DE CONFORMIDAD CON LAS SENTENCIAS DE ACCIONES CONSTITUCIONALES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$329.808.266,00	19/09/2018	18/12/2018

Estado: Avance de Obra: 77, 27% - Suspendido

A continuación algunos sitios intervenidos en cumplimiento de este contrato:



INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad

Fallo judicial No 2010-0003, consistente en: Recuperación del espacio público en la Edificio Terralta de la carrera 20 # 51 A - 25 del Barrio la Concordia



Fallo judicial No 2010-0236, consistente en: Recuperación del espacio público en la carrera 16 # 67- 37/39 del Barrio La Victoria.



Fallo judicial No 2008-0303, consistente en: Recuperación del espacio público en la carrera 45 # 56 - 43 del Barrio Terrazas.



✓ CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO



PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2018	LOGRO 2018
INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO	Número de M2 de andenes construidos.	30.000	10.400	19.356

El cumplimiento a este indicador obedece al contrato de andenes y pasamanos, fallos judiciales y las intervenciones en los diferentes escenarios deportivos.

LÍNEA ESTRATÉGICA 6: INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD

6.1. PROGRAMA: PROMOCIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
281 de 2017	CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR CICLISTA UIS-PARQUE DE LOS NIÑOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.171.015.163,58 Adicional \$ 433.232.617,99	12/10/2017	11/05/2018

Estado: Avance de obra 100% - Liquidado.

✓ CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2018	LOGRO 2018
PROMOCIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS	Número de kms de ciclorutas para transporte urbano implementados.	20	7	0

Para dar cumplimiento a este indicador, se encuentra en ejecución el Convenio de Cooperación Internacional No. 341 de 2017 "Diseño definitivo de 20 Kilómetros de Cicloruta", una vez se han entregados los diseños se podrá realizar la contratación y dar cumplimiento a este indicador.

6.2. PROGRAMA: MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA

• Mantenimiento Malla Vial Urbana

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
176 de 2018	OBRAS DE PARCHEO DE HUECOS, FALLOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES EN	\$ 2.746.373.202,00	30/08/2018	29/12/2018



	LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			
--	---	--	--	--

Estado: Avance de Obra: 46.87% - Suspendido

SECTORES ATENDIDOS Y EN EJECUCIÓN

BARRIO CIUDAD VENECIA SECTOR CALLE 93 ENTRE CRA 14 Y 13B Y CRA 14 ENTRE CALLES 95 Y 96: Obras ejecutadas:

- Reposición de Losas en concreto en sectores deteriorados.
- Adecuación de urbanismo mediante la construcción de andenes y sardineles, en sectores deteriorados.

BARRIO PABLO VI: Obras ejecutadas:

- Se efectúan trabajos de demolición de carpeta asfáltica existente, instalación de Mezcla Densa Caliente MDC-19 para parcheo, en los diferentes sectores aprobados.
- Construcción de muro de contención en calle 68 con 10ª, para la estabilización de la banca

BARRIO DELICIAS ALTAS CALLE 104ª ENTRE CARRERAS 15 Y 16: Obras ejecutadas:

- Obras de reposición de tubería de Alcantarillado sanitario existente D= 10" y D= 6"
- Reposición de Losas en concreto en sectores deteriorados

BARRIO SAN PEDRO CALLE 73 ENTRE CRA 28ª Y 29ª Y CARRERA 29 ENTRE CALLES 72 Y 73: Obras ejecutadas:

- Obras de reposición de tuberías de Alcantarillado existente D= 10" y D= 8"
- Construcción de Pavimento en Concreto Hidráulico

BARRIO PUERTO RICO VÍA VEHICULAR DE ACCESO AL BARRIO PUERTO RICO DIAGONAL 32C CON 9: Obras ejecutadas:


- Obras de reposición de tuberías de Alcantarillado existente D= 10" y D= 8"
- Construcción de Pavimento en Concreto Hidráulico

PARCHEO EN PUNTOS CRÍTICOS EN LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA: Se realizan obras de parcheo y/o bacheo para Recuperación de Pavimento Asfáltico en los sectores:

- Carrera 27 sector Puerta del Sol, hasta la avenida Rosita.
- BARRIO CABECERA: Carrera 36 entre Calles 50 y 44, Carrera 37 entre calles 52 y 53, Carrera 33 entre calles 55 y 56, Carrera 35 entre calles 45 y 52., Calle 51 entre Carrera 39 y 38, sectores Carrera 38 con Calle 49, Calle 51 entre Carreras 38 y 39, y Plaza Guarín Carrera 33
- BARRIO CENTRO: Carrera 14 entre calles 36 y 37
- BARRIO LA CONDORDIA: Carrera 18 entre Avenida la Rosita y calle 51.
- VÍA ANTIGUA A FLORIDABLANCA, PARTIENDO DEL CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTA DEL SOL 45.
- Carrera 27ª entre Calles 45 y 45BIS

CARRERA 16 ENTRE CALLES 45 Y DIAGONAL 15: Obras ejecutadas:

- Adecuación de espacio público, mediante la instalación de losetas y sardinel.

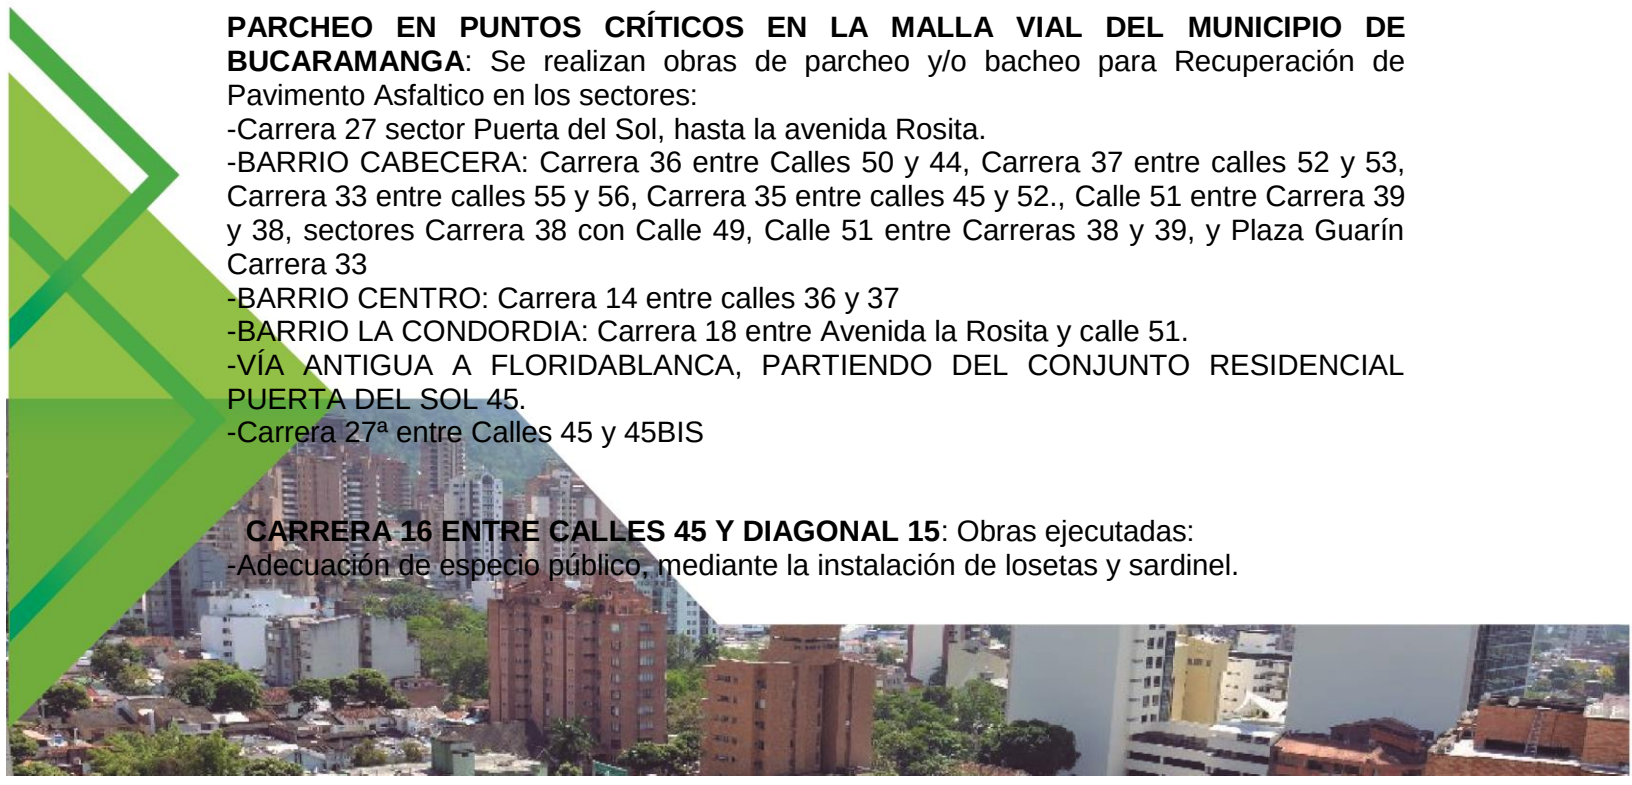

INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad

-Demolición de carpeta asfáltica existente, instalación de Mezcla Densa Caliente MDC-19 para parcheo, en sector aprobado.

CONSTRUCCION REDUCTORES DE VELOCIDAD

-BARRIO PABLO VI: Tipo Parabólico en la calle 68ª cra 10b -04

-BARRIO MANZANARES: Tipo Pompeyano en la calle 60 entre carreras 22 Occidente y 23 Occidente

REGISTRO FOTOGRAFICO

BARRIO CIUDAD VENECIA SECTOR CALLE 93 ENTRE CRA 14 Y 13B Y CRA 14 ENTRE CALLES 95 Y 96



BARRIO DELICIAS ALTAS CALLE 104ª ENTRE CARRERAS 15 Y 16:



CARRERA 27 SECTOR PUERTA DEL SOL, HASTA LA AVENIDA ROSITA





✓ CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2018	LOGRO 2018
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA	Número de M2 de malla vial urbana mejorados y/o construidos.	60.000	10.000	12.000

El cumplimiento a este indicador obedece al contrato antes mencionado

• Megaobras de Infraestructura Vial

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
331 de 2014	INTERVENTORÍA AMPLIACIÓN DEL CORREDOR VIAL PRIMARIO BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA SECTOR PUERTA DEL SOL - PUENTE PROVENZA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	Valor Total 15.392.422.371,02	01 de Octubre de 2014	31/12/2018

Estado: Avance de obra: 97.82% - en Ejecución

Entre las actividades que se encuentran realizando están:

Actividades eléctricas de la variante, maniobras aéreas entre las torres de neomundo y la subestación eléctrica conucos, construcción de la vía 1, 2,3, construcción de la rampa de acceso del constado occidental del puente peatonal del Barrio Antonia Santos y Adecuación del espacio público para la implantación de la signografía Guane, adicionalmente se requiere recuperación de la carpeta asfáltica y señalización.



INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
272 de 2014	CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL MESÓN DE LOS BÚCAROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	Valor Inicial \$ 54.909.500.000 Adicional 1. \$ 14.516.066.713 Adicional 2. \$ 10.945.041.309 Valor Total \$ 80.370.608.022	10 de septiembre de 2014	24 de Noviembre de 2018

Estado: Avance de Obra: 95.79% -Suspendido

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Excavaciones para la construcción de los ejes viales que conforman la glorieta.
- Terminación de Construcción de Muro de Contención
- Red alcantarillado, pendiente corona de pozos
- Conformación del Ejes Viales
- Construcción de Espacio Publico
- Cimentación Puente Peatonal
- Fabricación Puente Peatonal Metálico



✓ CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2018	LOGRO 2018
----------	-----------	----------------	-----------	------------



MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA	Número de megaobras terminadas.	3	0	0
--	---------------------------------	---	---	---

El cumplimiento a este indicador obedece a la terminación del Tercer carril y la Construcción del intercambiador del Mesón de los Búcaros que debió ser reportado en la vigencia 2017, pero como no ha sido posible la terminación de dichas obras, durante la vigencia 2018 se espera realizar el reporte.

6.2 PROGRAMA: MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL RURAL

La Secretaria de Infraestructura ha atendido parcialmente el mantenimiento de las vías rurales en razón a que la Maquinaria pesada no se encuentra en óptimas condiciones, sin embargo la Secretaria Administrativa - Subsecretaria de Bienes y Servicios adelantaron 2 licitaciones para el mantenimiento de la maquinaria las cuales fueron declaradas desiertas.

Es de anotar que sobre las diferentes vías de los tres corregimientos se adelantaron obras de placa huellas en cumplimiento a obras de presupuestos participativos e inversión vías rurales.

✓ CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2018	LOGRO 2018
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL RURAL	Número de kms de vías rurales con transitabilidad mantenida.	140	140	140
	Número de ML de placa huella construidas.	5.000	500	1.277

El cumplimiento a este indicador obedece a la transitabilidad mantenida en los 3 corregimientos y al contrato de Placas Huellas que se encuentra en ejecución

6.3 PROGRAMA: SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS Y RURALES

6.4. PROGRAMA: ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL

La Secretaria de Infraestructura a traves de la Oficina de Alumbrado Publico ha realizado



INDICADORES 2018

MES	PQR'S RECIBIDAS EN EL MES	PQR'S ATENDIDAS DEL MES	% ATENCION PQR'S DEL MES	TIEMPO DE RESPUESTA (DIAS)	PQR'S ATENDIDOS DE OTROS MESES	ACUMULADA PQR'S RECIBIDAS	ACUMULADA PQR'S ATENDIDAS	% ATENCION PQR'S ACUMULADO
Enero	1120	655	58%	5	446	1120	1101	98%
Febrero	846	428	51%	4	310	1966	1839	94%
Marzo	806	469	58%	5	262	2772	2570	93%
Abril	1090	644	59%	5	190	3862	3404	88%
Mayo	925	545	59%	5	251	4787	4200	88%
Junio	648	409	63%	5	260	5435	4869	90%
Julio	997	505	51%	4	227	6432	5601	87%
Agosto	1156	478	41%	5	216	7588	6295	83%
Septiembre	1058	506	48%	5	245	8646	7046	81%
Octubre	751	459	61%	5	128	9397	7696	82%
Noviembre	1009	488	48%	5	169	10406	8368	80%
Diciembre	819	265	32%	5	151	11225	8841	79%
TOTAL	11225	5851			2855			
TOTAL PQR'S ACUMULADO RECIBIDAS					8646			
TOTAL PQR'S ACUMULADO ATENDIDAS					7046			
PORCENTAJE DE ATENCION PQR'S					81%			

SECTORES A INTEVENIR

- ❖ GRUPO COINGESER Intervienen: Comunas 4, 5, 7, 12, 17, Corregimiento 3 y Viaducto Provincial
- ❖ GRUPO EME Intervienen: Comunas 2, 3, 6, 8, 9, 14, 15 y Corregimiento 1
- ❖ GRUPO CIVAREL Intervienen: Comunas 1, 10, 11, 13, 16 y Corregimiento 2

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
117 de 2018	ACTIVIDADES DE PODA PARA EL DESPEJE DE LUMINARIAS Y REDES QUE INTERFIEREN CON EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 593.923.343.45	15/05/2018	29/12/2018

Estado: Avance de Obra: 98.7% - En proceso de Liquidacion



PODAS EN EL PARQUE DE LOS NIÑOS PARA DESPEJAR LUMINARIAS Y RECUPERAR ILUMINACION



INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
312 de 2017	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO ETAPA 2 – BARRIO CIUDAD BOLÍVAR	\$ 2.176.343.155,91	21/06/2018	20/11/2018

Estado: Avance de obra: 100% - Liquidado




CIUDAD BOLIVAR – ILUMINACION PUENTE CIUDAD BOLIVAR – AUMENTO LA SEGURIDAD E INCENTIVA EL PUENTE PARA CRUZAR TAN CONGESTIONADA AVENIDA



CIUDAD BOLIVAR – ILUMINACION COMPARTES ESPACIO CON LOS ARBOLES DE LA ZONA, SE REALIZÓ PODA PARA DAR MÁXIMO USO A LAS LUMINARIAS INSTALADAS.

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
188 de 2018	SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA –FASE II: COMUNAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 23.725.301.046,00	27/08/2018	31/12/2018

Estado: Avance de obra: 100% - Recibidas

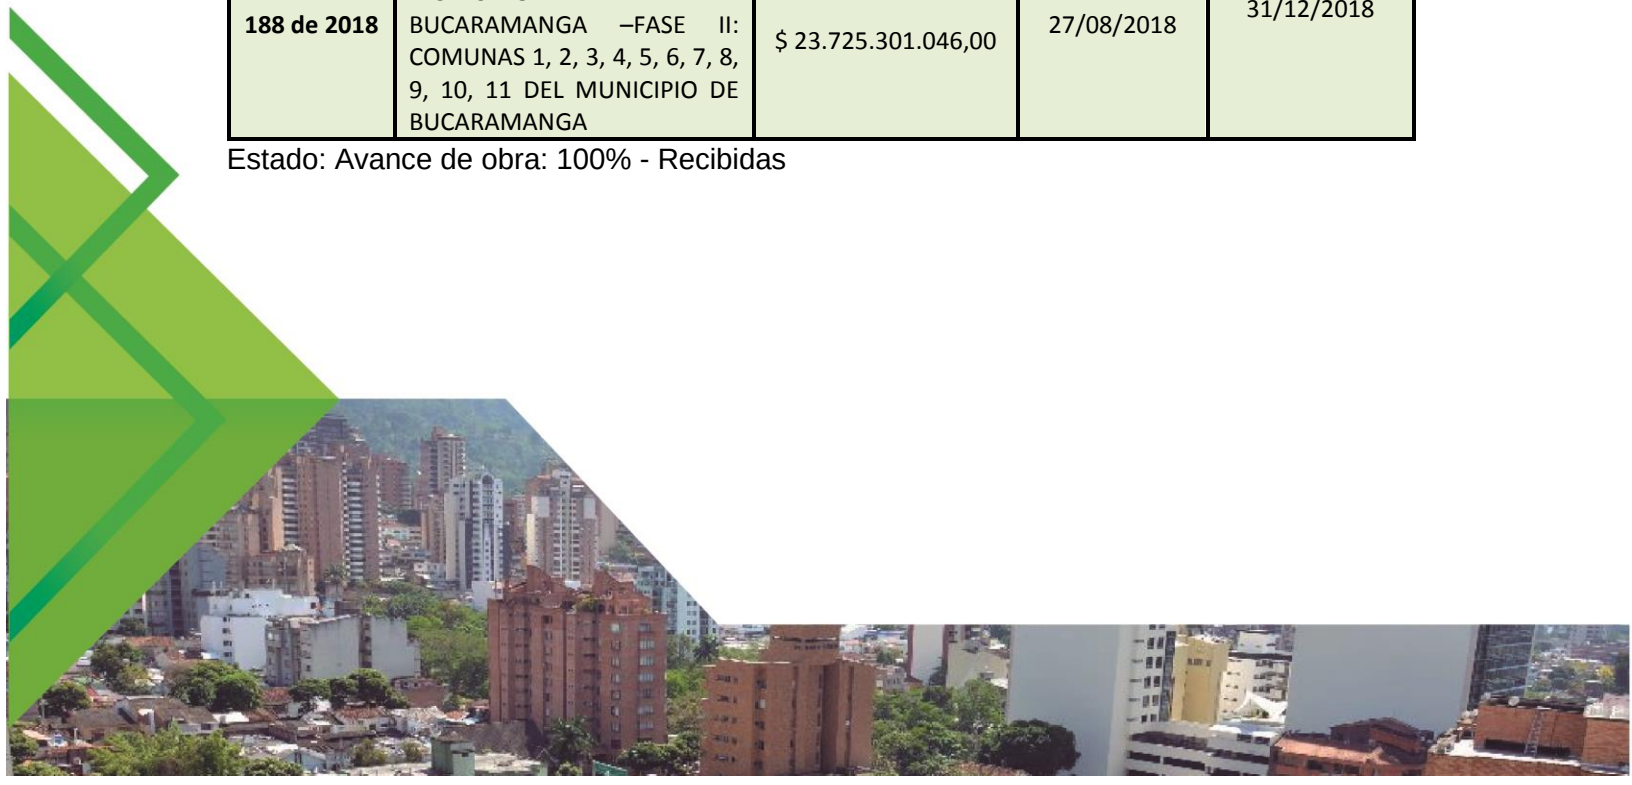

INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
214 de 2018	CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE LINEAL RIO DE ORO FASE II.	\$ 965.458.895,00	19/09/2018	31/12/2018

Estado: Avance de obra: 60% - Suspendido



Parque lineal rio de oro – Montaje de luminarias en ciclo ruta para iluminar alegría

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
238 de 2018	EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA -2018	\$ 892.917.138,00	01/10/2018	30/12/2018

Estado: En ejecución, avance de obra: 60% -Suspendido





Montaje de luminarias tipo led con brazo metálico en sector rural del municipio de Bucaramanga

✓ CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO


PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2018	LOGRO 2018
ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL	Número de luminarias sustituidas a LED.	36.000	12.000	24.569
	Número de luminarias expandidas.	1.000	300	873
	Número de puntos de telemedida instalados y puestos en marcha.	50	15	10
	Número de parques y/o escenarios públicos modernizados en su alumbrado público.	20	5	12
	Porcentaje de nuevos espacios públicos con alumbrado público instalado.	100%	100%	100%
	Porcentaje de luminarias que se encuentran en funcionamiento.	96%	96%	90%

El reporte a estos indicadores se viene realizando con los contratos antes mencionados, así mismo se adelanta:

- ✓ **Proyecto Piloto Energía Solar:** Parque Contemplativo El Carrasco, diseño eléctrico realizado y en revisión, para optimizar implementación de equipos y costos.

7. OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR LA SECRETARIA

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
--------------	--------	-------	--------------	-------------------

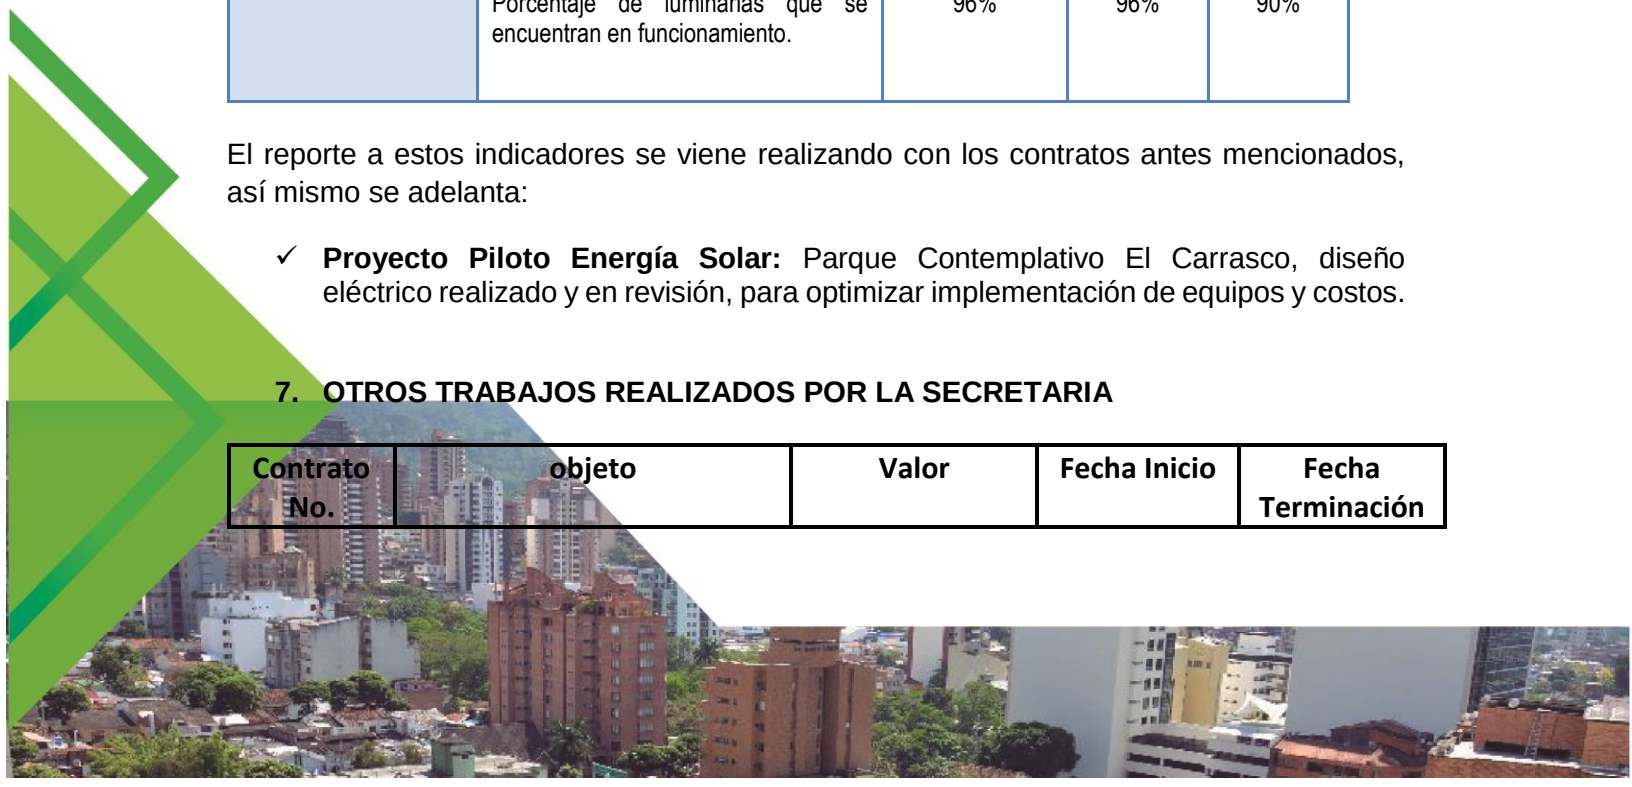

INFORME


Ante el Honorable Concejo Municipal



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad

405 de 2017	CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.598.565.682,8	01/02/2018	30/07/2018
-------------	---	--------------------	------------	------------

Estado: Avance de Obra: 75% - Suspendido

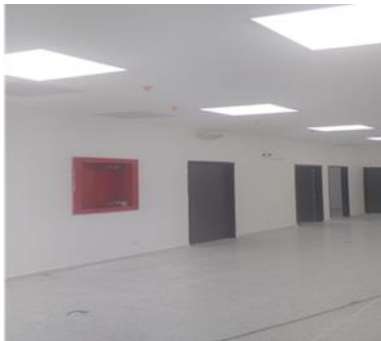

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
71 de 2018	RECONSTRUCCION DE LA ANTIGUA ESTACION DEL CAFÉ MADRID PARA LA HABILITACIÓN DE UN LUDOTECA EN EL BARRIO CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.254.823.459.69	12/03/2018	11/11/2018

Estado: Avance de Obra: 67.70% - Suspendido

Actualmente ya se encuentran fundidas en su totalidad las estructuras en concreto reforzado, se está completando los frisos de la totalidad de la Ludoteca, el cerramiento está completo, faltan los acabados, se inició en el mes de diciembre la cubierta, se terminó el alcantarillado y la entrega final, se continua con las labores constructivas de las redes hidrosanitarias, y se continua las labores en la parte externa del proyecto.



Vista desde el Norte



Costado Occidental



INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
151 de 2018	REALIZAR UN PLAN DE INTERVENCIÓN PARA REMOVER LA CUBIERTA QUE COMPRENDE EL ALERO DE LA VIVIENDA UBICADA EN LA CARRERA 12 No. 37-51 Y LA RESPECTIVA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA	\$31.794.971,00	09/08/2018	23/09/2018

Estado: Avance de Obra: 100% - Liquidado



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
140 de 2018	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION CERRAMIENTO Y RELLENO DEL TERRENO UBICADO EN LA DIAGONAL 32 No. 33ª-132 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$348.397.190,08	01/08/2018	30/09/2018

Estado: Avance de Obra: 100% - Liquidado



INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
282 de 2018	GRUPO 1 – ADECUACIONES LOCATIVAS, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, INEM SEDE B, ANDRÉS PÁEZ SOTO JOYA, AURELIO SEDE B, CLUB UNIÓN SEDE A, CLUB UNIÓN SEDE B, JUVENTUD, BOSCONIA BOLARQUI SEDE B, BOSCONIA CUCHILLA, VIJAGUAL SEDE A, SANTANDER SEDE A, POLITÉCNICO SEDE B, SANTA MARÍA GORETTIS SEDE B, JOSÉ CELESTINO MUTIS, AURELIO MARTÍNEZ MUTIS SEDE C, MAIPORE SEDE B, BICENTENARIO.”.	\$ 1.524.762.067,62	26/11/2018	31/12/2018

Estado: Avance de obra: 10% - Suspendido

AVANCE DEL PROYECTO:

El contrato alcanza un avance del **10%**, e incluye la intervención del área de cocina, cafetería y comedor, así como el mejoramiento del área de canchas del COLEGIO BICENTENARIO, en el cual se han adelantado actividades preliminares de demolición y retiro de escombros y sobrantes, además de las excavaciones y el inicio de las actividades de cimentación.




DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE



DEMOLICIÓN COCINA Y COMEDOR EXISTENTE

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
291 de 2018	GRUPO 2 – ADECUACIONES LOCATIVAS, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS,	\$ 1.033.961.774,35	26/11/2018	31/12/2018



INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad

INEM SEDE B, ANDRÉS PÁEZ SOTO JOYA, AURELIO SEDE B, CLUB UNIÓN SEDE A, CLUB UNIÓN SEDE B, JUVENTUD, BOSCONIA BOLARQUI SEDE B, BOSCONIA CUCHILLA, VIJAGUAL SEDE A, SANTANDER SEDE A, POLITÉCNICO SEDE B, SANTA MARÍA GORETTIS SEDE B, JOSÉ CELESTINO MUTIS, AURELIO MARTÍNEZ MUTIS SEDE C, MAIPORE SEDE B, BICENTENARIO			
--	--	--	--

Estado: Avance de obra: 15% - Suspendido

El contrato alcanza un avance del **15%**, en el cual se han adelantado actividades preliminares, movimiento de tierras, cimentación y mampostería en las dos Instituciones involucradas. En el Colegio Maiporé Sede B, se adelantó las actividades relacionadas con la reconstrucción de las baterías de baños externas, lo cual involucró la demolición y reconstrucción de un muro de cerramiento.



DEMOLICIÓN MURO DE CERRAMIENTO - COLEGIO MAIPORE



CONSTRUCCIÓN DE LAS BATERÍAS DE BAÑOS - COLEGIO MAIPORE

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
288 de 2018	"GRUPO 3 – ADECUACIONES LOCATIVAS, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, INEM SEDE B, ANDRÉS PÁEZ SOTO JOYA, AURELIO SEDE B, CLUB UNIÓN SEDE A, CLUB UNIÓN SEDE B, JUVENTUD, BOSCONIA BOLARQUI SEDE B, BOSCONIA CUCHILLA, VIJAGUAL SEDE A, SANTANDER SEDE A, POLITÉCNICO SEDE B, SANTA MARÍA GORETTIS SEDE B, JOSÉ CELESTINO MUTIS, AURELIO	\$ 924.175.430,89	26/11/2018	31/12/2018



	MARTÍNEZ MUTIS SEDE C, MAIPORE SEDE B, BICENTENARIO			
--	--	--	--	--

Estado: Avance de obra: 15% - Suspendido

AVANCE DEL PROYECTO:

El contrato alcanza un avance del **15%**, en donde se han adelantado las actividades de demolición y retiro de escombros, retiro parcial de cubiertas y remoción de enchapes en áreas de unidades sanitarias

GRUPO 3. COLEGIOS INEM “B” - AURELIO MARTINEZ MUTIS SEDE “B” – SANTA MARIA GORETTI SEDE “B” – JOSE CELESTINO MUTIS.



DEMOLICIÓN MUROS DE MAMPOSTERÍA Y MESONES
COLEGIO AURELIO MARTÍNEZ MUTIS SEDE “B”




DESMONTE DE CUBIERTA COLEGIO SANTA MARÍA
GORETTI SEDE “B”

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
283 de 2018	“GRUPO 4 – ADECUACIONES LOCATIVAS, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, INEM SEDE B, ANDRÉS PÁEZ SOTO JOYA, AURELIO SEDE B, CLUB UNIÓN SEDE A, CLUB UNIÓN SEDE B, JUVENTUD, BOSCONIA BOLARQUI SEDE B, BOSCONIA CUCHILLA, VIJAGUAL SEDE A, SANTANDER SEDE A, POLITÉCNICO SEDE B, SANTA MARÍA GORETTIS SEDE B, JOSÉ CELESTINO MUTIS, AURELIO MARTÍNEZ MUTIS SEDE C, MAIPORE SEDE B, BICENTENARIO	\$ 881.067.522,98	26/11/2018	31/12/2018

Estado: Avance de obra: 15% - Suspendido

AVANCE DEL PROYECTO:



INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad

El contrato alcanza un avance del **15%**, en el cual se ha podido adelantar actividades preliminares de demolición de acabados antiguos en las unidades sanitarias, reposición de redes hidrosanitarias, debido a que las existentes son muy antiguas y no cumplen con las condiciones mínimas de funcionamiento.

GRUPO 4. COLEGIOS ANDRES PAEZ DE SOTO JOYA – POLITECNICO SEDE “B”.



DEMOLICIÓN ENCHAPES E INSTALACIONES
SANITARIAS - COLEGIO POLITÉCNICO SEDE “B”



DESMONTE DE CUBIERTAS BAÑOS -COLEGIO ANDRÉS
PÁEZ SOTO JOYA


Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
286 de 2018	“GRUPO 5 – ADECUACIONES LOCATIVAS, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, INEM SEDE B, ANDRÉS PÁEZ SOTO JOYA, AURELIO SEDE B, CLUB UNIÓN SEDE A, CLUB UNIÓN SEDE B, JUVENTUD, BOSCONIA BOLARQUI SEDE B, BOSCONIA CUCHILLA, VIJAGUAL SEDE A, SANTANDER SEDE A, POLITÉCNICO SEDE B, SANTA MARÍA GORETTIS SEDE B, JOSÉ CELESTINO MUTIS, AURELIO MARTÍNEZ MUTIS SEDE C, MAIPORE SEDE B, BICENTENARIO	\$ 882.682.552,21	26/11/2018	31/12/2018

Estado: Avance de obra: 15% - Suspendido

ALCANCE DEL CONTRATO

El contrato alcanza un avance del **15%**, encontrándose en la fase preliminar de demoliciones.

GRUPO 5. COLEGIOS SANTANDER SEDE “A” - CLUB UNION SEDE “A” – CLUB UNION SEDE “B” – VIJAGUAL SEDE “A”.



INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad



DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA -
COLEGIO SANTANDER



DEMOLICIÓN DE PISOS Y ENCHAPES -COLEGIO
SANTANDER

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
285 de 2018	"GRUPO 6 – ADECUACIONES LOCATIVAS, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, INEM SEDE B, ANDRÉS PÁEZ SOTO JOYA, AURELIO SEDE B, CLUB UNIÓN SEDE A, CLUB UNIÓN SEDE B, JUVENTUD, BOSCONIA BOLARQUI SEDE B, BOSCONIA CUCHILLA, VIJAGUAL SEDE A, SANTANDER SEDE A, POLITÉCNICO SEDE B, SANTA MARÍA GORETTIS SEDE B, JOSÉ CELESTINO MUTIS, AURELIO MARTÍNEZ MUTIS SEDE C, MAIPORE SEDE B, BICENTENARIO	\$ 873.439.182,03	26/11/2018	31/12/2018

Estado: Avance de obra: 15% - Suspendido

ALCANCE DEL PROYECTO:

El contrato alcanza un avance del **15%**, el cual involucra la intervención de dos colegios rurales y de uno urbano. Las actividades adelantadas hasta el momento incluyen las demoliciones y el retiro de sobrantes.

GRUPO 6. COLEGIOS LA JUVENTUD - BOSCONIA BOLARQUI SEDE "B" – BOSCONIA LA CUCHILLA.



INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad



DEMOLICIÓN DE PISO Y MUROS - COLEGIO LA JUVENTUD



DEMOLICIÓN ENCHAPES - COLEGIO LA JUVENTUD

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
224 de 2018	"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN LOCATIVA DE AMBIENTES DE TRANSICIÓN UBICADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO I"	\$443.300.921,64	27/09/2018	31/12/2018

Estado: Avance de Obra: 70% - Suspendido

EL GRUPO I CONFORMADO POR LOS COLEGIO CLUB UNIÓN SEDE C (BARRIO COLORADOS), SANTO ÁNGEL (BARRIO VILLA ROSA), CLUB UNIÓN SEDE E (BARRIO CAFÉ MADRID), CLAVERIANO.



Colegio Claveriano



Colegio Santo Ángel



INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
225 de 2018	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN LOCATIVA DE AMBIENTES DE TRANSICIÓN UBICADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO II	\$ 336,328.888,00	27/09/2018	31/12/2018

Estado: Avance de Obra: 85% - Suspendido

EL GRUPO II CONFORMADO POR LOS COLEGIO GUSTAVO COTE URIBE, LA JUVENTUD, CAMPO HERMOSO SEDE C - JOSÉ ANTONIO GALÁN.



UNA (01) AULA COLEGIO LA JUVENTUD



DOS (02) AULAS COLEGIO GUSTAVO COTE

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
221 de 2018	“MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN LOCATIVA DE AMBIENTES DE TRANSICIÓN UBICADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO III	\$ 741.206.653,26	18/10/2018	31/12/2018

Estado: Avance de Obra: 65% - Suspendido

EL GRUPO III CONFORMADO POR LOS COLEGIO LAS AMÉRICAS, SANTANDER SEDE D, TEC. DÁMASO ZAPATA SEDE D – JARDÍN INFANTIL



INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad



SANTANDER SEDE D- MERCEDES ABREGO



TEC. DÁMASO ZAPATA SEDE D – JARDÍN INFANTIL

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
242 de 2018	REPARACIONES LOCATIVAS Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA: PROMOCIÓN SOCIAL SEDES D Y C – GRUPO I.	\$ 1.573.977.283,05	05/10/2018	04/02/2019

Estado: Avance de Obra: 7.45% - Vigencias futuras



PROMOCIÓN SOCIAL SEDES D, Transición



INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad



PROMOCIÓN SOCIAL SEDES C, Santa Inés

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
245 de 2018	REPARACIONES LOCATIVAS Y MANTENIMIENTO GENERAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA: PROMOCIÓN SOCIAL SEDES D Y C, CLUB UNIÓN SEDE D, MAIPORÉ SEDE C, RURAL EL PAULÓN, JORGE ARDILA DUARTE Y AURELIO MARTÍNEZ MUTIS.	\$1.512.077.835,80	05/10/2018	04/02/2019

Estado: Avance de Obra: 11.88% - Vigencias futuras



Colegio Aurelio Martínez Mutis



INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad



Colegio Jorge Ardila Duarte

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
243 de 2018	REPARACIONES LOCATIVAS Y MANTENIMIENTO GENERAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA: PROMOCIÓN SOCIAL SEDES D Y C, CLUB UNIÓN SEDE D, MAIPORÉ SEDE C, RURAL EL PAULÓN, JORGE ARDILA DUARTE Y AURELIO MARTINEZ MUTIS. GRUPO III	\$ 1.454.009.727,20	05/10/2018	04/02/2019

Estado: Avance de Obra: 33, 96% - Vigencias futuras



CLUB UNIÓN SEDE D, Olas Bajas

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
247 de 2018	REPARACIONES LOCATIVAS Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA: PROMOCIÓN	: \$ 1.386.169.767.87	05/10/2018	04/02/2019



INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad

	SOCIAL SEDES D Y C, CLUB UNIÓN SEDE D, RURAL EL PAULON, MAIPORE SEDE C, JORGE ARDILA DUARTE Y AURELIO MARTÍNEZ MUTIS – GRUPO IV.”			
--	---	--	--	--

Estado: Avance de Obra: 31, 73% - Vigencias futuras



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
239 de 2018	MANTENIMIENTO DE LA FACHADA Y ÁREAS INTERNAS DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA ”	: \$ 1.203.940.390.46	05/10/2018	31/12/2018

Estado: Avance de Obra: 42.27% - Suspendido



8. PROYECTOS PRESENTADOS Y VIABILIZADOS



INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad

No.	No. REGISTRO	OBJETO	VALOR VIGENCIA	ESTADO
1	20160680010121	MEJORAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS TRANSVERSALES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.563.200.000,00	Certificado - Actualización
2	20160680010088	ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, ENERGÍA Y FACTURACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	\$ 17.933.000.000,00	Certificado - Actualización
3	20170680010016	APOYO EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 864.250.000,00	Certificado - Actualización
4	20170680010118	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE Y CANCHA DEL BARRIO CRISTAL BAJO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 317.509.812,84	Certificado - Actualización
5	20160680010226	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER	\$ 1.008.735.035,13	Certificado - Actualización
6	20170680010090	MEJORAMIENTO DEL PARQUE BOCAPRADERA DEL BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 501.661.954,67	Certificado - Actualización
7	20170680010141	CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA DE COLUMNATA Y PUENTE DE INTEGRACIÓN EDIFICIOS EXISTENTE Y NUEVO CENTRO DE CONVENCIONES NEOMUENDO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 4.000.000.000,00	Certificado - Actualización Vigencias Futuras
8	20180680010010	APOYO AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS DIFERENTES OBRAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 105.932.922,80	Certificado - Proyecto Nuevo
9	20170680010046	SUBSIDIO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO A LA POBLACION DE ESTRATO 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 4.552.898.870,00	Certificado - Actualización
10	20170680010174	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO LOS PINOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 154.989.631,00	Certificado - Proyecto Nuevo
11	20170680010084	CONSTRUCCIÓN CORREDOR CICLISTA UIS - PARQUE DE LOS NIÑOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 466.793.508,99	Certificado - Actualización
12	20170680010093	ADECUACIÓN DEL PARQUE RELIGIOSO MORRORICO BUCARMANGA	\$ 127.923.589,32	Certificado - Actualización
13	20170680010133	CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS CANCHAS Y SUS ALREDEDORES DE LOS BARRIOS PORVENIR I PORVENIR II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.449.984.504,67	Certificado - Actualización
14	20170680010057	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA GRAN SALA DEL TEATRO SANTANDER MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	\$ 999.000.000,00	Certificado - Proyecto Nuevo
15	20180680010013	MATENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.977.910.290,37	Certificado - Proyecto Nuevo



INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad

16	20160680010245	CONSTRUCCION, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.	\$ 1.109.208.202,83	Certificado - Actualización
17	20160680010154	MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	\$ 4.541.798.899,48	Certificado - Actualización
18	20170680010111	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEL BARRIO CAFÉ MADRID DE BUCARAMANGA	\$ 89.084.660,00	Certificado - Actualización
19	20160680010196	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA BARRIO KENNEDY FASE II MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	\$ 599.555.869,61	Certificado - Actualización
20		MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE MICROFUTBOL DEL BARRIO LA JOYA FASE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 96.841.447,00	Proyecto Nuevo, en espera de ser certificado.
21	20170680010165	RENOVACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 88.017.400,27	En Actualización
22	20180680010030	APOYO AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INTERCAMBIADOR MESÓN DE LOS BÚCAROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, FASE III EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 1.242.467.100,00	Certificado - Proyecto Nuevo
23	20180680010023	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO A TECNOLOGÍA LED FASE II: COMUNAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 11 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 32.213.762.885,00	Certificado - Proyecto Nuevo
24	20180680010024	REMODELACION DE ANDENES Y ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.900.224.580,99	Certificado - Proyecto Nuevo
25	20180680010025	MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS CANCHAS DE TENIS DEL PARQUE DE LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.670.083.624,31	Certificado - Proyecto Nuevo
26	20180680010028	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA FASE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 3.146.145.207,00	Certificado - Proyecto Nuevo
27	20160680010226	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.	\$ 2.313.417.707,11	Certificado - Actualización
28	20180680010049	CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ZONAS VERDES DEL BARRIO LOS CANELOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.089.462.658,32	Certificado - Proyecto Nuevo
29	20180680010036	AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO RURAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 1.101.039.013,00	Certificado - Proyecto Nuevo



INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad

30	20180680010041	ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LAS VÍAS ARTERIALES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS Y DETERMINACIÓN DE COTA DE INUNDACIÓN DEL CENTRO DE ZONOSIS DE VIAGUAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 85.150.354,00	Certificado - Proyecto Nuevo
31	20180680010031	REMDELACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 7.706.773.585,37	Certificado - Proyecto Nuevo
32	20170680010139	MEJORAMIENTO DEL PARQUE LINEAL RIO DE ORO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.102.623.391,00	Certificado - Actualización
33	20170680010137	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.494.116.686,62	Certificado - Actualización
34	20170680010137	APOYO PARA LA INTERVENCIÓN, RESTAURACIÓN Y FINALIZACIÓN DEL TEATRINO DEL ESTADIO, FACHADAS DE LA CARRERA 20 Y LA CALLE 31, Y ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO DEL CENTRO CULTURAL DEL ORIENTE COLOMBIANO BUCARAMANGA	\$ 499.900.000,00	Certificado - Actualización
35	20180680010052	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE GRANJAS DE PROVENZA EN LA COMUNA 10 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 313.711.370,55	Certificado - Proyecto Nuevo
36	20180680010051	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LA CEIBA EN LA COMUNA13 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 3.493.871.261,00	Certificado - Proyecto Nuevo
37	20180680010054	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PARA TERMINACIÓN DE LA GRAN SALA DEL TEATRO SANTANDER FASE II EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 2.652.000.000,00	Certificado - Proyecto Nuevo
38	20180680010050	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE PUNTOS VIVE DIGITAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 135.502.973,00	Certificado - Proyecto Nuevo
39	20180680010035	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DE ATLETISMO, LUIS ENRIQUE FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE BUCARMANGA	\$ 66.155.135,00	Certificado - Proyecto Nuevo
40	20180680010068	ADECUACIÓN DE LA PLAZOLETA DE LOS EDECANES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.332.056.223,40	Certificado - Proyecto Nuevo
41	20180680010061	ADECUACIÓN PARQUE ECOLÓGICO LA FLORA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.749.844.108,09	Certificado - Proyecto Nuevo
42		ADECUACIÓN DE LA PLAZOLETA DE LA DEMOCRACIA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 456.314.841,09	En revisión en el Banco de Proyectos
43	20180680010060	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD INTERMEDIA MATERNO INFANTIL SANTA TERESITA UIMIST EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.269.036.943,02	Certificado - Proyecto Nuevo



INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad

44		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA 1, BARRIOS VILLALUZ, VILLAGREGIA II, BETANIA Y CAMPO MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 526.883.396,19	En revisión en el Banco de Proyectos
45	20180680010074	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEL COLEGIO INEM CUSTODIO GARCIA ROVIRA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.852.182.127,80	Certificado - Proyecto Nuevo
46	20180680010079	INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 1.549.627.148,08	Certificado - Proyecto Nuevo
47	20180680010078	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO ADYACENTE A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 147.697.706,00	Certificado - Proyecto Nuevo
48	20180680010079	MANTENIMIENTO DE BAÑOS PÚBLICOS EN DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 139.276.828,00	Certificado - Proyecto Nuevo

9. PROCESOS ADJUDICADOS

9.1 LICITACIONES PÚBLICAS

No.	OBJETO	No. PROCESO	ESTADO	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-001-2018	ADJUDICADO	\$ 1.798.100.263,97
2	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LOS DIFERENTES CORREGIMIENTOS QUE COMPRENDE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-002-2018	ADJUDICADO	\$ 1.277.358.628,60
3	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ANDENES, PASAMANOS Y ESCALERAS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER	SI-LP-003-2018	ADJUDICADO	\$ 1.553.175.389,00
4	MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS CANCHAS DE TENIS DEL PARQUE DE LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-004-2018	ADJUDICADO	\$ 2.397.714.936,81
5	OBRAS DE PARCHO DE HUECOS, FALLOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES EN LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-005-2018	ADJUDICADO	\$ 2.827.830.619,00
6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN LOCATIVA DE AMBIENTES DE TRANSICIÓN UBICADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-006-2018	ADJUDICADO	\$ 1.541.933.624,00



INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad

7	REMODELACIÓN DE CANCHAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-007-2018	ADJUDICADO	\$ 7.948.719.254,88
8	CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE LINEAL RIO DE ORO FASE II	SI-LP-008-2018	ADJUDICADO	\$ 977.185.114,00
9	EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA -2018	SI-LP-009-2018	ADJUDICADO	\$ 929.061.838,00
10	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LA CEIBA EN LA COMUNA 13 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE GRANJAS DE PROVENZA EN LA COMUNA 10 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-010-2018	ADJUDICADO	\$ 5.518.618.108,00
11	MANTENIMIENTO DE LA FACHADA Y ÁREAS INTERNAS DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	SI-LP-011-2018	ADJUDICADO	\$ 1.225.397.026,84
12	REPARACIONES LOCATIVAS Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA: PROMOCIÓN SOCIAL SEDES D Y C, CLUB UNION SEDE D, RURAL EL PAULON, MAIPORE SEDE C, JORGE ARDILA DUARTE Y AURELIO MARTÍNEZ MUTIS.	SI-LP-012-2018	ADJUDICADO	\$ 6.088.211.143,36
13	MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS E INSTALACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE Y JUEGOS INFANTILES, VIABILIZADOS POR EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	SI-LP-014-2018	ADJUDICADO	\$ 1.669.567.590,00
14	CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LOS CANELOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-015-2018	REVOCADO	\$ 911.108.471,40
15	ADECUACION DEL PARQUE ECOLOGICO LA FLORA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-016-2018	TRASLADO SECRETARIAL	\$ 2.575.284.495,09
16	ADECUACIONES LOCATIVAS, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, INEM SEDE B, ANDRES PAEZ SOTO JOYA, AURELIO SEDE B, CLUB UNIÓN SEDE A, CLUB UNIÓN SEDE B, JUVENTUD, BOSCONIA BOLARQUI SEDE B, BOSCONIA CUCHILLA, VIJAGUAL SEDE A, SANTANDER SEDE A, POLITECNICO SEDE B, SANTA MARIA GORETTI SEDE B, JOSE CELESTINO MUTIS, AURELIO MARTINEZ MUTIS SEDE C, MAIPORE SEDE B, BICENTENARIO.	SI-LP-017-2018	TRASLADO SECRETARIAL	\$ 6.215.632.944,00
17	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECNOLOGÍA LED PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – FASE II, EN LAS COMUNAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11	SI-LP-018-2018	PROYECTO DE PLIEGOS	\$ 7.406.002.193,00
18	ADECUACION DE LA PLAZOLETA DE LOS EDECANES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-019-2018	TRASLADO SECRETARIAL	\$ 1.237.379.823,72



INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad


19	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEL COLEGIO INEM CUSTODIO GARCIA ROVIRA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-020-2018	PROYECTO DE PLIEGOS	\$ 2.768.557.108,80
20	INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-021-2018	LICITACIÓN PUBLICA	\$ 1.410.484.166,08

9.2 SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

No.	OBJETO	No. PROCESO	ESTADO	VALOR TOTAL
1	ACTIVIDADES DE PODA PARA EL DESPEJE DE LUMINARIAS Y REDES QUE INTERFIERAN CON EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-SAMC-002-2018	ADJUDICADO	\$ 604.312.372,00
2	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION CERRAMIENTO Y RELLENO DE TERRENO UBICADO EN LA DIAGONAL 32 No. 33ª - 132 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-SAMC-003-2018	ADJUDICADO	\$ 355.000.192,00
3	MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO DE CONFORMIDAD CON LAS SENTENCIAS DE ACCIONES CONSTITUCIONALES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-SAMC-004-2018	ADJUDICADO	\$ 334.830.339,00
4	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PUNTOS VIVE DIGITAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	SI-SAMC-005-2018	ADJUDICADO	\$ 135.502.973,00

9.3 MINIMA CUANTIA

No.	OBJETO	No. PROCESO	ESTADO	VALOR TOTAL
1	REALIZAR UN PLAN DE INTERVENCIÓN PARA REMOVER LA CUBIERTA QUE COMPRENDE EL ALERO DE LA VIVIENDA UBICADA EN LA CARRERA 12 No 37-51 Y LA RESPECTIVA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA PARA PREVENIR EL RIESGO EN QUE SE ENCUENTRA LA COMUNIDAD QUE CIRCULA POR EL SECTOR Y CON EL PROPÓSITO DE CUMPLIR FALLO DENTRO DE LA ACCIÓN POPULAR RADICADA CON EL No 680013333009-2017-00178-00 EMANANDO DEL JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA	SI-CMC-002-2018	SE DECLARÓ DESIERTO	\$ 5.781.943,00
2	CONSULTORIA PARA DEFINIR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL MOBILIARIO DEL CENTRO METROPOLITANO DE CONVENCIONES DE BUCARAMANGA NEOMUNDO-GRAN SALON	SI-CMC-003-2018	ADJUDICADO	\$ 38.080.000,00

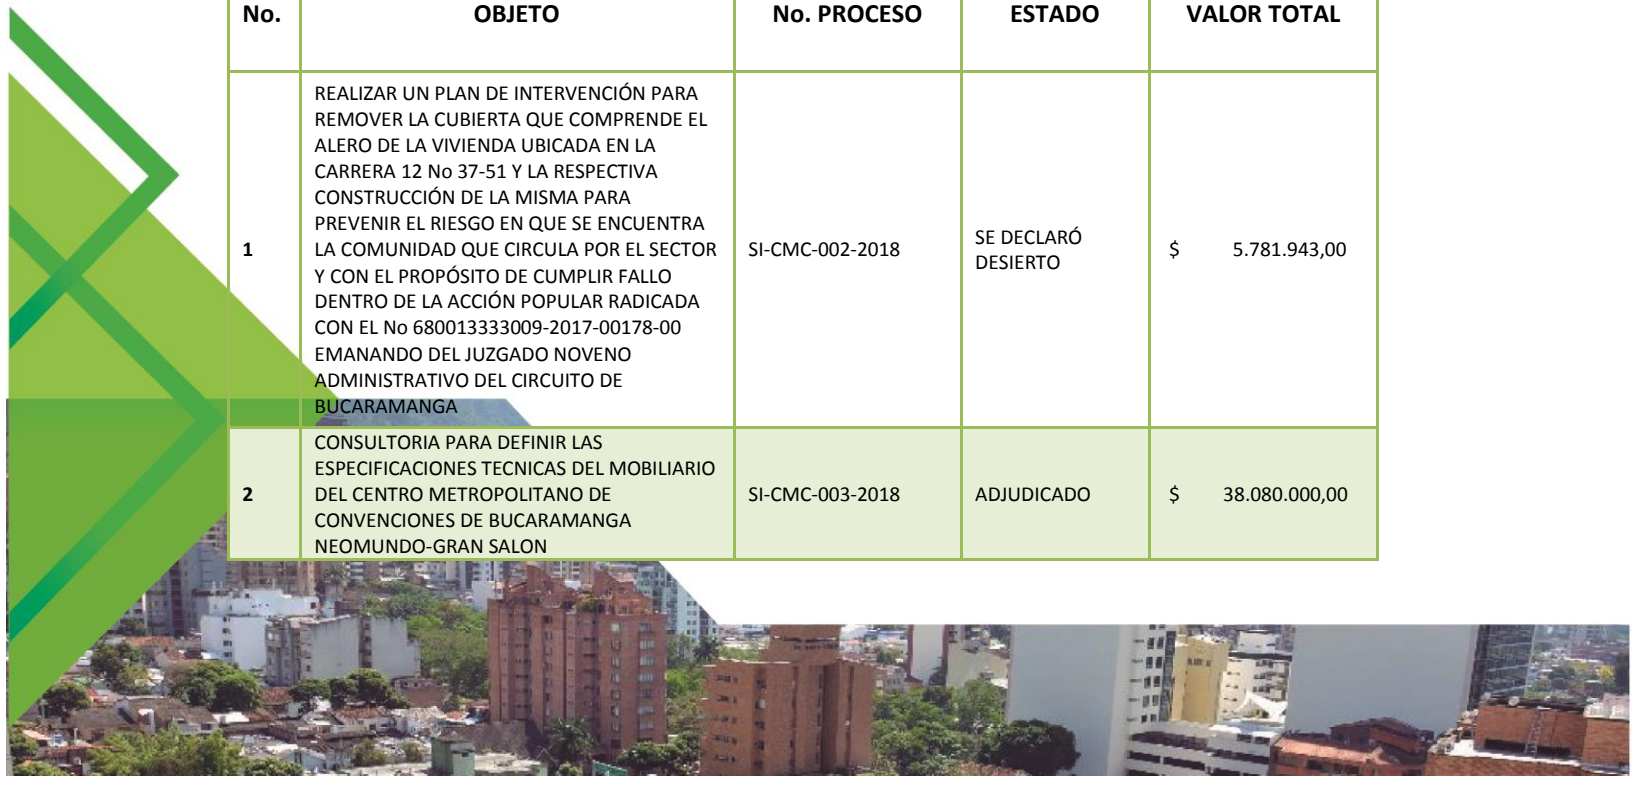

INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad

3	SUMINISTRO DE PLANTAS ORNAMENTALES E INSUMOS AGRÍCOLAS PARA REALIZAR INTERVENCIONES DE URBANISMO TÁCTICO EN ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CMC-004-2018	ADJUDICADO	\$ 14.779.900,00
4	OBRA CIVIL EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM FASE II-PISO I PARA LA ADECUACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS REGULADA Y NORMAL	SI-CMC-005-2018	ADJUDICADO	\$ 49.996.168,00
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL CAMION CANASTA GRUA DE PLACA OSA 790 CON BRAZO ARTICULADO HIDRAULICO PROPIEDAD DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CMC-006-2018	ADJUDICADO	\$ 34.802.621,00
6	CONSULTORÍA PARA DEFINIR LA COTA DE INUNDACIÓN DEL CENTRO ZOONOSIS DE VIAGUAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CMC-008-2018	ADJUDICADO	\$ 22.276.800,00
7	COMPRAVENTA DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA, TINTAS Y TONERES PARA LA OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CMC-009-2018	ADJUDICADO	\$ 15.746.116,89
8	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION CERRAMIENTO Y RELLENO DE TERRENO UBICADO EN LA DIAGONAL 32 No. 33ª - 132 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CMC-010-2018	ADJUDICADO	\$ 65.577.330,00
9	REALIZAR UN PLAN DE INTERVENCIÓN PARA REMOVER LA CUBIERTA QUE COMPRENDE EL ALERO DE LA VIVIENDA UBICADA EN LA CARRERA 12 No 37-51 Y LA RESPECTIVA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA PARA PREVENIR EL RIESGO EN QUE SE ENCUENTRA LA COMUNIDAD QUE CIRCULA POR EL SECTOR Y CON EL PROPOSITO DE CUMPLIR FALLO DENTRO DE LA ACCIÓN POPULAR RADICADA CON EL No 680013333009-2017-00178-00 EMANADO DEL JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA	SI-CMC-011-2018	ADJUDICADO	\$ 44.159.897,00
10	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DE ATLETISMO LUIS ENRIQUE FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER	SI-CMC-012-2019	ADJUDICADO	\$ 66.155.135,00

9.4 CONCURSO DE MERITOS



INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad

No.	OBJETO	No. PROCESO	ESTADO	VALOR TOTAL
1	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA UIMIST DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-001-2018	DECLARADO DESIERTO	\$ 563.582.156,00
2	INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO A LED – ETAPA 2 DEL BARRIO CIUDAD BOLÍVAR DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-002-2018	ADJUDICADO	\$ 194.462.541,00
3	ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y GEOLÓGICOS PARA LAS DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-003-2018	ADJUDICADO	\$ 220.566.078,00
4	INTERVENTORÍA AL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-004-2018	ADJUDICADO	\$ 196.449.960,00
5	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS Y REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LOS DIFERENTES CORREGIMIENTOS QUE COMPRENDE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-005-2018	ADJUDICADO	\$ 222.698.385,00
6	INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS CANCHAS DE TENIS DEL PARQUE DE LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-006-2018	ADJUDICADO	\$ 272.368.687,50
7	INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE PARCHEO DE HUECOS, FALLOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES EN LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-007-2018	ADJUDICADO	\$ 318.314.588,00
8	INTERVENTORÍA A LA REMODELACIÓN DE CANCHAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-008-2018	ADJUDICADO	\$ 427.575.330,00
9	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ANDENES, PASAMANOS Y ESCALERAS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER	SI-CM-009-2018	ADJUDICADO	\$ 199.953.425,00
10	INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE LINEAL RIO DE ORO FASE II	SI-CM-010-2018	ADJUDICADO	\$ 125.435.091,6
11	INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE CONFORMIDAD CON LAS SENTENCIAS DE ACCIONES CONSTITUCIONALES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-011-2018	ADJUDICADO	\$ 81.945.557,00



INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad

12	INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - 2018	SI-CM-012-2018	ADJUDICADO	\$ 170.191.967,4
13	INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN LOCATIVA DE AMBIENTES DE TRANSICIÓN UBICADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-013-2018	ADJUDICADO	\$ 305.850.022,00
14	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA (CIC) PARA EL SECTOR DE LA DIVA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER.	SI-CM-014-2018	ADJUDICADO	\$ 59.410.179,00
15	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LA CEIBA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-015-2018	ADJUDICADO	\$ 202.405.613,00
16	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE GRANJAS DE PROVENZA EN LA COMUNA 10 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-016-2018	ADJUDICADO	\$ 202.402.132,00
17	INTERVENTORÍA A MANTENIMIENTO DE LA FACHADA Y ÁREAS INTERNAS DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	SI-CM-017-2018	ADJUDICADO	\$ 10.628.483,00
18	INTERVENTORIA A LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA: PROMOCIÓN SOCIAL SEDES D Y C, CLUB UNION SEDE D, RURAL EL PAULON, MAIPORE SEDE C, JORGE ARDILA DUARTE Y AURELIO MARTÍNEZ MUTIS.	SI-CM-018-2018	ADJUDICADO	\$ 595.347.480,00
19	INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS E INSTALACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE Y JUEGOS INFANTILES, VIABILIZADOS POR EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	SI-CM-019-2018	ADJUDICADO	\$ 250.996.883,00
20	INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LOS CANELOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-020-2018	REVOCADO	\$ 118.381.973,8
21	INTERVENTORIA A LAS ADECUACIONES LOCATIVAS, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, INEM SEDE B, ANDRES PAEZ SOTO JOYA, AURELIO SEDE B, CLUB UNIÓN SEDE A, CLUB UNIÓN SEDE B, JUVENTUD, BOSCONIA BOLARQUI SEDE B, BOSCONIA CUCHILLA, VIAGUAL SEDE A, SANTANDER SEDE A, POLITECNICO SEDE B, SANTA MARIA GORETTI SEDE B, JOSE CELESTINO MUTIS, AURELIO MARTINEZ MUTIS SEDE C, MAIPORE SEDE B, BICENTENARIO	SI-CM-021-2018	ADJUDICADO	\$ 551.52.4837,5
22	INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO LA FLORA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-022-2018	ADJUDICADO	\$ 125.916.132,00



INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad

23	INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN DE LA PLAZOLETA DE LOS EDECANES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-023-2018	ADJUDICADO	\$ 94,676,400
24	INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECNOLOGÍA LED PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – FASE II COMUNAS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 11	SI-CM-024-2018	ADJUDICADO	\$ 842,794,973
25	INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEL COLEGIO INEM CUSTODIO GARCÍA ROVIRA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	SI-CM-025-2018	ADJUDICADO	\$83,576,289.00
26	INTERVENTORÍA A LA INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-026-2018	DECLARADO DESIERTO	\$ 117.475.313,00

10. INVERSION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 31 DE DICIEMBRE DE 2018

PROGRAMAS	INVERSION	%
ADMINISTRACION ARTICULADA Y COHERENTE	\$ 2.567.872.778,00	2,36
UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES	\$ 905.515.840,00	0,83
ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	\$ 1.233.893.999,00	1,13
RECUPERACION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO	\$ 3.151.900.000,00	2,89
OBSERVAR Y SER OBSERVADO FOMENTO AL TURISMO	\$ 4.000.000.000,00	3,67
INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO	\$ 31.833.974.237,75	29,23
PRESUPUESTOS INCLUYENTES	\$ 6.432.681.301,82	5,91
PROMOCIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS	\$ 466.793.508,00	0,43
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA	\$ 6.281.951.336,34	5,77
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL RURAL	\$ 650.000.000,00	0,60
ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL	\$ 51.299.536.248,09	47,10
SERVICIOS PUBLICOS URBANOS Y RURALES	\$ 85.800.000,00	0,08
TOTAL (1)	\$ 108.909.919.249,00	100%



11. OTROS VALORES EN LA EJECUCION

DESCRIPCION	VALOR
VALOR ACTUALIZACION REGISTROS PRESUPUESTALES – MESON DE LOS BUCAROS	\$ 6.096.973.132,00
VALOR SUBSIDIOS DE SERVICIOS PUBLICOS, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	\$ 3.693.430.068,00
TOTAL (2)	\$ 9.790.403.200,00

TOTAL INVERSION (1+2)	\$ 118.700.322.449,00
------------------------------	------------------------------

