

## INFORME DE GESTION

El presente informe detalla los avances en los programas de la Secretaria de Infraestructura, teniendo en cuenta las metas programadas en el Plan de Desarrollo 2016 -2019 “Gobierno de las Ciudadanas y los Ciudadanos”

A continuación se detalla la gestión que ha realizado la Secretaria de Infraestructura en el primer trimestre de 2017.

### LÍNEA ESTRATÉGICA 1: GOBERNANZA DEMOCRÁTICA

#### 1.1 PROGRAMA: PRESUPUESTOS INCLUYENTES

Este programa contempla la ejecución de obras con presupuestos participativos y actualmente la Secretaria adelanta las visitas correspondientes a las 17 comunas y los 3 corregimientos con el acompañamiento de los funcionarios de la Secretaria de Planeación.

Estas visitas se realizan con el fin de emitir posteriormente informe y dejar clara las viabilidades tanto técnicas presupuestales y jurídicas a que allá lugar en cada sitio visitado, unas vez se realicen los informes y las viabilidades por parte de la Secretaria de Planeación Municipal se procederá a iniciar el proceso contractual.

#### 1.2 PROGRAMA: UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES

En este programa se encuentra todos **los diseños, estudios, consultorías e interventorías** para ejecutar los proyectos y las obras del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, los cuales es importante resaltar:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
080 de 2016	INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SALONES COMUNALES DE DOCE BARRIOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 104.999.928,8	27/03/2017	Avance 5%

092 de 2016	INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA LA ESTACION DE POLICIA CENTRO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	\$ 88.372.425	14/09/2016	Suspendido En espera de Recursos para obras adicionales. <b>Avance 70%</b>
-------------	---	---------------	------------	--

## LÍNEA ESTRATÉGICA 2: INCLUSIÓN SOCIAL

### 2.1. PROGRAMA: ADULTO MAYOR Y DIGNO

Se actualizo el proyecto con el No. Registro 20160680010196 "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA BARRIO KENNEDY FASE II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" por valor de \$ 2.191.797.569,18, valor que comprende Obra e interventoria, actualmente se adelantan los tramites administrativos con el fin de poder iniciar el proceso de contratacion.

## LÍNEA ESTRATÉGICA 3: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

### 2.1. PROGRAMA: REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
043 de 2016	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION PARA EL CONTROL DE LA AMENAZA POR FENOMENOS DE REMOCIÓN EN MASA EN EL SECTOR DEL BARRIO BUCARAMANGA-COCACOLA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DEPARTAMENTO DE SANTANDER	\$ 1.608.405.173,53	12/09/2016	11/01/2017

**Estado:** Ejecutado 100% - Actualmente se encuentra en proceso de liquidación.



# Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable  
Concejo Municipal

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
356 de 2015	CONSTRUCCION FASE I DE OBRAS DE MITIGACION GEOTECNICA EN EL BARRIO DE VILLAS DE SAN IGNACIO Y COLEGIO VILLAS DE SAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER CONVENIO MUNICIPIO DE BUACARAMANGA Y DPS - FONADE	\$ 1.608.405.173,53	12/09/2016	11/01/2017

**Estado:** Proyecto financiado por el DPS y Municipio de Bucaramanga. Aporte DPS \$ 1.368.639.528,00 y el Municipio la suma de \$ 521.013.510,00, se fijó fecha de inicio para la obra el día 17 de abril de 2017. La interventoría a cargo del DPS



## LÍNEA ESTRATÉGICA 4: CALIDAD DE VIDA

### 4.2 PROGRAMA: INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO

#### ✓ Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes

La administración Municipal a través de la Secretaria de Infraestructura adelanto los siguientes procesos contractuales:

# Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable  
Concejo Municipal

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
19 de 2017	MANTENIMIENTO DE PARQUES, ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 3.321.213.590,53	15/02/2017	29/12/2017

**Estado:** En ejecución, avance del 30%

Dentro del proceso de mantenimiento se cuenta con cuatro zonas de trabajo distribuidas de la siguiente manera:

- 17 Cuadrillas conformadas por 5 personas cada una, ubicadas en los Parques y zonas Verdes de las 17 Comunas del Municipio de Bucaramanga.
- 4 cuadrillas de reacción conformadas por 5 personas cada una, como apoyo a las diferentes zonas del Municipio de Bucaramanga.
- 4 cuadrillas conformadas por 5 personas cada una, las cuales atienden las entradas principales a Bucaramanga, separadores y rompoys.
- 30 parqueros distribuidos en 42 Parques y Zonas verdes que se relacionan a continuación:

COMUNA	NOMBRE DEL PARQUE	DIRECCION	BARRIO
1	PARQUE DEL KENNEDY	CALLE 1C CON CRA 14	KENNEDY
3	SAN FRANCISCO	CRA 21 ENTRE BOULEVAR SANTANDER Y BOLIVAR	SAN FRANCISCO
3	CRISTO REY	CRA 18 ENTRE CALLE 9 Y 10	COMUNEROS
4	PARQUE GIRARDOT Y GLORIETA DE LA CRA 9	CARRERA 6 CON CALLE 26 Y CARRERA 9 CON QUEBRADA SECA	GIRARDOT Y CENTRO
5	LA VIDA	CALLE 45 CRR 1	CAMPOHERMOSO
6	PARQUE LAS TRES B Y PARQUE PERIODISTAS	CARRERA 17 CON CALLE 47	CENTRO
6	PARQUE CORONA, CEIBA Y MARCELINO GILBERT	CARRERA 28A CON CALLE 67A	LA SALLE
10	PARQUE EL DIAMANTE 2	CALLE 86 CON CARRERA 24	DIAMANTE 2
10	PARQUE LOS ENAMORADOS, PATINODROMO Y MERCARUSAN DE PROVENZA	CARRERA 21B CALLE 110	PROVENZA
11	PARQUE PORVENIR I Y II	CALLE 105 CON CARRERA 9	PORVENIR
12	PARQUE SAN PIO	Cra 33 CII 45	CABECERA
12	PARQUE LOS SARRAPIO	Cra 38 CII 45	CABECERA
12	PARQUE DE LOS LEONES	Cra 39 CII 41	CABECERA

# Informe de GESTIÓN


Ante el Honorable  
Concejo Municipal

12	PARQUE DE LAS PALMAS	CARRERA 32 CALLE 49	CABECERA
12	PARQUE TURBAY	CARRERA 27 CALLE 49	SOTOMAYOR
12	PARQUE DIVINO NIÑO, ZONA VERDE BANCOMEVA, ZONA VERDE OFTALMOLOGICA Y ZONA VERDE CLUB UNION	Cra 32 Cll 63	CONUCOS
13	PARQUE BOLIVAR	Cra 22 Cll 37	BOLIVAR
13	PARQUE ANTONIA SANTOS	Cra 22 Cll 33	ANTONIA SANTOS
13	PARQUE DE LOS NIÑOS	Cra 27 Cll 32	ANTONIA SANTOS
13	PARQUE LAS AMERICAS	Cra 38 Cll 33	ALVAREZ
13	GLORIETA ESTADIO Y GLORIETA UIS	CARRERA 30 CALLE 14 Y CARRERA 27 CALLE 14	SAN ALONSO
15	ROMERO	CALLE 45 CON CRR 11 Y 12	GARCIA ROVIRA
15	GARCIA ROVIRA	CALLE 36 Y 37 ENTRE CRR 10 Y 11	GARCIA ROVIRA
15	CENTENARIO	CALLE 32 Y 33 ENTRE CRR 18 Y 19	CENTRO
15	SANTANDER	CALLE 35 Y 36 ENTRE CRR 19 Y 20	CENTRO
17	LAS PALMAS-LOS VENADOS	CALLE 55 CON CRR 6 OCC-Y - CALLE 57 CON CRR 7 OCC	MUTIS
17	ESTORAQUES I - II	CALLE 58 A CON CRR 43 W-CALLE 59 CON CRR 42 W	ESTORAQUEZ
17	JORGE ARENAS PEREZ-LOS FUNDADORES	CRR 3W CALLE 63- CALLE 62 CRR 7W	MUTIS

## REGISTRO FOTOGRAFICO

✓ **Parqueros:**

**Parque del Kennedy:**

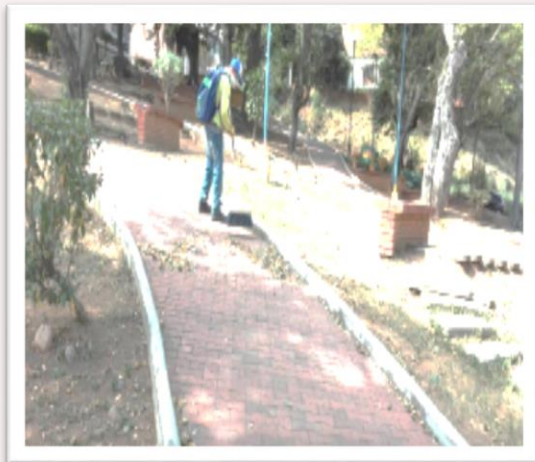

# Informe de **GESTIÓN**


Ante el Honorable  
Concejo Municipal

## Parque Girardot y Glorieta de la Carrera 9




✓ Cuadrillas:

## Carretera Antigua Al Mutis

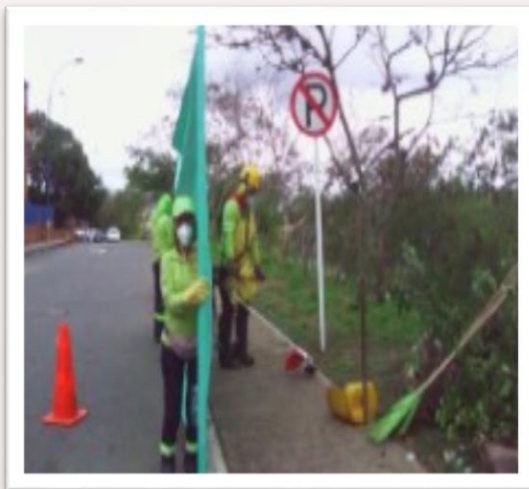

## Entrada al Barrio Bucaramanga

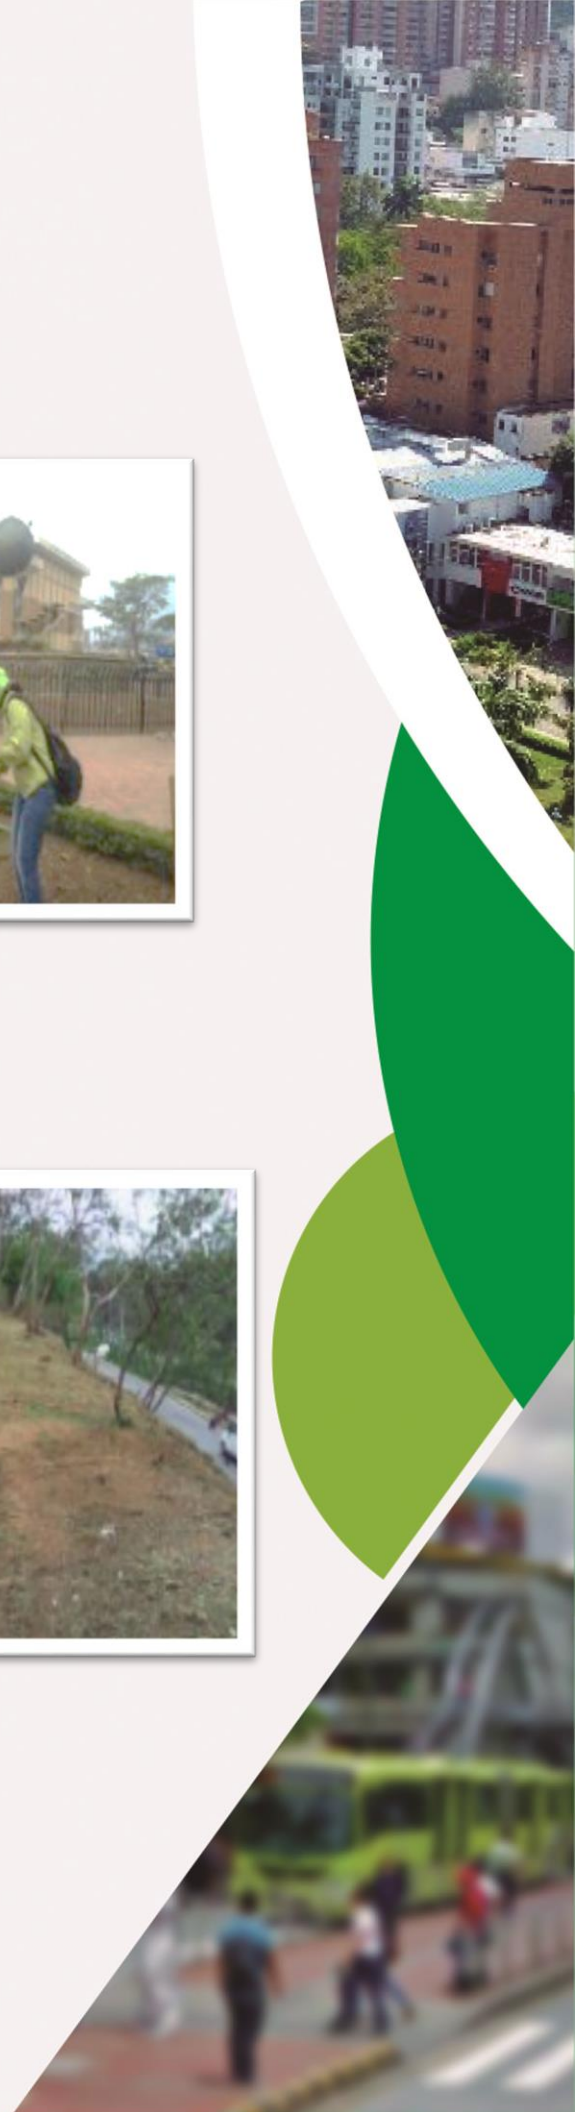

# Informe de **GESTIÓN**

Ante el Honorable  
Concejo Municipal



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
62 DE 2017	MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y ZONAS VERDES CONSISTENTE EN LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO EN LOS PARQUES INDICADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 200.519.602	29/03/2017	28/09/2017

**Estado:** En ejecución

A continuación se relaciona los 34 Parques y zonas Verdes donde se van a instalar el sistema de riego.

ITEM	PARQUE	ITEM	PARQUE
1	La vida	21	Benjamín Herrera
2	Los Niños	22	Divino Niño
3	Las Cigarras	23	Gabriel Turbay
4	San Pio	24	Unitransa bomberos
5	Centenario	25	Romero
6	San francisco	26	concordia
7	Las américas	27	fontana real
8	Leones	28	fontana
9	Uribe Uribe	29	novios
10	Bolívar	30	presentación

# Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable Concejo Municipal

11	Antonia Santos	31	olivos
12	Diamante 2	32	banderas
13	García Rovira	33	caballo de bolívar
14	Santander	34	pinos
15	Las Palmas		
16	Los periodistas		
17	3B		
18	Cristo Rey		
19	Corona- la ceiba		
20	Solón Wilches		

La Secretaría de Infraestructura actualmente adelanta la etapa precontractual del proceso de Selección abreviada SI-SAMC-003-2017 cuyo objeto es “Poda y Tala de árboles del Espacio Público Urbano del Municipio de Bucaramanga”, el cual contará con dos cuadrillas coordinadas por un Ing. Forestal, un Tecnólogo en Salud Ocupacional, 4 podadores, 12 repicadores, vehículo para transporte de herramienta y personal, camión para recolección de residuos vegetales, camión carro canasta contratado parcialmente para trabajos especiales.


- **Equipamientos Comunitarios (Sociales, deportivos, Culturales entre otros).**

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
180 DE 2016	“MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE PUNTOS VIVE DIGITAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”	\$ 53.849.606,00	31/10/2016	03/02/2017


**Estado:** Avance de obra: 100% - En proceso de liquidación

**Puntos Vive Digital atendidos:** Colegio INEM, Colegio Nacional de Comercio, Colegio Santander, Promoción Social del Norte, Colegio Oriente Miraflores y Café Madrid.

## 1. Colegio Inem

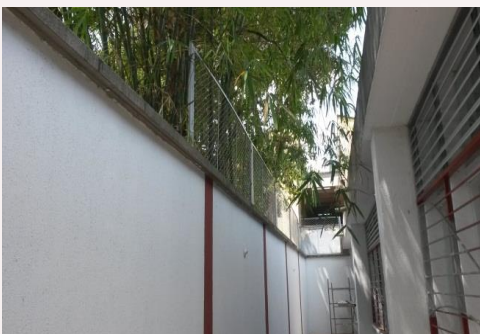

## 2. Colegio Nacional de Comercio

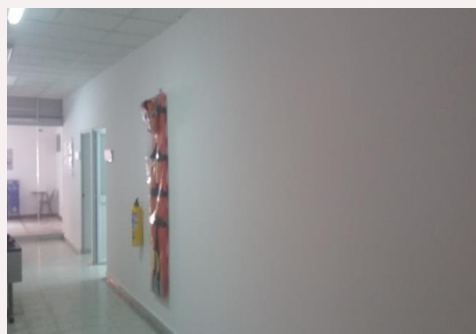



# Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable Concejo Municipal

## 3. Colegio Santander



## 4. Colegio Promoción Social del Norte



## 5. Colegio Oriente Miraflores



## 6. Café Madrid



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
556 de 2015	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SALONES COMUNALES EN 12 BARRIOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 1.499.371.237,74	27/03/2017	22/05/2017

**Estado:** 5% en ejecución

Se realizó el inicio del contrato y se recorrieron tres salones comunales junto con la interventoría el contratista y supervisor para iniciar actividades.

# Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable Concejo Municipal



- **Espacio Publico**

Se continúa ejecutando el contrato de cumplimiento a fallos judiciales, el cual se ha podido resolver 26 acciones populares en varios puntos de la Ciudad.

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
140 DE 2015	RECUPERACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL ESPACIO PÚBLICO DE CONFORMIDAD CON LAS SENTENCIAL DE ACCIONES CONSTITUCIONALES ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LAS INSPECCIONES DE CONTROL URBANO Y ORNATO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 599.726.301,8 <b>Adicional 2016</b> \$ 299.102.311,76	06/06/15	02/02/2017

**Estado:** Avance de Obra: 80%.

## BARRIO BRISAS DEL MUTIS



# Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable  
Concejo Municipal

## SECTOR DEL PARQUE SAN PIO



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
532 DE 2015	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS FALLOS POR ACCIÓN POPULAR Y DEMÁS ACCIONES DISPUESTAS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 582.030.201,5 <b>Adicional 2016</b> \$ 99.921.890,84	21/12/15	30/01/2017

**Estado:** Avance de Obra: 100%, En proceso de Liquidación

Se recuperó el espacio público en el Barrio San Francisco, Diamante II, Barrio Provenza Calle 105 desde el Puente de Provenza hasta la carrera 24 y en calle 105 con Carrera 26 frente a la cancha Fútbolomanía, San Pio, Espacio Público Barrio san Miguel Calle 51 y 51 carrera 13, Espacio Público sector el tierrero Carrera 13 con Av. Q. Seca.



**BARRIO PROVENZA CALLE 105 CON CARRERA 26 FRENTE A LA CANCHA FUTBOLOMANÍA**

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
237 DE 2016	ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA CALLE 30 A LA ALTURA DEL PARQUE DE LOS NIÑOS Y CALLE DE LOS ESTUDIANTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 59.570.289,00 <b>Adicional 2017</b> \$ 8.338.117,00	23/12/16	07/03/2017

**Estado:** Avance de Obra: 90%, En ejecución



## LÍNEA ESTRATÉGICA 6: INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD

### 6.1. PROGRAMA: MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA

- **Mantenimiento Malla Vial Urbana**

La Secretaria de Infraestructura adelanta los presupuestos para las obras de parcheo de huecos, fallos e implementación de obras civiles en la malla vial del Municipio de Bucaramanga.

- **Megaobras de Infraestructura Vial**

# Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable Concejo Municipal

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
272 de 2014	CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL MESÓN DE LOS BÚCAROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	Valor Inicial \$ 54.909.500.000 Adicional 1. \$ 14.516.066.713 Adicional 2. \$ 10.945.041.309 <b>Valor Total \$ 80.370.608.022</b>	10 de septiembre de 2014	7 de ABRIL de 2017

**Estado:** Avance de Obra: 87% ejecutado

En virtud de la orden judicial mencionada y ante la imposibilidad de continuar con las obras en el sector de la Escuela La Normal de Bucaramanga y la Glorieta, el Municipio de Bucaramanga debe suspender la ejecución de las obras INTERCAMBIADOR VIAL MESON DE LOS BUCAROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.



Deprimido eje 3 Avenida Quebrada seca al occidente



Tramo 2 – eje 8 carreras 27 Sentido norte sur

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
331 de 2014	INTERVENTORÍA AMPLIACIÓN DEL CORREDOR VIAL PRIMARIO BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA SECTOR PUERTA DEL SOL - PUENTE PROVENZA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	Valor Inicial \$ 7.518.263.339,5 Adicional 1. \$ 5.640.000.000 Adicional 2. \$ 298.124.079,52 <b>Valor Total \$ 13.158.263.339,5</b>	01 de Octubre de 2014	31 de Enero de 2017

**Estado:** Avance de obra: 85.17%

# Informe de **GESTIÓN**

Ante el Honorable  
Concejo Municipal



## DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO POR EL CONTRATISTA

### Tramo 1. Intercambiador de la Puerta del Sol – Acceso Norte Viaducto García Cadena

- Localización, replanteo y control topográfico permanente con una comisión.
- Se realizó la reparación del MR (Carril exclusivo Metrolínea) con concreto fast track en el sector de las Hormigas.
- Se mejoró el acabado del concreto de las vigas del puente de la 33.

- Se adelantaron actividades de excavación con máquina, vaciado de concreto de limpieza, armado de acero refuerzo, vaciado de concreto de 280 kg/cm<sup>2</sup> (módulos 1 y 2) de zarpa y vástago del muro de contención en el CP-06.
- Instalación de baranda del puente peatonal Antonia Santos
- Instalación de bordillos en separación entre MR y pavimento asfáltico
- Instalación de escultura el “camino de las hormigas”

### **Tramo 2. Acceso Norte Viaducto García Cadena – Acceso Sur Viaducto García Cadena**

- En el Viaducto García Cadena se adelantó el vaciado de concreto de 280 kg/cm<sup>2</sup> en andén (Costado Occidental).
- Se realizó la instalación de baranda anti suicidio y pasamanos sobre barrera de tráfico, en costado occidental del Viaducto García Cadena.
- Se realizó la adecuación de las juntas de dilatación sobre estribo Norte, Pila No. 1 y Pila No. 4, y la adecuación de juntas sobre andén oriental del Viaducto La Unión.

### **Tramo 3. Acceso Sur Viaducto García Cadena –Puente de Provenza.**

- Localización, replanteo y control topográfico permanente a lo largo de todo el tramo.
- Se viene adelantado la conformación e instalación de subbase granular, base granular, imprimiendo e instalación de MDC-2 en los ejes 24 y 80, en el sector frente al colegio 1 2 3 y conjunto Neptuno.
- Se adelantó el vaciado de concreto de 280 kg/cm<sup>2</sup> para barreras de tráfico sobre el deprimido el diamante II.
- Se adelantó instalación de MDC-2 (segunda capa) en entrada al deprimido el diamante II y reparación de carpeta asfáltica en salida del mismo.
- Se continuo la instalación de concreto hidráulico MR-45, en retorno operacional de metrolínea en sector del puente peatonal diamante II.
- Instalación de espacio público en el sector del Conjunto Multifamiliares.
- Se realizó el armado de acero de refuerzo y vaciado de concreto de 210 kg/cm<sup>2</sup> en muros de la rampa del costado occidental del puente peatonal del Diamante II, instalación de metaldeck e instalación de baranda peatonal.
- Se viene adelantado la construcción de Redes secas, Redes húmedas y actividades de espacio público, a lo largo del tramo 3.

## **6.2 PROGRAMA: MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL RURAL**

La Secretaria de Infraestructura realizó: Mantenimiento periódico a las diferentes vías del sector urbano y rural que contempla la Ampliación, Nivelación, Perfilado, Cuneteo y Afirmado de Vías Internas, actividades realizadas con la

# Informe de **GESTIÓN**

Ante el Honorable  
Concejo Municipal

Maquinaria disponible (3 Minicargador, 1 Motoniveladora y 2 Volquetas) Adscrita a este Despacho.

A continuación algunos sectores intervenidos.

## **Corregimiento N° 1:**

- V. San Pedro Bajo
- V. San Pedro Alto
- V. San Cayetano
- V. Santa Rita
- V. Los Angelinos y

## **Corregimiento N° 2:**

- V. Magueyes (Incluido ramales)
- V. Capilla Alta y
- V. Capilla Baja.

## **Corregimiento N° 3:**

- V. La Malaña
- V. Gualilo
- V. Buenavista
- V. Los Leones
- V. Retiro Chiquito
- porte Agua Potable Sector La Malaña.

## **Sector Urbano:**

- B. Bonanza Campestre.
- Calle 45 entre Cárcel Mujeres y Quinta Estrella.

Vía el Bueno entre Mercado Campesino y Terminal Transporte



Actualmente se encuentra actualizado el proyecto para el MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. Para realizar el proceso de la CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN LOS DIFERENTES CORREGIMIENOS QUE COMPRENDE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE



BUARAMANGA. Los presupuestos que se adelantan ascienden a la suma  
\$ 500.000.000,00

### 1.3 PROGRAMA: SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS Y RURALES

Se continúa con la ejecución del Convenio interadministrativo No. 2133635 de 2013 – Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo –FONADE, el cual apporto \$ 1.722.201.220,00 y el Municipio de Bucaramanga \$ 248.914.788,00

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
50 de 2016	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO BARRIO GRANJAS DE PROVENZA - MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.971.561.921,00	04/10/2016	03/06/2017

**Estado:** Avance de obra: 65% en ejecución

Comprende la construcción del alcantarillado pluvial y sanitario y la canalización de aguas lluvias esta obra requiere recursos adicionales para la pavimentación vía principal por valor de \$380.000.000,00



### 6.4. PROGRAMA: ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL

La Secretaria de Infraestructura a través de la Oficina de Alumbrado Publico ha realizado Mantenimiento de la siguiente Manera:

# Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable  
Concejo Municipal

MES	PQR'S RECIBIDAS EN EL MES	PQR'S ATENDIDAS DEL MES	TIEMPO DE RESPUESTA (DIAS)	PQR'S ATENDIDAS DE OTROS MESES
Enero	1160	1037	2	109
Febrero	1029	970	2	129
Marzo	1188	1023	2	59
<b>TOTAL</b>	<b>3.377</b>	<b>3.030</b>		<b>51</b>
<b>TOTAL PQR'S RECIBIDAS I TRIMESTRE 2017</b>				<b>3.377</b>
<b>TOTAL PQR'S ATENDIDAS I TRIMESTRE 2017</b>				<b>3.081</b>

Se continúa con la ejecución de los contratos de mantenimientos para el alumbrado público en cumplimiento de los siguientes procesos contractuales:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
54 de 2016	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN	EICON LTDA (\$473.843.532)	16 de Junio de 2016	15 de Abril de 2017
55 de 2016	DIFERENTES SECTORES DE LA ZONA URBANA Y ZONA RURAL	EME INGENIERIA S.A.(\$829.386.532)		
57 de 2016		IGS INGENIERIA E.U.(\$446.808.720)		

Estado: Avance de obra: 90% en ejecución

## SECTORES A INTEVENIR

- ✓ **GRUPO EICON** Intervienen: Comunas 1, 10, 11, 13, 16 y Corregimiento 2
- ✓ **GRUPO EME** Intervienen: Comunas 4, 5, 7, 12, 17, Corregimiento 3 y Viaducto Provincial
- ✓ **GRUPO IGS** Intervienen: Comunas 2, 3, 6, 8, 9, 14, 15 y Corregimiento 1


## PROYECTOS ADJUDICADOS EN DICIEMBRE

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
003 de 2017	CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO VIA CENFER – PUERTA DEL SOL –GRUPO 1 –CENFER INTERCAMBIADOR EL BUENO	\$ 3.296.758.330,00	15/02/2017	14/07/2017

Estado: Avance de obra: 30% en ejecución

# Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable Concejo Municipal

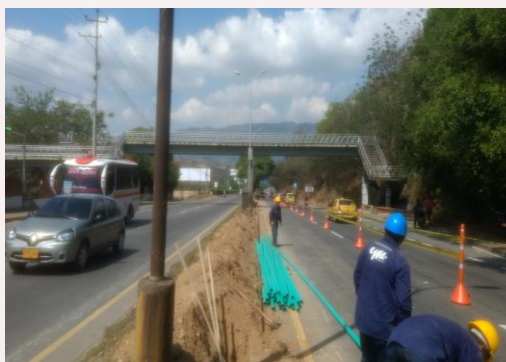

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
004 de 2017	CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO VIA CENFER – PUERTA DEL SOL. GRUPO 2 – INTERCAMBIADOR EL BUENO INTERCAMBIADOR PUERTA DEL SOL	\$ 2.881.620.453,00	15/02/2017	17/07/2017

Estado: en ejecución 10% avance de obra



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
008 de 2017	PARQUE GUAYACANES - BAVARIA II – COMUNA 1 Y VILLA DEL PRADO – COMUNA 5	\$ 1.239.726.530,00	16/02/2017	15/07/2017

Porcentaje Ejecución: Bavaria II - 32%

# Informe de **GESTIÓN**

Ante el Honorable  
Concejo Municipal

Porcentaje Ejecución: Villa del Prado – 8%



## PROCESOS ADJUDICADOS PROXIMOS A INICIAR

### **SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED – ETAPA 1 COMUNA 2**

**Valor:** \$ 1.181.332.040  
**Fecha de Adjudicación:** Marzo 22 de 2017  
**Contratista:** CELSA S.A.S  
**Barrios a Intervenir:** Esperanza I, II, III, Villa Helena - San Cristóbal, Vía Matanza desde CAI la Virgen, Lizcano I y II, Los Ángeles, Mirador del Norte Y Norte Club.

### **SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED – ZONA CENTRO**

**Valor:** \$ 388.033.824  
**Fecha de Inicio la instalación:** Abril 04 de 2017  
**Contratista:** ENERGÍA Y CONTROLES LTDA  
**Zona a intervenir:** Calle 33 a la Calle 37 Y Carrera 11 a la Carrera 19

## PROCESOS PUBLICADOS EN LA PAGINA SECOP

### **CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL TRAMO 4 CENTROABASTOS – CAFÉ MADRID**

**Valor:** \$ 4.517.468.817,00  
**Proceso:** SI-LP-002-2017  
**Fecha de Adjudicación:** Mayo 23 de 2017  
**Plazo de Ejecución:** 5 meses

# Informe de **GESTIÓN**

Ante el Honorable  
Concejo Municipal

## ❖ **INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED – ETAPA 1 COMUNA 2**

**Valor:** \$ 268.068.622,00  
**Proceso:** SI-SAMC-001-2017  
**Fecha de Adjudicación:** Mayo 02 de 2017  
**Plazo de Ejecución:** 3 meses

## ❖ **ACTIVIDADES DE PODAS PARA EL DESPEJE DE LUMINARIAS Y REDES QUE INTERFIERAN CON EL ALUMBRADO PÚBLICO**

**Valor:** \$ 549.256.735,00  
**Proceso:** SI-SAMC-002-2017  
**Fecha de Adjudicación:** Abril 28 de 2017  
**Plazo de Ejecución:** 7 meses

### **PROYECTOS EN PROCESO PRE-CONTRACTUAL, PROXIMOS A PUBLICAR EN EL SECOP**

CONCEPTO	VALOR
CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO – ETAPA 2 EN EL BARRIO CIUDAD BOLIVAR	\$ 1.696.085.045
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CANCHAS DE LOS BARRIOS BETANIA, VILLALUZ CAMPESTRE, CAMPO MADRID, VILLA ALEGRÍA II, CANELOS, CRISTAL ALTO Y CRISTAL BAJO.	\$ 2.015.560.959

### **PROYECTOS EN PROCESO DE DISEÑO**

- ✚ SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO A LED, EN LAS COMUNAS 1, 2, 3, 4 Y 5
- ✚ ILUMINACIÓN INTERACTIVA EN LA CRA 22 – ZONA DEL CALZADO
- ✚ ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA E INTERACTIVA – CALLE DE LOS ESTUDIANTES
- ✚ ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA E INTERACTIVA – PLAZOLETA IMCUT
- ✚ ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA – TANQUE DEL AMB PUERTA DEL SOL
- ✚ ILUMINACIÓN FUNCIONAL Y ARQUITECTÓNICA – PLAZA DE LOS EDECANES (Parque Casa Bolívar).
- ✚ ILUMINACIÓN FUNCIONAL Y ARQUITECTÓNICA – PARQUE MORRORICO

## 7. OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR LA SECRETARIA

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
83 de 2016	MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA LA ESTACION DE POLICIA CENTRO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	\$ 1.000.727.512,65	14/09/2016	13/02/2017

**Estado:** en ejecución 70% avance de obra

Se realizó el cambio de cubierta, el cambio de pisos y cielo rasos, remodelación de baños y la recuperación de fachadas, además del cambio de todo el sistema eléctrico, hidráulico y sanitario



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
48 de 2017	COSNTRUCCIÓN DE 29 ALBERGUES TEMPORALES EN EL SECTOR EL CABLE DEL BARRIO CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	\$ 969.608.469,00	14/09/2016	13/02/2017

**Estado:** en ejecución 5% avance de obra



Actualmente se adelantan los convenios con las diferentes empresas de servicios públicos cuyo objeto: GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA AL CONTRATISTA, CON DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS QUE SE APROPIAN EN EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS DEL CONTRATANTE DESTINADOS A SUBSIDIAR LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO A LOS USUARIOS DE LOS EXTRATOS 1, 2 Y 3 Y PILAS PUBLICAS.

## 8. CONTRATOS QUE VENIAN EN EJECUCION DE LA VIGENCIA 2015

### 8.1 Contrato Suspendidos

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
296 de 2015	ADECUACION DE TRES HOGARES INFANTILES EL TRENCITO ACOMUNAL ZONA 4 Y DOMINGO SABIO PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 536.273.840,97	07 de Septiembre de 2015	07 de Diciembre de 2015.

**Estado:** Porcentaje de Ejecucion: 35%.

**Estado:** Es de anotar que ante ajustes en beneficio de las obras contratadas, se realizó una cualificación y cuantificación de unos ítems no previstos.

### 8.2 Contratos en Ejecucion vigencia 2015

No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
No 276-2015	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS DIFERENTES COMUNAS Y CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 5.499.784.553,56 ADICIONAL \$ 310.206.571,06	17/11/2015	17/03/2017

**Estado:** Avance de Obra: 100% ejecutada

Se ejecutaron obras en las 17 comunas y 3 corregimientos para un total de obras de 64.

# Informe de **GESTIÓN**

Ante el Honorable  
Concejo Municipal



Demolición y construcción de tres Kiosco  
Barrió Candiles



Mejoramiento de cancha Parque Romero



Construcción de Parque Infantil  
Colegio comuneros



Mejoramiento de cancha Parque barrio  
Estoraques II



Mejoramiento acueducto vereda Magueyes



Mejoramiento Tramo de via Vereda  
Retiro Grande



En estos momentos ya se ejecutaron las obras al 100% en las 17 comunas y los tres corregimientos con un total de obras de 64 puntos.

Actualmente este despacho realiza el recibo de cada punto, con el fin de realizar el balance financiero y así proceder a liquidar el contrato.

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
186 de 2015	ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES DE DISEÑOS A DIFERENTES CENTROS DE SALUD Y DISEÑOS DE CENTROS DE SALUD INDICADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 878.995.800	13 de Diciembre de 2015	07/04/2017

A la fecha la situación actual de los diseños Centros de Salud presenta el siguiente estado:

A la fecha se encuentran realizados 9 diseños arquitectónicos, los cuales no fueron aprobados por secretaria de salud departamental por errores en diseño.

El centro de salud de Antonia Santos se encuentra en consecución de lote. A la fecha no se tiene definido el mismo por las dificultades con el POT.

## 9. ACCIONES POPULARES

Durante el periodo de Enero a Marzo de 2017, los Juzgados Administrativos y el Tribunal Administrativo de Santander han proferidos en ACCIONES POPULARES y ACCIONES DE TUTELA, fallos a favor y en contra en los procesos que cursan en los despachos judiciales de esta Secretaria de la Siguiete manera:

### 1. ACCIONES DE TUTELA:

Procesos Notificados:	08
Procesos tramitados	08
Fallos a favor de primera instancia	08
Pendientes de fallo (en apelación)	03

A continuación relaciono las Acciones de tutela tramitadas durante el trimestre

PROCESO No.	JUZGADO	ACCIONANTE	ORDEN JUDICIAL	ESTADO ACTUAL
2016-0312	7o Civil del Cto.	Esperanza Pamplona	El fallo fue a favor de la Secretaria de Infraestructura. Se condenó al INVISBU	Pendiente reubicacion
2017-0009	6° Civil Municipal Ejecución Sent.	Jhon Fredy Velasco	El fallo fue a favor del Municipio	Archivado
2017-0009	15 Civil Municipal	Eduardo Fandiño	El fallo de primera instancia fue a favor del Municipio	Apeló el Demandante.
2017-0013	11 P.M. F.C.G.	Dory Janeth Ruiz	El fallo de primera instancia fue a favor del Municipio	Apeló la Demandante.
2017-0018	21 P.M. F.C.G.	Marciana Carrillo	El fallo de primera instancia fue a favor del Municipio	Apeló la Demandante.
2017-0039	19 Civil Municipal	Maria Susana Marquez	El fallo fue a favor del Municipio	Archivado
2017-0032	6° P.M. con F.C.	Torcoroma Sanchez	El fallo fue a favor del Municipio	Archivado
2017-0024	8° P.M. con F,C,	Edwin Patiño Garcia	El fallo fue a favor del Municipio	Archivado

## 2. ACCIONES POPULARES:

Sentencias a favor 5  
Sentencias en contra 2

PROCESO No.	JUZGADO	SENTENCIA	ORDEN JUDICIAL	ESTADO ACTUAL
2010-0334	TAS	JUZGADO ARCHIVA	FALLO CUMPLIDO	Archivado
2010-0643	TAS.	FALLO CUMPLIDO	ARCHIVAR	Archivado
2015-0371	13° Administrativo	SE PACTO	No se condenó al Municipio	Archivado
2015-0309	9° Administrativo	FALLO A FAVOR	No se condenó al Municipio	Archivado
2010-0157	15° Administrativo	En contra	FALLO CUMPLIDO Cierra Incidente Desacato	Archivado
2010-310	15° Administrativo	En Contra	FALLO CUMPLIDO cierra Incidente Desacato	Archivado
2010-0285	15° Administrativo	FALLO CUMPLIDO	Cierra Incidente	Archivado
2004-1910	15° Administrativo	FALLO CUMPLIDO	Cierra Incidente	Archivado

# Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable  
Concejo Municipal

2009-0240	15° Administrativo	FALLO CUMPLIDO	Cierra Incidente	Archivado
2015-0389	7° Administrativo	FALLO A FAVOR	ARCHIVADO	Archivado
2004-0641	15° Administrativo	FALLO CUMPLIDO	CIERRA INCIDENTE	Archivado
2010-0154	15° Administrativo	FALLO CUMPLIDO	CIERRA INCIDENTE	Archivado
2012-0098	9° Administrativo	FALLO A FAVOR	ARCHIVADO	Archivado
2010-0174	15° Administrativo	FALLO CUMPLIDO	CIERRA INCIDENTE	Archivado
2004-2259	10° Administrativo	EN CUMPLIMIENTO	CIERRA INCIEDENTE	Archivado
2014-0391	12° Administrativo	FALLO A FAVOR	EN EJECUTORIA	EN EJECUTORIA
2016-0203	11° Administrativo	Falló en contra	En apelación ante el Tas	APELADO
2016-0137	5° Administrativo	Falló en Contra	En Apelación ante el Tas	APELADO

En la Oficina Jurídica durante el periodo de Octubre a Diciembre se tramitaron las siguientes funciones relacionadas con la defensa judicial del Municipio:

**DIEZ (10)** procesos de Acciones Populares. Se logró el archivo de estos procesos

**CUATRO (4)** Demandas nuevas contestadas durante el periodo.

**CINCO (05)** diligencias de audiencias en los Juzgados

**SEIS (6)** trámites de pago a los actores Populares

**CINCO (5)** Reuniones. Se asistió en representación de la Sec. Infraestructura

**SIETE (07)** Comités. Asistencia a citación para Comité de Conciliación.

**TRES (03)** REUNIONES comités de Verificación cumplimiento fallos

Las funciones adelantadas para ejercer la defensa judicial del Municipio se resumen así:

Fallos a favor en acciones constitucionales 13

Fallos en Contra en acciones constitucionales 02

Trámite para cumplimiento judiciales (respuesta incidentes)	13
Asistencia a diligencias judiciales	23
Asistencia a Comités de Verificación	05
Asistencia a reuniones	17

### 10. RELACIÓN PROCESOS SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

No.	No. PROCESO	OBJETO	VALOR	ESTADO
1	SI-SASI-001-2017	SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - FASE 1 COMUNA 2	\$1,181,943,911	Adjudicado por medio de Subasta Inversa
2	SI-SAMC-001-2017	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECNOLOGÍA LED PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA ¿ FASE 1 COMUNA 2	\$268,068,622	En etapa precontractual
3	SI-SAMC-002-2017	CONTRATAR ACTIVIDADES DE PODA PARA EL DESPEJE DE LUMINARIAS Y REDES QUE INTERFIERAN CON EL ALUMBRADO	\$549,256,735	En etapa precontractual
4	SI-LP-001-2017	ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS O DATA CENTER EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN, SOPORTE E IMPLEMENTACIÓN DE TIC, BUCARAMANGA, CENTRO ORIENTE DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER	\$1,440,000,000	En etapa precontractual
5	SI-SAMC-003-2017	PODA Y TALA DE ARBOLES DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$491,549,140	En etapa precontractual

### 11. PROYECTOS PRESENTADOS Y VIABILIZADOS

No.	No. REGISTRO	OBJETO	VALOR VIGENCIA	ESTADO
1	20160680010121	MEJORMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS TRANSVERSALES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 1.336.050.000,00	Actualizado a Vigencia 2017

# Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable  
Concejo Municipal

2	20170680010012	APOYO AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA OBRA AMPLIACIÓN DEL CORREDOR VIAL PRIMARIO BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA. SECTOR PUERTA DEL SOL - PUENTE DE PROVENZA.	\$ 298.124.079,52	Se formuló para el adicional de la interventoría del tercer carril, ya fue viabilizado
3	20160680010226	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.	\$ 630.900.000,00	Actualizado a Vigencia 2017
4	20170680010016	APOYO EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.	\$ 800.000.000,00	Se formuló para el taller de arquitectura, ya fue viabilizado
5	20160680010154	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 5.549.010.928,56	Actualizado a Vigencia 2017
6	20170680010002	APOYAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INTERCAMBIADOR MESÓN DE LOS BÚCAROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. FASE II.	\$ 306.473.740,00	Se formuló para el adicional de la interventoría del mesón de los búcaros, ya fue viabilizado
7	20160680010231	MEJORAMIENTO , CONSTRUCCION Y ADECUACIÓN DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO EN ALGUNOS BARRIOS DE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DEPARTAMENTO SANTANDER.	\$ 685.027.403,00	Actualizado a Vigencia 2017. Se envió a la Gobernación para asignación de recursos.
8	20170680010029	CONSTRUCCIÓN DE 29 ALBERGUES TEMPORALES EN EL SECTOR EL CABLE DEL BARRIO CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.	\$ 977.921.597,00	Se formuló para atención por calamidad pública, ya fue viabilizado
9	20170680010046	SUBSIDIO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO A LA POBLACIÓN DE ESTRATO 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.	\$ 3.392.324.680,00	Se formuló para convenios con empresas de sericios públicos, ya fue viabilizado

10	20160680010250	ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA CALLE 30 A LA ALTURA DEL PARQUE DE LOS NIÑOS Y CALLE DE LOS ESTUDIANTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 8.338.117,00	Se formuló para el adicional del contrato, ya fue viabilizado
11	20160680010196	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA BARRIO KENNEDY FASE II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.	\$ 2.191.797.569,18	Se actualizó para la vigencia
12	20160680010256	MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.		Se encuentra en proceso de actualización.
13	-----	CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREO-DEPORTIVO EN EL BARRIO CRISTAL BAJO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 1.170.377.509,43	Se formuló para adelantar la contratación de las obras e interventoría, se encuentra en revisión del banco de proyectos.
14	-----	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PARA TERMINACIÓN DE LA GRAN SALA DEL TEATRO SANTANDER MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.	\$ 2.500.000.000,00	Fue radicado en el banco de proyectos y se encuentra en ajustes por parte del teatro Santander.

### 12. TOTAL INVERSION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 31 DE MARZO DE 2017

PROGRAMAS	INVERSION	%
ADMINISTRACION ARTICULADA Y COHERENTE	\$ 813.533.333,33	
REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE	\$ 383.219.067,00	2,21
INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO	\$ 4.621.404.642.85	24,60
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA	\$ 604.597.819,52	3,49
ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL	\$ 11.510.409.516.29	69,69
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 17.933.164.378,99</b>	<b>100 %</b>
