



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga

**GOBERNAR
ES HACER**

**INFORME DE GESTION - 01 enero – 31 marzo de 2020
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**

INFORME DE GESTION A 31 DE MARZO DE 2020

En el presente informe se resume los principales avances que la Secretaria de Infraestructura ha generado en los tres primeros meses del año, en el cual ha ejecutado y realizado las gestiones pertinentes para el control del avance de las diferentes obras que ejecuta la Secretaria.

A continuación, se detalla la gestión que ha realizado la Secretaria de Infraestructura en el primer trimestre de 2020.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: GOBERNANZA DEMOCRÁTICA

1.1 PROGRAMA: PRESUPUESTOS INCLUYENTES

Se continua con la ejecución de proyectos en cumplimiento de los presupuestos participativos, los cuales se muestran a continuación:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
323 de 2019	ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.000.392.123,45 Adicional \$ 243.305.920,44	01/10/2019	20/05/2020

Estado: Avance de obra: 29,31% - Suspendido

Algunos sitios intervenidos en diferentes sectores de la ciudad.



Barrio Ciudad Bolívar



Provenza



Pan de Azúcar

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
338 de 2019	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO URBANO MEDIANTE EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO I	\$ 1.475.498.399,47 Adicional 1 \$ 107.851.016,90 Adicional 2 \$ 302.163.063,55	15/10/2019	18/05/2020

Estado: Suspendido


Sitios a intervenir y porcentajes de avance

N°	BARRIO	UBICACIÓN	% DE AVANCE
1	KENNEDY	Cra 12 entre calles 10 y 11 Norte	50%
2	ALTOS DEL KENNEDY	Cra 11 entre calles 28A y 28 Norte	70%
3	VILLA ROSA III	Carrera 18A con calle 11A	70%
4	NUEVA COLOMBIA	Calle 2 entre Cra 16D y 17	60%
5	LOS ÁNGELES	Calle 2 entre Cra 16D y 17	70%
6	CENTRO	Carrera 15 entre calles 33 y 34	0%
7	LA JOYA	Carrera 8 oeste entre calles 36 y 37	5%
8	CAMPO HERMOSO	Carrera 12 Oeste entre calles 46 y 47	45%
9	ESTORAQUES	Carrera 43 Oeste entre calle 58ª y 59	15%

PARQUE BARRIO LOS ANGELES



PARQUE BARRIO NUEVA COLOMBIA

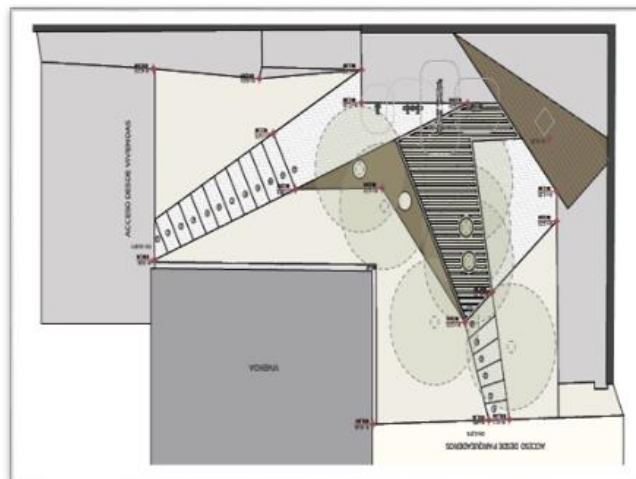

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
339 de 2019	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO URBANO MEDIANTE EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO 2	\$ 1.152.739.167,19 Adicional 1 \$ 22.406.073,26 Adicional 2 \$ 141.014.280,87	15/10/2019	18/05/2020

Estado: Suspendido

Sitios a intervenir y porcentajes de avance

N°	BARRIO	UBICACIÓN	% DE AVANCE
1	SANTANDER	Carrera 5 oeste con calle 31	19%
2	BALCONCITOS	Calle 55 con cra 5 Occidente	29%
3	NARANJOS	Carrera 5 # 58-42	40%
4	URBANIZACION LOS ALMENDROS	Carrera 8 64-63	90%
5	CIUDAD BOLIVAR – SECTOR 20 DE JULIO	Calle 64 # 64-16	80%
6	CIUDAD BOLIVAR – SECTOR GUAYACANES	Calle 64 Cra 6ª	45%
7	PLAZUELA REAL	Calle 65 Cra 10	90%
8	HÉROES	Calle 65 Cra 6 Oeste	5%
9	MONTERREDONDO	Carrera 36 oeste calle 65	38%

PARQUE BARRIO BALCONCITOS



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
340 de 2019	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO URBANO MEDIANTE EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO 3	\$ 1.092.913.615,91 Adicional 1 \$ 32.248.246,29	15/10/2019	18/05/2020

Estado: Suspendido

Sitios a intervenir y porcentajes de avances

N°	BARRIO	UBICACIÓN	% DE AVANCE
1	SANTA MARIA	Calle 103B entre carreras 12A y 13	90%
2	MANUELA BELTRAN	Calle 103F con carrera 11A	48%
3	CRISTAL BAJO	Carrera 15 con calle 127 ^a	10%
4	SAN PEDRO CLAVER	Calle 74 con cra 30	57%
5	EL SOL	Calle 73 Bis con cra 31	41%
6	ANTONIA SANTOS SUR	Calle 71 con cra 30 ^a	80%
7	MERCEDES	Carrera 28 entre calles 62 y 63	38%

PARQUE BARRIO ANTONIA SANTOS



SENDEROS Y KIOSCO BARRIO SANTA MARIA



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
326 de 2019	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES MAGUEYES, MONSERRATE, ROSA BLANCA Y LAS GRANJITAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"	\$ 504.058.620 Adicional \$ 102.168.577,00	01/10/2019	27/04/2020

Estado: Suspendido

Se están ejecutando las actividades correspondientes a reposición de tubería de conducción en diferentes diámetros para cada uno de los 4 acueductos intervenidos, construcción de bocatomas, desarenadores y tanquilla para los siguientes acueductos:

- Acueducto Veredal Monserrate
- Acueducto Veredal Rosa Blanca
- Acueducto vereda Las Granjitas
- Acueducto vereda Magueyes

MEJORAMIENTO A CUEDUCTO	% DE AVANCE
Acueducto Monserrate	70%
Acueducto Magueyes	50%
Acueducto Rosa Blanca	50%
Acueducto Las Granjitas	60%

RELLENO COMPACTADO EN MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN



Vereda Monserrate



Vereda Granjitas –Pedregal Bajo

**REDES DE ADUCCION
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC RDE-21, DIAMETRO Ø = 2"**



**BOCATOMA EN CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 Ó 3000PSI) -
IMPERMEABILIZADO (MEZCLADO EN SITIO)**



Así mismo se encuentran ejecutando obras de presupuestos participativos en los siguientes procesos:

- REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LOS SALONES COMUNALES, el cual contempla el salón comunal de Café Madrid y Gaitán.
- MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA, el cual contempla los siguientes sitios:

	BARRIO	DIRECCIÓN	METROS
1	PUERTO RICO	Carrera 30 entrada principal barrio puerto rico	70 ML
2	ANTONIO NARIÑO	Carrera 7 entre calles 21 y 23	80 ML
3	GIRARDOT	Carrera 8 entre calles 29 y 31	110 ML
4	TOLEDO PLATA	Calle 106 entre Carreras 15b y 15c	70 ML
5	ALVAREZ- LAS AMERICAS	Carrera 40 entre calles 32 y 33	120 ML
6	ALVAREZ- LOS ALPES	Calle 31a entre carreras 41 y 44	100 ML
7	ANTONIA SANTOS CENTRO (Paseo del Comercio)	Carrera 26 entre las Calles 31 a la 35	300 ML
8	MIRAFLORES	Calle 19 #54-13 hasta Calle 21 #52a-04	120 ML
9	BUENAVISTA	La Ye- entre Carrera 66a entre Calle 19 a la 21	100 ML
11	GUAYACANES	Calle 70a con Carrera 70 entrada por la parte superior de guayacanes	120 ML
12	VILLA SARA	Calle 15c entre carreras 105 y 106	120 ML
13	BRISAS EL MUTIS	*Carrera 13aw N° 60 bis-71 hasta Carrera 13aw N° 60bis-93 *Carrera 14w N° 60 bis-65 Hasta la Carrera 14w N° 60 bis- 93	135 ML

Los cuales ya se encuentran ejecutados.

- CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MALLA VIAL VEREDAL, en el cual contempla los siguientes sitios:

CORREGIMIENTO 1	Vereda San Ignacio	Sector el Mango
	Vereda San Pedro	Sector el Tanque
	Vereda San Cayetano	Sector curva el Mamón
CORREGIMIENTO 2	Vereda Cuchilla Alta	Sector Palo Blanco
	Vereda Capilla Baja	Sector curva escondida
CORREGIMIENTO 3	Vereda San José	Sector el Caracolí
	Vereda Santa Bárbara	Sector 10 de Mayo, tramo la UDES km 8+500

Los cuales ya se encuentran ejecutados.

LINEA ESTRATEGICA 2: INCLUSIÓN SOCIAL

2.1. PROGRAMA: ADULTO MAYOR Y DIGNO

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
204 de 2019	MEJORAMIENTO DEL CENTRO VIDA AÑOS MARAVILLOSOS EN LA CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.068.967.088,83	22/07/2019	20/05/2020

Estado: Avance de obra: 74% Suspendido



LINEA ESTRATEGICA 3: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

3.1 PROGRAMA: SENDEROS PARA LA VIDA

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
303 de 2019	CONSTRUCCION DE SENDEROS DE LOS CAMINANTES EN LOS CERROS ORIENTALES DE BUCARAMANGA. - GRUPO 1-Puerta Corcovado	\$ 4.835.552.381,69	30/08/2019	14/06/2020

Estado: Avance de obra: 37,01% - Suspendido



Canalización y alimentación eléctrica de luminarias en terraza corcovado



Ejecución de ultimas 2 capas tratamiento en plazoleta k 0+220

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
307 de 2019	CONSTRUCCION DE SENDEROS DE LOS CAMINANTES EN LOS CERROS ORIENTALES DE BUCARAMANGA. - GRUPO 2-Puerta Jardín	\$ 5.605.876.851	16/09/2019	30/12/2019

Estado: Avance de obra: 31,80% - Suspendido



Cajeo y nivelación de subrasante. Vía Barrio los Anayas.



Compactación de la subrasante. Vía al Barrio los Anayas.

3.2 PROGRAMA: REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE

La Secretaria de Infraestructura firmo convenio Interadministrativo para la construcción de un muro, el cual es preciso mencionar:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
226 de 2019	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS, FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES ENTRE EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PARA LA MITIGACION DEL RIESGO DE DESLIZAMIENTO SOBRE LA CARRERA 34 ENTRE LA CALLE 98 Y LA CALLE 104 DEL BARRIO BELLAVISTA CASAS COSTADO POSTERIOR DEL CONJUNTO RESIDENCIAL BALCON DEL TEJAR V ETAPA DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA AP 2002-2646 DEL DOS (02) DE AGOSTO DE 2006 EMITIDA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER.	\$ 1.072.924.729,93 Aporte Municipio Floridablanca (\$ 536.462.364,96) Aporte Municipio de Bucaramanga (\$ 536.462.364,96)	27/06/2019	26/12/2019

Estado: En espera del informe final por parte de Floridablanca como ejecutor de las obras para el recibo y posterior liquidación.

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
362 de 2019	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACION EN EL LOTE DE LA CARRERA 39 NO 42-29 BARRIO CABECERA DEL LLANO, DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN JUDICIAL – TUTELA 68001403007 – 2018- 00828 – 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"	\$ 282.318.308,55	15/11/2019	18/03/2020

Estado: Avance de Obra: 100% - Liquidado

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: CALIDAD DE VIDA

4.1 PROGRAMA: AMBIENTES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
151 de 2019	MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 7.297.395.222,86 Adicional \$ 660.119.051,67	04/06/2019	03/04/2020

Estado: Avance de obra: 90% - Suspendido



4.2 PROGRAMA: INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
13 de 2020	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER, EN LOS SECTORES INDICADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO.	\$ 4.677.196.206,20	Por iniciar	Por iniciar

Estado: por iniciar

El Municipio no ha dado inicio al Contrato Interadministrativo porque la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga EMAB está realizando el proceso de contratación, una vez cumplan con los requisitos necesarios para dar inicio al Contrato y se realice el Acta respectiva, se iniciará las labores objeto del Contrato.

Mediante el presente Contrato Interadministrativo se realizará rocería a las zonas verdes ubicadas en Parques, separadores y vías del Municipio de Bucaramanga, se asignará Parqueros a los Parques Emblemáticos y Parques Principales de cada Sector, Mantenimiento de Prado y Siembra de Prado, a continuación, se relaciona como se tiene proyectado distribuir las zonas de trabajo:

- ✓ 25 Cuadrillas conformadas por 4 personas cada una, ubicadas en los Parques y zonas Verdes de las 17 Comunas del Municipio de Bucaramanga.
- ✓ 4 cuadrillas conformadas por 4 personas cada una, las cuales atienden las entradas principales a Bucaramanga, separadores y rompoys.
- ✓ 3 cuadrillas conformadas por 4 personas, para Siembra y mantenimiento de Prado.


Igualmente se está llevando a cabo la etapa precontractual para realizar licitación pública; junto con la Oficina de Alumbrado Público y que incluirá despeje de luminarias y Tala de árboles y manejo integral del Componente arbóreo en el Espacio Público del Municipio de Bucaramanga.

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
112 de 2019	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA TERMINACION DEL EDIFICIO DE APOYO TEATRO SANTANDER Y TEATRINO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES (EMA) EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 4.057.438.420 Adicional \$ 1.933.742.819,25	22/03/2019	20/05/2020

Estado: Avance de Obra: 76% - Suspendido



Fachada principal

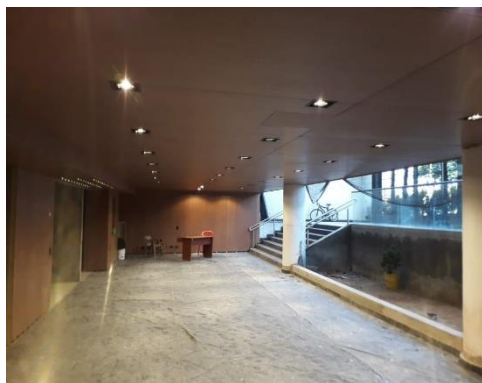

Lobby

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
196 de 2019	MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO I (Villa Rosa 4,5,6 , Villa Elena I, los Ángeles, Villa Alegría, Nuevo Horizonte, Villa Helena II)	\$ 1.063.680.300 Adicional \$ 14.763.280,83	05/07/2019	19/03/2020

Estado: Avance de Obra: 90% - **Suspendido**, debido a la emergencia sanitaria causada por el COVID-19; al igual, los decretos y resoluciones derivados del mismo.



CANCHA MÚLTIPLE BARRIO LOS ÁNGELES



CANCHA MÚLTIPLE ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO HORIZONTE



CANCHA MÚLTIPLE BARRIO VILLA HELENA 2



CANCHA MÚLTIPLE BARRIO VILLA ROSA



CANCHA MÚLTIPLE BARRIO VILLA HELENA 1



CANCHA MÚLTIPLE BARRIO VILLA ALEGRÍA

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
197 de 2019	MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO II (San Cristóbal, Villa Mercedes, Colegio Santo Ángel, Esperanza I, María Paz)	\$ 1.371.448.073 Adicional \$ 49.128.573,57	05/07/2019	20/03/2020

Estado: Avance de obra: 95% - **Suspendido**, debido a la situación generada por el COVID-19, lo cual afectó el desplazamiento de los recursos necesarios desde la ciudad de Bogotá, para la instalación de la malla en nylon, el acabado sintético multicapa y el piso de caucho.



CANCHA MULTIPLE BARRIO SAN CRISTÓBAL



CANCHA MULTIPLE BARRIO ESPERANZA 1



CANCHA DE FÚTBOL EN GRAMA SINTETICA B. MARÍA PAZ



CANCHA MÚLTIPLE BARRIO MARÍA PAZ



CANCHA MULTIPLE COLEGIO SANTO ÁNGEL

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
205 de 2019	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DE ATLETISMO LUIS ENRIQUE FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER	\$ 7.328.306.699,1 Adicional \$ 2.706.771.051,53	10/07/2019	04/06/2020

Estado: Avance de Obra: 35,25% - Suspendido



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
234 de 2019	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE CENTRALIDAD NORTE EN EL TEJAR NORTE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 4.528.233.551,23 Adicional \$ 253.325.574,00	15/07/2019	09/03/2020

Estado: Avance de Obra: 100% - Recibido



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
265 de 2019	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LA CEIBA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA FASE II.	\$ 5.156.747.554 Adicional \$630.467.244,66	06/08/2019	21/06/2020

Estado: Avance de obra: 48,15% - Suspendido



Montaje Estructura metálica en Tramo No 27 – Eje No 3



Suministro e Instalación de Cerramiento en tubería y Cárcamo prefabricado

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
241 de 2019	CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL METROPOLITANO DEL RÍO SURATÁ EN EL BARRIO EL CLAVERIANO, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA..	\$ 6.103.224.070,59	16/07/2019	25/06/2020

Estado: Avance de obra: 47% - **Suspendido**, debido a la situación generada por el COVID-19, adoptando la nación como medida preventiva para evitar la expansión del mismo el aislamiento obligatorio.



ACTIVIDADES DE URBANISMO SECTOR 1



CIRCULACIONES ADOQUINADAS SECTOR 1



PISO EN DECK PLAZOLETA SECTOR 1



PLAZOLETA ADOQUINADA SALON COMUNAL SECTOR 1



ZONA DE JUEGOS INFANTILES SECTOR 3



ZONA EMPRADIZADA Y ARBORIZADA SECTOR 3



PLAZOLETA JUNTO JUEGOS INFANTILES SECTOR 3



ACCESO A ZONA DE CANCHA SINTETICA SECTOR 3

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
266 de 2019	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LOS SALONES COMUNALES EN LOS BARRIOS. GRUPO 1 (BUCARAMANGA, EL GAITAN, LA FERIA, SAN MIGUEL Y VILLA DEL PRADO)	\$ 2.041.243.497,09 Adicional \$ 193.939.598.84	06/08/2019	18/05/2020

Estado: Avance de ejecución: 45% - Suspendido

**SALON COMUNAL BARRIO BUCARAMANGA
69 % AVANCE EJECUTADO**



Ilustración 1. MUROS EN MAMPOSTERIA LADRILLO GRAN FORMATO DIMENSIONES DE 39X11X5 CM, PISO ACABADO CON HELICOPTERO, ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA TIPO SANDWICH, MURO ACABADO EN ESTUCO.

**SALON COMUNAL BARRIO SAN MIGUEL
53% AVANCE EJECUTADO**



Ilustración 3. MUROS ACABADO EN ESTUCO Y PINTURA, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILO.

SALON COMUNAL BARRIO GAITAN
43% AVANCE EJECUTADO



Ilustración 5. SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA TERMINADO DE CUBIERTA TIPO SANDWICH

SALON COMUNAL BARRIO LA FERIA
45% AVANCE EJECUTADO



Ilustración 7. SUMINISTRO E INSTALACION DE FACHADA EN LADRILLO GRAN FORMATO; SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA INSTALACION DE PERGOLAS EN WPC.

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
267 de 2019	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LOS SALONES COMUNALES EN LOS BARRIOS. GRUPO 2 (DIAMANTE – LA LIBERTAD – NORTE BAJO – NUEVA COLOMBIA – CAFÉ MADRID)	\$ 2.005.639.450,19 Adicional \$ 211.412.157,16	06/08/2019	22/04/2020

Estado: Avance de obra: 98% - Suspendido

**SALON COMUNAL DIAMANTE I
98% AVANCE EJECUTADO**



Facha Principal

**SALON COMUNAL NUEVA COLOMBIA
98% AVANCE EJECUTADO**



**SALON COMUNAL CAFÉ MADRID
98% AVANCE EJECUTADO**



**SALON COMUNAL LALIBERTAD
98% AVANCE EJECUTADO**




SALON COMUNAL NORTE BAJO
98% AVANCE EJECUTADO



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
375 de 2019	MEJORAMIENTO DE RED DE GAS PARA EQUIPOS INDUSTRIALES Y TRATAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN TERRAZA DEL CENTRO VIDA KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 28.568.309	29/11/2019	28/12/2019

Estado: Avance de obra: 95% - Suspendido

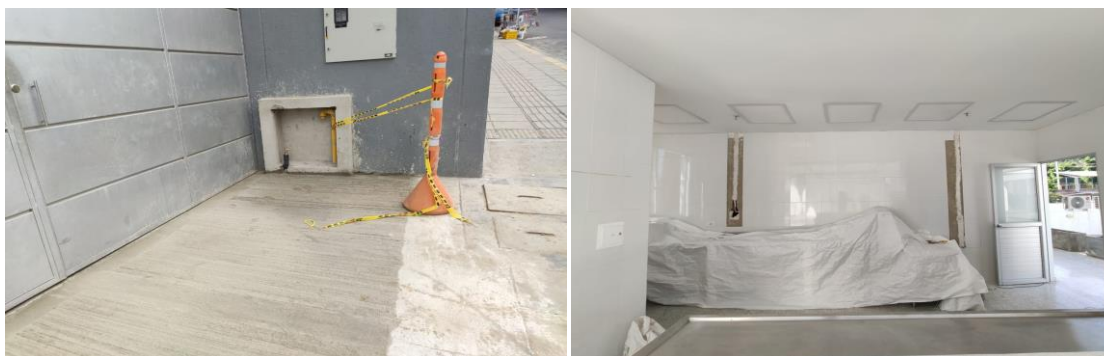

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
376 de 2019	CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	\$ 502.318.195,20 Adicional \$ 61.353.938,84	29/11/2019	25/04/2020

Estado: Avance de obra: 26% - **Suspendido**, debido a la situación generada por el COVID-19, adoptando la nación como medida preventiva para evitar la expansión del mismo el aislamiento obligatorio.



INSTALACION LOSETA PREFABRICADA ACCESO AL CDI



INSTALACION LOSETA PREFABRICADA ACCESO AL CDI



ACTIVIDAD DE REPLANTEO Y ESTRUCTURAS



ACTIVIDAD DE REPLANTEO Y ARMADO DE ESTRUCTURAS



ACTIVIDAD DE REPLANTEO



INSTALACIÓN LOSETA PREFABRICADA ACCESO PRINCIPAL

LINEA ESTRATEGICA 6: INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD

6.1 PROGRAMA: PROMOCIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
161 de 2019	CONSTRUCCIÓN DE CICLO-INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO I	\$ 6.518.280.839	30/05/2019	26/12/2019

Estado: Avance de Obra: 28,40% - la nueva fecha de terminación está por definir (Actualmente el contrato se encuentra suspendido y una vez se reinicie se hará una adición en plazo cuya duración se encuentra en estudio actualmente)



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
162 de 2019	CONSTRUCCIÓN DE CICLO-INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO II	\$ 6.260.637.436,76		

Estado: Avance de Obra: - 33,12% - la nueva fecha de terminación está por definir (Actualmente el contrato se encuentra suspendido y una vez se reinicie se hará una adición en plazo cuya duración se encuentra en estudio actualmente)



6.2 PROGRAMA: MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
261 de 2019	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - GRUPO 1	\$ 4.446.523.289 Adicional 1 \$ 515.036.515,00 Adicional 2 \$ 1.699.812.040,00	06/08/2019	08/05/2020

Estado: Avance de Obra: 78,15 – Suspendido

GRUPO 1 (COMUNAS: 1 Norte, 2 Nororiental, 3 San francisco, 4 Occidental)



KENNEDY: Cra 11 con Cll 13AN



KENNEDY: Calle 20 con Carrera. 20.

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
263 de 2019	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - GRUPO 2	\$ 4.316.014.490 Adicional 1 \$ 555.273.906,00 Adicional 2 \$ 1.602.364.927,00	06/08/2019	09/05/2020

Estado: Avance de Obra: 84,50 – Suspendido

GRUPO 2 (COMUNAS: 5 García Rovira, Comuna 6 La Concordia, 7 La ciudadela, 12 Cabecera de llano, 13 Oriental, 14 Morrórico, 15 Centro).



Calle 45 entre carrera 14 w



Vía chimita sentido oriente-occidente

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
264 de 2019	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. - GRUPO 3	\$ 3.838.463.454,08	06/09/2019	30/12/2019

Estado: Avance de Obra: 72,99% - Suspendido



Barrio Bucaramanga Calle 69 entre Carrera 5 y 6



Lagos del cacique Calle 71 entre carrera 53 y Carrera 54

6.3 PROGRAMA: MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL RURAL

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
282 de 2019	CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 1	\$ 1.136.548.602 Adicional 1 \$162.523.356 Adicional 2 \$185.304.138,46	15/08/2019	09/05/2020

Estado: Avance de obra: 95% Suspendido

GRUPO No	CORREGIMIENTO	VEREDA	SITIO ESPECÍFICO	RECURSOS CREDITO	RECURSOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	TIPO SUPERFICIE	LONGITUD (M) INTERVENIDA POR RECURSOS DE CREDITO (M)	LONGITUD INTERVENIDA POR PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LONGITUD TOTAL INTERVENIDA (M)	EJECUTADOS 15 DE MARZO
1	1	ANGELINOS	SECTOR CARABINEROS RAMO	X		PLACAS HUELLAS	111		111	100,00%
		LA ESMERALDA	FINCA LUCILA SAAVEDRA	X		PLACAS HUELLAS	110		110	100,00%
			FINCA SIEMPRE VIVA	X		PLACAS HUELLAS	30		30	100,00%
			FINCA GENY LA PISCINA	X		PLACAS HUELLAS	50		50	100,00%
			PAVIMENTO SOCADO BAJO PEDROBAJO	X		MURO DE CONTENCIÓN longitud 5m	1		1	100,00%
				X		CONSTRUCCIÓN CABEZOTE ALCANTARILLA	1		1	100,00%
			FINCA EL CALZO	X		PLACAS HUELLAS	83		83	100,00%
		SAN IGNACIO	DESPLUPADORA	X		PLACAS HUELLAS	105		105	100,00%
			DESDE PUENTE TIERRA HACIA SAN IGNACIO LA SABANA	X		PAVIMENTO FLEXIBLE	100		100	100,00%
			EL MANGO		X	PLACAS HUELLAS		118	118	100,00%
		EL BURRIDO	FINCA DE LA CUMBRE	X		CABEZOTE ALCANTARILLA	1		1	0,00%
		SANTA RITA	FINCA DON DANIEL	X		PLACAS HUELLAS	90		90	0,00%
			VIA MAGUEYES CURVA LA TALARA	X		PLACAS HUELLAS	160		160	100,00%
		SAN CAYETANO	CURVA EL MAMON		X	PLACAS HUELLAS		140	140	100,00%
		SAN PEDRO BAJO	MIRAMAR SECTOR EL TANQUE		X	PLACAS HUELLAS		86	86	100,00%
VIAGUAL	MURO DE CONTENCIÓN PARA			GAVIONES longitud 23m			23	100,00%		
TOTAL GRUPO No 1 (CORREGIMIENTO No 1)									1209	

SECTOR CARABINEROS SE CONSTRUYO 111 ML EN PLACA DE CONCRETO RIGIDO



ANTES



DESPUES

FINCA GENY LA PISCINA



ANTES



DESPUES

SECTOR EL MANGO



ANTES



DESPUES

SECTOR DESPULPADORA



ANTES



DESPUES

SECTOR DESDE PUENTE TIRRA HACIA SAN IGNACIO



ANTES



DESPUES

GAVIONES VIJAGUAL



 PENDIENTES POR EJECUTAR


FINCA DE LA CDMB	CABEZOTE ALCANTARILLA
FINCA DON DANIEL	PLACAS HUELLAS

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
283 de 2019	CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 2	\$ 1.180.683.854 Adicional \$202.962.104	15/08/2019	09/05/2020

Estado: Avance de obra: 85% – Suspendido

GRUPO No	CORREGIMIENTO	VEREDA	SITIO ESPECIFICO	RECURSOS CREDITO	RECURSOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	TIPO SUPERFICIE	LONGITUD VIAL INTERVENIDA POR RECURSOS CREDITO (M)	LONGITUD INTERVENIDA POR PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LONGITUD TOTAL INTERVENIDA (M)	EJECUTADOS 15 DE MARZO	
2	2	LOS SANTOS	FINCA EL PORVENIR	X		PLACAS HUELLAS	100		100	100,00%	
		CAPILLA ALTA	FINCA VAN LOPEZ	X		PLACAS HUELLAS	100		100	100,00%	
			CURVA EL CUCHARAL	X		PLACAS HUELLAS	45		45	100,00%	
			MIRADOR INO	X		PLACAS HUELLAS	118		118	100,00%	
		CAPILLA BAJA	CARDENALES	X		PLACAS HUELLAS	70		70	100,00%	
			FINCA BORGE HELIODORO BAIMES, INVERNADERO	X		PLACAS HUELLAS	40		40	100,00%	
			CURVA ESCONDIDA		X		PLACAS HUELLAS		77	77	100,00%
		CUCHILLA ALTA	DORIS ARDILA ACCESO ESCUELA RURAL	X		PLACAS HUELLAS	120		120	35,00%	
			PALO BLANCO		X		PLACAS HUELLAS		40	40	100,00%
		MONSERRATE	GERMAN VILLABONA	X		PLACAS HUELLAS			1	1	100,00%
			FINCA GALLEGO	X		PLACAS HUELLAS	64		64	100,00%	
		ROSA BLANCA	GAVIONES	X		GAVIONES	25		25	100,00%	
		BOLARQUI ALTO	FINCA LA HERMOSA	X		PLACAS HUELLAS	222		222	100,00%	
		BOLARQUI BAJO	CASA TABLA	X		PLACAS HUELLAS	50		50	100,00%	
			AGUA BLANCA	X		PLACAS HUELLAS	60		60	100,00%	
		MAGUEYES	FINCA EL TRAPICHE	X		PLACAS HUELLAS	60		60	100,00%	
BOLARQUI BAJO	PUENTE COLGANTE EN MADERAS			MANTENIMIENTO PUENTE COLGANTE EN MADERAS	26		26	0,00%			
CUCHILLA ALTA	SECTOR RECEPTORA			PLACAS HUELLAS	80		80	100,00%			

SECTOR FINCA EL PORVENIR

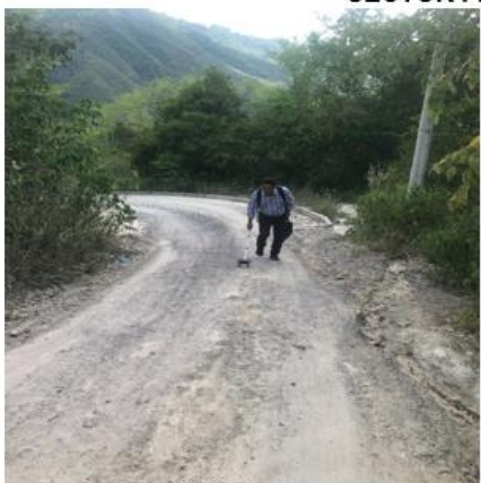

ANTES



DESPUES

SECTOR FINA CARDENALES



ANTES



DESPUES

SECTOR FINCA HELIODORO JAIMES



ANTES



DESPUES

✚ PENDIENTES POR EJECUTAR

DORIS ARDILA Y ACCESO ESCUELA RURAL	PLACAS HUELLAS	120 M
PUENTE COLGANTE	MANTENIMIENTO PUENTE COLGANTE EN MADERA	26 M

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
284 de 2019	CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 3	\$ 1.300.079.710	15/08/2019	09/05/2019

Estado: Avance de obra: 72% – Suspendido

GRUPO No	CORREGIMIENTO	VEREDA	SITIO ESPECIFICO	RECURSOS CREDITO	RECURSOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	TIPO SUPERFICIE	LONGITUD INTERVENIDA POR RECURSOS CREDITO (M)	LONGITUD INTERVENIDA POR PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LONGITUD TOTAL INTERVENIDA (M)	EJECUTADOS 15 DE MARZO
		RETIRO CHIQUITO	REFUGIO TIZAMA	X		PLACAS HUELLAS	250		250	0,00%
			FINCA SANTO DOMINGO	X		PLACAS HUELLAS	100		100	0,00%
		SANBOSE	REFUGIO DEL CAMINATE, FINCA SANTA BOHEMIA, ESTACION No. 3, CASAS 60, RENTERIA, PAULINA, CASAS TANQUE	X		PLACAS HUELLAS	351		351	45,00%
			FINCA LILIAN ARGAS, TRAMO DICCIONAL, ESTACION No. 2	X		PAVIMENTO RIGIDO	100	22	122	100,00%
			CARACOLÍ		X	PLACAS HUELLAS		73	73	100,00%
			SECTOR RANJITAS	X		PLACAS HUELLAS	11,79	9,3	20	0,00%
		PEDREGAL	SECTOR PORVENIR	X		PLACAS HUELLAS	50		50	0,00%
			FINCA EL VERGEL, TRAMO, TRAMO, TRAMO, TRAMO	X		PLACAS HUELLAS	75		60	100,00%
			ALTO FINCA LAS PALMAS	X		PLACAS HUELLAS	100		100	100,00%
			ROSO MONSALVE	X		PLACAS HUELLAS	70		70	100,00%
		10 DE MAYO SANTA	PRIO	X		CANAL GUA LLUVIAS	1		1	0,00%
			DESDE LA VIA NACIONAL HASTA LIDES	X		PAVIMENTO RIGIDO	100	10	110	100,00%
			PRIO		X	PLACAS HUELLAS		81	81	100,00%
		GUALILO	VILLA BAVIERA, ENTRADA GUALILO	X		PLACAS HUELLAS	100	20	120	100,00%
TOTAL GRUPO No. 3 (CORREGIMIENTO No. 3)									1508	

SECTOR GUALILO |



ANTES



DESPUES

▲ FINCA LAS PALMAS



ANTES



DESPUES

▲ DESDE LA VIA NACIONAL HASTA UDES



✚ PENDIENTES POR EJECUTAR

REFUGIO ITZAMA	250 M
FINCA SANTO DOMINGO	100 M
SECTOR GRANJITAS	11.7 M
SECTOR PORVENIR	50 M
PR 8 + 400	

6.4 PROGRAMA: SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS Y RURALES

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
343 de 2019	"CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A TRAVÉS DE POZOS SÉPTICOS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER".	\$ 792.800.294,00	17/10/2019	27/04/2020

Estado: Avance de obra: 35% - Suspendido



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
345 de 2019	"CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A TRAVÉS DE POZOS SÉPTICOS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER".	\$ 992.031.676,00	17/10/2019	11/05/2020

Estado: Avance de obra: 31% - Suspendido




Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
344 de 2019	"CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A TRAVÉS DE POZOS SÉPTICOS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER".	\$ 616.708.569,88	17/10/2019	11/05/2019




Estado: Avance de obra: 28% - Suspendido



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
352 de 2019	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ATENDER LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE VIJAGUAL, BOSCONIA, MIRAFLORES Y CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MALAÑA; DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER.	\$ 579.115.188 Adicional \$ 104.339.590	01/11/2019	27/03/2020

Estado: Avance de obra: 93,12 % - Suspendido

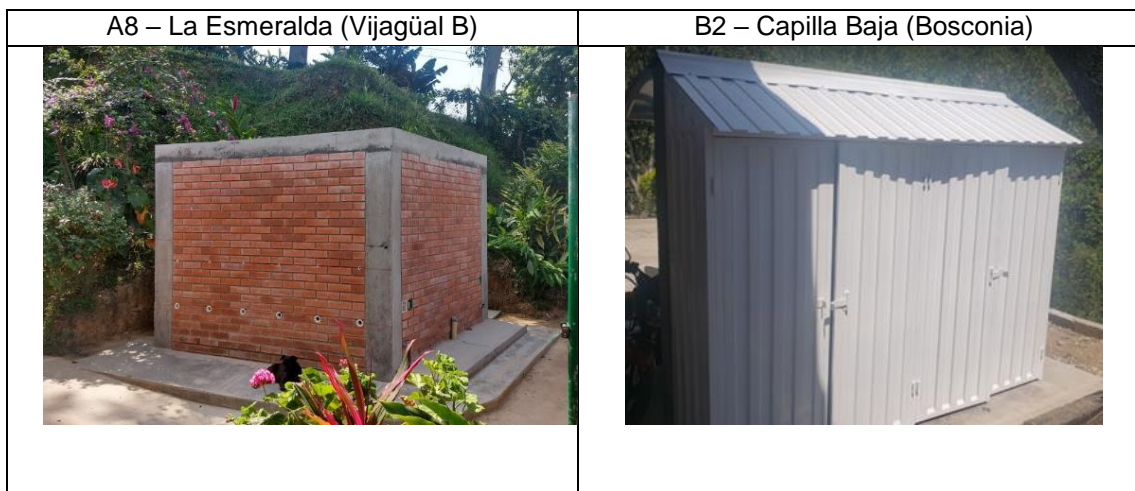

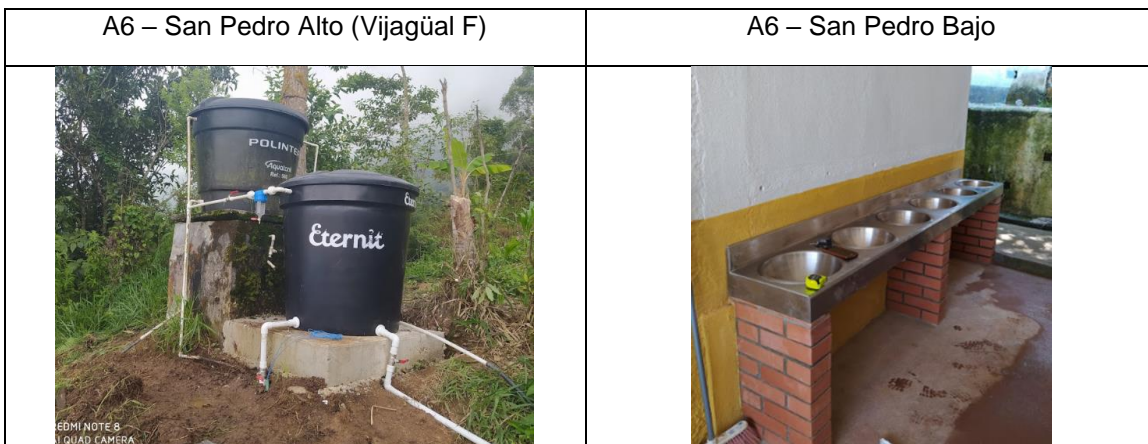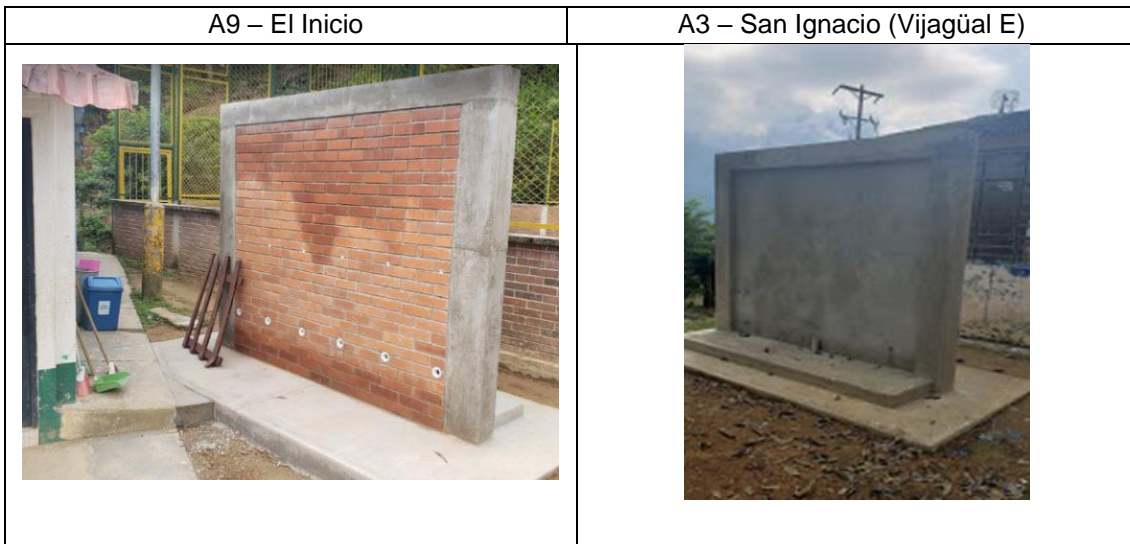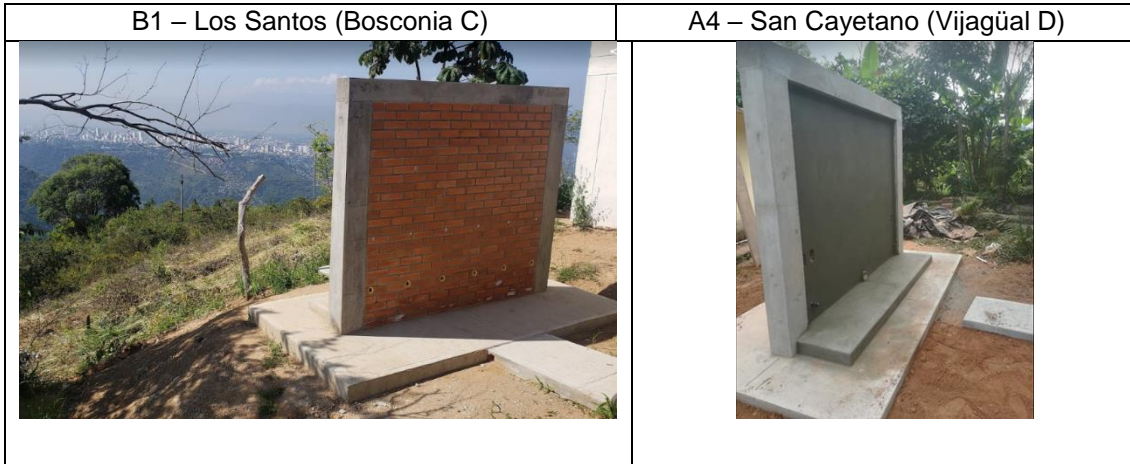

6.5 PROGRAMA: ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL

Contrato No.	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
297 de 2019	Modernización y expansión del alumbrado público perimetral del parque ecológico la flora de Bucaramanga	\$2.327'801.828.00 Adicional \$335'553.059.60	28 de agosto de 2019	18 de Mayo de 2020

Estado: Avance de Obra 82% - Suspendido en cumplimiento del decreto 457 de marzo de 2020 de la presidencia de la República.



Excavaciones para ductos Conduit, pisos recuperados, instalación de luminarias y cableado.

Contrato No.	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
245 de 2019	Modernización del alumbrado público del parque Morrónico del municipio de Bucaramanga	\$2.467'202.721.00 Adicional \$278'111.654.74	24 de julio 2019	24 de mayo de 2020

Estado: Avance de Obra 63% - Suspendido en cumplimiento del decreto 457 de marzo de 2020 de la presidencia de la República.



Senderos con piso recuperado y luminarias instaladas.

Contrato No.	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
256 de 2019	Ampliación del alumbrado público perimetral exterior de la villa olímpica del municipio de Bucaramanga	\$1.388.093.264.00 Adicional \$235'922.413.00	14 de Agosto de 2019	30 de abril de 2020.

Estado: Avance de Obra 98% - Suspendido por garantía de luminarias.



Iluminación perimetral de la villa olímpica de Bucaramanga, las imágenes corresponden a la glorieta, carrera 30 y calle 14 respectivamente.

Contrato No.	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
275 de 2019	Modernización del alumbrado público de la calle 30 entre las carreras 26 y 27 del municipio de Bucaramanga.	\$1.068.518.465.00 Adicional \$259'924.695.88	20 de agosto de 2019	24 de mayo de 2020.

Estado: Avance de Obra 48% - Suspendido en cumplimiento del decreto 457 de marzo de 2020 de la presidencia de la República.



Instalación de posteria para iluminación calle 30 y recuperación de andén por intervención para ductos eléctricos.

Contrato No.	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
285 de 2019	Modernización del alumbrado público de la calle de los estudiantes entre la calle 54ª y la diagonal 14 municipio de Bucaramanga	\$3.911'411.963.00 Adicional \$39'926.386.00	15 de agosto de 2019	07 de junio de 2020.

Estado: Avance de Obra 60% - Suspendido en cumplimiento del decreto 457 de marzo de 2020 de la presidencia de la República.



Modernización del alumbrado público y soterración de redes eléctricas asociadas. Montaje de luminarias.

Contrato No.	Objeto	Valor Inicial	Fecha Inicio	Fecha Terminación
154 de 2019	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO 1	\$554.559.219 Adición \$ 221.823.689	21/05/2019	27/04/2020
155 de 2019	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO 2	\$439.559.461 adición \$ 170.699.835	21/05/2019	27/04/2020
156 de 2019	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO 3	\$426.749.586 adición \$ 170.699.835	21/05/2019	27/04/2020

Estado: En ejecución, avance 95%. – En ejecución



Mantenimiento de alumbrado público en el sector rural y urbano de todo el municipio de Bucaramanga: 17 comunas y tres corregimientos. Dando respuesta a la PQR'S recibidas en AP por medio telefónico, pagina web y en ventanilla de la oficina.

Contrato No.	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
251 de 2019	Modernización del alumbrado público entre las calles 34 y 37 y entre las carreras 10 a la 12 del municipio de Bucaramanga.	\$1.785.201.572.00	31 de Julio de 2019	16 de Marzo de 2020

Estado: Avance de Obra 100%. Terminado en proceso de recibo por luminarias.



Modernización de la iluminación en el centro institucional, las imágenes muestran la iluminación frente a la iglesia de San Laureano, parque García Rovira y recuperación de andén para ductos eléctricos e instalación de postera lado occidental del edificio de la Gobernación.

Contrato No.	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
356 de 2019	Instalación de luminarias de alumbrado público de tecnología led para el municipio de Bucaramanga - fase III - grupo 1 -	\$ 694.559.246,24	Adjudicado	
357 de 2019	Instalación de luminarias de alumbrado público de tecnología led para el municipio de Bucaramanga - fase iii - grupo 2 -	\$ 652.338.660,82	Adjudicado	
358 de 2019	instalacion de luminarias de alumbrado público de tecnología led para el municipio de Bucaramanga - fase iii - grupo 3 -	\$ 645.033.284,55	Adjudicado	
359 de 2019	instalación de luminarias de alumbrado público de tecnología led para el municipio de Bucaramanga - fase iii - grupo 4	\$ 594.056.990,17	Adjudicado	

Estado: Avance de Obra 0% - Pendiente acta de inicio en cumplimiento del decreto 457 de marzo de 2020 de la presidencia de la República.

Contrato No.	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
PENDIENTE	“Interventoría a las obras de instalación de luminarias de alumbrado público de tecnología led para el municipio de Bucaramanga – fase iii”.	\$316.286.887	Adjudicado	

Estado: Avance 0% - Pendiente acta de inicio en cumplimiento del decreto 457 de marzo de 2020 de la presidencia de la República. Inicia al igual que los contratos 356, 357, 358 y 359 de 2020.

CONTRATOS EN PROCESO DE LIQUIDACION Y LIQUIDADOS

Contrato No.	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
260 de 2019	Modernización del alumbrado público de la pasarela de calzado (la carrera 22 entre calles 19 y 20 y calles 19, 20, 21 y 22 entre carreras 21 y 23) del municipio de Bucaramanga.	\$893.074.153.50	08 de Agosto de 2019	07 de Diciembre de 2019

Estado: Avance de Obra 100% - Terminado. En proceso de recibo y liquidación, por garantía de luminarias.



Postería y luminaria modernizada en la pasarela del calzado.

Contrato No.	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
135 de 2019	El arrendador entrega al arrendatario a título de arrendamiento, el uso y goce de la bodega no 6 del " centro industrial ruta 169 propiedad horizontal, ubicado en la carrera 8 no 20 n-148 de Bucaramanga, cuyos linderos se encuentran en la escritura pública 1518 de 2016 de la notaria decima de Bucaramanga, le corresponde el folio de matrícula inmobiliaria 300-403751, la cual se destinara como bodega de almacenamiento de luminarias de la oficina de alumbrado público del municipio de Bucaramanga	\$62.908.356,00	Abril 25 de 2019	31 de Diciembre de 2019

Estado: Liquidado.

Contrato No.	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
136 de 2019	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la ups de 6 kva marca toshiba de la oficina de alumbrado público del municipio de Bucaramanga.	\$4.569.600	Abril 25 de 2019	Diciembre 24 de 2019

Estado: Liquidado.

Contrato No.	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
141 de 2019	Actividades de poda para el despeje de luminarias y redes que interfieren con el alumbrado público en el municipio de Bucaramanga.	\$638.961.999.63	Mayo 6 de 2019	Diciembre 20 de 2019

Estado: Liquidado.

Contrato No.	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
246 de 2019	Construcción del alumbrado público alimentado con energía solar para el parque contemplativo el carrasco en el municipio de Bucaramanga	\$1.351.805.677,00	31 de Julio de 2019	30 de Diciembre de 2019

Estado: Avance de Obra 100% - Terminado -Queda pendiente por recibo de certificado de RETIE y RETILAP para recibo y Liquidación.



Vista nocturna parque contemplativo El Carrasco, iluminado con paneles solares.

Contrato No.	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
192 de 2019	Modernización del sistema de alumbrado público de los escenarios deportivos y parque principal del barrio los canelos del municipio de Bucaramanga.	\$920.749.354	Junio 27 de 2019	Octubre 26 de 2019

Estado: Avance de Obra 100% - En proceso de liquidación.



Escenario deportivo y parque Los Canelos, terminado y en uso.

7. OTROS PROCESO ADELANTADOS POR LA SECRETARIA

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
152 DE 2019	Convenio ESE-ISABU (Aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos con el fin de ejecutar los proyectos de remodelación de la infraestructura física de los centros de salud del Municipio de Bucaramanga)	\$5.235.537.883,4 Adicional \$1.787.305.419,75	08/05/2019	30/06/2020

Estado: Avance de obra: 99.73% - Activo y en ejecución

**CENTRO DE SALUD GIRARDOT
99,70% AVANCE EJECUTADO**



CENTRO DE SALUD CAMPOHERMOSO
99,70% AVANCE EJECUTADO



CENTRO DE SALUD LA LIBERTAD
100% AVANCE EJECUTADO



**CENTRO DE SALUD BUCARAMANGA
100% AVANCE EJECUTADO**



**CENTRO DE SALUD SAN RAFAEL
99,50% AVANCE EJECUTADO**



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
351 de 2019	"CONSTRUCCIÓN DE GALERÍAS DE BÓVEDAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, SANTANDER"	\$ 381.604.728,15	07/11/2019	18/04/2020

Estado: Avance de obra: 96% - Suspendido



PINTURA MODULOS DE NUEVAS BOVEDAS



CONFORMACION DE ANDENES

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
348 de 2019	MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCION INMEDIATA CAIS ADSCRITOS A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 468.723.474,98	12/11/2019	17/02/2020

Estado: Avance de Obra: 95% – Suspendido en espera de adicional N° 2 en valor y plazo.

Con el contrato mencionado se atenderán los siguientes CAI'S:

- BARRIO CAFÉ MADRID, BARRIO LA ESPERANZA, LA VIRGEN, BARRIO SAN FRANCISCO, BARRIO GIRARDOT, CHIMITA, BARRIO LA JOYA, BARRIO LA CONCORDIA, VIADUCTO GARCIA CADENA, BARRIO CIUDAD VENECIA, TERMINAL DE TRANSPORTES, PARQUE SAN PIO, BARRIO SOTOMAYOR, BARRIO SAN ALONSO, BARRIO ANTONIA SANTOS CENTRO Y BARRIO MORRORICO

➤ **CAI BARRIO CAMPOHERMOSO**



(ANTES)



(ACTUAL)

➤ **CAI BARRIO SANTANDER**



➤ **CAI INEM**




➤ **CAI PARQUE SANTANDER**



➤ **CAI BARRIO ALVAREZ**



➤ CAI BARRIO LA VICTORIA

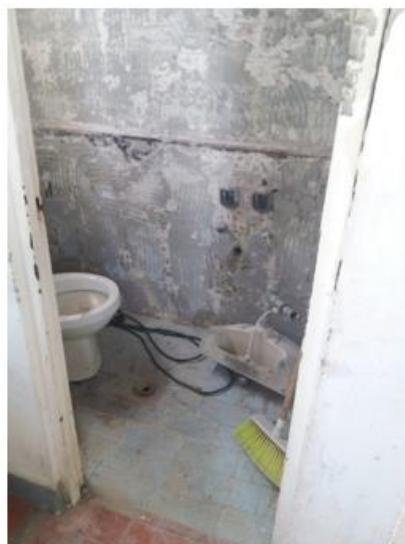

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
353 de 2019	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL REGIONAL ORIENTE MIGRACIÓN COLOMBIA PARA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA".	\$ 536.976.347.49	08/11/2019	24/01/2020

Estado: Avance de obra: 100% - Ejecutado



REMODELACION EXTERIOR CUBIERTA



REMODELACION INTERIOR



REMODELACION INTERIOR



REMODELACION INTERIOR



REMODELACION EXTERIOR



REMODELACIÓN INTERIOR



REMODELACIÓN INTERIOR

8. PROYECTOS PRESENTADOS Y VIABILIZADOS

No.	No. REGISTRO	OBJETO	VALOR VIGENCIA	ESTADO
1	20160680010121	MEJORAMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS PROCESOS TRANSVERSALES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.095.600.000	Certificado - Actualización
2	20170680010016	APOYO EN LA PLANIFICACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	\$ 559.196.970,00	Certificado - Actualización
3	20190680010063	MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNDEY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 883.901.082,09	Certificado - Actualización
4	20190680010098	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS VEREDALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 102.168.572,00	Certificado - Actualización

5	20190680010058	MEJORAMIENTO DEL CENTRO VIDA AÑOS MARAVILLOSOS EN LA CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 385.443.287,16	Certificado - Actualización
6	20190680010064	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LOS SALONES COMUNALES EN LOS BARRIOS BUCARAMANGA, DIAMANTE I, LA LIBERTAD, EL GAITAN, LA FERIA, CAFÉ MADRID, NUEVA COLOMBIA, NORTE BAJO, SAN MIGUEL Y VILLA DEL PRADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 266.389.895,00	Certificado - Actualización
7	20180680010103	REMDELACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE SALUD GIRARDOT DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 30.865.193,06	Certificado - Actualización
8	20180680010100	REMDELACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE SALUD LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 24.573.068,06	Certificado - Actualización
9	20180680010097	REMDELACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE SALUD SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 34.212.068,06	Certificado - Actualización
10	20180680010102	REMDELACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE SALUD BUCARAMANGA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 34.212.068,06	Certificado - Actualización
11	20180680010104	REMDELACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE SALUD LA JOYA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 30.865.193,06	Certificado - Actualización
12	20180680010099	REMDELACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE SALUD CAMPO HERMOSO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 21.226.193,06	Certificado - Actualización
13	2018680010098	REMDELACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE SALUD KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 24.573.068,06	Certificado - Actualización
14	20190680010080	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL METROPOLITANO DEL RÍO SURATÁ EN EL BARRIO EL CLAVERIANO, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 300.615.099,00	Certificado - Actualización
15	2019068001082	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 5.301.950.541,25	Certificado - Actualización
16	20190680010086	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LA CEIBA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA FASE II	\$ 276.644.812,00	Certificado - Actualización
17	20190680010030	MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 48.367.063,29	Certificado - Actualización
18	20190680010141	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DE ATLETISMO LUIS ENRIQUE FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	\$ 313.900.283,00	Certificado - Actualización
19	20190680010115	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO URBANO MEDIANTE EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 715.787.978,71	Certificado - Actualización
20	20190680010097	CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 868.907.437,07	Certificado - Actualización
21	20190680010126	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A TRAVES DE POZOS SEPTICOS EN EL AREA RURAL DE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	\$ 168.905.355,00	Certificado - Actualización

22	20190680010050	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE CENTRALIDAD NORTE EN EL TEJAR NORTE 2 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 48.531.568,00	Certificado - Actualización
23	20190680010105	CONSTRUCCION ANDENES ESCALERAS Y PASAMANOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 189.109.362,00	Certificado - Actualización
24	20190680010100	CONSTRUCCION DE SENDEROS DE LOS CAMINANTES EN LOS CERROS ORIENTALES DE BUCARAMANGA	\$ 328.036.578,10	Certificado - Actualización
25	20190680010134	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 61.353.938,84	Certificado - Actualización
26	20200680010003	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 4.970.012.684,20	Certificado - Proyecto Nuevo
27	20160680010088	ADMINISTRACION OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, ENERGIA Y FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DEPARTAMENTO SANTANDER	\$ 12.630.145.000,00	Certificado - Actualización
28	20190680010077	AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO PERIMETRAL EXTERIOR DE VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 38.639.955,00	Certificado - Actualización
29	20190680010065	MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO A TECNOLOGIA LED FASE III: DE LAS COMUNAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 316.287.049,00	Certificado - Actualización
30	20190680010072	MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO ENTRE LAS CALLE 34 Y 37 Y ENTRE CARRERAS 10 A LA 12 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 38.592.890,00	Certificado - Actualización
31	20190680010049	MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE MORRORICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 104.953.835,00	Certificado - Actualización
32	20190680010079	MODERNIZACION Y EXPANSION DEL ALUMBRADO PUBLICO PERIMETRAL DEL PARQUE ECOLOGICO LA FLORA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 55.635.954,50	Certificado - Actualización
33	20190680010074	MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE 30 ENTRE LAS CARRERAS 26 Y 27 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 47.158.629,00	Certificado - Actualización
34	20190680010073	MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE DE LOS ESTUDIANTES ENTRE CALLE 54 A Y LA DIAGONAL 14 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 105.575.463,63	Certificado - Actualización
35	20200680010011	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 5.033.716.535,16	Certificado - Proyecto Nuevo - Actualización

9. CONCURSO DE MERITOS

No.	OBJETO	No. PROCESO	ESTADO	VALOR TOTAL
1	INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECNOLOGÍA LED PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – FASE III	SI-CM-001-2020	ADJUDICADO	316.287.049

10. PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONTRATACION

No.	OBJETO	VALOR
1	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 2.143.801.448,18
2	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.472.349.701,34
3	INTERVENTORIA DEL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 597.114.143,00
4	ACTIVIDADES DE PODA PARA EL DESPEJE DE LUMINARIAS Y REDES QUE INTERFIEREN CON EL ALUMBRADO PUBLICO Y TALA DE ÁRBOLES Y MANEJO INTEGRAL DEL COMPONENTE ARBÓREO EN EL ESPACIO PÚBLICO, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 811.789.384,50
6	INTERVENTORIA A LAS ACTIVIDADES DE PODA Y TALA DE ARBOLES	\$ 163.143.528,25
7	MANTENIMIENTO DE LAS VIAS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER	\$ 499.983.952,30

11. INVERSION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 31 DE MARZO DE 2020

PROGRAMAS	INVERSION	%
ADMINISTRACION ARTICULADA Y COHERENTE	\$ 1.417.644.670,00	7,08
UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES	\$ 896.388.496,45	4,48
ADULTO MAYOR Y DIGNO	\$ 385.443.287,16	1,92
INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO	\$ 6.578.857.911,91	32,85
PROMOCION DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS	\$ 61.353.938,84	0,31
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA	\$ 5.301.950.541,2	26,47
MANTENIMIENTO DE RED VIAL RURAL	\$ 868.907.437,07	4,34
ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL	4.246.041.876.02	21,20
SERVICIOS PUBLICOS RURALES	\$ 271.073.927,00	1,35
TOTAL (1)	\$ 20.027.662.085,65	100%

OTROS VALORES EN LA EJECUCION

DESCRIPCION	VALOR
VALOR SUBSIDIOS DE SERVICIOS PUBLICOS, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	\$ 2.433.218.728,00
TOTAL (2)	\$ 2.433.218.728,00

TOTAL INVERSION (1+2)	\$ 22.460.880.813,65
------------------------------	-----------------------------
