



INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad

INFORME DE GESTION PRIMER TRIMESTRE DE 2019

El presente informe resume los principales avances que la Secretaria de Infraestructura ha generado en los diferentes programas que conforman el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Gobierno de las Ciudadanas y los Ciudadanos”. Durante el primer trimestre de 2019 ha ejecutado y realizado las gestiones pertinentes para el control del avance de las diferentes obras que ejecuta la Secretaria.

A continuación se detalla la gestión que ha realizado la Secretaria de Infraestructura en el primer trimestre de 2019.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: GOBERNANZA DEMOCRÁTICA

1.1 PROGRAMA: PRESUPUESTOS INCLUYENTES

A la fecha se encuentra estructurada la atención de necesidades con relación a las obras viabilizadas en los grupos de presupuestos participativos vigencias 2016 y 2017, los cuales se encuentran en ejecución, como se relaciona a continuación:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
210 de 2018	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ANDENES, PASAMANOS Y ESCALERAS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER	\$ 1.343.937.014,91	19/09/2018	15/04/2019

Estado: Avance de obra: 45.80% - en ejecución

SECTORES ATENDIDOS Y EN EJECUCIÓN

A. BARRIO SAN CRISTÓBAL: Obras ejecutadas Sectores:

- ✓ Calle1A entre Carreras 23 y Carrera 23B
- ✓ Carrera 22 C con Calle 3N-4N

B. BARRIO LA JUVENTUD: Obras ejecutadas Sectores:

- ✓ Calle 1N entre Carreras 18B 18C
- ✓ Calle1N con Carrera 18D
- ✓ Calle 1 con Carrera 18 D.

C. BARRIO CENTRO (CALLE 31 ENTRE CARRERA 14 Y 9): Obras ejecutadas Sectores:

- ✓ Calle 31 entre las Carreras 14 a la Carrera 11



- D. BARRIO TRANSICIÓN:** Obras ejecutadas y/o en ejecución Andenes Sectores:
- ✓ Calle 2 entre Carreras 16E y 17
 - ✓ Carrera 17 entre 2 y 1B
 - ✓ Carrera 17 entre Calle 1A y 2
 - ✓ Carrera 17A entre 1A y 1B
 - ✓ Carrera 17 entre 1A Y 1
- E. BARRIO COAVICONSA:** Obras ejecutadas y/o en ejecución Andenes Sectores:
- ✓ Peatonal Calle 103 BIS con Carrera 13E
 - ✓ Carrera 13E entre Calles 103B y 103C
- F. BARRIO IGSABELLAR:** Obras ejecutadas Andenes y/o en ejecución Sectores:
- ✓ Calle 103F con Carrera 10
- G. BARRIO ANTONIA SANTOS:** Obras ejecutadas y/o en ejecución Andenes Sectores:
- ✓ Carreras 25 entre Calles 31 y 32 Frente a Centro Educativo
- H. BARRIO SAUCES:** Obras ejecutadas parcialmente de pasamanos y andenes Sectores:
- ✓ Calle 15 y 14 con Carrera 39 y 40
 - ✓ Carrera 40 entre calles 14 y 12
- I. BARRIO GOMEZ NIÑO:** Obras ejecutadas y/o en ejecución Andenes Sectores:
- ✓ Calle 56 entre Carreras 14 y 15 costado norte
- J. BARRIO PEDREGOSA:** Obras ejecutadas y/o en ejecución Andenes Sectores:
- ✓ Peatonal Carrera 33 entre Calle 90 y 91
- K. BARRIO LAGOS DEL CACIQUE:** Obras ejecutadas y/o en ejecución Andenes Sectores:
- ✓ Carrera 49 con Calle 74^a

REGISTRO FOTOGRAFICO

SECTOR CENTRO

Calle 31 entre carreras 14 y 13 costado norte




SECTOR GOMEZ NIÑO

Calle 56 entre carreras 15 y 14 costado norte



SECTOR COAVICONSA

Calle 13e entre 103c y 103b

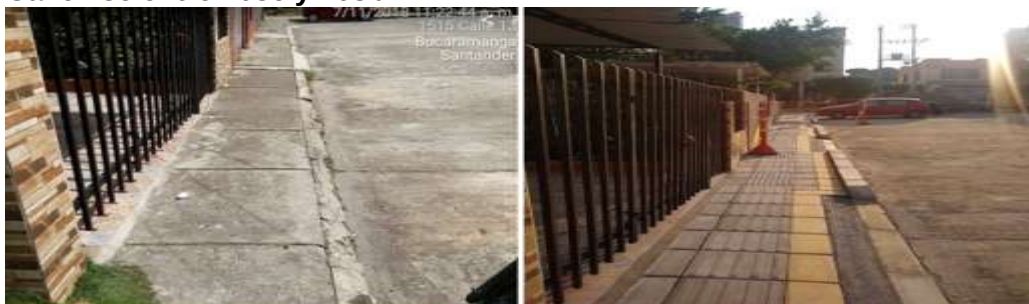

SECTOR ANTONIA SANTOS

Carrera 25 entre calles 31 y 32 costado occidental



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
256 de 2018	MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS E INSTALACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE Y JUEGOS INFANTILES, VIABILIZADOS POR EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO II	\$ 775.839.494,9	02/11/2018	17/05/2019

Estado: Avance de obra: 40% - En ejecución

Los trabajos se realizan en los siguientes Barrios:

COMUNA 1- BARRIO VILLA ROSA:

- Mantenimiento y recuperación de arcos de futbol y tableros
- Mantenimiento de cerramiento soldadura y pintura de muros y escaleras
- Reconstrucción de piso de cancha

COMUNA 4- BARRIO GIRARDOT:

- Mantenimiento y recuperación de arcos de futbol y tableros
- Mantenimiento de cerramiento soldadura y pintura de muros y escaleras
- Reconstrucción de espacios adyacentes

COMUNA 5- BARRIO LA CEIBA:

- Mantenimiento de cerramiento soldadura y pintura de muros y escaleras
- Reconstrucción de piso de cancha
- Suministro de juegos Infantiles y adecuación de espacios adyacentes

COMUNA 17- BRISAS DEL MUTIS

- Suministro de juegos infantiles y gimnasios, así como adecuación de espacios adyacentes

COMUNA 2- VILLA HELENA II:

- Suministro e instalación de gimnasio y adecuación de espacios adyacentes



REGISTRO FOTOGRAFICO

ESPERANZA II



ANTES



ESTADO ACTUAL

BARRIO GIRARDOT



ANTES



ESTADO ACTUAL

BARRIO LA CEIBA



ANTES



ESTADO ACTUAL



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
258 de 2018	MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS E INSTALACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE Y JUEGOS INFANTILES, VIABILIZADOS POR EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO I	\$ 1.044.230.780,28	02/11/2018	17/04/2019

Estado: Avance de obra: 90% - En ejecución

Los trabajos se realizarán en los siguientes Barrios:

COMUNA 9- BARRIO DIAMANTE I:

- Mantenimiento y recuperación de arcos de futbol y tableros
- Mantenimiento de cerramiento soldadura y pintura de muros y escaleras
- Reconstrucción de piso de cancha

COMUNA 9- BARRIO LA LIBERTAD:

- Mantenimiento y recuperación de arcos de futbol y tableros
- Mantenimiento de cerramiento soldadura y pintura de muros y escaleras
- Reconstrucción de piso de cancha
- Suministro de juegos Infantiles y adecuación de espacios adyacentes

COMUNA 16- BARRIO ALTOS DEL CACIQUE:

- Suministro de juegos Infantiles y adecuación de espacios adyacentes

COMUNA 8- BARRIO 20 DE JULIO:

- Suministro de juegos Infantiles y adecuación de espacios adyacentes

COMUNA 16- BARRIO BOSQUES DEL CACIQUE:

- Suministro de juegos Infantiles y adecuación de espacios adyacentes



BARRIO BOSQUES DEL CACIQUE



ANTES



ESTADO ACTUAL

BARRIO DIAMANTE I



ANTES



ESTADO ACTUAL

BARRIO LA LIBERTAD



ANTES



ESTADO ACTUAL



BARRIO 20 DE JULIO



ANTES



ESTADO ACTUAL

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
176 de 2018	OBRAS DE PARCHEO DE HUECOS, FALLOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES EN LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.746.373.202 Adicional \$ 1.034.022.757,26	30/08/2018	20/05/2019

Estado: Avance de obra: 74.7 % - En ejecución


En cumplimiento de este contrato se adelanta los presupuestos participativos vigencia 2016 y 2017, además de las obras de malla vial urbana.

Así mismo se encuentra en ejecución la pavimentación de vías en los siguientes Barrios:

- ✓ Barrio Buena Vista de la Comuna 14
- ✓ Barrio San Rafael de la Comuna 3
- ✓ Barrio San Gerardo de la Comuna 8 Pendiente por intervenir
- ✓ Barrio Álvarez las Américas de la Comuna 13

CONSTRUCCION REDUCTORES DE VELOCIDAD

UBICACION	BARRIO	COMUNA	TIPO
CALLE 68 NO 10D - 04	PABLO VI	8	PARABOLICO
CALLE 65 ENTRE CASAS 3-10 Y 3-14	BUCARAMANGA	8	PARABOLICO
CALLE 60 ENTRE CARRERA 22W Y 23W	MANZANARES	17	POMPEYANO
CALLE 34 ENTRE CARRERAS 45 Y 46	ALVAREZ	13	PARABOLICO
CRA 38 ENTRE CALLES 33 Y 34	ALVAREZ	13	POMPEYANO

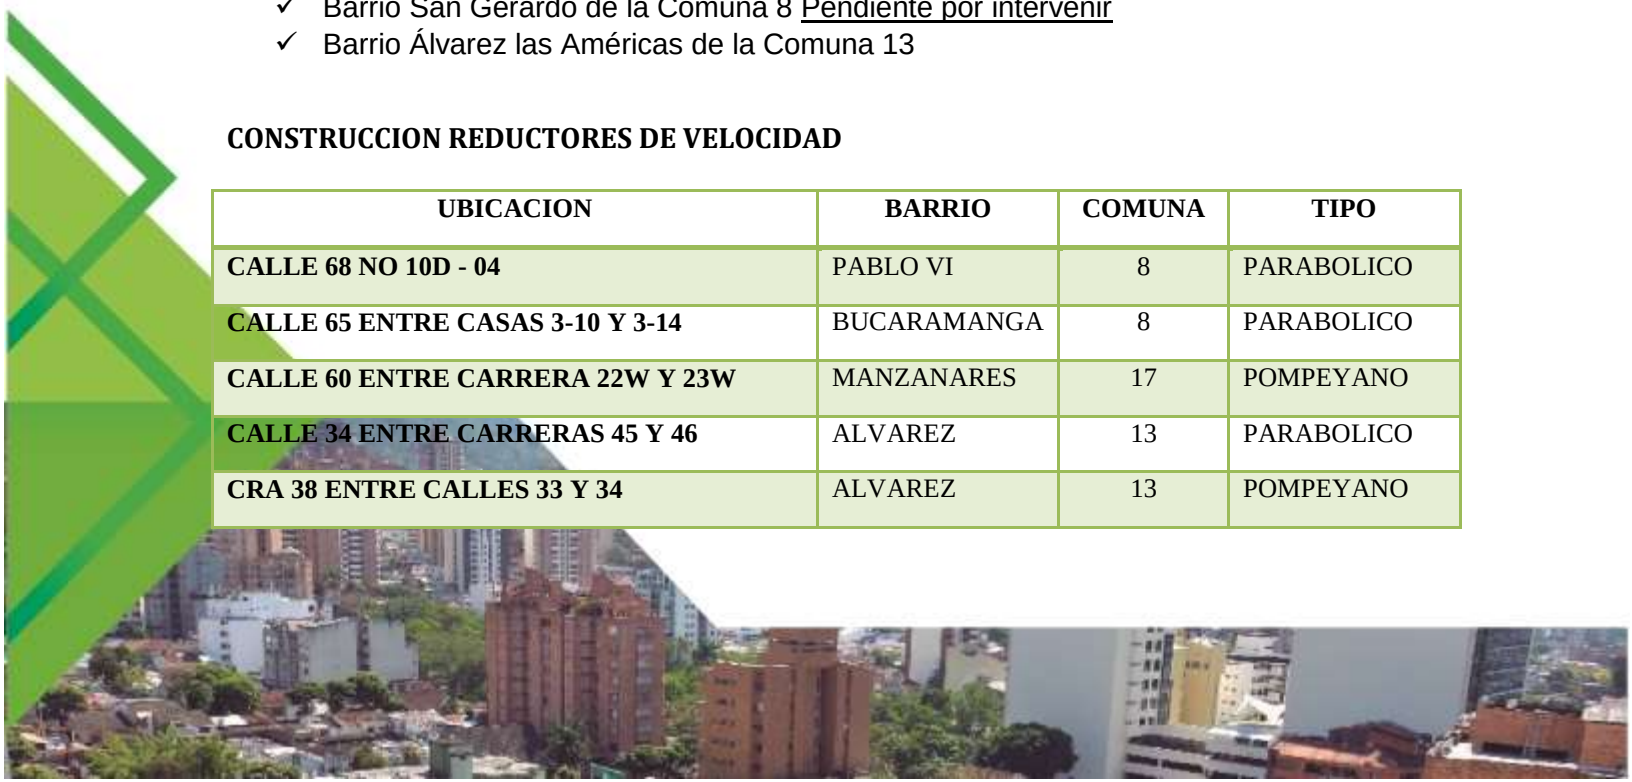

CALLE 45 NO 05 (FRENTE AL CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA DEL PRADO - SENTIDO - OR-OCC)	CAMPO HERMOSO	5	PARABOLICO
CALLE 45 NO 05 (FRENTE AL CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA DEL PRADO - SENTIDO - OCC-OR)	CAMPO HERMOSO	5	PARABOLICO
CALLE 67 NO 10B - 49	PABLO VI	8	PARABOLICO
CALLE 34 NO 42 - 06	ALVAREZ	13	PARABOLICO
CALLE 35 NO 6 - 73	ALFONSO LOPEZ	5	PARABOLICO
CRA 7 ENTRE CASAS 34-46 Y 34-54	ALFONSO LOPEZ	5	PARABOLICO
CALLE 42 NO 7 - 16	ALFONSO LOPEZ	5	PARABOLICO
CRA 7 NO 42 - 56	ALFONSO LOPEZ	5	PARABOLICO
CRA 9 ENTRE CALLES 104B Y 104C	EL PORVENIR	11	PARABOLICO
CALLE 105 NO 8- 24 FRENTE A LOCAL 2	EL PORVENIR	11	PARABOLICO
CALLE 105 NO 8A - 34	EL PORVENIR	11	PARABOLICO
CALLE 104G CON CRA 6A (ESQUINA)	EL PORVENIR	11	POMPEYANO
CRA 8 ENTRE CALLES 104 Y 104A (ESQUINA CALLE 104A)	EL PORVENIR	11	POMPEYANO


Para la implementación del ejercicio de presupuestos participativos 2018, a la fecha se realizó la totalidad de las visitas a las diferentes comunas y corregimientos, de acuerdo a solicitado mediante los acuerdos barriales presentados ante la Secretaria de Planeación en el año 2018.

De dichas visitas ya se tiene el concepto de cuales son viales y cuales no viables, por lo tanto de las viables se están realizando los presupuestos correspondientes a cada barrio clasificados por grupos, como son:

1. Andenes, escaleras y pasamanos
2. Instalación de juegos infantiles y gimnasios
3. Mantenimiento de malla vial urbana
4. Construcción de placa huella entre otros.

Es importante aclarar que se adquirió el compromiso que durante el mes de abril de la presente vigencia se finalizara la formulación de los proyectos pendientes de las vigencias anteriores de presupuestos participativos (2016, 2017), así:

1. Adecuación de parques, kioscos y plazoletas
2. Mantenimiento acueductos veredales.

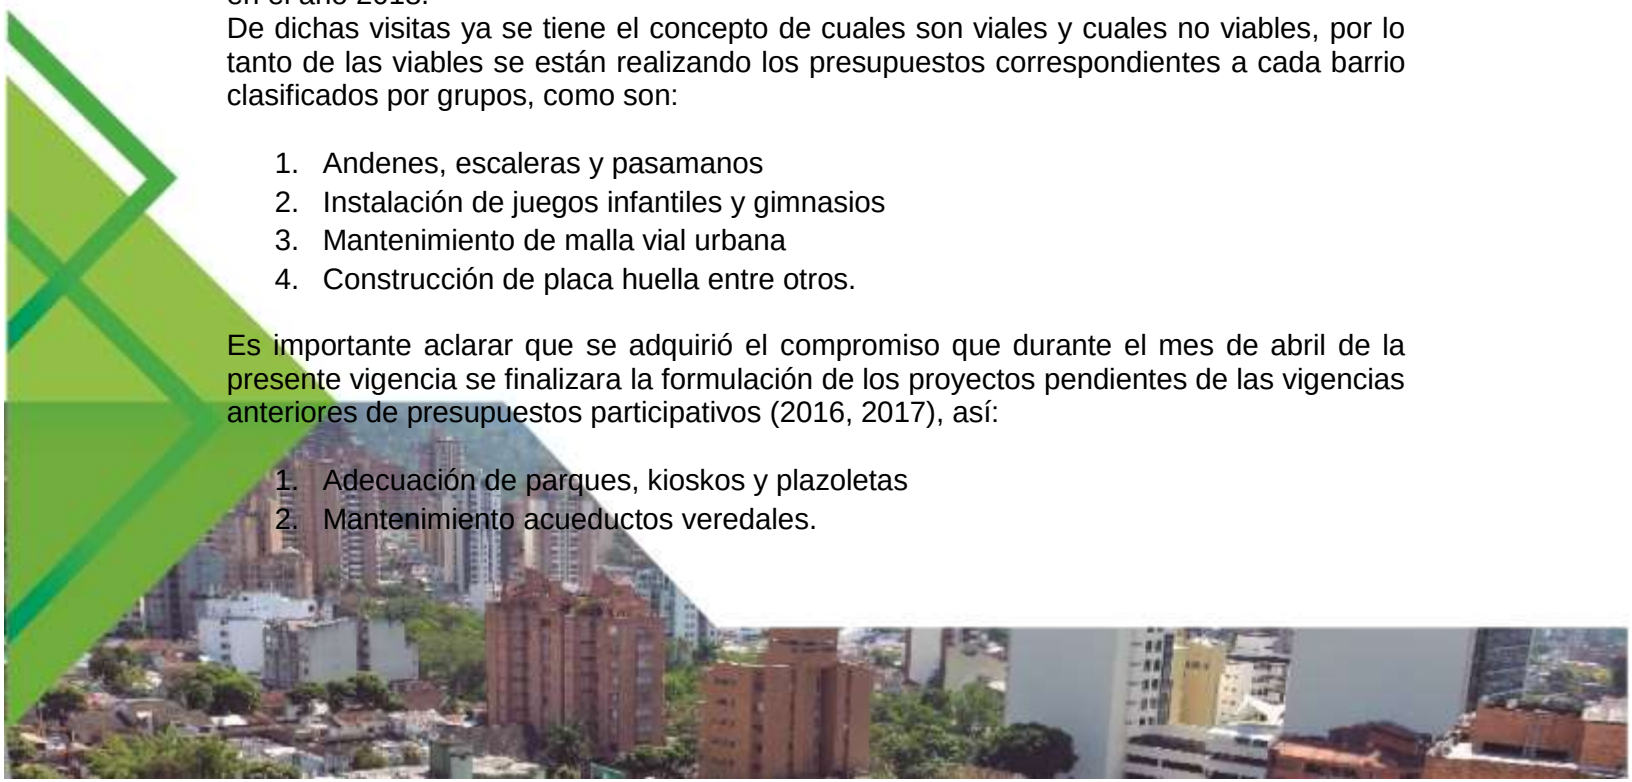

✓ CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO A 31 DE MARZO DE 2019

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2019	LOGRO 2019
PRESUPUESTOS INCLUYENTES.	Número de comunas con obras comunitarias ejecutadas con presupuesto participativo.	17	17	0

2. PROGRAMA: GESTIÓN INTELIGENTE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL

A la fecha se encuentra en el trámite para la obtención de la licencia urbanística para el proyecto Construcción del Centro de Salud Antonia Santos, el cual fue demolido en el año 2015 con ocasión al proyecto “Ampliación del corredor vial primario entre Bucaramanga y Floridablanca en el sector comprendido entre el puente del Barrio Provenza y el intercambiador de tráfico de la Puerta del Sol.

✓ CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO A 31 DE MARZO DE 2019

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2019	LOGRO 2019
GESTIÓN INTELIGENTE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL.	Porcentaje de predios requeridos adquiridos para la ejecución de obras de desarrollo para la ciudad.	100%	100%	100%

1.3 PROGRAMA: UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES

En este programa se encuentran todos los diseños, estudios, consultorías e interventorías para ejecutar los proyectos y las obras del Plan de Desarrollo 2016 – 2019.

Igualmente se continúa con la supervisión y control a través de proceso de interventorías de los proyectos que se encuentran en ejecución, así mismo se encuentra en proceso de contratación el siguiente estudio:

- ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN EL LOTE EN LA CARRERA 39 NO. 42 - 29 BARRIO CABECERA DEL LLANO, DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN JUDICIAL - TUTELA 680014003007-2018-00828-1 BUCARAMANGA. por valor de \$ 54.633.852,00



✓ CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO A 31 DE MARZO DE 2019

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2019	LOGRO 2019
UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES	Realizar el 100% de los diseños, estudios, consultorías e interventorías para ejecutar los proyectos y las obras del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 y otros planes de ciudad.	100%	100%	100%

LINEA ESTRATEGICA 2: INCLUSIÓN SOCIAL

2.1. PROGRAMA: ADULTO MAYOR Y DIGNO

A la fecha se encuentra publicado en el SECOP bajo el número de proceso SI-LP-008 de 2019, el proyecto “MEJORAMIENTO DEL CENTRO VIDA AÑOS MARAVILLOSOS EN LA CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. Por valor de \$ 2.088.988.096,86

✓ CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO A 31 DE MARZO DE 2019

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2019	LOGRO 2019
ADULTO MAYOR Y DIGNO	Número de Centros vida adecuados y/o readecuados.	3	1	0

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

3.1. PROGRAMA: SENDEROS PARA LA VIDA

La Secretaria de Infraestructura próximamente presentara el proyecto ante el Banco de Proyectos dela Secretaria de Planeación, teniendo en cuenta que la Corporación autónoma regional para la defensa de la Meseta de Bucaramanga, el pasado 29 de Marzo de 2019, aprobó la intervención del Sendero peatonal de los cerros orientales y actualmente se estructura con las restricciones solicitadas por la entidad ambiental.



✓ CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO A 31 DE MARZO DE 2019

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2019	LOGRO 2019
SENDEROS PARA LA VIDA	Porcentaje de avance en la habilitación del subsector del gran bosque de los cerros orientales de escala metropolitana.	100%	40%	0

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: CALIDAD DE VIDA

4.1 PROGRAMA: CUIDAR LO QUE ES VALIOSO": RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
112 de 2019	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA TERMINACION DEL EDIFICIO DE APOYO TEATRO SANTANDER Y TEATRINO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES (EMA) EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 4.057.438.420	22/03/2019	21/10/2019

Estado: Avance de Obra: 0% en ejecución

Así mismo se continúa con la ejecución de los contratos que se relacionan a continuación:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
118 de 2017	"AUNAR ESFUERZOS, TECNICOS, FINANCIEROS, Y ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INTERES PUBLICO "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PARA TERMINACIÓN DE LA GRAN SALA DEL TEATRO SANTANDER MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER."	\$ 2.500.000.000 Adicional \$ 1.249.000.000	03/05/2017	21/12/2018

Estado: Avance de Obra 85% - Suspendido





Terminación de la Instalación de silletería

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
198 de 2018	AUNAR ESFUERZOS, TECNICOS, FINANCIEROS, Y ADMINISTRATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INTERÉS PÚBLICO Y PROVISIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA GRAN SALA DEL TEATRO SANTANDER – MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.652.000.000	24/08/2018	28/02/2019

Estado: Avance de Obra 98% - En proceso de liquidación

En desarrollo del Convenio se atienden los siguientes Ítems.: Iluminación ambiental y técnica, tapetes y carpintería de madera y metálica.

Se recibieron luminarias, se instalaron tapetes de la Gran Sala y están en elaboración las carpinterías de madera y metálica.



Instalación pisos de vinilo y tapetes, e instalaciones eléctricas



✓ CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO A 31 DE MARZO DE 2019

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2019	LOGRO 2019
CUIDAR LO QUE ES VALIOSO": RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO	Número de acciones de fortalecimiento para el Teatro Santander.	1	0	0

Este indicador se encuentra con el 100% de cumplimiento, sin embargo se han adelantado otros procesos necesarios para colocarlo al servicio de la comunidad.

4.2 PROGRAMA: OBSERVAR Y SER OBSERVADO: FOMENTO AL TURISMO

La construcción para la unificación de las dos fachadas mediante una columnata, así como la construcción de un puente que une los edificios en su costado occidental y la integración de los parqueaderos y las oficinas de la estructura existente con las oficinas de prensa, se encuentra con un avance del 92% y se espera poder terminar para el mes de Mayo de 2019. Cabe resaltar que el gran salón así como los 4 salones de la estructura existente, se encuentra en servicio de la comunidad.



✓ CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO A 31 DE MARZO DE 2019

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2019	LOGRO 2019
OBSERVAR Y SER OBSERVADO: FOMENTO AL TURISMO	Número de espacios garantizados del centro de convenciones de Bucaramanga como eje central del desarrollo del turismo de reuniones en el municipio.	1	1	0



OBSERVAR Y SER OBSERVADO: FOMENTO AL TURISMO	Número de centros de convenciones - NEOMUNDO terminados.	1	0	0
---	--	---	---	---

El Cumplimiento a estos indicadores fue reportado durante la vigencia 2018

4.3 PROGRAMA: INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO

✓ Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes

La administración Municipal a través de la Secretaria de Infraestructura adelanto el siguiente proceso contractual el cual se encuentra en ejecución:


Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
4 de 2019	MANTENIMIENTO DE PARQUES, ZONAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER, EN LOS SECTORES INDICADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO	\$ 4.977.330.765,00	04/02/2019	31/12/2019

Estado: Avance de Obra: 18,18% - En ejecución

Dentro del presente Contrato Interadministrativo se está realizando rocería a las zonas verdes ubicadas en Parques, separadores y vías del Municipio de Bucaramanga, asignación de 77 parqueros distribuidos en 69 Parques y Zonas verdes, Mantenimiento de Prado y Siembra de Prado, a continuación se relaciona como se encuentra distribuido las zonas de trabajo:

- ✓ 25 Cuadrillas conformadas por 4 personas cada una, ubicadas en los Parques y zonas Verdes de las 17 Comunas del Municipio de Bucaramanga.
- ✓ 4 cuadrillas conformadas por 4 personas cada una, las cuales atienden las entradas principales a Bucaramanga, separadores y rompoys.
- ✓ Personal para Siembra y mantenimiento de Prado conformada por 9 Trabajadores.

Teniendo en cuenta las condiciones climáticas que se ha presentado durante el primer trimestre de la presente vigencia; el proceso de siembra de prado se ha venido aplazando, una vez se inicie el periodo de lluvias se empezará con éste proceso.

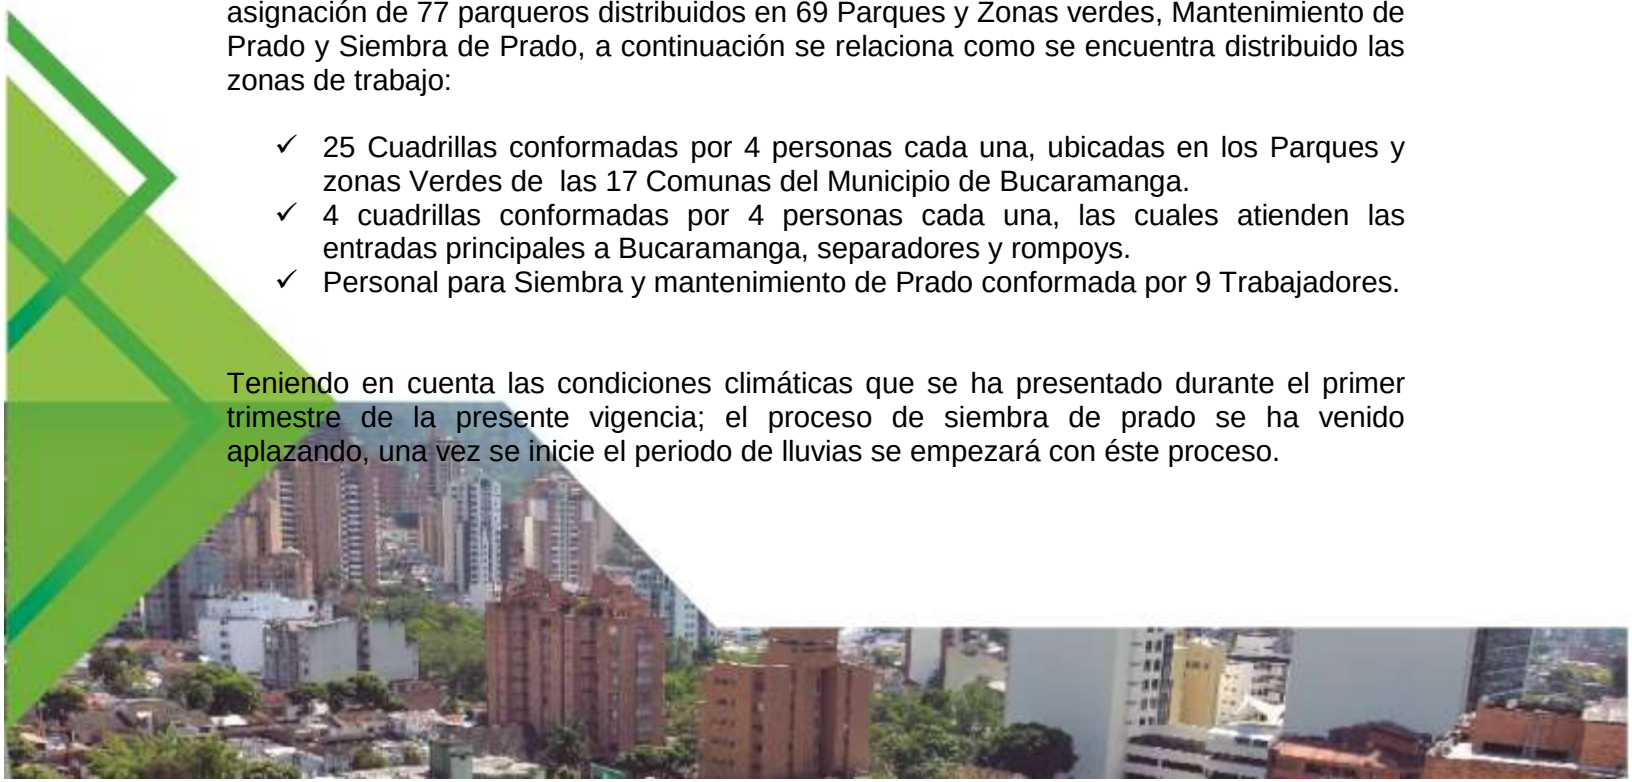

✓ Parqueros:

PARQUE DIAMANTE II



PARQUE SARRAPIOS



✓ Rocería:

MANTENIMIENTO ANTES Y DESPUES TORRES LA INMACULADA



MANTENIMIENTO ANTES Y DESPUES PARQUE LEONES



✓ METAS PLAN DE DESARROLLO A 31 DE MARZO DE 2019

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2019	LOGRO 2019
INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO	Porcentaje de parques con mantenimiento anual realizado.	100%	100%	100%

• Equipamientos Comunitarios (Sociales, deportivos, Culturales entre otros).


Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
218 DE 2018	CONSTRUCCION DEL PARQUE LA CEIBA EN LA COMUNA 13 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 3.185.372.854,8	24/09/2018	29/04/2019

Estado: Avance de obra: 67% -En ejecución



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
216 DE 2018	CONSTRUCCION DEL PARQUE GRANJAS DE PROVENZA EN LA COMUNA 10 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.221.897.961,11	24/09/2018	29/04/2019

Estado: Avance de obra: 83% - En ejecución





Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
138 DE 2018	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA GRUPO 1"	\$ 851.084.220,48	01/08/2018	05/04/2019

Estado: Avance de obra: 95% - En ejecución

El contrato alcanza un avance del **95%**, encontrándose terminados los escenarios deportivos en los Barrios Brisas del Mutis, Monteredondo y Altos del Progreso y Bucaramanga. En el barrio Kennedy ya se surtió el trámite para el permiso de tala del árbol especie orejo solicitado por la comunidad y se solo queda pendiente instalar la cubierta de la gradería. En este momento el contrato está a punto de reiniciarse para su terminación definitiva, sobre lo cual resta alrededor de un 5%.



CERRAMIENTO SUR CANCHA DE FUTBOL BRISAS DEL MUTIS



CANCHA MULTIPLE BRISAS DEL MUTIS



INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad



CANCHA MULTIPLE BARRIO BUCARAMANGA



CANCHA SINTETICA CAMPO MADRID

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
136 DE 2018	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA GRUPO II"	\$ 912.840.262,83	01/08/2018	05/04/2019

Estado: Avance de obra: 95% - En ejecución

El contrato alcanza un avance del **95%**, encontrándose terminadas la mayoría de las intervenciones y en etapa de resolver detalles finales de acabados, para poder realizar la entrega de los diferentes escenarios a la comunidad.



CANCHA MULTIPLE LA FLORESTA



CANCHA MULTIPLE SAN GERARDO





CANCHA MICROFUTBOL-VOLIBOL ALVAREZ



CANCHA MULTIPLE PARQUE LOS LEONES

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
178 DE 2018	MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS CANCHAS DE TENIS DEL PARQUE DE LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.359.817.188,38	13/08/2018	10/04/2019

Estado: Avance de obra: 92.5% - En ejecución

El contrato alcanza un avance del **92,5%**, y se está adelantando la fase final de terminación en donde resta por instalar los vidrios del cerramiento del edificio, los elementos metálicos en fachada del edificio y del cerramiento del escenario, la terminación de la instalación del ascensor y la instalación del mobiliario y aplicación del polvo de ladrillo en las canchas.



EDIFICIO DE SERVICIOS CANCHAS DE TENIS



TERMINACION CANCHA COSTADO ORIENTAL



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
192 DE 2018	REMDELACION DE CANCHAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO I	\$ 3.773.166.237,58	03/09/2018	26/03/2019

Estado: Avance de Obra de: 90% - En proceso de recibo final de obra



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
191 DE 2018	REMDELACION DE CANCHAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO II	\$ 4.073.930.183,1	03/09/2018	26/03/2019

Estado: en Ejecución, Avance de Obra de: 100% - En proceso de liquidación





Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
284 DE 2018	ADECUACION DE LA PLAZOLETA DE LOS EDECANES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 1.223.767.860,23	04/12/2018	21/05/2019

Estado: Avance de Obra de: 68.35% - en ejecución

Actualmente en la obra se ejecutan las actividades correspondientes a excavaciones, redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas, suministro e instalación de sub base granular, figuración de acero, construcción del espejo de agua, construcción de rampa en concreto, instalación de reja para cerramiento, estructura metálica, entre otras actividades que se encuentran en su etapa inicial.



INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
274 DE 2018	ADECUACION DEL PARQUE ECOLOGICO LA FLORA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.546.957.564,76	19/11/2018	15/04/2019

Estado: Avance de Obra de: 95% - En ejecución



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
263 DE 2018	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS PUNTOS VIVE DIGITAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	\$ 134.148.150,90	06/11/2018	25/03/2019

Estado: Avance de Obra de: 100% - En proceso de liquidación

A continuación algunos sitios intervenidos en cumplimiento de este contrato.

1. P.V.D. Colegio INEM



2. P.V.D. BARRIO LA JOYA



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
304 DE 2018	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEL COLEGIO INEM CUSTODIO GARCIA ROVIRA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.738.806.431,2	03/12/2018	05/05/2019

Estado: Avance de Obra de: 65% - En ejecución

El contrato alcanza un avance del **65%**, en el cual se han adelantado la mayor parte de las obras de urbanismo y de la estructura del piso de la cancha con sus filtros y drenajes. También se están adelantando las obras eléctricas y de iluminación de la cancha, quedando pendiente el traslado del poste para la acometida eléctrica, la hincada de los mástiles con las luminarias y la grama sintética.



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
315 DE 2018	"MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS EN DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"	\$ 137.641.322,51	19/12/2018	23/03/2019

Estado: Avance de Obra de: 100% - En proceso de liquidación



BATERIA SANITARIA DEL PARQUE DE LOS NIÑOS (ANTES Y DESPUES)



BATERIA SANITARIA DEL PARQUE LA FLORA (ANTES Y DESPUES)





BATERIA SANITARIA DEL PARQUE DEL BARRIO GIRARDOT (ANTES Y DESPUES)



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
349 DE 2018	INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.398.424.293,54	Por iniciar	Por iniciar

Estado: Avance: 0% - En proceso de legalización de la Interventoría, dado que en la vigencia anterior se declaro desierta.

✓ **CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO A 31 DE MARZO DE 2019**

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2019	LOGRO 2019
INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO	Número de equipamientos comunitarios (sociales, deportivos y culturales: canchas sintéticas, multicentros deportivos, salones comunales, entre otros) intervenidos y/o construidos.	100	35	2

El cumplimiento a este indicador obedece a los contratos antes mencionados.

• **Mantenimiento a Plazas de Mercado**

Se continua con la ejecucion del contrato relacionado a continuacion:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
359 de 2017	REPOSICIÓN DE LA CUBIERTA DEL MODULO NORTE DE LA PLAZA GUARÍN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 585.620.639,85	23/11/2017	18/04/2019

Estado: En ejecución, avance de Obra 82% - En Ejecución

El contratista ya instalo la cubierta y está realizando los trámites correspondientes ante la Essa para la manipulación de las redes existentes y así poder iniciar la instalación del cerramiento de Fachada en lámina multiperforada (Faldón).





CUBIERTA COSTADO NORTE DE LA PLAZA GUARÍN, INTERNA

✓ CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO A 31 DE MARZO DE 2019

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2019	LOGRO 2019
INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO	Número de adecuaciones y/o mantenimientos realizados a las plazas de mercado a cargo del municipio.	4	2	0

- **Andenes Construidos**

Se continua con la ejecucion del contrato relacionado a continuacion:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
182 de 2018	MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DE CONFORMIDAD CON LAS SENTENCIAS DE ACCIONES CONSTITUCIONALES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$329.808.266,00	19/09/2018	08/03/2019

Estado: Avance de Obra: 99% - Suspendido

1. SECTORES ATENDIDOS Y EN EJECUCIÓN

1. Fallo judicial No 2004-2624, consistente en: Adecuación del área de espacio público Calle 12 No. 20-70 La Canasta Campesina





2. Fallo judicial No 2008-0328 consistente en: Recuperación del espacio público en la Calle 90 No. 17D - 39 del Barrio San Luis.



3. Fallo judicial No 2008-0363, consistente en: Remover las varillas de hierro incrustadas en el andén peatonal de la carrera 11 entre calles 1 y 3 del Barrio San Rafael.



✓ CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO A 31 DE MARZO DE 2019

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2019	LOGRO 2019
INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO	Número de M2 de andenes construidos.	30.000	10.400	0

LÍNEA ESTRATÉGICA 6: INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD

6.1 PROGRAMA: PROMOCIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS

Actualmente se encuentra en proceso de contratación el proyecto “CONSTRUCCIÓN CICLO-INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA” con el numero de proceso SI-LP-003-2019 por valor de \$ 13.239.423.934,17

✓ CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO A 31 DE MARZO DE 2019

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2019	LOGRO 2019
PROMOCIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS	Número de kms de ciclorutas para transporte urbano implementados.	20	10	0

Una vez se legalice el contrato se realizará el reporte a este indicador.

PROGRAMA: MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA

- Mantenimiento Malla Vial Urbana


Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
176 de 2018	OBRAS DE PARCHEO DE HUECOS, FALLOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES EN LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.746.373.202,00 Adicional \$1.034'022.757,26	30/08/2018	20/05/2019

Estado: Avance de Obra: 74.7% - En ejecución



SECTORES ATENDIDOS Y EN EJECUCIÓN

- A. BARRIO CIUDAD VENECIA SECTOR CALLE 93 ENTRE CRA 14 Y 13B Y CRA 14 ENTRE CALLES 95 Y 96:** Obras ejecutadas:
- ✓ Reposición de Losas en concreto en sectores deteriorados.
 - ✓ Adecuación de urbanismo mediante la construcción de andenes y sardineles, en sectores deteriorados.
 - ✓
- B. BARRIO PABLO VI:** Obras ejecutadas:
- ✓ Se efectúan trabajos de demolición de carpeta asfáltica existente, instalación de Mezcla Densa Caliente MDC-19 para parcheo, en los diferentes sectores aprobados.
 - ✓ Construcción de muro de contención en calle 68 con 10ª, para la estabilización de la banca.
- C. BARRIO DELICIAS ALTAS CALLE 104ª ENTRE CARRERAS 15 Y 16:** Obras ejecutadas:
- ✓ Obras de reposición de tubería de Alcantarillado sanitario existente D= 10" y D= 6"
 - ✓ Reposición de Losas en concreto en sectores deteriorados.
- D. BARRIO SAN PEDRO CLAVER CALLE 73 ENTRE CRA 28ª Y 29ª Y CARRERA 29 ENTRE CALLES 72 Y 73:** Obras ejecutadas:
- ✓ Obras de reposición de tuberías de Alcantarillado existente D= 10" y D= 8"
 - ✓ Construcción de Pavimento en Concreto Hidráulico.
- E. BARRIO PUERTO RICO VÍA VEHICULAR DE ACCESO AL BARRIO PUERTO RICO DIAGONAL 32C CON 9:** Obras ejecutadas:
- ✓ Obras de reposición de tuberías de Alcantarillado existente D= 10" y D= 8"
 - ✓ Construcción de Pavimento en Concreto Hidráulico
- F. BARRIO BUENAVISTA CALLE 20 ENTRE CARRERAS 64 Y 65:** Obras ejecutadas:
- ✓ Construcción de pavimento en concreto hidráulico.
 - ✓ Construcción de andén y adecuación de espacio público.
- G. BARRIO SAN RAFAEL CALLE 4 ENTRE CARRERAS 15 Y 13:** Obras ejecutadas:
- ✓ Construcción de pavimento en concreto hidráulico.
 - ✓ Construcción de andenes y adecuación de espacio público.
- H. BARRIO ALVAREZ CARRERA 44 ENTRE CALLES 32 Y 33:** Obras ejecutadas:
- ✓ Se efectúan trabajos de demolición de carpeta asfáltica existente, instalación de Mezcla Densa Caliente MDC-19 para reposición de carpeta asfáltica y estructura, en la calle aprobada.
- I. PARCHEO EN PUNTOS CRÍTICOS EN LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA:** Se realizan obras de parcheo y/o bacheo para Recuperación de Pavimento Asfáltico en los sectores:

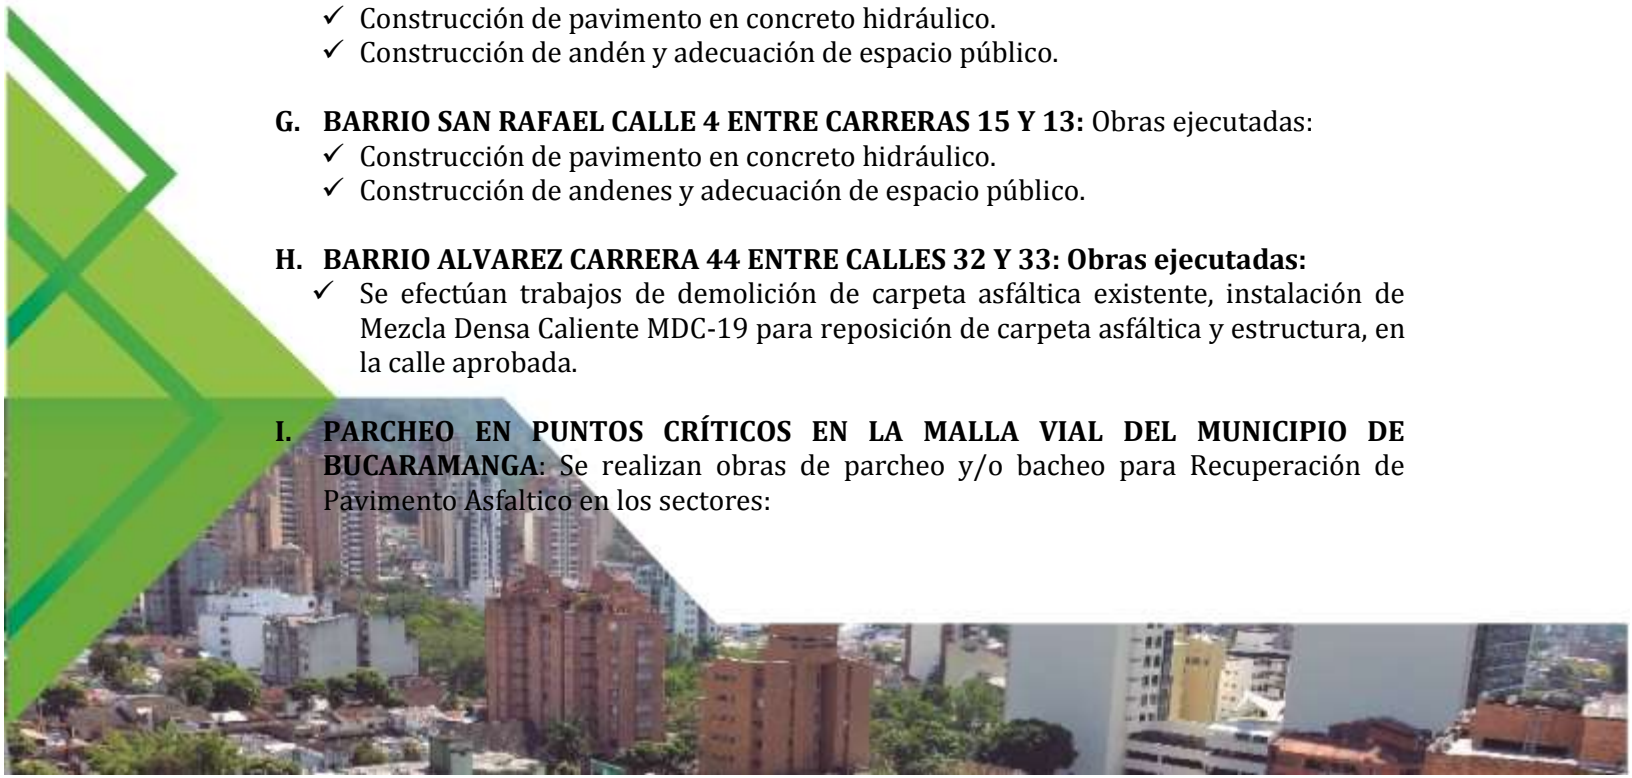

- ✓ CARRERA 27: sector Puerta del Sol, hasta la avenida Rosita.
- ✓ BARRIO CABECERA: Carrera 36 entre Calles 50 y 44, Carrera 37 entre calles 52 y 53, Carrera 33 entre calles 55 y 56, Carrera 35 entre calles 45 y 52., Calle 51 entre Carrera 39 y 38, sectores Carrera 38 con Calle 49, Calle 51 entre Carreras 38 y 39, y Plaza Guarín Carrera 33
- ✓ BARRIO CENTRO: Carrera 14 entre calles 36 y 37
- ✓ BARRIO GARCIA ROVIRA: Calles 34 y 33, entre carreras 10 y 14.
- ✓ BARRIO VILLA DIAMANTE: Carrera 29 entre calles 96 y 93
- ✓ BARRIO ALVAREZ: Carrera 33 entre calles 34 y 32 (frente a plaza guarin)
- ✓ BARRIO LA CONDORDIA: Carrera 18 entre Avenida la Rosita y calle 51. Carrera 21 entre calles 56 y 51.
- ✓ BARRIO EL TEJAR: Transversal oriental, calle 100 y calle 93
- ✓ BARRIO SAN MARTIN/PUERTA DEL SOL: Carrera 33 entre calles 93 y 70 (vía antigua)
- ✓ BARRIO SOTOMAYOR: Carrera 27^a entre Calles 45 y 45BIS

J. CARRERA 16 ENTRE CALLES 45 Y DIAGONAL 15: Obras ejecutadas:

- ✓ Adecuación de espacio público, mediante la instalación de losetas y sardinel.
- ✓ Demolición de carpeta asfáltica existente, instalación de Mezcla Densa Caliente MDC-19 para parcheo, en sector aprobado.

REGISTRO FOTOGRAFICO

BARRIO PUERTO RICO VÍA VEHICULAR DE ACCESO AL BARRIO PUERTO RICO DIAGONAL 32C CON 9



BARRIO BUENAVISTA CALLE 20 ENTRE CARRERAS 64 Y 65



PARCHEO EN PUNTOS CRÍTICOS EN LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA:



BARRIO GARCIA ROVIRA



BARRIO VILLA DIAMANTE CARRERA 29 ENTRE CALLES 93 Y 96



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
115 DE 2019	AUNAR ESFUERZOS, FINANCIEROS, TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DE ALGUNAS VÍAS DEL BARRIO LA PEDREGOSA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO MUNICIPAL NO. 0077 DE 2008.	VALOR: Total: \$165.235.077 APOORTE ALCALDIA: \$90.802.168 ACUEDUCTO: \$74.432.909	29 de Marzo de 2019	28 de Julio de 2019

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION No. 1113 DEL 29 DE AGOSTO DE 2016, CUYO OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, JURIDICOS Y FINANCIEROS PARA ADELANTAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS RELACIONADAS CON LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS REQUERIDAS DE CONSTRUCCION, REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, EL RECAUDO DE PEAJES ASI COMO LA OPERACIÓN TOTAL DE LOS TRAMOS VIALES QUE FUERON OBJETO DEL CONTRATO DE CONCESION No. 002 DE 2006, INCLUYENDO LAS NUEVA OBRAS QUE SE IDENTIFIQUEN COMO PRIORITARIAS.

A la fecha se encuentra el proceso de contratación pública No. LP-GE-02-2019 así:



No.	objeto	Valor	Plazo del Contrato	UBICACION
1	REHABILITACION DE LOS TRAMOS: 1. ENTRE LA CARRERA 27 CON CALLE 65 EN BUCARAMANGA, (COLEGIO LA SALLE) SIN INCLUIR EL PUENTE HASTA LA INTERSECCION PALENQUE (PR71+301) 2. SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCION PALENQUE (PR71+310 RUTA 6602) Y LA INTERSECCION T DEL AEROPUERTO (PR63+800 RUTA 6602) Y 3. SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCION T DEL AEROPUERTO (PR63+800 RUTA 6602) Y EL AEROPUERTO DE PALONEGRO DE BUCARAMANGA Y LA CONSTRUCCION DEL RETORNO UBICADO EN EL PR. 76+680 AL PR 76+990 DEL TRAMO ENTRE LA CARRERA 27 CON CALLE 65 EN BUCARAMANGA, (COLEGIO LA SALLE) HASTA LA INTERSECCION PALENQUE (PR 71+301)	\$ 45.247.352.479	7 MESES	BUCARAMANGA – GIRON – LEBRIJA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Este proceso será adjudicado el 27 de Mayo de 2019

✓ CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO A 31 DE MARZO DE 2019

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2019	LOGRO 2019
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA	Número de M2 de malla vial urbana mejorados y/o construidos.	60.000	30.500	7.660

El cumplimiento a este indicador obedece al contrato antes mencionado.

• Megaobras de Infraestructura Vial



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
272 de 2014	CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL MESÓN DE LOS BÚCAROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	Valor Inicial \$ 54.909.500.000 Adicional 1. \$ 14.516.066.713 Adicional 2. \$ 10.945.041.309 Adicional 3. \$ 2.886.000.000 Valor Total \$ 83.256.608.022	10 de septiembre de 2014	24 de Marzo de 2019

Estado: Avance de Obra: 97.66% -En ejecución

REGISTRO FOTOGRAFICO



Plazoleta No. 1 Cerramiento Escuela Normal Superior



Fundida Piso Puente Peatonal Concreto Ranurado





Fundida Piso Puente Peatonal Concreto Ranurado



Acopio Piedra Barichara

✓ CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO A 31 DE MARZO DE 2019

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2019	LOGRO 2019
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA	Número de megaobras terminadas.	3	0	0

El cumplimiento a este indicador obedece a la terminación del Tercer carril y la Construcción del intercambiador del Mesón de los Búcaros, el cual se encuentra pendiente de reporte.



6.2 PROGRAMA: MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL RURAL

La Secretaria de Infraestructura se encuentra adelantando un proyecto para la atención de emergencias con el fin de habilitar y brincar transitabilidad en la red vial de Municipio de Bucaramanga, por un valor aproximado de \$ 71.000.000, lo anterior a que la Maquinaria del Municipio adscrita a este despacho se encuentra sin el debido mantenimiento y hasta tanto la Secretaria Administrativa adelante el proceso, es necesario realizar la contratación que supla la necesidad de eliminar el riesgo de derrumbes en las diferentes veredas de los tres corregimientos.

✓ CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO A 31 DE MARZO DE 2019

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2019	LOGRO 2019
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL RURAL	Número de kms de vías rurales con transitabilidad mantenida.	140	140	140
	Número de ML de placa huella construidas.	5.000	4.000	0

6.3 PROGRAMA: SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS Y RURALES

6.4. PROGRAMA: ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL

La Secretaria de Infraestructura a traves de la Oficina de Alumbrado Publico ha realizado



INDICADORES 2019

MES	PQR'S RECIBIDAS EN EL MES	PQR'S ATENDIDAS DEL MES	% ATENCION PQR'S DEL MES	TIEMPO DE RESPUESTA (DIAS)	PQR'S ATENDIDOS DE OTROS MESES	ACUMULADA PQR'S RECIBIDAS	ACUMULADA PQR'S ATENDIDAS	% ATENCION PQR'S ACUMULADO
Enero	746	329	44%	5	187	746	516	69%
Febrero	719	620	86%	4	117	1366	1253	92%
Marzo	938	850	91%	4	70	2216	2173	98%
Abril								
Mayo								
Junio								
Julio								
Agosto								
Septiembre								
Octubre								
Noviembre								
Diciembre								
TOTAL	2403	1799			374			
TOTAL PQR'S ACUMULADO RECIBIDAS					0			
TOTAL PQR'S ACUMULADO ATENDIDAS					0			
PORCENTAJE DE ATENCION PQR'S					98%			

Atencion operacion de alumbrado publico

MES	LUMINARIAS REPARADAS	CONTROLES REPARADOS	REPOSICION DE RED (MT S)	LUMINARIAS HABILITADAS	TOTAL LUMINARIAS ATENDIDAS
Enero	845	2	168	988	1833
Febrero	1009	4	359	1426	2435
Marzo	943	5	502	1824	2767

CONTRATO MANTENIMIENTO

Se termina la ejecución de los contratos de mantenimientos para el alumbrado público en cumplimiento de los siguientes procesos contractuales:



CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO											
CONCEPTO	N° CONT	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN INICIAL	VALOR INICIAL CONTRATO	ADICIONAL 01		ADICIONAL 02		FINAL	
						TIEMPO DIAS	VALOR	TIEMPO	VALOR	FECHA	VALOR
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	302	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - GRUPO 1, COINGESER	19/10/2017	18/10/2018	\$ 810.496.308	75	\$ 164.125.502	90	\$ 202.624.077	31/03/2019	\$ 1.177.245.887
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	303	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - GRUPO 2, EMIE	18/10/2017	17/10/2018	\$ 671.856.317	75	\$ 138.290.425	90	\$ 167.964.079	30/03/2019	\$ 978.110.821
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	304	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - GRUPO 3, CIVAREL INGENIERIA	19/10/2017	18/10/2018	\$ 651.732.060	75	\$ 131.975.742	90	\$ 162.933.015	31/03/2019	\$ 946.640.817
INTERVENTORIA ALUMBRADO PUBLICO	305	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE	19/10/2017	18/10/2018	\$ 651.732.060	75	\$ 131.975.742	90	\$ 162.933.015	31/03/2019	\$ 946.640.817

Estado: 100% ejecutado, en liquidación.

PARQUE LINEAL RIO DE ORO

Contrato No.	Objeto	Valor	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
214 de 2018	CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL PARQUE LINEAL RIO DE ORO FASE II	\$965.458.895	19/09/2018	31/12/2018

Estado: Avance de Obra: 98% - Actualmente se encuentra suspendido mientras se realizan actividades de certificaciones RETIE y RETILAP – Obra terminada






LUMINARIAS EN GRADAS DE PLAZOLETA CENTRAL DEL
PARQUE LINEAL RIO DE ORO



LUMINARIAS ENCENDIDAS PARA PRUEBA Y DISPONIBLES
PARA USO DE LA COMUNIDAD-

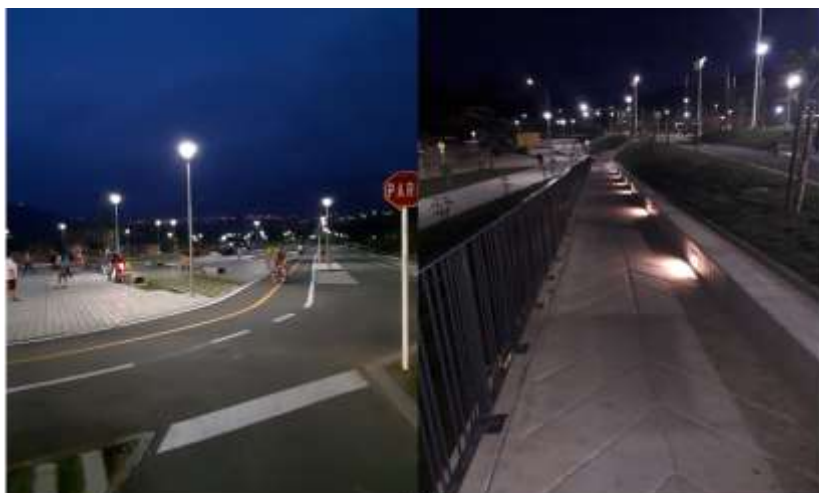

CICLO VIA Y COSTADO NORTE DEL PARQUE
ILUMINADO Y EN USO POR LA COMUNIDAD

ILUMINACION RAMPA PEATONAL

EXPANSION ALUMBRADO PUBLICO SECTOR RURAL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

CONTRATO NO.	OBJETO	VALOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
238 DE 2018	EXPANSION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - 2018	\$892.917.138,00	01/10/2018	06/03/2019

ESTADO: En Ejecución Avance de Obra: 100% - En Proceso de Liquidación



VEREDAS INTERVENIDAS EN PROYECTO DE EXPANSION RURAL 2018

VEREDA ANGELINOS, VDA SANTA BARBARA, RETIRO GRANDE, RETIRO CHIQUITO, VEREDA BOLARQUI PARTE ALTA, VEREDA CAPILLA ALTA, VEREDA CAPILLA BAJA, VEREDA BOLARQUI BAJO, VEREDA MONSERRATE, VEREDA GUALILO, VEREDA MAGUEYES, VEREDA SANTOS BAJOS, VEREDA ROSA BLANCA, VEREDA ABURRIDO PARTE BAJA, VEREDA SAN PEDRO.



LUMINARIAS LED - VEREDA ANGELINOS



LUMINARIAS LED - VEREDA RETIRO GRANDE

INSTALACION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECNOLOGIA LED PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - FASE II, EN LAS COMUNAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 11.



INSTALACION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECNOLOGIA LED PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – FASE II, EN LAS COMUNAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 11.						
GRUPO	CONTRATISTA	VALOR	FECHA DE INICIO	PLAZO (días)	FECHA FINAL	AVANCE
1	BIOTECNOLOGIA	\$ 1.855.918.171	23/01/2019	150	23/06/2019	2,13%
2	UT ILUMINACION URBANA	\$ 1.560.166.824	27/12/2018	150	27/05/2019	25,49%
3	CONSORCIO ALUMBRADO PUBLICO 2018	\$ 2.001.758.182	27/12/2018	150	27/05/2019	12,52%
4	CONSORCIO ALUMBRADO FASE II	\$ 1.915.427.500	23/01/2019	150	23/06/2019	0,00%

GRUPO	COMUNAS A INTERVENIR
1	1 y 2
2	3 y 4
3	5, 6, 7 y 8
4	9, 10 y 11



ESTADO DE PEATONALES DE SECTORES DE COMUNA 10 - EN LA IMAGEN SE OBSERVA LA LUMINARIA DE SODIO QUE SERA REEMPLAZADA POR LED



CALLE DEL BARRIO ALFONSO LOPEZ MODERNIZADA A LED - PUEDE OBSERVARSE EL CONTRASTE ENTRE LAS TRES LUMINARIAS LED Y LA AMARILLA DE SODIO





TECNICO CAMBIANDO LUMINARIA A TECNOLOGIA LED
USANDO ELEMENTOS DE SEGURIDAD




CALLE TOTALMENTE MODERNIZADA A TECNOLOGIA LED

✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO A 31 MARZO DE 2019

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2019	LOGRO 2019
ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL	Número de luminarias sustituidas a LED.	36.000	12.000	0
	Número de luminarias expandidas.	1.000	300	0
	Número de puntos de telemedida instalados y puestos en marcha.	50	20	4
	Número de parques y/o escenarios públicos modernizados en su alumbrado público.	20	5	0
	Porcentaje de nuevos espacios públicos con alumbrado público instalado.	100%	100%	100%
	Porcentaje de luminarias que se encuentran en funcionamiento.	96%	96%	91%

Para el cumplimiento de estos indicadores se adelanta:

- ✓ **Proyecto Piloto Energía Solar:** Esta próximo a publicarse en el SECOP -Parque Contemplativo El Carrasco. 30 de abril de 2019.
- ✓ **Proyecto Construcción y Modernización del Alumbrado Público de los Parques del Municipio de Bucaramanga –** (Proyectado 2019)
- ✓ **Proyecto de Repotenciación de Escenarios Deportivos –** (Proyectado 2019)

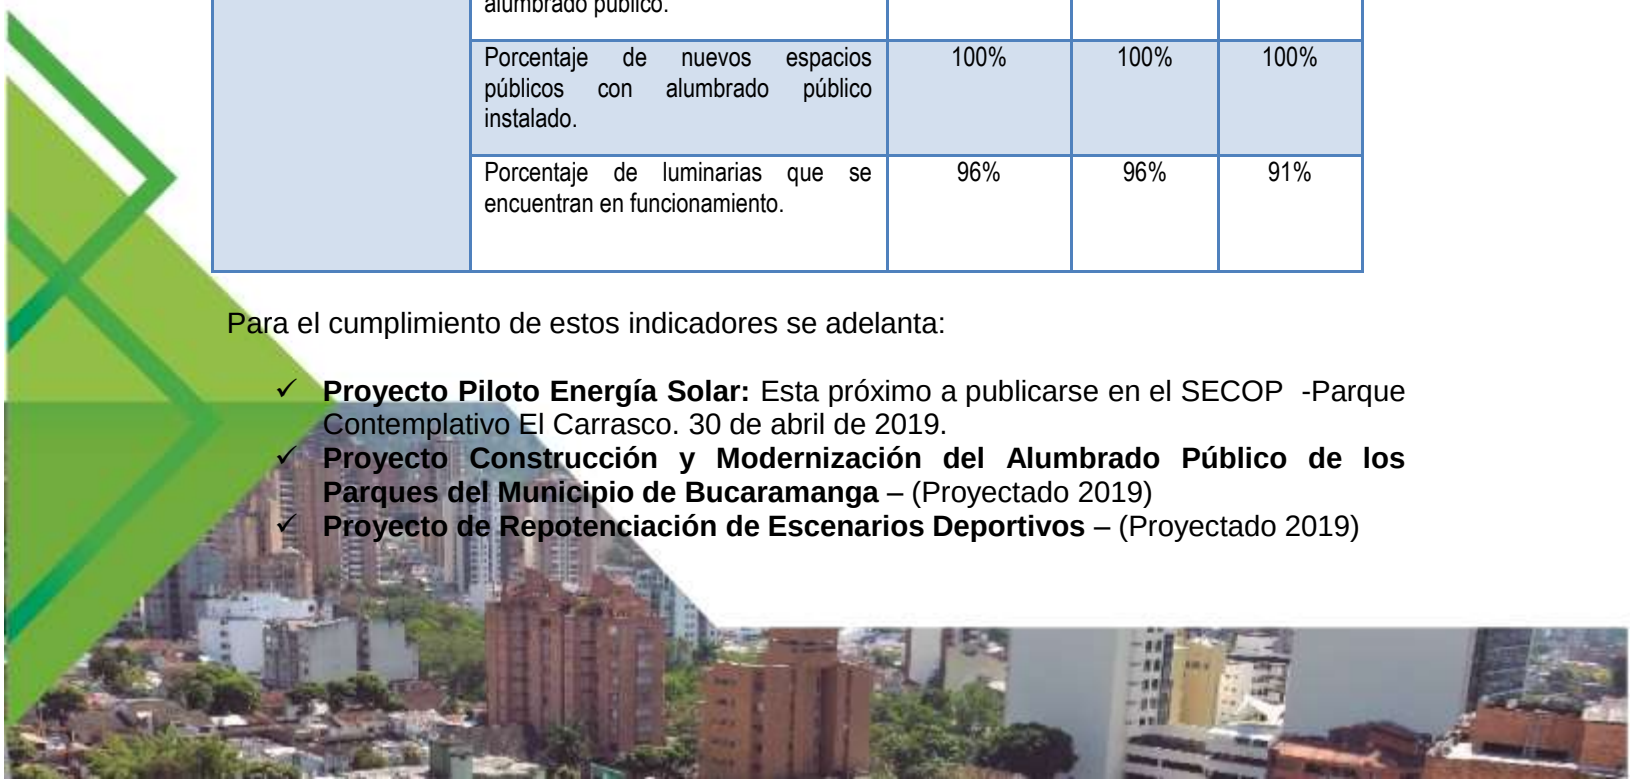

- ✓ Proyecto de Modernización de alumbrado público de algunos sitios representativos de la Ciudad – Calle de las letras (Proyectado 2019)

7. OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR LA SECRETARIA

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
405 de 2017	CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.598.565.682,8	01/02/2018	15/04/2019

Estado: Avance de Obra: 100% - Ejecutado –en proceso de liquidación



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
71 de 2018	RECONSTRUCCION DE LA ANTIGUA ESTACION DEL CAFÉ MADRID PARA LA HABILITACIÓN DE UN LUDOTECA EN EL BARRIO CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.254.823.459.69	12/03/2018	24/05/2019

Estado: Avance de Obra: 81.98% - En ejecución





Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
282 de 2018	GRUPO 1 – ADECUACIONES LOCATIVAS, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, BICENTENARIO.”.	\$ 1.524.762.067,62	26/11/2018	01/05/2019

Estado: Avance de obra: 25% - En ejecución

El contrato alcanza un avance del **25%**, e incluye la intervención del área de cocina, cafetería y comedor del COLEGIO BICENTENARIO, en el cual se ha terminado la fase de construcción de la estructura metálica del comedor y se adelantaron actividades de mampostería e instalaciones del área de cocina.



ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTA COMEDOR



MAMPOSTERÍA AREA DE COCINA

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
291 de 2018	GRUPO 2 – ADECUACIONES LOCATIVAS, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL A	\$ 1.033.961.774,35	26/11/2018	19/03/2019



	LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, (MAIPORE B, AURELIO MARTINEZ MUTIS SEDE C)			
--	--	--	--	--

Estado: Avance de obra: 95% - Suspendido

El contrato alcanza un avance del **95%**, en el cual queda pendiente solo el acabado sintético del piso de la cancha y la instalación de la lona de cubierta en portería del Colegio Maiporé B. La Sede C del Colegio Aurelio Martínez Mutis, ya fue entregada. En este momento se suspende la obra en Maiporé B, debido a una fuerte filtración de aguas servidas del sistema de alcantarillado del colegio, el cual traspasa el lindero hacia la sede C; por lo anterior se van a estudiar las alternativas de solución para la reposición del sistema de alcantarillado, el cual no hacía parte del alcance del contrato.



CONSTRUCCION BATERIAS DE BAÑOS (EXTERNO) COLEGIO
MAIPORE



CONSTRUCCIÓN DE LAS BATERÍAS DE BAÑOS (INTERNO)
COLEGIO MAIPORE

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
288 de 2018	"GRUPO 3 – ADECUACIONES LOCATIVAS, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, (INEM SEDE B, SANTA MARIA GORETY SEDE B, AURELIO MARTINEZ SEDE B, JOSE CELESTINO MUTIS)	\$ 924.175.430,89	26/11/2018	23/03/2019

Estado: Avance de obra: 100% - ejecutado

El contrato se encuentra 100% terminado y recibida las obras por parte de la comunidad educativa.





COLEGIO AURELIO MARTÍNEZ MUTIS SEDE "B"



COLEGIO SANTA MARÍA GORETTI SEDE "B"

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
283 de 2018	"GRUPO 4 – ADECUACIONES LOCATIVAS, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, (ANDRES PAEZ SOTO JOYA, POLITECNICO SEDE B)	\$ 881.067.522,98	26/11/2018	23/03/2019

Estado: Avance de obra: 99% - en proceso de recibo final

El contrato se encuentra 99% terminado y en proceso de entrega a las directivas del Colegio. Se están atendiendo unas observaciones para poder dar recibido a los trabajos.



COLEGIO POLITECNICO SEDE "B"



COLEGIO ANDRÉS PÁEZ SOTO JOYA

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
286 de 2018	"GRUPO 5 – ADECUACIONES LOCATIVAS, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, (VIJAGUAL A, CLUB UNION A Y B,	\$ 882.682.552,21	26/11/2018	07/04/2019



	SANTANDER SEDE A)			
--	-------------------	--	--	--

Estado: Avance de obra: 95% en ejecución

El contrato alcanza un avance del **95%**, encontrándose en la fase final de acabados. En ese encuentra suspendido por un problema sobreviniente presentado por la falta de presión de agua en el Colegio Santander que no permite el adecuado funcionamiento de las instalaciones sanitarias y de servicios del colegio, ante lo cual se debe revisar el sistema para ver de qué manera se presuriza la red, para que las baterías instaladas y las demás existentes funcionen correctamente.



COLEGIO SANTANDER



COLEGIO CLUB UNION A



COLEGIO CLUB UNION B



COLEGIO VIJAGUALA



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
285 de 2018	"GRUPO 6 – ADECUACIONES LOCATIVAS, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, (LA JUVENTUD, BOSCONIA,, BOLARQUI SEDE B, BOSCONIA LA CUCHILLA)	\$ 873.439.182,03	26/11/2018	07/04/2019

Estado: Avance de obra: 98% - en proceso de recibo final

El contrato alcanza un avance del **95%**, el cual involucra la intervención de dos colegios rurales y de uno urbano, encontrándose en fase final de acabados.



COLEGIO LA JUVENTUD



COLEGIO BOSCONIA BOLARQUÍ – JUEGOS INFANTILES

COLEGIO BOSCONIA BOLARQUÍ – PINTURA AULAS



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
224 de 2018	"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN LOCATIVA DE AMBIENTES DE TRANSICIÓN UBICADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO I"	\$443.300.921,64	27/09/2018	29/03/2019

Estado: Avance de Obra: 100% - ejecutado

EL GRUPO I CONFORMADO POR LOS COLEGIO CLUB UNIÓN SEDE C (BARRIO COLORADOS), SANTO ÁNGEL (BARRIO VILLA ROSA), CLUB UNIÓN SEDE E (BARRIO CAFÉ MADRID), CLAVERIANO.

CLUB UNIÓN SEDE C -COLORADOS



PARQUE INFANTIL



AULA DE CLASE

CLUB UNIÓN SEDE E -CAFÉ MADRID



PATIO INTERNO AULA



PARQUE INFANTIL



AULA DE TRANSICION



SANTO ÁNGEL



AULA TRANSICION

CANCHA BASKET BOL

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
225 de 2018	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN LOCATIVA DE AMBIENTES DE TRANSICIÓN UBICADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO II	\$ 336,328.888,00	27/09/2018	27/02/2019

Estado: Avance de Obra: 100% - Ejecutado

EL GRUPO II CONFORMADO POR LOS COLEGIO GUSTAVO COTE URIBE, LA JUVENTUD, CAMPO HERMOSO SEDE C - JOSÉ ANTONIO GALÁN.

GUSTAVO COTE URIBE



PAREDES INTERNAS AULAS

PARQUE INFANTIL



LA JUVENTUD



AULA DE TRANSICION

BAÑO INFANTIL

CAMPO HERMOSO



AULA DE TRANSICION Y PISO MODULAR PATIO

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
221 de 2018	“MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN LOCATIVA DE AMBIENTES DE TRANSICIÓN UBICADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO III	\$ 741.206.653,26	18/10/2018	29/03/2019

Estado: Avance de Obra: 100% - Ejecutado

EL GRUPO III CONFORMADO POR LOS COLEGIO LAS AMÉRICAS, SANTANDER SEDE D, TEC. DÁMASO ZAPATA SEDE D – JARDÍN INFANTIL



DÁMASO ZAPATA SEDE D



Zona de pasillos aulas de transición



Zona de juegos infantiles

LAS AMÉRICAS



Aula de transición



PARQUE INFANTIL

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
242 de 2018	REPARACIONES LOCATIVAS Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA: PROMOCIÓN SOCIAL SEDES D Y C Y SANTA INES. GRUPO – GRUPO I.	\$ 1.573.977.283,05	05/10/2018	09/05/2019

Estado: Avance de Obra: 68% - Vigencias futuras



IE. PROMOCION SOCIAL SEDE D:

		
<i>Pasamanos acceso segundo nivel</i>	<i>Vista de pasamanos</i>	<i>Pasamanos zona de transición</i>
		
<i>Cerramiento en tubería metálica</i>	<i>Mampostería en baños</i>	<i>Mampostería en cocina</i>
		
<i>Instalación de red sanitaria</i>	<i>Mampostería cocina</i>	<i>Instalaciones eléctrica</i>



IE PROMOCION SOCIAL SEDE C



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
245 de 2018	REPARACIONES LOCATIVAS Y MANTENIMIENTO GENERAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA: JORGE ARDILA DUARTE Y AURELIO MARTÍNEZ MUTIS. GRUPO II	\$1.512.077.835,80	05/10/2018	09/04/2019

Estado: Avance de Obra: 82% - Vigencias futuras

REGISTRO FOTOGRÁFICO – IE. JORGE ARDILA DUARTE



Instalacion Teja tipo Sandwich en la cubierta del deposito.



Tratamiento de zonas deprimidas en el asfalto patio 1.

REGISTRO FOTOGRÁFICO – IE. JORGE ARDILA DUARTE



Aplicación piso EPDM Patio Transicion



Instalación de Postes y canastas Patio 1- Patio 2



REGISTRO FOTOGRÁFICO – IE. AURELIO MARTINEZ MUTIS



Terminación de Aulas de Informática

REGISTRO FOTOGRÁFICO – IE. AURELIO MARTINEZ MUTIS



Pintura de vigas salones



Instalación de red eléctrica salones

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
243 de 2018	REPARACIONES LOCATIVAS Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA: CLUB UNION SEDE D (OLAS BAJAS) Y MAIPORE SEDE C. GRUPO III.	\$ 1.454.009.727,20	05/10/2018	09/04/2019

Estado: Avance de Obra: 98% - Vigencias futuras



MAIPORÉ SEDE C



CLUB UNIÓN SEDE D





Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
247 de 2018	REPARACIONES LOCATIVAS Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA: SEDE RURAL EL PABLON. GRUPO IV.	\$ 1.386.169.767.87	05/10/2018	12/04/2019

Estado: Avance de Obra: 96% - Vigencias futuras

(Portería)



Estado sector portería inicios mes de enero 2019 (Interior IE)



Estado sector portería finales mes de marzo 2019 (Interior IE)





Estado sector portería finales mes de enero 2019 (exterior IE)



Estado sector portería finales mes de marzo 2019 (exterior IE)

Exterior cafetería, rampa y cancha múltiple



Estado conexión rampa inicios mes de enero 2019 (exterior IE)



Estado conexión rampa finales mes de marzo 2019 (interior IE)



Estado rampa gradería tarima inicios mes de enero 2019 (exterior IE)



Estado rampa gradería tarima finales mes de marzo 2019 (interior IE)



	
Estado circulación posterior inicios mes de enero 2019 (exterior IE)	Estado circulación posterior finales mes de marzo 2019 (interior IE)
	
Estado conexión aulas cafetería inicios mes de enero 2019 (exterior IE)	Estado conexión aulas cafetería finales mes de marzo 2019 (interior IE)
	
Estado conexión cafetería aulas inicios mes de enero 2019 (exterior IE)	Estado conexión cafetería aulas finales mes de marzo 2019 (interior IE)



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
239 de 2018	MANTENIMIENTO DE LA FACHADA Y ÁREAS INTERNAS DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA "	: \$ 1.203.940.390.46	05/10/2018	29/04/2019

Estado: Avance de Obra: 79.64% - En ejecución



Aplicación de pañete casino de oficiales cra 12

Fachada parqueadero estucada y pintada

8. PROCESOS ADJUDICADOS

8.1 LICITACIONES PUBLICAS

No.	OBJETO	No. PROCESO	ESTADO	VALOR TOTAL
1	MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-001-2019	TRASLADO SECRETARIAL	\$ 7.545.402.520,90
2	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LOS CANELOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-002-2019	PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO	\$ 943.979.472,90
3	CONSTRUCCIÓN DE CICLO-INFRAESTRUCTURA PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-003-2019	TRASLADO SECRETARIAL	\$ 13.239.423.934,17
4	MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-004-2019	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	\$ 2.521.772.813,00
5	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-005-2019	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	\$ 1.633.278.514,67



6	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DE ATLETISMO LUIS ENRIQUE FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER, BASADA Y DANDO CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE ACCIÓN POPULAR RAD No. 2009-00069	SI-LP-006-2019	PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO	\$ 7.520.073.336,00
7	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE CENTRALIDAD NORTE EN EL TEJAR NORTE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-007-2019	PROYECTO DE PLIEGOS	\$ 4.583.348.898,00
8	MEJORAMIENTO DEL CENTRO VIDA AÑOS MARAVILLOSOS EN LA CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	SI-LP-008-2019	PROYECTO DE PLIEGOS	\$ 2.088.988.096,86

8.2 CON CURSO DE MERITOS

No.	OBJETO	No. PROCESO	ESTADO	VALOR TOTAL
1	INTERVENTORÍA A LA INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-001-2019	ADJUDICADO	\$ 154.388.667,00
2	INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-002-2019	TRASLADO SECRETARIAL	\$ 627.370.380,00

8.3 SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

No.	OBJETO	No. PROCESO	ESTADO	VALOR TOTAL
1	ACTIVIDADES DE PODA PARA EL DESPEJE DE LUMINARIAS Y REDES QUE INTERFIERAN CON EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-SAMC-002-2019	TRASLADO SECRETARIAL	\$ 582.643.995,00
2	EXPANSIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-SAMC-003-2019	PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO	\$ 459.661.191,33
3	ADECUACION PLAZOLETA DE LA DEMOCRACIA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, SANTANDER	SI-SAMC-0004-2019	PROYECTO DE PLIEGOS	\$ 291.155.981,61



8.3 MINIMA CUANTIA

No.	OBJETO	No. PROCESO	ESTADO	VALOR TOTAL
1	REALIZAR AUDITORIA BAJO LA NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC ISO 50001:2011 A LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CMC-001-2019	ADJUDICADO	\$ 5.740.560,00
2	COMPRVENTA DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA, TINTAS Y TONERES PARA LA OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CMC-002-2019	ADJUDICADO	\$ 18.050.318,13

9. PROYECTOS PRESENTADOS Y VIABILIZADOS

No.	No. REGISTRO	OBJETO	VALOR VIGENCIA	ESTADO
1	20160680010121	MEJORAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS TRANSVERSALES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.563.200.000,00	Certificado - Actualización
2	20160680010088	ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, ENERGÍA Y FACTURACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	\$ 17.933.000.000,00	Certificado - Actualización
3	20170680010016	APOYO EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 864.250.000,00	Certificado - Actualización
4	20160680010226	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER	\$ 1.008.735.035,13	Certificado - Actualización
5	20180680010010	APOYO AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS DIFERENTES OBRAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 105.932.922,80	Certificado - Proyecto Nuevo
6	20170680010046	SUBSIDIO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO A LA POBLACION DE ESTRATO 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 4.552.898.870,00	Certificado - Actualización
7	20170680010093	ADECUACIÓN DEL PARQUE RELIGIOSO MORRORICO BUCARMANGA	\$ 127.923.589,32	Certificado - Actualización
8	20180680010013	MATENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.977.910.290,37	Certificado - Actualización

INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad

9	20160680010245	CONSTRUCCION, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.	\$ 1.109.208.202,83	Certificado - Actualización
10	20160680010154	MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	\$ 4.541.798.899,48	Certificado - Actualización
11	20180680010023	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO A TECNOLOGÍA LED FASE II: COMUNAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 11 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 32.213.762.885,00	Certificado - Actualización
12	20180680010049	CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ZONAS VERDES DEL BARRIO LOS CANELOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.089.462.658,32	Certificado - Actualización
13	20180680010036	AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO RURAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 1.101.039.013,00	Certificado - Actualización
14	20180680010052	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE GRANJAS DE PROVENZA EN LA COMUNA 10 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 313.711.370,55	Certificado - Actualización
15	20180680010051	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LA CEIBA EN LA COMUNA 13 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 3.493.871.261,00	Certificado - Actualización
16	20180680010050	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE PUNTOS VIVE DIGITAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 135.502.973,00	Certificado - Actualización
17	20180680010068	ADECUACIÓN DE LA PLAZOLETA DE LOS EDECANES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.332.056.223,40	Certificado - Actualización
18	20180680010061	ADECUACIÓN PARQUE ECOLÓGICO LA FLORA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.749.844.108,09	Certificado - Actualización
19		ADECUACIÓN DE LA PLAZOLETA DE LA DEMOCRACIA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 456.314.841,09	Certificado - Proyecto Nuevo
20	20180680010060	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD INTERMEDIA MATERNO INFANTIL SANTA TERESITA UIMIST EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.269.036.943,02	Certificado - Actualización
21	20180680010074	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEL COLEGIO INEM CUSTODIO GARCIA ROVIRA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.852.182.127,80	Certificado - Actualización
22	20180680010079	INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 1.549.627.148,08	Certificado - Actualización
23	20180680010079	MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS EN DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 139.276.828,00	Certificado - Actualización
24	20190680010026	CONSTRUCCIÓN CICLOINFARESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 14.381.722.157,17	Certificado - Proyecto Nuevo



25	20190680010021	MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 8.172.772.900,90	Certificado - Proyecto Nuevo
26	20190680010044	MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE ARTES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 5.742.579.420,00	Certificado - Proyecto Nuevo
27	20190680010050	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRALIDAD NORTE EN EL TEJAR NORTE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 5.305.067.870,00	Certificado - Proyecto Nuevo
28	20190680010029	APOYO EN LA CARACTERIZACIÓN E INVENTARIO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES FASE II EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 152.500.000,00	Certificado - Proyecto Nuevo
29	20190680010058	MEJORAMIENTO DEL CENTRO VIDA AÑOS MARAVILLOSOS EN LA CIUADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 2.363.218.571,70	Certificado - Actualización
30	20190680010097	REMDELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE SALUD SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 695.184.903,27	Certificado - Actualización
31	20190680010103	REMDELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE SALUD GIRARDOT DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 827.021.551,30	Certificado - Actualización
32	20180680010098	REMDELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE SALUD KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 667.260.839,09	Certificado - Actualización
33	20180680010102	REMDELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE SALUD BUCARAMANGA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 817.939.591,39	Certificado - Actualización
34	20180680010099	REMDELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE SALUD CAMPO HERMOSO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 607.752.633,50	Certificado - Actualización
35	20180680010104	REMDELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE SALUD LA JOYA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 816.698.446,48	Certificado - Actualización
36	20180680010100	REMDELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE SALUD LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 821.006.085,37	Certificado - Actualización
37	20180680010101	REMDELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE SALUD EL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 1.217.366.279,00	Certificado - Actualización
38	20190680010064	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LOS SALONES COMUNALES EN LOS BARRIOS BUCARAMANGA, DIAMANTA 1, LA LIBERTAD, EL GAITAN, LA FERIA, CAFÉ MADRID, NUEVA COLOMBIA, NORTE BAJO, SAN MIGUEL Y VILLA DEL PRADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 4.766.483.038,31	Certificado - Proyecto Nuevo



10. INVERSION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 31 DE MARZO DE 2018

PROGRAMAS	INVERSION	%
ADMINISTRACION ARTICULADA Y COHERENTE	\$ 2.542.700.000,00	
UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES	\$ 51.643.191,60	
RECUPERACION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO	\$ 4.057.438.420,00	
INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO	\$ 10.548.849.872,91	
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA	\$ 1.432.051.541,76	
ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL	\$ 6.869.725.583,08	
TOTAL (1)	\$ 25.502.408.609,35	100%

11. OTROS VALORES EN LA EJECUCION

DESCRIPCION	VALOR
VALORES NO REPORTADOS EN PDM	\$ 242.016.277,56
VALOR SUBSIDIOS DE SERVICIOS PUBLICOS, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	\$ 3.102.879.840,00
TOTAL (2)	\$ 3.344.896.117,56
TOTAL INVERSION (1+2)	\$ 28.847.304.726,91

