

INFORME DE GESTION

El presente informe resume los principales avances que la Secretaria de Infraestructura ha generado en los diferentes programas que conforman el Plan de Desarrollo 2012-2016 – 2019 “Gobierno de las Ciudadanas y los Ciudadanos”. Durante lo corrido del año 2017, la Secretaria de Infraestructura ha realizado y ha continuado ejecutando las gestiones pertinentes para el control del avance de los diferentes proyectos.

A continuación se detalla la gestión que ha realizado la Secretaria de Infraestructura en los tres primeros trimestres de 2017.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: GOBERNANZA DEMOCRÁTICA

1.1 PROGRAMA: PRESUPUESTOS INCLUYENTES

Este programa contempla la ejecución de obras con presupuestos participativos, a la fecha se adelanta el proyecto para el Mejoramiento y mantenimiento de escenarios deportivos en diferentes sectores del Municipio de Bucaramanga, aprobado mediante vigencia futura acuerdo No. 039 del 21 de Septiembre de 2017.

El valor a comprometer por la vigencia 2017 tanto de obra como de interventoría asciende a la suma de **\$ 755.143.618,62** y los Barrios que se intervendrán: Comuneros, Alfonso López, Villa del Prado, San Miguel, Quebrada la Iglesia, Gibraltar, el Roció, San Pio y San Luis.

Igualmente se realizaron los presupuestos para los proyectos de remodelación de andenes, pasamanos y escaleras y la Instalación de gimnasios en varias locaciones del Municipio que serán contratos en la vigencia 2018.

Así mismo se adelantan los presupuestos participativos de la vigencia 2017, que se espera realizar los acuerdos barriales si como las visitas por parte de funcionarios de la Secretaria de Planeación e Infraestructura en la actual vigencia.

✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2017	LOGRO 2017
PRESUPUESTOS INCLUYENTES.	Número de comunas con obras comunitarias ejecutadas con presupuesto participativo.	17	17	0

La Secretaria de infraestructura espera realizar el reporte de cumplimiento a este indicador en un 52% teniendo en cuenta los 9 escenarios deportivos que se intervendrán.

1.2 PROGRAMA: GESTIÓN INTELIGENTE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL

✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2017	LOGRO 2017
GESTIÓN INTELIGENTE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL.	Porcentaje de predios requeridos adquiridos para la ejecución de obras de desarrollo para la ciudad.	100%	100%	100%

La Secretaría de Infraestructura, en los tres trimestres de 2017 no ha requerido ningún predio para los proyectos desarrollados, por lo tanto el % de cumplimiento es del 100%.

1.3 PROGRAMA: UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES

En este programa se encuentra todos los diseños, estudios, consultorías e interventorías para ejecutar los proyectos y las obras del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, los cuales es importante resaltar:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
203 de 2017	ESTUDIOS DE SUELOS, PATOLÓGICOS Y ESTRUCTURALES PARQUE DE LOS NIÑOS, SECTOR CANCHA DE TENIS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER	\$ 49.950.797,00	22/06/2017	21/07/2017 Liquidado

Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable
Concejo Municipal

231 de 2017	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION CENTRO VIDA BARRIO KENNEDY FASE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 144.743.787,00	01/08/2017	30/12/2017
247 de 2017	INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE PARCHEO DE HUECOS, FALLOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES EN LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 113.979.248,00	18/09/2017	17/12/2017
260 de 2017	INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL BARRIO CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 77.634.648,00	01/09/2017	30/12/2017
283 de 2017	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN CORREDOR CICLISTA UIS- PARQUE DE LOS NIÑOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 67.121.782,00	Por iniciar	Por iniciar
296 de 2017	REALIZAR LA INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DEL PARQUE BOCA PRADERA EN EL BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 81.950.778,00	29/09/2017	28/12/2017

Igualmente se continua con la supervision de las siguientes obras:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
080 de 2016	INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SALONES COMUNALES DE DOCE BARRIOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 104.999.928,8 Adicional 1. \$ 80.786.583,15	27/03/2017	12/12/2017
092 de 2016	INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA LA ESTACION DE POLICIA CENTRO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	\$ 88.372.425	14/09/2016	20/08/2017 SUSPENDIDO

✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIOS	META 2017	LOGRO 2017
UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES	Realizar el 100% de los diseños, estudios, consultorías e interventorías para ejecutar los proyectos y las obras del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 y otros planes de ciudad.	100%	100%	100%

En cuanto a la realización de los diseños, estudios, consultorías e interventorías requeridos, la meta para el cuatrenio es que por cada vigencia se realicen los estudios diseños, estudios, consultorías e interventorías requeridos por cada programa para el correcto funcionamiento de los mismos, por lo tanto esta meta se ha cumplido el 100%.

LINEA ESTRATEGICA 2: INCLUSIÓN SOCIAL

2.1. PROGRAMA: ADULTO MAYOR Y DIGNO

La Secretaria de Infraestructura adelanto el siguiente proceso contractual:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
229 de 2017	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA BARRIO KENNEDY FASE II - MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.024.528.836,64	01/08/2017	30/12/2017

Estado: En ejecucion 1%

Se realizo el inicio del contrato y se llevo a cabo la revision general de la edificacion construida en la fase 1 con pruebas de resitencia de la estructura existente con esclerometro, revision de instalaciones hidraulicas, sanitarias, electricas y planos record.



✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIOS	META 2017	LOGRO 2017
ADULTO MAYOR Y DIGNO	Número de Centros vida adecuados y/o readecuados.	3	1	1

Se logró dar cumplimiento a este indicador mediante el contrato No. 229 de 2017.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

3.1. PROGRAMA: SENDEROS PARA LA VIDA

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
175 de 2017	“ELABORACIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS URBANOS, ARQUITECTÓNICOS Y PAISAJÍSTICOS Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL DE ALGUNOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”	\$ 2.070.279.719	16/06/2017	15/10/2017

Estado: en Ejecucion: 90%

A la fecha se han desarrollado los siguientes productos específicos en cumplimiento del contrato:

Producto: *El modelamiento urbano tridimensional fase 1 del Municipio de Bucaramanga y la construcción de la narrativa de los proyectos.*

Actividad

1. Inventario y espacialización de datos suministrados por las entidades
2. Modelación 3D fase 1 de Ciudad – Modelo Base Geografía, ocupación e intenciones Plan de Gobierno.

Producto: *Documento Gestión Social y Comunicaciones*

Actividad

1. Caracterización general del territorio a intervenir
2. Elaboración y análisis de los talleres de imaginarios y su respectiva sistematización.



✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIOS	META 2017	LOGRO 2017
SENDEROS PARA LA VIDA	Número de subsectores del gran bosque de los cerros orientales de escala metropolitana diseñados.	1	1	1

Con la contratación de los estudios y diseños, se da cumplimiento a este indicador, además este proceso también se reportó a los siguientes indicadores:

- ✓ Número de intervenciones en espacio público "La piel de la democracia" realizadas. (1)
- ✓ Porcentaje de avance de los estudios y diseños para la implementación de escaleras eléctricas. (100%)
- ✓ Porcentaje de avance de la realización del estudio que contenga los lineamientos y directrices generales del gran bosque de los cerros orientales de escala metropolitana. (90%)

3.2. PROGRAMA: REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
356 de 2015	CONSTRUCCION FASE I DE OBRAS DE MITIGACION	\$ 1.889.653.032,5	17/04/2017	16/08/2017

Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable Concejo Municipal

	<p>GEOTECNICA EN EL BARRIO DE VILLAS DE SAN IGNACIO Y COLEGIO VILLAS DE SAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER CONVENIO MUNICIPIO DE BUACARAMANGA Y DPS - FONADE</p>			
--	---	--	--	--

Estado: En ejecución, avance de obra; 98.03%

A la fecha se encuentran realizando actividades de relleno, inyección de lechada para los anclajes y tensionamiento de anclajes.

Así mismo se adelanta el adición en valor, con el fin de llegar a culminar las obras, dado que es importante iniciar la submuración de las columnas existentes en el Colegio.



✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIOS	META 2017	LOGRO 2017
REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE	Número de obras de mitigación realizadas en comunas que presenten riesgos de desastre.	20	1	1

El cumplimiento de este indicador obedece a la ejecución del contrato antes mencionado.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: CALIDAD DE VIDA

4.1 PROGRAMA: CUIDAR LO QUE ES VALIOSO": RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
118 de 2017	"AUNAR ESFUERZOS, TECNICOS, FINANCIEROS, Y ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INTERES PUBLICO "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PARA TERMINACIÓN DE LA GRAN SALA DEL TEATRO SANTANDER MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER."	\$ 2.500.000.000,00	03/05/2017	02/11/2017

Estado: En ejecución, avance del 70%

Las principales actividades realizadas:

- Equipos de Sonido, se contrató con la firma Mayer Sound, la compra de estos equipos por valor de \$ 977.479.000.
- Obra civil y acabado Vestíbulo en proceso de ejecución cercano al 50%.
- Mecánica Teatral, se adelantó el proceso contractual de este ítem por valor de \$452.022.581 con la empresa Construcciones Acústicas, de la ciudad Bogotá.

En los informes presentados por la FUNDACION TEATRO SANTANDER, se puede observar que se han venido realizando las inversiones, de conformidad con el presupuesto establecido en el convenio. Sin embargo, debido a que se vio la necesidad de realizar una revisión al presupuesto anexo al contrato, lo cual obedece a las condiciones de precios del mercado al momento de contratar y al valor de cambio de la moneda internacional para realizar la compra de algunos suministros especializados que son parte de las actividades establecidas en el presupuesto referido.



Igualmente se continua ejecutando el convenio de Asociacion No. 152 del 06 de octubre de 2016 Entre el Municipio de Bucaramanga y la FUNDACION TEATRO SANTANDER, cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos técnicos, financieros, administrativos para el desarrollo del proyecto de interés público Recuperación del Teatro Santander para la Construcción de redes y obras complementarias en las instalaciones del Teatro Santander del Municipio de Bucaramanga”, por valor de \$2.000.000.000 y, **presenta un avance aproximado del 50%**, representados en las siguientes actividades:

- Contrato con AMV Ingeniería para el suministro e instalación de las redes eléctricas de acuerdo con el presupuesto inicialmente registrado en el Convenio, por valor de \$697.339.322.
- Suministro de la iluminación ambiental del teatro Santander, elementos importados de Italia de acuerdo con facturas, pólizas y orden de compra. El valor total del Contrato es de \$465.003.689.57, de los cuales se ha entregado un Anticipo por valor de \$232.501.844.50.

Debido a que los recursos de este Convenio provienen de la suscripción del ACUERDO INTERADMINISTRATIVO No. 951 DE 2016, entre la Gobernación de Santander y el Municipio de Bucaramanga, se está tramitando una modificación del mismo ante el Departamento, para justificar los cambios en actividades como el sistema de iluminación y las redes que le complementan, debido a la actualización tecnológica de dichos suministros y a la variación que fue necesario realizar en los diseños eléctricos.

✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2017	LOGRO 2017
CUIDAR LO QUE ES VALIOSO": RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO	Número de acciones de fortalecimiento para el Teatro Santander.	1	1	1

El cumplimiento de este indicador obedece a la ejecución del contrato antes mencionado.

4.2 PROGRAMA: OBSERVAR Y SER OBSERVADO: FOMENTO AL TURISMO

En este programa se adelanto la vigencia futura acuerdo No. 039 del 21 de Septiembre de 2017, para adicionar el convenio FNT – 328 de 2014 “Construcción y dotación del Centro de Convenciones NEOMUNDO de Bucaramanga.

Los recursos que desembolsara el Municipio de Bucaramanga seran de la siguiente manera: Vigencia 2017 el valor de \$ 1.250.000.000 y Vigencia 2018 el valor de \$ 4.000.000.000, para un total de \$ 5.250.000.000,00.

Lo anterior para realizar la unificación de las dos fachadas mediante una columnata, así como la construcción de un puente que une los edificios en su costado occidental.

✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATREÑO	META 2017	LOGRO 2017
OBSERVAR Y SER OBSERVADO: FOMENTO AL TURISMO	Número de centros de convenciones - NEOMUNDO terminados.	1	0	0

Este indicador presenta un cumplimiento del 0.5 de la vigencia 2016, el reporte total se hará una vez el Centro de Convenciones sea terminado.

4.3 PROGRAMA: INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO

✓ Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes

La administración Municipal a través de la Secretaria de Infraestructura adelanto los siguientes procesos contractuales:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
19 de 2017	MANTENIMIENTO DE PARQUES, ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 3.321.213.590,53 Adicional 1. \$ 190.177.737,06	15/02/2017	29/12/2017

Estado: En ejecución, avance del 71.43%

A la fecha sigue en ejecución el contrato mencionado, continuando con cuatro zonas de trabajo distribuidas de la siguiente manera:

- ✓ 17 Cuadrillas conformadas por 5 personas cada una, ubicadas en los Parques y zonas Verdes de las 17 Comunas del Municipio de Bucaramanga.
- ✓ 4 cuadrillas de reacción conformadas por 5 personas cada una, como apoyo a las diferentes zonas del Municipio de Bucaramanga.
- ✓ 4 cuadrillas conformadas por 5 personas cada una, las cuales atienden las entradas principales a Bucaramanga, separadores y rompoys.

Informe de **GESTIÓN**

Ante el Honorable
Concejo Municipal

- ✓ 30 parqueros distribuidos en 42 Parques y Zonas verdes

Con el Adicional:

- ✓ 4 Cuadrillas de 5 personas cada una, para apoyar las comunas 1, 2 y 14 del Municipio de Bucaramanga.
- ✓ 7 Obreros para reforzar las cuadrillas de la zona Norte.
- ✓ Un Auxiliar Administrativo para atender las solicitudes de rocería y mantenimiento de parques y zonas verdes mediante el servicio de CALL CENTER Teléfono: 6378090.
- ✓ Así como la herramienta y los insumos requeridos para realizar las respectivas labores.

Parqueros

Parque Diamante II:



Parque San Francisco:



Informe de **GESTIÓN**

Ante el Honorable
Concejo Municipal

Cuadrillas:

Parque los Gatos Ciudad Bolívar:



Cancha De Futbol B .E Iglesia San Cayetano, Barrio Santander.



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
62 DE 2017	MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y ZONAS VERDES CONSISTENTE EN LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO EN LOS PARQUES INDICADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 200.519.602 Adicional 1. \$ 99.835.009	29/03/2017	28/09/2017

Estado: En ejecución, avance del 73.91%

Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable
Concejo Municipal

De los 34 parques seleccionados para la instalación de riego, se han intervenido los siguientes.

- Parques: La vida, Centenario, las Américas, los Leones, Uribe Uribe, Diamante II , García Rovira, Santander, Los Periodistas, Tres B, Cristo Rey, Corona – la Ceiba, Solón Wilches, Divino Niño, Unitransa Bomberos, Romero, Concordia, Fontana Real, Fontana, Novios, Presentación, Olivos, Banderas, Caballo Bolívar y Pinos.

Con el Adicional se van a intervenir los siguientes Parques:

No.	NOMBRE DEL PAQUE
1	Bruno Batelo
2	Prados del mutis
3	Nacuma
4	palmas mutis
5	Parque Porvenir
6	Salucoop
7	Girardot
8	Canelos
9	guayacanes "lo gatos"
10	Olas Bajas
11	Estoraques
12	punte provincial y balconcitos

Parque Leones:



Parque Antonia Santos:



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
169 DE 2017	PODA Y TALA DE ÁRBOLES DEL ESPACIO PÚBLICO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 488.039.812,62	30/05/2017	29/12/2017

Estado: En ejecución: Avance del 57.14%

Este contrato cuenta con dos cuadrillas coordinadas por un Ing. Forestal, un Tecnólogo en Salud Ocupacional, 4 podadores, 12 repicadores, vehículo para transporte de herramienta y personal, camión para recolección de residuos vegetales, camión carro canasta contratado parcialmente para trabajos especiales.

Con corte a 30 de Septiembre de 2017, se han realizado 748 podas y 93 talas de árboles.

📍 Calle 109 # 21A-71 Parque Los Sauces, Barrio Provenza



Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable
Concejo Municipal

📍 Calle 12 # 18-05, Barrio Villa Rosa



✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2017	LOGRO 2017
INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO	Porcentaje de parques con mantenimiento anual realizado.	100%	100%	100%

El cumplimiento de este indicador obedece a los contratos que se encuentran en ejecución.

• Equipamientos Comunitarios (Sociales, deportivos, Culturales entre otros).

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
556 de 2015	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SALONES COMUNALES EN 12 BARRIOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 1.499.371.237,74 Adicional \$ 743.293.411,12	27/03/2017	22/05/2017

Estado: en ejecución, avance de obra: 90%

ALCANCES FÍSICOS DEL PROYECTO:

Una vez iniciado el contrato de obra y luego de un trabajo conjunto entre contratista, interventor y supervisión se pudo establecer el alcance real de los recursos del contrato principal del proyecto, el cual incluía la ejecución de obra de mantenimiento y mejoramiento de SEIS (06) salones comunales, así: EL ROCIO, PORVENIR, SANTANDER, PROVENZA, KENNEDY Y REGADEROS NORTE.

Se proyectó, gestionó y se firmó un adicional en valor para realizar obras de mejoramiento en DOS (2) salones comunales más, así: SAN CRISTOBAL y LA ESPERANZA II.

AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

En la actualidad se han entregado a la comunidad totalmente terminados CUATRO (4) SALONES COMUNALES, correspondientes a los barrios EL ROCIO, PORVENIR, SANTANDER Y PROVENZA, con una inversión total en los mismos que asciende a la suma de 998 MILLONES (incluido AIU), correspondiente a un 44% del valor total del contrato incluido el adicional.

Se están adelantando las obras en los salones de los barrios KENNEDY y REGADEROS NORTE, las cuales tienen una proyección de inversión de 512 millones aproximadamente, y cuyo avance actual es de unos 360 millones, los cuales corresponden a un 16% del valor total incluido el adicional.

Se están iniciando las obras en los salones de los barrios SAN CRISTOBAL y LA ESPERANZA II, los cuales tienen una proyección de inversión por la suma aproximada de 743 millones, correspondiente a los recursos del CONTRATO ADICIONAL.

A continuación el registro fotográfico de algunos centros de salud intervenidos:

EL ROCÍO



Informe de **GESTIÓN**

Ante el Honorable
Concejo Municipal

PORVENIR



SANTANDER



PROVENZA



Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable Concejo Municipal

KENNEDY



REGADEROS NORTE



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
227 DE 2017	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS CON EL FIN DE EJECUTAR EL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.263.654.146,38	01/08/2017	30/12/2017

Estado: en ejecución: Avance del 20%.

La Alcaldía de Bucaramanga ha realizado el giro de los recursos y la ESE ISABU está realizando proceso de contratación y ha adjudicado el contrato respectivo.

Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable Concejo Municipal

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
259 DE 2017	MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL BARRIO CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 750.154.116,33	01/09/2017	30/12/2017

Estado: En ejecución: Avance del 10%

Se ha realizado el acompañamiento a las obras preliminares y el movimiento de tierras correspondiente a la explanación a máquina, descapote y poda de árboles.



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
269 DE 2017	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS TENDIENTES A LA HABILITACIÓN Y PROMOCIÓN DE ESPACIOS DE ACCESO GRATUITO A INTERNET A TRAVÉS DE LAS ZONAS WI-FI QUE INTEGRAN LAS TIC PARA EL USO DE LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.033.989.525	POR INICIAR	POR INICIAR

Estado: En legalización próximo a iniciar

Con este proyecto se pretende atender entre parques, separadores, canchas etc, el servicio de Internet a través de zonas WIFI en beneficio de toda la ciudadanía.

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
284 de 2017	CONSTRUCCION DEL PARQUE BOCA PRADERA DEL BARRIO CIUADELA REAL DE MINAS MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.146.494.931,76	29/09/2017	28/12/2017

Estado: En Ejecucion

✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2017	LOGRO 2017
INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO	Número de equipamientos comunitarios (sociales, deportivos y culturales: canchas sintéticas, muulticentros deportivos, salones comunales, entre otros) intervenidos y/o constuidos.	100	30	59

El reporte a este indicador obedece a los contratos antes mencionados.

LÍNEA ESTRATÉGICA 6: INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD

6.1. PROGRAMA: PROMOCIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
281 de 2017	CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR CICLISTA UIS-PARQUE DE LOS NIÑOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.171.015.163,58	Por iniciar	Por iniciar

Estado: Próximo a iniciar

✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIOS	META 2017	LOGRO 2017
PROMOCIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS	Número de kms de ciclorutas para transporte urbano implementados.	20	3	1.5

El reporte a este indicador, obedece al contrato que se encuentra próximo a iniciar, y se realizara ajuste si hubiere lugar al final del contrato.

6.2. PROGRAMA: MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA

- Mantenimiento Malla Vial Urbana

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
246 de 2017	OBRAS DE PARCHEO DE HUECOS, FALLOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES EN LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.228.092.616,57	18/09/2017	17/12/2017

Estado: en ejecución. Avance físico del 5.68%

Los Sitios a intervenir en cumplimiento a este contrato se realizaran de acuerdo al cuadro de necesidades que tiene este despacho para la reparación de la malla vial.

Barrios Intervenido:

BARRIO PROVENZA

Acceso Provenza calle 105 con carrera 26A (debajo puente peatonal).

Acceso Provenza Calle 105 # 26a-53.

Calle 105 # 26-23.

Calle 105 # 26-01.

Paralela Autopista Sentido Bucaramanga-Florida (Debajo Puente Vehicular Provenza).

Paralela Autopista Sentido Bucaramanga-Florida.

Carrera 26 # 105-12.

Diagonal 105 # 27-105 (Paralela Autopista Sentido Bucaramanga-Florida).

Informe de **GESTIÓN**

Ante el Honorable
Concejo Municipal

BARRIO PROVENZA

ACCESO PROVENZA CALLE 105 CON CARRERA 26A (DEBAJO PUENTE PEATONAL)



FOTO ANTES DE LA INTERVENCION



FOTO EXCACION PARA REPARACION PAVIMENTO

BARRIO PROVENZA

ACCESO PROVENZA CALLE 105 # 26A-53



FOTO ANTES DE LA INTERVENCION



FOTO EXCACION PARA REPARACION PAVIMENTO

✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIOS	META 2017	LOGRO 2017
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA	Número de M2 de malla vial urbana mejorados y/o construidos.	60.000	16.500	8.000

El reporte a indicador obedece a contrato de la malla vial urbana, que también da cumplimiento al indicador de; Número de M2 de andenes construidos en (200) m2

Informe de **GESTIÓN**

Ante el Honorable
Concejo Municipal

- Megaobras de Infraestructura Vial

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
272 de 2014	CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL MESÓN DE LOS BÚCAROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	Valor Inicial \$ 54.909.500.000 Adicional 1. \$ 14.516.066.713 Adicional 2. \$ 10.945.041.309 Valor Total \$ 80.370.608.022	10 de septiembre de 2014	7 de ABRIL de 2017

Estado: Avance de Obra: 89.94% - **SUSPENDIDO**

Este contrato se encuentra suspendido desde el 24 de Marzo de 2017 en virtud de la orden judicial ante la imposibilidad de continuar con las obras en el sector de la Escuela La Normal.



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
331 de 2014	INTERVENTORÍA DEL AMPLIACIÓN DEL CORREDOR VIAL PRIMARIO BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA SECTOR PUERTA DEL SOL - PUENTE PROVENZA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	Valor Inicial \$ 7.518.263.339,5 Adicional 1. \$ 5.640.000.000,00 Adicional 2. \$ 298.124.079,52 Adicional 3. \$ 279.998.312,00 Adicional 4. \$ 503.068.682,00 Adicional 5 \$ 576.556.101,00 Valor Total 14.816.010.514,02	01 de Octubre de 2014	31 de Enero de 2017

Estado: Avance de obra: 97.82%

Actualmente se adelantan los trabajos redes eléctricas por la Autopista



lizada de postes para alumbrado en el separador de la autopista.



Acero de refuerzo para columnas de la subestacion electrica. Acero longitudinal de diametro 1/2" y flejes de diametro 3/8".

✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATREÑO	META 2017	LOGRO 2017
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA	Número de megaobras terminadas.	3	2	0

El cumplimiento a este indicador obedece a la terminación del Tercer carril y la Construcción del intercambiador le Mesón de los Búcaros, se espera poder dar cumplimiento al finalizar la vigencia.

6.2 PROGRAMA: MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL RURAL

La Secretaria de Infraestructura realizó: Mantenimiento periódico a las diferentes vías del sector urbano y rural que contempla la Ampliación, Nivelación, Perfilado, Cuneteo y Afirmado de Vías Internas, actividades realizadas con la Maquinaria disponible (1 Minicargador, 1 Motoniveladora, 2 Volquetas y Carrotanque) Adscrita a este Despacho.

Corregimiento N° 2:

- V. Bolarqui Alta
- V. Monserrate
- V. Capilla Alta

Corregimiento N° 3:

- V. Santa Barbara
- V. El Pedregal
- V. Gualilo

Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable Concejo Municipal

- Ramal Los Leones
- V. Retiro Grande
- V. Retiro Chiquito
- V. El Pedregal
- Transporte Agua Potable Sector La Malaña.

Sector Urbano:

- Retiro de Caseta Metálica.
- Retiro de Escombros y arboles Calle 14 y Vegas de Morrórico
- Retiro de Escombros B. San Martin
- Retiro de Escombros Taller Municipal
- Inservibles secretaria de Salud
- Inservibles Secretaria Administrativa



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
282 de 2017	CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN LOS DIFERENTES CORREGIMIENTOS QUE COMPRENDE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 493.250.628,00	Por Iniciar	Por Iniciar

Estado: próximo a iniciar

✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIIO	META 2017	LOGRO 2017
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL RURAL	Número de kms de vías rurales con transitabilidad mantenida.	140	140	140
	Número de ML de placa huella construidas.	5.000	500	600

El cumplimiento a este indicador obedece al mantenimiento rutinario con la maquinaria del Municipio, de acuerdo a la programación por parte de este Despacho y al contrato 282 de 2017.

1.3 PROGRAMA: SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS Y RURALES

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
50 de 2016	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO BARRIO GRANJAS DE PROVENZA - MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.971.561.921,00	04/10/2016	03/10/2017

Estado: Avance de obra: 100%

La ejecución del contrato se encuentra al 100% del valor del contrato.

ACTIVIDADES PRINCIPALES DESARROLLADAS

- Excavaciones para construcción de alcantarillado sanitario 2798 m³
- Instalación de tubería sanitaria 244 ML
- Instalación de tubería de alcantarillado PVC 1201 ML
- Conexiones domiciliarias 167 Un
- Suministro e instalación de paral metálico para barandas 516,7 ML
- Suministro e instalación de malla eslabonada para barandas 246 m²
- Construcción de canal



6.4. PROGRAMA: ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL

La Secretaria de Infraestructura a través de la Oficina de Alumbrado Publico ha realizado Mantenimiento de la siguiente Manera:

MES	PQR'S RECIBIDAS EN EL MES	PQR'S ATENDIDAS DEL MES	% ATENCION PQR'S DELMES	TIEMPO DE RESPUESTA (DIAS)	PQR'S ATENDIDOS DE OTROS MESES
Enero	1160	1037	89%	2	109
Febrero	1029	970	94%	2	129
Marzo	1188	1055	89%	2	61
Abril	998	557	56%	4	113
Mayo	1039	681	66%	3	438
Junio	902	548	61%	3	397
Julio	875	656	75%	3	310
Agosto	1019	794	78%	2	190
Septiembre	714	356	50%	4	200
TOTAL	8924	6654			1947
TOTAL PQR'S ACUMULADO RECIBIDAS					8924
TOTAL PQR'S ACUMULADO ATENDIDAS					8601
PORCENTAJE DE ATENCIÓN PQR'S					96,4%

Se continúa con la ejecución de los contratos de mantenimientos para el alumbrado público en cumplimiento de los siguientes procesos contractuales:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
54 de 2016	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN	EICON LTDA (\$473.843.532)	16 de Junio de 2016	15 de Septiembre de 2017
55 de 2016	DIFERENTES SECTORES DE LA ZONA URBANA Y ZONA RURAL	EME INGENIERIA S.A.(\$829.386.532)		
57 de 2016		IGS INGENIERIA E.U.(\$446.808.720)		

Estado: Avance de obra: 100% ejecutado

SECTORES A INTEVENIR


- ✓ **GRUPO EICON** Intervienen: Comunas 1, 10, 11, 13, 16 y Corregimiento 2
- ✓ **GRUPO EME** Intervienen: Comunas 4, 5, 7, 12, 17, Corregimiento 3 y Viaducto Provincial
- ✓ **GRUPO IGS** Intervienen: Comunas 2, 3, 6, 8, 9, 14, 15 y Corregimiento 1

Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable Concejo Municipal

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
003 de 2017	CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO VIA CENFER – PUERTA DEL SOL –GRUPO 1 –CENFER INTERCAMBIADOR EL BUENO	\$ 3.296.758.330,00	15/02/2017	30/10/2017

Estado: Avance de obra: 95% en ejecución

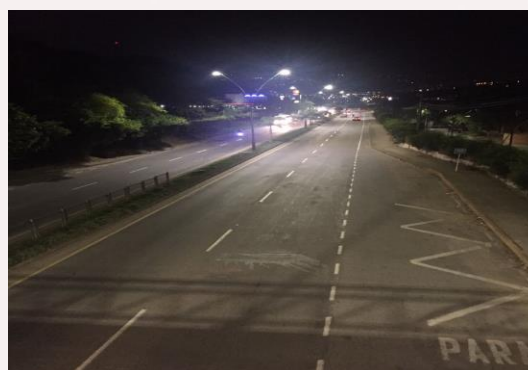

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
004 de 2017	CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO VIA CENFER – PUERTA DEL SOL. GRUPO 2 – INTERCAMBIADOR EL BUENO INTERCAMBIADOR PUERTA DEL SOL	\$ 2.881.620.453,00	15/02/2017	30/10/2017

Estado: en ejecución 85% avance de obra



Informe de **GESTIÓN**

Ante el Honorable
Concejo Municipal

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
008 de 2017	PARQUE GUAYACANES - BAVARIA II – COMUNA 1 Y VILLA DEL PRADO – COMUNA 5	\$ 1.239.726.530,00	16/02/2017	15/07/2017



Porcentaje Ejecución: Bavaria II - 100%
Porcentaje Ejecución: Villa del Prado – 100%



SUSTITUCIÓN A LED – ETAPA 1 - COMUNA 2

COP. 165 de 2017 - CIVAREL LTDA
CONT. Suministro 101 de 2017 – CELSA S.AS.
CONT. Interventoría 202 de 2017 – UT Comuna 2
Valor Luminarias: \$ 1.181.332.040
Valor Instalación: \$ 257.193.399
Valor Interventoría: \$ 113.907.038
Fecha de Inicio: Mayo 02 de 2017
Fecha de Terminación: Octubre 30 2017
Porcentaje Ejecución: 80%

Barrios a Intervenir: Esperanza I, II, III, Villa Helena , Vía Matanza desde CAI la Virgen, Lizcano I y II, Los Ángeles, Mirador del Norte, Norte Club.

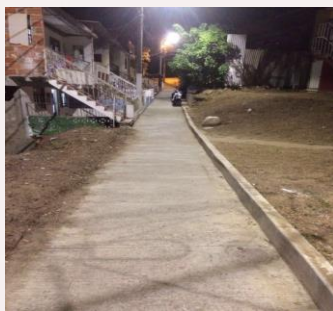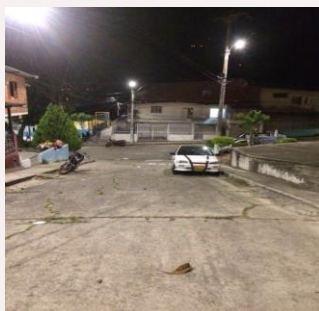

Informe de **GESTIÓN**

Ante el Honorable
Concejo Municipal

CONSTRUCCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL TRAMO 4 – CENTRO ABASTOS CAFÉ MADRID

Grupo 1 – EICON LTDA

COP: 219 de 2017

Valor: \$ 2.621.711.740,95

Porcentaje Ejecución: 15%

Fecha de Inicio:

Fecha de Terminación:

Grupo 2 – EME INGENIERÍA S.A

COP: 220 de 2017

Valor: \$ 1.813.213.811,70

Porcentaje Ejecución: 20%

Julio 27 de 2017

Diciembre 26 de 2017



MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO ETAPA 2 – BARRIO CIUDAD BOLÍVAR

Contratista:

Valor:

Fecha de Adjudicación:

Plazo de Ejecución:

INGELCO PROYECTOS E.U.

\$ 2.176.343.155,91

Septiembre 06 de 2017

4 meses



Aún no tiene Acta de Inicio, porque el proceso de interventoría se declaró Desierto.

Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable Concejo Municipal

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
164 de 2017	CONTRATAR ACTIVIDADES DE PODA PARA EL DESPEJE DE LUMINARIAS Y REDES QUE INTERFIERAN CON EL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 529.288.455,09	23/05/2017	23/12/2017

Porcentaje Ejecución: 50%



✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2017	LOGRO 2017
ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL	Número de luminarias sustituidas a LED.	36.000	12.000	1.995
	Número de luminarias expandidas.	1.000	200	846
	Número de puntos de telemedida instalados y puestos en marcha.	50	15	6
	Número de parques y/o escenarios públicos modernizados en su alumbrado público.	20	8	6
	Porcentaje de nuevos espacios públicos con alumbrado público instalado.	100%	100%	100%
	Porcentaje de luminarias que se encuentran en funcionamiento.	96%	96%	78%

Se espera que en el segundo semestre de la presente vigencia, se realicen los reportes correspondientes a la contratación que se encuentra por iniciar para dar cumplimiento a estos indicadores.

7. OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR LA SECRETARIA

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
83 de 2016	MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA LA ESTACION DE POLICIA CENTRO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	\$ 1.000.727.512,65 Adicional \$ 446.185.020.00	14/09/2016	13/02/2017

Estado: en ejecución 93.15% avance de obra

ACTIVIDADES EJECUTADAS Y ESTADO ACTUAL DE LA OBRA:

Las actividades ejecutadas durante el mes anterior antes de la suspensión de la obra, realizada con fecha 11 de agosto de 2017, con motivo de los trámites requeridos ante la ESSA para la aprobación de la acometida eléctrica provisional, son las siguientes:

- Se realiza prueba de red normal y regulada en el primer piso
- Se instalan cajas de cables HDMI en los tres pisos.
- Instalación de pisos en la entrada principal
- Instalación de guardaescoba en la entrada principal
- Se inicia arreglos y detalles
- Friso y embone de puertas
- Arreglos de filos y dilataciones de ventanas
- Boquilla de pisos y guardaescoba
- Prueba de voz y datos en los tres pisos
- Detalles en pisos
- Detalles en muro de acceso al parqueadero
- Mesón de guardia
- Desmonte de tablero eléctrico
- Adecuación de espacio donde quedara instalado el tablero
- Construcción de caja de inspección eléctrica de 1,60* 1.30* 1.20m ubicada sobre la calle 31
- Actividades de acometida de media tensión
- Adecuación de andenes
- Fundida de tapas para las cajas de inspección eléctrica
- Pintura de pisos y paredes de armerillos

Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable Concejo Municipal

- Terminación instalación de luminarias y tomas

Con lo anterior se determina el avance establecido, quedando a la espera de la aprobación de la acometida provisional por parte de la ESSA, y la conexión de la energía por parte de LINEA VIVA, para proceder a los detalles de terminación y aseo finales, para su entrega definitiva.



El contrato de obra se encuentra suspendido debido a que se están adelantando los trámites ante la Electrificadora de Santander S.A E.S.P requeridos para la legalización de la instalación provisional de 150KVA, dentro de este trámite se requiere realizar para el medidor No. 36141175 marca ACTARIS tipo SL7000, unas pruebas de arranque, prueba de vacío, calibración y parametrización en los laboratorios de la ESSA, el cual mediante acta No. 5462170 del cuatro (4) de septiembre de 2017, se realiza retiro del medidor por parte de funcionarios de la Electrificadora de Santander S.A E.S.P, según soporte de documento en poder del contratista.

Al cierre del presente informe, se contó con la realización de las pruebas requeridas del medidor, el cual fue nuevamente instalado en el sitio de la obra, y solo queda esperar que LINEA VIVA de la ESSA haga la conexión del servicio, para poner en funcionamiento la Estación y, de esta forma poder reiniciar los trabajos para terminarlos en la semana siguiente al reinicio.

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
228 de 2017	ADECUACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO CENTRAL DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DE BUCARAMANGA "CAM FASE I"	\$ 180.206.840,7	14/08/2017	13/10/2017

Estado: en ejecución 9% avance de obra

Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable
Concejo Municipal



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
224 de 2017	"ADECUACIONES FISICAS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL ESPECIALIZADO CAME QUEBRADASECA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"	24630421,81	22/08/2017	21/09/2017

Estado: Avance de Obra: 100% ejecutado

El contrato se encuentra ejecutado en un 100% y está en proceso de realizar acta final de obra y liquidación.



CONSTRUCCIÓN DE ESCOTILLA DE INSPECCIÓN (0.60 X 0.60 M) EN CIELORRASO DE DRYWALL

Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable
Concejo Municipal



PUERTA PIVOTANTE A DOS HOJAS EN CRISTAL 6 MM TEMPLADO Y MARCO EN ALUMINIO.

Se realizaron los Convenios Interadministrativos, con el fin de GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DESTINADOS A SUBSIDIAR LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO A LOS USUARIOS DE LOS EXTRATOS 1, 2 Y 3 Y PILAS PUBLICAS.

Las empresas con las cuales ya cuentan con convenio son:

- ✚ EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S A ESP EMPAS S A
- ✚ EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S A E S P
- ✚ LIMPIEZA URBANA S.A.
- ✚ PROACTIVA CHICAMOCHA

8. PROYECTOS EN PROCESO DE CONTRATACION

No.	OBJETO	No. PROCESO	ESTADO	VALOR TOTAL
1	ADECUACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO EN LA PLAZA GUARÍN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-011-2017	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	\$ 2.018.007.063,15
2	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE Y CANCHA DEL BARRIO CRISTAL BAJO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-012-2017	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	\$ 1.481.910.510,70

Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable
Concejo Municipal

3	ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE DATOS O DATA CENTER EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN, SOPORTE E IMPLEMENTACIÓN DE TIC, BUCARAMANGA, CENTRO ORIENTE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER	SI-SAMC-005-2017	EN TRASLADO SECRETARIAL	\$ 1.440.000.000,00
4	CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN LOS DIFERENTES CORREGIMIENTOS QUE COMPRENDE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-SAMC-006-2017	ADJUDICADO EN LEGALIZACIÓN DE CONTRATO	\$ 499.999.058,00
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	SI-SAMC-007-2017	ADJUDICADO EN LEGALIZACIÓN DE CONTRATO	\$ 579.148.905,65
6	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE MICROFUTBOL DEL BARRIO LA JOYA Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE L BARRIO CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-SAMC-008-2017	ADJUDICADO EN LEGALIZACIÓN DE CONTRATO	\$ 397.743.596,00
7	MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CENTRO ORIENTE	SI-LP-013-2017	PROYECTO DE PLIEGOS	\$ 2.576.955.808,84
8	CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS CANCHAS Y SUS ALREDEDORES DE LOS BARRIOS PORVENIR I PORVENIR II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-014-2017	PLIEGO DEFINITIVO	\$ 2.344.292.227,00
9	ADECUACIÓN PARQUE DE LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-015-2017	PROYECTO DE PLIEGOS	\$ 1.273.129.001,00
10	ADECUACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE RELIGIOSO MORRORICO BUCARAMANGA	SI-SAMC-010-2017	PLIEGO DEFINITIVO	\$ 277.314.712,00
11	ADECUACIONES FÍSICAS Y MANTENIMIENTO LOCATIVO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM FASE I Y FASE II DEL MUNICIPIO DE	SI-SAMC-011-2017	PLIEGO DEFINITIVO	\$ 579.950.236,00

	BUCARAMANGA			
12	INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA PLAZA GUARÍN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-011-2017	PROYECTO DE PLIEGOS	\$ 116.546.649,00

9. PROYECTOS PRESENTADOS Y VIABILIZADOS

No.	No. REGISTRO	OBJETO	VALOR VIGENCIA	ESTADO
1	20170680010133	CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS CANCHAS Y SUS ALREDEDORES DE LOS BARRIOS PORVENIR I PORVENIR II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.449.984.504,67	CERTIFICADO
2	20170680010124	REMODELACIÓN DE ANDENES, PASAMANOS Y ESCALERAS EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 267.582.471,30	CERTIFICADO
3	20160680010256	MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.060.061.968,32	CERTIFICADO
4	20170680010150	ADECUACIÓN PARQUES DE LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.300.070.005,75	CERTIFICADO
5	20170680010119	ADECUACIÓN ESPACIO PUBLICO PLAZA GUARIN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.134.553.712,15	CERTIFICADO
6	20170680010118	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE Y CANCHA DEL BARRIO CRISTAL BAJO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.974.570.838,35	CERTIFICADO

Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable
Concejo Municipal

7	20170680010141	CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA DE COLUMNATA Y PUENTE DE INTEGRACIÓN EDIFICIOS EXISTENTE Y NUEVO CENTRO DE CONVENCIONES NEOMUENDO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 5.250.000.000,00	CERTIFICADO
8	20170680010144	REPOSICION DE LA CUBIERTA DEL MODULO NORTE DE LA PLAA GUARIN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 596.709.799,76	CERTIFICADO
9	20170680010094	OPTIMIZACIÓN COLECTOR CALLE 6 ENTRE CARRERAS 10 Y 15A DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 6.297.145.356,00	CERTIFICADO
10	20170680010142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y GIMNASIOS BIOSALUDABLES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 396.891.156,26	CERTIFICADO
11	20170680010135	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO BARRIO GRANJAS DE PROVENZA FASE II EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 899.999.175,00	CERTIFICADO
12	20170680010153	CONSTRUCCIÓN FASE II OBRAS DE MITIGACIÓN GEOTECNICA EN EL BARRIO VILLAS DE SAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 944.796.506,05	CERTIFICADO
13		ESTUDIOS BÁSICOS PARA LA HABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO EFECTIVO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.070.279.719,00	CERTIFICADO
14	20170680010149	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS TÉCNICOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 20 KILÓMETROS DE CICLO-INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.091.364.000,00	CERTIFICADO

15	20170680010148	FORMULACIÓN DE ESTRATEGIA DE LA BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE Y DISEÑO DE 20 KILÓMETROS DE CICLO-INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 3.239.110.710	CERTIFICADO
16	20170680010139	MEJORAMIENTO DEL PARQUE LINEAL RIOS DE ORO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 10.123.705.586,00	CERTIFICADO

10. DEFENSA JUDICIAL

Durante el periodo de Enero a Septiembre de 2017, los Juzgados Administrativos y el Tribunal Administrativo de Santander han proferidos en ACCIONES POPULARES y ACCIONES DE TUTELA, fallos a favor y en contra en los procesos que cursan en los despachos judiciales de esta Secretaria de la Siguiete manera:

1. ACCIONES DE TUTELA:

Procesos Notificados	6
Procesos Tramitados	6
Fallos a Favor	6
Fallos en contra	1
Tramites en cumplimiento de fallos anteriores	3

Durante este periodo se ejecutaron obras en cumplimiento de algunos fallos Judiciales y se adelantaron funciones tendientes a obtener cierre de Incidentes de Desacato y archivo del proceso:

- A.T. 2005-0172 Juzgado 13 Civil Municipal. Se cerró el incidente (se está cumpliendo)
- A.T. 2003-1431 Juzgado 5º Administrativo. Se cerró el incidente y archivo del proceso
- A.T. 2011-0155 Juzgado 15 Administrativo. Se cerró el incidente

A continuación relaciono las Acciones de tutela tramitadas durante el periodo

Informe de **GESTIÓN**

Ante el Honorable
Concejo Municipal

PROCESO No.	JUZGADO	ACCIONANTE	ORDEN JUDICIAL	ESTADO ACTUAL
2017-0322	8° Penal Municipal	Asociación Comerciantes La Isla	Fallo a favor	Archivado
2017-0364	6° Civil Municipal	Alejandro Gamboa	Fallo a favor	Archivado
2017-0086	10 P.M.con F.C.	Martha María Soto	Fallo en contra	En cumplimiento
2017-0454	21 Civil Municipa.	Emiro Martínez	Falla a favor	Archivado
2017-0086	10 P.M.con F.C.	Martha María Soto	En recurso de apelación	Se impugnó y se modificó la decisión
2017-0276	8° Civil del Circuito	Albeiro Espinosa	Falla a favor	Archivado
2017-0106	1° P.M. con F.C.	Isidro Santander	Fallo a favor	Archivado

2. ACCIONES POPULARES:

Procesos vigentes a cargo de la secretaria de infraestructura:	52
Procesos de Infraestructura, pendientes de cumplimiento:	30
Procesos de Infraestructura CUMPLIDOS	5

PROCESO No.	JUZGADO	SENTENCIA	ORDEN JUDICIAL	ESTADO ACTUAL
2017-0010	1°	FALLO EN CONTRA	En Apelación ante Tas	APELADO
2017-0001	2°	FALLO A FAVOR	Agotamiento Jurisdicción	Archivo
2016-0234	10°	FALLO EN CONTRA	En apelación ante el Tas	APELADO
2017-0114	4° penal Municipal control garantías	FALLO A FAVOR	IMPROCEDENCIA ACCION TUTELA	Archivado
2017-0116	4° penal Municipal control garantías	FALLO A FAVOR	IMPROCEDENCIA ACCION TUTELA	Archivado

11. INVERSION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 –REPORTADO EN PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMAS	INVERSION	%
ADMINISTRACION ARTICULADA Y COHERENTE	\$ 1.230.486.666,66	2,24
ADULTO MAYOR Y DIGNO	\$ 2.169.272.623,64	3,95
REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE	\$ 1.847.814.207,93	3,36
CUIDAR LO QUE ES VALIOSO": RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO	\$ 2.500.000.000,00	4,55
INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO	\$ 14.263.339.980,25	25,97
PROMOCIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS	\$ 1.238.136.945,58	2,25
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA	\$ 3.306.292.779,09	6,02
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL RURAL	\$ 493.250.628,00	0,90
ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL	\$ 26.645.633.379,51	48,52
SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS Y RURALES	\$ 1.224.000.000,00	2,23
TOTAL (1)	\$ 54.918.227.210,66	100 %

12. OTROS VALORES EN LA EJECUCION

DESCRIPCION	VALOR
VALOR ACTUALIZACION REGISTROS PRESUPUESTALES	\$ 15.515.458.357,45
VALOR SUBSIDIOS DE SERVICIOS PUBLICOS, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	\$ 3.151.955.339,00
TOTAL (2)	\$ 18.667.413.696.45

TOTAL INVERSION (1+2)	\$ 73.585.640.907,11
------------------------------	-----------------------------
