

## INFORME DE GESTION

El presente informe resume los principales avances que la Secretaria de Infraestructura ha generado en los diferentes programas que conforman el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Gobierno de las Ciudadanas y los Ciudadanos”. Durante el primer Trimestre de la vigencia 2018, la Secretaria de Infraestructura ejecutó y realizo las gestiones pertinentes para el control del avance de los diferentes proyectos.

A continuación se detalla la gestión que ha realizado la Secretaria de Infraestructura en los primeros meses del año.

### LÍNEA ESTRATÉGICA 1: GOBERNANZA DEMOCRÁTICA

#### 1.1 PROGRAMA: PRESUPUESTOS INCLUYENTES

Este programa contempla la ejecución de obras con presupuestos participativos en las diferentes comunas:

Actualmente se encuentran en ejecución dos contratos con cargo a presupuestos participativos vigencia 2016, los cuales se relacionan a continuación y presentan un avance del 15.58%.

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
411 de 2017	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 903.596.605,74	02/02/2018	01/06/2018
412 de 2017	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 613.301.169,82	02/02/2018	01/06/2018

Los Barrios que se benefician son: Comuneros, Alfonso López, Villa del Prado, San Miguel, Quebrada la Iglesia, Gibraltar, el Roció, San Pio y San Luis.

## ✚ ESCENARIO DEPÓRTIVO BARRIO ALFONSO LOPEZ



## ✚ ESCENARIO DEPÓRTIVO BARRIO VILLA DEL PRADO



Actualmente se adelantan trabajos en los Barrios; San Miguel, el Prado (San Pio), San Luis, El Roció y Quebrada la Iglesia. Los trabajos en el Barrio Gibraltar no han iniciado.

A la fecha se encuentra estructurada la atención de necesidades con relación a las obras viabilizadas en los grupos de presupuestos participativos vigencias 2016 y 2017. En la presente vigencia se tiene programada la contratación de dichas obras, las cuales se realizaran en cuatro grupos de acuerdo a actividades afines, como se relacionan a continuación:

## 1. RECUPERACIÓN Y/O CONSTRUCCION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS

### Presupuestos Participativos 2016

COMUNA / CORREGIMIENTO	BARRIO
COMUNA 1	OMAGA II
	LA JUVENTUD
COMUNA 2	OLAS II
	SAN CRISTOBAL
COMUNA 5	TRANSICION
	LOS BUCAROS
COMUNA 8	AFRICA
COMUNA 9	LA PEDREGOSA
	SAN MARTIN
COMUNA 11	COAVICONSA
	IGSABELAR
COMUNA 13	ALVAREZ
COMUNA 14	LOS SAUCES
	VEGAS DE MORRORRICO
COMUNA 15	CENTRO
	LAGOS DEL CACIQUE (ANDENES)
COMUNA 16	SAN EXPEDITO

Fuente: Grupo Presupuestos Participativos

### Presupuestos participativos 2017

COMUNA / CORREGIMIENTO	BARRIO / VEREDA	TIPO DE INTERVENCION
COMUNA 2	SAN CRISTOBAL	RECUPERACION ANDENES Y/O ESCALERAS
	TRANSICION	RECUPERACION ANDENES Y/O ESCALERAS
COMUNA 6	GOMEZ NIÑO	RECUPERACION ANDENES Y/O ESCALERAS
COMUNA 10	CRISTAL BAJO	CONSTRUCCION ANDENES Y/O ESCALERAS
COMUNA 11	JARDINES DE COAVICONSA	RECUPERACION ANDENES Y/O ESCALERAS
COMUNA 13	ANTONIA SANTOS CENTRO	RECUPERACION ANDENES Y/O ESCALERAS
COMUNA 14	ALBANIA	RECUPERACION ANDENES Y/O ESCALERAS
	EL DIVISO	RECUPERACION ANDENES Y/O ESCALERAS
	MORRORRICO	RECUPERACION ANDENES Y/O ESCALERAS

Fuente: Grupo Presupuestos Participativos

## 2. CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA VEREDAL, REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO

### Presupuestos Participativos 2016

COMUNA / CORREGIMIENTO	BARRIO
CORREGIMIENTO 1	VEREDA LA SABANA
	VEREDA ANGELINOS- BOSCONIA
	VEREDA ANGELINOS LA CEMENTO
CORREGIMIENTO 2	VEREDA RETIRO GRANDE PARTE BAJA
CORREGIMIENTO 3	VEREDA LA MALAÑA

Fuente: Grupo Presupuestos Participativos

### Presupuestos Participativos 2017

COMUNA / CORREGIMIENTO	BARRIO / VEREDA	TIPO DE INTERVENCION
CORREGIMIENTO 1	LA ESMERALDA	CONSTRUCCION PLACA HUELLA
CORREGIMIENTO 2	VEREDA LOS SANTOS PARTE ALTA - EL ESPINO	CONSTRUCCION PLACA HUELAS
	EL PEDREGAL	CONSTRUCCION PLACA HUELLA
CORREGIMIENTO 3	GUALILO ALTO	RECUPERACION DE PAVIMENTO RIGIDO
	RETIRO CHIQUITO	CONSTRUCCION PLACA HUELLA

Fuente: Grupo Presupuestos Participativos

## 3. INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y ECOGIMNASIOS

### Presupuestos Participativos 2016

COMUNA / CORREGIMIENTO	BARRIO
COMUNA 9	LA LIBERTAD
COMUNA 16	ALTOS DEL CACIQUE
	BOSQUES DEL CACIQUE
COMUNA 17	BRISAS DEL MUTIS

Fuente: Grupo Presupuestos Participativos

## Presupuestos Participativos 2017

COMUNA / CORREGIMIENTO	BARRIO / VEREDA	TIPO DE INTERVENCION
COMUNA 2	VILLA HELENA I	GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y URBANISMO

Fuente: Grupo Presupuestos Participativos

### 4. MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS COMO CANCHAS, CUBIERTAS, GIMNASIOS DE FUERZA

## Presupuestos Participativos 2017

COMUNA / CORREGIMIENTO	BARRIO / VEREDA	TIPO DE INTERVENCION
COMUNA 1	VILLA ROSA (ESPERANZA III)	MANTENIMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO
COMUNA 4	GIRARDOT	ADECUACION DE ESCENARIO DEPORTIVO
COMUNA 6	LA CEIBA	MANTENIMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO
COMUNA 9	LA LIBERTAD	MANTENIMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO
	DIAMANTE I	MANTENIMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO
COMUNA 17	BALCONCITOS- SUJETO VISITA TALLER ARQ.	CONSTRUCCION ESCENARIO DEPORTIVO
	LA GRAN LADERA- SUJETO VISITA TALLER	CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO

Fuente: Grupo Presupuestos Participativos

### ✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2018	LOGRO 2018
PRESUPUESTOS INCLUYENTES.	Número de comunas con obras comunitarias ejecutadas con presupuesto participativo.	17	17	0

Una vez se realice la contratación a los diferentes grupos de presupuestos participativos vigencia 2016 y 2017, se actualizará el reporte a las metas del plan de desarrollo en aras de dar cumplimiento a este indicador.

## 1.2 PROGRAMA: GESTIÓN INTELIGENTE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL

### ✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2018	LOGRO 2018
GESTIÓN INTELIGENTE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL.	Porcentaje de predios requeridos adquiridos para la ejecución de obras de desarrollo para la ciudad.	100%	100%	100%

La Secretaría de Infraestructura, durante el primer trimestre de 2018 no ha requerido la adquisición de ningún predio para la ejecución de los proyectos, ya que estos se están realizando en predios del municipio, por lo tanto el % de cumplimiento es del 100%.

### 1.3 PROGRAMA: UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES

En este programa se encuentran todos los diseños, estudios, consultorías e interventorías para ejecutar los proyectos y las obras del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, los cuales es importante resaltar:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
414 de 2017	INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 153.020.612,5	02/02/2018	01/06/2018
417 de 2017	INTERVENTORIA CONSTRUCCION, ADECUACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD CAFÉ MADRID MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 125.761.818,00	01/02/2018	30/07/2018

Igualmente se continúa con la supervisión de las siguientes obras:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
231 de 2017	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION CENTRO VIDA BARRIO KENNEDY FASE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 144.743.787,00	01/08/2017	09/02/2018

# Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable  
Concejo Municipal

247 de 2017	INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE PARCHEO DE HUECOS, FALLOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES EN LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 113.979.248,00	18/09/2017	09/03/2018
260 de 2017	INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL BARRIO CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 77.634.648,00	01/09/2017	04/02/2018
283 de 2017	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN CORREDOR CICLISTA UIS- PARQUE DE LOS NIÑOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 67.121.782,00	12/10/2017	13/04/2018
296 de 2017	REALIZAR LA INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DEL PARQUE BOCA PRADERA EN EL BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 81.950.778,00	29/09/2017	26/03/2018
322 de 2017	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE Y CANCHA DEL BARRIO CRISTAL BAJO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 44.616.254,00	30/12/2017	15/04/2018
366 de 2017	INTERVENTORÍA PARA LA ADECUACIÓN DEL PARQUE DE LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 16.155.916,00	11/12/2017	04/04/2018 <b>Suspendido</b>
379 de 2017	INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA PLAZA GUARÍN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 116.521.031,00	19/12/2017	03/05/2018
380 de 2017	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS CANCHAS Y SUS ALREDEDORES DE LOS BARRIOS PORVENIR I PORVENIR II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 87.620.503,00	13/12/2017	15/04/2018
341 DE 2017	AUNAR ESFUERZOS EN LA FORMULACION DE POLITICAS CICLO- INCLUSIVAS PARA BUCARAMANGA EN EL MARCO DEL PROYECTO "ESTRATEGIA	\$ 850.450.389,00	10/11/2017	06/07/2018

	DE LA BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE Y DISEÑO DE 20 KILOMETROS DE CICLO-INFRAESTRUCTURA.			
--	----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

## ✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2018	LOGRO 2018
UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES	Realizar el 100% de los diseños, estudios, consultorías e interventorías para ejecutar los proyectos y las obras del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 y otros planes de ciudad.	100%	100%	100%

En cuanto a la realización de los diseños, estudios, consultorías e interventorías requeridos, la meta para el cuatrenio es que por cada vigencia se realicen los estudios, diseños, consultorías e interventorías requeridos por cada programa para el correcto funcionamiento de los mismos, por lo tanto esta meta se ha cumplido el 100%.

## LINEA ESTRATEGICA 2: INCLUSIÓN SOCIAL

### 2.1. PROGRAMA: ADULTO MAYOR Y DIGNO

La Secretaria de Infraestructura continúa con la ejecución del contrato relacionado a continuación:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
229 de 2017	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA BARRIO KENNEDY FASE II - MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.024.528.836,64 Adicional \$ 520.033.939,2	01/08/2017	09/02/2018

Estado: Avance de Obra 70%

Mampostería y estructura de vigas 3 piso





✓ **CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO**

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIOS	META 2018	LOGRO 2018
ADULTO MAYOR Y DIGNO	Número de Centros vida adecuados y/o readecuados.	3	1	0

Se tiene proyectado realizar el Mejoramiento Centro Vida Años Maravillosos - Real de Minas, para dar cumplimiento a este indicador.

**LÍNEA ESTRATÉGICA 3: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL**

**3.1. PROGRAMA: SENDEROS PARA LA VIDA**

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
330 de 2017	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EN FASE III PARA LA HABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR GRAN BOSQUE DE LOS CERROS ORIENTALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.160.000.000,00	10/11/2017	20/04/2018

**Estado:** Avance de la consultoria: 30%

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

El proyecto consiste básicamente en un sendero peatonal principal con una longitud aproximada de 2.522 metros, entre la puerta El Corcovado sobre la vía a Cúcuta y la puerta Barrio El Jardín, más un sendero peatonal secundario ubicado en la parte occidental de los cerros, de longitud de 404 metros, ubicado entre los Barrios Albania - Miraflores y el Conjunto Residencial Cantabria.

El área aproximada que ocupa el proyecto, incluyendo los senderos peatonales, las puertas de acceso El Corcovado y Barrio El Jardín, y el Tanque Mirador, es de 18.000 m<sup>2</sup>, lo cual equivale a menos del 2% del área que ocupa los cerros orientales.

# Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable Concejo Municipal



El contrato se encuentra en un porcentaje de avance del 30%, el cual no es lo esperado, debido a que se encontraba suspendido por la falta de entrega de información técnica por parte de la Empresa de Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, sobre el área del tanque Pan de Azúcar, predio de su propiedad, y sobre la cual se va a desarrollar parte del proyecto. La información solicitada al amb ya ha sido entregada por dicha entidad, y el contrato se encuentra en ejecución, donde la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO –EDU–, ha entregado un primer borrador del anteproyecto, sobre el cual se hicieron las observaciones respectivas por parte de la supervisión del Municipio, y se está trabajando en la evolución del diseño.

Adicionalmente se encuentra en ejecución los estudios geotécnicos, geológicos y de patología de la estructura del tanque Pan de Azúcar, para completar la parte de estudios del proyecto.

## ✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2018	LOGRO 2018
SENDEROS PARA LA VIDA	Número de subsectores del gran bosque de los cerros orientales de escala metropolitana diseñados.	1	0	0

Para la vigencia 2018 no existe meta programada, el cumplimiento a este indicador se realizó con el contrato en mención durante la vigencia 2017.

## 3.2. PROGRAMA: REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE

Este programa contempla todas las obras de mitigación y/o estabilización en las diferentes comunas del Municipio de Bucaramanga.

Teniendo en cuenta la declaratoria de calamidad pública de las áreas afectadas por la erosión en las comunas 3, 4, 5, 8 y 17 en el Municipio de Bucaramanga y el Desarrollo del Plan de Acción Específico para la Reducción y Recuperación de estos Sectores se presentó ante la UNGRD, los diseños, memorias de cálculos y presupuestos y ejecución del Barrio de la Obra de San Rafael obras que fueron contratadas y que se encuentran en ejecución.

A través de la UMGRD se presentaron ante el DNP los siguientes proyectos que se encuentran en proceso de cumplimiento de requisitos para los siguientes Barrios:

1. Monte Redondo
2. Estoraques
3. Nariño
4. Santander Sector del Colegio Francisco de Paula Santander y el Barrio XXIII de junio, Calle 32 Cra 2 y 1 Occ.
5. Don Bosco

Igualmente, se encuentra en proceso de liquidación el siguiente contrato, toda vez que el contratista se encuentra reuniendo la documentación para proceder a realizar la liquidación del mismo, teniendo en cuenta que una vez liquidada la obra se debe proceder a liquidar el Convenio.

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
356 de 2015	CONSTRUCCION FASE I DE OBRAS DE MITIGACION GEOTECNICA EN EL BARRIO DE VILLAS DE SAN IGNACIO Y COLEGIO VILLAS DE SAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER CONVENIO MUNICIPIO DE BUACARAMANGA Y DPS - FONADE	\$ 1.889.653.032,5	17/04/2017	16/08/2017

Estado: Ejecutado: 100%

### ✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIOS	META 2018	LOGRO 2018
REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE	Número de obras de mitigación realizadas en comunas que presenten riesgos de desastre.	20	9	0

Una vez estas obras sean contratadas, se realizara el reporte para poder dar cumplimiento a este indicador.

#### LÍNEA ESTRATÉGICA 4: CALIDAD DE VIDA

##### 4.1 PROGRAMA: CUIDAR LO QUE ES VALIOSO": RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

Se continua ejecutando el convenio realizado con la Fundacion Teatro Santander:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
118 de 2017	"AUNAR ESFUERZOS, TECNICOS, FINANCIEROS, Y ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INTERES PUBLICO "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PARA TERMINACIÓN DE LA GRAN SALA DEL TEATRO SANTANDER MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER."	\$ 2.500.000.000 Adicional \$ 1.249.000.000	03/05/2017	13/07/2018

**Estado:** Avance de Obra 60%

Se adelantó, por solicitud de la Fundación Teatro Santander adición en valor y plazo del convenio, con el fin de realizar actividades que puedan dar como resultado la apertura al público del Teatro Santander.



Fachada Teatro Santander



Tramoya y Camerino

✓ **CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO**

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIOS	META 2018	LOGRO 2018
CUIDAR LO QUE ES VALIOSO": RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO	Número de acciones de fortalecimiento para el Teatro Santander.	1	0	0

Para la actual vigencia no existe programada meta, toda vez que ya se dio cumplimiento durante la vigencia 2017.

**4.2 PROGRAMA: OBSERVAR Y SER OBSERVADO: FOMENTO AL TURISMO**

Dentro del primer trimestre el Municipio de Bucaramanga giro el valor de \$ 4.000.000.000, de acuerdo a la vigencia futura aprobado mediante acuerdo No. 039 del 21 de Septiembre de 2017, para adicionar el convenio FNT – 328 de 2014 “Construcción y dotación del Centro de Convenciones NEOMUNDO de Bucaramanga.

Lo anterior para realizar la unificación de las dos fachadas mediante una columnata, así como la construcción de un puente que une los edificios en su costado occidental.

✓ **CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO**

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIOS	META 2018	LOGRO 2018
OBSERVAR Y SER OBSERVADO: FOMENTO AL TURISMO	Número de centros de convenciones - NEOMUNDO terminados.	1	0	0

Este indicador presenta un cumplimiento del 0.5 de la vigencia 2016, el reporte total se hará una vez el Centro de Convenciones sea terminado, el cual se tiene proyectado entregar el gran salón en la presente vigencia fiscal.

**4.3 PROGRAMA: INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO**

## ✓ Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes

La administración Municipal a través de la Secretaria de Infraestructura adelanto los siguientes procesos contractuales:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
7 de 2018	MANTENIMIENTO DE PARQUES, ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 4.241.198.080,00	30/01/2018	29/12/2018

**Estado:** Avance de Obra: 27.27%

Dentro del presente Contrato Interadministrativo se está realizando rocería a las zonas verdes ubicadas en Parques, separadores y vías del Municipio de Bucaramanga, asignación de 53 parqueros distribuidos en 45 Parques y Zonas verdes, Mantenimiento de Prado y Siembra de Prado, a continuación se relaciona como se encuentran distribuidas las zonas de trabajo:

- ✓ 25 Cuadrillas conformadas por 4 personas cada una, ubicadas en los Parques y zonas Verdes de las 17 Comunas del Municipio de Bucaramanga.
- ✓ 4 cuadrillas de reacción conformadas por 4 personas cada una, como apoyo a las diferentes zonas del Municipio de Bucaramanga.
- ✓ 4 cuadrillas conformadas por 4 personas cada una, las cuales atienden las entradas principales a Bucaramanga, separadores y rompoys.
- ✓ 3 cuadrillas conformadas por 4 personas cada una, para siembra y mantenimiento de prado japonés.

### A Continuación el listado de parques donde se asigno parqueros:

PARQUEROS ZONA ORIENTE	
ITEM	PARQUE
1	PARQUE DIVINO NIÑO Y LAS MERCEDES
2	PARQUE TURBAY
3	PARQUE LAS PALMAS
4	PARQUE BOLIVAR
5	PARQUE ANTONIA SANTOS
6	PARQUE DE LOS NIÑOS
7	CABALLO DE BOLIVAR Y PLAZA BANDERAS
8	PARQUE DE LAS AMERICAS
9	PARQUE LEONES
10	PARQUE SARRAPIOS
11	PARQUE SAN PIO
12	PARQUE SOLON WILCHES, JOSE DOLORES, OLIVOS, CLUB UNION, PAPANAYAS, OFTALMOLOGICA Y BANCOOMEVA

PARQUEROS ZONA NORTE	
ITEM	PARQUE
1	PARQUE AVENIDA Q. SECA
2	PARQUE SAN FRANCISCO
3	PARQUE CRISTO REY
4	PARQUE ESPERANZA 3
5	PARQUE EL KENNEDY
6	PARQUE CAFÉ MADRID

# Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable  
Concejo Municipal

PARQUEROS ZONA OCCIDENTE	
ITEM	PARQUE
1	PARQUE GARCIA ROVIRA
2	PARQUE CENTENARIO
3	PARQUE SANTANDER
4	PARQUE GIRARDOT
5	LA PAZ- FUNDADORES
6	PARQUE CIGARRAS
7	PARQUE ROMERO
8	PARQUE LA VIDA
9	PARQUE BRUNO BATELLO VIADUCTO
10	PARQUE LAS PALMAS-VENADOS
11	CIUDAD BOLIVAR
12	PARQUE ESTORAQUES
13	PARQUE LAS ARDILLAS-HEROES
14	PARQUE LOS GATOS
15	PARQUE PRADOS-MANZANARES

PARQUEROS ZONA SUR	
ITEM	PARQUE
1	FONTANA REAL
2	PARQUE LAS TRES B, CANELOS, SAN MIGUEL
3	PARQUE CORONA, CEIBA
4	PARQUE ENAMORADOS, PATINODROMO, MERCARUSAN
5	PARQUE VALLEDUPAR
6	PUENTE DE PROVENZA
7	EL ROCIO
8	PARQUE DIAMANTE II
9	PARQUE PORVENIR, MOLINO, PETACA
10	CAMINODROMO FONTANA
11	CANELOS
12	PARQUE CONCORDIA Y PERIODISTAS

## A Continuación listado de parques para siembra de Prado Japonés

ITEM	COMUNA	PARQUE O ZONA VERDE	DIRECCION	BARRIO
1	2	PARQUE LAS TORTUGAS	CALLE 3N CON CRA 21	LA JUVENTUD
2	2	ZONA VERDE Y PARQUE ESPERANZA 2	CRA 22 CON CALLE 18 N	LA ESPERANZA 2
3	3	PARQUE AVENIDA QUEBRADASECA	PARQUE CRA 15 CON AVENIDA QUEBRADASECA	COMUNEROS
4	4	PARQUE GAITAN	CALLE 16 CON CARRERA 10 GAITAN	GAITAN
5	4	PARQUE DE LOS ABUELOS	CARRERA 12 W B. SANTANDER	SANTANDER
6	5	PARQUE TERCERA EDAD	CALLE 41 CON CARRERA 3 LA JOYA	JOYA
7	5	PARQUE LAS CRUCES	CALLE 37 CARRERA 7 W LA JOYA	JOYA
8	6	PARQUE MERCELINO GILBERT	CALLE 67 CON CARRERA 29	LA SALLE
9	6	PARQUE SAN MIGUEL	CALLE 50 CON CARRERA 15	SAN MIGUEL
10	6	PARQUE CANDILES	CARRERA 12 CALLE 50	CANDILES
11	6	PARQUE AVENIDA LA ROSITA	AVENIDA LA ROSITA	AVENIDA LA ROSITA
12	7	PARQUE CENTAUROS	CALLE 55A REAL DE MINAS	CIUDADELA REAL DE MINAS
13	8	PARQUE SAN GERARDO	CALLE 63 CON 14B	SAN GERARDO
14	8	PARQUE PABLO VI	CALLE 68 CON CARRERA 11	PABLO VI
15	8	PARQUE SAN GERARDO	CALLE 63 CON 14B	SAN GERARDO
16	9	PARQUE SAN MARTIN	CALLE 86 CON CARRERA 28	SAN MARTIN
17	9	PARQUE SAN PEDRO BAJO	CALLE 74A CARRERA 30	SAN PEDRO BAJO

# Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable  
Concejo Municipal

ITEM	COMUNA	PARQUE O ZONA VERDE	DIRECCION	BARRIO
17	9	PARQUE SAN PEDRO BAJO	CALLE 74A CARRERA 30	SAN PEDRO BAJO
18	9	PARQUE EL SOL	CALLE 71D CARRERA 31	EL SOL
19	9	PARQUE NUEVA GRANADA	CALLE 70 CON CARRERA 20	NUEVA GRANADA
20	9	PARQUE ANTONIA SANTOS SUR	CALLE 70 CON CARRERA 29 A	ANTONIA SANTOS SUR
21	10	PARQUE CAMINODROMO DE PROVENZA	CARRERA 21B CALLE 110	FONTANA
22	10	PARQUE PARQUE VALLEDUPAR	AVENIDA 70	PARQUE VALLEDUPAR
23	10	PARQUE PROVENZA	CARRERA 21 CALLE 106	PROVENZA
24	10	PARQUE PROVENZA	CARRERA 24 CON CALLE 104	PROVENZA
25	10	PARQUE SAN LUIS	CALLE 90 CON CARRERA 17B	SAN LUIS
26	10	PARQUE PROVENZA	CARRERA 21B CALLE 110	PROVENZA
27	10	PARQUE BASICO PROVENZA	CARRERA 21B CON CALLE 111	BASICO PROVENZA
28	10	PARQUE SAN LUIS	AVENIDAD 88 HASTA LA ENTRADA DEL BARRIO JUAN XXIII	SAN LUIS
29	10	PARQUE PROVENZA	CARRERA 21 A CALLE 107	PROVENZA
30	10	PARQUE PROVENZA	CARRERA 23A CON CALLE 105 A	PROVENZA
31	10	PARQUE CRISTAL BAJO	CALLE 123	CRISTAL BAJO
32	10	PARQUE PROVENZA	CARRERA 21A CON CALLE 109	PROVENZA
33	11	PARQUE BARRIO PORVENIR	CALLE 105 CON CARRERA 9	BARRIO PORVENIR
34	11	PARQUE COAVICONZA	CALLE 103A CON CARRERA 14	COAVICONZA
35	11	PARQUE EL ROCIO	CALLE 104 A CON CARRERA 16 A	EL ROCIO
36	11	PARQUE VILLA ALICIA	CALLE 103 CARRERA 15	VILLA ALICIA
37	11	PARQUE PORVENIR	CALLE 104B CON CARRERA 8	PORVENIR
39	11	PARQUE EL MOLINO	CALLE 104 H CARRERA 6	PORVENIR
40	11	PARQUE MANUELA BELTRAN	CALLE 103F CON CARRERA 12B	MANUELA BELTRAN
41	12	PARQUE LA FLORESTA	CARRERA 49 CON CALLE 65	LA FLORESTA
42	15	PARQUE ROMERO	CARRERA 10 Y 13 CALLE 44 Y 45	GARCIA ROVIRA
43	17	PARQUE LOS ABUELOS	CARRERA 2/W CALLE 64	MUTIS
44	17	PARQUE LAS ARDILLAS	CALLE 62 CARRERA 3 W	MUTIS
45	17	PARQUE LOS HEROES	CALLE 64 CARRERA 6 W	HEROES
46	17	PARQUE LOS FUNDADORES	CALLE 62 CARRERA 7 W	MUTIS
47	17	PARQUE MONTEREDONDO	CALLE 65 CARRERA 12 W	MONTERREDONDO
48	17	PARQUE NACUMA	CALLE 65 CARRERA 36 W	MONTERREDONDO
49	17	PARQUE MANZANARES	CALLE 60 CON CARRERA 20 W	MANZANARES
50	4	ROMBO Y GIMNASIO QUEBRADASECA	CARRERA 9 CON QUEBRADASECA	GIRARDOT



# Informe de **GESTIÓN**

Ante el Honorable  
Concejo Municipal

✓ **Parqueros:**

**Parque Santander:**



✓ **Mantenimiento de Prado**

**Parque García Rovira:**



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
09 DE 2018	MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y ZONAS VERDES CONSISTENTE EN LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS	\$ 251.100.819,00	01/02/2018	30/09/2018

# Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable  
Concejo Municipal

DE RIEGO EN LOS PARQUES INDICADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			
---------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

**Estado:** Avance de Obra: 5%

Teniendo en cuenta que para llevar a cabo la instalación de los puntos de agua en los diferentes sitios; se necesita realizar los procesos licitatorios para la compra de suministro y materiales para la ejecución del proyecto por parte del Acueducto Metropolitano y el cual se ha efectuado desde el inicio del Contrato, por tal motivo durante los dos meses de ejecución se ha ejecutado actividades administrativas; de igual manera se están haciendo las mediciones en los Parques Nacuma, Parque Manzanares, Rompoy de la Quebrada seca con Carrera 9ª para proceder a la respectiva instalación del Sistema de Riego.

A continuación se relaciona los 50 Parques y zonas Verdes donde se van a instalar el sistema de riego.

ITEM	COMUNA	PARQUE O ZONA VERDE	DIRECCION	BARRIO
1	2	PARQUE LAS TORTUGAS	CALLE 3N CON CRA 21	LA JUVENTUD
2	2	ZONA VERDE Y PARQUE ESPERANZA 2	CRA 22 CON CALLE 18 N	LA ESPERANZA 2
3	3	PARQUE AVENIDA QUEBRADASECA	PARQUE CRA 15 CON AVENIDA QUEBRADASECA	COMUNEROS
4	4	PARQUE GAITAN	CALLE 16 CON CARRERA 10 GAITAN	GAITAN
5	4	PARQUE DE LOS ABUELOS	CARRERA 12 W B. SANTANDER	SANTANDER
6	5	PARQUE TERCERA EDAD	CALLE 41 CON CARRERA 3 LA JOYA	JOYA
7	5	PARQUE LAS CRUCES	CALLE 37 CARRERA 7 W LA JOYA	JOYA
8	6	PARQUE MERCELINO GILBERT	CALLE 67 CON CARRERA 29	LA SALLE
9	6	PARQUE SAN MIGUEL	CALLE 50 CON CARRERA 15	SAN MIGUEL
10	6	PARQUE CANDILES	CARRERA12 CALLE 50	CANDILES
11	6	PARQUE AVENIDA LA ROSITA	AVENIDA LA ROSITA	AVENIDA LA ROSITA
12	7	PARQUE CENTAUROS	CALLE 55A REAL DE MINAS	CIUDADELA REAL DE MINAS
13	8	PARQUE SAN GERARDO	CALLE 63 CON 14B	SAN GERARDO
14	8	PARQUE PABLO VI	CALLE 68 CON CARRERA 11	PABLO VI

# Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable  
Concejo Municipal

15	8	PARQUE SAN GERARDO	CALLE 63 CON 14B	SAN GERARDO
16	9	PARQUE SAN MARTIN	CALLE 86 CON CARRERA 28	SAN MARTIN
17	9	PARQUE SAN PEDRO BAJO	CALLE 74A CARRERA 30	SAN PEDRO BAJO
18	9	PARQUE EL SOL	CALLE 71D CARRERA 31	EL SOL
19	9	PARQUE NUEVA GRANADA	CALLE 70 CON CARRERA 20	NUEVA GRANADA
20	9	PARQUE ANTONIA SANTOS SUR	CALLE 70 CON CARRERA 29 A	ANTONIA SANTOS SUR
21	10	PARQUE CAMINODROMO DE PROVENZA	CARRERA 21B CALLE 110	FONTANA
22	10	PARQUE VALLEDUPAR	AVENIDA 70	PARQUE VALLEDUPAR
23	10	PARQUE PROVENZA	CARRERA 21 CALLE 106	PROVENZA
24	10	PARQUE PROVENZA	CARRERA 24 CON CALLE 104	PROVENZA
25	10	PARQUE SAN LUIS	CALLE 90 CON CARRERA 17B	SAN LUIS
26	10	PARQUE PROVENZA	CARRERA 21B CALLE 110	PROVENZA
27	10	PARQUE BASICO PROVENZA	CARRERA 21B CON CALLE 111	BASICO PROVENZA
28	10	PARQUE SAN LUIS	AVENIDAD 88 HASTA LA ENTRADA DEL BARRIO JUAN XXIII	SAN LUIS
29	10	PARQUE PROVENZA	CARRERA 21 A CALLE 107	PROVENZA
30	10	PARQUE PROVENZA	CARRERA 23A CON CALLE 105 A	PROVENZA
31	10	PARQUE CRISTAL BAJO	CALLE 123	CRISTAL BAJO
32	10	PARQUE PROVENZA	CARRERA 21A CON CALLE 109	PROVENZA
33	11	PARQUE BARRIO PORVENIR	CALLE 105 CON CARRERA 9	BARRIO PORVENIR
34	11	PARQUE COAVICONZA	CALLE 103A CON CARRERA 14	COAVICONZA
35	11	PARQUE EL ROCIO	CALLE 104 A CON CARRERA 16 A	EL ROCIO
36	11	PARQUE VILLA ALICIA	CALLE 103 CARRERA 15	VILLA ALICIA
37	11	PARQUE PORVENIR	CALLE 104B CON CARRERA 8	PORVENIR
38	11	PARQUE TOLEDO PLATA	CALLE 107 A CARRERA 15C ZONAS VERDES Y PARQUES	TOLEDO PLATA
39	11	PARQUE EL MOLINO	CALLE 104 H CARRERA 6	PORVENIR

# Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable Concejo Municipal

40	11	PARQUE MANUELA BELTRAN	CALLE 103F CON CARRERA 12B	MANUELA BELTRAN
41	12	PARQUE LA FLORESTA	CARRERA 49 CON CALLE 65	LA FLORESTA
42	15	PARQUE ROMERO	CARRERA 10 Y 13 CALLE 44 Y 45	GARCIA ROVIRA
43	17	PARQUE LOS ABUELOS	CARRERA 2AW CALLE 64	MUTIS
44	17	PARQUE LAS ARDILLAS	CALLE 62 CARRERA 3 W	MUTIS
45	17	PARQUE LOS HEROES	CALLE 64 CARRERA 6 W	HEROES
46	17	PARQUE LOS FUNDADORES	CALLE 62 CARRERA 7 W	MUTIS
47	17	PARQUE MONTERREDONDO	CALLE 65 CARRERA12 W	MONTERREDONDO
48	17	PARQUE NACUMA	CALLE 65 CARRERA 36 W	MONTERREDONDO
49	17	PARQUE MANZANARES	CALLE 60 CON CARRERA 20 W	MANZANARES
50	4	ROMPOY Y GIMNASIO QUEBRADASECA	CARRERA 9 CON QUEBRADASECA	GIRARDOT

## ✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2018	LOGRO 2018
INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO	Porcentaje de parques con mantenimiento anual realizado.	100%	100%	100%

El cumplimiento de este indicador obedece a los contratos que se encuentran en ejecución.

- **Equipamientos Comunitarios (Sociales, deportivos, Culturales entre otros).**

La Secretaria de Infraestructura ha continuado ejecutando los siguientes contratos:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
227 DE 2017	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS CON EL FIN DE EJECUTAR EL	\$ 1.263.654.146,38	01/08/2017	15/04/2018

# Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable Concejo Municipal

	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			
--	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Estado: Avance de obra: 100% - Recibido de Obra



Fachada Principal puesto de salud de Regadero, Toledo Plata y Pablo sexto

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
259 DE 2017	MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL BARRIO CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 750.154.116,33 <b>Adicional</b> <b>\$ 275.693.091,90</b>	01/09/2017	04/02/2018

Estado: Avance de obra: 100% - Recibido de Obra



Anden perimetral costado occidental

Mini cancha sintética, plazoleta y zonas verdes

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
269 DE 2017	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS TENDIENTES A LA HABILITACIÓN Y PROMOCIÓN DE ESPACIOS DE ACCESO GRATUITO A	\$ 2.033.989.525	26/10/2017	31/07/2018

# Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable Concejo Municipal

	INTERNET A TRAVÉS DE LAS ZONAS WI-FI QUE INTEGRAN LAS TIC PARA EL USO DE LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Estado: Avance Físico: 56.27% - Instalación: 90% - Zonas en Operación: 78%, las zonas serán instaladas en 16 de las 17 comunas del Municipio.

Con este proyecto se pretende atender parques, separadores, canchas etc, con servicio de Internet a través de zonas WIFI en beneficio de toda la ciudadanía.

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
284 de 2017	CONSTRUCCION DEL PARQUE BOCA PRADERA DEL BARRIO CIUADELA REAL DE MINAS MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.146.494.931,76 Adicional \$ 275.693.091,9	29/09/2017	26/03/2018

Estado: Avance de Obra 95% - Suspendido



Eco gimnasios Bocapradera



Andenes perimetrales, Zona Juegos y Bancas en concreto

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
308 de 2017	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE MICROFUTBOL DEL BARRIO LA JOYA Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEL BARRIO CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 391.107.653,00 Adicional \$ \$ 185.926.107,00	10/10/2017	07/04/2018

Estado: Avance de Obra 65%

# Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable Concejo Municipal

La obra presenta un porcentaje de avance aproximado del 65% representado en Cancha la joya, reconstrucción de cerramiento, mantenimiento de la cubierta de la gradería adecuación de muros y cerramiento metálico, reposición de friso y piso de graderías. En Cancha de Café Madrid movimiento de tierra, construcción de filtro para manejo de aguas lluvia de la cancha, conformación de la superficie de la cancha, construcción de andenes perimetrales, adecuación de espacio para zona de juegos.

Panorámicas Cancha Café Madrid



Panorámicas graderías la Joya y Cerramiento Forzado



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
320 de 2017	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE Y CANCHA DEL BARRIO CRISTAL BAJO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 1.450.558.948,5 <b>Adicional</b> \$ 456.073.945,00 \$ 269.014.610,84	30/10/2017	31/03/2018

Estado: Avance de obra 96%

# Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable Concejo Municipal

La obra presenta un porcentaje de avance del 96%, quedando pendiente por terminar algunos detalles finales de acabados como el cerramiento en malla de nylon de la cancha y la instalación del pasamanos de la terraza con piso en deck, en el costado occidental del parque, así como labores de aseo final.



Cabe aclarar que el adicional No. 1 se aprobó con base en la necesidad de construir los muros de contención en gaviones ubicados entre el costado sur del parque y la quebrada La Cuellar, en una longitud aproximada de 90 metros, necesaria para dar mayor estabilidad y seguridad al proyecto. Por otra parte, el adicional No. 2 se aprobó con base en el ajuste realizado al diseño de pavimento de la calzada vehicular, el cual contemplaba un acabado en adoquín vehicular, pero debido a que se evidenció el paso de vehículos pesados por el sitio, se decidió cambiar a concreto. En este segundo adicional también se incluyó el cambio de especificación de la pega del adoquín peatonal para toda el área del parque, así como una mayor área de intervención del urbanismo, a solicitud de la comunidad del sector, actividades que demandaron mayores costos de los presupuestados.

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
324 de 2017	ADECUACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE RELIGIOSO MORRORICO BUCARAMANGA.	\$ 270.009.924,05 Adicional \$ 127.923.589.32	09/11/2017	20/03/2018

Estado: Avance de Obra 100% - En Proceso de Liquidación

Intervenciones realizadas en Gradería e instalaciones de gimnasios entre otras





# Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable  
Concejo Municipal

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
370 de 2017	ADECUACIÓN PARQUE DE LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA..	\$ 1.088.325.855,00	11/12/2017	04/04/2018

Estado: Avance de Obra 80% - Suspendido desde el 27 de Marzo de 2018

Los trabajos presentan un avance del 80%, pero debido a la demora en la entrega del material de cerramiento marca BENITO, importado desde España, se aprobó una suspensión hasta la llegada del material al sitio de la obra, para proceder a su instalación y terminación de los trabajos.



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
374 de 2017	CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS CANCHAS Y SUS ALREDEDORES DE LOS BARRIOS PORVENIR I Y PORVENIR II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO II	\$ 1.580.052.824,88	13/12/2017	17/04/2018

Estado: Avance de Obra 70%

Los trabajos presentan un avance del 70%, y debido al atraso de una semana que actualmente tiene la obra, se le exigió al contratista la implementación de cuadrillas de trabajo adicional, así como la implementación de la doble jornada de trabajo, para que culmine dentro del plazo establecido.

# Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable Concejo Municipal



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
378 de 2017	CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS CANCHAS Y SUS ALREDEDORES DE LOS BARRIOS PORVENIR I PORVENIR II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO I	\$ 724.856.089,78	13/12/2017	20/03/2018

**Estado:** Avance de Obra 97%

Los trabajos llegaron a un nivel de ejecución del 97%, debiéndose suspender 4 días antes de terminar el plazo, ya que las luminarias del parque marca SCHREDER, que son importadas, no han llegado al sitio de obra para su respectiva instalación y recibido a satisfacción del proyecto.



Así mismo se realizó la contratación del Suministro de Materiales en tres grupos los cuales es preciso detallar.

# Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable  
Concejo Municipal

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
407 de 2017	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	GRUPO 2 \$ 374.404.578,24	27 de Diciembre de 2017	09 de Marzo de 2018
408 de 2017		GRUPO 4 \$ 24.458.598,36		
409 de 2017		GRUPO I \$ 73.706.549,63		

Estado: Avance de obra: Contrato 409: En proceso de Liquidación, Contrato No. 407: 70%, Contrato 408, 100 Avance de Entrega.

## ✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2018	LOGRO 2018
INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO	Número de equipamientos comunitarios (sociales, deportivos y culturales: canchas sintéticas, muulticentros deportivos, salones comunales, entre otros) intervenidos y/o constuidos.	100	30	0

Para dar cumplimiento a este indicador, actualmente se adelanta el proyecto de mantenimiento a escenarios deportivos el cual representa 22 canchas, una vez sea contratado se realizara el reporte a este indicador.

## • Mantenimiento a Plazas de Mercado

Se continua con la ejecucion del contrato relacionado a continuacion:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
359 de 2017	REPOSICIÓN DE LA CUBIERTA DEL MODULO NORTE DE LA PLAZA GUARÍN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 585.620.639,85	23/11/2017	30/12/2017

Estado: Avance de Obra 0% - Suspendido

Pendiente trámite antes las empresas de telecomunicaciones el traslado de redes, toda vez que están se encuentran colgadas a la estructura metálica que soportan la estructura de la cubierta.

### ✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2018	LOGRO 2018
INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO	Número de adecuaciones y/o mantenimientos realizados a las plazas de mercado a cargo del municipio.	4	1	0

Se espera terminar con la intervención a la plaza de mercado Guarín y realizar las gestiones para lograr dar cumplimiento a este indicador.

#### • Andenes Construidos

Se continua con la ejecucion del contrato relacionado a continuacion:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
376 de 2017	ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA PLAZA GUARÍN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 1.982.938.940,48	19/12/2017	03/05/2018

Estado: Avance de Obra 25%

Se han realizado obras de demolición, movimiento de tierra, en el costado norte y demolición de andenes en el costado sur e instalación de desagües en esta zona, e instalación de sardineles.

*Cerramiento costado sur por la calle 32*



✓ **CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO**

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2018	LOGRO 2018
INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO	Número de M2 de andenes construidos.	30.000	10.400	0

Para dar cumplimiento a este indicador, la Secretaria de infraestructura se encuentra adelantado el proyecto de andenes, escalera y pasamanos, una vez contratado se realizara el reporte a este indicador.

**LÍNEA ESTRATÉGICA 6: INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD**

**6.1. PROGRAMA: PROMOCIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS**

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
281 de 2017	CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR CICLISTA UIS-PARQUE DE LOS NIÑOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.171.015.163,58 Adicional \$ 433.232.617,99	12/10/2017	13/04/2018

**Estado:** Avance de obra 80%

**Actividades Ejecutadas:**

**TRAMO 1:**

- A. se culmina el 100% de fundida de bordillo en la glorieta
- B. se culmina instalación de hitos y tachones hasta la calle 14
- C. Se culmina pintura en pictogramas, líneas de borde, líneas laterales y líneas de eje se da inicio a la marcación de señales verticales para su instalación.
- D. Pendiente arreglar detalles de pintura y acabados.
- E. Pendiente instalación de señales verticales calle 10

**TRAMO 2:**

- A. Pintura en pictogramas, líneas de borde, líneas laterales y líneas de eje en un 90%
- B. Pendiente finalizar señalización vertical.

- C. Se implementó el cambio vial el día 20 de febrero y se realizaron actividades de borrado de señales y pintura de pictogramas y señales horizontales marcación de líneas de eje.
- D. Se culmina la instalación de hitos, tachones y tachas en el sector, pendiente hitos flexibles amarillos en calle 14
- E. Se culmina demarcación horizontal del cruce de la calle 14 avenida Eduardo Santos.

### **TRAMO 3:**

- A. se continúan obras civiles en tramo 3 en el sector denominado justo y bueno, esta pendiente finalizar instalación de losetas.
- B. Pendiente señalización horizontal
- C. Pendiente detalles de instalación de alumbrado público como emboquillado de tuberías y marca de caja de inspección.
- D. Pendiente recubrimiento de postes con concreto para protección de tuberías eléctricas
- E. Pendiente ejecución de plan de siembra para la compensación de los árboles talados e informe de las actividades realizadas en la tala.

### **TRAMO 4:**

- A. Se finalizaron actividades de reparcho, se ejecutó señalización horizontal sobre el tramo.
- B. Ejecutado total de pintura señalización horizontal
- C. Señales verticales instaladas en un 90%

### **TRAMO 5:**

- A. Pendiente finalizar instalación de loseta y adoquín, avance 95%
- B. Pendiente acabados y reparaciones daños ocasionados por terceros y/o por el contratista durante la ejecución de actividades o cambios por la mala instalación y/o mala calidad de materiales.
- C. Pendiente retirar escombros y realizar limpieza general de obra.
- D. Pendiente semaforización, se han instalado mástiles, pendiente cabezales.
- E. Pendiente ejecución de plan de siembra para la compensación de los árboles talados e informe de las actividades realizadas en la tala.

### **TRAMO 6:**

- A. Finalizada la segregación de la calle 32
- B. Pendiente la finalización de instalación de señales verticales
- C. Pendiente semaforización, avance 50%
- D. Pendiente finalización de demarcación horizontal avance 90%
- E. Pendiente siembra de prado y pinos vela.



CARRERA 30 ENTRE CALLES 30 Y 32



CARRERA 27 ENTRE UIS Y CABALLO DE BOLIVAR

## ✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIOS	META 2018	LOGRO 2018
PROMOCIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS	Número de kms de ciclorutas para transporte urbano implementados.	20	7	0

Para dar cumplimiento a este indicador, se encuentra en ejecución el Convenio de Cooperación Internacional No. 341 de 2017 “Diseño definitivo de 20 Kilómetros de Cicloruta”, el cual se encuentra en un porcentaje de avance del 30%, en el cual se ha recopilado información correspondiente al tema de ciclo infraestructura de orden municipal, nacional e internacional, para proceder al análisis de esta información y comenzar la etapa de propuestas para Bucaramanga y dejar las bases para el desarrollo posterior al área Metropolitana.

## 6.2. PROGRAMA: MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA

### • Mantenimiento Malla Vial Urbana

Se continuó ejecutando el siguiente contrato:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
246 de 2017	OBRAS DE PARCHEO DE HUECOS, FALLOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES EN LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.228.092.616,57 <b>Adicional</b> \$ 223.813.732,98	18/09/2017	09/03/2018

Estado: Avance de Obra: 99.30%

## ACTIVIDADES EJECUTADAS

EJECUTADO FINAL		
MEJORAMIENTO MALLA VIAL	UND	CANT
Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas subyacentes	M3	1.344,19
Riego de liga	M2	9.427,03
Mezcla densa en caliente MDC-19 para vía aplicada manualmente	M3	1.344,53

SEÑALIZACION MALLA VIAL	UND	CANT
Suministro e Instalación de Pintura Termoplástica o de dos componentes blanca y/o amarilla y/o azul en marcas viales (cebras, pictogramas, senderos, flechas, leyendas entre otros incluye imprimante negro , antideslizante)	M2	484,00

Igualmente durante la ejecución del contrato se realizaron los siguientes trabajos:

- ✓ ADECUACIÓN DE LOS SEPARADORES PRESENTES EN LA CARRERA 23 CON CALLE 56 PARA MANIOBRA DE GIRO DE LOS BUSES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROLINEA.
- ✓ CAMBIOS DE SENTIDOS VIALES Y CREACION DE PAR VIAL EN LA CARRERA 2W Y CARRERA 3 DEL BARRIO EL MUTIS DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.
- ✓ MODIFICACION INTEGRAL EN EL SECTOR DE LA GLORIETA CHICAMOCHA, INVOLUCRANDO, CAMBIOS DE SENTIDOS VIALES EN LA CARRERA 28 Y 29 ENTRE CALLES 30 Y 36, ELIMINACION DE GIROS Y PROPUESTA DE DESVIOS EN LA CARRERA 33 CON CALLE 36 PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD.

A continuación algunas intervenciones realizadas.

### BARRIO CANDADO - CARRERA 15 # 104B-63



Antes de la Intervención Pavimento



Después de la Intervención



# Informe de **GESTIÓN**

Ante el Honorable  
Concejo Municipal

## **BARRIO EL PORVENIR - CARRERA 9 ENTRE CALLE 104E Y CALLE 103F**



Antes de la Intervención



Después de la Intervención

## **BARRIO SAN ALONSO - CARRERA 28 # 17-40**



Antes de la Intervención



Después de la Intervención


## **SEÑALIZACIÓN MALLA VIAL Y CAMBIOS VIALES**

### **UBICACIÓN SEÑALIZACIÓN DE LA MALLA VIAL**


- ✓ Carrera 3 y 2W entre calle 55 y calle 65; calle 56 entre carrera 2W y carrera 7W

# Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable Concejo Municipal

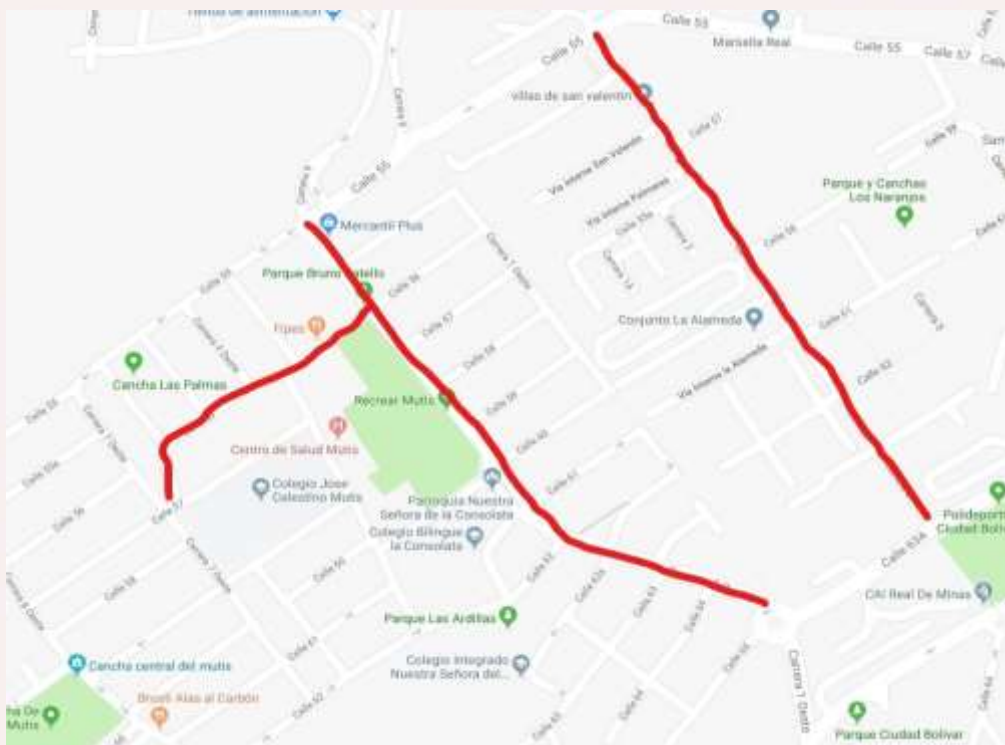

✓ Carrera 28 y carrera 29 entre calle 30 y calle 36

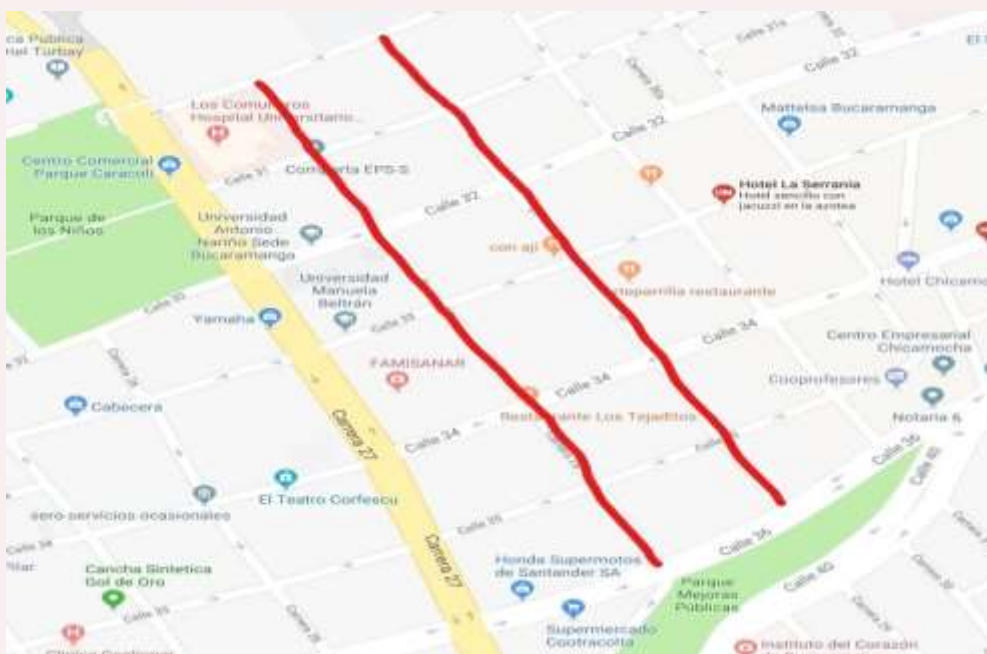

# Informe de **GESTIÓN**

Ante el Honorable  
Concejo Municipal

## MUTIS



## CARRERA 29 ENTRE CALLE 30 Y CALLE 36



## SECTOR CARRERA 28 ENTRE CALLE 30 Y CALLE 36



✓ **CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO**

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2018	LOGRO 2018
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA	Número de M2 de malla vial urbana mejorados y/o construidos.	60.000	10.000	0

Se espera que una vez se realice la contratación del proyecto del mantenimiento y mejoramiento de la malla vial de la presente vigencia se pueda dar cumplimiento a este indicador.

• **Megaobras de Infraestructura Vial**

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
272 de 2014	CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL MESÓN DE LOS BÚCAROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	Valor Inicial \$ 54.909.500.000 Adicional 1. \$ 14.516.066.713 Adicional 2. \$ 10.945.041.309 <b>Valor Total \$ 80.370.608.022</b>	10 de septiembre de 2014	7 de ABRIL de 2017

**Estado:** Avance de Obra: 89.94% - **SUSPENDIDO**

Este contrato se encuentra suspendido por los motivos expuestos en el acta de suspensión del plazo de fecha 28 de Febrero de 2018

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
331 de 2014	INTERVENTORÍA AMPLIACIÓN DEL CORREDOR VIAL PRIMARIO BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA SECTOR PUERTA DEL SOL - PUENTE PROVENZA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	Valor Inicial \$ 7.518.263.339,5 Adicional 1. \$ 5.640.000.000,00 Adicional 2. \$ 298.124.079,52 Adicional 3. \$ 279.998.312,00 Adicional 4. \$ 503.068.682,00 Adicional 5 \$ 576.556.101,00 Adicional 7 \$ 576.411.857,00 <b>Valor Total 15.392.422.371,02</b>	01 de Octubre de 2014	31 de Enero de 2017

**Estado:** Avance de obra: 97.82% **SUSPENDIDO**

Pendientes trabajos redes eléctricas, y pavimentos

✓ **CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO**

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2018	LOGRO 2018
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA	Número de megaobras terminadas.	3	0	0

El cumplimiento a este indicador obedece a la terminación del Tercer carril y la Construcción del intercambiador del Mesón de los Búcaros que debió ser reportado en la vigencia 2017, pero como no ha sido posible la terminación de dichas obras, durante la vigencia 2018 se espera realizar el reporte.

**6.2 PROGRAMA: MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL RURAL**

La Secretaria de Infraestructura realizó: Mantenimiento periódico a las diferentes vías del sector urbano y rural que contempla la Ampliación, Nivelación, Perfilado, Cuneteo y Afirmado de Vías Internas, actividades realizadas con la Maquinaria disponible (1 Minicargador, 1 Motoniveladora, 2 Volquetas y Carrotanque) Adscrita a este Despacho, A continuación algunos sectores intervenidos.

**Corregimiento N° 2:**

- Travesía Santa Rita - Capilla Alta – Magueyes

**Corregimiento N° 3:**

- V. Santa Bárbara - UDES
- V. Gualilo
- V. Retiro Chiquito
- V. San José
- Transporte Agua Potable Sector La Malaña.

**Sector Urbano:**

- Retiro de Caseta Metálica.
- Retiro de Escombros Villa Mercedes
- Transporte material Paulon
- Inservibles Zoonosis
- Mantenimiento de Motoniveladora
- Mantenimiento de Volqueta
- Cargue de Elementos de Urbanismo Táctico



✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2018	LOGRO 2018
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL RURAL	Número de kms de vías rurales con transitabilidad mantenida.	140	140	140
	Número de ML de placa huella construidas.	5.000	500	0

El cumplimiento a este indicador obedece al mantenimiento rutinario con la maquinaria del Municipio, de acuerdo a la programación por parte de este Despacho y con respecto a las placas huellas, se espera iniciar proceso de contratación en el mes de Abril para dar cumplimiento a este indicador.

### 1.3 PROGRAMA: SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS Y RURALES

La Secretaria de Infraestructura ha continuado ejecutando el siguiente convenio:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
352 DE 2017	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE GESTIÓN ENTRE EMPAS S.A, EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN	\$ 3.152.925.698,21	15/12/2017	14/12/2018

COLECTOR CALLE 5 ENTRE CARRERAS 10 Y 15, Y CALLE 6 ENTRE CARRERAS 15 Y 15B DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.			
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

El Municipio de Bucaramanga, realizo el desembolso único para la Empresa de Alcantarillado de Santander –EMPAS, el cual es la ejecutora del proyecto y se encuentra realizando el proceso de contratación.

#### 6.4. PROGRAMA: ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL

La Secretaria de Infraestructura a través de la Oficina de Alumbrado Publico ha realizado Mantenimiento de la siguiente Manera:

MES	PQR'S RECIBIDAS EN EL MES	PQR'S ATENDIDAS DEL MES	% ATENCION PQR'S DEL MES	TIEMPO DE RESPUESTA (DIAS)	PQR'S ATENDIDOS DE OTROS MESES	ACUMULADA PQR'S RECIBIDAS	ACUMULADA PQR'S ATENDIDAS	% ATENCION PQR'S ACUMULADO
Enero	1120	655	58%	5	446	1120	1101	98%
Febrero	846	428	51%	4	310	1966	1839	94%
Marzo	806	463	57%	5	262	2772	2564	92%
<b>TOTAL PQR'S ACUMULADO RECIBIDAS</b>					<b>11729</b>			
<b>TOTAL PQR'S ACUMULADO ATENDIDAS</b>					<b>11213</b>			
<b>PORCENTAJE DE ATENCION PQR'S</b>					<b>92%</b>			

Se continúa con la ejecución de los contratos de mantenimientos para el alumbrado público en cumplimiento de los siguientes procesos contractuales:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
302 de 2017	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES SECTORES DE LA ZONA URBANA Y ZONA RURAL	COINGESER LTDA \$ 810.496.307,50	18 de Octubre de 2017	18 de Octubre de 2018
303 de 2017		EME INGENIERIA \$671.856.316,58		
304 de 2017		CIVAREL INGENIERIA \$651.732.060,00		

**Estado:** Avance de obra: 45%

#### SECTORES A INTEVENIR

- ❖ GRUPO COINGESER Intervienen: Comunas 4, 5, 7, 12, 17, Corregimiento 3 y Viaducto Provincial
- ❖ GRUPO EME Intervienen: Comunas 2, 3, 6, 8, 9, 14, 15 y Corregimiento 1
- ❖ GRUPO CIVAREL Intervienen: Comunas 1, 10, 11, 13, 16 y Corregimiento 2

# Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable Concejo Municipal

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
003 de 2017	CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO VIA CENFER – PUERTA DEL SOL –GRUPO 1 –CENFER INTERCAMBIADOR EL BUENO	\$ 3.296.758.330,00	15/02/2017	30/10/2017

**Estado:** Avance de obra: 100% ejecutado – En proceso de Liquidación

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
004 de 2017	CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO VIA CENFER – PUERTA DEL SOL. GRUPO 2 – INTERCAMBIADOR EL BUENO INTERCAMBIADOR PUERTA DEL SOL	\$ 2.881.620.453,00	15/02/2017	30/10/2017

**Estado:** Avance de Obra: 99% - Suspendido desde el 26 de Octubre de 2017



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
008 de 2017	PARQUE GUAYACANES - BAVARIA II – COMUNA 1 Y VILLA DEL PRADO – COMUNA 5	\$ 1.239.726.530,00	16/02/2017	15/07/2017

**Porcentaje Ejecución:** Bavaria II - 100%

**Porcentaje Ejecución:** Villa del Prado – 100% - **SUSPENDIDO**



## **CONSTRUCCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL TRAMO 4 – CENTRO ABASTOS CAFÉ MADRID**

### **Grupo 1 – EICON LTDA**

COP: 219 de 2017

Valor: \$ 2.621.711.740,95

Porcentaje Ejecución: **86.52%**

Fecha de Inicio:

Fecha de Terminación:

Estado: *SUSPENDIDO (22/12/2017)*

*Se estima reinicio para el 16 de Abril de 2018*

### **Grupo 2 – EME INGENIERÍA S.A**

COP: 220 de 2017

Valor: \$ 1.813.213.811,70

Porcentaje Ejecución: 92.03%

Julio 27 de 2017

Diciembre 26 de 2017

## **MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO ETAPA 2 – BARRIO CIUDAD BOLÍVAR**

Contratista:

INGELCO PROYECTOS E.U.

Valor:

\$ 2.176.343.155,91

Fecha de Adjudicación:

Septiembre 06 de 2017

Plazo de Ejecución:

4 meses

Proceso de interventoría de Ciudad Bolívar etapa 2 en tramite, se estima publicación de estudios previos para el 9 de abril de 2018.

<b>Contrato No.</b>	<b>objeto</b>	<b>Valor</b>	<b>Fecha Inicio</b>	<b>Fecha Terminación</b>
<b>338 de 2017</b>	CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO PARQUE CRISTAL ALTO.	\$ 374.093.443.00	20/11/2017	30/12/2017

Porcentaje Ejecución: 99% - en Ejecución



# Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable Concejo Municipal

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
390 de 2017	CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DISEÑO FACHADA PLAZA SAN MATEO	\$ 61.561.937.00.	12/12/2017	30/12/2017

Porcentaje Avance de la consultoria: 100% - En proceso de Liquidación



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
325 de 2017	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA ELECTRICADORA DE SANTANDER PARA LA IMPLEMENTACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 1.000.000.000.	08/11/2017	07/01/2018

Porcentaje Ejecución: 100% - Avance – En proceso de Liquidación

## ✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIIO	META 2018	LOGRO 2018
ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL	Número de luminarias sustituidas a LED.	36.000	12.000	0
	Número de luminarias expandidas.	1.000	300	0
	Número de puntos de teledidacta instalados y puestos en marcha.	50	15	0

Número de parques y/o escenarios públicos modernizados en su alumbrado público.	20	5	0
Porcentaje de nuevos espacios públicos con alumbrado público instalado.	100%	100%	0%
Porcentaje de luminarias que se encuentran en funcionamiento.	96%	96%	92%

Para el cumplimiento de estos indicadores se adelantan:

- ✓ **Número de Luminarias Sustituidas a Led:** Se está gestionando banco de proyectos para la modernización del alumbrado público a tecnología led de las comunas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 11. (24.300 luminarias)
- ✓ **Proyecto Piloto Energía Solar:** Está en diseño Parque Contemplativo El Carrasco
- ✓ **De adelanta el proceso SI-SAMC-002-2018,** cuyo objeto: Actividades de poda para el despeje de luminarias y redes que interfieran con el alumbrado público en el Municipio de Bucaramanga, por Valor: 604,312,372

## 7. OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR LA SECRETARIA

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
332 de 2017	ADECUACIONES FÍSICAS Y MANTENIMIENTO LOCATIVO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM FASE I Y FASE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 571.193.007,91	22/08/2017	28/03/2018

**Estado:** Avance de Obra: 100% en proceso de recibo final y liquidación.

### ACTIVIDADES PRINCIPALES EJECUTADAS:

- 1 ADECUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS EN EL CAM FASE II
- 2 MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LAS FACHADAS DEL CAM FASE I
- 3 MANTENIMIENTO TERRAZA DEL CAM FASE I

# Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable Concejo Municipal

- 4 MANTENIMIENTO Y EMBELLICIMIENTO DE LAS FACHADAS DEL CAM FASE II
- 5 MANTENIMIENTO TERRAZAS DEL CAM FASE 2 Y CUBIERTA DE LA PLENARIAS DEL CONCEJO
- 6 ADECUACIONES INTERNAS EN EL CAM FASE 1

Terrazas Cam Fase II



Limpieza Fachadas



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
339 de 2017	MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CENTRO ORIENTE. (GRUPO III AREA SUR)".	\$ 883.194.102,9	20/11/2017	28/02/2018

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
340 de 2017	MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CENTRO ORIENTE. ORIENTE (GRUPO II AREA CENTRAL)".	\$ 817.434.952,46	20/11/2017	28/02/2018

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
355 de 2017	MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES EN EL MUNICIPIO DE	\$ 813.655.567,13	20/11/2017	28/02/2018

# Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable  
Concejo Municipal

	BUCARAMANGA, CENTRO ORIENTE. (GRUPO I AREA NORTE)".			
--	-----------------------------------------------------	--	--	--

Estado: Avance de Obra 100%

Gracias a la coordinación de los trabajos acordada y realizada previamente entre el Municipio, el Contratista y la Interventoría, las obras objeto de mantenimiento y/o adecuación fueron terminadas dentro del plazo establecido, donde finalmente se intervinieron 30 establecimientos educativos distribuidos en los tres grupos anteriormente descritos.

Si bien los trabajos fueron terminados el 28 de febrero, durante el mes de marzo se procedió a realizar el proceso de entrega de cada uno de los sitios intervenidos al rector de cada establecimiento, donde se hicieron varias observaciones y se presentaron detalles de acabados que se han venido corrigiendo por parte de los contratistas de obra, para su entrega a conformidad.

Actualmente ya han sido recibidos a conformidad el grupo 2 en su totalidad, y parcialmente el grupo 1, y se procedió a dar inicio a la entrega de los establecimientos del grupo 3.

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
405 de 2017	CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.598.565.682,8	POR INICIAR	Aprobado mediante vigencia futura

Estado: Avance de Obra: 0% - Suspendido

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
71 de 2018	RECONSTRUCCION DE LA ANTIGUA ESTACION DEL CAFÉ MADRID PARA LA HABILITACIÓN DE UN LUDOTECA EN EL BARRIO CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.254.823.459.69	12/03/2018	11/11/2018

Estado: Avance de Obra: 5%

Los trabajos iniciaron el 12 de Marzo de 2018, en el cual se tiene un avance del 5%. En la obra se adelantan la limpieza general del lote, cerramiento provisional de obra y apiques para inspección de la cimentación existente.

# Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable  
Concejo Municipal

Trabajos de limpieza de escombros y acondicionamiento del área de trabajo



## 8. PROYECTOS EN PROCESO DE CONTRATACION

No.	OBJETO	No. PROCESO	TIPO PROCESO	PLAZO	PLAZO		ESTADO	VALOR TOTAL
					FECHA DE PUBLICACIÓN	FECHA DE ADJUDICACIÓN		
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-001-2018	LICITACIÓN PÚBLICA	4	12/03/2018	10/05/2018	PROYECTO DE PLIEGOS	\$ 1.798.100.263,97
2	ACTIVIDADES DE PODA PARA EL DESPEJE DE LUMINARIAS Y REDES QUE INTERFIERAN CON EL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-SAMC-002-2018	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA	7,5	02/03/2018	24/04/2018	PLIEGO DEFINITIVO	\$ 604.312.372,00
3	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION CERRAMIENTO Y RELLENO DE TERRENO UBICADO EN LA DIAGONAL 32 No. 33ª - 132 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-SAMC-002-2018	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA	2	13/03/2018	25/03/2018	PLIEGO DEFINITIVO	\$ 355.000.192,00
4	REALIZAR UN PLAN DE INTERVENCIÓN PARA REMOVER LA CUBIERTA QUE COMPRENDE EL ALERO DE LA VIVIENDA UBICADA EN LA CARRERA 12 No 37-51 Y LA RESPECTIVA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA PARA PREVENIR EL RIESGO EN QUE SE ENCUENTRA LA COMUNIDAD QUE CIRCULA POR EL SECTOR Y CON EL PROPÓSITO DE CUMPLIR FALLO DENTRO DE LA ACCIÓN POPULAR RADICADA CON EL No 680013333009-2017-00178-00 EMANANDO DEL JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA	SI-CMC-002-2018	MINIMA CUANTÍA	1	13/03/2018	03/04/2018	SE DECLARÓ DESIERTO	\$ 5.781.943,00

## 9. PROYECTOS PRESENTADOS Y VIABILIZADOS

No.	No. REGISTRO	OBJETO	VALOR VIGENCIA	ESTADO
1	20160680010121	MEJORAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS TRANSVERSALES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.563.200.000,00	Certificado - Actualización
2	20160680010088	ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, ENERGÍA Y FACTURACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	\$ 17.933.000.000,00	Certificado - Actualización
3	20170680010016	APOYO EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 864.250.000,00	Certificado - Actualización
4	20170680010118	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE Y CANCHA DEL BARRIO CRISTAL BAJO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 317.509.812,84	Certificado - Actualización
5	20160680010226	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER	\$ 1.008.735.035,13	Certificado - Actualización
6	20170680010090	MEJORAMIENTO DEL PARQUE BOCAPRADERA DEL BARRIO CIUADAELA REAL DE MINAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 501.661.954,67	Certificado - Actualización
7	20170680010141	CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA DE COLUMNATA Y PUENTE DE INTEGRACIÓN EDIFICIOS EXISTENTE Y NUEVO CENTRO DE CONVENCIONES NEOMUENDO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 4.000.000.000,00	Certificado - Actualización Vigencias Futuras

# Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable  
Concejo Municipal

8	20180680010010	APOYO AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS DIFERENTES OBRAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 105.932.922,80	Certificado - Proyecto Nuevo
9	20170680010046	SUBSIDIO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO A LA POBLACION DE ESTRATO 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 4.552.898.870,00	Certificado - Actualización
10	20170680010174	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO LOS PINOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 154.989.631,00	Certificado - Proyecto Nuevo
11	20170680010084	CONSTRUCCIÓN CORREDOR CICLISTA UIS - PARQUE DE LOS NIÑOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 466.793.508,99	Certificado - Actualización
12	20170680010093	ADECUACIÓN DEL PARQUE RELIGIOSO MORRORICO BUCARMANGA	\$ 127.923.589,32	Certificado - Actualización
13	20170680010133	CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS CANCHAS Y SUS ALREDEDORES DE LOS BARRIOS PORVENIR I PORVENIR II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.449.984.504,67	Certificado - Actualización
14	20170680010057	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA GRAN SALA DEL TEATRO SANTANDER MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	\$ 999.000.000,00	Certificado - Proyecto Nuevo
15	20180680010013	MATENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.977.910.290,37	Certificado - Proyecto Nuevo
16	20160680010245	CONSTRUCCION, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.	\$ 1.109.208.202,83	Certificado - Actualización



17	20160680010154	MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	\$ 4.541.798.899,48	Certificado - Actualización
18	20170680010111	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEL BARRIO CAFÉ MADRID DE BUCARAMANGA	\$ 89.084.660,00	Certificado - Actualización
19	20160680010196	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA BARRIO KENNEDY FASE II MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	\$ 599.555.869,61	Certificado - Actualización
20	20180680010018	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE MICROFUTBOL DEL BARRIO LA JOYA FASE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 96.841.447,00	Proyecto Nuevo, en espera de ser certificado.
21	20170680010165	RENOVACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 88.017.400,27	En Actualización

## 10. DEFENSA JUDICIAL

Durante el periodo de Enero a Marzo de 2017, los Juzgados Administrativos y el Tribunal Administrativo de Santander han proferidos en ACCIONES POPULARES y ACCIONES DE TUTELA, fallos a favor y en contra en los procesos que cursan en los despachos judiciales de esta Secretaria de la Siguiete manera:

Acciones de Tutela y Acciones Populares notificadas y tramitadas	13
Fallos a favor en acciones de tutela y acciones populares	12
Fallos en contra en acciones de tutela	00
Fallos pendientes por notificar en acciones de Tutela	02
Fallos en contra en acciones populares	02
Fallos cumplidos en acciones populares	03
Fallos en acciones populares pendientes de cumplimiento	15

## 11. INVERSION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 31 DE MARZO DE 2018

PROGRAMAS	INVERSION	%
ADMINISTRACION ARTICULADA Y COHERENTE	\$ 1.629.500.000,00	8,00
OBSERVAR Y SER OBSERVADO FOMENTO AL TURISMO	\$ 4.000.000.000,00	20,00
INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO	\$ 8.768.147.239,85	43,00
PROMOCIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS	\$ 466.793.508,00	2,00
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA	\$ 32.131.276,80	0,00
ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL	\$ 5.606.980.694,12	27,00
<b>TOTAL (1)</b>	<b>\$ 20.503.552.718,77</b>	<b>100%</b>

## 12. OTROS VALORES EN LA EJECUCION

DESCRIPCION	VALOR
VALOR ACTUALIZACION REGISTROS PRESUPUESTALES	\$ 116.684.400,00
VALOR SUBSIDIOS DE SERVICIOS PUBLICOS, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	\$ 2.316.981.905,00
<b>TOTAL (2)</b>	<b>\$ 2.433.666.305,00</b>
<b>TOTAL INVERSION (1+2)</b>	<b>\$ 22.937.219.023,77</b>
