



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga

**GOBERNAR
ES HACER**

**INFORME DE GESTION - 01 Abril – 30 Junio de 2022
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**

INFORME DE GESTION A 30 DE JUNIO DE 2022

En el presente informe se resume los principales avances que la Secretaria de Infraestructura ha generado en el segundo trimestre del año, en el cual ha contrato, ejecutado y realizado las gestiones pertinentes para el control del avance de las diferentes obras que ejecuta la Secretaria.

A continuación, se detalla la gestión que realizó la Secretaria de Infraestructura en el segundo trimestre de 2022.

LINEA ESTRATEGICA 1. BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR

La secretaria de infraestructura continúa ejecutando el contrato del colegio tecnológico el cual es detallado a continuación:

1. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 104 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2021: "MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DAMASO ZAPATA FASE I DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA."

VALOR INICIAL	:	\$ 10.161.443.099,00
VALOR ADICIONAL 1	:	\$ 2.047.432.424,30
VALOR ADICIONAL 2	:	\$ 3.335.243.684,00
VALOR TOTAL ACTUAL	:	\$ 15.544.243.684,00
VALOR ANTICIPO INICIAL	:	\$ 3.048.432.929,70
VALOR ANTICIPO ADICION 1	:	:\$ 614.229.727,29
VALOR ANTICIPO ADICION 2	:	:\$ 1.000.573.105,20
TOTAL ANTICIPOS	:	\$ 4.663.235.762,19
PLAZO INICIAL	:	: 7 MESES
PLAZO ADICIONAL 1	:	:15 DIAS
PLAZO ADICIONAL 2	:	:.5 MESES
PLAZO ADICIONAL 3	:	: 2 MESES
PLAZO TOTAL	:	: 13 MESES
FECHA DE INICIO	:	28 de junio de 2021
NUEVA FECHA DE TERM.	:	26 de julio de 2022
% EJECUCION:	:	92%
ESTADO DEL CONTRATO	:	EN EJECUCION:

El contrato se encuentra en proceso de ejecución con un avance del 92%, en este momento se están interviniendo las instalaciones del edificio de bienestar en las que se encuentran las oficinas de psicología, enfermería, odontología, batería de baños, sala audiovisual docentes, papelería, auditorio, pasillos, sala egresados, ludoteca.

Edificio administrativo: se está haciendo intervención en las oficinas de Rectoría, secretaria de rectoría, Coordinación académica, Contabilidad académica, Almacén, Pagaduría, SIMAT y secretaria general, y dos baños

Espacio Público: se está haciendo intervención en una (1) cancha multifuncional y (1) cancha para futbol en arenilla, zonas arborizadas, instalación de mesas de picnic, mesas de ping pong y zonas de circulación.

EDIFICIO DE BIENESTAR PLAZOLETA - ANTES



EDIFICIO DE BIENESTAR PLAZOLETA - DESPUES



PASILLO DE ADMINISTRACION - ANTES



PASILLO DE ADMINISTRACION - DESPUES





**LÍNEA ESTRATÉGICA 3. BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA:
EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES**

PROGRAMA: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA INFRAESTRUCTURA

En este programa se continúa ejecutando los diferentes contratos de estudios y diseños, necesarios para las diferentes obras del Municipio.

1. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 331 DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 “REALIZAR LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN VIAL DE LA CALLE 53-54, CONEXIÓN ORIENTE-OCCIDENTE, EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE, LA INCORORACIÓN DE ELEMENTOS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SU ARTICULACIÓN CON LAS INTERVENCIONES URBANAS DEL CORREDOR”.

VALOR FISCAL	:	\$ 2.885.000.000
PLAZO	:	DIEZ (10) MESES.
PAGO No. 1(Firma acta inicio) 25%	:	\$721.250.000
PAGO No. 2.	:	\$721.250.000
FECHA DE INICIO	:	22 DE NOVIEMBRE DE 2021.
FECHA DE SUSPENSIÓN	:	29 DE DICIEMBRE DE 2021.
FECHA DE REINICIO	:	13 DE ENERO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	:	02 DE OCTUBRE DE 2022
PORCENTAJE AVANCE PLAZO	:	69%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato Interadministrativo No. 331 de 2021 se encuentra en ejecución, Al momento se presenta el informe de actividades No. 03 desarrolladas entre 05 de marzo – 04 de abril de 2022 que comprende lo siguiente.

1.ACTIVIDADES EJECUTADAS

1.1. COMPONENTE 1: CONCEPTUALIZACION Y MODELADO.

- 1.1.1. URBANISMO
- 1.1.2. MOVILIDAD
- 1.1.3. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

1.2. OTRAS ESPECIALIDADES

- 1.2.1 TOPOGRAFIA, CAPTURA Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL
- 1.2.2. ELABORACION DE LA LINEA BASE AMBIENTAL
- 1.2.3. REDES DE SERVICIOS



PROGRAMA: DESARROLLO DEL CAMPO

Dentro de este programa se continúa ejecutando los diferentes contratos que benefician a diferentes veredas, así:

1. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 289 DE 2021: "CONSTRUCCION DE POZOS SEPTICOS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA " –GRUPO 1

Contratista : PAVIACOM SAS
Interventor : CARLOS ALBERTO GUALDRON
Supervisor : WILSON MOTTA RODRIGUEZ
Valor inicial : \$ 367.006.900
Valor adicional : \$ 155.708.130
Plazo Inicial : Cuatro (04) meses
Fecha de Inicio : 22 de Noviembre de 2021
Fecha de terminación : 21 de abril de 2022
Estado : CONTRATO LIQUIDADADO

PORCENTAJE AVANCE : 100%

CORREGIMIENTO NO 1		CORREGIMIENTO NO 2	
VEREDA	# POZOS INSTALADOS	VEREDA	# POZOS INSTALADOS
Vereda esmeralda	10	Vereda Monserrate	6
Vereda Aburrido alto	1	Vereda Bolarqui alto	2
Vereda aburrída bajo	3	Vereda Capilla alta	5
Vereda San Pedro alto	6	Vereda Los santos	1
Vereda San Pedro bajo	2	TOTAL POZOS INSTALADOS	42
Vereda Santa Rita	6		



Pozos séptico compacto de 1600 lts



Pozo de infiltración altura 3 metros

2. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 290 DE 2021: "CONSTRUCCION DE POZOS SEPTICOS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA " –GRUPO 2

Contratista : CONSTRUCTORA ICONIKA SAS
Interventor : CARLOS ALBERTO GUALDRON
Supervisor : WILSON MOTTA RODRIGUEZ
Valor inicial : \$ 367.143.960,00
Valor adicional : \$ 92.077.860,00
Plazo Inicial : Cuatro (04) meses
Fecha de Inicio : 22 de Noviembre de 2021
Fecha de terminación : 21 de abril de 2022
PORCENTAJE AVANCE : 100%
ESTADO : EN LIQUIDACION

CORREGIMIENTO NO 2		CORREGIMIENTO NO 3	
VEREDA	# POZOS INSTALADOS	VEREDA	# POZOS INSTALADOS
Vereda magueyes	10	Vereda Gualilo	4
		Vereda Santa Bárbara	4
TOTAL POZOS INSTALADOS	35	Vereda Retiro chiquito	6
		Vereda Retiro Grande	1
		Vereda El Pedregal	6
		Vereda San José	4

**LÍNEA ESTRATÉGICA 4. BUCARAMANGA CIUDAD VITAL:
LA VIDA ES SAGRADA**

PROGRAMA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES

Durante este primer trimestre se terminó de ejecutar el contrato interadministrativo detallado así:

1. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 216 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021:
 REALIZAR LA ACTIVIDADES DE RECOLECCION, TRANSPORTE, DISPOSICION DE RESIDUOS Y RIEGO DE LACOBERTURA VEGETAL A TRAVES DE LOS CUALES SE GARANTIZA LA CONSERVACION Y EL MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS VERDES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

VALOR FISCAL : \$ 558.592.671,53
 VALOR ADICIONAL : \$ 277.154.471,96
 PLAZO : TRES MESES Y 20 DIAS
 PLAZO ADICIONAL 1 : QUINCE DIAS
 PLAZO ADICIONAL 2 : DOS MESES

FECHA DE INICIO : 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN : 14 DE MARZO DEL 2022
PORCENTAJE AVANCE : 100%

ESTADO DEL CONTRATO: el contrato se encuentra terminado y en proceso de liquidación

Con este contrato se realizó la atención de 203 parques y zonas verdes ubicados en cada una de las comunas de la ciudad y lo cual correspondió al mantenimiento diario como recolección de hojas secas, riego, fertilización y corte de césped.

2. CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 66 DE 2022 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2022, CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ZONAS VERDES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”.

- Valor del Contrato: \$2.622.405.105,00
- Plazo total: 5 meses
- Plazo transcurrido a la fecha: 1 mes, 15 días
- Plazo restante: 3 meses, 15 días
- Avance físico ejecutado: \$535.088.340,00
- Acta de inicio: 29 de abril del 2022



Corte de Césped Zona Verde Vía Terminal Chimita



Corte de Césped Calle 45 hacia la Vía Chimita



Recolección de Desechos vegetales



Corte de Césped Separador Autopista



Corte de césped plazuela Real



Intervención de Ciclo Ruta San Miguel

PROGRAMA: EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

En este programa se encuentran los contratos en etapa de ejecución final vigencia 2021 y contratos adjudicados durante el primer semestre de 2022 así:

1. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 038 DE FECHA 2 de MARZO de 2022: Objeto:
“ADECUACION DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,
SANTANDER” – GRUPO 1

GRUPO 1: SALÓN LOS COLORADOS

VALOR : \$ 479.947.142,00
VALOR ANTICIPO : \$ 143.984.142,60 (30%)

www.bucaramanga.gov.co

VALOR ADICIONAL 1	:	N/A- Es adicional en plazo
PLAZO INICIAL	:	DOS MESES
PLAZO ACTUAL	:	TRES MESES
FECHA DE INICIO	:	28 de marzo de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	:	27 de junio de 2022
ESTADO DEL CONTRATO	:	SUSPENDIDO
PORCENTAJE AVANCE	:	24 %

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en la construcción de estructura. Se ha realizado el Balance financiero del contrato. Se encuentra adelantando procesos administrativos relacionados con la actualización del proyecto y legalización de mayores, menores cantidades y obras NO previstas. Los barrios beneficiados son: Los Colorados



Render Salón Colorados



Vista interior Salón Colorados



Vista de estructura



Vista de estructura



2. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 037 DE FECHA 2 de MARZO de 2022: Objeto:
“ADECUACION DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,
SANTANDER”- GRUPO 2

GRUPO 2: SALÓN VILLA MERCEDES

VALOR	:	\$ 406.829.486,00
VALOR ANTICIPO	:	\$ 122.048.845,80 (30%)
VALOR ADICIONAL 1	:	N/A – Es adicional en plazo
PLAZO INICIAL	:	DOS MESES
PLAZO ACTUAL	:	TRES MESES
FECHA DE INICIO	:	28 de marzo de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	:	27 de junio de 2022
ESTADO DEL CONTRATO	:	SUSPENDIDO
PORCENTAJE AVANCE	:	18 %

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra terminando la fase de preliminares y ha iniciado cimentación y estructura. Se ha realizado el Balance financiero del contrato. Se encuentra adelantando procesos administrativos relacionados con la actualización del proyecto y legalización de mayores, menores cantidades y obras NO previstas. Los barrios beneficiados son: Villa Mercedes.



Render Salón Villa Mercedes



Vista interior Villa Mercedes



Vista panorámica



Vista panorámica

3. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 036 DE FECHA 2 de MARZO de 2022: Objeto:
“ADECUACION DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,
SANTANDER” – GRUPO 3

GRUPO 3: SALON LAS AMÉRICAS

VALOR	:	\$ 459.976.380,00
VALOR ANTICIPO	:	\$ 137.992.914,00 (30%)
VALOR ADICIONAL 1	:	N/A
PLAZO INICIAL	:	DOS MESES
PLAZO ACTUAL	:	TRES MESES
FECHA DE INICIO	:	28 de marzo de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	:	27 de junio de 2022
ESTADO DEL CONTRATO	:	SUSPENDIDO
PORCENTAJE AVANCE	:	60 %

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en etapa de obra gris y reposición de cubierta y las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias. Se ha intervenido también la zona de acceso. Se ha realizado el Balance financiero del contrato. Se encuentra adelantando procesos administrativos relacionados con la actualización del proyecto y legalización de mayores, menores cantidades y obras NO previstas. Los barrios beneficiados son: Las Américas, Álvarez



Render Salón Las Américas



Vista interior Salón Las Américas



Desmante de cubierta



Desmontes de elementos



Fachada



Area interna

4. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 26 DEL 18 DE FEBRERO DE 2022 cuyo objeto es "ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-SANTANDER"- GRUPO 3

VALOR INICIAL : \$ 5.247.985.246
 VALOR ANTICIPOS : \$ 1.574.395.573,80
 PLAZO INICIAL : SEIS (06) MESES

FECHA DE INICIO : 28 de marzo de 2022
FECHA DE TERMINACION INICIAL : 27 de septiembre de 2022
% EJECUCION : 10,12%

ESTADO DEL CONTRATO: EN EJECUCION:

El contrato se encuentra en proceso de ejecución con un avance del 10.12%, en el instituto educativo Aurelio Martínez Mutis se han realizado actividades de topografía tales como mediciones y replanteos del proyecto, junto con actividades de demolición de graderías y losa de concreto en general, al momento se están elaborando cajas de inspección agua lluvias, se están instalando lloraderas para las jardineras en tubería PVC y se está realizando el relleno con material seleccionado para red aguas lluvias y rellenos con base granular.

En el parque Nacumas finalizadas las actividades preliminares se encuentra en construcción el filtro francés de la cancha de fútbol, la construcción de las graderías de la cancha múltiple junto con la excavación de cajas, dados de cimentación e instalaciones eléctricas.

En el barrio san Gerardo al momento se está trabajando la soldadura de los ganchos para tubería de cerramiento, el encofrado de contrahuellas para la gradería del workout y la instalación de acero para cárcamo del mismo, junto con la excavación para la gradería y la instalación del filtro francés.

En el cuarto de basuras del barrio los Naranjos se han ejecutado actividades de desmontes tales como marcos, puerta, llave de agua, el corte y demolición de muros en mampostería, demolición de enchapes de pisos y muros junto con la demolición de la impermeabilización de la cubierta y la placa de piso en general, también se trabajó la escafilada del acabado en estuco y pintura existente.

En el gimnasio de la gran ladera se han ejecutado actividades iniciales de medición y replanteo, junto con la excavación y fundida de bordillos, instalación de sardinel, la excavación de dados, la compactación de sub base granular y la fundida de un alcorque.

En el escenario deportivo el triunfo se está realizando actividades de excavación para dados del cerramiento de la cancha de arena y su fundición en concreto ciclópeo, la instalación de bordillos e instalación del cárcamo en la cancha de arena, resaltando que ya fueron realizados todos los desmontes de estructuras que se encontraban anteriormente.

Finalmente en el frente de la ceiba además de actividades de topografía, demoliciones y desmontes se realizó la excavación para la cimentación de las bancas junto con su solado de limpieza, el armado estructural de acero para los bordillos y las bancas y su encofrado con formaleta metálica, también se realizó la excavación para la acometida pluvial y la instalación de tubería de 4" desde cárcamo a caja de inspección.

REGISTRO FOTOGRAFICO



IE AURELIO MARTINEZ SEDE B - ANTES



IE AURELIO MARTINEZ SEDE B - DESPUES



SAN GERARDO - ANTES



SAN GERARDO - DESPUES



6 abr. 2022 1:55:34 p. m.
6417 Carrera 36 Oeste
Bucaramanga
Santander
Nacumas G3

PARQUE NACUMAS - ANTES



21 abr. 2022 10:02:40 a. m.
Nacumas G3

PARQUE NACUMAS - DESPUES



miércoles, 5 de abril de 2022 10:18:49
Cl. 60 #3W-69, Bucaramanga, Santander, Colombia
Altitud: 912.2m
Velocidad: 1.0km/h
El Triunfo G3

EL TRIUNFO - ANTES



jue., jun. 30, 2022 15:47p. m.
Bucaramanga
Escenario Deportivo El Triunfo

EL TRIUNFO - DESPUES



LA CEIBA- ANTES



LA CEIBA - DESPUES



5. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 27 DEL 18 DE FEBRERO DE 2022 cuyo objeto es “ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-SANTANDER”. – GRUPO 4

VALOR INICIAL	:	\$ 5.049.581.350
VALOR ANTICIPOS	:	\$ 1.514.874.405
PLAZO INICIAL	:	SIETE (07) MESES
FECHA DE INICIO	:	23 de marzo de 2022
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	:	22 de octubre de 2022
% EJECUCION	:	8,29%

El contrato se encuentra en proceso de ejecución con un avance del 8.29%, al momento en el parque Bosque del Cacique se han realizado todas actividades generales de mediciones con topografía, desmontes en general de obra civil y parte eléctrica, demoliciones de andenes y placas, excavaciones manuales y mecánicas en todo el parque, rellenos con material seleccionado, estructuras en concreto y metálicas, graderías y bordillos perimetrales a la cancha, la red pluvial se tiene un alto porcentaje de avance y las actividades de la red eléctricas iniciaron alrededor de dos semanas y continúan con ellas.

En el parque Santa María se han realizado todas actividades generales de mediciones con topografía, desmontes en general de juegos y gimnasios, aplicación de sub-base para los senderos zona sur del parque, desmontes de la parte eléctrica postes y luminarias, demoliciones de bancas, senderos y placas en asfalto y concreto, excavaciones manuales y en zanja en todo el parque, rellenos con material proveniente de las excavaciones del parque, estructuras en concreto con vigas de cimentación para la bahía vehicular, la red hidráulica para los bebederos y las actividades de la red eléctricas para la nueva iluminación del proyecto.

En el parque Fontana se han realizado todas actividades generales de mediciones con topografía, desmontes de juegos existentes, mobiliario y gimnasios, demoliciones de andenes, senderos internos del parque y placas en concreto, excavaciones manuales y en zanja en todo el parque, rellenos con material seleccionado y proveniente de las excavaciones, relleno con sub base granular en el sendero norte, la red pluvial de las zonas de juegos se tiene un alto porcentaje de avance y las actividades de la red eléctricas para la instalación de postes y luminarias.

REGISTRO FOTOGRAFICO:

<p>BOSQUES DEL CACIQUE - ANTES</p>  <p>BOSQUES DEL CACIQUE - ANTES</p>	<p>BOSQUES DEL CACIQUE - DESPUES</p>  <p>BOSQUES DEL CACIQUE - DESPUES</p>
 <p>PARQUE FONTANA- ANTES</p>	 <p>PARQUE FONTANA- DESPUES</p>



6. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 24 DEL 18 DE FEBRERO DE 2022 cuyo objeto es “ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-SANTANDER”. – GRUPO 1

Contratista : CONSORCIO EQUIPO URBANO PL
Interventor : JESAK S.A.S
Supervisor : WILSON MOTTA RODRIGUEZ
Valor inicial : \$3.945.859.179.00
Plazo Inicial : Cinco (05) Meses
Plazo adicional No 1 : Treinta (30) días
Fecha de Inicio : 28 de Marzo de 2022
Fecha de terminación : 27 de Agosto de 2022

PORCENTAJE AVANCE : 40.5%

PARQUE	VALOR
PORTAL DE LOS ANGELES	\$1.710.057.392
VEREDA VIJAGUAL	\$1.537.961.614
BARIO BOSQUE NORTE	\$697.839.973

ESTADO DEL AVANCE CONTRATO:

1. PARQUE Y CANCHA PORTAL DE LOS ANGELES



ANTES



DESPUES

2. PARQUE Y CANCHA VEREDA VIJAGUAL



ANTES



DESPUES

3. PARQUE Y CANCHA BOSQUE NORTE



ANTES



DESPUES

7. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 24 DEL 18 DE FEBRERO DE 2022 cuyo objeto es “ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-SANTANDER”. – GRUPO 2

Contratista : TITÁN INGENIERÍA INTELIGENTE S.A.S
Interventor : JESAK S.A.S
Supervisor : WILSON MOTTA RODRIGUEZ
Valor inicial : **\$3.166.887.555,00**
Plazo Inicial : Cuatro (04) días
Plazo adicional No 1 : Treinta (30) días
Fecha de Inicio : 28 de Marzo de 2022
Fecha de terminación : 27 de Julio de 2022

PORCENTAJE AVANCE : 23.5%

ALCANCE

Parque	Valor
PARQUE GIRARDOT	\$ 674.848.214,00
BARRIO SANTANDER	\$ 881.676.738,00
BARRIO DON BOSCO	\$ 617.738.028,00
PARQUE SAN PIO	\$ 992.624.570,00

ESTADO DEL AVANCE CONTRATO:

PARQUE Y CANCHA GIRARDOT



ANTES



DESPUES

PARQUE Y CANCHA BARRIO SANTANDER



ANTES



DESPUES

PARQUE Y CANCHA BARRIO DOS BOSCO



ANTES



DESPUES

8. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 29 DE FECHA 23 de febrero 2022
“ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – Grupo 1”
PARQUE FERROCARRILES

VALOR INICIAL	:	\$ 7.620.834.131,00
VALOR ANTICIPO TOTAL	:	\$ 2.286.250.239,00
FECHA DE INICIO	:	28 marzo de 2022
PLAZO INICIAL	:	10 Meses.
FECHA DE TERM INICIAL	:	27 de enero 2023
% EJECUCION	:	5,87 %
ESTADO DEL CONTRATO	:	EJECUCIÓN



**9. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 30 DE FECHA 23 de febrero 2022
“ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS
DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – Grupo 2” –
CANCHA CAFÉ MADRID**

VALOR INICIAL	:	\$ 4.427.144.706,00
VALOR ANTICIPO TOTAL	:	\$ 1.328.143.411,80
FECHA DE INICIO	:	28 marzo de 2022
PLAZO INICIAL	:	06 Meses.
FECHA DE TERM INICIAL	:	27 de septiembre 2022
% EJECUCION	:	10,18 %
ESTADO DEL CONTRATO	:	EJECUCIÓN



**10. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 34 DE FECHA 28 de febrero 2022
“ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS
DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – Grupo 3” –
PARQUE LA FERIA**

VALOR INICIAL : \$ 6.249.897.563,00
VALOR ANTICIPO TOTAL : \$ 1.874.969.268,9
FECHA DE INICIO : 07 de abril de 2022
PLAZO INICIAL : 09 Meses.
FECHA DE TERM INICIAL : 06 de enero de 2023
% EJECUCION : 1,31 %
ESTADO DEL CONTRATO : EN EJECUCIÓN



**11. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 31 DE FECHA 23 de febrero 2022
“ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS
DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – Grupo 4” –
PARQUE CANELOS**

VALOR INICIAL : \$ 6.874.999.999,0
VALOR ANTICIPO TOTAL : \$ 1.462.499.999,7
FECHA DE INICIO : 30 de marzo de 2022
PLAZO INICIAL : 07 Meses.
FECHA DE TERM INICIAL : 29 de octubre de 2022
% EJECUCION : 23 %
ESTADO DEL CONTRATO : EJECUCIÓN



**12. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 33 DE FECHA 25 de febrero 2022
“ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS
DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – Grupo 5” –
PARQUE PORVENIR**

VALOR INICIAL : \$ 7.925.167.869,00
VALOR ANTICIPO TOTAL : \$ 2.377.550.360,70
FECHA DE INICIO : 30 de marzo de 2022
PLAZO INICIAL : 10 Meses.
FECHA DE TERM INICIAL : 29 de enero de 2023
% EJECUCION : 16%
ESTADO DEL CONTRATO : EJECUCIÓN



CONTRATOS EN EJECUCIÓN VIGENCIA 2021

1.CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 173 DE FECHA 6 de agosto de 2021:
“ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS ADYACENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – GRUPO 1”

GRUPO 1 – CORDONCILLOS II

VALOR INICIAL	:	\$ 667.862.933,00
VALOR ANTICIPO	:	\$ 333.931.467,00 (Contratista renunció a Anticipo)
VALOR ADICIONAL EN Vr. 1:	:	\$ 138.355.583,00
VALOR ADICIONAL EN Vr. 2:	:	\$ 15.432.990,00
VALOR TOTAL CON ADICION:	:	\$ 821.651.506,00
PLAZO INICIAL	:	4 MESES
PLAZO TOTAL	:	6 MESES + 11 DIAS
FECHA DE INICIO	:	19 de agosto de 2021
FECHA TERM. INICIAL.	:	18 de diciembre de 2021
NUEVA FECHA DE TERM.	:	13 de junio de 2022
ESTADO DEL CONTRATO	:	EJECUTADO
PORCENTAJE AVANCE	:	100%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra ejecutado en su totalidad y en trámite de Entrega y recibo final de obra, entrega del bien inmueble y posterior liquidación. La intervención ejecutada comprende la adecuación del salón comunal, una zona intermedia de con zonas verdes y área de juegos y la cancha multifuncional con gradería. Los Barrios beneficiados con esta intervención son: Cordoncillos 2, San Gerardo, Canelos, Cordoncillo 1 y barrios aledaños.



ANTES: VISTA DEL SALÓN Y CANCHA DE CORDONCILLOS II ANTES DE LA INTERVENCIÓN



ANTES: VISTA DEL SALÓN Y CANCHA DE CORDONCILLOS II ANTES DE LA INTERVENCIÓN



ACTUAL: CERRAMIENTOS



ACTUAL: ZONA DE JUEGOS



ACTUAL: SALÓN COMUNAL



ACTUAL: SALON COMUNAL- VISTA LATERAL

2.CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 174 DE FECHA 6 de agosto de 2021:
“ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS ADYACENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – GRUPO 2”

GRUPO 2 – BUENAVISTA

VALOR INICIAL	:	\$ 790.406.627,00
VALOR ANTICIPO	:	\$ 395.203.313,00 (Pagado al Contratista)
VALOR ADICIONAL en Vr. 1:	:	\$ 57.361.100,00
VALOR ADICIONAL en Vr. 2:	:	\$ 91.677.354,00
VALOR TOTAL CON ADICION:	:	\$ 939.445.081,00
PLAZO INICIAL	:	4 MESES
PLAZO TOTAL	:	6 MESES + 27 DÍAS
FECHA DE INICIO	:	19 de agosto de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	:	18 de diciembre de 2021
NUEVA FECHA DE TERM.	:	26 de mayo de 2022
ESTADO DEL CONTRATO	:	EJECUTADO
PORCENTAJE AVANCE	:	100,00%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra ejecutado en su totalidad. En proceso subsanando pendientes menores registrados por el control de calidad final para el proceso de entrega y recibo final de obra y entrega del bien inmueble y posterior liquidación. La intervención ejecutada comprende la adecuación del salón comunal, la conexión de éste con el espacio público perimetral, un área de gimnasios al aire libre, plazoleta y la cancha multifuncional con gradería. Los Barrios beneficiados con esta intervención son: Buenos Aires, Buenavista, Corregimiento 3: con la Vereda San José y Alto de los Padres.



ANTES: SALON BUENAVISTA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



ANTES: AREA DE ESPACIO PÚBLICO- SALON Y CANCHA BUENAVISTA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



AHORA: FACHADA



AHORA: PANORAMICA DEL SALON COMUNAL Y ESPACIO PÚBLICO



AHORA: CONSTRUCCION BANCA EXTERIOR



AHORA: PANORAMICA NOCTURNA

3.CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 172 DE FECHA 6 de agosto de 2021:
 “ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS ADYACENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – GRUPO 3”

GRUPO 3 – CASA BUHO + LUDOTECA LAS AMERICAS

VALOR INICIAL	:	\$ 1.558.718.661,00 Vr total. CASA BUHO: 1.357.461.840 LUDOTECA: \$201.256.821,00
VALOR ANTICIPO	:	\$ 779.359.330,50 – (APROBADO Y PAGADO A LA FECHA)
VALOR ADICIONAL EN Vr 1:	:	\$ 297.803.242,00
VALOR TOTAL CON ADICIONAL:	:	\$ 1.856.521.903,00
PLAZO INICIAL	:	5 MESES
PLAZO TOTAL	:	9 MESES
FECHA DE INICIO	:	19 de agosto de 2021
FECHA DE TERMINACION	:	18 de enero de 2022
NUEVA FEHCA TERMINACIÓN:	:	13 de junio de 2022
ESTADO DEL CONTRATO	:	EJECUTADO
PORCENTAJE AVANCE	:	Frente Ludoteca Américas 100%
PORCENTAJE AVANCE	:	Casa Búho 100%
PORCENTAJE TOTAL	:	Consolidado del Contrato 100%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra ejecutado. Los dos frentes de obra están ejecutados- en proceso de subsanación de observaciones finales por control de obra para proceso de Entrega y Recibo Final. Los Barrios beneficiados con esta intervención son Las Américas, Antonia Santos y La Aurora.



ANTES: CASA BUHO ANTES DE LA INTERVENCIÓN



ANTES: CASA BUHO ANTES DE LA INTERVENCIÓN



ESTADO ACTUAL: Fachada Carrera 27



ESTADO ACTUAL: Fachada Cruce Cra. 27 y Calle 33



ESTADO ACTUAL: Vista Salón Piso 2



ESTADO ACTUAL: Vista Salón Piso 3



4. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 261 DE FECHA 8 DE OCTUBRE DE 2021:
OBJETO: “ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES I: EL INICIO Y SEDE G: SAN PEDRO BAJO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA OFICIAL RURAL VIJAGUAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”- GRUPO 1

GRUPO 1– VIJAGUAL SEDE G- SAN PEDRO BAJO

VALOR INICIAL	:	\$517.115.246,00
VALOR ANTICIPO	:	\$ 155.134.573,80 -30% – (PAGADO AL CONTRATISTA)
VALOR ADICIONAL 1	:	\$199.993.670,00
VALOR TOTAL:		\$717.108.916,00
PLAZO INICIAL:		2 MESES
PLAZO TOTAL	:	5 MESES + 15 días
FECHA DE INICIO	:	5 de noviembre de 2021
FECHA DE TERMINACION	:	4 de enero de 2022
NUEVA FECHA TERMINACION:		18 junio de 2022
ESTADO DEL CONTRATO	:	EJECUTADO
PORCENTAJE AVANCE	:	100 %

ESTADO DEL CONTRATO: El Contrato se encuentra ejecutado. Se contempla la intervención total de la Sede Educativa, cambio de cubierta, cambio de las instalaciones eléctricas, pisos en concreto pulido, instalación de nueva Fachada Metálica y estabilización del talud posterior. Se inició proceso de subsanación de observaciones finales por control de calidad final de obra para la el proceso de Entrega y Recibo final de obra. La vereda beneficiada con esta intervención es San Pedro Bajo.



5. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 264 DE FECHA 8 DE OCTUBRE de 2021:

OBJETO: “ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES I: EL INICIO Y SEDE G: SAN PEDRO BAJO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA OFICIAL RURAL VIJAGUAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”- GRUPO 2

VALOR INICIAL	:	\$ 1.049.352.155,00 Vr. total.
VALOR ANTICIPO	:	\$ 314.805.646,50 -30% – (PAGADO AL CONTRATISTA)
VALOR ADICIONAL 1	:	\$ 95.317.223,00
VALOR TOTAL:	:	\$ 1.144.669.378,00
PLAZO INICIAL:	:	2 MESES
PLAZO TOTAL	:	5 MESES + 15 días
FECHA DE INICIO	:	5 de noviembre de 2021
FECHA DE TERMINACION	:	4 de enero de 2022
NUEVA FECHA TERMINACION:	:	18 junio de 2022
ESTADO DEL CONTRATO	:	EJECUTADO
PORCENTAJE AVANCE	:	100 %

ESTADO DEL CONTRATO: El Contrato se encuentra ejecutado. Se contempla la intervención total de la Sede Educativa, cambio de cubierta, cambio de las instalaciones eléctricas, pisos en concreto pulido, instalación de nueva Fachada Metálica, definición del espacio público, mantenimiento de la cancha y suministro de juego multifuncional. La vereda beneficiada con esta intervención es El Aburrido Alto.



6. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 342 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE de 2021:
Objeto: “CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL PARA LOS ANIMALES EN CONIDICION DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”

UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL –UBA –CANILES Y GATERIAS

VALOR INICIAL	:	\$ 745.788.096,00
VALOR ANTICIPO	:	\$ 223.736.428,80 (Con Acta de Pago de Anticipo aprobada)
VALOR ADICIONAL 1	:	\$ 338.536.690,00
VALOR TOTAL	:	\$1.084.324.786,00
PLAZO INICIAL	:	UN MES+15 DÍAS
PLAZO TOTAL	:	CUATRO MESES + 27 DIAS
FECHA DE INICIO	:	9 de noviembre de 2021

FECHA DE TERMINACIÓN : 12 de enero de 2022
FECHA DE TERMINACION
DEFINITIVA. : 4 DE MAYO de 2022
ESTADO DEL CONTRATO : EJECUTADO
PORCENTAJE AVANCE : 100 %

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra EJECUTADO. Contempló la construcción de módulos multifuncionales destinados para los diferentes procesos de atención de caninos y felinos, con definición de espacios individuales y colectivos conectados por agradables espacios de circulación. Se ha formalizado la Terminación de la ejecución y se implementa el protocolo de entrega de la Secretaría de Infraestructura a la Secretaría de ambiente para su puesta en operación. Es un proyecto de cobertura urbana para toda la ciudad de Bucaramanga.



ANTES: Area antes de l intervención



ANTES: Area antes de l intervención



Ahora: Avance general se observan procesos de, mampostería y estructura metálica




Ahora: Vista general de avance de módulos de caniles y gateras

7.CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 327 DE 2021 ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA FUNDACION TEATRO SANTANDER, CUYO OBJETO ES “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL TEATRINO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES (EMA), MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE SONIDO, ILUMINACION, VESTIMENTA TEATRAL, SISTEMA DE TRAMOYA MOTORIZADO, SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE GRADERIAS COMPLEMENTARIOS, ASCENSOR Y OBRAS CIVILES DEL LOBBY DEL TEATRO SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	\$ 2.600.000.000
DESEMBOLSO No 1 (50%):	\$ 1.300.000.000
DESEMBOLSO No 2 (40%):	\$ 1.040.000.000
FECHA DE INICIO:	19 DE NOVIEMBRE DE 2021
PLAZO INICIAL:	UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2021
SUSPENSION No 1:	23 DE DICIEMBRE DE 2021
AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION No 1:	17 DE ENERO DE 2022
REINICIO No 1:	17 DE FEBRERO DE 2022
ADICIONAL EN PLAZO No 1:	24 DE FEBRERO DE 2022
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	26 DE EPTIEMBRE DE 2022
PORCENTAJE DE EJECUCION:	45%
ESTADO DEL CONVENIO:	EN EJECUCION:


El convenio se encuentra actualmente en ejecución con un porcentaje del 45%, dentro de las actividades que se vienen adelantando se encuentra la instalación de Los sistemas tales como equipos de SONIDO, ILUMINACIÓN, VESTIMENTA TEATRAL, SISTEMA DE TRAMOYA MOTORIZADO, Y SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE GRADERÍAS COMPLEMENTARIOS, los cuales serán implementados en el Teatrino de la escuela municipal de artes (EMA) ubicado en el Edificio de apoyo del Teatro, cuya zona a la fecha se encuentra con el piso y aislamiento acústico terminado y en instalación de tratamiento acústico.

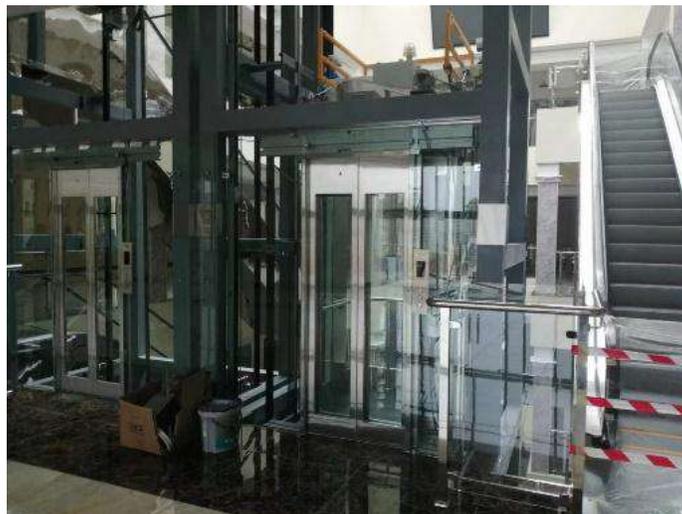

INSTALACION DE ASCENSOR PANORAMICO



ACONDICIONAMIENTO DE GRADERIAS

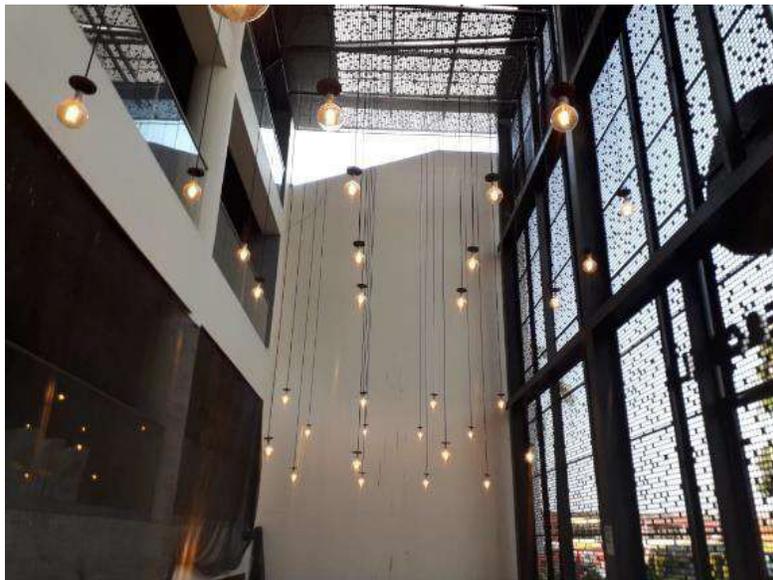

ILUMINACION LOBBY

8. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 151 DE FECHA 19 de julio 2021 “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. Grupo1” - PARQUE LA CONCORDIA

VALOR INICIAL	:	\$ 3.393.956.372,00
VALOR ANTICIPOS	:	No tiene anticipo por solicitud del contratista.
VALOR ADICIONAL 1	:	\$ 497.709.712,00
VALOR ADICIONAL 2	:	\$ 0,00
PLAZO INICIAL	:	7 meses
PLAZO ADICIONAL	:	30 días
PLAZO ADICIONAL 2	:	22 días
FECHA DE INICIO	:	09 de agosto 2021
NUEVA FECHA DE TERM.	:	30 de abril de 2022
% EJECUCION	:	100%
ESTADO DEL CONTRATO	:	EN RECIBO FINAL

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en proceso de recibo final.

REGISTRO FOTOGRAFICO – PARQUE LA CONCORDIA



9. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 156 DE FECHA 19 de julio 2021 “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. Grupo2” - PARQUE SOLON WILCHES

VALOR INICIAL	:	\$ 1.954.205.083,00
VALOR ANTICIPOS	:	\$ 586.261.524,90
VALOR ADICIONAL 1	:	\$ 112.574.515,00
VALOR ADICIONAL 2	:	\$ 0,00
PLAZO INICIAL	:	4 meses y 15 días.
PLAZO ADICIONAL	:	2 MESES.
PLAZO ADICIONAL 2	:	8 DIAS.

FECHA DE INICIO : 19 de agosto 2021
 NUEVA FECHA DE TERM. : 24 de abril 2022
 % EJECUCION : 100%
 ESTADO DEL CONTRATO : EN RECIBO FINAL

ESTADO DEL CONTRATO: ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en proceso de recibo final.

REGISTRO FOTOGRAFICO – PARQUE SOLON WILCHES



10. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 152 DE FECHA 19 de julio 2021
“ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. Grupo 3” - ESPACIO PUBLICO LAS AMERICAS

VALOR INICIAL : \$ 1.267.985.719,00
 VALOR ANTICIPOS : \$ 380.395.715,70
 VALOR ADICIONAL 1 : \$ 109.752.727,63
 VALOR ADICIONAL 2 : \$ 0,00
 PLAZO INICIAL : 4 meses y 15 días.
 PLAZO ADICIONAL : 2 meses
 FECHA DE INICIO : 27 de agosto 2021
 NUEVA FECHA DE TERM. : 27 junio de 2022
 % EJECUCION : 79%
 ESTADO DEL CONTRATO : EN TERMINACIÓN DE ACTIVIDADES Y RECIBO FINAL

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en terminación de actividades y recibo final.

REGISTRO FOTOGRAFICO –ESPACIO PUBLICO LAS AMERICAS



**11. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 165 DE FECHA 03 de agosto 2021
“ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIO PÚBLICO DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. Grupo 4” –PARQUE LOS HEROES**

VALOR INICIAL	:	\$ 1.662.960.260,00
VALOR ANTICIPOS	:	\$ 498.888.078,00
VALOR ADICIONAL 1	:	\$ 0,00
VALOR ADICIONAL 2	:	\$ 0,00
PLAZO INICIAL	:	4 meses y 15 días.
PLAZO ADICIONAL	:	2 meses
FECHA DE INICIO	:	26 de agosto 2021
NUEVA FECHA DE TERM.	:	23 abril de 2022
% EJECUCION	:	100%
ESTADO DEL CONTRATO	:	EN RECIBO FINAL

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en proceso de recibo final.




12. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 153 DE FECHA 19 de julio 2021 “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. Grupo 5” –PARQUE LOS PERIODISTAS

VALOR INICIAL	:	\$ 2.617.340.169,00
VALOR ANTICIPOS	:	\$ 785.202.050,7
VALOR ADICIONAL 1	:	\$ 173.824.999
VALOR ADICIONAL 2	:	\$ 0,00

PLAZO INICIAL : 6 meses
PLAZO ADICIONAL : 1 mes
FECHA DE INICIO : 09 de agosto 2021
NUEVA FECHA DE TERM. : 08 de marzo 2022
% EJECUCION : 100%
ESTADO DEL CONTRATO : EN LIQUIDACIÓN

ESTADO DEL CONTRATO: Al contrato ya se le realizo recibo final, está en proceso de liquidación del contrato.

REGISTRO FOTOGRAFICO –PARQUE LOS PERIODISTAS

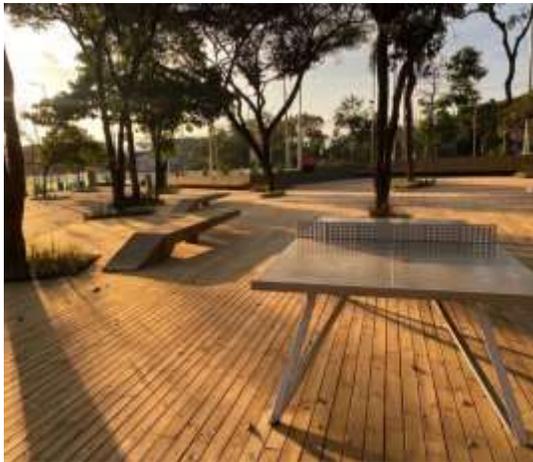

**13. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 248 DE FECHA 30 de septiembre 2021
 “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. Grupo 7” - PARQUE MONTERREDONDO**

VALOR INICIAL	:	\$ 2.252.831.768,00
VALOR ANTICIPOS	:	\$ 675.849.529,28
VALOR ADICIONAL 1	:	\$ 0,00
VALOR ADICIONAL 2	:	\$ 0,00
PLAZO INICIAL	:	6 meses
PLAZO ADICIONAL	:	0
FECHA DE INICIO	:	22 de noviembre 2021
NUEVA FECHA DE TERM.	:	21 de mayo de 2022
% EJECUCION	:	57%
ESTADO DEL CONTRATO	:	SUSPENDIDO.

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato presenta un avance del 57%, el presente contrato interviene el parque Monte redondo, e incluye la intervención de los siguientes componentes: Parque los Monte redondo, juegos infantiles, componente eléctrico, componente vegetal, zonas de instancia, senderos, espacio público, restauración monumento, etc; se está en proceso sancionatorio por parte de la interventoría al contratista, debido al gran porcentaje de atraso presentado en los componente eléctrico, red sanitaria, canales de concreto, trabajos en caseta de baños, etc.

REGISTRO FOTOGRAFICO – PARQUE MONTERREDONDO





14. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 154 DE FECHA 19 de julio 2021 “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. Grupo 6” - PARQUE BRUNO BATELLO

VALOR INICIAL	:	\$ 1.647.837.707,00
VALOR ANTICIPOS	:	\$ 494.351.312,10
VALOR ADICIONAL 1	:	\$ 96.526.825,00
VALOR ADICIONAL 2	:	\$ 0,00
PLAZO INICIAL	:	4 meses y 15 días.
PLAZO ADICIONAL	:	2 meses
FECHA DE INICIO	:	18 de agosto 2021
NUEVA FECHA DE TERM.	:	15 de abril 2022
% EJECUCION	:	100%
ESTADO DEL CONTRATO	:	EN RECIBO FINAL

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en proceso de recibo final.

REGISTRO FOTOGRAFICO –PARQUE BRUNO BATELLO



15. CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. No. 266 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2021 OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" GRUPO 02 CASA GALAN

VALOR INICIAL	\$ 982.239.854,00
VALOR ADICIONAL 1	\$ 110.512.602,00
VALOR TOTAL	\$ 1.092.752.456,00
VALOR ANTICIPO	\$ 491.119.927,00
PLAZO INICIAL	2 MESES Y 15 DIAS
PRORROGA 01	2 MESES Y 15 DIAS
PRORROGA 02	4 DIAS
PRORROGA 03	30 DIAS
PLAZO TOTAL	4 MESES Y 64 DIAS (6 MESES Y 4 DIAS)
FECHA INICIO	03-11-2022
FECHA SUSPENSION N° 1	01-04-2022
FECHA REINICIO N° 1	06-04-2022
ULTIMA FECHA DE TERMINACION	06-05-2022
FECHA SUSPENSIÓN N° 2	06-05-2022
% FISICO DE EJECUCION	23,16 %
ESTADO DEL CONTRATO	SUSPENDIDO (En trámite adicional en valor y plazo)

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se desarrolló la suplementación de los elementos componentes contractuales de acorde lo definido en su diseño final y resueltas las dudas de detalles técnicos de la construcción que ha permitido estabilizar las fachadas del proyecto de tapia pisada y las cuales fueron adosadas a la estructura convencional de acorde al reforzamiento requerido, dando la recuperación de los espacios horizontales y verticales de la edificación encaminados a la función final que se ha proyectado, de igual forma se está adecuando de forma que el patrimonio cultural prevalezca por la connotación del proyecto mediante los parámetros a mejorar de la cubierta en desarrollo, actividades que se habían venido implementando y las cuales fueron suspendidas en su totalidad, por los trámites administrativos propios de los contratos para las adiciones requeridas.

FOTOGRAFÍAS

ABRIL 2022- ANTES	JUNIO 2022 - DESPUES
 <p><i>casa galan</i> Bucaramanga abr. 02,2022 06:43:32 a. m.</p>	 <p><i>Casa Galan</i> Bucaramanga may. 27,2022 06:00:56 p. m.</p>
EXTERIOR	
 <p><i>casa galan</i> Bucaramanga abr. 02,2022 06:43:41 a. m.</p>	 <p><i>casa galan</i> Bucaramanga may. 26,2022 06:58:34 a. m.</p>
VIGA CORONA REMATE	
 <p><i>casa galan</i> Bucaramanga abr. 02,2022 06:44:27 a. m.</p>	 <p><i>casa galan</i> Bucaramanga may. 26,2022 07:00:07 a. m.</p>
MURO LINDERO PARQUEADERO	



VIGA CORONA INTERIOR



PERFILES METALICOS MEZANINE



ACEROS VIGA CORONA



PERFILERIA ESCALERA



PERFILES METALICOS BAÑOS



EXTERIORES



ESTRUCTURA MADERA



CERCHAS DE LA CUBIERTA

16. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 332 DE 2021 “SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA GARANTIZAR LA COBERTURADELMÍNIMO VITAL DE AGUA A LOS SECTORES DE LOS CORREGIMI ENTOS 1, 2,3, EN VIRTUD DE LAS ACCIONES JUDICIALES EXISTENTES EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”.

VALOR FISCAL	:	\$ 134.096.188,80
PLAZO INICIAL	:	CUARENTA (40) DIAS
PLAZO ADICIONAL 1	:	CAMBIA PLAZO TOTAL SIETE (7) MESES
PLAZO ADICIONAL 2	:	CINCO MESES (05) VEINTICINCO (25) DIAS
FECHA DE INICIO	:	01 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN Inicial	:	10 DE ENERO DE 2022
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	:	DICIEMBRE 26 DE 2022
PORCENTAJE AVANCE	:	47,46%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en proceso de ejecución con un avance del 47,46%, suministrando agua potable a los sectores V. Pedregal sectores Porvenir y Los Cuadros, V. Los Santos Bajos, Chitota, Bonanza Campestre y Villa Carmelo.



17. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 444 DE 2021: “MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO KENNEDY A CARGO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”.

VALOR INICIAL	:	\$ 75.954.518,20
VALOR ADICIONAL	:	\$ 41.800.000,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	:	\$ 117.754.518,20
VALOR EJECUTADO	:	\$ 117.754.518,20
PLAZO INICIAL	:	1 MES
PLAZO ADICIONAL	:	1 MES Y 30 DIAS
PLAZO TOTAL	:	2 MESES Y 30 DIAS (3 MESES)
FECHA DE INICIO	:	17 DE FEBRERO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	:	29 DE ABRIL DE 2022
FECHA REINICIO	:	11 DE MAYO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	:	27 DE MAYO DE 2022

PORCENTAJE AVANCE : 100%
ESTADO ACTUAL : EJECUTADO, EN LIQUIDACIÓN

REGISTRO FOTOGRAFICO

ZONA 2 (CARNES Y PESCADOS) - ANTES



ZONA 2 (CARNES Y PESCADOS) – DESPUES



ZONA 2 LOCALES – ANTES



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga

**GOBERNAR
ES HACER**



ZONA 2 LOCALES – DESPUES



ZONA 4 (FRUTAS Y VERDURAS) – ANTES



ZONA 4 (FRUTAS Y VERDURAS) – DESPUES





ZONA 8 (EXTERIORES) – ANTES



ZONA 8 (EXTERIORES) – DESPUES

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

En este programa se continúa ejecutando los siguientes contratos:

1. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 82 DE 2021: “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER –GRUPO 1”.

VALOR FISCAL INICIAL	:	\$5.446.200.902,00
VALOR FISCAL ADICIONAL	:	\$2.722'466.897,00
VALOR FISCAL TOTAL	:	\$8.168'667.799,00
PLAZO INICIAL	:	OCHO (08) MESES
PLAZO ADICIONAL	:	CUATRO (04) MESES
PLAZO INICIAL + ADICIONAL	:	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIO	:	08 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	:	07 DE JUNIO DE 2022
PORCENTAJE AVANCE	:	99,99%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se terminó el día 07 de junio de 2022 y se encuentra en proceso de liquidación con un avance del 99,99%, e incluye la intervención de los siguientes barrios en las comunas 1,2,3 y 4 de la ciudad: LA JUVENTUD, OLAS BAJAS, LA UNIVERSIDAD, EL ROSAL, KENNEDY, MARIA PAZ, LA MUTUALIDAD, EL TEJAR.



miércoles, 27 de abril de 2022 9:35 a. m.
7° 8' 41" N - 73° 7' 49" W
1633 Calle 1
Bucaramanga
Santander

BARRIO LA JUVENTUD VIA ALTERNA I.E. DESPUES



Jueves, 9 de mayo de 2022 9:04 a. m.
7° 8' 41" N - 73° 7' 49" W

BARRIO LA JUVENTUD VIA ALTERNA I.E. ANTES



27 abr. 2022 1:56:30 p. m.
7° 0' 38" N - 73° 7' 52" W
1712 Calle 22 Norte
Bucaramanga
Santander

BARRIO OLAS BAJAS CALLE 21N # 17ª-20 DESPUES



18 may. 2022 2:23:25 p. m.
7° 0' 34" N - 73° 7' 57" W
1712 Calle 22 Norte
Bucaramanga
Santander

BARRIO OLAS BAJAS CALLE 21N # 17ª-20 ANTES



10 may. 2022 10:30:50 a. m.
7° 10' 38" N - 73° 8' 5" W
52N Calle 55
Bucaramanga
Santander

BARRIO EL ROSAL CALLE 55N ANTES



25 may. 2022 3:52:42 p. m.
7° 10' 38" N - 73° 8' 5" W
52N Calle TRANSV 23
Bucaramanga
Santander

BARRIO EL ROSAL CALLE 55N DESPUES



BARRIO EL TEJAR CARRERA 8 CON CALLE 19N ANTES



BARRIO EL TEJAR CARRERA 8 CON CALLE 19N DESPUES

2. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 81 DE 2021: “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER –GRUPO 2”.

VALOR FISCAL INICIAL	:	\$ 6.380.833.557,00
VALOR FISCAL ADICIONAL	:	\$ 3.190.416.745,00
VALOR FISCAL TOTAL	:	\$ 9.571.250.302,00
PLAZO INICIAL	:	OCHO (08) MESES
PLAZO ADICIONAL	:	CUATRO (04) MESES
PLAZO INICIAL + ADICIONAL	:	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIO	:	08 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	:	07 DE JUNIO DE 2022
PORCENTAJE AVANCE	:	99,98%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se terminó el día 07 de junio de 2022 y se encuentra en proceso de liquidación con un avance del 99,98%, e incluye la intervención de los siguientes barrios en las comunas 12, 13 y 14 de la ciudad: CABECERA DEL LLANO, EL PRADO, MORRORICO VIA BUCARAMANGA-CÚCUTA.



SECTOR MORRORICO TRAMO 2. SENALIZACION



SECTOR MORRORICO TRAMO 2. SENALIZACION



SECTOR MORRORICO TRAMO 2. SENALIZACION



SECTOR MORRORICO TRAMO 2. SENALIZACION



SECTOR MORRORICO TRAMO 2. SENALIZACION



SECTOR MORRORICO TRAMO 2. SENALIZACION



28/03/2022 7:29:48 a. m.
 7°7'27,8292"N -73°6'37,1502"W
 35-35 Calle 36
 Bucaramanga
BARRIO EL PRADO CALLE 36 ENTRE CRAS 35 Y 36 ANTES **BARRIO EL PRADO CALLE 36 ENTRE CRAS 35 Y 36 DESPUES**



19 may. 2022 2:55:16 p. m.
 7°7'10.32"N -73°6'33.396"W
 Bucaramanga
 CL 45 entre CR 35 Y 36
BARRIO CABECERA CALLE 45 CON CARRERA 36 ANTES **BARRIO CABECERA CALLE 45 CON CARRERA 36 DESPUES**

3. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 84 DE 2021: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"- GRUPO 3.

VALOR FISCAL INICIAL	:	\$ 5.716.002.371,00
VALOR FISCAL ADICIONAL	:	\$ 2.857.554.542,00
VALOR FISCAL TOTAL	:	\$ 8.573.556.913,00
PLAZO INICIAL	:	OCHO (08) MESES
PLAZO ADICIONAL	:	CUATRO (04) MESES
PLAZO INICIAL + ADICIONAL	:	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIO	:	08 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	:	07 DE JUNIO DE 2022
PORCENTAJE AVANCE	:	100%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en proceso de liquidación, con un avance del 100%, e incluye la intervención los siguientes barrios de las comunas 9,10,11,16 de la ciudad: SAN PEDRO, SAN LUIS, PROVENZA, VIVEROS DE PROVENZA, GRANJAS DE PROVENZA, ROCIO, LAS DELICIAS, LAGOS DEL CACIQUE, EL TEJAR.



BARRIO SAN PEDRO CALLE 73 CON CR 29 A – ANTES



BARRIO SAN PEDRO CALLE 73 CON CR 29 A - DESPUÉS



BARRIO SAN LUIS CRA 18 ENTRE AV 87 Y 88 – ANTES



BARRIO SAN LUIS CRA 18 ENTRE AV 87 Y 88 - DESPUÉS



GRANJAS DE PROVENZA CRA 21A CON TRANS 114 – ANTES



GRANJAS DE PROVENZA CRA 21A CON TRANS 114 - DESPUÉS



BARRIO LAGOS DEL CACIQUE CALLE 71 INTER CON CRA 55
- ANTES



BARRIO LAGOS DEL CACIQUE CALLE 71 INTER CON CRA 55
- DESPUÉS



AGUJETA DE PROVENZA CALL 105 CON CRA 26A - ANTES



AGUJETA DE PROVENZA CALLE 105 CON CRA 26A - DESPUÉS

4. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 268 DE 2021: “CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MALLA VIAL VEREDAL, VIABILIZADOS POR EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”. GRUPO 1

Contratista : BIOTECNOLOGIA COLOMBIA S.A.S
Interventor : SEIING S.A.S. BIC
Supervisor : WILSON MOTTA RODRIGUEZ
Valor inicial : \$ 570.088.681,00
Valor adicional : \$ 284.889.041,00
Plazo Inicial : Cuatro (04) meses
Fecha de Inicio : 17 de noviembre de 2021
Fecha de terminación : 14 de Abril de 2022


ESTADO : EN LIQUIDACION

PORCENTAJE AVANCE : 100%

Veredas Grupo 1

VEREDA	Placa huella (metros)	Alcantarilla (und)	Muro de Contención h=3*7 (und)	Muro de Contención h=3*9 (und)
VEREDA EL PABLON	140,00	3	1	1
VEREDA SAN PEDRO BAJO	120,00			
VEREDA SAN CAYETANO	140,00	1	1	
TOTAL GRUPO 2	400,00	4,00	2,00	1,00

PLACA HUELLA VEREDA EL PAULON

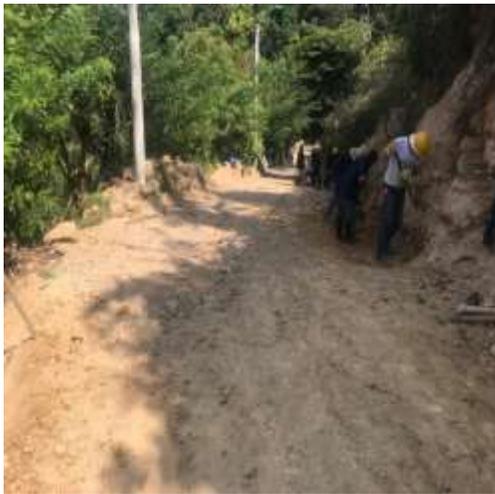

ANTES



DESPUES

PLACA HUELLA VEREDA SAN PEDRO



ANTES



DESPUES

PLACA HUELLA VEREDA SAN CAYETANO



ANTES



DESPUES

5. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 286 DE 2021: “CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MALLA VIAL VEREDAL, VIABILIZADOS POR EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”. GRUPO 2

Contratista : CONSORCIO VÍAS RURAL 1
Interventor : SEIING S.A.S. BIC
Supervisor : WILSON MOTTA RODRIGUEZ
Valor inicial : \$ 712.472.296,00
Valor adicional : \$356.153.322,00
Plazo Inicial : Cuatro (04) meses
Fecha de Inicio : 17 de noviembre de 2021
Fecha de terminación : 14 de Abril de 2022

ESTADO : **EN LIQUIDACION**

PORCENTAJE AVANCE : 100%

Veredas Grupo 2

VEREDA	Placa huella (metros)	Alcantarilla (und)	Muro de Contención h=3*7 (und)	Muro de Contención h=3*9 (und)
VEREDA MAGUEYES	120	1		
VEREDA LOS SANTOS	85			
VEREDA BOLARQUI	70			
VEREDA RETIRO GRANDE	100			
VEREDA 10 DE MAYO	80			
VEREDA GUALILO ALTO	90			
VEREDA MONSERRATE	70			
VEREDA BUENAVISTA	45			
TOTAL GRUPO 2	660.00	1.00	0.00	0.00

PLACA HUELLA VEREDA MAGUEYES



ANTES



DESPUES

PLACA HUELLA VEREDA BOLARQUI



ANTES



DESPUES

PLACA HUELLA VEREDA RETIRO GRANDE



ANTES



DESPUES

PLACA HUELLA VEREDA LOS SANTOS



ANTES



DESPUES

PLACA HUELLA VEREDA BUENA VISTA



ANTES



DESPUES

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”.

#	Descripción	Valor
LOTE 1	Motoniveladora Komatsu Modelo GD535-5 Empresa Komatsu Colombia SAS	\$1.005.970.000
LOTE 2	Retroexcavadora de llantas CASE 570ST Empresa Partequipos Maquinaria SAS.	\$ 406.700.000
LOTE 3	Vibro compactador autopropulsado de rodillos sencillo BOMAG BW177D-5. Empresa Komatsu Colombia SAS	\$ 395.920.000
LOTE 4	Minicargador y martillo hidráulico compatible CASE SR 175. Empresa Partequipos Maquinaria SAS	\$ 421.125.000

Después de la adjudicación efectuada se suscribieron los siguientes Contratos:

- 1. CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 58 de 29/03/2022:** “ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER” LOTE 2 RETROEXCAVADORA DE LLANTAS”.

VALOR FISCAL : \$ 406.700.000,00
VALOR ADICIONAL : \$ 0
PLAZO : CINCO (05) MESES, contados a partir de la fecha de inicio.

PLAZO ADICIONAL : N/A
FECHA DE INICIO :03 DE MAYO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN :02 DE OCTUBRE DE 2022
PORCENTAJE AVANCE :0%

ESTADO DEL CONTRATO: No se ha recibido la retroexcavadora de llantas.

2. CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 59 de 29/03/2022: “ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER” LOTE 4 MINICARGADOR”.

VALOR FISCAL : \$ 421.125.000,00
VALOR ADICIONAL : \$ 0
PLAZO : CINCO (05) MESES, contados a partir de la fecha de inicio.
PLAZO ADICIONAL : N/A
FECHA DE INICIO :03 DE MAYO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN :02 DE OCTUBRE DE 2022
PORCENTAJE AVANCE :0%

ESTADO DEL CONTRATO: No se han recibido los dos minicargadores y el martillo hidráulico compatible con minicargador.

3. CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 72 de 19/04/2022: “ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER” LOTE 3 VIBRO COMPACTADOR AUTOPROPULSADO DE RODILLO SENCILLO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA.

VALOR FISCAL : \$ 395.920.000,00
VALOR ADICIONAL : \$ 0
PLAZO : CINCO (05) MESES, contados a partir de la fecha de inicio.
PLAZO ADICIONAL : N/A
FECHA DE INICIO :02 DE MAYO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN :01 DE OCTUBRE DE 2022
PORCENTAJE AVANCE :100%

ESTADO DEL CONTRATO: El día viernes 1 de junio de 2022, en el lote del Municipio ubicado en la Calle 45 # 0 – 51 de Bucaramanga, se recibió el vibro compactador autopropulsado de rodillo sencillo Modelo BOMAG BW177D-5. El día viernes 1 de junio de 2022 dos señores operarios CPS al servicio de la Secretaría de Infraestructura recibieron, de técnicos de la empresa KOMATSU COLOMBIA SAS, las instrucciones de operación.



Vibro compactador autopropulsado de rodillo sencillo Modelo BOMAG BW177D-5

4. **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 73 de 19/04/2022:** “ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER” LOTE 1 MOTONIVELADORA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA.

VALOR FISCAL : \$ 1.005.970.000,00
VALOR ADICIONAL : \$ 0
PLAZO : CINCO (05) MESES, contados a partir de la fecha de inicio.
PLAZO ADICIONAL : N/A
FECHA DE INICIO : 02 DE MAYO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN : 01 DE OCTUBRE DE 2022
PORCENTAJE AVANCE : 100%

ESTADO DEL CONTRATO: El día martes 28 de mayo de 2022, en el lote del Municipio ubicado en la Calle 45 # 0 – 51 de Bucaramanga, se recibió la Motoniveladora Komatsu Modelo GD535-5. El día miércoles 29 de mayo de 2022, dos Operarios CPS al servicio de la Secretaría de Infraestructura recibieron de técnicos de la empresa KOMATSU COLOMBIA SAS las instrucciones de operación.



PROGRAMA: ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL

En este programa se encuentran los contratos adjudicados durante la vigencia 2021 y que se encuentran en ejecución, así como los contratos adjudicados durante el primer semestre de 2022 así:

1. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 17 DE 2022: “MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE LA LOMA, DEL PARQUE LOS SARRAPIOS Y DE LAS VIAS PEATONALES UBICADAS ENTRE LAS CALLES 42 A 54 Y LAS CARRERAS 33 A 42 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER- GRUPO 1 PARQUE LA LOMA”.

VALOR FISCAL	:	\$ 1.424.543.281,00
VALOR ADICIONAL	:	N/A
PLAZO	:	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL	:	N/A
FECHA DE INICIO	:	22 DE MARZO DEL 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	:	21 DE OCTUBRE DE 2022
PORCENTAJE AVANCE	:	14,05%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en ejecución.



PARQUE LA LOMA – apertura en tierra para instalación de banco de ductos



PARQUE LA LOMA – Instalación de banco de ductos

2. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 18 DE 2022: “MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE LA LOMA, DEL PARQUE LOS SARRAPIOS Y DE LAS VIAS PEATONALES UBICADAS ENTRE LAS CALLES 42 A 54 Y LAS CARRERAS 33 A 42 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER- GRUPO 2- PARQUE LOS SARRAPIOS”.

VALOR FISCAL : \$ 780.526.955,00
 VALOR ADICIONAL : N/A
 PLAZO : CINCO (05) MESES
 PLAZO ADICIONAL : N/A
 FECHA DE INICIO : 22 DE MARZO DEL 2022
 FECHA DE TERMINACIÓN : 21 DE AGOSTO DE 2022
 PORCENTAJE AVANCE : 23,82%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en ejecución

 <p>12 may. 2022 13:24:58 PARQUE SARRAPIOS INTERVENTORIA HCR</p>	 <p>21/6/2022 08:10:22 7°7'6.103"N - 73°6'27.991"W 2-9 Calle 46 Bucaramanga Santander</p>
<p><i>PARQUE LOS SARRAPIOS – retiro de lozas de senderos</i></p>	<p><i>PARQUE LOS SARRAPIOS – Construcción de caja de inspección</i></p>

3. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 19 DE 2022: “MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE LA LOMA, DEL PARQUE LOS SARRAPIOS Y DE LAS VIAS PEATONALES UBICADAS ENTRE LAS CALLES 42 A 54 Y LAS CARRERAS 33 A 42 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER -GRUPO 3- VÍAS PEATONALES UBICADAS ENTRE LAS CALLES 42 A 54 Y LAS CARRERAS 33 A 42”.

VALOR FISCAL : \$ 1106491282,00
 VALOR ADICIONAL : N/A
 PLAZO : CINCO (05) MESES
 PLAZO ADICIONAL : N/A
 FECHA DE INICIO : 22 DE MARZO DEL 2022
 FECHA DE TERMINACIÓN : 21 DE AGOSTO DE 2022
 PORCENTAJE AVANCE : 19,54%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en ejecución



CALLE 53 # 33-31 - Construcción de caja de inspección



CARRERA 48A CON CALLE 46 apertura en tierra para instalación de banco de ductos

Así mismo se continúa con la ejecución de los siguientes contratos:

4. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 148 DE 2021: "MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO 1".

VALOR FISCAL	:	\$ 453.296.052,00
VALOR ADICIONAL	:	\$ 226.648.025,91
PLAZO	:	SEIS (06) MESES
PLAZO ADICIONAL	:	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO	:	26 DE JULIO DEL 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	:	03 DE MAYO DE 2022
PORCENTAJE AVANCE	:	100%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra terminado

	
<p>Nivelación de luminaria – Mantenimiento de Alumbrado Publico</p>	<p>Tendido de red área – Mantenimiento de Alumbrado Publico</p>

5. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 149 DE 2021: “MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO 2”.

VALOR FISCAL	:	\$ 334.285.128,00
VALOR ADICIONAL	:	\$ 167.142.564,00
PLAZO	:	SEIS (06) MESES
PLAZO ADICIONAL	:	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO	:	26 DE JULIO DEL 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	:	03 DE MAYO DE 2022
PORCENTAJE AVANCE	:	100%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra terminado

	
<p>Cambio de luminaria bajo flujo luminoso – Mantenimiento de Alumbrado Publico</p>	<p>Cambio de fotocelda en falla – Mantenimiento de Alumbrado Publico</p>

6. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 150 DE 2021: “MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO 3”.

VALOR FISCAL	:	\$ 373.485.156,00
VALOR ADICIONAL	:	\$ 18.6742.578,00
PLAZO	:	SEIS (06) MESES
PLAZO ADICIONAL	:	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO	:	26 DE JULIO DEL 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	:	03 DE MAYO DE 2022
PORCENTAJE AVANCE	:	100%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra terminado

	
<p>Mantenimiento en tableros escenarios deportivos –Alumbrado Publico</p>	<p>Identificación de falla eléctrica (corto) – Mantenimiento de Alumbrado Publico</p>

7. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 200 DE 2021: “MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE SANTANDER DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO N-01”.

VALOR FISCAL : \$ 932.330.318,00
 VALOR ADICIONAL : \$ 426.041.800,32
 PLAZO : CINCO (05) MESES
 PLAZO ADICIONAL : TRES (03) MESES
 FECHA DE INICIO : 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
 FECHA DE TERMINACIÓN : 29 DE JUNIO DE 2022
 PORCENTAJE AVANCE : 99,80%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra terminado (Pendiente liquidación)



8. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 201 DE 2021: “MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE SANTANDER DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO N-02”.

VALOR FISCAL	:	\$ 394.660.423,00
VALOR ADICIONAL	:	\$ 48.778.443,92
PLAZO	:	CUATRO (04) MESES
PLAZO ADICIONAL	:	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO	:	08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	:	14 DE JULIO DE 2022
PORCENTAJE AVANCE	:	95,52%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra Suspendido

El proceso de certificación RETIE Y RETIALP requiere de un tiempo para realizar las visitas y mediciones de los niveles de iluminación y verificación de las instalaciones eléctricas tiempos que dependen de un externo o un tercero para entrega de la certificación.

El proceso de conexión y legalización del medidor ante el operador de red ESSA, se debe tener la certificación RETIE como documento exigido para los trámites de legalización. Por lo anterior, los tiempos de este proceso dependen exclusivamente de entes externos y ajenos a nosotros como contratistas.

	
<p>Parque Santander Calle 35 con Cra 20 – encendido de iluminación</p>	<p>Parque Santander Calle 35 con Cra 20 - verificación de circuitos y niveles de iluminación</p>

9. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 106 DE 2021: “CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL CORREDOR VIAL TRAMO 7 DESDE LA GLORIETA LA CEMENTO HASTA EL BARRIO COLORADOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.

VALOR FISCAL	:	\$ 1.583.057.253,00
VALOR ADICIONAL	:	N/A
PLAZO	:	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL	:	TREINTA Y SEIS (36) DIAS
FECHA DE INICIO	:	15 DE JUNIO DEL 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	:	17 DE JUNIO DE 2022
PORCENTAJE AVANCE	:	100%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra terminado (pendiente liquidación)



CORREDOR VIAL TRAMO 7 DESDE LA GLORIETA LA CEMENTO HASTA EL BARRIO COLORADOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA




CORREDOR VIAL TRAMO 7 DESDE LA GLORIETA LA CEMENTO HASTA EL BARRIO COLORADOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

10. CONTRATO DE COMISION No. 136 DE 2021: “DESARROLLAR LA PRIMERA FASE PARA LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PUNTOS DE GESTIÓN INTELIGENTE Y MEDIDAS PARA LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.

VALOR FISCAL	:	\$ 14.680.441.671,56
VALOR ADICIONAL	:	N/A
PLAZO	:	CINCO (05) MESES
PLAZO ADICIONAL 1	:	TRES (03) MESES
PLAZO ADICIONAL 2	:	CINCUENTA (50) DIAS
PLAZO ADICIONAL 3	:	TREINTA Y UNO (31) DIAS
FECHA DE INICIO	:	13 DE JULIO DEL 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	:	24 DE JUNIO DE 2022
PORCENTAJE AVANCE	:	100%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra terminado (se encuentra en etapa de revisión)

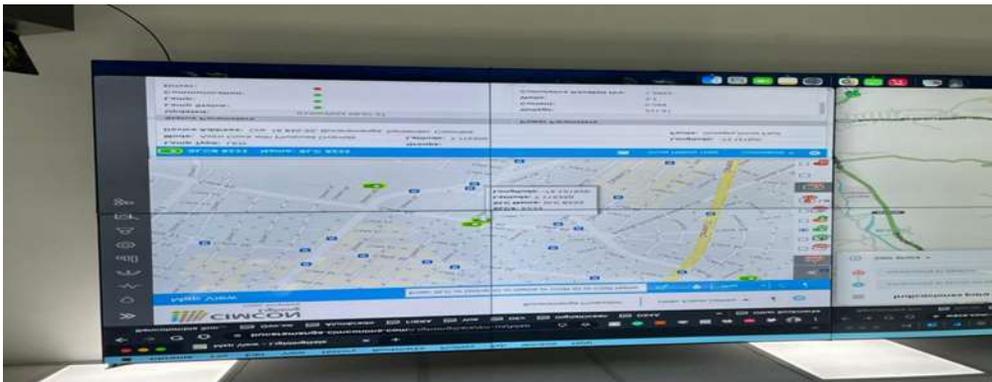

11. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 218 DE 2021: “MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. Grupo 1.”.

VALOR FISCAL	:	\$ 656.386.943,00
VALOR ADICIONAL	:	N/A
PLAZO	:	CUATRO (04) MESES
PLAZO ADICIONAL	:	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO	:	04 DE OCTUBRE DEL 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	:	06 DE JULIO DE 2022
PORCENTAJE AVANCE	:	83,99%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en Ejecución.

	
<p>TRF-AP-013 Calle 9 # 17-55 - Parque Cristo Rey.</p>	<p>TRF-AP-047 Calle 103 # 3 Sector La Antena- Cancha sintética porvenir</p>

12. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 219 DE 2021: “MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. Grupo 3.”.

VALOR FISCAL	:	\$ 893.418.828,00
VALOR ADICIONAL 1	:	\$ 269.596.198,31
VALOR ADICION 2	:	\$ 173.773.229,28
VALOR TOTAL	:	\$ 1.336.788.255,59
PLAZO	:	CUATRO (04) MESES

PLAZO ADICIONAL : TRES (03) MESES
 FECHA DE INICIO : 04 DE OCTUBRE DEL 2021
 FECHA DE TERMINACIÓN : 06 DE JULIO DE 2022
 PORCENTAJE AVANCE : 91,43%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en ejecución.



13. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 244 DE 2021: “MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. Grupo 2.”.

VALOR FISCAL : \$ 1.015.817.608,00
 VALOR ADICIONAL 1 : \$ 187.983.529,54
 VALOR ADICIONAL 2 : \$ 303.805.479,05
 VALOR TOTAL : \$ 1.507.606.616,59
 PLAZO : CUATRO (04) MESES
 PLAZO ADICIONAL : TRES (03) MESES
 FECHA DE INICIO : 04 DE OCTUBRE DEL 2021
 FECHA DE TERMINACIÓN : 06 DE JULIO DE 2022
 PORCENTAJE AVANCE : 88,11%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en ejecución

	
<p>Construcción de caja de inspección Cra. 17b Cl. 90 Cancha deportiva - Barrio San Luis</p>	<p>Mantenimiento tableros de CI 48 # 32 – 69. Cabecera del Llano.</p>

14. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 247 DE 2021: “ACTIVIDADES DE PODA PARA EL DESPEJE DE LUMINARIAS Y REDES QUE INTERFIEREN CON EL ALUMBRADO PÚBLICO Y TALA DE ÁRBOLES Y MANEJO INTEGRAL DEL COMPONENTE ARBÓREO EN EL ESPACIO PÚBLICO, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.

VALOR FISCAL	:	\$ 872.617.400,50
VALOR ADICIONAL	:	\$ 433.257.691,60
VALOR TOTAL	:	\$ 1.305.875.092,10
PLAZO	:	SEIS MESES (06) MESES Y (15) DÍAS
PLAZO ADICIONAL	:	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO	:	11 DE OCTUBRE DEL 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	:	25 DE JULIO DE 2022
PORCENTAJE AVANCE	:	91,20%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en ejecución.

	
<p>Actividad de despeje de red de alumbrado publico</p>	<p>Poda y tala de vegetación que obstaculiza flujo luminoso en luminaria</p>

15. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 303 DE 2021: “AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.”.

VALOR FISCAL	:	\$ 1.180.027.147,00
VALOR ADICIONAL	:	\$ 328.453.833,73
VALOR TOTAL	:	\$ 1.508.480.980,73
PLAZO	:	CUATRO (04) MESES
PLAZO ADICIONAL	:	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO	:	10 DE FEBRERO DEL 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	:	09 DE JUNIO DE 2021
NUEVA FECHA TERMINACION	:	09 DE AGOSTO DE 2021
FECHA SUSPENSION 1	:	24 DE JULIO DE 2021
FECHA REINICIO 1	:	23 DE AGOSTO DE 2021
FECHA SUSPENSION 2	:	:04 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA REINICIO 2	:	:03 DE JUNIO DE 2022
FECHA TERMINACION	:	:07 DE JUNIO DE 2022
PORCENTAJE AVANCE	:	100%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra terminado.

	
<p><i>VEREDA MAGUEYES – instalación de red eléctrica área</i></p>	<p><i>VEREDA CAPILLA ALTA – instalación de luminarias LED</i></p>

16. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 85 DE 2022: “MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO No 1”.

VALOR FISCAL	:	\$ 813.032.264,00
VALOR ADICIONAL	:	N/A
PLAZO	:	OCHO (08) MESES
PLAZO ADICIONAL	:	N/A
FECHA DE INICIO	:	13 DE MAYO DEL 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	:	12 DE ENERO DE 2023
PORCENTAJE AVANCE	:	24,35%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en **EJECUCIÓN**

	
<p>Cra 27 frente al parque Turbay – revisión y búsqueda de falla</p>	<p>Cra 27 frente al parque Turbay – instalación de cable o conductor eléctrico.</p>

17. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 86 DE 2022: “MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO No 2”.

VALOR FISCAL	:	\$ 538.567.888,00
VALOR ADICIONAL	:	N/A
PLAZO	:	OCHO (08) MESES
PLAZO ADICIONAL	:	N/A
FECHA DE INICIO	:	13 DE MAYO DEL 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	:	12 DE ENERO DE 2023
PORCENTAJE AVANCE	:	24,35%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en **EJECUCIÓN**

	
<p>La immaculada fase I – Cambio de fotocontrol</p>	<p>La immaculada fase II – Cambio de luminaria por bajo flujo luminoso</p>

18. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 87 DE 2022: “MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO No 3”.

VALOR FISCAL	:	\$ 741.517.944
VALOR ADICIONAL	:	N/A
PLAZO	:	OCHO (08) MESES
PLAZO ADICIONAL	:	N/A
FECHA DE INICIO	:	13 DE MAYO DEL 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	:	12 DE ENERO DE 2023
PORCENTAJE AVANCE	:	24,35%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en **EJECUCIÓN**.

	
<p>calle 105 con 22 - Provenza – Cambio de fusibles luminarias LED</p>	<p>Parque las Américas – Cambio de Drives</p>

**LINEA ESTRATEGICA 5. BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN:
INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES**

PROGRAMA: GOBIERNO FORTALECIDO PARA SER Y HACER

En este programa se encuentra todo el recurso humano que requiere la secretaria para el fortalecimiento a la ejecución de los procesos transversales, así como la planificación de las diferentes obras.

GASTOS DE INVERSION	PRIMER TRIMESTRE 2022
	VALOR
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 3.910.100.000,00
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	\$ 313.800.000,00
TOTAL GENERAL	\$ 4.223.900.000,00

**OTROS PROYECTOS CONTRATADOS Y QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION
POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.**

**1. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 355 DE 2021: “MEJORAMIENTO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE FUERTE NORTE
PERTENECIENTE AL DISTRITO I DE LA POLICIA METROPOLITANA DEL MUNICIPIO
DE BUCARAMANGA.**

Contratista	: WILLIAM RENE ARIZA MATEUS
Supervisor	: WILSON MOTTA RODRIGUEZ
Valor inicial	: \$ 615.821.308,00
Valor adicional	: \$ 196.811.537,16
Plazo Inicial	: Cuarenta y cinco (45) días
Plazo adicional No 1	: Treinta (30) días
Fecha de Inicio	: 6 de Diciembre de 2021
Fecha de suspensión	: 14 de Marzo de 2022
Fecha de Reinicio	: 16 de mayo de 2022
Fecha de terminación	: 05 de julio de 2022
PORCENTAJE AVANCE	: 85%

ESTADO DEL CONTRATO: en Ejecución



CAMBIO DE CUBIERTA DE BARRO ZONA CASONA- PINTURA- INSTALACIONES LECTRICAS



PINTURA DE MUROS Y CARPINTERIA DE MADERA



CONSTRUCCIÓN CUARTO DE BOMBAS



CUBIERTA SECTOR CABALLERIZAS – ACABDOS Y REDES ELECTRICAS

2. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 421 - 16/12/2021 “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA COMISARIA DE FAMILIA LA JOYA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 462.832.580,00
FECHA DE INICIO:	21 DE DICIEMBRE DE 2021
PLAZO INICIAL:	UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	04 DE FEBRERO DE 2022
SUSPENSION No 1:	26 de enero de 2021
AMPLIACION 1 A SUSPENSION No 1:	25 de febrero de 2022
REINICIO No 1:	17 de marzo de 2022
ADICIONAL EN PLAZO No 1:	24 de marzo de 2022
ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO No 2:	\$116.750.898.20
ADICIONAL EN PLAZO No 3:	24 de junio de 2022
PORCENTAJE DE EJECUCION:	95%
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	14 de julio de 2022
ESTADO DEL CONTRATO:	EN EJECUCION:

El contrato se encuentra en ejecución con un avance del 95%, dentro de las actividades que se están desarrollando esta la aplicación de mástico polimérico para nivelación de pisos, instalación de luminarias herméticas en baterías de baños, instalación de piso vinílico referencia granito e instalación de puertas metálicas segundo piso.



**APLICACIÓN DE MASTICO POLIMÉRICO DE
NIVELACIÓN**



**APLICACIÓN DE MASTICO POLIMÉRICO DE
NIVELACIÓN**



**APLICACIÓN DE MASTICO POLIMÉRICO DE
NIVELACIÓN**



**APLICACIÓN DE MASTICO POLIMÉRICO DE
NIVELACIÓN**



**APLICACIÓN DE MASTICO POLIMÉRICO DE
NIVELACIÓN**



**APLICACIÓN DE MASTICO POLIMÉRICO DE
NIVELACIÓN**



**Instalación luminarias hermeticas batería de
baños**




3. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 311 DE FECHA 10 de NOVIEMBRE de 2021: “MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO PREVENTIVO (CIP) PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.”

VALOR INICIAL:	\$ 734.243.079,69
VALOR ANTICIPOS:	\$ 142.272.923,91
PLAZO INICIAL:	1.5 MESES
FECHA DE INICIO:	25 de noviembre de 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	08 de enero de 2022
SUSPENSION No 1:	23 de diciembre de 2021
REINICIO No 1:	01 de febrero de 2022
SUSPENSION No 2:	16 de febrero de 2022
AMPLIACION 1 A SUSPENSION No 2:	17 de marzo de 2022
AMPLIACION 2 A SUSPENSION No 2:	02 de abril de 2022
AMPLIACION 3 A SUSPENSION No 2:	02 de mayo de 2022
REINICIO No 1 :	20 de mayo de 2022
ADICIONAL EN PLAZO No.1 :	20 de mayo de 2022
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	04 de agosto de 2022
% EJECUCION:	49%
ESTADO DEL CONTRATO :	EN EJECUCION:

El contrato se encuentra en ejecución con un avance del 49%, dentro de las actividades que se están desarrollando en los diferentes frentes de trabajo se encuentra: OBRA CIVIL: Armado de hierro para vigas de cimentación y para pantallas estructurales en baños del piso 2, armado de hierro para vigas de cimentación de muros divisorios baño 2, armado de red sanitaria en baño 2, armada de nueva red hidráulica en baño 2.

OBRA ELECTRICA: Terminación de tablero de control piso 2, instalación de cajas de distribución, cableado en carpintería, instalación de tuberías en oficinas, instalación de cableados en oficinas, instalación de lámparas en oficinas, instalación de accesorios en tubería Emt.

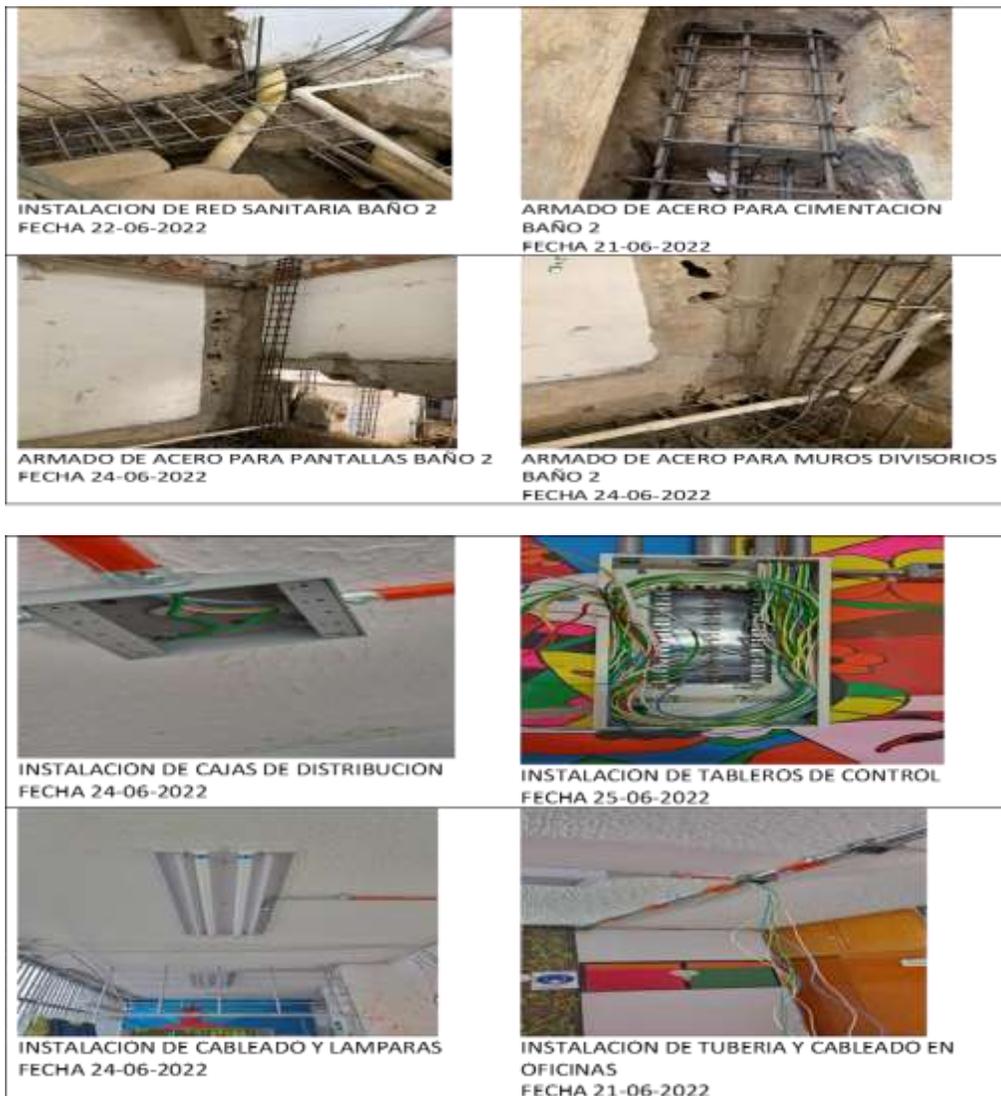

4. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 390 DE 2021: “ADECUACIÓN DE ESPACIO LOCATIVO PARA EL BIENESTAR DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN CAM FASE 1 DE LA ALCALDÍA DE BUCARAMANGA”.

VALOR FISCAL INICIAL : \$ 203.098.850,00

PLAZO INICIAL : Un mes (01) sin exceder la vigencia 2021 (12 días)
PLAZO ADICIONAL : 45 días calendario
PLAZO TOTAL : 57 días calendario
FECHA DE INICIO : 20 de diciembre de 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1 : 28 de diciembre de 2021
FECHA DE REINICIACIÓN N° 1 : 27 de enero de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2 : 16 de marzo de 2022
FECHA DE REINICIO No. 2 : 12 de mayo de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN : 27 de mayo de 2022
PORCENTAJE AVANCE : 100 %

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato está ejecutado en su totalidad. En estado de liquidación.

OBRA EJECUTADA EN FUNCIONAMIENTO



5. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 340 DE 2021: “MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ALOJAMIENTO DEL BATALLÓN DE INGENIEROS N° 5 CORONEL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.

VALOR FISCAL INICIAL	: \$ 622.169.227,00
VALOR ADICIONAL N°1	: \$ 163.509.428,00
VALOR TOTAL	: \$ 785.678.655,00
PLAZO INICIAL	: UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS
PLAZO ADICIONAL N°1	: UN (01) MES
PLAZO ADICIONAL N°2	: UN (01) MES
PLAZO ADICIONAL N°3	: DIEZ (10) DIAS
PLAZO TOTAL	: 3 MESES Y 25 DIAS
FECHA DE INICIO	: 29 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA SUSPENSIÓN N° 1	: 28 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA REINICIACIÓN N° 1	: 11 DE ENERO DE 2022
FECHA SUSPENSIÓN N° 2	: 22 DE FEBRERO DE 2022
FECHA REINICIACIÓN N° 2	: 18 DE MAYO DE 2022
ULTIMA FECHA DE TERMINACIÓN	: 30 DE JUNIO DE 2022
PORCENTAJE AVANCE	: 98 %

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato actualmente se encuentra en ejecución, faltando dos días para finalizar, se han ejecutado la totalidad de las actividades del Alojamiento Baraya, quedando pendiente a la fecha se tiene pendiente finalizar las actividades en el exterior de Canaleta en Concreto 3000 PSI Mezclado en Sitio Área Transversal de 625 a 1600 cm² y Contenedor de raíces longitudinal, rectangular o cuadrado en concreto de 3000 PSI mezclado en sitio, espesor 10 cm, Incluye malla electrosoldada y acero de refuerzo; esto debido a que no hemos recibido visita por parte de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), entidad que aprueba la ejecución de talas de especies.

En cuanto al contrato, presenta un avance del 98 %, reflejado en actividades como Cubierta metálica sin traslapo DESKA® Tipo DSS (STANDING SEAM), Cerramiento Anjeo perimetral en malla hexagonal, Cielo raso suspendido en PVC, Instalación de aparatos sanitarios (Sanitario tipo institucional según requerimiento ADA, Orinal uso institucional color blanco, Lavamanos de semipedestal, Ducha sencilla), Estuco plástico pared interior y/o exterior, Pintura vinilo tipo 1 pared interior sobre estuco, Pintura acrílica exterior pared, Pintura acrílica exterior alta resistencia sobre mampostería a la vista, Mantenimiento pulida y brillada de piso granito existente, Instalación de espejos biselados en baño y Carteleras informativas en vidrio templado para el exterior de cada alojamiento, adecuaciones eléctricas, Instalación de luminarias (PANEL tipo rectangular SLIM 40W 120X30cm, BALA led SLIM 22W, HERMETICA 40w TIPO MODULO, LED TIPO TORTUGA), Colocación de Guardaescobas en granito y tablón gress rojo, Cambio de vidrio transparente 4mm a ventanas existentes, Instalación de Cajones en Yeso Cartón para ductos de luz.



Cubierta metálica sin traslapo DESKA® Tipo DSS (STANDING SEAM)



Cerramiento Anjeo perimetral en malla hexagonal



Cielo raso suspendido en PVC

6. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 296 DE 2021: MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS EN EL RECINTO DEL CONCEJO Y EDIFICIO FASE II DE LA ALCALDIA DE BUCARAMANGA.

VALOR FISCAL INICIAL : \$ 62.005.569,00
PLAZO INICIAL : 1 MES
PLAZO ADICIONAL N° 1 : 20 DIAS
PLAZO TOTAL : 1 MES Y 20 DIAS
FECHA DE INICIO : 30 - 11 - 2021
FECHA SUSPENSIÓN N° 1 : 23 - 12 - 2021
FECHA REINICIACIÓN N° 1 : 11 - 01 - 2022
FECHA SUSPENSIÓN N° 2 : 25 - 02 - 2022
FECHA REINICIACION N°2: 26 - 05 - 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 17 - 06 - 2022

PORCENTAJE AVANCE : 100%

ESTADO DEL CONTRATO: Ejecutado. En Recibo final y liquidación

REGISTRO FOTOGRAFICO.

1. Impermeabilización del piso bajo la franja de circulación peatonal que da por la calle 34 (prevenir filtraciones al interior de oficinas del concejo).



2. Limpieza de foso profundo junto a salón de plenarias (zona exterior).



ANTES



DESPUES

3. Instalación de Malla Aérea con varilla 3/8" con malla tipo gallinero en alambre de alta resistencia.



ANTES



DESPUES

6. CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 265 DE 2021, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA.

VALOR INICIAL	\$ 636.173.700,00
VALOR ANTICIPO	\$ 318.086.850,00
PLAZO INICIAL	2 MESES Y 15 DIAS
PLAZO ADICIONAL N° 1	14 DÍAS
PLAZO ADICIONAL N° 2	42 DIAS
PLAZO ADICIONAL N° 3	15 DIAS
PLAZO TOTAL	2 MESES Y 86 DIAS (4 MESES Y 26 DIAS)
FECHA DE INICIO	03-11-2021

FECHA SUSPENSIÓN N° 1	28-01-2022
FECHA REINICIACIÓN N° 1	16-02-2022
ULTIMA FECHA DE TERMINACIÓN	16-04-2022
% EJECUCION	93,16%
FECHA SUSPENSIÓN N° 2	06-04-2022
ESTADO DEL CONTRATO	SUSPENDIDO (En trámite adicional en valor y plazo)

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

El contrato se encuentra en un gran porcentaje desarrollado, del cual se generaron nuevos espacios arquitectónicos de acuerdo a la funcionabilidad, lo que ha generado nuevas actividades para complementar lo desarrollado, en las zonas de Atención al Usuario, Atención a víctimas, Dependencia de Antinarcóticos, Unidad de Reacción Inmediata, Área de Reseñas, Área de Balística, y Celdas de Paso, ya entregados y en funcionamiento.

A la fecha de presentación del presente informe (junio 30 de 2022), el plazo de ejecución del contrato se encuentra en suspensión, hasta tanto se celebre y legalice un nuevo adicional en valor y plazo.

REGISTRO FOTOGRAFICO






NARCÓTICOS



BAÑOS ACCESO



URI

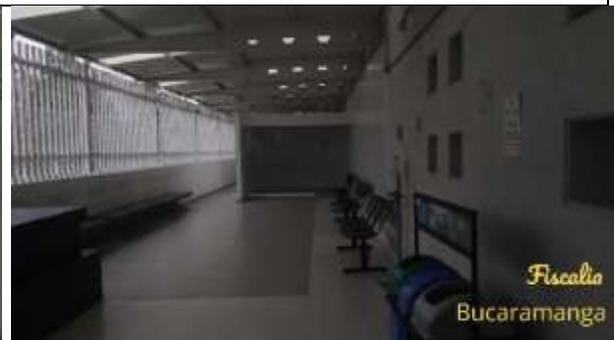

URI



EXTERIOR URI



CELDAS DE PASO



CELDAS DE PASO

CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 2020-2023

La Secretaria de Infraestructura realiza el seguimiento y monitoreo a las metas programadas para la vigencia 2022, para el primer trimestre presentan el siguiente avance

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA

PROGRAMA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES

INDICADOR	META Programada 2022	Meta Ejecutada 2022	AVANCE	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADO
Mantener el 100% de los parques, zonas verdes y su mobiliario.	100%	100%	100%	\$ 5.277.790.676,00	\$ 5.540.376.407,00

PROGRAMA: EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

INDICADOR	META Programada 2022	Meta Ejecutada 2022	AVANCE	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADO
Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad construido y/o mejorado.	40.000	84.651	100%	\$ 135.226.622.256,00	\$ 61.067.955.946,00

PROGRAMA: ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL

INDICADOR	META Programada 2022	Meta Ejecutada 2022	AVANCE	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADO
Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados.	1	1	100%	\$ 33.387.641.459,00	\$ 4.630.164.640,00

INDICADOR	META Programada 2022	Meta Ejecutada 2022	AVANCE	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADO
Porcentaje de luminarias operativas en funcionamiento.	100%	100%	100%	\$ 25.448.151.566,00	\$ 11.765.066.506,00

**LINEA ESTRATEGICA 5. BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN:
INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES**

PROGRAMA: GOBIERNO FORTALECIDO PARA SER Y HACER

INDICADOR	META Programada 2022	Meta Ejecutada 2022	AVANCE	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADO
Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos.	100%	100%	100%	\$ 19.284.070.224,00	\$ 8.133.290.040,00

ANEXO

- PRESUPUESTOS EJECUTADOS (Ejecución presupuestal)
- INFORMES DE INTERVENTORIA (Contratos terminados y en ejecución)
- GASTO (Relación personal)
- GASTOS (Relación de Inversión)

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

NIT - 890201222

INFORME DE EJECUCION CONSOLIDADO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

A 30 DE JUNIO DEL 2022

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES				TOTAL DISPONIBILIDADES	TOTAL COMPROMISOS		TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	% Ejecucion	
		Presupuesto Inicial	Adicion	Credito	Contracredito	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos del Mes	Compromisos Acumulados	Pagos del Mes	Pagos Acumulados					
		\$ 1,00				3 = 1 + 2	\$ 5,00	\$ 7,00	\$ 9,00	\$ 9,00					10 = 3 - 5
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA														
	INVERSION INFRAESTRUCTURA														
	GASTOS														
	INVERSION														
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS														
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS														
	ACTIVOS FIJOS														
	MAQUINARIA Y EQUIPO														
	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES														
	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS														
	TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL VIA TERCARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO														
RUBRO	VIA TERCARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO MAQUINAS APISONADORAS Y APLANADORAS DE CAMINOS (COMPACTADORAS), AUTOPROPULSADAS														
2.3.2.01.01 .003.02.08. 2402112.4 4424.273	TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL VIA TERCARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO 273	\$ -	\$ 3.000.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000.000,00	\$ 2.229.715.000,00	\$ -	\$ 2.229.715.000,00	\$ -	\$ -	\$ 770.285.000,00	\$ -	\$ 2.229.715.000,00	74,32
	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS														
	ADQUISICION DE SERVICIOS														
	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION														
	PLAZA DE MERCADOS ADECUADAS														
	PLAZA DE MERCADOS ADECUADAS														
RUBRO	EDIFICACIONES COMERCIALES														
.005.17090 78.53122.2 01	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACION PLAZA DE MERCADO ADECUADAS 201	\$ -	\$ -	\$ 41.800.000,00	\$ -	\$ 41.800.000,00	\$ 41.800.000,00	\$ -	\$ 41.800.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41.800.000,00	100
2.3.2.02.02 .005.17090 78.53122.5 73	AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACION PLAZA DE MERCADO ADECUADAS RECURSOS DEL CREDITO VIGENCIA ANTERIOR 573	\$ -	\$ 11.559.999.899,67	\$ -	\$ -	\$ 11.559.999.899,67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.559.999.899,67	\$ -	\$ -	0
	EDUCACION CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION INICIAL, PRESCOLAR, BSICA Y MEDIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA														
RUBRO	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA ESPACIO PUBLICO ADECUADO														
2.3.2.02.02 .005.22010 52.53129.2 01	EDUCACION CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION INICIAL, PRESCOLAR, BSICA Y MEDIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA 201	\$ -	\$ -	\$ 3.742.454.344,00	\$ -	\$ 3.742.454.344,00	\$ 3.742.454.344,00	\$ -	\$ 3.742.454.344,00	\$ -	\$ 1.000.573.105,20	\$ -	\$ -	\$ 2.741.881.238,80	100
2.3.2.02.02 .005.22010 52.53129.5 01	EDUCACION CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION INICIAL, PRESCOLAR, BASICA Y MEDIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA 501	\$ -	\$ 4.000.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
	TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL PLACA HUELLA CONSTRUIDA														
RUBRO	TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL PLACA HUELLA CONSTRUIDA CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES														
2.3.2.02.02 .005.24020 42.53211.2 89	TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL PLACA HUELLA CONSTRUIDA 289	\$ -	\$ -	\$ 1.800.000.000,00	\$ -	\$ 1.800.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.800.000.000,00	\$ -	\$ -	0

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES					TOTAL DISPONIBILIDADES	TOTAL COMPROMISOS		TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	% Ejecucion
		Presupuesto Inicial	Adicion	Credito	Contracredito	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos del Mes	Compromisos Acumulados	Pagos del Mes	Pagos Acumulados				
2.3.2.02.02.005.24020.42.53211.573	TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL PLACA HUELLA CONSTRUIDA RECURSOS DEL CREDITO VIGENCIA ANTERIOR 573	\$ 1,00				3 = 1 + 2	\$ 5,00		\$ 7,00		\$ 9,00	10 = 3 - 5	11 = 5 - 7	12 = 7 - 9	13 = 7 / 3
RUBRO	PLACA HUELLA CONSTRUIDA SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS), CALLES	\$ -	\$ 5.100.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 5.100.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.100.000.000,00	\$ -	\$ -	0
2.3.2.02.02.005.24020.42.54211.201	TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL PLACA HUELLA CONSTRUIDA 201	\$ -	\$ -	\$ 825.420.368,00	\$ -	\$ 825.420.368,00	\$ 825.420.368,00	\$ -	\$ 825.420.368,00	\$ -	\$ 640.981.593,75	\$ -	\$ -	\$ 184.438.774,25	100
RUBRO	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO DE LA RED VIAL REGIONAL SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS), CALLES														
2.3.2.02.02.005.24021.07.54211.201	TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO DE LA RED VIAL REGIONAL 201	\$ -	\$ -	\$ 376.248.010,00	\$ -	\$ 376.248.010,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 376.248.010,00	\$ -	\$ -	0
RUBRO	VIA URBANA CONSTRUIDA VIA URBANA CONSTRUIDA CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES														
2.3.2.02.02.005.24021.13.53211.530	TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL VIA URBANA CONSTRUIDA 530	\$ -	\$ 4.981.378.944,41	\$ -	\$ -	\$ 4.981.378.944,41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.981.378.944,41	\$ -	\$ -	0
RUBRO	TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL VIA URBANA MEJORADA VIA URBANA MEJORADA CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES														
2.3.2.02.02.005.24021.14.53211.201	TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL VIA URBANA MEJORADA 201	\$ -	\$ -	\$ 33.505.500.206,11	\$ -	\$ 33.505.500.206,11	\$ 33.505.500.206,11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.505.500.206,11	\$ -	0
2.3.2.02.02.005.24021.14.53211.289	TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL VIA URBANA MEJORADA 289	\$ -	\$ -	\$ 1.479.000.000,00	\$ -	\$ 1.479.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.479.000.000,00	\$ -	\$ -	0
2.3.2.02.02.005.24021.14.53211.573	TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL VIA URBANA MEJORADA RECURSOS DEL CREDITO VIGENCIA ANTERIOR 573	\$ -	\$ 8.545.803.608,78	\$ -	\$ -	\$ 8.545.803.608,78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.545.803.608,78	\$ -	\$ -	0
2.3.2.02.02.005.24021.14.53211.604	TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL VIA URBANA MEJORADA 604	\$ -	\$ 248.171.667,00	\$ -	\$ -	\$ 248.171.667,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 248.171.667,00	\$ -	\$ -	0
RUBRO	VIA URBANA MEJORADA SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS), CALLES														
2.3.2.02.02.005.24021.14.54211.201	TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL VIA URBANA MEJORADA 201	\$ -	\$ -	\$ 1.178.167.596,00	\$ 107.905.225,58	\$ 1.070.262.370,42	\$ 856.943.752,00	\$ -	\$ 856.943.752,00	\$ 133.490.688,00	\$ 617.028.302,82	\$ 213.318.618,42	\$ -	\$ 239.915.449,18	80,06
RUBRO	PUENTE PEATONAL CON MANTENIMIENTO PUENTE PEATONAL CON MANTENIMIENTO PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS														
2.3.2.02.02.005.24021.20.53221.201	TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL PUENTE PEATONAL CON MANTENIMIENTO 201	\$ -	\$ -	\$ 435.593.566,48	\$ -	\$ 435.593.566,48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 435.593.566,48	\$ -	\$ -	0

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES				Presupuesto Definitivo 3 = 1 + 2	TOTAL DISPONIBILIDADES	TOTAL COMPROMISOS		TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible 10 = 3 - 5	Saldo Por Ejecutar 11 = 5 - 7	Saldo Por Pagar 12 = 7 - 9	% Ejecucion 13 = 7 / 3
		Presupuesto Inicial \$ 1,00	Adicion	Credito	Contracredito		Disponibilidades Acumuladas \$ 5,00	Compromisos del Mes	Compromisos Acumulados \$ 7,00	Pagos del Mes	Pagos Acumulados \$ 9,00				
2.3.2.02.02 .005.24021 20.53221.2 89	TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL PUENTE PEATONAL CON MANTENIMIENTO 289	\$ -	\$ -	\$ 365.999.563,52	\$ -	\$ 365.999.563,52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 365.999.563,52	\$ -	\$ -	0	
	TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL ANDEN DE LA RED URBANA REHABILITADO														
	ANDEN DE LA RED URBANA REHABILITADO CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES														
RUBRO															
2.3.2.02.02 .005.24021 27.53211.2 01	TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL ANDEN DE LA RED URBANA REHABILITADO 201	\$ -	\$ -	\$ 617.022.563,00	\$ -	\$ 617.022.563,00	\$ 617.022.562,00	\$ -	\$ 617.022.562,00	\$ -	\$ 209.835.768,10	\$ 1,00	\$ -	\$ 407.186.793,90	99,99
	ANDEN DE LA RED URBANA REHABILITADO SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERA (EXCEPTO CARRETERA ELEVADAS), CALLE														
RUBRO															
2.3.2.02.02 .005.24021 27.54211.2 89	TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL ANDN DE LA RED URBANA REHABILITADO 289	\$ -	\$ -	\$ 3.787.390.794,48	\$ -	\$ 3.787.390.794,48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.787.390.794,48	\$ -	\$ -	0	
	TRANSPORTE SEGURIDAD DE TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA SEGURIDAD VIAL														
	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA SEGURIDAD VIAL CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES														
RUBRO															
2.3.2.02.02 .005.24090 13.53211.2 01	TRANSPORTE SEGURIDAD DE TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA SEGURIDAD VIAL 201	\$ -	\$ -	\$ 2.711.049.762,98	\$ -	\$ 2.711.049.762,98	\$ 2.711.049.762,98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.711.049.762,98	\$ -	0
	TRANSPORTE SEGURIDAD DE TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA SEGURIDAD VIAL 501														
RUBRO															
2.3.2.02.02 .005.24090 13.53211.5 01	TRANSPORTE SEGURIDAD DE TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA SEGURIDAD VIAL 501	\$ -	\$ 1.000.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000.000,00	\$ -	\$ -	0	
	TRANSPORTE SEGURIDAD DE TRANSPORTE PUENTES PEATONALES REHABILITADOS														
	PUENTES PEATONALES REHABILITADOS SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS														
RUBRO															
2.3.2.02.02 .005.24090 42.54221.2 01	TRANSPORTE SEGURIDAD DE TRANSPORTE PUENTES PEATONALES REHABILITADOS 201	\$ -	\$ -	\$ 14.989.761,60	\$ -	\$ 14.989.761,60	\$ 14.989.761,60	\$ -	\$ 14.989.761,60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.989.761,60	100
	OBRAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE MOVIMIENTOS EN MASA														
RUBRO	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL														
2.3.2.02.02 .005.32050 18.53290.2 89	AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL OBRAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE MOVIMIENTOS EN MASA 289	\$ -	\$ -	\$ 7.500.000.000,00	\$ -	\$ 7.500.000.000,00	\$ 7.500.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.500.000.000,00	\$ -	0
	AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL OBRAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE MOVIMIENTOS EN MASA 501														
RUBRO															
2.3.2.02.02 .005.32050 18.53290.5 01	AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL OBRAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE MOVIMIENTOS EN MASA 501	\$ -	\$ -	\$ 15.225.605.454,00	\$ -	\$ 15.225.605.454,00	\$ 15.081.373.496,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 144.231.958,00	\$ 15.081.373.496,00	\$ -	\$ -	0
	AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL OBRAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE MOVIMIENTOS EN MASA 588														
RUBRO															
2.3.2.02.02 .005.32050 18.53290.5 88	AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL OBRAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE MOVIMIENTOS EN MASA 588	\$ -	\$ -	\$ 2.274.394.546,00	\$ -	\$ 2.274.394.546,00	\$ 2.274.394.546,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.274.394.546,00	\$ -	0
	TEATROS ADECUADOS														
	TEATROS ADECUADOS OTROS														
RUBRO	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES														
2.3.2.02.02 .005.33010 38.53129.5 01	CULTURA PROMOCION Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTISTICOS TEATROS ADECUADOS 501	\$ -	\$ 1.300.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 1.300.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.300.000.000,00	\$ -	\$ -	0	

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES				TOTAL	TOTAL COMPROMISOS		TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	% Ejecucion		
		Presupuesto Inicial	Adicion	Credito	Contracredito	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades	Compromisos del Mes	Compromisos Acumulados	Pagos del Mes					Pagos Acumulados	
							Acumuladas									
		\$ 1,00				\$ 5,00		\$ 7,00		\$ 9,00	10 = 3 - 5	11 = 5 - 7	12 = 7 - 9	13 = 7 / 3		
	CENTROS COMUNITARIOS ADECUADOS															
RUBRO	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO															
2.3.2.02.02 .005.41030 27.54270.2 01	INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION SOCIAL Y PRODUCTIVA PARA LA POBLACION EN SITUACION DE VULNERABILIDAD CENTROS COMUNITARIOS ADECUADOS 201	\$ -	\$ -	\$ 363.841.868,50	\$ -	\$ 363.841.868,50	\$ 363.841.868,00	\$ 15.432.990,00	\$ 363.841.868,00	\$ -	\$ 22.434.910,00	\$ 0,50	\$ -	\$ 341.406.958,00	99,99	
	CENTROS DE PROTECCION SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR CONSTRUIDOS Y DOTADOS															
RUBRO	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES															
2.3.2.02.02 .005.41040 01.53129.5 01	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO PARA EL RESPETO Y GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS. SALON COMUNAL ADECUADO 501	\$ -	\$ 2.989.447.501,00	\$ -	\$ -	\$ 2.989.447.501,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.989.447.501,00	\$ -	\$ -	\$ -	0	
	DEPORTE Y RECREACION FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA															
RUBRO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO															
2.3.2.02.02 .005.43010 04.53270.5 01	DEPORTE Y RECREACION FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 501	\$ -	\$ 13.853.202.280,00	\$ -	\$ -	\$ 13.853.202.280,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.853.202.280,00	\$ -	\$ -	\$ -	0	
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO															
2.3.2.02.02 .005.43010 04.54270.2 01	DEPORTE Y RECREACION FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 201	\$ 13.993.681.541,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.993.681.541,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	
2.3.2.02.02 .005.43010 04.54270.2 67	DEPORTE Y RECREACION FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 267	\$ 121.402.771,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121.402.771,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	
2.3.2.02.02 .005.43010 04.54270.2 73	DEPORTE Y RECREACION FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RECURSOS DEL CREDITO 273	\$ -	\$ 20.142.555.459,17	\$ -	\$ -	\$ 20.142.555.459,17	\$ 18.863.443.557,00	\$ -	\$ 18.863.443.557,00	\$ 294.926.444,75	\$ 5.561.542.471,43	\$ 1.279.111.902,17	\$ -	\$ 13.301.901.085,57	93,64	
	DEPORTE Y RECREACION FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS															
RUBRO	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO															
2.3.2.02.02 .005.43010 11.54270.2 01	DEPORTE Y RECREACION FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS 201	\$ 3.075.758.113,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 874.518.572,77	\$ 2.201.239.540,23	\$ 2.068.738.566,23	\$ 1.474.191.422,00	\$ 1.474.191.422,00	\$ -	\$ -	\$ 132.500.974,00	\$ 594.547.144,23	\$ 1.474.191.422,00	66,97
2.3.2.02.02 .005.43010 11.54270.2 13	DEPORTE Y RECREACION FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS 213	\$ 8.118.317.887,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.118.317.887,00	\$ 8.118.317.887,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.118.317.887,00	\$ -	\$ -	0

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES				TOTAL DISPONIBILIDADES	TOTAL COMPROMISOS		TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	% Ejecucion	
		Presupuesto Inicial	Adicion	Credito	Contracredito	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos del Mes	Compromisos Acumulados	Pagos del Mes					Pagos Acumulados
2.3.2.02.02.006.24080.04.64114.201	TRANSPORTE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS ESPACIOS DEDICADOS A LA INTERMODALIDAD 201	\$ -	\$ -	\$ 350.000.000,00	\$ -	\$ 350.000.000,00	\$ 350.000.000,00	\$ -	\$ 350.000.000,00	\$ -	\$ 350.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	100
2.3.2.02.02.006.24080.04.64114.501	TRANSPORTE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS ESPACIOS DEDICADOS A LA INTERMODALIDAD 501	\$ -	\$ 805.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 805.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 805.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	0
	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION														
	TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LA RED VIAL REGIONAL														
	ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LA RED VIAL REGIONAL SERVICIOS DE PLANEACION URBANA														
RUBRO															
2.3.2.02.02.008.24021.18.83221.201	TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LA RED VIAL REGIONAL 201	\$ 100.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 100.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
	ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LA RED VIAL REGIONAL SERVICIOS DE ARQUITECTURA PAISAJISTA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION														
RUBRO															
2.3.2.02.02.008.24021.18.83232.230	TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LA RED VIAL REGIONAL 230	\$ 3.092.386.065,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.092.386.065,00	\$ 2.068.329.918,50	\$ -	\$ 2.068.329.918,50	\$ -	\$ -	\$ 1.024.056.146,50	\$ -	\$ 2.068.329.918,50	66,88
2.3.2.02.02.008.24021.18.83232.255	TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LA RED VIAL REGIONAL 255	\$ 72.081.145,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 72.081.145,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 72.081.145,00	\$ -	\$ -	0
	ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LA RED VIAL REGIONAL SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE TRANSPORTE														
RUBRO															
2.3.2.02.02.008.24021.18.83232.201	TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LA RED VIAL REGIONAL 201	\$ -	\$ -	\$ 317.316.266,00	\$ -	\$ 317.316.266,00	\$ 233.416.266,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83.900.000,00	\$ 233.416.266,00	\$ -	0
	ESTUDIOS DE PREINVERSION ESTUDIOS DE PREINVERSION SERVICIOS DE PLANEACION URBANA														
RUBRO															
2.3.2.02.02.008.32020.44.83221.201	AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS ESTUDIOS DE PREINVERSION 201	\$ -	\$ -	\$ 46.947.229,00	\$ -	\$ 46.947.229,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46.947.229,00	\$ -	\$ -	0
2.3.2.02.02.008.32020.44.83221.267	AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS ESTUDIOS DE PREINVERSION 267	\$ -	\$ -	\$ 121.402.771,00	\$ -	\$ 121.402.771,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121.402.771,00	\$ -	\$ -	0
	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO ZONAS VERDES MANTENIDAS														
	ZONAS VERDES MANTENIDAS OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.														
RUBRO															
2.3.2.02.02.008.40020.26.83990.201	ZONAS VERDES MANTENIDAS 201	\$ -	\$ -	\$ 92.000.000,00	\$ -	\$ 92.000.000,00	\$ 49.000.000,00	\$ -	\$ 49.000.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ 37.800.000,00	\$ 43.000.000,00	\$ -	\$ 11.200.000,00	53,26
	ZONAS VERDES MANTENIDAS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE														
RUBRO															
2.3.2.02.02.008.40020.26.85970.201	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO ZONAS VERDES MANTENIDAS 201	\$ 3.500.000.000,00	\$ -	\$ 185.460.092,60	\$ 331.486.029,48	\$ 3.353.974.063,12	\$ 3.352.476.407,07	\$ -	\$ 3.352.476.407,07	\$ 185.266.793,89	\$ 252.471.377,57	\$ 1.497.656,05	\$ -	\$ 3.100.005.029,50	99,95
2.3.2.02.02.008.40020.26.85970.501	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO ZONAS VERDES MANTENIDAS 501	\$ -	\$ 1.592.330.583,00	\$ -	\$ -	\$ 1.592.330.583,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.592.330.583,00	\$ -	\$ -	0
	ZONAS VERDES MANTENIDAS OTROS SERVICIOS DE APOYO N.C.P.														
RUBRO															
2.3.2.02.02.008.40020.26.85999.201	ZONAS VERDES MANTENIDAS 201	\$ -	\$ -	\$ 239.486.029,48	\$ -	\$ 239.486.029,48	\$ 138.900.000,00	\$ -	\$ 138.900.000,00	\$ 25.700.000,00	\$ 107.940.000,00	\$ 100.586.029,48	\$ -	\$ 30.960.000,00	57,99

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES				Presupuesto Definitivo 3 = 1 + 2	TOTAL DISPONIBILIDADES	TOTAL COMPROMISOS		TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible 10 = 3 - 5	Saldo Por Ejecutar 11 = 5 - 7	Saldo Por Pagar 12 = 7 - 9	% Ejecucion 13 = 7 / 3
		Presupuesto Inicial	Adicion	Credito	Contracredito		Disponibilidades Acumuladas	Compromisos del Mes	Compromisos Acumulados	Pagos del Mes	Pagos Acumulados				
		\$					\$	\$	\$	\$	\$				
	ESTUDIOS DE PREINVERSION E INVERSION	1,00				5,00		7,00		9,00					
RUBRO	ESTUDIOS DE PREINVERSION E INVERSION SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE TRATAMIENTO DE AGUA, DRENAJE Y ALCANTARRILLADO														
2.3.2.02.02 .008.40030 42.83327.2 01	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO ESTUDIOS DE PRE INVERSION E INVERSION 201	\$ -	\$ -	\$ 620.339.602,78	\$ -	\$ 620.339.602,78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 620.339.602,78	\$ -	\$ -	0	
2.3.2.02.02 .008.40030 42.83327.5 01	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO ESTUDIOS DE PRE INVERSION E INVERSION 501	\$ -	\$ 331.796.814,80	\$ -	\$ -	\$ 331.796.814,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 331.796.814,80	\$ -	\$ -	0	
RUBRO	PARQUE RECREATIVOS ADECUADOS PARQUE RECREATIVOS ADECUADOS OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.														
2.3.2.02.02 .008.43010 11.83990.2 01	PARQUE RECREATIVOS ADECUADOS 201	\$ -	\$ -	\$ 48.600.000,00	\$ -	\$ 48.600.000,00	\$ 48.600.000,00	\$ -	\$ 48.600.000,00	\$ 8.100.000,00	\$ 33.480.000,00	\$ -	\$ -	100	
2.3.2.02.02 .008.43010 11.83990.5 01	DEPORTE Y RECREACION FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS 501	\$ -	\$ 36.450.000,00	\$ -	\$ -	\$ 36.450.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36.450.000,00	\$ -	\$ -	0	
RUBRO	PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS OTROS SERVICIOS DE APOYO NCP														
2.3.2.02.02 .008.43010 11.85999.2 01	PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS 201	\$ -	\$ -	\$ 79.200.000,00	\$ -	\$ 79.200.000,00	\$ 75.300.000,00	\$ -	\$ 75.300.000,00	\$ 12.550.000,00	\$ 51.400.000,00	\$ 3.900.000,00	\$ -	\$ 23.900.000,00	95,07
2.3.2.02.02 .008.43010 11.85999.5 01	DEPORTE Y RECREACION FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS 501	\$ -	\$ 56.365.000,00	\$ -	\$ -	\$ 56.365.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56.365.000,00	\$ -	\$ -	0	
RUBRO	ESTUDIOS DE PREINVERSION ESTUDIOS DE PREINVERSION SERVICIOS DE ASESORIA EN INGENIERIA														
2.3.2.02.02 .008.45990 06.83310.2 01	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL ESTUDIOS DE PREINVERSION 201	\$ -	\$ -	\$ 100.000.000,00	\$ -	\$ 100.000.000,00	\$ 99.762.706,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 237.294,00	\$ 99.762.706,00	\$ -	0
RUBRO	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO														
2.3.2.02.02 .008.45990 31.82120.2 01	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 402.800.000,00	\$ -	\$ 13.283.333,00	\$ -	\$ 416.083.333,00	\$ 264.000.000,00	\$ -	\$ 264.000.000,00	\$ 44.000.000,00	\$ 193.833.332,00	\$ 152.083.333,00	\$ -	\$ 64.666.668,00	63,44
2.3.2.02.02 .008.45990 31.82120.5 01	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ -	\$ 113.516.667,00	\$ -	\$ -	\$ 113.516.667,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 113.516.667,00	\$ -	\$ -	0	
RUBRO	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES														
2.3.2.02.02 .008.45990 31.83213.2 01	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 1.386.050.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.386.050.000,00	\$ 1.204.200.000,00	\$ -	\$ 1.204.200.000,00	\$ 182.700.000,00	\$ 855.130.002,00	\$ 181.850.000,00	\$ -	\$ 316.569.998,00	86,87
2.3.2.02.02 .008.45990 31.83213.5 01	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ -	\$ 791.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 791.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 791.500.000,00	\$ -	\$ -	0	

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES				TOTAL DISPONIBILIDADES	TOTAL COMPROMISOS		TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	% Ejecucion	
		Presupuesto Inicial	Adicion	Credito	Contracredito	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos del Mes	Compromisos Acumulados	Pagos del Mes					Pagos Acumulados
2.3.2.02.01 .003.45990 16.389110 2.226	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 226	\$ -	\$ -	\$ 37.699,20	\$ -	\$ 37.699,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.699,20	\$ -	\$ -	0	
RUBRO	SEDES MANTENIDAS MARCADORES DE FILTRO Y SIMILARES														
2.3.2.02.01 .003.45990 16.389110 4.226	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 226	\$ -	\$ -	\$ 79.718,10	\$ -	\$ 79.718,10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79.718,10	\$ -	\$ -	0	
RUBRO	SEDES MANTENIDAS LAPICES														
2.3.2.02.01 .003.45990 16.389110 6.226	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 226	\$ -	\$ -	\$ 12.959,10	\$ -	\$ 12.959,10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.959,10	\$ -	\$ -	0	
RUBRO	SEDES MANTENIDAS ALMOHADILLAS PARA SELLOS														
2.3.2.02.01 .003.45990 16.389120 7.226	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 226	\$ -	\$ -	\$ 14.399,00	\$ -	\$ 14.399,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.399,00	\$ -	\$ -	0	
	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE														
	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS														
RUBRO	SEDES MANTENIDAS NAVAJAS Y CORTAPLUMAS														
2.3.2.02.01 .004.45990 16.429130 4.226	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS	\$ -	\$ -	\$ 38.199,00	\$ -	\$ 38.199,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38.199,00	\$ -	\$ -	0	
RUBRO	SEDES MANTENIDAS TIJERAS PARA ARTES Y OFICIOS														
2.3.2.02.01 .004.45990 16.429130 5.226	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 226	\$ -	\$ -	\$ 21.598,50	\$ -	\$ 21.598,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.598,50	\$ -	\$ -	0	
RUBRO	SEDES MANTENIDAS GRAPAS METALICAS N.C.P.														
2.3.2.02.01 .004.45990 16.429449 9.226	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 226	\$ -	\$ -	\$ 27.489,00	\$ -	\$ 27.489,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.489,00	\$ -	\$ -	0	
RUBRO	SEDES MANTENIDAS CLIPS														
2.3.2.02.01 .004.45990 16.429950 2.226	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 226	\$ -	\$ -	\$ 24.871,00	\$ -	\$ 24.871,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.871,00	\$ -	\$ -	0	
RUBRO	SEDES MANTENIDAS ARNESES O CINTURONES DE SEGURIDAD														
2.3.2.02.01 .004.45990 16.429994 2.226	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 226	\$ 6.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.500.000,00	\$ -	\$ -	0	
RUBRO	SEDES MANTENIDAS APARATOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE Y CALEFACCION														
2.3.2.02.01 .004.45990 16.439120 1.526	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 526	\$ -	\$ 15.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 15.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.000.000,00	\$ -	\$ -	0	
RUBRO	SEDES MANTENIDAS TAJALAPICES DE MESA														
2.3.2.02.01 .004.45990 16.451600 1.226	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 226	\$ -	\$ -	\$ 11.900,00	\$ -	\$ 11.900,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.900,00	\$ -	\$ -	0	
RUBRO	SEDES MANTENIDAS ENGRAPADORAS PARA OFICINA														
2.3.2.02.01 .004.45990 16.451600 3.226	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 226	\$ -	\$ -	\$ 156.949,10	\$ -	\$ 156.949,10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 156.949,10	\$ -	\$ -	0	

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES				Presupuesto Definitivo 3 = 1 + 2	TOTAL	TOTAL COMPROMISOS		TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible 10 = 3 - 5	Saldo Por Ejecutar 11 = 5 - 7	Saldo Por Pagar 12 = 7 - 9	% Ejecucion 13 = 7 / 3
		Presupuesto Inicial \$ 1,00	Adicion	Credito	Contracredito		Disponibilidades Acumuladas \$ 5,00	Compromisos del Mes	Compromisos Acumulados \$ 7,00	Pagos del Mes	Pagos Acumulados \$ 9,00				
	SERVICIO DE ALOJAMIENTO, SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIO DE TRANSPORTE Y SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA.														
	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS														
	SEDES MANTENIDAS SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD (POR CUENTA PROPIA)														
RUBRO	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 226	\$ 11.000.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 1.795.192.169,38	\$ 9.204.807.830,62	\$ 4.823.744.157,00	\$ -	\$ 4.823.744.157,00	\$ -	\$ 4.823.744.157,00	\$ 4.381.063.673,62	\$ -	\$ -	52,4
	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 253	\$ 25.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.000.000,00	\$ 21.940.652,00	\$ -	\$ 21.940.652,00	\$ -	\$ 21.940.652,00	\$ 3.059.348,00	\$ -	\$ -	87,76
	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 526	\$ -	\$ 1.718.977.953,03	\$ -	\$ -	\$ 1.718.977.953,03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.718.977.953,03	\$ -	\$ -	0
	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING														
	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS														
	SEDES MANTENIDAS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES NO RESIDENCIALES (DIFERENTES A VIVIENDA) A COMISION O POR CONTRATO														
RUBRO	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 253	\$ 195.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 95.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ 91.075.566,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.924.434,00	\$ 91.075.566,00	\$ -	0
	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION														
	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS														
	SEDES MANTENIDAS SERVICIOS DE CONSULTORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA														
RUBRO	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 226	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -	0
	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 526	\$ -	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ -	0
	SEDES MANTENIDAS SERVICIOS DE SOPORTE EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (TI)														
RUBRO	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 226	\$ 233.607.460,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 233.607.460,00	\$ 233.607.460,00	\$ -	\$ 233.607.460,00	\$ -	\$ 77.869.153,33	\$ -	\$ -	\$ 155.738.306,67	100
	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 253	\$ -	\$ -	\$ 25.073.612,00	\$ -	\$ 25.073.612,00	\$ 25.023.612,00	\$ 25.023.612,00	\$ 25.023.612,00	\$ -	\$ -	\$ 50.000,00	\$ -	\$ 25.023.612,00	99,8
	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 526	\$ -	\$ 194.672.883,33	\$ -	\$ -	\$ 194.672.883,33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 194.672.883,33	\$ -	\$ -	0

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES				TOTAL DISPONIBILIDADES	TOTAL COMPROMISOS		TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	% Ejecucion	
		Presupuesto Inicial	Adicion	Credito	Contracredito	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos del Mes	Compromisos Acumulados	Pagos del Mes					Pagos Acumulados
RUBRO	SEDES MANTENIDAS SERVICIOS DE TELEFONIA FUA (ACCESO)														
2.3.2.02.02 .008.45990 16.84120.2 53	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 253	\$ 85.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85.000.000,00	\$ 43.394.513,25	\$ 10.220.917,00	\$ 43.394.513,25	\$ 10.220.917,00	\$ 43.394.513,25	\$ 41.605.486,75	\$ -	\$ -	51,05
2.3.2.02.02 .008.45990 16.84120.5 26	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 526	\$ -	\$ 25.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 25.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.000.000,00	\$ -	\$ -	0
RUBRO	SEDES MANTENIDAS SERVICIOS DE PROTECCION (GUARDAS DE SEGURIDAD)														
2.3.2.02.02 .008.45990 16.85250.2 26	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 226	\$ 580.000.000,00	\$ -	\$ 701.255.130,40	\$ -	\$ 1.281.255.130,40	\$ 1.259.693.705,00	\$ -	\$ 1.259.693.705,00	\$ -	\$ -	\$ 21.561.425,40	\$ -	\$ 1.259.693.705,00	98,31
2.3.2.02.02 .008.45990 16.85250.5 26	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 526	\$ -	\$ 420.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 420.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 420.000.000,00	\$ -	\$ -	0
RUBRO	SEDES MANTENIDAS SERVICIOS DE DESINFECCION Y EXTERMINACION														
2.3.2.02.02 .008.45990 16.85310.2 26	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 226	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -	0
RUBRO	SEDES MANTENIDAS SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL														
2.3.2.02.02 .008.45990 16.85330.2 26	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 226	\$ 24.600.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.600.000,00	\$ 19.176.824,00	\$ -	\$ 19.176.824,00	\$ -	\$ -	\$ 5.423.176,00	\$ -	\$ 19.176.824,00	77,95
2.3.2.02.02 .008.45990 16.85330.5 26	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 526	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ -	\$ -	0
RUBRO	SEDES MANTENIDAS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE														
2.3.2.02.02 .008.45990 16.85970.2 26	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 226	\$ 1.494.785.759,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.494.785.759,00	\$ 1.494.748.480,91	\$ -	\$ 349.325.143,24	\$ 102.432.838,31	\$ 102.432.838,31	\$ 37.278,09	\$ 1.145.423.337,67	\$ 246.892.304,93	23,36
2.3.2.02.02 .008.45990 16.85970.5 26	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 526	\$ -	\$ 516.819.092,36	\$ -	\$ -	\$ 516.819.092,36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 516.819.092,36	\$ -	\$ -	0
RUBRO	SEDES MANTENIDAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS N.C.P.														
2.3.2.02.02 .008.45990 16.871109 9.226	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 226	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ -	0
2.3.2.02.02 .008.45990 16.871109 9.526	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 526	\$ -	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ -	0
RUBRO	SEDES MANTENIDAS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORES Y EQUIPOS PERIFERICOS.														
2.3.2.02.02 .008.45990 16.87130.2 26	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 226	\$ 10.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ -	\$ 10.000.000,00	\$ -	\$ 10.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	100
2.3.2.02.02 .008.45990 16.87130.2 53	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 253	\$ -	\$ -	\$ 3.263.264,00	\$ -	\$ 3.263.264,00	\$ 3.263.264,00	\$ -	\$ 3.263.264,00	\$ -	\$ 1.601.154,16	\$ -	\$ -	\$ 1.662.109,84	100

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES				Presupuesto Definitivo 3 = 1 + 2	TOTAL DISPONIBILIDADES	TOTAL COMPROMISOS		TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible 10 = 3 - 5	Saldo Por Ejecutar 11 = 5 - 7	Saldo Por Pagar 12 = 7 - 9	% Ejecucion 13 = 7 / 3
		Presupuesto Inicial	Adicion	Credito	Contracredito		Disponibilidades Acumuladas	Compromisos del Mes	Compromisos Acumulados	Pagos del Mes	Pagos Acumulados				
							\$	\$	\$	\$	\$				
	TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL ANDEN DE LA RED URBANA REHABILITADO	\$ 1,00				\$ 5,00		\$ 7,00		\$ 9,00					
	ANDEN DE LA RED URBANA REHABILITADO SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS), CALLES														
RUBRO															
2.3.2.02.02.005.24021.27.54211.232	TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL ANDEN DE LA RED URBANA REHABILITADO 232	\$ 280.854.381,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 280.854.381,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 280.854.381,00	\$ -	\$ -	0	
2.3.2.02.02.005.24021.27.54211.282	TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL ANDEN DE LA RED URBANA REHABILITADO 282	\$ 1.083.712.056,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.083.712.056,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.083.712.056,00	\$ -	\$ -	0	
2.3.2.02.02.005.24021.27.54211.582	TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL ANDEN DE LA RED URBANA REHABILITADO 582	\$ -	\$ 1.960.833.127,33	\$ -	\$ -	\$ 1.960.833.127,33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.960.833.127,33	\$ -	\$ -	0	
	ESPACIO PUBLICO ADECUADO														
RUBRO	ESPACIO PUBLICO ADECUADO EDIFICIOS COMERCIALES														
2.3.2.02.02.005.40020.20.53122.533	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO ESPACIO PUBLICO ADECUADO 533	\$ -	\$ 3.368.183.568,00	\$ -	\$ -	\$ 3.368.183.568,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.368.183.568,00	\$ -	\$ -	0	
	FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA GASTOS					\$ 6.693.583.132,33									
	INVERSION														
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS														
	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS														
	ADQUISICION DE SERVICIOS														
	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES														
	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS														
RUBRO	SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS														
2.3.2.02.02.009.40030.47.91123.200	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 200	\$ 270.698.077,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 270.698.077,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 270.698.077,00	\$ -	\$ -	0	
2.3.2.02.02.009.40030.47.91123.201	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 201	\$ 4.137.320.506,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.137.320.506,00	\$ 728.398.089,00	\$ 246.977.416,00	\$ 728.398.089,00	\$ 246.977.416,00	\$ 3.408.922.417,00	\$ -	\$ -	17,6	
2.3.2.02.02.009.40030.47.91123.215	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	\$ 6.392.312.960,00	\$ 307.560.498,00	\$ -	\$ -	\$ 6.699.873.458,00	\$ 3.180.991.951,00	\$ 532.955.568,00	\$ 3.180.991.951,00	\$ 532.955.568,00	\$ 3.518.881.507,00	\$ -	\$ -	47,47	
2.3.2.02.02.009.40030.47.91123.260	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 260	\$ 852.861,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 852.861,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 852.861,00	\$ -	\$ -	0	

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES				TOTAL	TOTAL COMPROMISOS		TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	% Ejecucion	
		Presupuesto Inicial	Adicion	Credito	Contracredito	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades	Compromisos del Mes	Compromisos Acumulados	Pagos del Mes					Pagos Acumulados
							Acumuladas								
		\$ 1,00				\$ 5,00		\$ 7,00		\$ 9,00	10 = 3 - 5	11 = 5 - 7	12 = 7 - 9	13 = 7 / 3	
2.3.2.02.02 .009.40030 47.91123.2 68	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 268	\$ 24.911.725,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.911.725,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.911.725,00	\$ -	\$ -	0	
2.3.2.02.02 .009.40030 47.91123.5 15	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 515	\$ -	\$ 308.121.846,36	\$ -	\$ -	\$ 308.121.846,36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 308.121.846,36	\$ -	\$ -	0	
2.3.2.02.02 .009.40030 47.91123.5 28	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 528	\$ -	\$ 39.150.083,96	\$ -	\$ -	\$ 39.150.083,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39.150.083,96	\$ -	\$ -	0	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PASIVOS EXIGIBLES														
	GASTOS					\$ 11.480.928.557,32		\$ 3.909.390.040,00		\$ 3.909.390.040,00					
	INVERSION														
	DISMINUCION DE PASIVOS														
	FINANCIACION DE DEFICIT PASIVOS														
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS														
	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO														
RUBRO	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES														
2.3.7.06.02 .4599002.5 3129.616	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 616	\$ -	\$ 266.733.201,66	\$ -	\$ -	\$ 266.733.201,66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 266.733.201,66	\$ -	\$ -	0	
RUBRO	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES														
2.3.7.06.02 .4599002.5 3211.601	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601	\$ -	\$ 1.842.838.994,32	\$ -	\$ -	\$ 1.842.838.994,32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.842.838.994,32	\$ -	\$ -	0	
2.3.7.06.02 .4599002.5 3211.630	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 630	\$ -	\$ 116.816.300,00	\$ -	\$ -	\$ 116.816.300,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 116.816.300,00	\$ -	\$ -	0	
RUBRO	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES														
2.3.7.06.02 .4599002.5 4129.601	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601	\$ -	\$ 736.279.272,46	\$ -	\$ -	\$ 736.279.272,46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 736.279.272,46	\$ -	\$ -	0	
RUBRO	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES														
2.3.7.06.02 .4599002.5 4211.601	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601	\$ -	\$ 20.599.615,77	\$ -	\$ -	\$ 20.599.615,77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.599.615,77	\$ -	\$ -	0	
RUBRO	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO														
2.3.7.06.02 .4599002.5 4270.601	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601	\$ -	\$ 1.743.233.510,45	\$ -	\$ -	\$ 1.743.233.510,45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.743.233.510,45	\$ -	\$ -	0	

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES					TOTAL DISPONIBILIDADES	TOTAL COMPROMISOS		TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	% Ejecucion
		Presupuesto Inicial	Adicion	Credito	Contracredito	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos del Mes	Compromisos Acumulados	Pagos del Mes	Pagos Acumulados				
2.3.7.06.02 .4599002.5 4270.613	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 613	\$ 1,00				\$ 3 = 1 + 2	\$ 5,00		\$ 7,00		\$ 9,00	10 = 3 - 5	11 = 5 - 7	12 = 7 - 9	13 = 7 / 3
	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO SERVICIOS DE ASESORIA EN ARQUITECTURA	\$ -	\$ 443.032.993,25	\$ -	\$ -	\$ 443.032.993,25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 443.032.993,25	\$ -	\$ -	0
RUBRO															
2.3.7.06.02 .4599002.8 3211.601	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601	\$ -	\$ 370.830.776,00	\$ -	\$ -	\$ 370.830.776,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 370.830.776,00	\$ -	\$ -	0
RUBRO	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA														
2.3.7.06.02 .4599002.8 4222.601	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601	\$ -	\$ 346.307.169,00	\$ -	\$ -	\$ 346.307.169,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 346.307.169,00	\$ -	\$ -	0
RUBRO	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS														
2.3.7.06.02 .4599002.9 1123.626	GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 626	\$ -	\$ 1.449.870.483,85	\$ -	\$ -	\$ 1.449.870.483,85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.449.870.483,85	\$ -	\$ -	0
	TOTAL INFORME SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 122.793.759.821,00	\$ 193.136.999.421,45	\$ 82.402.731.328,56	\$ 58.993.696.301,71	\$ 339.339.794.269,30	\$ 172.891.548.203,35	\$ 2.329.801.925,00	\$ 95.885.854.906,70	\$ 3.027.673.355,77	\$ 30.923.260.737,65	\$ 166.448.246.065,95	\$ 77.005.693.296,65	\$ 64.776.834.169,05	28,2565902

RELACION COMPROMISOS (01 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Objeto
3780	05/04/2022 15:43	66	JUAN CARLOS RESTREPO GUTIERREZ	2638	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.622.405.105,00	2.3.2.02.02.008.4002026.85 970.201 - VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO ZONAS VERDES MANTENIDAS 201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ZONAS VERDES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
3781	05/04/2022 15:47	104	CONSORCIO DAMASO ZAPATA	3081	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.335.243.684,00	2.3.2.02.02.005.2201052.53 129.201 - EDUCACION CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION INICIAL, PRESCOLAR, BSICA Y MEDIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA 201	ADICIONAL EN VALOR NO. 4 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 104 DEL 28 DE MAYO DE 2021, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TENOLÓGICO DÁMASO ZAPATA FASE I DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
3829	06/04/2022 16:31	247	EME INGENIERIA S A	3098	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 283.871.691,00	2.3.2.02.02.008.4599016.85 970.226 - GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 226	ADICION EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO 247 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CUYO OBJETO ES: ACTIVIDADES DE PODA PARA EL DESPEJE DE LUMINARIAS Y REDES QUE INTERFIEREN CON EL ALUMBRADO PUBLICO Y TALA DE ÁRBOLES Y MANEJO INTEGRAL DEL COMPONENTE ARBÓREO EN EL ESPACIO PÚBLICO, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
3830	06/04/2022 16:32	254	GAM INGENIERIA S.A.S.	3099	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 65.453.452,24	2.3.2.02.02.008.4599016.85 970.226 - GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 226	ADICION EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO 254 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACTIVIDADES DE PODA PARA EL DESPEJE DE LUMINARIAS Y REDES QUE INTERFIEREN CON EL ALUMBRADO PUBLICO Y TALA DE ARBOLES Y MANEJO INTEGRAL DEL COMPONENTE ARBOREO EN EL ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
3831	06/04/2022 16:33	247	EME INGENIERIA S A	3096	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 149.386.000,60	2.3.2.02.02.008.4002026.85 970.201 - VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO ZONAS VERDES MANTENIDAS 201	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 247 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CUYO OBJETO ES: ACTIVIDADES DE PODA PARA EL DESPEJE DE LUMINARIAS Y REDES QUE INTERFIEREN CON EL ALUMBRADO PUBLICO Y TALA DE ÁRBOLES Y MANEJO INTEGRAL DEL COMPONENTE ARBÓREO EN EL ESPACIO PÚBLICO, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y EME INGENIERIA S.A

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Objeto
3832	06/04/2022 16:33	254	GAM INGENIERIA S.A.S.	3097	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 25.451.629,51	2.3.2.02.02.008.4002026.85 970.201 - VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO ZONAS VERDES MANTENIDAS 201	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 254 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA A LAS ACTIVIDADES DE PODA PARA EL DESPEJE DE LUMINARIAS Y REDES QUE INTERFIEREN CON EL ALUMBRADO PUBLICO Y TALA DE ARBOLES Y MANEJO INTEGRAL DEL COMPONENTE ARBÓREO EN EL ESPACIO PÚBLICO, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y GAM INGENIERIA S.A.S
3835	06/04/2022 17:08	244	CONSORCIO BUCA 2021	3105	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 303.805.479,05	2.3.2.02.02.009.2102011.91 123.226 - MINAS Y ENERGIA CONSOLIDACION PRODUCTIVA DEL SECTOR DE ENERGIA ELCTRICA REDES DE ALUMBRADO PUBLICO CON MANTENIMIENTO 226	DICION EN VALOR Y PLAZO NO. 2 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°244 DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA". GRUPO 2 - (TABLEROS)
3836	06/04/2022 17:10	219	I.G.S. INGENIERIA E.U	3106	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 173.773.229,28	2.3.2.02.02.009.2102011.91 123.226 - MINAS Y ENERGIA CONSOLIDACION PRODUCTIVA DEL SECTOR DE ENERGIA ELCTRICA REDES DE ALUMBRADO PUBLICO CON MANTENIMIENTO 226	DICION EN VALOR Y PLAZO NO. 2 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°219 DE 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA". GRUPO 3 - (CARRERA 15)
3837	06/04/2022 17:11	217	ESNORALDO MUÑOZ PATIÑO	3104	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 294.220.657,50	2.3.2.02.02.009.2102011.91 123.226 - MINAS Y ENERGIA CONSOLIDACION PRODUCTIVA DEL SECTOR DE ENERGIA ELCTRICA REDES DE ALUMBRADO PUBLICO CON MANTENIMIENTO 226	ADICION EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO 217 DE 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA."
3838	06/04/2022 20:59	167	SOLIDOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	3142	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 31.487.398,00	2.3.2.02.02.005.3301093.53 129.201 - CULTURA PROMOCION Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTISTICOS CENTROS CULTURALES CONSTRUIDOS Y DOTADOS 201	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 167 DEL 04 DE AGOSTO DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Objeto
3839	06/04/2022 21:01	266	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	3141	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 110.512.602,00	2.3.2.02.02.005.3301093.53 129.201 - CULTURA PROMOCION Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTISTICOS CENTROS CULTURALES CONSTRUIDOS Y DOTADOS 201	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 3 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO.266 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2021, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. - GRUPO 2
3848	07/04/2022 16:06	416	TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS SAS	3082	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 14.989.761,60	2.3.2.02.02.005.2409042.54 221.201 - TRANSPORTE SEGURIDAD DE TRANSPORTE PUENTES PEATONALES REHABILITADOS 201	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 2 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 416 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DEL PUENTE PEATONAL DE LA INTERSECCION VIAL DE LA CARRERA 22B CON CALLE 7N EN EL BARRIO EL PLAN, QUE COMUNICA LA INTERSECCION VIAL DE LA CALLE 10N CON CARRERA 22AB EN EL BARRIO ESPERANZA II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
3873	18/04/2022 10:15	69	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.	2639	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 278.079.200,00	2.3.2.02.02.008.4002026.85 970.201 - VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO ZONAS VERDES MANTENIDAS 201	INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ZONAS VERDES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
4025	25/04/2022 11:32	78	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN L	3012	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 19.176.824,00	2.3.2.02.02.008.4599016.85 330.226 - GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 226	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EN LOS DIFERENTES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, JUNTO CON EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS Y LA MAQUINARIA RESPECTIVA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
4031	25/04/2022 14:02	73	KOMATSU COLOMBIA S.A.S.	2535	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.005.970.000,00	2.3.2.01.01.003.02.08.24021 12.44424.273 - TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL VIA TERCARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO 273	ADQUISICIÓN A TITULO DE COMPRAVENTA DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. - LOTE 1 MOTONIVELADORA " DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Objeto
4032	25/04/2022 14:03	72	KOMATSU COLOMBIA S.A.S.	2535	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 395.920.000,00	2.3.2.01.01.003.02.08.24021 12.44424.273 - TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL VIA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO 273	ADQUISICIÓN A TITULO DE COMPRAVENTA DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. - LOTE 3 VIBRO COMPACTADOR AUTOPROPULSADO DE RODILLO SENCILLO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA.
4130	27/04/2022 16:17		ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	3301	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.013.554.123,00	2.3.2.02.02.006.4599016.69 112.226 - GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 226	ENERGIA - ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 SEGUN FACTURA 192555038 NUMERO DE CUENTA 1075933 -1
4131	27/04/2022 16:17		COMCEL S A	3300	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 289.830,05	2.3.2.02.02.008.4599016.84 120.253 - GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 253	CONSUMO DE VOZ CORRESPONDIENTE AL 04 DE MARZO 2022 AL 03 DE ABRIL DE 2022 PLAN DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y SIM CARD DE PRUEBA DE TELEMEDIDA, SEGUN FACTURA E 5561320296 DE CLARO REFERENCIA 8221401343
4164	28/04/2022 08:51		ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA A MB S.A. ESP	3303	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 283.452.554,00	2.3.2.02.02.009.4003047.91 123.215 - VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 SEGUN FACTURA NO. 05522 \$ 283.452.554,00, VALOR TOTAL \$283.452.554,00 -ACUEDUCTO METROPOLITANO

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Objeto
4165	28/04/2022 08:52		METROLIMPIA S.A.S. E.S.P.	3304	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 12.751.526,00	2.3.2.02.02.009.4003047.91 123.215 - VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 SEGÚN FACTURA NO. ELEC-653 \$ 12.751.526,00 VALOR TOTAL \$ 12.751.526,00 - METROLIMPIA
4166	28/04/2022 08:53		EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S A ESP EMPAS S A	3305	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 141.477.060,00	2.3.2.02.02.009.4003047.91 123.215 - VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	PAGO DE SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL MES DICIEMBRE DE 2021 SEGÚN FACTURA NO. 05028 \$ 141.477.060,00 VALOR TOTAL \$ 141.477.060,00 - EMPAS
4167	28/04/2022 08:53		LIMPIEZA URBANA S.A. ESP	3306	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 31.734.684,00	2.3.2.02.02.009.4003047.91 123.215 - VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 SEGÚN FACTURA NO. LUSA-1279 \$ 15.872.718,00, MES DICIEMBRE DE 2021 SEGÚN FACTURA NO. LUSA -1280 \$ 15.861.966,00 - VALOR TOTAL \$ 31.734.684,00 - LIMPIEZA URBANA
4218	29/04/2022 15:50		ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	3322	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 6.171.672,00	2.3.2.02.02.006.4599016.69 112.253 - GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 253	CONSUMO DE ENERGÍA DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO, INFORMACION COMERCIAL FACTURACION FORMATO DIGITAL PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL 15 DE MARZO 2022 AL 12 DE ABRIL DE 2022, SEGÚN FACTURA 193257232 DE LA ESSA - NUMERO DE CUENTA 32675

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Objeto
4219	29/04/2022 15:50		COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P BIC	3323	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.183.150,00	2.3.2.02.02.008.4599016.84 120.253 - GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 253	CONSUMO DE TELEFONIA LOCAL - ADSL (FIBRA OPTICA, SERVIDOR) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022, SEGUN FACTURA TBCL- 21429075 DE MOVISTAR (ANTERIORMENTE TELEBUCARAMANGA) CUENTA NO. 498
4243	03/05/2022 16:56	723	JAVIER HERNANDO MARTINEZ AYALA	867	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 12.833.333,34	2.3.2.02.02.008.4599031.83 321.201 - GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LOS ASUNTOS RELACIONADOS DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
4247	04/05/2022 08:21	331	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER UIS	3343	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.068.329.918,50	2.3.2.02.02.008.2402118.83 232.230 - TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LA RED VIAL REGIONAL 230	REALIZAR LA REVISIÓN Y ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA SOLUCIÓN VIAL DE LA CALLE 53-54, CONEXIÓN ORIENTE – OCCIDENTE, EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE, LA INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SU ARTICULACION CON LAS INTERVENCIONES URBANAS EN EL CORREDOR. VIGENCIA FUTURA, ACUERDO NO. 035 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2021. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 331 DE 2021
4270	05/05/2022 16:49	85	CONSORCIO INGCIV	2587	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 813.032.264,00	2.3.2.02.02.008.4599016.87 15205.226 - GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 226	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO 1
4271	05/05/2022 16:50	88	HCR INGENIEROS S.A.S.	2588	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 876.561.520,80	2.3.2.02.02.008.4599016.87 15205.226 - GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 226	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
4272	05/05/2022 16:50	87	CONSORCIO ENERGYS	2587	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 741.517.944,00	2.3.2.02.02.008.4599016.87 15205.226 - GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 226	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO 3

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Objeto
4273	05/05/2022 16:51	86	CONSORCIO ELECTRICO	2587	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 538.567.888,00	2.3.2.02.02.008.4599016.87 15205.226 - GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 226	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO 2
4383	10/05/2022 16:52	444	GTP ASOCIADOS LTDA	3383	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 41.800.000,00	2.3.2.02.02.005.1709078.53 122.201 - AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACION PLAZA DE MERCADO ADECUADAS 201	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 2 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 444 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021, CUYO OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO KENNEDY A CARGO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
4388	11/05/2022 10:14	174	UNIÓN TEMPORAL EARR SAS	3385	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 91.677.354,00	2.3.2.02.02.005.4103027.54 270.201 - INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION INCLUSION SOCIAL Y PRODUCTIVA PARA LA POBLACION EN SITUACION DE VULNERABILIDAD CENTROS COMUNITARIOS ADECUADOS 201	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 5 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 174 DEL 06 DE AGOSTO DE 2021, CUYO OBJETO: ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS ADYACENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 2
4389	11/05/2022 10:15	140	R Y M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	3384	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 19.960.694,00	2.3.2.02.02.005.4103027.54 270.201 - INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION INCLUSION SOCIAL Y PRODUCTIVA PARA LA POBLACION EN SITUACION DE VULNERABILIDAD CENTROS COMUNITARIOS ADECUADOS 201	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 5 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 140 DEL 12 DE JULIO DE 2021, CUYO OBJETO: INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS ADYACENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 1

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Objeto
4405	11/05/2022 16:27		ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA AMB S.A. ESP	3397	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 261.438.538,00	2.3.2.02.02.009.4003047.91 123.215 - VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL MES DE ENERO DE 2022 SEGUN FACTURA NO. 05543 \$ 261,438,538,00, VALOR TOTAL \$261,438,538,00 -ACUEDUCTO METROPOLITANO
4406	11/05/2022 16:28		EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S A E S P	3398	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 260.990.955,00	2.3.2.02.02.009.4003047.91 123.215 - VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES DE FEBRERO DE 2022 SEGUN FACTURA NO. 210 \$ 260,990,955,00. VALOR TOTAL \$ 260,990,955,00 - EMAB
4561	19/05/2022 14:01		EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S A ESP EMPAS S A	3474	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 130.159.692,00	2.3.2.02.02.009.4003047.91 123.215 - VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	PAGO DE SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL MES ENERO DE 2022 SEGUN FACTURA NO. 05966 \$ 130.159.692,00 VALOR TOTAL \$ 130.159.692,00 - EMPAS
4586	24/05/2022 07:34	1088	FABIO RUIZ GONZALEZ	3503	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.400.000,00	2.3.2.02.02.008.4002026.85 999.201 - ZONAS VERDES MANTENIDAS 201	ADICION EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO NO. 1088 DE 2022, QUE TIENE POR OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES EN DESARROLLO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Objeto
4719	27/05/2022 10:23		COMCEL S A	3582	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 477.435,24	2.3.2.02.02.008.4599016.84 120.253 - GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 253	"PLAN DE DATOS DE TELEMEDIDA, TELEGESTION Y PLATAFORMA TECNOLOGICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, 20 DE ABRIL DE 2022 AL 19 DE MAYO DE 2022. SEGÚN FACTURA DE CLARO NO.E 5566318443 - REFERENCIA 8221383845"
4720	27/05/2022 10:23		ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	3581	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.461.176,00	2.3.2.02.02.006.4599016.69 112.253 - GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 253	CONSUMO DE ENERGÍA DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL 13 DE ABRIL 2022 AL 13 DE MAYO DE 2022, SEGÚN FACTURA 194338735 DE LA ESSA - NUMERO DE CUENTA 32675
4721	27/05/2022 10:25		ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	3580	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.044.202.575,00	2.3.2.02.02.006.4599016.69 112.226 - GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 226	ENERGIA - ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 SEGUN FACTURA 193607996 NUMERO DE CUENTA 1075933 -1
4725	27/05/2022 15:59	135	CONSORCIO EPSILON PARQUES	3382	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 37.220.121,00	2.3.2.02.02.005.4301012.54 129.201 - DEPORTE Y RECREACION FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ PARQUES RECREATIVOS MANTENIDOS 201	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 135 DEL 07 DE JULIO DE 2021, CUYO OBJETO: INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO 2
4733	01/06/2022 10:26	1636	DIANA MARCELA SUAREZ FAJARDO	1770	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 8.550.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.82 120.201 - GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO(A) PARA EJERCER LA REPRESENTACION JUDICIAL Y/O EXTRAJUDICIAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Objeto
4735	01/06/2022 16:40		ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA AMB S.A. ESP	3594	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 246.977.416,00	2.3.2.02.02.009.4003047.91 123.201 - VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 201	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL MES DE FEBRERO DE 2022 SEGUN FACTURA NO. 05555 \$ 246.977.416,00, VALOR TOTAL \$ 246.977.416,00 -ACUEDUCTO METROPOLITANO
4736	01/06/2022 16:41		EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S A E S P	3593	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 532.955.568,00	2.3.2.02.02.009.4003047.91 123.215 - VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES DE MARZO DE 2022 SEGÚN FACTURA NO. 212 \$ 278,821,829,00, MES DE ABRIL DE 2022 SEGÚN FACTURA NO. 215 \$ 254.133.739,00 VALOR TOTAL \$ 532.955.568,00 - EMAB
4911	08/06/2022 16:32		COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P BIC	3655	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.085.927,00	2.3.2.02.02.008.4599016.84 120.253 - GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 253	CONSUMO DE TELEFONIA LOCAL - ADSL (FIBRA OPTICA, SERVIDOR) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022, SEGUN FACTURA TBCL- 21647251 DE MOVISTAR (ANTERIORMENTE TELEBUCARAMANGA) CUENTA NO. 498
4912	08/06/2022 16:32		COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P BIC	3654	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.134.990,00	2.3.2.02.02.008.4599016.84 120.253 - GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 253	CONSUMO DE TELEFONIA LOCAL - ADSL (FIBRA OPTICA, SERVIDOR) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022, SEGUN FACTURA TBCL- 21538823 DE MOVISTAR (ANTERIORMENTE TELEBUCARAMANGA) CUENTA NO. 498

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Objeto
4949	10/06/2022 14:10	173	CONSORCIO DRE	3386	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 15.432.990,00	2.3.2.02.02.005.4103027.54 270.201 - INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION INCLUSION SOCIAL Y PRODUCTIVA PARA LA POBLACION EN SITUACION DE VULNERABILIDAD CENTROS COMUNITARIOS ADECUADOS 201	ADICIONAL EN VALOR NO. 4 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 173 DEL 06 DE AGOSTO DE 2021, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS ADYACENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 1
5092	17/06/2022 10:34	134	WILMAN MORALES REY PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S A S	3590	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 25.023.612,00	2.3.2.02.02.008.4599016.83 132.253 - GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 253	VERIFICAR LAS MEDIDAS DE VARIABLES ELECTRICAS QUE REALIZA EL DISPOSITIVO FOTOCONTROL CIMCON ISLC 3100-7P-C... CUYA CARGA SON LAS DISTINTAS LUMINARIAS SE HAN SELECCIONADO PRODUCTO DEL ANALISIS Y ESPACIO MUESTRAL DE ACUERDO CON LA NORMA ISO NO. 2859-1:1999 PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO PARA INSPECCION DE ATRIBUTOS.
5300	30/06/2022 10:50	137	UNION TEMPORAL RECUPERACION URBANA BGA	3211	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 744.914.177,00	2.3.2.02.02.005.4301011.54 270.201 - DEPORTE Y RECREACION FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS 201	RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - GRUPO NO. 2
5301	30/06/2022 10:52	136	PAVIACOM S.A.S.	3211	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 729.277.245,00	2.3.2.02.02.005.4301011.54 270.201 - DEPORTE Y RECREACION FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS 201	RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - GRUPO NO. 1
5304	30/06/2022 11:31	138	INDUTEC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	3613	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 15.000.000,00	2.3.2.02.01.003.4599016.38 11106.226 - GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 226	ADQUISICIÓN DE SILLAS ERGONÓMICAS, SILLAS INTERLOCUTORAS Y ESCRITORIOS, DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR EL ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO BIOMECÁNICO.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Objeto
5305	30/06/2022 11:34	140	ELECTRO BOOSTER SAS	3050	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 10.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599016.87 14199.226 - GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 226	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUIDO RESPUESTOS DE LAS MOTOCICLETAS Y VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

RELACION PERSONAL (01 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022)

Año	Numero Contrato	Tipo Contrato	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2022	1088	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FABIO	RUIZ GONZALEZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES EN DESARROLLO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER	\$3.400.000,00	23/05/2022	25/05/2022	24/07/2022
