



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA



Informe de Gestión

Cuarto Trimestre



www.bucaramanga.gov.co

   Alcaldía de Bucaramanga




INFORME DE GESTION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

La Secretaría de Infraestructura de Bucaramanga presenta el informe de gestión correspondiente al cuarto trimestre del año 2025, comprendido del 01 de octubre de 2025 al 31 de diciembre de 2025, en el cual ha continuado ejecutando y realizando las gestiones pertinentes para el control y avance de las diferentes obras que actualmente se encuentran en ejecución. Este documento tiene como objetivo proporcionar un resumen detallado de las actividades realizadas en el marco de las líneas estratégicas, programas y alineados con las metas del plan de desarrollo municipal para el periodo 2024-2027. Igualmente, el avance de cumplimiento en su ejecución presupuestal.

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL

El presupuesto definitivo a 31 de diciembre de 2025 de la Secretaria de Infraestructura, ascendió a \$ 253.202.206.623,51 y se realizaron apropiaciones y compromisos por valor de \$ 175.606.930.931,00 equivalente al **69,35%** de ejecución.

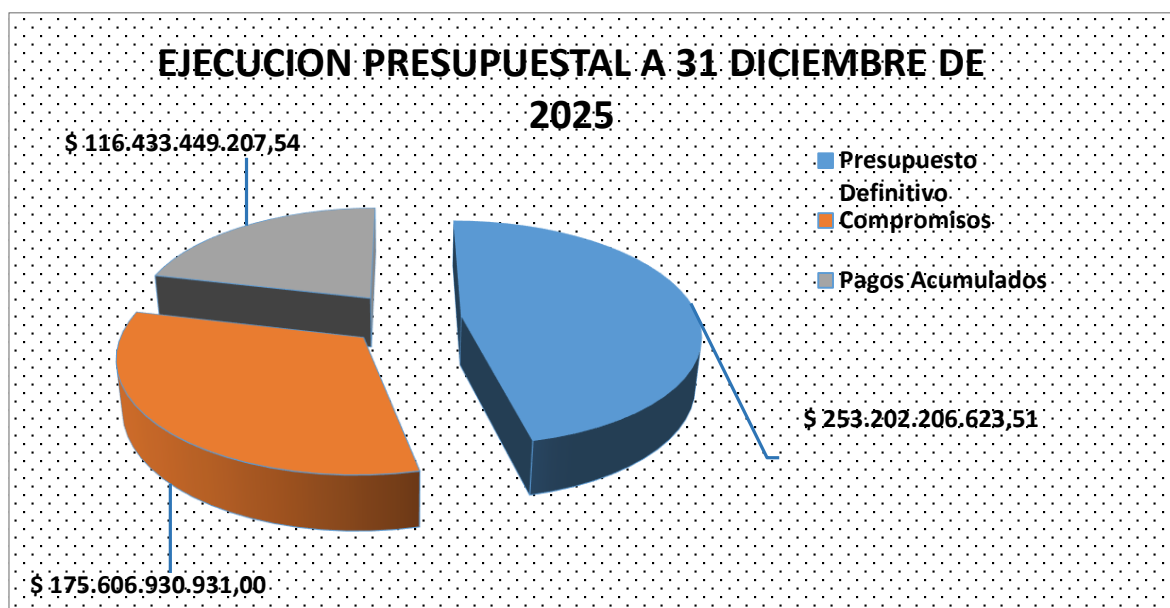

Durante el cuarto trimestre de 2025 de acuerdo a las diferentes necesidades se debieron realizar diferentes movimientos presupuestales de créditos y contracréditos, igualmente fueron adicionados unos recursos mediante los siguientes actos administrativos así: DECRETO 0765 SE LIQUIDA EL ACUERDO No 038 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2025, RESOLUCION No 4-R-202510-00028705 DEL 22 OCT 2025, RESOLUCION 4-R--202511-00029412 DEL 13 NOV 2025, RESOLUCION N°4-R--202511-0029714 – 26112025, y ACUERDO # 043 DEL 14 DE NOVIEMBRE 2025, quedando como presupuesto definitivo el valor de \$ 253.202.206.623,51

A continuación, se detalla la inversión por las diferentes líneas estratégicas, sector, programas, metas e indicadores del Plan de Desarrollo:



1. LINEA ESTRATEGICA. TERRITORIO SEGURO QUE INTEGRA

SECTOR: Cultura

PROGRAMA: Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Brindar 2 servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble de bienes de patrimonio cultural en el municipio de Bucaramanga

Indicador	Meta 2025	Logro 2025	% Avance 2025	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuest al
Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble	1	1	100%	\$ 210,612,869,00	\$ 210.612.869,00	100%

Descripción del Proyecto


Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PROVISIONALES Y DE PROTECCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS DEL BIEN INTERÉS CULTURAL PLAZA SAN MATEO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANAGA, SANTANDER"	2023680010066	\$ 492.488.281,38	\$ 492.488.281,38
	202500000027293	\$ 210,612,869.34	\$ 210,612,869.34
VALOR TOTAL			\$ 703.101.150,72

Descripción de actividades desarrolladas

Que de acuerdo con las necesidades al contrato No. 232 del 2024 - **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PROVISIONALES Y DE PROTECCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS DEL BIEN DE INTERÉS CULTURAL PLAZA SAN MATEO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.**

Valor Inicial:	\$492.488.281.38	completado al 100%
Valores adicionales:	\$210.612.869.34	completado al 100
Plazo Inicial:	22 DIAS	
Fecha Inicial:	10/12/2024	
Fecha Final:	14/08/2025	
Estado del Contrato:	LIQUIDADO	
Porcentaje de Avance:	100%	
Total, pagado a la fecha:	\$ 703.101.150,72	

ESTADO DEL CONTRATO: El proyecto contempló el reforzamiento y rehabilitación de la plaza San Mateo a los cuales se lograron culminar y finalmente el contrato se encuentra en proceso de liquidación próximo a finalizar en su totalidad para dar cumplimiento a uno de los indicadores asignados en el Plan de Desarrollo contribuyendo de manera significativa al logro de la meta programada para el presente año (Servicios de restauración del patrimonio Cultural material inmueble).

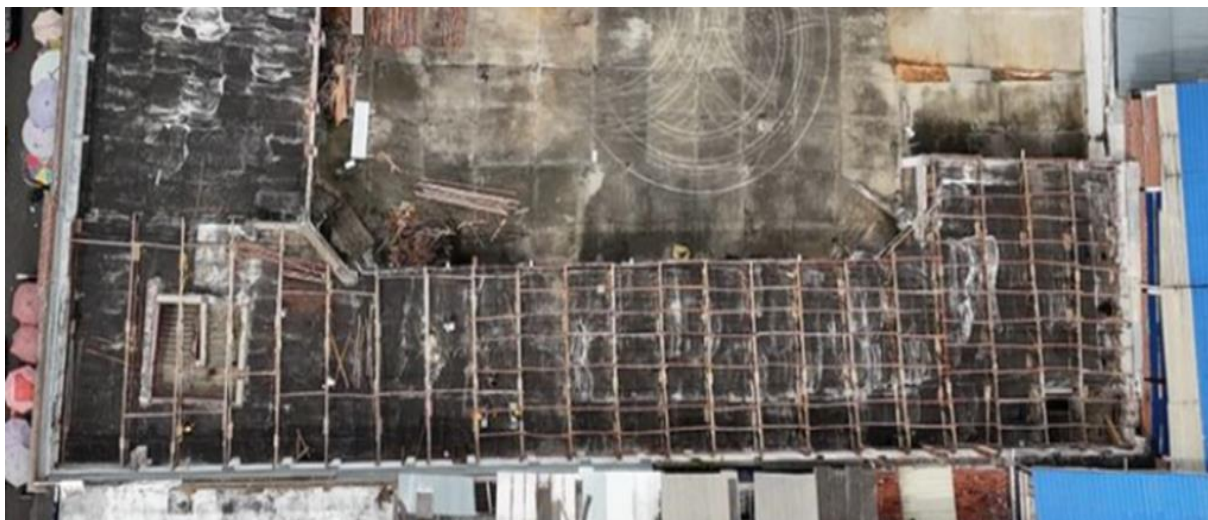

2. LINEA ESTRATEGICA. TERRITORIO SEGURO QUE PROGRESA

SECTOR: Transporte



PROGRAMA: Infraestructura red vial regional

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Realizar 4 Estudios de pre inversión para la red vial regional

Indicador	Meta 2025	Logro 2025	% Avance 2025	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuesta I
Estudios de preinversión para la red vial regional	1	0,9	90%	\$ 120.344.831	\$ 0	0%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA TRONCAL METROPOLITANA NORTE SUR TRAMO 3A INTERSECCIÓN VIAL CARRERA 9NA CON CALLE 45 DEL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	2024680010007	\$1.282.056.389,00	\$1.282.056.389,00

Descripción de actividades desarrolladas

Contrato No. 140 del 2024 - **ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA TRONCAL METROPOLITANA NORTE SUR TRAMO 3A, "INTERSECCIÓN VIAL CARRERA 9NA CON CALLE 45 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.:**

Valor Inicial:	\$ 1.282.056.389.00
Valores adicionales:	\$ 0.
Valor Total	\$ 1.282.056.389.00
Plazo Inicial:	Tres (03) MESES
Fecha Inicial:	1 octubre de 2024
Fecha Final:	30 mayo del 2025
Estado del Contrato:	Liquidado
Porcentaje de Avance:	100%
Total, pagado a la fecha:	\$ 1.282.056.389.00

ESTADO DEL CONTRATO: Durante el período comprendido entre el 20 de diciembre de 2024 y el 25 de noviembre de 2025, se realizó seguimiento a la ejecución del contrato de consultoría a cargo de NOGAALL S.A.S, el cual incluye componentes técnicos, ambientales, sociales y administrativos. El informe consolida las principales actividades desarrolladas y la documentación presentada por el consultor, conforme a los informes finales y soportes remitidos.

En el componente técnico, entre las semanas 15 y 19 se recibieron múltiples entregables parciales, correspondientes a estudios y diseños especializados (estructuras, suelos, tránsito, redes, ambiental, urbanismo, presupuestos, PMT, estudios prediales, arqueológicos y forestales, entre otros), los cuales fueron formalizados mediante oficios y sometidos a revisión por parte de la Secretaría de Infraestructura, generándose observaciones técnicas para su ajuste.



En el componente social, se desarrollaron actividades de divulgación y socialización del proyecto, incluyendo jornadas de volanteo en sectores aledaños y espacios de socialización con la comunidad.

Adicionalmente, se llevaron a cabo mesas técnicas y reuniones interinstitucionales para la revisión de aspectos clave como tránsito, presupuestos y gestión predial, con participación de distintas dependencias de la administración municipal, fortaleciendo el proceso de articulación y control del proyecto.



Imagen 1: Estado actual del Proyecto



Imagen 2: Render de la alternativa mejoramiento

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Mejorar 20 Km de Vías urbanas del municipio

Indicador	Meta 2025	Logro 2025	% Avance 2025	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Vía urbana mejorada	17,16	24,31	100%	\$ 33.127.736.917	\$ 32.081.242.941	97%



Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Mejoramiento de la malla vial y espacio público enmarcado dentro de la estrategia "plan revitalización del espacio público centro" en el Municipio de Bucaramanga, Santander	202500000016144	\$1.004.295.290,00	\$1.004.295.290,00

Descripción de actividades desarrolladas

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 163 DE 2022: "MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ENMARCADO DENTRO DE LA ESTRATEGIA "PLAN REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO CENTRO" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"

CONTRATISTA:	CONSORCIO MALLA INCAL NIT: 901606477-1 EDGAR ALONSO QUESADA OREJARENA
VALOR INICIAL:	\$31.221.573.233,00
ANTICIPO (30%):	\$ 9.366.471.969,90
VALOR ADICIONAL:	\$ 11.900.862.783,12
VALOR ACUMULADO:	\$ 43.122.436.016,12
PLAZO INICIAL:	6 MESES
PRORROGA No. 1	6 MESES
PRORROGA No. 2	3 MESES
PRORROGA No. 3	5 MESES
PRORROGA No. 4	14 DÍAS
PRORROGA No. 5	7 DÍAS
PRORROGA No. 6	5 MESES Y 16 DÍAS
PRORROGA No. 7	7 MESES
PRORROGA No. 8	45 DÍAS
PLAZO TOTAL:	34 MESES Y 22 DÍAS
INTERVENTORÍA:	SOLIUN INGENIERÍA S.A.S. NIT: 901114547-5
FECHA DE INICIO:	30 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	21 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO 1:	12 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	23 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE REINICIO 2:	10 DE MARZO DE 2025
ESTADO DEL CONTRATO:	TERMINADO
FECHA TERMINACIÓN FINAL	29 DE NOVIEMBRE 2025
PORCENTAJE AVANCE FÍSICO:	97,95%
AVANCE FINANCIERO:	97,95%

ESTADO DEL CONTRATO: A la fecha y con la aprobación del contrato adicional se tienen dentro del alcance 24 frentes de obra en total, de los cuales 24 frentes ya se encuentran con acabados en piedra travertino vehicular, pavimento rígido en MR42 y travertino peatonal, con sus respectivas obras complementarias (optimización de redes de acueducto, alcantarillado e instalación e tubería para soterrado de red eléctrica);

24 frentes con terminados en piedra natural y calzada vehicular

- Carrera 10 entre calles 37 y 41
- Carrera 10 entre calles 41 y 42
- Carrera 10 entre calles 42 y 43
- Carrera 10 entre calles 43 y 44
- Carrera 11 entre calles 37 y 41
- Carrera 11 entre calles 41 y 42
- Carrera 11 entre calles 42 y 43
- Carrera 11 entre calles 43 y 44
- Calle 37 entre carreras 11 y 12



- Calle 37 entre carreras 12 y 13
- Carrera 12 entre calles 36 y 37
- Carrera 12 entre calles 37 y 41
- Carrera 12 entre calles 41 y 42
- Carrera 12 entre calles 42 y 43
- Carrera 12 entre calles 43 y 44
- Calle 41 entre carreras 9 y 10
- Calle 41 entre carreras 10 y 11
- Calle 41 entre carreras 11 y 12
- Calle 41 entre carreras 12 y 13
- Calle 42 entre carreras 9 y 10
- Calle 42 entre carreras 10 y 11
- Calle 42 entre carreras 11 y 12
- Calle 42 entre carreras 12 y 13
- Calle 43 entre carreras 10 y 11

Generalidades contractuales en el periodo del presente informe: se suscribió una prórroga en plazo a los contratos de obra e interventoría, por un tiempo de 45 días y con fecha de terminación final a 29 de noviembre de 2025. A la fecha del presente informe, el contrato se encuentra terminado.

A continuación, se enuncian las principales actividades ejecutadas en el periodo del presente informe para cada frente de obra que hace parte del alcance actual del contrato.

- **Calle 42 entre carreras 9 y 10:**
Calzada Vehicular: Se realizó la excavación para el acceso vehicular. Posteriormente se procedió con el relleno, la fundición de losas, el corte de dilataciones y el estampado del concreto.
Señalización: Se realizó instalación de señalización vertical.
- **Calle 42 entre carreras 10 y 11:**
Espacio Público: Se realizaron adecuaciones de bordillos en jardineras y mantenimiento de losas peatonales.
Infraestructura: Se trabajó en la fundición de la tapa para la caja de alcantarillado pluvial (AP) y excavaciones para nivelación de piso en el sendero peatonal
- **Calle 42 entre carreras 11 y 12:**
Malla Vial: Se ejecutó el replanteo de la rasante y la demolición del pavimento existente. Se avanzó en la instalación de base granular, geotextil vial, fundición y estampado de losas de concreto MR42.
Redes y Servicios: Se instaló tubería para redes eléctricas de baja tensión (BT), redes de acueducto y redes de telemáticos.
Acabados: Se realizaron siembras de especies arbóreas en jardineras, instalación de sardineles, bolardos metálicos y sellado de juntas con cordón epóxico
- **Calle 42 entre carreras 12 y 13:**
Pavimentación: Se realizó la demolición de pavimento y la conformación de la calzada vehicular. Se trabajó en la instalación de geodrén vial y fundición de losas vehiculares.
Urbanismo: Continuó la instalación de piso peatonal en piedra (Sinu Veta) y losas peatonales. Se instalaron bolardos metálicos en el costado sur y se trabajó en las cajas de barrajes.
Redes: Se instalaron cajas para contadores de acueducto y tubería eléctrica.
- **Carrera 12 entre calles 42 y 43:**
Infraestructura Hidrosanitaria: Se ejecutaron excavaciones para pozos de inspección, construcción de pozos sanitarios en ladrillo y empalme de tuberías. Se instaló tubería de acueducto en coordinación con la AMB.
Malla Vial y Drenaje: Se realizó la compactación de base granular y la instalación de geodrén vial de 4 pulgadas. Se fundieron losas de concreto MR42 y se realizó el estampado respectivo.
Urbanismo: Se trabajó en la demolición de andenes, instalación de sardineles (prefabricados y fundidos), instalación de bolardos y enchape de piedra sobre sardinel.
Redes Eléctricas: Instalación de tubería para alumbrado público (AP) y construcción de cajas de barrajes (incluyendo vigas corona y muros).



Resumen en Otros Frentes

Carrera 11 (Calles 41 a 44): Mantenimiento de adoquín vehicular travertino , demolición de concreto para ampliación de calzada, instalación de geotextil y fundición de losas en la ampliación.

Carrera 13 (Calle 42): Verificación e instalación de piso peatonal y guía táctil.

- **Gestión Ambiental y Social:** Se realizaron jornadas semanales de limpieza, mantenimiento de jardineras y podas. Socialmente, se mantuvieron reuniones con la comunidad y el comando de policía para informar sobre cierres y avances.

Conclusiones Generales

- Progreso Físico: Al cierre de noviembre, el contrato de obra alcanzó un avance ejecutado del 97,95%, frente a un 100% programado.
- Estado Financiero: La inversión acumulada en obra corresponde al 97,95%
- HSEQ: Durante el periodo no se presentaron accidentes de trabajo. Se cumplió con la señalización, uso de EPP y charlas diarias de seguridad.
- Pendientes Finales: Las actividades remanentes se concentran en arreglos de detalles finales, terminación de interconexiones entre subestaciones eléctricas y trámites de actualización de diseños.

CALLE 42 ENTRE CARRERAS 9 y 10



Instalación de señalización vertical



Instalación de señalización vertical

CALLE 42 ENTRE CARRERAS 10 y 11



Excavación para replanteo área de andén



Excavación para bolardos esquina con cra 11

CALLE 42 ENTRE CARRERAS 11 y 12



18/11/2025, 3:28:05 p.m.
Calle 42 11-3
Bucaramanga
Interventoria

Compactación de capa de base granular sobre calzada vehicular



21/11/2025, 10:58:00 a.m.
Carrera 12 41-80
Bucaramanga
Interventoria

Fundida de concreto losas de pavimento MR42

CALLE 42 ENTRE CARRERAS 12 y 13



7° 6' 54.858" N 73° 7' 40.71" W
1252 Calle 42
Interventoria, Soliun Ing
Plan Centro Bucaramanga

Instalación de enchape en sinu veta sobre sardinel costado norte



7° 6' 55.56" N 73° 7' 39.282" W
1259 Calle 42
Interventoria, Soliun Ing
Plan Centro Bucaramanga

Fundida de losas en concreto MR42

CARRERA 12 ENTRE CALLES 42 Y 43



9/12/2025, 10:11:00 a.m.
Carrera 12 42-29
Bucaramanga
Interventoria

Compactación subase granular en sendero peatonal costado oriental



9/12/25, 3:52 p.m.
N 7° 6' 54", W 73° 7' 42"
Santander Bucaramanga, García Rovira, Carrera 12
Carrera 12 41-16-41-80

Sellado de losas con sellante epoxico

INTERSECCIÓN CARRERA 12 CON CALLE 42



5 de diciembre de 2025 7:24:12 a.m.
Interventoria, Soliun Ing
Plan Centro Bucaramanga



5 de diciembre de 2025 7:48:15 a.m.
Interventoria, Soliun Ing
Plan Centro Bucaramanga

Fundida en concreto MR42 calzada vial



OTROS FRENTES DE OBRA



Desmonte de luminarias existentes para entrega a la entidad sobre la carrera 10



Señalización horizontal intersecciones cra 10 con 41 y cra 10 con 42



Instalación de señales de tránsito verticales



Mantenimiento de adoquín vehicular en travertino calle 41 con cra 11



Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER	2024680010051	\$30,904,033,662.30	\$30,904,033,662.30

Descripción de actividades desarrolladas

CONTRATO DE OBRA 052 DE 21 DE ABRIL DE 2025 (SI-SI-LP-002-2024) CONSORCIO GENPRO GROUP "MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER".

Valor del contrato:	\$ 29.043.476.777
Valor Anticipo:	N/A
Plazo inicial:	A monto agotable o hasta el 31 de diciembre de 2025
Fecha de inicio:	23/05/2025
Fecha de terminación:	31/12/2025
Estado del Contrato:	Suspendido
Porcentaje avance:	90%

Ubicación: El proyecto se desarrolla en todas las comunas del Municipio de Bucaramanga.

Impacto: Comprende la ejecución de trabajos de mejoramiento y mantenimiento en las vías urbanas de Bucaramanga, mediante obras de bacheo y rehabilitación, en pavimento rígido o flexible buscando así la realizar actividades que mejoran la circulación vial y disminuyen el riesgo de accidentes.

Igualmente, la construcción de reductores de velocidad en diferentes puntos críticos de la ciudad avalados por la Dirección de tránsito de Bucaramanga – DTB, mediante la resolución 328 del 18 de junio de 2024.

- 1.COMUNA 1 - NORTE
- 2.COMUNA 2 - NORORIENTAL
- 3.COMUNA 3 - SAN FRANCISCO
- 4.COMUNA 4 - OCCIDENTAL
- 5.COMUNA 5 - GARCÍA ROVIRA
- 6.COMUNA 6 - LA CORNCORDIA
- 7.COMUNA 7 - CIUDADELA
- 8.COMUNA 8 - SUR OCCIDENTE
- 9.COMUNA 9 - LA PEDREGOSA
- 10.COMUNA 10 - PROVENZA
- 11.COMUNA 11 - SUR
- 12.COMUNA 12 - CABECERA DEL LLANO
- 13.COMUNA 13 - ORIENTAL
- 14.COMUNA 14 - MORRORICO
- 15.COMUNA 15 - CENTRO
- 15.COMUNA 16 - LAGOS DEL CACIQUE
- 15.COMUNA 17 - MUTIS

Este proyecto contribuye al mejoramiento del flujo vehicular en la ciudad, y la disminución de accidentes por ende el mejoramiento en los índices de seguridad vial.

Beneficios para la Comunidad:

- **Mejoramiento en el flujo vehicular:** Al contar con vías en buen estado mejora la circulación de los vehículos y los tiempos de circulación.



- **Menor Impacto a daños:** Se disminuye el riesgo de accidentes y daños en el parte automotor y sus componentes mecánicos.

Aumento de la Seguridad vial: Se tiende a baja en la tasa de mortalidad por accidentes y el mejoramiento de las condiciones de los actores viales.



Carrera 15 entre calle 55 y Avenida La Rosita



Carrera 36 entre calle 56 y 55 – Cabecera

Se han realizado trabajos de mantenimiento y rehabilitación de la malla vial en diferentes comunas y barrios de la ciudad enfocados en el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo – Vía urbana mejorada, con un avance de 22 km hasta el momento.

- Concordia – calle 53 entre carrera 15 y 17
- Concordia – calle 52 entre carrera 17 y 17b
- Concordia – calle 17b entre calle 52 y 54
- Concordia – calle 54 entre carrera 15 y 17
- Ciudad Bolívar – Avenida guayacanes entre transversal metropolitana y carrera 1
- Ciudad Bolívar – Calle 64c entre carrera 1 y carrera 6ª
- Ciudad Bolívar – Calle 64 entre carrera 6ª y carrera 5
- Ciudad Bolívar – Carrera 6ª entre calle 63 y 64
- Naranjos – Carrera 3 entre calles 55 y 63ª
- Ciudadela Real de minas - Diagonal 13 entre calle 60 y avenida Samanes



- Ciudadela Real de minas – Carrera 7 sector plaza mayor
- Centro - Carrera 15 entre avenida rosita y calle 61ª
- Antonia Santos – Calle 35 entre carrera 25 y 26
- Delicias Altas – Calle 105 entre transversal metropolitana y carrera 15d
- Kennedy – Carrera 14 entre calles 16 y 17
- Kennedy – Carrera 15 entre calles 14 y 16
- Kennedy – Carrera 14 con calle 13
- Villa Rosa – Calle 13 entre Avenida el libertador y carrera 18ª
- Villa Rosa – Calle 15N avenida principal
- Villa Rosa – Carrera 18b
- Villa rosa – Carrera 20N Avenida principal
- Villa Rosa – Carrera 19N curva entrada a Villa Helena
- Provenza – Calle 115 entre carreras 22 y 23
- Provenza – Calle 114 entre carreras 22 y 23
- Provenza – Calle 113 entre carreras 22 y 23
- Provenza – Calle 112 entre carreras 22 y 23
- Provenza – Carrera 23 entre calle 105 y 111
- Provenza – Calle 108 entre calles 23c y 24ª
- Altos del Cacique
- San Expedito
- Transversal oriental
- Coaviconsa – Calle 103 entre transversal metropolitana y carrera 14
- Calle 61
- La Ceiba
- Carrera 36 entre calle 56 a la 52
- Carrera 35a entre calle 53 y 52
- Los Pinos
- La Joya
- Alfonso López
- La Pedregosa
- Monterredondo
- La Victoria
- Viveros de Provenza
- Los Ángeles
- García Rovira
- Porvenir

Nos encontramos ejecutando 19 presupuestos participativos de vigencias 2020 a 2024 y la construcción de los reductores de velocidad contemplados en la resolución 328 de 2024, igualmente con recursos propios se están interviniendo barrios de la comuna 5 y 9.

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Realizar el mantenimiento periódico o rutinario a 110 Km de Vías terciarias de la malla vial rural de la ciudad por año.

Indicador	Meta 2025	Logro 2025	% Avance 2025	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuesta I
Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario km	110	221	100%	\$ 3.000.000.000	\$ 3.000.000.000	100%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Mantenimiento periódico de la red vial rural del Municipio de Bucaramanga Santander	2024680010043	\$ 3.000.000.000	\$ 4.620.379.446



Descripción de actividades desarrolladas

CONTRATO DE ALQUILER NO. 114 de fecha 16 de junio de 2025 -: HCL SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS “ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”.

Valor del contrato:	\$2.818.077.627,00
Valor Anticipo:	N/A
Plazo inicial:	Hasta 30 de diciembre o hasta agotar monto
Fecha de inicio:	24 de junio de 2025
Fecha de terminación:	30 de diciembre de 2025
Estado del Contrato:	EJECUCIÓN
Porcentaje avance:	95,03%
Porcentaje avance financiero:	95,03%

Ubicación:

- Vías Rurales de los corregimientos 1, 2, y 3 del Municipio de Bucaramanga, Santander.

Impacto:

Con la ejecución del contrato se genera un impacto directo en la mejora de la red vial rural del municipio de Bucaramanga, garantizando la disponibilidad de maquinaria amarilla, volquetas y vehículos necesarios para la atención oportuna de actividades de mantenimiento, rehabilitación y contingencias derivadas de fenómenos climáticos en los 3 corregimientos del municipio de Bucaramanga, trabajando de manera simultánea con el fin de atender al en el menor tiempo a toda la población rural


Esta intervención fortalece la conectividad de las comunidades rurales con el casco urbano, reduciendo tiempos de desplazamiento, facilitando el acceso a la educación, la salud y el comercio, y promoviendo la competitividad del sector agrícola al optimizar el transporte de productos hacia los centros de comercialización o los denominados mercadillos de los fines de semana.

De igual forma, contribuye a la seguridad vial realizando la intervención de tramos críticos que representan riesgo de accidentalidad o que se encuentran con posibilidad de derrumbe de manera que con esto se vincule a toda la población rural al gobierno municipal y se fortalece la capacidad institucional de la Secretaría de Infraestructura para cumplir las metas establecidas en el Plan de Desarrollo “Bucaramanga Avanza Segura 2024–2027”

ESTADO DEL CONTRATO:

El contrato es a monto agotable y se ejecuta de acuerdo a las rutas indicadas por la comunidad tal como se puede ver en las siguientes imágenes:



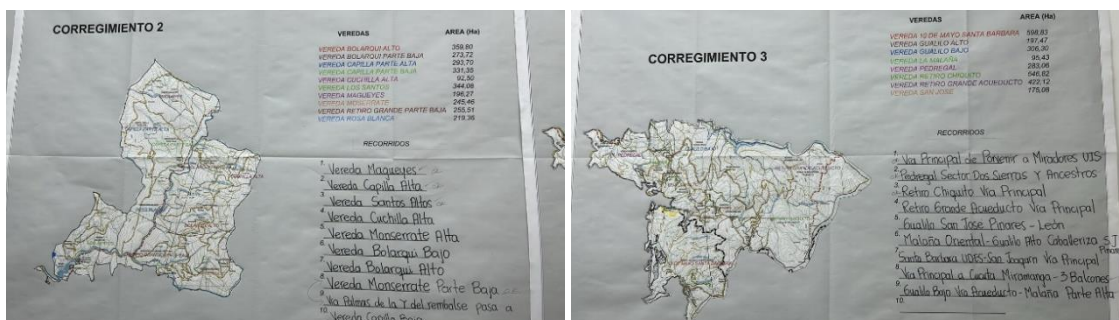

De manera que las labores han sido programadas con el banco de maquinaria conformado de la siguiente manera:

FRENTE DE TRABAJO CORREGIMIENTO UNO (1)

Motoniveladora - potencia 140kw
Retroexcavadora cargadora de llantas 420-potencia 70kw
Vibro compactador autopropulsado de rodillo sencillo 6,6 tn
Vibro compactador de rodillo de 10 t
Vibro compactador de rodillo de 3tn
minicargador 242 potencia 55,4kw-con martillo hidráulico compatible
Retroexcavadora 320-potencia 117kw
volqueta de 6m3
camioneta pick up 4x4 doble cabina

FRENTE DE TRABAJO CORREGIMIENTO DOS (2)

Motoniveladora - potencia 140kw
Retroexcavadora cargadora de llantas 420-potencia 70kw
Vibro compactador autopropulsado de rodillo sencillo 6,6 tn
Vibro compactador autopropulsado de rodillo de 10 t
Vibro compactador autopropulsado de rodillo de 3tn
minicargador 242 potencia 55,4kw-con martillo hidráulico compatible
Retroexcavadora 320-potencia 117kw
volqueta de 6m3
camioneta pick up 4x4 doble cabina

FRENTE DE TRABAJO CORREGIMIENTO TRES (03)

Retroexcavadora cargadora de llantas 420-potencia 70kw
Vibro compactador autopropulsado de rodillo sencillo 6,6 tn
Vibro compactador autopropulsado de rodillo de 10 t
Vibro compactador autopropulsado de rodillo de 3tn
minicargador 242 potencia 55,4kw-con martillo hidráulico compatible
Retroexcavadora 320-potencia 117kw
volqueta de 6m3
camioneta pick up 4x4 doble cabina



En este sentido en la atención inmediata de los corregimientos, la Administración Municipal ha materializado en la disposición de maquinaria amarilla y vehículos especializados, cuyo registro de operación refleja la magnitud del trabajo adelantado.

De manera que a la fecha ya se han atendido los sectores:

CORREGIMIENTO - 1	CORREGIMIENTO - 2	CORREGIMEINTO - 3
EL ABURRIDO	BOLARQUI ALTO	SANTA BARBARA
EL PABLON	BOLARQUI PARTA BAJA	GUALILO ALTO
LA ESMERALDA	CAPILLA PARTE ALTA	GUALILO BAJO
LA SABANA	CAPILLA PARTE BAJA	LA MALAÑA
SAN IGNACIO	CUCHILLA ALTA	PEDREGAL
SAN PEDRO ALTO	LOS SANTOS	RETIRO CHIQUITO
SAN PEDRO BAJO	MAGUEYES	RETIRO GRANDE
	RETIRO GRANDE	SAN JOSE

A continuación, se presentan imágenes de las actividades realizadas



RESUMEN DE INTERVENCIÓN EN ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DESPEJE DE VIAS POR OBSTRUCCIÓN, POR LLUVIAS SOBRE LAS VÍAS RURALES Y ZONAS URBANAS AFECTADAS. (OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2025) CON MAQUINARIA PROPIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

OCTUBRE 2025

FECHA	Vereda-Barrio	Tramo Intervenido	Corregimiento - Urbano	Horas Máquina Invertida	CANTIDAD m3	Km Intervenido	Actividades Realizadas
oct-25							
octubre 01 2025	Ingesan Vía a Matanza - Vereda Sta. Rita	Santa Rita	C1	0	14	0	Transporte de material para Placa Huellas Vereda Santa Rita IE
octubre 07 2025	Ingesan Vía a Matanza - Vereda Sta. Rita	Santa Rita	C1	0	7	0	Transporte de material para Placa Huellas Vereda Santa Rita IE



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA

octubre 08 2025	Vereda Vijagual - Vereda San Cayetano	Ramal IE Vijagual - V. San Cayetano	C1	5,5	60	0,1	Cargue de material arena, triturado y base. Nivelación replanteo, extendido de material, alistamiento de terreno para Placa Huella.
octubre 08 2025	Ingesan Vía a Matanza - Vereda Sta. Rita	Santa Rita	C1	0	14	0	Transporte de material para Placa Huella Vereda Santa Rita IE
octubre 09 2025	Carrera 13 41-33	Centro Urbano	Urbano	1	6	0	Cargue y Transporte de escombros hasta Carrasco Municipal
octubre 09 2025	Calle 37 7-31	Taller Municipal	Urbano	1	2	0	Cargue de escombros en Taller Municipal hasta Carrasco Municipal
octubre 15 2025	Vereda Vijagual - Vereda San Cayetano	Ramal IE Vijagual - V. San Cayetano	C1	4,1	46	0	Cargue de material arena, triturado y base. Nivelación replanteo, extendido de material, alistamiento de terreno para Placa Huella.
octubre 17 2025	Calle 5N 17B-38	Cancha La Bombonera Norte	Urbano	0	14	0	Apoyo cargue y Transporte de escombros desde cancha La Bombonera al Norte hasta El Carrasco.
octubre 20 2025	Vereda Vijagual - Vereda San Cayetano	Ramal IE Vijagual - V. San Cayetano	C1	0,7	5	0,1	Extendido de material y apoyo a Placa Huella.
octubre 21 2025	Vijagual C1 - CDI La Inmaculada Cra. 55W 39-38	Paso malo Anillo Vial IE Villas de San Ignacio	Urbano	1,1		0	
octubre 22 2025				4,9		0	
octubre 22 2025	Vía El Bueno - B. Porvenir	Provincia de Soto 1-2 Vía El Bueno - B. Porvenir	Urbano	6,5		0	
			TOTAL MES OCTUBRE	24,8	168	0,2	
				TOTAL HORAS DE	TOTAL m3	TOTAL KILOMETROS	



				INTERVENCIÓN		INTERVENIDOS	
			ACUM. MP OCT	419	3363	37,21	

ACTUALIZADO ACUMULADO (octubre 2025)

ACUMULADO MP + MA MP MAQ. PROPIA MA MAQ. ALQUILADA	MAQUINARIA ALCALDÍA DE BUCARAMANGA	37,21	KM
	MAQUINARIA ALQUILADA Informado octubre 2025 (0,0 km octubre 2025 Km)	158,30	KM
	TOTAL KM INTERVENIDOS 2025	195,51	KM



NOVIEMBRE 2025

FECHA	Vereda- Barrio	Tramo Intervenido	Corregimiento - Urbano	Horas Máquina Invertida	CANTIDAD m3	Km Intervenido	Actividades Realizadas
nov-25							
noviembre 06 2025	Actividad recolección de material al borde de la vía y canaleta colmatada en sentido Girón - Bucaramanga Calle 65 cra 7 Barrio Bucaramanga,	Calle 65 cra 7 Barrio Bucaramanga,	Urbano	0	7	0	Actividad recolección de material al borde de la vía y canaleta colmatada en sentido Girón - Bucaramanga Calle 65 cra 7 Barrio Bucaramanga, posterior transporte a El Carrasco, equipos requeridos Volqueta y Minicargador
noviembre 11 2025	San Pedro Bajo C1	Vía San Pedro Bajo	C1	0	7	0	Cargue de material para Vereda San Pedro para Placa Huella un viaje arena 6m3 (11/11/2025)






ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA

noviembre 12 2025	San Pedro Bajo C1	Vía San Pedro Bajo	C1	0	12	0	Cargue de material 12m3 de arena para Vereda San Pedro para Placa Huella (12/11/2025)
noviembre 13 2026	Espacio Público carrera 11A-1, Carrera 22, zona norte	Espacio Público carrera 11A-1, Carrera 22, zona norte	Urbano	0		0	Solicitud acción preventiva Desalojo en espacio Público carrera 11A-1, Carrera 22, zona norte (13/11/2025)
noviembre 13 2027	San Pedro Bajo C1	Vía San Pedro Bajo	C1	0	12	0	Cargue de material dos viajes 12 m3 triturado para Vereda San Pedro para Placa Huella (13/11/2025)
noviembre 14 2028	Acompañamiento Acción Preventiva Espacio Público carrera 11A-1, Carrera 22, zona norte	carrera 11A-1, Carrera 22, zona norte	Urbano	1,2	6	0	Acompañamiento y ejecución de volqueta y Minicargador en apoyo a acción preventiva en carrera 11a-1, carrera 22
noviembre 18 2025	Vereda San Pedro C1	Vía San Pedro Bajo C1 - Ramal San Luis IE San Pedro Bajo C1	C1	7,3	66	0	Despeje de zona por lluvias en la vía San Pedro Bajo C1 - Ramal San Luis IE San Pedro Bajo C1, cargue de material, relleno de cárcavas, replanteo nivelación y cuneteo.
noviembre 19 2025	Tejar 1 y Tejar 2 Sector Norte	Tejar 1 y Tejar 2 Sector Norte	Urbano	0	7	0	Apoyo con Volqueta recogida de material inservibles en Tejar 1 y Tejar 2 Sector Norte, traslado de material a El Carrasco un viaje de escombros inservibles 7m3 (19/11/2025)
noviembre 20 2025	San Pedro Bajo C1	Vía San Pedro Bajo	C1	0	18	0	Cargue de material tres viajes 18m3 piedra y cascajo para Vereda San Pedro para Placa Huella (20/11/2025)
noviembre 20 2026	Vereda San Pedro C1	Vía San Pedro Bajo C1 - Ramal San Luis IE San Pedro Bajo C1	C1	0		0,25	Nivelación replanteo vía IE San Pedro Bajo - Ramal San Luis Vereda San Pedro Bajo. 0,25 Km (20/11/2025)
noviembre 24 2025	Vereda San Pedro C1	Vía San Pedro Bajo	C1	0	6	0	Cargue de material volqueta OSA 868 un viaje 6m3 cascajo para Vereda San Pedro para Placa Huella (24/11/2025)
noviembre 25 2025	Vereda San Pedro C1	Vía San Pedro Bajo	C1	0	18	0	Cargue de material tres viajes volqueta OSA 868 18m3 arena y cascajo para Vereda San Pedro para Placa Huella (25/11/2025)
noviembre 27 2025	Vereda San Ignacio C1	Vía San Ignacio	C1	0	42	0	Apoyo de cargue de tierra sobre excavación para muro de contención Vereda San Ignacio C1 7 viajes 42m3 de tierra movidos (27/11/2025)
noviembre 27 2025	Barrio Miradores de la UIS	Miradores de la UIS	Urbano	0	6	0	Cargue transporte y disposición de un viaje de Fresado 6m3 para Barrio Miradores de la UIS (27/11/2025)
noviembre 28 2025	Vereda San Ignacio C1	Vía San Ignacio	C1	0	48	0	Apoyo de cargue de tierra sobre excavación para muro de contención Vereda San Ignacio C1, 8 viajes 48m3 de tierra movidos (28/11/2025)
			TOTAL MES NOVIEMBRE	8,5	255	0,25	
				TOTAL HORAS DE INTERVENCIÓN	TOTAL m3	TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS	
			ACUM. NOV.	427,5	3618	37,46	



ACTUALIZADO ACUMULADO (noviembre 2025)

MAQUINARIA ALCALDIA DE BUCARAMANGA		37,46	KM
MAQUINARIA ALQUILADA Informado noviembre 2025 (0,0 km noviembre 2025 Km)		158,30	KM
TOTAL KM INTERVENIDOS 2025		195,76	KM

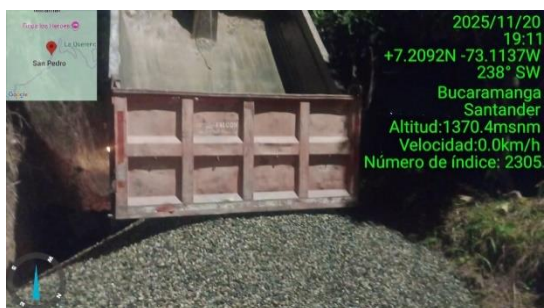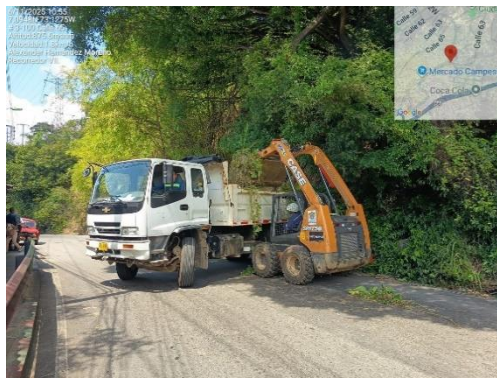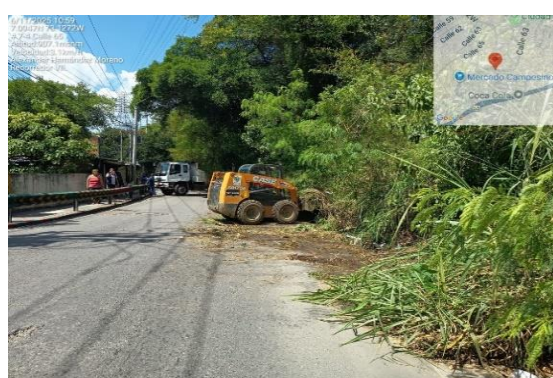



DICIEMBRE 2025

FECHA	Vereda-Barrio	Tramo Intervenido	Corregimiento - Urbano	Horas Máquina Invertida	CANTIDAD m3	Km Intervenido	Actividades Realizadas
dic-25							
diciembre 03 2025	San Pedro bajo Ramal San Luis	San Pedro Bajo Ramal San Luis	C1	6,3	7	0,5	Despeje de derrumbe sobre la vía, replanteo nivelación extendido de material. Cuneteo y habilitación de paso vehicular
diciembre 05 2025	San Pedro bajo Ramal San Luis	San Pedro Bajo Ramal San Luis	C1	5,8	0	0,55	Despeje de derrumbe sobre la vía, replanteo, nivelación extendido de material. Cuneteo y habilitación de paso vehicular
diciembre 05 2025	Taller Municipal - Col. Santo Ángel -IE Dámaso Zapata - V. Angelinos - V. Bolarquí	Taller Municipal - Col. Santo Ángel -IE Dámaso Zapata - V. Angelinos Bosconia - V. Bolarquí	Urbano - C1 - C2	0	8	0	Traslado de materiales de apoyo a Grupo de mantenimientos de Sec. Infraestructura
diciembre 08 2025	V. Rosa Blanca	Vía a Matanza. V. Rosa Blanca	C2	0	42	0	Despeje de derrumbe , cargue y transporte de material para habilitar paso vehicular.
diciembre 09 2025	Barrio Estoraques	Vías internas Barrio Estoraques	Urbano	4,6	0	0,295	Excavación, replanteo, nivelación cargue de material sobrante, extendido de fresado.
diciembre 09 2026	Barrio Estoraques	Vías internas Barrio Estoraques	Urbano	7,5	0	0,322	Excavación, replanteo, nivelación cargue de material sobrante, extendido de fresado.
diciembre 09 2026	Barrio Estoraques	Vías internas Barrio Estoraques	Urbano	0	0	0,322	Excavación, replanteo, nivelación cargue de material sobrante, extendido de fresado.



diciembre 11 2025	IE Dámaso Zapata - IE Santo Ángel	IE Dámaso Zapata - IE Santo Ángel	Urbano	0	3	0	Traslado de láminas de teja de zinc de cerramiento.
diciembre 11 2025	San Pedro bajo Ramal San Luis	San Pedro Bajo Ramal San Luis	C1	8,5	0	0,55	Despeje de derrumbe sobre la vía, replanteo, nivelación, extendido de material. Cuneteo y habilitación de paso vehicular
diciembre 12 2025	Barrio Estoraques	Vías internas Barrio Estoraques	Urbano	2,9	0		Excavación, replanteo, nivelación cargue de material sobrante, extendido de fresado.
			TOTAL MES DICIEMBRE	35,6	60	2,54	
				TOTAL HORAS DE INTERVENCIÓN	TOTAL m3	TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS	
			ACUM. DIC.	442,9	3706	61,63	

ACTUALIZADO ACUMULADO (diciembre 2025)

MAQUINARIA ALCALDIA DE BUCARAMANGA	40,00	KM
MAQUINARIA ALQUILADA Informado diciembre 2025 (0,0 km diciembre 2025 Km)	158,30	KM
TOTAL KM INTERVENIDOS 2025	198,30	KM





META E INDICADOR DE PRODUCTO: Construir 5.000 metros lineales de placa huella en la zona rural

Indicador	Meta 2025	Logro 2025	% Avance 2025	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuesta I
Placa huella construida	4.000	3049	76%	\$ 9.522.592.280	\$ 8.512.307.598	89%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES A TRAVES DE PLACA HUELLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	2024680010253	\$ 9.522.592.280	\$ 9.522.592.280

Descripción de actividades desarrolladas

Contrato 109 del 13 de junio de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-009-2025 con el objetivo de “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ROSA BLANCA DEL CORREGIMIENTO DOS (2), MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y ALCANTARILLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER”

Valor del contrato: \$410.000.000,00

Valor del Anticipo: N/A

Plazo inicial: 4 meses

Fecha de Inicio: 4 de agosto de 2025

Fecha de terminación: 3 de diciembre de 2025

Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación

Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Rosa Blanca, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 2 del municipio Bucaramanga.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de la vereda Rosa Blanca y veredas aledañas.



Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.



Placa Huella en la Vereda Rosa Blanca

Contrato 069 del 09 de mayo de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-005-2025 con el objetivo de “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **MONSERRATE Y RETIRO GRANDE** DEL CORREGIMIENTO DOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER”

Valor del contrato: \$410.000.000,00

Valor del Anticipo: N/A

Plazo inicial: 4 meses

Plazo con prórrogas: 6 meses

Suspensión: 15 días

Fecha de Inicio: 26 de mayo de 2025

Fecha de terminación: 10 de diciembre de 2025

Estado del contrato: En ejecución – En suspensión temporal

Porcentaje Avance físico ejecutado: 70%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Monserrate y Retiro Grande, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 2 del municipio Bucaramanga.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de la vereda Monserrate y Retiro Grande y veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias.



Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.



Placa Huella en la Vereda Monserrate y Retiro Grande

Contrato 113 del 13 de junio de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-006-2025 con el objetivo de “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **MAGUEYES** DEL CORREGIMIENTO DOS, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias a través de la construcción de placa huellas y alcantarillas en el sector rural del municipio de Bucaramanga - Santander”

Valor del contrato: \$410.000.000,00

Valor del Anticipo: N/A

Plazo inicial: 4 meses

Plazo con Prórroga: 5 meses

Fecha de Inicio: 14 de julio de 2025

Fecha de terminación: 13 de diciembre de 2025

Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación

Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Magueyes, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 2 del municipio Bucaramanga.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de la vereda Magueyes y veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.



Placa Huella en la Vereda Magueyes

Contrato 072 del 09 de mayo de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-003-2025 con el objetivo de “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **LA CAPILLA** DEL CORREGIMIENTO DOS (2) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS Terciarias a través de la construcción de placa huellas y alcantarillas en el sector rural del municipio de Bucaramanga, Santander”

Valor del contrato: \$410.000.000,00

Valor del Anticipo: N/A

Plazo inicial: 4 meses

Plazo con Prórroga: 5 meses

Fecha de Inicio: 20 de mayo de 2025

Fecha de terminación: 19 de octubre de 2025

Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación

Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda La Capilla, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 2 del municipio Bucaramanga.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de la vereda La Capilla y veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.



Placa Huella en la Vereda La Capilla

Contrato 110 del 13 de junio de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-008-2025 con el objetivo de “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **CUCHILLA ALTA** DEL CORREGIMIENTO DOS (2), DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER”

Valor del contrato: \$410.000.000,00

Valor del Anticipo: N/A

Plazo inicial: 4 meses

Plazo con Prórroga: 4 meses y 20 días

Fecha de Inicio: 12 de agosto de 2025

Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2025

Estado del contrato: En Ejecución

Porcentaje Avance físico ejecutado: 81%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Cuchilla Alta, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 2 del municipio Bucaramanga.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de la vereda Cuchilla Alta y veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.



Placa Huella en la Vereda Cuchilla Alta

Contrato 070 del 09 de mayo de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-004-2025 con el objetivo de “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **LOS ANGELINOS SECTOR LA CEMENTO** DEL CORREGIMIENTO UNO (1), DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER”

Valor del contrato: \$410.000.000,00

Valor del Anticipo: N/A

Plazo inicial: 4 meses

Plazo con Prórroga: 5 meses

Fecha de Inicio: 20 de mayo de 2025

Fecha de terminación: 19 de octubre de 2025

Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación

Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Los Angelinos Sector La Cemento, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 1 del municipio Bucaramanga.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de la vereda Los Angelinos Sector La Cemento y veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.



Placa Huella en la Vereda Los Angelinos Sector La Cemento

Contrato 112 del 13 de junio de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-010-2025 con el objetivo de “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **VIJAGUAL** DEL CORREGIMIENTO UNO (1), DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER”

Valor del contrato: \$410.000.000,00

Valor del Anticipo: N/A

Plazo inicial: 4 meses

Fecha de Inicio: 14 de julio de 2025

Fecha de terminación: 13 de noviembre de 2025


Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación

Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Vijagual, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 1 del municipio Bucaramanga.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de la vereda Vijagual y veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.

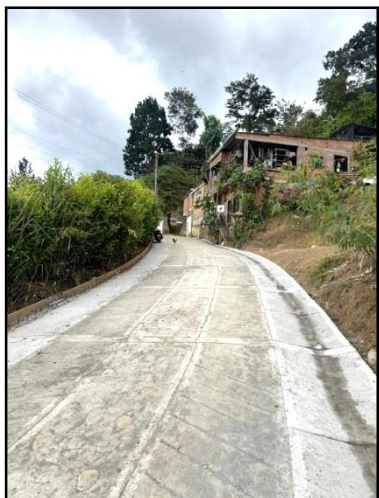

Placa Huella en la Vereda Vijagual

Contrato 111 del 13 de junio de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-007-2025 con el objetivo de “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **SANTA RITA SECTOR CEYLAN MONTECRISTO** DEL CORREGIMIENTO UNO (1) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER”

Valor del contrato: \$410.000.000,00

Valor del Anticipo: N/A

Plazo inicial: 4 meses

Plazo con Prórroga: 5 meses

Fecha de Inicio: 18 de julio de 2025

Fecha de terminación: 17 de diciembre de 2025


Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación

Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Santa Rita Sector Ceylan Montecristo, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 1 del municipio Bucaramanga.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de la vereda Santa Rita Sector Ceylan Montecristo y veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.

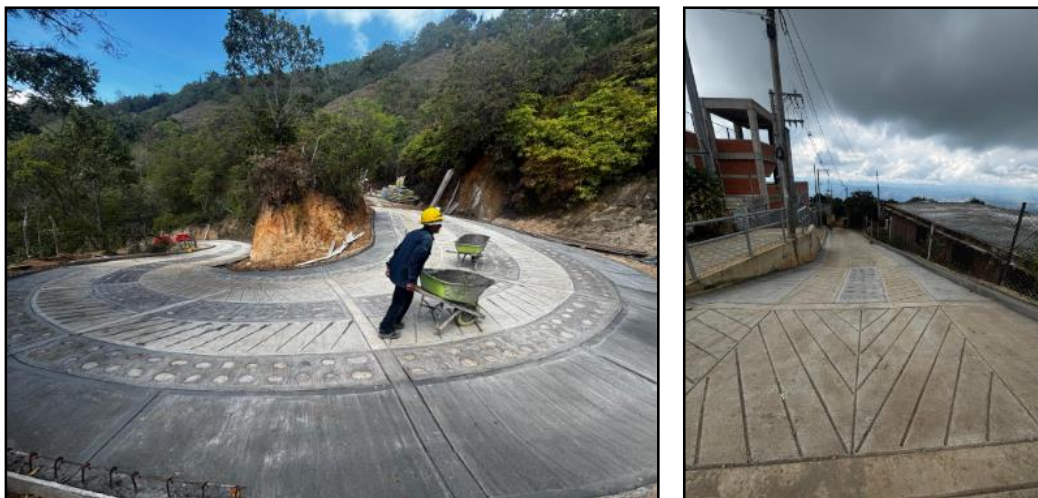

Placa Huella en la Vereda Santa Rita Sector Ceylan Montecristo

Contrato 071 del 09 de mayo de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-002-2025 con el objetivo de “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **SANTA BARBARA SECTOR BAJO LA UDES SAN JOAQUIN**, DEL CORREGIMIENTO TRES (3) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y ALCANTARILLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”

Valor del contrato: \$410.000.000,00

Valor del Anticipo: N/A

Plazo inicial: 4 meses

Plazo con Prórroga: 5 meses

Fecha de Inicio: 20 de mayo de 2025

Fecha de terminación: 19 de octubre de 2025

Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación

Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Santa Barbara Sector Bajo La Udes San Joaquin, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 3 del municipio Bucaramanga.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de la vereda Santa Barbara Sector Bajo La Udes San Joaquin y veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.



Placa Huella en la Vereda Santa Barbara Sector Bajo La Udes San Joaquin

Contrato 068 del 09 de mayo de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-001-2025 con el objetivo de “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **SAN CAYETANO Y SANTA RITA**, DEL CORREGIMIENTO UNO (1) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER”

Valor del contrato: \$410.000.727,00

Plazo inicial: 4 meses

Fecha de Inicio: 20 de mayo de 2025

Fecha de terminación: 19 de septiembre de 2025


Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación

Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda San Cayetano, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 1 del municipio Bucaramanga.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de la vereda San Cayetano y veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.

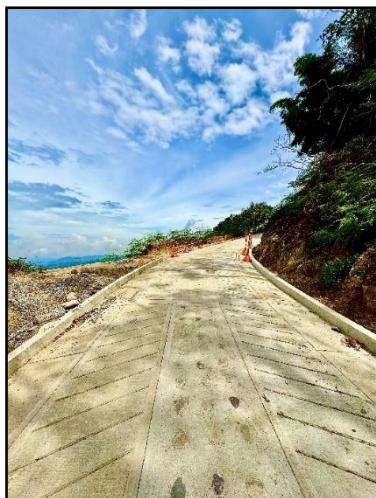

Placa Huella en la Vereda San Cayetano y Santa Rita

Contrato 210 del 04 de septiembre de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-011-2025 con el objetivo de “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **GUALILO PARTE ALTA** DEL CORREGIMIENTO TRES, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias a través de la construcción de placa huellas y alcantarillas en el sector rural del Municipio de Bucaramanga – Santander”

Valor del contrato: \$410.000.000,00

Valor del Anticipo: N/A

Plazo inicial: 3 meses y 15 días

Fecha de Inicio: 18 de septiembre de 2025

Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2025

Estado del contrato: En ejecución

Porcentaje Avance físico ejecutado: 70%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Gualilo Parte Alta, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 3 del municipio Bucaramanga.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de la vereda Gualilo Parte Alta y veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.



Placa Huella en la Vereda Gualilo Parte Alta

Contrato 211 del 04 de septiembre de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-016-2025 con el objetivo de “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE **SAN PEDRO ALTO** DEL CORREGIMIENTO UNO (1) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y ALCANTARILLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”

Valor del contrato: \$328.790.410

Valor del Anticipo: N/A

Plazo inicial: 3 meses y 15 días

Fecha de Inicio: 18 de septiembre de 2025

Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2025

Estado del contrato: En ejecución

Porcentaje Avance físico ejecutado: 51%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda San Pedro Alto, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 1 del municipio Bucaramanga.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de la vereda San Pedro Alto y veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.



Placa Huella en la Vereda San Pedro Alto

Contrato 212 del 04 de septiembre de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-013-2025 con el objetivo de “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL **PEDREGAL** DEL CORREGIMIENTO TRES (3) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER”

Valor del contrato: \$762.467.825

Valor del Anticipo: N/A

Plazo inicial: 3 meses y 15 días

Fecha de Inicio: 18 de septiembre de 2025

Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2025

Estado del contrato: En ejecución

Porcentaje Avance físico ejecutado: 38%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Pedregal, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 3 del municipio Bucaramanga.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de la vereda Pedregal y veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.



Placa Huella en la Vereda Pedregal

Contrato 213 del 04 de septiembre de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-012-2025 con el objetivo de “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **SAN JOSE** DEL CORREGIMIENTO TRES (3) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER”

Valor del contrato: \$762.467.825

Valor del Anticipo: N/A

Plazo inicial: 3 meses y 15 días

Fecha de Inicio: 18 de septiembre de 2025

Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2025

Estado del contrato: En ejecución

Porcentaje Avance físico ejecutado: 55%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda San José, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 3 del municipio Bucaramanga.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de la vereda San José y veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.



Placa Huella en la Vereda San José

Contrato 214 del 04 de septiembre de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-015-2025 con el objetivo de “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **EL ABURRIDO PARTE ALTA**, DEL CORREGIMIENTO UNO (1) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias a través de la construcción de placa huellas y alcantarillas en el sector rural del municipio de Bucaramanga, Santander”

Valor del contrato: \$ 352.467.825

Valor del Anticipo: N/A

Plazo inicial: 3 meses y 15 días

Fecha de Inicio: 22 de septiembre de 2025

Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2025

Estado del contrato: En ejecución

Porcentaje Avance físico ejecutado: 16%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda El Aburrado Parte Alta, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 1 del municipio Bucaramanga.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de la vereda El Aburrado Parte Alta y veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.



Placa Huella en la Vereda El Aburrido Parte Alta

Contrato 220 del 12 de septiembre de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-014-2025 con el objetivo de “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **LOS SANTOS PARTE ALTA** DEL CORREGIMIENTO DOS (2) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER”

Valor del contrato: \$762.467.825

Valor del Anticipo: N/A

Plazo inicial: 3 meses y 15 días

Fecha de Inicio: 23 de septiembre de 2025

Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2025

Estado del contrato: En ejecución

Porcentaje Avance físico ejecutado: 18%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Los Santos Parte Alta, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 2 del municipio Bucaramanga.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de la vereda Los Santos Parte Alta y veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.



Placa Huella en la Vereda Los Santos Parte Alta

SECTOR: Vivienda Ciudad y Territorio

PROGRAMA: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Beneficiar a 289.645 usuarios con subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en los estratos 1, 2 y 3.

Indicador	Meta 2025	Logro 2025	% Avance 2025	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuesta I
Usuarios beneficiados con subsidios al consumo	289.645	289.645	100%	\$ 10.725.683.783	\$ 9.115.229.597	85%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Subsidios a los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a la población de estratos 1, 2 y 3 del Municipio de Bucaramanga.	2024680010048	\$ 9.629.401.646	\$ 37.914.658.856

Descripción de actividades desarrolladas

Durante el cuarto trimestre de la presente vigencia la Secretaria de Infraestructura continúa realizando el pago de los subsidios a las diferentes empresas de servicios públicos, facturación enviada por la Unidad Técnica de Servicios Públicos detalle acumulado por empresas así:

EMPRESA	VALOR PAGADO
ACUEDUCTO	\$ 3.549.676.648
EMPAS	\$ 1.234.518.156
EMAB	\$ 3.941.015.966
LIMPIEZA URBANA	\$ 329.400.939
VEOLIA	\$ 60.617.888
VALOR TOTAL	\$ 9.115.229.597



META E INDICADOR DE PRODUCTO: Transportar y entregar 18.000 metros cúbicos de Agua potable en carrotaques para garantizar el mínimo vital de agua en zonas sin cobertura del municipio.

Indicador	Meta 2025	Logro 2025	% Avance 2025	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Agua transportada y entregada	2400	3836	100%	\$ 200.000.000	\$ 0	0%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Suministro de agua potable para garantizar la cobertura del mínimo vital de agua a los sectores de los corregimientos 1, 2, y 3 del Municipio de Bucaramanga, Santander	2024680010053	\$ 188.055.514	\$ 188.055.514

Descripción de actividades desarrolladas

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 134 DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 “SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA GARANTIZAR LA COBERTURA DEL MINIMO VITAL DE AGUA A LOS SECTORES DE LOS CORREGIMIENTOS 1, 2, 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

NÚMERO DEL CONVENIO:	134
FECHA DEL CONTRATO:	20/09/2024
TIPOLOGÍA DEL CONTRATO O CONVENIO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
MODALIDAD DE SELECCIÓN DE CONTRATO:	CONTRATACIÓN DIRECTA
CONTRATISTA	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. ESP
OBJETO:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA GARANTIZAR LA COBERTURA DEL MINIMO VITAL DE AGUA A LOS SECTORES DE LOS CORREGIMIENTO 1,2,3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
PLAZO EJECUCIÓN:	3 MESES Y QUINCE (15) DÍAS
VALOR INICIAL:	\$188.055.514
FECHA DE INICIO	16 DE OCTUBRE DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE DEL 2024
FECHA SUSPENSIÓN N°. 01	20 DE DICIEMBRE DEL 2024
FECHA DE REINICIO No 1	17 DE FEBRERO DE 2025



NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN

26 DE DICIEMBRE DE 2025

Estado del Contrato
Porcentaje avance

: TERMINADO
: 100%

Ubicación:

- Vereda Chiltota.
- Asentamiento Villa Carmelo
- El porvenir, Los cuadros.
- Vereda San Ignacio.

Impacto: Este proyecto impacta a 682 familias del sector rural del Municipio de Bucaramanga

Beneficios para la Comunidad:

El artículo 2 de la constitución Política de Colombia, establece que son fines esenciales del estado; servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitución; facilita la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia política y la vigilancia de un orden justo(...)



Imagen No 1. Suministro de agua potable
Villa Carmelo



Imagen No 2. Vereda los santos bajos



Imagen No 3. Vereda Chitota





Imagen No 4. Vereda Los Cuadros



Imagen No 5. Estacion Carabineros

3. LINEA ESTRATEGICA. TERRITORIO SEGURO Y SOSTENIBLE

SECTOR: Vivienda Ciudad y Territorio

PROGRAMA: Ordenamiento Territorial y Desarrollo urbano

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Adecuar 300,000 metros cuadrados de espacio público.

Indicador	Meta 2025	Logro 2025	% Avance 2025	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Espacio público adecuado	40.000	30.724	77%	\$ 27.918.724.650	\$ 21.800.394.095	79%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Mejoramiento del espacio público (plazoleta Luis Carlos galán y parque García Rovira) enmarcado dentro de la estrategia "plan centro" en el municipio de Bucaramanga, Santander (fase 2)	2022680010049	\$ 0	\$ 14.765.777.919,79



Descripción de actividades desarrolladas

Contrato 396 – 2022 “MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN LA PLAZOLETA LUIS CARLOS GALÁN Y PARQUE GARCIA ROVIRA ENMARCADOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA "PLAN CENTRO" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.”

Valor Inicial:	\$10.995.207.368
Valores adicionales:	\$ 3.770.570.551,79
Valor Total	\$ 14.765.777.919,79
Plazo Inicial:	OCHO (08) MESES
Fecha Inicial:	06 de marzo de 2023
Fecha Final:	17 de enero de 2025
Plazo Final:	Veinte (20) Meses y un (01) día
Estado del Contrato:	Liquidado.
Porcentaje de Avance:	100%

ESTADO DEL CONTRATO: El proyecto contempló la intervención de:

Plazoleta: Entrega de Bancas en concreto, materas en concreto, pasamanos, luminaria nueva, mantenimiento de la piedra Barichara.

Parque: Entrega de bancas con espaldar en madera, polígonos de zonas verdes reformados, mantenimiento a losas en concreto. Siembra de especies nativas y mantenimiento de zonas verdes.

Vías :Entregamos la calle 37 desde la carrera 9 hasta la carrera 11 en concreto rígido (esquina de la iglesia San Laureano), entregamos calle 36 entre carrera 10 y 12 en concreto rígido con separador en zona verde, bolardos en el perímetro de la vía, entregamos calle 35 desde la carrera 9 hasta la 11 en concreto rígido (esquina parqueadero subterráneo), entregamos la carrera 10 entre las calles 34 a la 37, entregamos la carrera 11 entre las calles 37 a la 34 en concreto rígido, entregamos la carrera 12 entre las calles 34 a la 36 en concreto rígido,

Andenes: Se entregan todos los andenes aledaños a estas vías y esta zona en piedra sinu veta.

Actividades complementarias: Cambio de redes de alcantarillado a tubería estructural corrugada. Construcción de cajas eléctricas para la soterranización de redes. Mejoramiento de la señalización vial (Horizontal, vertical)





Estado final del Parque García Rovira



Estado final de la Plazoleta Luis Carlos Galán



Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL EN LA CARRERA 26 (PASEO ESPAÑA) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER	2022680010054	\$ 5.907.177.515,24	\$ 9.072.944.903,00
	202500000019302	\$ 2.740.728.019,29	\$ 2.740.728.019,29

Descripción de actividades desarrolladas

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 387 DE 2022: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA “CENTRO CAMINABLE “EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER

CONTRATISTA: COINOBRAS S.A.S.
NIT. 804.000.152-8
MILTON VILLARREAL MURILLO

VALOR INICIAL: \$9.072.944.903,00
ANTICIPO (30%): N/A
VALOR ADICIONAL: \$2.075.728.019,29
VALOR ACUMULADO: \$11.148.672.710,47
PLAZO INICIAL: 10 MESES
PRORROGA No. 1: 5 MESES
PRORROGA No. 2: 30 DÍAS
PRORROGA No. 3: 7 MESES
PRORROGA No.4: 45 DIAS
PLAZO TOTAL: 24 MESES Y 15 DIAS
INTERVENTORÍA: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
NIT: 890.201.213-4

FECHA DE INICIO: 01 DE AGOSTO DE 2024
SUSPENSIÓN 1: SUSPENDER POR EL TÉRMINO DE (01) UN MES Y (02) DOS DIAS DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 28 DE ENERO DE 2025 Y/O CUANDO SE SUPEREN LAS CAUSAS DE LA SUSPENSION.

AMPLIACION A LA SUSPENSIÓN No. 1: SUSPENDER POR EL TÉRMINO DE (15) QUINCE DIAS DEL 29 DE ENERO DE 2025 AL 12 DE FEBRERO DE 2025 Y/O CUANDO SE SUPEREN LAS CAUSAS DE LA SUSPENSION.

AMPLIACIÓN No.2 A LA SUSPENSIÓN N°1: SUSPENDER POR EL TÉRMINO DE (14) CATORCE DIAS DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 AL 26 DE FEBRERO DE 2025 Y/O CUANDO SE SUPEREN LAS CAUSAS DE LA SUSPENSION.

AMPLIACIÓN No.3 A LA SUSPENSIÓN N°1: SUSPENDER POR EL TÉRMINO DE (05) DIAS DEL 27 DE FEBRERO DE 2025 AL 03 DE MARZO DE 2025 Y/O CUANDO SE SUPEREN LAS CAUSAS DE LA SUSPENSION.

REINICIO N°1: SE REINICIÓ EL CONTRATO EL DIA 04 DE MARZO DE 2025 Y EN CONSECUENCIA LA FINALIZACIÓN ES EL DIA 13 DE MARZO DE 2025.

PRORROGA No. 1: PRÓRROGA DE (15) QUINCE DIAS APARTIR DE 14 DE MARZO DE 2025 AL 28 DE MARZO DE 2025

PRORROGA No. 2: PRÓRROGA DE (15) QUINCE DIAS APARTIR DE 29 DE MARZO DE 2025 AL 12 DE ABRIL DE 2025



PRORROGA No. 3

PRÓRROGA DE (07) MESES
APARTIR DE 13 DE ABRIL DE 2025 AL 12 DE
NOVIEMBRE DE 2025

PRORROGA No. 4

PRÓRROGA DE (45) DIAS
APARTIR DE 13 DE ABRIL DE 2025 AL 12 DE
NOVIEMBRE DE 2025

ESTADO DEL CONTRATO: ACTIVO

PORCENTAJE AVANCE FÍSICO: 90,78%

AVANCE FINANCIERO: 81,59%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato de obra se encuentra activo y en ejecución, la fecha de terminación es el día 27 de diciembre de 2025, a corte del 23 de diciembre de 2025 se tiene un avance físico de la obra de 90.78% y un avance financiero del 81,59%.

4 frentes terminados con actividades de acabados pendientes.

- Carrera 26 entre calles 32 y 33
- Carrera 26 entre calles 33 y 34
- Carrera 26 entre calles 34 y 35
- Carrera 26 entre calles 35 y 36

3 frentes en intervención con actividades de señalización horizontal y vertical.

- Carrera 26 entre calles 36 y 37
- Calle 37 entre carreras 26 y 27
- Calle 37 entre carreras 26 y 25

1 frente en intervención con actividades de replanteo de andén, instalación de loseta royal beta, construcción de caja de paso e instalación de postería y luminarias.

- Calle 37 entre carreras 25 y 26 esquina costado suroriental.

A continuación, se enuncian las principales actividades ejecutadas en el periodo del presente informe para cada frente de obra que hace parte del alcance actual del contrato, se realizaron actividades en 7 frentes.

- **Carrera 26 entre calles 32 y 33:** se realizó la instalación de postes y luminarias, cableado para alumbrado, instalación de señalización vertical y la demarcación de la señalización horizontal.
- **Carrera 26 entre calles 33 y 34:** se realizó la instalación de postes y luminarias, cableado para alumbrado, instalación de señalización vertical, la demarcación de la señalización horizontal. Se realizó la construcción de las cajas de paso en los extremos del pompeyano de la intersección de la calle 33.
- **Carrera 26 entre calles 34 y 35:** Se realizó la instalación de postes y luminarias, cableado para alumbrado, instalación de señalización vertical, la demarcación de la señalización horizontal. Se realizó la construcción de las cajas de paso en los extremos del pompeyano de la intersección de la calle 34, se realizó la instalación del sello asfáltico en los extremos del pompeyano de la intersección de la calle 34 para nivelación de las losas de MR construidas con el asfalto existente, construcción base de gabinete e instalación y puesta en funcionamiento de gabinete y contadores para red de alumbrado público.
- **Carrera 26 entre calles 35 y 36:** Se realizó la instalación de postes y luminarias, cableado para alumbrado, la instalación de señalización vertical, la demarcación de la señalización horizontal.
- **Carrera 26 entre calles 36 y 37:** Se realizó la intervención de los carriles externos de la intersección de la calle 36 (instalación de ductería, construcción de cajas de comunicaciones, cajas de barraje, cajas de alumbrado público, instalación de semáforos, instalación y adecuación de gabinete de semaforización, construcción de cajas de semaforización, cableado interconexión hasta red semaforización de cra 24, cableado para alumbrado público), intervención de andenes con instalación de bolardos, instalación de loseta royal beta en andenes y acceso vehicular, instalación de postes y luminarias, instalación de señalización vertical, la demarcación de la señalización horizontal.
- Se realizó la construcción de las cajas de paso en los extremos del pompeyano de la intersección de la calle 36, se realizó la instalación del sello asfáltico en los extremos



del pompeyano de la intersección de la calle 36 para nivelación de las losas de MR construidas con el asfalto existente, construcción de sumideros longitudinales tipo monoblock.

- **Calle 37 entre carreras 26 y 27:** Se realizó la intervención de la vía con la demolición de placa existente, excavaciones manual y mecánica para la instalación de ductería de alumbrado público, comunicaciones, media tensión, baja tensión, construcción de cajas de comunicaciones, cajas de alumbrado público, cajas de media tensión, caja de barrajes, instalación de sardinel para conformación de la vía, replanteo de la vía con base granular, construcción de sumidero transversal tipo EMPAS, construcción de cajas de inspección para conexión de sumideros, conexión de acometidas de red a presión a predios de la zona, construcción de pozos de inspección, cambio de red sanitaria principal, instalación de acero de refuerzo e instalación de concreto MR 42 en las placas de la vía, intervención de andenes con la instalación de loseta royal beta y loseta en concreto, instalación de bolardos, instalación de postes y luminarias, instalación de señalización vertical, la demarcación de la señalización horizontal.
- **Calle 37 entre carreras 26 y 25:** Se realizó la intervención de la vía con la demolición de placa existente, excavaciones manual y mecánica para la instalación de ductería de alumbrado público, comunicaciones, media tensión, baja tensión, construcción de cajas de comunicaciones, cajas de alumbrado público, cajas de media tensión, caja de barrajes, instalación de sardinel para conformación de la vía, replanteo de la vía con base granular, construcción de sumidero transversal tipo EMPAS, construcción de cajas de inspección para conexión de sumideros, conexión de acometidas de red a presión a predios de la zona, construcción de pozos de inspección, cambio de red sanitaria principal, instalación de acero de refuerzo e instalación de concreto MR 42 en las placas de la vía, intervención de andenes con la instalación de loseta royal beta y loseta en concreto, instalación de bolardos, instalación de postes y luminarias, instalación de señalización vertical, la demarcación de la señalización horizontal, construcción de sumideros longitudinales tipo monoblock, construcción caja de paso.

Durante el periodo del presente informe comprendido a partir del 01 de octubre de 2025 hasta el 23 de diciembre de 2025, se han realizado diferentes actividades así:


REGISTRO FOTOGRÁFICO



CARRERA 26 ENTRE CALLE 32 Y 33



CARRERA 26 ENTRE CALLE 32 Y 33 VISTA NORTE

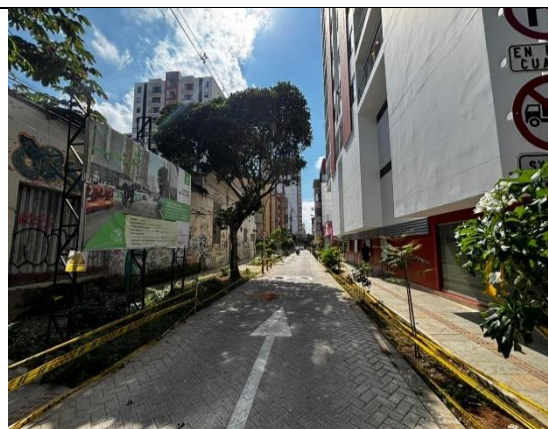

CARRERA 26 ENTRE CALLE 32 Y 33 VISTA SUR

INTERSECCIÓN CALLE 33 CON CARRERA 26



INTERSECCIÓN CARRERA 26 CALLE 33 SENTIDO SUR



INTERSECCIÓN CARRERA 26 CALLE 33 SENTIDO OCCIDENTE




INTERSECCIÓN CARRERA 26 CALLE 33 SENTIDO NORTE



INTERSECCIÓN CARRERA 26 CALLE 33 SENTIDO ORIENTE

CARRERA 26 ENTRE CALLE 33 Y 34

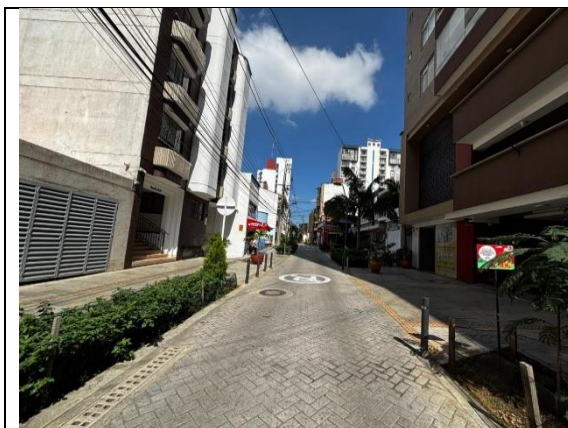

CARRERA 26 ENTRE CALLE 33 Y 34 VISTA NORTE



CARRERA 26 ENTRE CALLE 33 Y 34 VISTA SUR

INTERSECCIÓN CALLE 34 CON CARRERA 26




INTERSECCIÓN CARRERA 26 CALLE 34 SENTIDO SUR



INTERSECCIÓN CARRERA 26 CALLE 34 SENTIDO OCCIDENTE



INTERSECCIÓN CARRERA 26 CALLE 34 SENTIDO NORTE

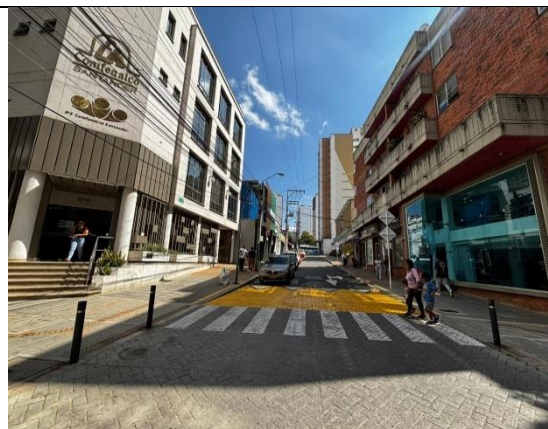

INTERSECCIÓN CARRERA 26 CALLE 34 SENTIDO ORIENTE



CARRERA 26 ENTRE CALLE 34 Y 35



CARRERA 26 ENTRE CALLE 34 Y 35 VISTA NORTE




CARRERA 26 ENTRE CALLE 34 Y 35 VISTA SUR

INTERSECCIÓN CALLE 35 CON CARRERA 26




INTERSECCIÓN CARRERA 26 CALLE 35 SENTIDO SUR

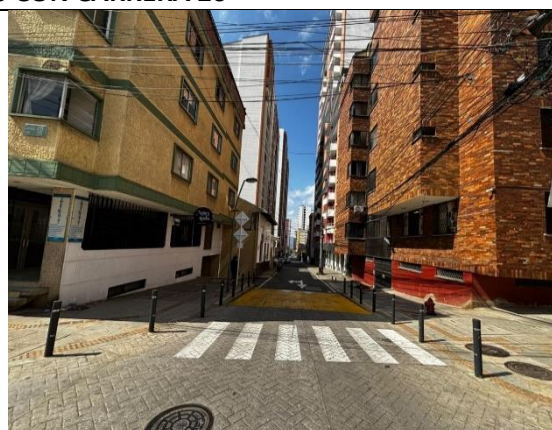

INTERSECCIÓN CARRERA 26 CALLE 35 SENTIDO OCCIDENTE




INTERSECCIÓN CARRERA 26 CALLE 35 SENTIDO NORTE

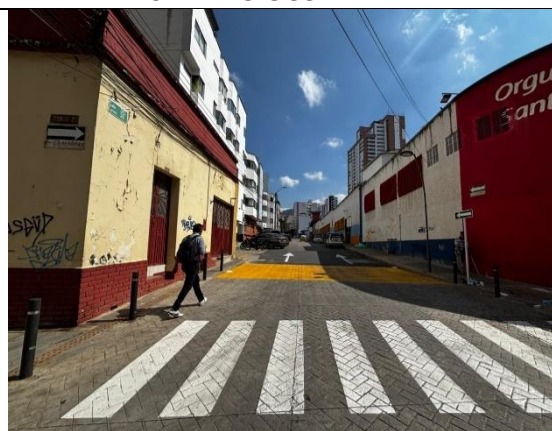

INTERSECCIÓN CARRERA 26 CALLE 35 SENTIDO ORIENTE

CARRERA 26 ENTRE CALLE 35 Y 36

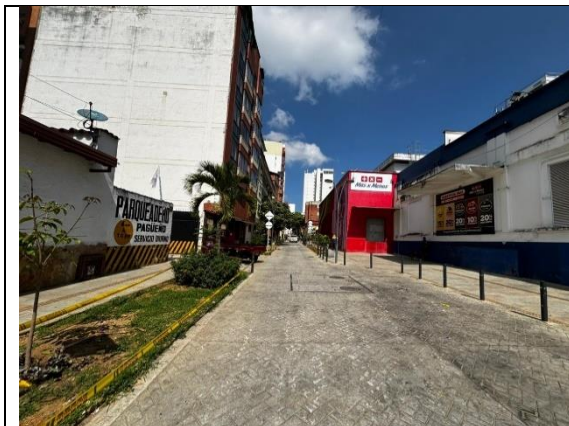


CARRERA 26 ENTRE CALLE 35 Y 36 VISTA NORTE




CARRERA 26 ENTRE CALLE 35 Y 36 VISTA SUR

INTERSECCIÓN CALLE 36 CON CARRERA 26

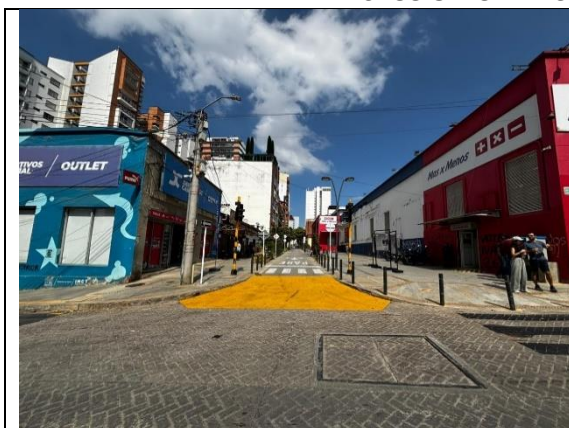

INTERSECCIÓN CARRERA 26 CALLE 36 SENTIDO NORTE

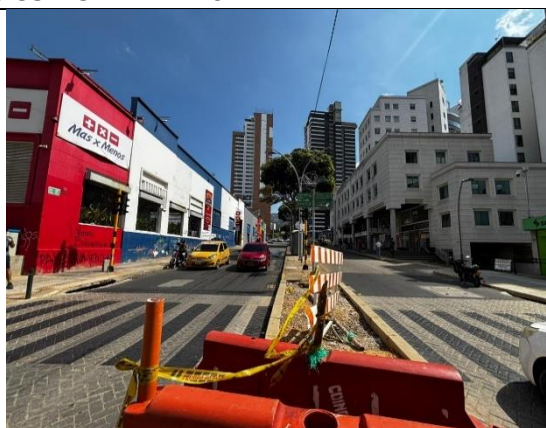

INTERSECCIÓN CARRERA 26 CALLE 36 SENTIDO ORIENTE



INTERSECCIÓN CARRERA 26 CALLE 36 SENTIDO OCCIDENTE




INTERSECCIÓN CARRERA 26 CALLE 36 SENTIDO SUR



CARRERA 26 ENTRE CALLE 36 Y 37




CARRERA 26 ENTRE CALLE 36 Y 37 VISTA NORTE

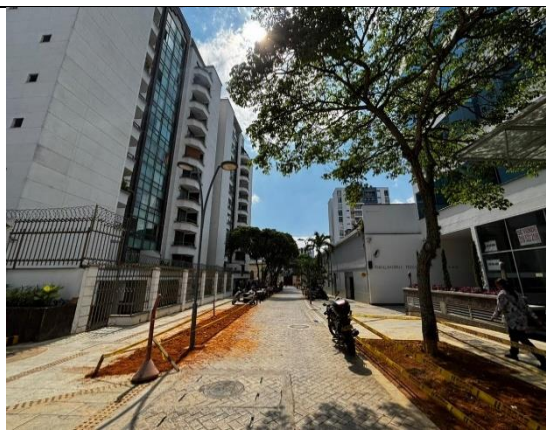


CARRERA 26 ENTRE CALLE 36 Y 37 VISTA SUR

CALLE 37 ENTRE CARRERA 25 Y 27

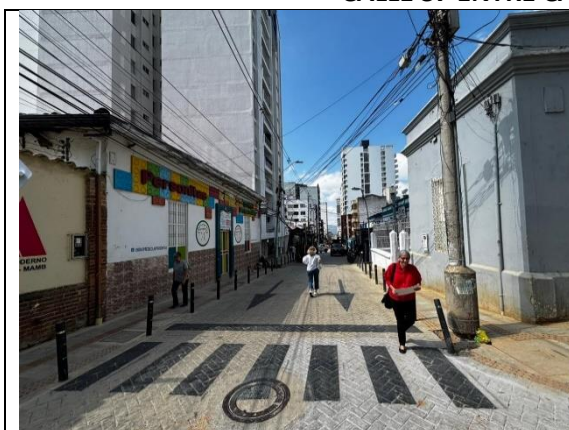

CALLE 37 CON CARRERA 26 SENTIDO OCCIDENTE

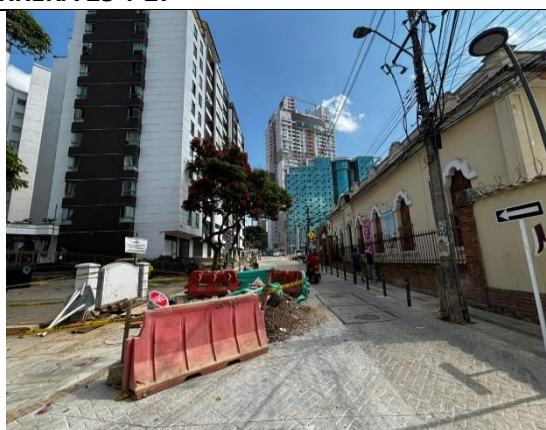

CALLE 37 CON CARRERA 26 SENTIDO ORIENTE



CALLE 37 CON CARRERA 26 SENTIDO NORTE



CALLE 37 CON CARRERA 25 SENTIDO ORIENTE

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL BORDE SUR LA VICTORIA EN EL BARRIO LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	2023680010007	\$9.042.908.877,23	\$14.256.691.826,19



Contrato 184-2023: CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BORDE SUR LA VICTORIA EN EL BARRIO LA VICTORIA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.

Valor del contrato inicial:	\$12.918.441.253,19
Fecha de inicio:	08 de agosto de 2023.
Plazo inicial:	6 meses
Suspensión No.1:	2 meses (06 de febrero de 2024 y hasta el 05 de abril de 2024,)
Ampliación 1 a la suspensión No.1:	1 mes (06 de abril 2024 – 05 de mayo de 2024)
Ampliación 2 a la suspensión No.1:	7 meses (06 de mayo 2024 – 05 de diciembre de 2024)
Ampliación 3 a la suspensión No.1:	4 meses (06 de diciembre de 2024 – 05 de abril de 2025)
Ampliación 4 a la suspensión No.1:	6 meses (06 de abril de 2025 – 05 de octubre de 2025)
Reinicio:	6 meses (06 de octubre de 2025 – 05 de abril de 2026)
Avance físico ejecutado	23%
Avance financiero:	30%
Estado:	En ejecución



Imagen 1: Implantación general diseño del proyecto

La imagen anterior, es una imagen de referencia, en la cual se definieron 6 tramos en obra entre las carreras 21 y carrera 11, con la intervención de un talud entre a calle 69 y calle 70 (vía nacional Bucaramanga Girón).

Se debe definir la titularidad del predio por parte del DADEP, en donde este implantado parte de la construcción del parque lineal para el tramo 1, conforme a la imagen 1; sin embargo, este predio no obstaculiza el reinicio de las obras, pues hay otros sectores de intervención.

Programar y gestionar recursos para la vigencia 2026, para la bolsa de ajustes.

Continuar con la gestión y tramites del permiso forestal ante la CDMB, para obtener la ampliación, radicada el 6 de noviembre de 2025 con radicado 2-S-SdIB- 202511-00100646.

Contrato 183-2023: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BORDE SUR LA VICTORIA EN EL BARRIO LA VICTORIA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.

Valor del contrato inicial:	\$678.208.073,00
Fecha de inicio:	08 de agosto de 2023.
Plazo inicial:	6 meses



Suspensión No.1:	2 meses (06 de febrero de 2024 y hasta el 05 de abril de 2024)
Reinicio:	19 de abril 2024
Fecha de terminación:	20 de abril de 2024
Avance físico ejecutado	3% porcentaje por confirmar por la nueva interventoría, toda vez que a la fecha no existe informe final del contrato 183/2023
Avance financiero:	73.62%
Estado:	Terminado

El contrato de interventoría No. 183 de 2023, se encuentra finalizado y está en proceso de liquidación. En espera que, el contratista subsane observaciones realizadas por la supervisión en aras de continuar con los respectivos trámites administrativos.

Se recibe por parte de la oficina jurídica concepto sobre la viabilidad de dar apertura y desarrollo del proceso administrativo sancionatorio del contrato de interventoría por presunto incumplimiento de contrato.

VALOR PAGADO: \$499.325.167,00

SALDO EN EL RP: \$178.882.906,00

Respecto a la nueva interventoría:

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL BORDE SUR LA VICTORIA EN EL BARRIO LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	202500000020181	\$785.643.475,00	\$785.643.475,00

Contrato 196-2025 INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE BORDE SUR LA VICTORIA EN EL BARRIO LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

Valor del contrato inicial:	\$679.931.678,00
Plazo inicial:	6 meses
Estado:	En ejecución
Porcentaje ejecución:	29%
Porcentaje ejecución financiero:	29%

El contrato de interventoría inicia el 9 de octubre de 2025 e inicia con la revisión de las actividades ejecutadas en el tramo 6, durante las vigencias 2023 y 2024, consistentes en actividades de espacio público y unas cajas para instalación de redes eléctricas.

La imagen anterior, es una imagen de referencia, en la cual se definieron 6 tramos en obra entre las carreras 21 y carrera 11, con la intervención de un talud entre a calle 69 y calle 70 (vía nacional Bucaramanga Girón).

se han realizado comités técnicos en las siguientes fechas 22-10-2025, 5-11-2025, 19-11-2025 se realizaron el segundo, tercero y cuarto comité de obra entre ambos contratistas, con asistencia de las áreas técnicas, HSE, social y la supervisión por parte de la administración municipal. Revisión de compromisos, recorrido de obra. Durante los mismos se realizó participación del simulacro nacional sismo, recomendaciones por parte de la



supervisión para el HSE para el área de cimentación profunda y de perforaciones en el talud para la ubicación de los drenes horizontales, se atendieron observaciones sobre el refuerzo en los anillos, posible variación de gabinete eléctrico y del área forestal.

Se encuentra en seguimiento las áreas técnica, administrativa, social y forestal, se están realizando comités técnicos cada 15 días

Convenio 333 – 2021: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE LA ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P., EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P., GASORIENTE S.A.E.S.P. Y EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA; PARA LA CONMEMORACIÓN DE LOS 400 AÑOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ÍCONO DE LA CIUDAD.

Objeto: Aunar esfuerzos para conmemorar los 400 años de fundación de la ciudad e Bucaramanga, que tuvo lugar el 22 de diciembre de 1622, permitiendo el posicionamiento de marca de empresas; así como la apropiación de ciudadana territorio; reflejo de identidad y sentido de pertenencia por el patrimonio de la ciudad en favor de sus grupos de interés

Fecha de inicio:	12 de noviembre de 2021.
Fecha de terminación:	11 de enero de 2023
Prorroga No. 1 en plazo:	11 meses
Prorroga No. 2 en plazo:	20 días
Nueva fecha terminación:	30 de diciembre de 2023
Fecha de suspensión 1:	22 de diciembre de 2023
Valor del convenio:	
ACUEDUCTO METROPOLITANO:	\$500.000.000,00
ESSA:	\$500.000.000,00
GASORIENTE:	<u>\$500.000.000,00</u>
Total	\$1.500.000.000,00
Avance físico ejecutado:	9.33%
Avance financiero:	9.33%
Estado:	Suspendido.

El alcance del convenio incluía la estructuración del icono arquitectónico, mediante la realización de un concurso arquitectónico para el diseño y posterior proceso para construcción e instalación de un icono arquitectónico, que refleje la interacción de las empresas de servicios públicos domiciliarios que acá participan energía eléctrica, acueducto y gas, que abordan los siguientes temas: **agua, energía eléctrica, gas, energías renovables, comunicaciones y participación ciudadana, conciencia ambiental, historia, cultura local y espacio público, y su interacción e influencia, pasada; presente y futura en el municipio de Bucaramanga.**

Así las cosas, se desarrolló concurso abierto por la Sociedad Colombiana de Arquitectos para que organizara concurso de diseño y arquitectura y que actuara como coordinador entre la Entidad Estatal, en el mes de enero de 2022 la Secretaria de Infraestructura suscribió con la Sociedad Colombiana de Arquitectos contrato de prestación de servicios para que esta Sociedad funja como organismo asesor del Concurso de Méritos Arquitectónico que aperturó la Secretaria de Infraestructura para el diseño del icono arquitectónico para la celebración de los 400 años de Bucaramanga.

El Ministerio de Cultura expidió la resolución 1414 de 2024, esto para el mes de noviembre, otorgando la respectiva autorización para la intervención.

El principio de anualidad que rige en materia presupuestal a las entidades públicas y los plazos que se estipularon para la ejecución del proyecto nos impedía que en un mes y medio pudiera iniciarse y realizarse la obra; reiterando que la expedición del acto



administrativo que autoriza la intervención se dio por parte del Ministerio de Cultura solo hasta mediados del mes noviembre de 2024, por tal razón debíamos iniciar el respectivo trámite durante la vigencia 2025.

Aunado a lo anterior, la ESSA cita la cláusula vigésimo octava, para que se den soluciones sobre la continuidad o no del convenio y terminación del mismo, situación que viene desarrollándose desde el primer semestre del 2025; en donde se identificaron las malas prácticas que el municipio desarrolló durante las vigencias 2020 a 2023 para con el convenio y dan razón para que las empresas vinculadas al convenio solicitaran apartarse del mismo. De esta manera el convenio entro en etapa de terminación y posterior liquidación reconociendo las actuaciones y contratos derivados del presente convenio, para que el municipio en un momento posterior a este ejecute el producto derivado del presten convenio, que es la consultoría 200 de 2023.

Se proyectó el acta de recibo final y se envió para firma de las respectivas partes.



Foto 1. Imagen renderizada



Foto 2. Imagen renderizada

CONTRATO: 200 - 2023: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MONUMENTO CONMEMORATIVO A LA CELEBRACIÓN 400 AÑOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.

Fecha de inicio:	24 de agosto de 2023.
Plazo:	45 días
Otro Sí 1:	
Ampliación plazo:	3 meses
Fecha terminación:	23 de noviembre 2023
Avance físico ejecutado:	100%
Avance financiero:	90%
Estado:	Liquidado.

El ministerio de cultura quien hizo la revisión del componente de diseño e implantación del objeto ya conceptuó y entrego para el mes de noviembre de 2024 los respectivos conceptos para la implantación y construcción del objeto denominado hoja del búcaro, monumento a los 400 años de fundación de la ciudad de Bucaramanga. Así las cosas, ya se puede iniciar el proceso de Recibo final y liquidación, ya que está en manos del municipio. El proyecto de pasivos exigibles ya fue aprobado por el Concejo municipal de Bucaramanga se puede continuar con el proceso de liquidación del contrato, adicionalmente el comité técnico ya recibió la solicitud de uso de los recursos con los que cuenta este contrato para su ejecución.

Se llevó a cabo el proceso de liquidación del contrato el día 11 de diciembre de 2025



Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
ADECUACION DE ESPACIO PUBLICO EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	2024680010050	\$ 24.134.607.023	\$ 45.114.109.841,13

Descripción de actividades desarrolladas

CONTRATO DE OBRA 105 de fecha 20 de junio de 2025 -: CONSORCIO ESPACIOS BGA “ADECUACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”.

Valor del contrato: \$16.317.394.434,13
Valor Anticipo: N/A
Plazo inicial: 4 meses 21 días
Fecha de inicio: 11 de agosto de 2025
Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2025
Estado del Contrato: EJECUCIÓN
Porcentaje avance: 75 %

Ubicación: En el marco del presente contrato, cuyo alcance inicial comprende la intervención de 63 barrios agrupados en 17 comunas, se ha venido avanzando de manera progresiva en la ejecución de las actividades técnicas previstas, cumpliendo con los cronogramas establecidos.

Impacto: Este proyecto de gran relevancia tiene alcance en las 17 comunas y 63 barrios priorizados, generando un impacto integral en la optimización del espacio público, al tiempo que promueve condiciones de accesibilidad universal, garantizando el desplazamiento seguro y digno de las personas con discapacidad.

Beneficios para la Comunidad:

- Optimización del espacio público: se generan entornos más ordenados, funcionales y seguros para el uso colectivo.
- Accesibilidad universal: se garantiza la movilidad incluyente para personas con discapacidad, adultos mayores, niños y población vulnerable.
- Fortalecimiento de la movilidad peatonal: mejora de andenes, senderos y pasos seguros que facilitan el desplazamiento diario.
- Reducción de riesgos: adecuación de infraestructura que disminuye accidentes asociados a barreras físicas y deterioro del espacio público.
- Impacto en la cohesión social: se promueve la apropiación del territorio y el sentido de pertenencia de la comunidad hacia su barrio y comuna.
- Mejoramiento paisajístico y ambiental: recuperación de áreas deterioradas y adecuación de zonas verdes que aportan a la sostenibilidad urbana.



META E INDICADOR DE PRODUCTO: Mantener 100 parques en el municipio

Indicador	Meta 2025	Logro 2025	% Avance 2025	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Parques mantenidos	41	56	100%	\$ 4.726.740.978	\$ 0	0%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES, EQUIPAMIENTO Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER.	2024680010045	\$ 3.000.000.000	\$ 3.731.566.923,14

Descripción de actividades desarrolladas

Con este proyecto se ha podido realizado el mantenimiento y embellecimiento de 56 parques de la ciudad trabajo realizado por la cuadrilla del Alcalde.

Contrato 244 – 2024: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES DEL MUNICIPIO:

Se llevó a cabo el proceso de contratación del contrato No. 244-2024, Orden de Compra No. 139109, cuyo objeto es “SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA” en la TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIA, en virtud del Acuerdo Marco de Precios por Colombia Compra Eficiente, mediante el proceso No CCE-255-AMP-2021, una vez realizada la evaluación de las propuestas recibidas, por parte del comité evaluador fue seleccionado el proponente el contratista JAIRO OSORIO CABALLERO identificado con C.C. 91.282.210:, bajo la adjudicación del contrato No. 244-2024; el cual implica el suministro de los materiales de ferretería y herramientas necesarios para ejecutar el mantenimiento periódico de parques, zonas verdes y equipamientos urbanos del municipio de Bucaramanga. La orden de compra tiene por fecha el 13 de diciembre de 2024.

Valor del contrato inicial: \$616.071.617,60
Valor del Adicional 1: NA
Valor total: \$616.071.617,60
Fecha de inicio: 18 de diciembre de 2024.



Suspensión No.1: 22 días calendario. (23 de diciembre de 2024 – 14 de enero de 2025)

Ampliación a la suspensión No.1: 45 días calendario (15 de enero de 2025 – 28 de febrero de 2025)

Reinicio: 1 de marzo de 2025.

Prorroga No.1: 3 meses y 13 días (9 de marzo de 2025 – 23 de junio de 2025)

Prorroga No.2: 4 meses

Prorroga No.3: 1 mes y 26 días

Fecha de finalización: 19 de diciembre de 2025.


Avance físico ejecutado: 39.74%

Avance financiero: 39.74%

Estado: Terminado

El avance físico ejecutado corresponde al 39.74%, este está sujeto a las solicitudes de materiales que realice el profesional encargado del personal de obra dispuesto para la ejecución de obras de mantenimiento de los parques del municipio.

El contratista presentó tres actas de ejecución por el valor de \$244.843.471,11 las cuales ya se encuentra pagadas para una ejecución financiera del 39.74%

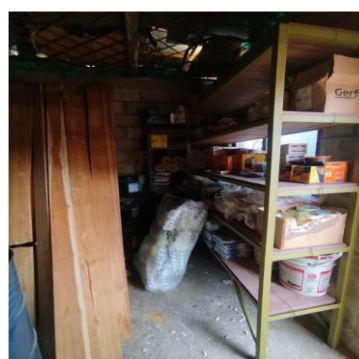

Estado actual bodega de materiales

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Mantener 1,605,851 metros cuadrados de zonas verdes

Indicador	Meta 2025	Logro 2025	% Avance 2025	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Zonas verdes mantenidas	1605851	3937841	100%	\$ 10.000.000.000	\$ 7.812.383.897	78,12%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Mantenimiento y manejo integral arbóreo y de zonas verdes en el municipio de Bucaramanga, Santander	2024680010046	\$ 31.813.343.882	\$ 10.000.000.000

Descripción de actividades desarrolladas

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 135 DEL 26 DE JUNIO DE 2025 suscrito con: EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA (EMAB) SA ESP con el objeto de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA y LA EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA(EMAB)PARADESARROLLAR ACTIVIDADESRELACIONADAS CON LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES UBICADAS EN EL ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER."



Valor del convenio:	\$6.538.315.836.00
Valor Anticipo:	N/A
Plazo inicial:	4.5 Meses
Fecha de inicio:	29 de agosto de 2025
Fecha de terminación:	Desde la fecha de suscripción del acta de inicio y el 31 de diciembre de 2025
Estado del Contrato:	SUSPENDIDO
Porcentaje avance:	87%
Porcentaje avance financiero:	0%

Ubicación:

- Parques y zonas verdes ubicadas en el espacio público del municipio de Bucaramanga, Santander

Impacto: El impacto que genera el convenio 135 en el municipio de Bucaramanga es de alto alcance, la realización de los siete componentes ejecutados a lo largo del municipio ha reflejado un impacto positivo. Entre los aspectos a destacar en el desarrollo del convenio se destacan: La siembra de cobertura vegetal en áreas de gran afluencia como el Parque Santander y el Parque de los niños, Siembra de césped en las zonas secas (aridas) del Parque de los Niños, Riego de cobertura vegetal en áreas como el Mesón de los Bucaros, Parque Turbay, Parque de los Niños, Parque Santander, Puerta del sol y los diferentes separadores viales (separador calle 36 , separador calle 45), recolección y transporte de residuos sólidos ordinarios (residuos bolsa negra) y residuos voluminosos localizados en los parques y zonas verdes del municipio, mantenimiento de coberturas vegetales en el municipio de Bucaramanga de las zonas donde se realiza la siembra, Corte de césped en las áreas verdes del municipio y parqueros encargados de la limpieza en las áreas verdes del municipio.

ESTADO DEL CONTRATO:

El contrato ha logrado un avance de ejecución del 87% de alcance de las 418 áreas establecidas en el contrato.

Al mes de diciembre se ha logrado la intervención de 1.541.078 m2 de áreas del 1.605.851 m2 establecidos en el convenio.

Cabe resaltar que el 1.541.078 m2 es el alcance del total de m2 establecidos en el convenio, aunque el total de m2 intervenidos ha sido mayor. Esto se debe a que las áreas han sido intervenidas en gran cantidad de ocasiones y por diferentes componentes. Es decir, un área como el parque de los niños puede tener intervención de los 7 componentes según lo requiera el componente técnico.

En las intervenciones establecidas en las diferentes áreas se puede destacar el aspecto técnico y la caracterización de cada área ya que para la intervención se debe segregar que tipo de intervención requiere el área para poder ejecutar efectivamente los metros cuadrados establecidos en el convenio.

Las cuadrillas de trabajo de todos los componentes han estado distribuidas a lo largo del municipio de Bucaramanga generando el siguiente resumen de intervenciones:

ZONA	# ÁREAS INTERVENIDAS	METROS CUADRADOS INTERVENIDOS
NORTE	69	237131
OCCIDENTE	84	402694
ORIENTE	67	532119
SUR	111	369134
Total general	331	1541078



A continuación, se mostrará evidencia de los 7 componentes durante la ejecución del convenio:





22/10/25 4:43 P. M.
Lat 7.151588°N
Lon 73.135557°W



19/09/25 8:59 A. M.
Lat 7.109087°N
Lon 73.123234°W



29/09/25 9:42 A. M.
Lat 7.118517°N
Lon 73.109069°W



21/10/25 2:42 P. M.
Lat 7.117478°N
Lon 73.114260°W



10/12/2025 7:50 A. M.
Lat 7.125843°N
Lon 73.119303°W



13/11/2025 7:40 A. M.
Lat 7.125257°N
Lon 73.119135°W



Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
MANTENIMIENTO Y MANEJO INTEGRAL ARBÓREO DE ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	2024680010046	\$ 809.685.217,89	\$ 809.685.217,89

Descripción de actividades desarrolladas

CONTRATO DE OBRA 195 DE 27 DE AGOSTO DE 2025 (SI-SI-SAMC-002-2025) CONSORCIO FORESTAL BUCARAMANGA “MANTENIMIENTO Y MANEJO INTEGRAL ARBÓREO DE ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”.

Valor del contrato: **\$ 809.685.217,89**
 Valor Anticipo: N/A
 Plazo inicial: A monto agotable o hasta el 31 de diciembre de 2025
 Fecha de inicio: 20/10/2025
 Fecha de terminación: 31/12/2025
 Estado del Contrato: Suspendido
 Porcentaje avance: 90%

Ubicación: El proyecto se desarrolla en todas las comunas del Municipio de Bucaramanga.

Impacto: Tiene como objetivo realizar la ejecución de actividades técnicas y especializadas de poda y tala de especies arbóreas que representan amenaza o riesgo en el espacio público urbano del municipio de Bucaramanga, con el fin de garantizar la seguridad de la ciudadanía, la protección de bienes públicos y privados, y la preservación del entorno urbano, de acuerdo con las autorizaciones ambientales emitidas por la autoridad competente, cumpliendo los lineamientos técnicos establecidos por la Secretaria de Infraestructura y la normatividad ambiental vigente.

- 1.COMUNA 1 - NORTE
- 2.COMUNA 2 - NORORIENTAL
- 3.COMUNA 3 - SAN FRANCISCO
- 4.COMUNA 4 - OCCIDENTAL
- 5.COMUNA 5 - GARCÍA ROVIRA







- 6.COMUNA 6 - LA CORNCORDIA
- 7.COMUNA 7 - CIUDADELA
- 8.COMUNA 8 - SUR OCCIDENTE
- 9.COMUNA 9 - LA PEDREGOSA
- 10.COMUNA 10 - PROVENZA
- 11.COMUNA 11 - SUR
- 12.COMUNA 12 - CABECERA DEL LLANO
- 13.COMUNA 13 - ORIENTAL
- 14.COMUNA 14 - MORRORICO
- 15.COMUNA 15 - CENTRO
- 15.COMUNA 16 - LAGOS DEL CACIQUE
- 15.COMUNA 17 - MUTIS

Este proyecto contribuye al mejoramiento y disminución de accidentes por caída de árboles o ramas en el espacio público.

Beneficios para la Comunidad:

- **Menor Impacto a daños:** Se disminuye el riesgo de accidentes y daños en el espacio público.
- **Aumento de la Seguridad:** Se tiende a bajar en la tasa por accidentes y se da el mejoramiento de las condiciones del espacio público.

SEGUIMIENTO	
	
PODA	PODA
	
TALA	TALA



Se han realizado trabajos de mantenimiento y manejo integral arbóreo en diferentes comunas y barrios de la ciudad enfocados en el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo – Mantener 1.605.851 metros cuadrados de zonas verdes.

- Comuna 3: San Francisco
- Comuna 7: Real de minas
- Comuna 9: Barrio Pedregosa.
- Comuna 10: Barrios Provenza y Fontana.
- Comuna 12: Parque Ecológico La Flora.
- Comuna 13: Barrios Álvarez y La Aurora.
- Comuna 16: Hacienda San Juan.
- Comuna 17: Barrios Balconcitos y Mutis.
- Comuna 1: Colorados
- Comuna 1: Café Madrid
- Comuna 1: Olas altas
- Comuna 4: Nápoles
- Comuna 10: Diamante 2
- Comuna 12: Parque Ecológico La Flora, Sotomayor

4. LINEA ESTRATEGICA. TERRITORIO SEGURO QUE GENERA VALOR

SECTOR: Gobierno territorial

PROGRAMA: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Asistir técnicamente a nueve (9) dependencias de la administración municipal para el diseño, seguimiento y ejecución de proyectos estratégicos de la ciudad en el área de infraestructura

Indicador	Meta 2025	Logro 2025	% Avance 2025	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	9	9	100%	\$ 11.506.163.086	\$ 11.434.856.665	99%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Fortalecimiento institucional a los procesos misiones y de gestión de la secretaría de infraestructura del municipio de Bucaramanga, Santander	2024680010049	\$ 11.506.163.086	\$ 28.292.139.343

Descripción de actividades desarrolladas

Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2025 la Secretaria de Infraestructura ha continuado realizar la contratación del recurso humano que requiere la secretaria para el fortalecimiento a la ejecución de los procesos transversales, así como la planificación de las diferentes obras.



GASTOS DE INVERSION	A 31 DE DICIEMBRE 2025
	VALOR
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION	\$ 11.434.856.665

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Adecuar cinco (05) sedes de bienes inmuebles que son propiedad municipal para fortalecer los procesos administrativos y promover el desarrollo de capacidades dentro de la administración

Indicador	Meta 2025	Logro 2025	% Avance 2025	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Sedes adecuadas	1,5	1	67%	\$ 162.638.200	\$ 56.969.970	35%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
"REPARACION DEL EQUIPAMIENTO COMUNITARIO CASA BUHO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	22500000018145	\$ 56.969.970	\$ 56.969.970

Descripción de actividades desarrolladas

CONTRATO No 082 DE 2024 "REPARACION DEL EQUIPAMIENTO COMUNITARIO CASA BUHO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

CONTRATO: 082
FECHA DEL CONTRATO: 27/05/2025
TIPOLOGÍA DEL CONTRATO O CONVENIO: CONTRATO DE OBRA
MODALIDAD DE SELECCIÓN DE CONTRATO: CONTRATACIÓN DIRECTA
OBJETO: "REPARACION DEL EQUIPAMIENTO COMUNITARIO CASA BUHO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 1,2,3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
CONTRATISTA : PIEDRA ANGULAR CONSTRUCCIONES S.A.S.
SUPERVISOR : ING. WILSON MOTTA RODRIGUEZ
VALOR FISCAL : \$41.000.120,00
VALOR ADICIONAL : \$15.969.850,00
VALOR TOTAL : \$ 56.969.970,00
PLAZO : UN (01) MES
PLAZO ADICIONAL : QUINCE (15) DIAS
FECHA DE INICIO : 17 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL : 16 DE JULIO DE 2025
FECHA DE SUSPENSION : 14 DE JULIO DE 2025
FECHA DE REINICIO : 24 DE JULIO DE 2025



FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL : 11 DE AGOSTO DE 2025
Estado del Contrato : EJECUCIÓN
Porcentaje avance : 100%

Ubicación:

Calle 27 con carrera 33 esquina Barrio La Aurora - Bucaramanga

Impacto: Este proyecto impacta a 682 familias del sector rural del Municipio de Bucaramanga

Beneficios para la Comunidad:

La CASA BUHO se encuentra diseñada como una edificación de atención gratuita para el cuidado de la niñez en situación de riesgo de vulneración de sus derechos. Allí se brinda servicios para niños y niñas entre 7 meses y 8 años de edad cuyo padres o representantes, debido a sus condiciones socioeconómicas, no cuente con redes de apoyo familiar para el cuidado y protección general.

Con este programa social se beneficia un total de 130 niños y niñas en las dos jornadas.

ALCANCE:

- reparaciones locativas de la planta física como corrección de humedades tanto de cubierta como de redes sanitaria.
- Impermeabilización de placa de cubierta.
- Reparación de las redes eléctricas, como tablero general y automáticos.
- Pintura general de muros y cielo raso.
- Demolición de muros en DRYWALL y cambio.
- Cambio de luminarias y tomacorrientes



IMAGEN No 1: IMPERMEABILIZACION PLACA DE CUBIERTA



IMAGEN No 2: DEMOLICION CIELO RASO Y REVISION FILTRACIONES



Suministro, transporte e instalación de tablero trifasico de 36pts con espacio para totalizador(97*30*15cm) Pintura electrostática IP44 mas accesorios--



IMAGEN No 3 : TABLERO GENRAL ANTES



IMAGEN No 4. TABLERO GENERAL DESPUES

Mantenimiento equipo mini split (Condensadora + Evaporadora)



META E INDICADOR DE PRODUCTO: Elaborar (04) estudios de preinversión para la realización de documentos en las fases de pre-factibilidad, factibilidad o definitivos para la consolidación de la infraestructura social en el municipio

Indicador	Meta 2025	Logro 2025	% Avance 2025	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Estudios de preinversión elaborados	2	0,5	25%	\$ 2.365.489.877	\$2.365.489.877	100%



Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RESTAURACIÓN DE LA PLAZA SAN MATEO INMUEBLE DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	20230680010066	\$1.800.000.000.00	\$1.800.000.000.00

Descripción de actividades desarrolladas

CONTRATO N° 197-2025 “CONSULTORIA ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RESTAURACIÓN DE LA PLAZA SAN MATEO INMUEBLE DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER” Valor total del contrato: \$ 1.542.128.640 Y CONTRATO DE OBRA 217-2025 INTERVENTORÍA A LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RESTAURACIÓN DE LA PLAZA SAN MATEO INMUEBLE DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Valor total del contrato: \$ 257.865.599 y

ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RESTAURACIÓN DE LA PLAZA SAN MATEO INMUEBLE DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

Valor del contrato:	\$1.800.000.000.00
Valor Anticipo:	N/A
Plazo inicial:	4 meses14
Fecha de inicio:	15 de septiembre de 2025
Fecha de terminación:	30 de diciembre de 2025
Estado del Contrato:	EJECUCIÓN
Porcentaje avance:	60%
Total pagado a la fecha:	\$ 33.928.615,98

Durante el cuarto trimestre de 2025 se adelantaron actividades de seguimiento, revisión técnica y control contractual a los contratos de consultoría No. 197-2025 e interventoría No. 217-2025, correspondientes a la actualización de los estudios y diseños para la restauración de la Plaza San Mateo, Bien de Interés Cultural del municipio.

En noviembre de 2025, el consultor presentó los Tomos I, II y III (diagnóstico, estudios especializados y análisis de alternativas), los cuales fueron revisados por la interventoría, evidenciándose observaciones técnicas, normativas y metodológicas que impidieron su aprobación. Se identificaron debilidades en la articulación de los estudios y en la sustentación de las alternativas propuestas.

A la fecha, el avance programado del contrato es del 85%, mientras que el avance real aprobado es de aproximadamente 60%, reflejando retrasos en la ejecución. Asimismo, se evidenciaron incumplimientos en la entrega de informes, evidencias de SST y atención a observaciones.

En el aspecto financiero, no se han autorizado pagos, encontrándose pendientes los ajustes técnicos requeridos para la aprobación de los entregables y el trámite correspondiente.

Ubicación: El proyecto se encuentra ubicado en la Cra 16 #33 - 37 del Municipio de Bucaramanga.




Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, impacto social en el incremento en la seguridad debido al uso del inmueble, espacios e encuentros fortaleciendo la cohesión social, impacto urbano de movilidad con senderos accesibles y señalización inclusiva y el más importante el impacto patrimonial corregir patologías estructurales del inmueble conservación del inmueble como interés cultural y patrimonial y que no alteren la autenticidad del bien.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región.

Beneficios para la Comunidad:

- Recuperación del patrimonio Cultural: la recuperación y rehabilitación de un sitio de gran valor histórico para la ciudad de Bucaramanga preservando su identidad y arquitectura estilo Republicano.
- Mejoramiento del entorno Urbano: Impermeabilización de cubiertas, reforzamiento estructural y mejoramiento del espacio público tanto peatonal y vehicular.
- Dinamización económica: potencializar la actividad económica generación de empleo local y favorecer el comercio formal
- Promoción del turismo y la cultura: convertir la plaza en centro de eventos, cultural gastronómico y de exposición recordando la función que tuvo en el pasado.
- Creación de espacios públicos favoreciendo la integración social y embellecimiento del entorno.

Imágenes de Sondeos, apiques y rotopercusiones

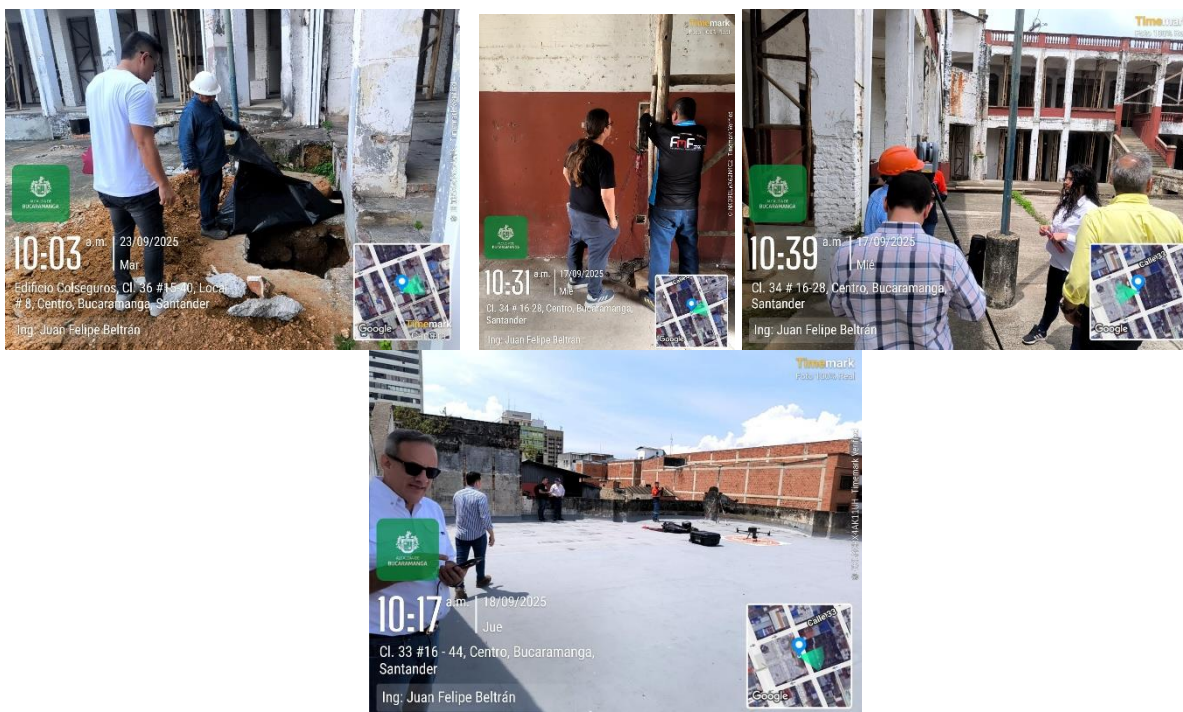

Imágenes de Alternativas proyectadas



Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
PRESTACION DE SERVICIOS DE TOMAS DE MUESTRA Y ELABORACION DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE ESTUDIO DE SUELOS PARA LOS PROYECTOS EN ESTRUCTURACIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	202500000032340	\$ 120.489.877,19	\$ 120.489.877,19

Descripción de actividades desarrolladas

CONTRATO CPS 278 DE 2025 - PRESTACION DE SERVICIOS DE TOMAS DE MUESTRA Y ELABORACION DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE ESTUDIO DE SUELOS PARA LOS PROYECTOS EN ESTRUCTURACIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

Valor Inicial:	\$ 120.489.877,19
Valores adicionales:	\$ 0.
Valor Total	\$ 120.489.877,19
Plazo Inicial:	Treinta y siete días (37) DIAS
Fecha Inicial:	24 de noviembre de 2025
Fecha Final:	31 de diciembre del 2025
Estado del Contrato:	En proceso de recibo y liquidación
Porcentaje de Avance:	80%
Total, pagado a la fecha:	\$ 33.928.615,98

El presente informe da cuenta del seguimiento realizado al contrato de prestación de servicios para la toma de muestras y ensayos de laboratorio de estudio de suelos, suscrito el 12 de noviembre de 2025, con inicio de ejecución el 24 de noviembre de 2025 y terminación prevista para el 31 de diciembre de 2025, por un valor total de \$120.489.877,19. El contrato fue celebrado con la firma Miguel Silva Ingeniería S.A.S., y tiene como finalidad apoyar la estructuración de proyectos de infraestructura estratégica para el municipio de Bucaramanga.



Durante el IV trimestre de 2025, el contrato se encuentra en fase inicial de ejecución, evidenciándose un inicio oportuno y satisfactorio de las actividades técnicas de campo. El contratista adelantó exploraciones geotécnicas mediante apiques y sondeos geomecánicos (SPT) en distintos sectores del municipio, entre los que se destacan Morrico – Miraflores (Puente Peatonal), Bolarquí (Puente Vehicular) y la entrada al barrio Mutis (proyecto vial 2W), recrear el mutis, Recrear la joya, cancha de softball, cancha el bueno, entre otros puntos definidos en el alcance contractual.

Entre el 24 y el 15 de Diciembre de 2025, se desarrolló la campaña de exploración en campo, logrando la recolección de muestras alteradas, inalteradas y semi-alteradas, las cuales constituyen el insumo técnico para la ejecución de los ensayos de laboratorio y la posterior elaboración de los informes geotécnicos requeridos para la estructuración de los proyectos.

En el componente financiero, no se registran pagos efectuados al cierre del trimestre; sin embargo, se encuentra en revisión el Acta Parcial No. 1, por un valor de \$33.928.615,98. En términos generales, se evidencia un avance técnico favorable y un cumplimiento adecuado del alcance inicial del contrato, quedando pendientes para el siguiente periodo la consolidación de los resultados de laboratorio, la entrega de los informes técnicos finales y el trámite de los pagos conforme a lo establecido contractualmente.

Imágenes de Sondeos, apiques y rotopercusiones



5. LINEA ESTRATEGICA. TERRITORIO SEGURO QUE PROTEGE

SECTOR: Minas y Energía

PROGRAMA: Consolidación productiva del sector de energía eléctrica

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Garantizar 51,229 lámparas de alumbrado público para la prestación del servicio de alumbrado público en el Municipio de Bucaramanga.



Indicador	Meta 2025	Logro 2025	% Avance 2025	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Garantizar lámparas de alumbrado público.	51.229	51.229	100%	\$ 82.176.423.403	\$ 52.969.290.966	65%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 2020-2023 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	2020680010114	\$ 3.594.944.130,28	\$ 28.025.839.948,32

Descripción de actividades desarrolladas

Dentro del proyecto de mantenimiento del sistema de alumbrado público 2020-2023 del municipio de Bucaramanga, enfocados en el mismo objeto realizar un mantenimiento preventivo y correctivo del sistema mediante los contratos:

Contrato 138 de 2023

Estado: Liquidado

Fecha de Inicio: 24 de julio 2023

Fecha de terminación: 27 de septiembre 2024

Valor inicial \$ 1.122.746.611,00

Adicional 1 \$ 320.784.746,00

Adicional 2 \$ 240.588.559,50

Adicional 3 \$ 64.156.949,20

Valor total \$ 1.748.276.865,70



Contrato 139 de 2023

Estado: Liquidado

Fecha de Inicio: 24 de julio de 2023

Fecha de terminación: 13 de septiembre 2024



Valor inicial \$ 1.140.646.311,00
Adicional 1 \$ 325.898.946,00
Adicional 2 \$ 244.424.209,50
Adicional 3 \$ 65.179.789,20
Valor total \$ 1.776.149.255,70



Contrato 140 de 2023

Estado: Liquidado

Fecha de Inicio: 24 de julio 2023
Fecha de terminación: 18 de agosto 2024
Valor inicial \$ 1.124.731.209,00
Adicional 1 \$ 321.351.774,00
Adicional 2 \$ 241.013.830,50
Adicional 3 \$ 64.270.354,80
Valor total \$ 1.751.367.168,30



Contrato 141 de 2023

Estado: Terminado en proceso de liquidación, pendiente acta de garantías.

Fecha de Inicio: 24 de julio 2023
Fecha de terminación: 27 de agosto 2024
Valor inicial \$ 1.036.925.512,00
Adicional 1 \$ 296.264.432,00
Adicional 2 \$ 222.198.324,00
Adicional 3 \$ 59.252.886,40
Valor total \$ 1.614.641.154,40



Resultados:

- **Mantenimiento Preventivo y Correctivo:** Se ejecutó un programa de mantenimiento preventivo que abarcó el 100% de los puntos de iluminación establecidos en el contrato. Esto incluyó la revisión, modernización y reparación de componentes eléctricos del alumbrado público de Bucaramanga.
- **Optimización de la Red de Alumbrado:** Se redujo el tiempo promedio de respuesta ante fallos a un promedio de 72 horas, gracias a la implementación de gestión de actividades y cierres en tiempo real que permitió identificar problemas de manera proactiva.

Logros alcanzados:

- **Sustitución de Tecnología:** Se modernizaron un total de 42.716 luminarias convencionales por lámparas LED, lo que representa un 83 % de la infraestructura de alumbrado. Esta transición no solo mejoró la eficiencia energética, sino que también aumentó la luminosidad en las áreas atendidas.

Localización:

El mantenimiento se realizó en las comunas y corregimientos:

- Comuna 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
- Corregimiento 1,2,3

Población Beneficiada:

El número de personas beneficiadas con enfoque diferencia es de 605,047 personas en el municipio de Bucaramanga.

Impacto generado:

- El proyecto de alumbrado público en Bucaramanga ha generado un impacto positivo significativo, mejorando la seguridad, la calidad de vida y la cohesión social. Esta intervención no solo ha transformado el entorno urbano, sino que también ha contribuido al bienestar integral de sus habitantes.
- El contrato de mantenimiento está dirigido a toda la población en general sin discriminación alguna, con el fin de mejorar la percepción de seguridad en el municipio mejorando las condiciones de luminosidad en todos los sectores del área metropolitana de Bucaramanga.
- Los contratos mencionados dieron cumplimiento al 100% de las actividades de las obligaciones asignadas durante la vigencia del contrato.



Imagen N°1 Hincar poste



Imagen N°2 Reemplazo de luminaria

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONA RURAL 2024 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	2024680010085	\$1.231.292.530,00	\$1.231.292.530,00

Descripción de actividades desarrolladas

Contrato 332 de 2023 – MODERNIZACIÓN RURAL : Mediante el proceso SI-SI-LP-007-2023 en donde se adelantó la invitación abierta a presentar propuestas por parte del Municipio de Bucaramanga; para el objeto "AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS RURALES – FASE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"; una vez realizada la evaluación de las propuestas recibidas, por parte del comité evaluador fue seleccionado el proponente CONSORCIO ILUMINAR BGA R Se adelanto el contrato 332-2023; con el objeto de realizar la ampliación del alumbrado rural fase II con base en las PQR's presentadas por la comunidad rural, visitando algunas veredas de los dos corregimientos con el apoyo de los respectivos ediles y presidentes de junta de las veredas dentro del alcance del presente contrato.

Estado: TERMINADO EN RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN.

Ubicación: El proyecto se encuentra en los corregimientos 1 y 2 del Municipio de Bucaramanga.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas, centros de formación técnica y sector Industrial, directamente beneficiando a la población de las siguientes veredas:

- San Pedro Alto y Bajo
- El Aburrido
- San Ignacio
- Sabana
- Vijagual
- La Esmeralda
- Santa Rita
- Angelinos
- Bosconia
- Bolarquí Bajo y Alto
- Capilla Baja y Alta



- Vereda Monserrate
- Santos Bajos y Altos
- Magueyes
- Cuchilla Alta

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región.

Actividades ejecutadas:

- Localización y replanteo manual de 1000 puntos para el proyecto
- Retiro transporte y entrega de postes metálicos
- Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de luminarias existentes.
- Aplomada de postes existentes.
- Suministro, transporte e instalación de cable Al 2x6 Serie-8000.
- Suministro, transporte e instalación de luminarias led de alumbrado público tipo perfil M4-1.
- Transporte, instalación y suministro de herrajes en poste o torrecilla estructura tipo NC-625.
- Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de conductor de redes aéreas Aluminio
- Poda y limpieza de zonas para instalación de luminarias

Contratista: CONSORCIO ILUMINAR BGA R

Valor Inicial: \$1.659.990.756,00

Valor Adicional: \$921.129.953,01

Valor Total: \$ 2.581.120.708,58

Plazo Inicial: 02 Meses

Plazo Adicional No. 1: 03 Meses

Plazo Adicional No. 2: 03 Meses

Fecha De Inicio: 15 De abril De 2024

fecha De Suspensión No 1: 13 De junio De 2024

fecha De Reinicio No 1: 30 De septiembre De 2024

Fecha de suspensión No 2. 27 de diciembre de 2024

fecha De Reinicio No 2: 25 de septiembre De 2025

Fecha De Terminación: 30 De diciembre De 2025

Avance físico Ejecutado: 100%

Beneficios para la Comunidad:

- **Mayor Eficiencia Energética:** Las nuevas luminarias LED consumen menos energía, lo que se traduce en una menor huella de carbono.
- **Mejor Iluminación:** Las luminarias LED proporcionan una luz más blanca y uniforme, lo que mejora la visibilidad y la seguridad en las vías de acceso.
- **Mayor Durabilidad:** Las tecnologías LED tienen una vida útil significativamente mayor que las luminarias tradicionales, lo que reduce los costos de mantenimiento y reemplazos.
- **Menor Impacto Ambiental:** La reducción en el consumo de energía y la utilización de materiales más amigables con el medio ambiente contribuyen a disminuir la contaminación y a proteger el ecosistema.
- **Aumento de la Seguridad:** Una iluminación adecuada en vías de acceso reduce la criminalidad y accidentalidad, mejorando la percepción de seguridad de los residentes, creando entornos más seguros y cómodos para todos.



Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 - FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	2023680010042	\$4.090.424.780,64	\$14.773.520.535,58

Contrato de Obra Pública 285 - 2023 Lote 1: Se encuentra localizado en la carrera 27 desde la calle 9 hasta la calle 34 del Municipio de Bucaramanga. A su vez, este proyecto impacta directamente sobre el eje vial principal de la ciudad, garantizando la iluminación sobre este corredor con gran presencia de establecimientos comerciales, instituciones educativas (SENA, UIS, UMB, COLEGIO SANTANDER, COLEGIO TECNOLÓGICO, UNIMINUTO), centros hospitalarios Clínica La Merced, Clínica Comuneros y edificaciones residenciales de grandes volúmenes, comprendido entre los barrios La Aurora, San Alonso, San Francisco, La Universidad, Mutualidad y Antonia Santos.

Descripción de actividades ejecutadas:

- **Retiro de infraestructura existente:** Porcentaje de avance 100%.
- **Construcción de canalizaciones:** Porcentaje de avance 100%.
- **Instalación de postes y luminarias:** Porcentaje de avance 100%.
- **Instalación de luminarias:** Porcentaje de avance 100%.

Valor del contrato inicial: \$ 1.542.848.948,00

Valor del Adicional 1: \$ 436.339.159,00

Valor total: \$ 1.979.188.107

Avance físico Ejecutado: 100%

ESTADO ACTUAL: Terminado, LIQUIDADADO

Beneficios para la Comunidad:

- **Mayor Eficiencia Energética:** Las nuevas luminarias LED consumen menos energía, lo que se traduce en una reducción de los costos operativos para el municipio y una menor huella de carbono.
- **Mejor Iluminación:** Las luminarias LED proporcionan una luz más blanca y uniforme, lo que mejora la visibilidad y la seguridad en las vías públicas.



- **Mayor Durabilidad:** La tecnología LED presenta una vida útil considerablemente mayor que la de las luminarias tradicionales, lo que reduce los costos de mantenimiento y reemplazo.
- **Menor Impacto Ambiental:** La disminución en el consumo de energía y el uso de materiales más sostenibles contribuyen a reducir la contaminación y proteger el ecosistema.
- **Estética Urbana:** La nueva infraestructura de alumbrado público ofrece a la ciudad un aspecto más moderno y atractivo.
- **Aumento de la Seguridad Pública:** Una iluminación adecuada en espacios públicos reduce la criminalidad y mejora la percepción de seguridad de los residentes, creando entornos más seguros y cómodos para todos.



Imagen 1. Instalación de postes



Imagen 2. Instalación de adoquín

Contrato de Obra Pública 286 -2023 Lote 2: Se encuentra localizado en la carrera 27 desde la calle 34 hasta la puerta del sol del Municipio de Bucaramanga. A su vez, este proyecto impacta directamente sobre el eje vial principal de la ciudad, garantizando la iluminación sobre este corredor con gran presencia de establecimientos comerciales y edificaciones residenciales de grandes volúmenes, comprendido entre los barrios Mejoras Públicas, Sotomayor, Nuevo Sotomayor, Bolarquí y Concordia.

Actividades en Ejecución:

- **Construcción de cajas de alumbrado:** El porcentaje de avance es del 100%.
- **Instalación de postes y luminarias:** El porcentaje de avance es del 100%.
- **Recuperación del espacio público:** El porcentaje de avance es del 100%.
- **Retiro de infraestructura existente:** El porcentaje de avance es del 100%.

Valor del contrato inicial: \$ 1.522.075.669,89

Valor del Adicional 1: \$ 287.025.412,00

Valor del Adicional 2: \$ 104.224.318,82

Valor total: \$ 1.913.325.400,71

Avance físico Ejecutado: 100%

ESTADO ACTUAL: Terminado, LIQUIDADADO

Beneficios para la Comunidad:



- **Mayor Eficiencia Energética:** Las nuevas luminarias LED consumen menos energía, lo que se traduce en una reducción de los costos operativos para el municipio y una menor huella de carbono.
- **Mejor Iluminación:** Las luminarias LED proporcionan una luz más blanca y uniforme, lo que mejora la visibilidad y la seguridad en las vías públicas.
- **Mayor Durabilidad:** La tecnología LED presenta una vida útil considerablemente mayor que la de las luminarias tradicionales, lo que reduce los costos de mantenimiento y reemplazo.
- **Menor Impacto Ambiental:** La disminución en el consumo de energía y el uso de materiales más sostenibles contribuyen a reducir la contaminación y proteger el ecosistema.
- **Estética Urbana:** La nueva infraestructura de alumbrado público ofrece a la ciudad un aspecto más moderno y atractivo.
- **Aumento de la Seguridad Pública:** Una iluminación adecuada en espacios públicos reduce la criminalidad y mejora la percepción de seguridad de los residentes, creando entornos más seguros y cómodos para todos.



Imagen 1. Instalación de postes



Imagen 2. Tendido de redes

Contrato de Obra Pública 287 - 2023 Lote 3: Se encuentra localizado en Calle 36 desde la carrera 11 hasta la carrera 27 del Municipio de Bucaramanga. A su vez, este proyecto impacta directamente sobre el sector comercial de la ciudad en la zona centro, zona residencial del barrio Mejoras públicas, Antonia Santos y Centro

Objetivo del Contrato: Modernizar el sistema de alumbrado público de la ciudad de Bucaramanga, sustituyendo las antiguas luminarias por nuevas tecnologías LED más eficientes y duraderas. Esta actualización incluyó la mejora de los drivers y otros componentes de las luminarias, así como el reemplazo de la ductería para garantizar un funcionamiento óptimo y confiable del sistema.

Actividades en Ejecución:

- **Construcción de canalizaciones:** Porcentaje de avance 100%.
- **Construcción de cajas de alumbrado:** Porcentaje de avance 100%.
- **Instalación de postes y luminarias:** Porcentaje de avance 100%.
- **Recuperación del espacio público:** Porcentaje de avance 100%.



Valor del contrato inicial: \$ 1.522.075.669,89

Valor del Adicional 1: \$ 456.622.700,97

Valor total: \$ 1978.698.370,86

Avance físico Ejecutado: 100%

ESTADO ACTUAL: Terminado, LIQUIDADO

Beneficios para la Comunidad:

- **Mayor Eficiencia Energética:** Las nuevas luminarias LED consumen menos energía, lo que se traduce en una reducción de los costos operativos para el municipio y en una menor huella de carbono.
- **Mejor Iluminación:** Las luminarias LED proporcionan una luz más blanca y uniforme, lo que mejora la visibilidad y la seguridad en las vías públicas.
- **Mayor Durabilidad:** Las tecnologías LED tienen una vida útil significativamente mayor que las luminarias tradicionales, lo que reduce los costos de mantenimiento y reemplazos.
- **Menor Impacto Ambiental:** La reducción en el consumo de energía y la utilización de materiales más amigables con el medio ambiente contribuyen a disminuir la contaminación y a proteger el ecosistema.
- **Estética Urbana:** La nueva infraestructura de alumbrado público le dará a la ciudad un aspecto más moderno y atractivo.
- **Aumento de la Seguridad Pública:** Una iluminación adecuada en espacios públicos reduce la criminalidad y mejora la percepción de seguridad de los residentes, creando entornos más seguros y cómodos para todos.



Imagen 1. Instalación de postes



Imagen 2. Construcción de tablero

Contrato 289 de 2023 - Lote 6: Se encuentra localizado en la Avenida Gonzales Valencia, del Municipio de Bucaramanga, sirve como un importante corredor que conecta diferentes áreas de Bucaramanga, facilitando el acceso a lugares relevantes por parte de estudiantes, trabajadores de los distintos sectores económicos, desde la zona céntrica, oriental y occidental del municipio. Desde el pasado 20 de noviembre, anterior fecha de terminación del contrato, cuyas causales que habían generado la Suspensión N.º 3 ya fueron superadas y por lo tanto, se establece en común acuerdo el reinicio 3 de las actividades de obra a partir del 13 de diciembre con fecha de terminación el 31 de diciembre del 2024

Actividades en Ejecución:

- **Demolición y Excavación:** Porcentaje de avance 100%.



- **Construcción de Cajas de Alumbrado:** Porcentaje de avance 100%.
- **Reemplazo de Ductería:** Porcentaje de avance 100%.
- **Postes:** Porcentaje de avance 100%.

Valor del contrato inicial: \$ 836'362.735,00

Valor del Adicional 1: \$ 405.365.172

Valor del Adicional 2: 53.532.331,51. en valor y tiempo

Valor total: \$ 1.295'.260.238,51

AVANCE EJECUTADO: 100%

ESTADO ACTUAL: Terminado, LIQUIDADO

Beneficios para la Comunidad:

- **Mayor Eficiencia Energética:** Las nuevas luminarias LED consumen menos energía, lo que se traduce en una reducción de los costos operativos para el municipio y en una menor huella de carbono.
- **Mejor Iluminación:** Las luminarias LED proporcionan una luz más blanca y uniforme, lo que mejora la visibilidad y la seguridad en las vías públicas.
- **Mayor Durabilidad:** Las tecnologías LED tienen una vida útil significativamente mayor que las luminarias tradicionales, lo que reduce los costos de mantenimiento y reemplazos.
- **Menor Impacto Ambiental:** La reducción en el consumo de energía y la utilización de materiales más amigables con el medio ambiente contribuyen a disminuir la contaminación y a proteger el ecosistema.
- **Estética Urbana:** La nueva infraestructura de alumbrado público le dará a la ciudad un aspecto más moderno y atractivo.
- **Aumento de la Seguridad Pública:** Una iluminación adecuada en espacios públicos reduce la criminalidad y mejora la percepción de seguridad de los residentes, creando entornos más seguros y cómodos para todos.



Contrato 290 de 2023 - Lote 7: Se encuentra localizado en la Avenida La Rosita, desde la Carrera 17 hasta la Carrera 27 del Municipio de Bucaramanga, sirve como un importante corredor que conecta diferentes áreas de Bucaramanga, facilitando el acceso a lugares relevantes por parte de estudiantes, trabajadores de los distintos sectores económicos, desde la zona céntrica, oriental y occidental del municipio. Desde el pasado 20 de



noviembre, anterior fecha de terminación del contrato, cuyas causales que habían generado la Suspensión N.º 3 ya fueron superadas y, por lo tanto, se establece en común acuerdo el reinicio 3 de las actividades de obra a partir del 13 de diciembre con fecha de terminación el 31 de diciembre del 2024

Actividades en Ejecución:

- **Demolición y Excavación:** Porcentaje de avance 100%.
- **Construcción de Cajas de Alumbrado:** Porcentaje de avance 100%.
- **Reemplazo de Ductería:** Porcentaje de avance 100%.
- **Postes:** Porcentaje de avance 100%.

Valor del contrato inicial: \$ 897'152.256,00

Valor del Adicional 1: \$ 310.247.632,98

Valor del Adicional 2: \$ 111.009.116,02 en valor y tiempo

Valor total: \$ 1.318'409.005

AVANCE EJECUTADO: 100%

ESTADO ACTUAL: Terminado, Se encuentra en liquidación

Beneficios para la Comunidad:

- **Mayor Eficiencia Energética:** Las nuevas luminarias LED consumen menos energía, lo que se traduce en una reducción de los costos operativos para el municipio y en una menor huella de carbono.
- **Mejor Iluminación:** Las luminarias LED proporcionan una luz más blanca y uniforme, lo que mejora la visibilidad y la seguridad en las vías públicas.
- **Mayor Durabilidad:** Las tecnologías LED tienen una vida útil significativamente mayor que las luminarias tradicionales, lo que reduce los costos de mantenimiento y reemplazos.
- **Menor Impacto Ambiental:** La reducción en el consumo de energía y la utilización de materiales más amigables con el medio ambiente contribuyen a disminuir la contaminación y a proteger el ecosistema.
- **Estética Urbana:** La nueva infraestructura de alumbrado público le dará a la ciudad un aspecto más moderno y atractivo.
- **Aumento de la Seguridad Pública:** Una iluminación adecuada en espacios públicos reduce la criminalidad y mejora la percepción de seguridad de los residentes, creando entornos más seguros y cómodos para todos.





Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	2024680010189	\$ 19.568.000.000	\$ 81.553.013.348,21

Descripción de actividades desarrolladas

Dentro del proyecto de mantenimiento del sistema de alumbrado público del municipio de Bucaramanga, se encuentran plasmados los siguientes contratos, los cuales se encuentran algunos en procesos de publicación en la plataforma de SECOP II, en estructuración o viabilidad jurídica, pero que a la fecha cuentan con CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal):

Contrato 188 de 2024 – MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.: Mediante el proceso SI-SI-LP-001-2024 en donde se adelantó la invitación abierta a presentar propuestas por parte del Municipio de Bucaramanga; para el objeto "MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA."; una vez realizada la evaluación de las propuestas recibidas, por parte del comité evaluador fue seleccionado el proponente OCCIDENTAL DE COLOMBIA .Se adelanto el contrato 188-2024; con el objeto de realizar MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE 2,del municipio de Bucaramanga con base en las PQR's reportadas por la comunidad del área metropolitana del municipio de Bucaramanga.

Ubicación: El proyecto se encuentra dirigido para el municipio de Bucaramanga.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en el área metropolitana de Bucaramanga, porque permite que el alumbrado público del municipio esté funcionando al 100 % de capacidad, beneficiando a la población y ayudando a reducir lugares oscuros contribuyendo a la seguridad del municipio. El proyecto se dirige a las siguientes ubicaciones:

- Comuna 2
- Comuna 7
- Comuna 13
- Comuna 17
- Corregimiento 1

Actividades en ejecución:

- Cambio de luminarias en daño
- Instalación de tapas antivandálicas
- Mantenimiento de redes de energía
- Instalación de cableado aéreo y subterráneo por reposición
- Instalación de nuevos puntos de energía
- Mantenimientos de tableros de distribución

Valor del contrato inicial: \$ 603.511.578

Valor total: \$ 905.267.367

ESTADO: LIQUIDADADO



Beneficios para la Comunidad:

1. Mejora de la seguridad pública

- Reducción de delitos: Un alumbrado público adecuado reduce la incidencia de delitos al mejorar la visibilidad en las calles, parques y otras áreas públicas, lo que dificulta la comisión de delitos como robos, agresiones o vandalismo.
- Prevención de accidentes: Las calles bien iluminadas disminuyen el riesgo de accidentes de tráfico, especialmente durante la noche, al ofrecer una mejor visibilidad para los conductores y peatones.

2. Fomento de la movilidad y accesibilidad

- Mayor confianza para transitar: Un buen sistema de alumbrado público proporciona seguridad tanto a peatones como a ciclistas y conductores, fomentando la movilidad nocturna y permitiendo que la comunidad se desplace con mayor tranquilidad.
- Accesibilidad en espacios públicos: Parques, plazas y áreas recreativas iluminadas adecuadamente pueden ser utilizadas por la comunidad en horarios nocturnos, mejorando la accesibilidad a espacios públicos.

3. Aumento de la calidad de vida

- Bienestar y tranquilidad: Un entorno bien iluminado genera un sentimiento de bienestar y tranquilidad en la comunidad, ya que la luz en espacios públicos ofrece comodidad y facilita la interacción social.
- Promoción de actividades recreativas: La iluminación pública adecuada permite que las personas realicen actividades recreativas, deportivas o sociales durante la noche, lo cual contribuye a la vida comunitaria y el esparcimiento.

4. Sostenibilidad y eficiencia energética

- Uso de tecnologías eficientes: Los contratos de mantenimiento de alumbrado público suelen incluir la implementación de tecnologías más eficientes, como las luces LED, que reducen el consumo de energía y los costos operativos. Esto contribuye a la sostenibilidad energética de la comunidad.
- Reducción de emisiones de carbono: La implementación de sistemas de iluminación de bajo consumo energético disminuye la huella de carbono de la comunidad, alineándose con los objetivos de sostenibilidad medioambiental.

5. Mantenimiento y actualización continua

- Respuestas rápidas a fallos: El contrato de mantenimiento asegura una respuesta rápida ante cualquier falla en el sistema de alumbrado, lo que minimiza los períodos de oscuridad en la vía pública y mantiene la seguridad.
- Mejora continua de la infraestructura: El mantenimiento regular incluye la inspección, reparación y sustitución de las luminarias, lo que garantiza que el sistema de alumbrado público esté siempre en buen estado y funcione de manera óptima.

6. Impacto en el desarrollo económico

- Atractivo para inversionistas y turistas: Las zonas bien iluminadas suelen ser más atractivas para los inversionistas, comerciantes y turistas, lo que puede favorecer el crecimiento económico local.
- Fomento del comercio local: Los comercios en áreas bien iluminadas se benefician de un mayor flujo de clientes, lo que contribuye a la actividad económica en la comunidad.

7. Mejor calidad visual y ambiental



- Reducción de la contaminación lumínica: Un contrato de mantenimiento bien gestionado puede ayudar a reducir la contaminación lumínica, mediante el uso de tecnología que distribuye la luz de manera eficiente y dirige el brillo solo hacia las áreas necesarias.
- Estética y valorización urbana: La iluminación adecuada también contribuye a la estética de la ciudad, haciendo que las calles y plazas se vean más atractivas, lo que puede mejorar la percepción pública de la zona.

8. Fortalecimiento del sentido de comunidad

- Sensación de pertenencia: Las áreas bien iluminadas fomentan una sensación de pertenencia y seguridad entre los residentes, ya que las personas se sienten parte activa de una comunidad bien cuidada.
- Incremento en la participación ciudadana: La inversión en infraestructura pública, como el alumbrado, puede incentivar a los ciudadanos a involucrarse más en asuntos comunitarios, ya que se percibe un esfuerzo conjunto por mejorar la calidad de vida.



Contrato 189 de 2024 – MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.: Mediante el proceso SI-SI-LP-001-2024 en donde se adelantó la invitación abierta a presentar propuestas por parte del Municipio de Bucaramanga; para el objeto "MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA."; una vez realizada la evaluación de las propuestas recibidas, por parte del comité evaluador fue seleccionado el proponente SOSDOM SA .Se adelantó el contrato 189-2024; con el objeto de realizar MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE 3,del municipio de Bucaramanga con base en las PQR'S reportadas por la comunidad del área metropolitana del municipio de Bucaramanga.

Ubicación: El proyecto se encuentra dirigido para el municipio de Bucaramanga.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en el área metropolitana de Bucaramanga, porque permite que el alumbrado público del municipio esté funcionando al 100 % de capacidad, beneficiando a la población y ayudando a reducir lugares oscuros contribuyendo a la seguridad del municipio. El proyecto se dirige a las siguientes ubicaciones:

- Comuna 3
- Comuna 4
- Comuna 8
- Comuna 14
- Corregimiento 2



Actividades en ejecución:

- Cambio de luminarias en daño
- Instalación de tapas antivandálicas
- Mantenimiento de redes de energía
- Instalación de cableado aéreo y subterráneo por reposición
- Instalación de nuevos puntos de energía
- Mantenimientos de tableros de distribución

Valor del contrato inicial: \$ 564.666.008

Valor total: \$ 846.999.012

ESTADO: Finalizado (Fecha de finalización, 13 de agosto de 2025), En recolección de información pendiente del orden técnico por parte del contratista.

Beneficios para la Comunidad:

1. Mejora de la seguridad pública

- Reducción de delitos: Un alumbrado público adecuado reduce la incidencia de delitos al mejorar la visibilidad en las calles, parques y otras áreas públicas, lo que dificulta la comisión de delitos como robos, agresiones o vandalismo.
- Prevención de accidentes: Las calles bien iluminadas disminuyen el riesgo de accidentes de tráfico, especialmente durante la noche, al ofrecer una mejor visibilidad para los conductores y peatones.

2. Fomento de la movilidad y accesibilidad

- Mayor confianza para transitar: Un buen sistema de alumbrado público proporciona seguridad tanto a peatones como a ciclistas y conductores, fomentando la movilidad nocturna y permitiendo que la comunidad se desplace con mayor tranquilidad.
- Accesibilidad en espacios públicos: Parques, plazas y áreas recreativas iluminadas adecuadamente pueden ser utilizadas por la comunidad en horarios nocturnos, mejorando la accesibilidad a espacios públicos.

3. Aumento de la calidad de vida

- Bienestar y tranquilidad: Un entorno bien iluminado genera un sentimiento de bienestar y tranquilidad en la comunidad, ya que la luz en espacios públicos ofrece comodidad y facilita la interacción social.
- Promoción de actividades recreativas: La iluminación pública adecuada permite que las personas realicen actividades recreativas, deportivas o sociales durante la noche, lo cual contribuye a la vida comunitaria y el esparcimiento.

4. Sostenibilidad y eficiencia energética

- Uso de tecnologías eficientes: Los contratos de mantenimiento de alumbrado público suelen incluir la implementación de tecnologías más eficientes, como las luces LED, que reducen el consumo de energía y los costos operativos. Esto contribuye a la sostenibilidad energética de la comunidad.
- Reducción de emisiones de carbono: La implementación de sistemas de iluminación de bajo consumo energético disminuye la huella de carbono de la comunidad, alineándose con los objetivos de sostenibilidad medioambiental.

5. Mantenimiento y actualización continua

- Respuestas rápidas a fallos: El contrato de mantenimiento asegura una respuesta rápida ante cualquier falla en el sistema de alumbrado, lo que minimiza los períodos de oscuridad en la vía pública y mantiene la seguridad.
- Mejora continua de la infraestructura: El mantenimiento regular incluye la inspección, reparación y sustitución de las luminarias, lo que garantiza que el



sistema de alumbrado público esté siempre en buen estado y funcione de manera óptima.

6. Impacto en el desarrollo económico

- Atractivo para inversionistas y turistas: Las zonas bien iluminadas suelen ser más atractivas para los inversionistas, comerciantes y turistas, lo que puede favorecer el crecimiento económico local.
- Fomento del comercio local: Los comercios en áreas bien iluminadas se benefician de un mayor flujo de clientes, lo que contribuye a la actividad económica en la comunidad.

7. Mejor calidad visual y ambiental

- Reducción de la contaminación lumínica: Un contrato de mantenimiento bien gestionado puede ayudar a reducir la contaminación lumínica, mediante el uso de tecnología que distribuye la luz de manera eficiente y dirige el brillo solo hacia las áreas necesarias.
- Estética y valorización urbana: La iluminación adecuada también contribuye a la estética de la ciudad, haciendo que las calles y plazas se vean más atractivas, lo que puede mejorar la percepción pública de la zona.

8. Fortalecimiento del sentido de comunidad

- Sensación de pertenencia: Las áreas bien iluminadas fomentan una sensación de pertenencia y seguridad entre los residentes, ya que las personas se sienten parte activa de una comunidad bien cuidada.
- Incremento en la participación ciudadana: La inversión en infraestructura pública, como el alumbrado, puede incentivar a los ciudadanos a involucrarse más en asuntos comunitarios, ya que se percibe un esfuerzo conjunto por mejorar la calidad de vida.



Contrato 199 de 2024 – MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.: Mediante el proceso SI-SI-LP-001-2024 en donde se adelantó la invitación abierta a presentar propuestas por parte del Municipio de Bucaramanga; para el objeto "MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA."; una vez realizada la evaluación de las propuestas recibidas, por parte del comité evaluador fue seleccionado el proponente CONSORCIO MANTENIMIENTO DIKARM-2024. Se adelanto el contrato 199-2024; con el objeto de realizar MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE 4, del municipio de Bucaramanga con base en las PQR's reportadas por la comunidad del área metropolitana del municipio de Bucaramanga.

Ubicación: El proyecto se encuentra dirigido para el municipio de Bucaramanga.



Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en el área metropolitana de Bucaramanga, porque permite que el alumbrado público del municipio este funcionando al 100 % de capacidad, beneficiando a la población y ayudando a reducir lugares oscuros contribuyendo a la seguridad del municipio. El proyecto se dirige a las siguientes ubicaciones:

- Comuna 1
- Comuna 5
- Comuna 9
- Comuna 15
- Corregimiento 3

Actividades en ejecución:

- Cambio de luminarias en daño
- Instalación de tapas antivandálicas
- Mantenimiento de redes de energía
- Instalación de cableado aéreo y subterráneo por reposición
- Instalación de nuevos puntos de energía
- Mantenimientos de tableros de distribución

Valor del contrato inicial: \$ 619.597.399,45

Valor total: \$ 929.396.098,95

ESTADO: Finalizado (Fecha de finalización, 13 de agosto de 2025), En recolección de información pendiente del orden técnico por parte del contratista.

Beneficios para la Comunidad:

1. Mejora de la seguridad pública

- Reducción de delitos: Un alumbrado público adecuado reduce la incidencia de delitos al mejorar la visibilidad en las calles, parques y otras áreas públicas, lo que dificulta la comisión de delitos como robos, agresiones o vandalismo.
- Prevención de accidentes: Las calles bien iluminadas disminuyen el riesgo de accidentes de tráfico, especialmente durante la noche, al ofrecer una mejor visibilidad para los conductores y peatones.

2. Fomento de la movilidad y accesibilidad

- Mayor confianza para transitar: Un buen sistema de alumbrado público proporciona seguridad tanto a peatones como a ciclistas y conductores, fomentando la movilidad nocturna y permitiendo que la comunidad se desplace con mayor tranquilidad.
- Accesibilidad en espacios públicos: Parques, plazas y áreas recreativas iluminadas adecuadamente pueden ser utilizadas por la comunidad en horarios nocturnos, mejorando la accesibilidad a espacios públicos.

3. Aumento de la calidad de vida

- Bienestar y tranquilidad: Un entorno bien iluminado genera un sentimiento de bienestar y tranquilidad en la comunidad, ya que la luz en espacios públicos ofrece comodidad y facilita la interacción social.
- Promoción de actividades recreativas: La iluminación pública adecuada permite que las personas realicen actividades recreativas, deportivas o sociales durante la noche, lo cual contribuye a la vida comunitaria y el esparcimiento.

4. Sostenibilidad y eficiencia energética



- **Uso de tecnologías eficientes:** Los contratos de mantenimiento de alumbrado público suelen incluir la implementación de tecnologías más eficientes, como las luces LED, que reducen el consumo de energía y los costos operativos. Esto contribuye a la sostenibilidad energética de la comunidad.
- **Reducción de emisiones de carbono:** La implementación de sistemas de iluminación de bajo consumo energético disminuye la huella de carbono de la comunidad, alineándose con los objetivos de sostenibilidad medioambiental.

5. Mantenimiento y actualización continua

- **Respuestas rápidas a fallos:** El contrato de mantenimiento asegura una respuesta rápida ante cualquier falla en el sistema de alumbrado, lo que minimiza los períodos de oscuridad en la vía pública y mantiene la seguridad.
- **Mejora continua de la infraestructura:** El mantenimiento regular incluye la inspección, reparación y sustitución de las luminarias, lo que garantiza que el sistema de alumbrado público esté siempre en buen estado y funcione de manera óptima.

6. Impacto en el desarrollo económico

- **Atractivo para inversionistas y turistas:** Las zonas bien iluminadas suelen ser más atractivas para los inversionistas, comerciantes y turistas, lo que puede favorecer el crecimiento económico local.
- **Fomento del comercio local:** Los comercios en áreas bien iluminadas se benefician de un mayor flujo de clientes, lo que contribuye a la actividad económica en la comunidad.

7. Mejor calidad visual y ambiental

- **Reducción de la contaminación lumínica:** Un contrato de mantenimiento bien gestionado puede ayudar a reducir la contaminación lumínica, mediante el uso de tecnología que distribuye la luz de manera eficiente y dirige el brillo solo hacia las áreas necesarias.
- **Estética y valorización urbana:** La iluminación adecuada también contribuye a la estética de la ciudad, haciendo que las calles y plazas se vean más atractivas, lo que puede mejorar la percepción pública de la zona.

8. Fortalecimiento del sentido de comunidad

- **Sensación de pertenencia:** Las áreas bien iluminadas fomentan una sensación de pertenencia y seguridad entre los residentes, ya que las personas se sienten parte activa de una comunidad bien cuidada.
- **Incremento en la participación ciudadana:** La inversión en infraestructura pública, como el alumbrado, puede incentivar a los ciudadanos a involucrarse más en asuntos comunitarios, ya que se percibe un esfuerzo conjunto por mejorar la calidad de vida.



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA META: 11 - GARANTIZAR 51.229 LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Durante el tercer trimestre del año 2025 se ha dado cumplimiento a la meta institucional de garantizar 51.229 lámparas de alumbrado público para la prestación del servicio en el Municipio de Bucaramanga. Este resultado obedece a la implementación de acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, la reposición oportuna de luminarias, y la optimización de los procesos de gestión del servicio.

El cumplimiento de esta meta asegura la continuidad y calidad del alumbrado público en vías, parques y espacios urbanos, fortaleciendo la seguridad vial y ciudadana, mejorando la movilidad nocturna y generando un entorno urbano más seguro y atractivo para la comunidad. Asimismo, este logro refleja el compromiso de la administración municipal con la sostenibilidad del servicio y con el bienestar de los habitantes, al garantizar una cobertura adecuada que contribuye al desarrollo social y económico de la ciudad.

De esta forma, el cumplimiento en el tercer trimestre de 2025 evidencia la eficiencia en la gestión del servicio de alumbrado público, consolidando la meta propuesta y reafirmando la capacidad institucional de garantizar una infraestructura urbana confiable y al servicio de todos los ciudadanos de Bucaramanga.

Para tener en cuenta, cabe mencionar que debido a que el servicio de alumbrado público en el Municipio de Bucaramanga, conformado por 51.229 luminarias, está expuesto de manera permanente a factores externos que pueden afectar su funcionamiento. Entre ellos se destacan las variaciones climáticas (lluvias intensas, tormentas eléctricas, humedad, vientos fuertes y altas temperaturas), así como condiciones ambientales y de desgaste natural por uso continuo. Estos elementos generan, de manera inevitable, fallas o deterioros en algunas luminarias, impactando temporalmente la prestación del servicio.

Es por esto, que es normal que, en algún transcurso de la vigencia, en alguna semana contemos con menos cantidad de luminarias funcionando, las cuales son atendidas y se llega nuevamente a cumplir la respectiva meta.

META E INDICADOR DE PRODUCTO

Elaborar 2 Documentos de estudio técnico para mejorar la prestación de servicio de alumbrado público.



Indicador	Meta 2025	Logro 2025	% Avance 2025	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Numero de documentos	2	0,25	13%	\$ 2.500.000.000,00	\$ 2.500.000.000,00	100%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO DE REFERENCIA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	202500000028264	\$ 2.500.000.000	\$ 2.500.000.000

Resumen del proyecto: El municipio es responsable de prestar el servicio de alumbrado público consistente en la iluminación de las vías públicas, parques públicos, escenarios deportivos y demás espacios de libre circulación que no se encuentran a cargo de ninguna persona Natural o Jurídica diferente del municipio.

Realizar un estudio técnico diagnóstico del sistema de alumbrado público que permita identificar sus condiciones actuales, deficiencias técnicas y oportunidades de mejora para orientar su planificación y modernización del alumbrado en el municipio.

Realizar un ajuste integral a la prestación del servicio mediante un estudio técnico de referencia, con el fin de satisfacer las necesidades de avanzar en la modernización, renovación y expansión del alumbrado público urbano y rural del Municipio de Bucaramanga, haciendo uso de tecnologías más amigables con el medio ambiente, favoreciendo la seguridad de los ciudadanos, entregando espacios iluminados que brinden la sensación de espacios seguros en la ciudad, tanto en sus zonas urbanas como rurales, encaminando grandes esfuerzos e inversiones, tanto físicas, económicas y de personal.

Objetivo: Mejorar el servicio de Alumbrado Público en la ciudad, mediante el desarrollo de nuevas tecnologías, la optimización del sistema tarifario, el fortalecimiento de la infraestructura, la implementación eficiente de un centro de control y monitoreo, y la autogeneración de energías limpias autosostenibles, con el fin de garantizar un servicio de calidad, eficiente, sostenible y efectivo del sistema de iluminación en espacios públicos, que además propicie seguridad ciudadana, confianza en el uso de espacios públicos y desarrollo económico.

BENEFICIOS DEL PROYECTO:

SOCIALES: El proyecto tiene como principal beneficio el fortalecimiento en el desarrollo y ejecución de las actividades de seguimiento y control a procesos de la secretaría de Infraestructura-Alumbrado Público.

ECONÓMICOS: Implementado nueva tecnología e instalando luminarias LED, genera disminución en los altos niveles de consumo de energía y mantenimiento.

AMBIENTALES: Generar un impacto ambiental, disminuyendo los niveles de dióxido de carbono en la ciudad, al construir el sistema de iluminación con nuevas tecnologías y uso de luminarias LED.



INFORMACIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL DEL PROYECTO

- **CONTRATO:** 176 DEL 2025
- **OBJETO:** Realizar El Estudio Técnico De Referencia De Determinación De Costos, Optimizar La Eficiencia Energética Y Puesta En Marcha Del Esquema De Operación Para El Sistema De Alumbrado Público Del Municipio De Bucaramanga
- **VALOR:** \$ 2.500.000.000
- **FECHA DE INICIO:** 25/08/2025
- **FECHA FIN:** 30/12/2025
- **ESTADO:** SUSPENDIDO

INFORMACIÓN AVANCE DE EJECUCIÓN:

- Se revisó y aprobó el plan de trabajo remitido por el contratista.
- Se realizó mesa de trabajo con el líder técnico del proceso de formulación del ETR el 15 de Sept, donde se revisó el plan de trabajo y entregables, se definió avances de forma quincenal con el fin de llevar un seguimiento.
- Se recibió Solicitud de información por parte del contratista, de esta información ya se realizó una primera entrega de información el día 19 de Sept. Para los puntos pendientes por entregar ya se elaboraron los oficios para ser remitidos a la secretaria de Planeación y secretaria de Hacienda y poder consolidar la información solicitada.
- Se dio trámite al primer pago del contrato

META E INDICADOR DE PRODUCTO

Implementar un sistema de gestión y monitoreo de la información del alumbrado público acorde a RETILAP.

Indicador	Meta 2025	Logro 2025	% Avance 2025	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Sistemas de información actualizados	0,4	1	100%	\$ 895.583.589	\$ 595.583.589,00	66%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE BUCARAMANGA	2024680010205	\$ 950.000.000	\$ 2.829.559.058,41

Resumen del proyecto: Teniendo en cuenta que el Municipio de Bucaramanga tiene establecido el Impuesto de Alumbrado Público según acuerdo municipal vigente 044 de 2008 y que esta es una renta de destinación específica, es claro y conveniente que se utilice recursos de este rubro para atender todas las necesidades de la prestación del servicio de alumbrado público incluido los gastos administrativos.



Dada la importancia en la prestación del servicio de alumbrado público es necesario realizar la adquisición de la renovación de las licencias OPUS, SGAP, SIAP y otras herramientas tecnológicas, para garantizar el funcionamiento eficaz del área de diseño, garantizando a su vez la administración, operación y mantenimiento y de esta manera prestar el servicio esencial de alumbrado público que no se puede dejar de prestar, por seguridad de todos los habitantes del Municipio.

SOCIALES: El proyecto tiene como principal beneficio el fortalecimiento en el desarrollo y ejecución de las actividades de seguimiento y control a procesos de la secretaría de Infraestructura-Alumbrado Público.

ECONÓMICOS: Implementado nueva tecnología, genera disminución en los altos niveles de consumo de energía y en los costos de mantenimiento especialmente en el ahorro en la contratación de cuadrillas de mantenimiento.

AMBIENTALES: Generar un impacto ambiental, disminuyendo los niveles de dióxido de carbono en la ciudad, al construir el sistema de iluminación con nuevas tecnologías.

PROCESOS CONTRACTUALES RELACIONADOS CON EL PROYECTO Y LA META

INFORMACIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL DE SGAP

- **CONTRATO:** 075 DEL 2025
- **OBJETO:** Servicio De Soporte Y Mantenimiento Del Sistema De Gestión De Alumbrado Público-SGAP Y El Hardware De Control Asociado En Los Diferentes Sitios De Telemedida Del Municipio De Bucaramanga.
- **VALOR:** \$ 277.556.919
- **FECHA DE INICIO:** 21/05/2025
- **FECHA FIN:** 31/12/2025
- **ESTADO:** EN RECIBO FINAL PARA INICIAR PROCESO DE LIQUIDACIÓN

El software de gestión del Alumbrado Público tiene como objetivo optimizar el control y la operación de las luminarias de la ciudad de Bucaramanga. La plataforma se enfoca en mantener la máxima disponibilidad del servicio, asegurar una alta eficiencia operativa y minimizar los costos asociados a las fallas recurrentes, todo ello a través de una estrategia que va más allá del mantenimiento convencional.

Objetivo del Software: El software busca transformar la gestión del alumbrado público en una plataforma inteligente, trazable y adaptable, asegurando que cada acción técnica esté respaldada por análisis predictivos, indicadores de rendimiento y propuestas de mejora continuas. Esta herramienta facilita una toma de decisiones más ágil y precisa, permitiendo a los gestores anticiparse a posibles riesgos y mejorar la calidad del servicio para los ciudadanos.

Características Claves del Software


1. **Monitoreo y Control Remoto:** El software permite monitorear el estado de las luminarias en tiempo real, con actualizaciones periódicas sobre la comunicación y el funcionamiento de cada unidad. Esto facilita la identificación de fallas y la implementación de soluciones antes de que se conviertan en problemas mayores.
2. **Gestión de Alarmas y Fallas:** A través del sistema, se gestionan las alarmas y fallas de forma eficiente, con un proceso automatizado que detecta y notifica incidencias en el menor tiempo posible. Además, el software tiene la capacidad de reducir eventos críticos en más del 95% mediante mantenimiento preventivo, correctivo y un seguimiento remoto constante.
3. **Optimización de Mantenimiento Preventivo:** El sistema permite la programación de intervenciones periódicas, garantizando que todas las luminarias se mantengan en


- condiciones óptimas. Las intervenciones incluyen inspecciones regulares, limpieza, revisión de conexiones eléctricas y validación de parámetros técnicos.
4. Gestión de Base de Datos y Respaldos: El software asegura la integridad de los datos mediante la depuración semanal y la verificación de copias de seguridad. De esta manera, se preserva la información histórica y operativa para la toma de decisiones a largo plazo.
 5. Análisis de Desempeño y Mejora Continua: El software consolida los indicadores clave de desempeño, trazabilidad de fallas, análisis de costos operativos y propuestas de mejora. Esto permite a los responsables de la gestión del alumbrado público optimizar los recursos, reducir el tiempo de inactividad y mejorar la calidad del servicio prestado a la comunidad.
 6. Soporte Técnico Especializado: A través de la plataforma, se proporciona soporte técnico tanto remoto como presencial para resolver incidentes relacionados con el hardware y el software. Esto incluye la atención de fallas en sensores, controladores y otros componentes esenciales para el funcionamiento del sistema de alumbrado público.
 7. Capacitación y Actualización del Personal: El software también incluye módulos para la capacitación continua del personal operativo, asegurando que estén actualizados en el manejo del sistema y la integración de nuevos equipos.

Beneficios para la Gestión del Alumbrado Público. El uso de este software permite una gestión más eficiente y proactiva del alumbrado público de Bucaramanga, con los siguientes beneficios clave:

- Mayor disponibilidad y confiabilidad del servicio, reduciendo significativamente el tiempo de inactividad.
- Mejor control y trazabilidad, lo que permite una mejor planificación y ejecución de las actividades de mantenimiento.
- Reducción de costos operativos, gracias a la optimización de recursos y la prevención de fallas.
- Mayor resiliencia ante incidentes, con una respuesta más rápida y efectiva a las alertas del sistema.

El software de gestión implementado por WM SAS en el Alumbrado Público de Bucaramanga no solo facilita la operación diaria de las luminarias de la ciudad, sino que también transforma la gestión del alumbrado en una plataforma inteligente y adaptable. Con su capacidad de monitoreo en tiempo real, gestión de alarmas, mantenimiento preventivo y análisis de desempeño, el sistema asegura una operación eficiente, confiable y resiliente, elevando la calidad del servicio y optimizando los recursos públicos.

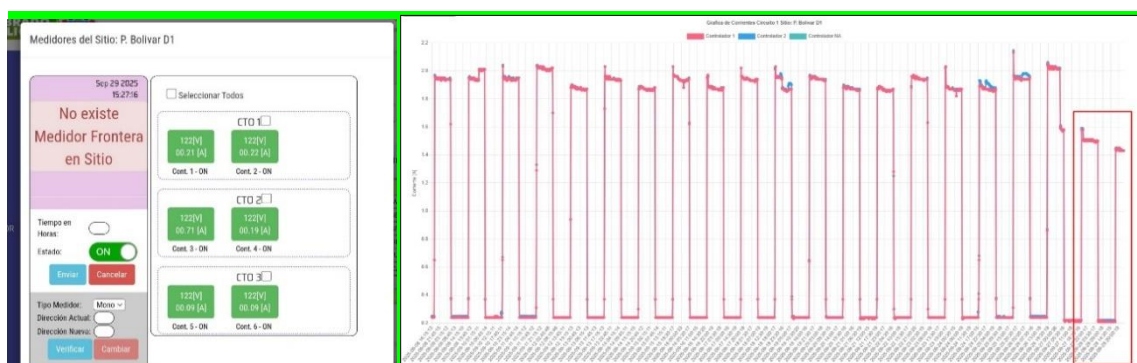

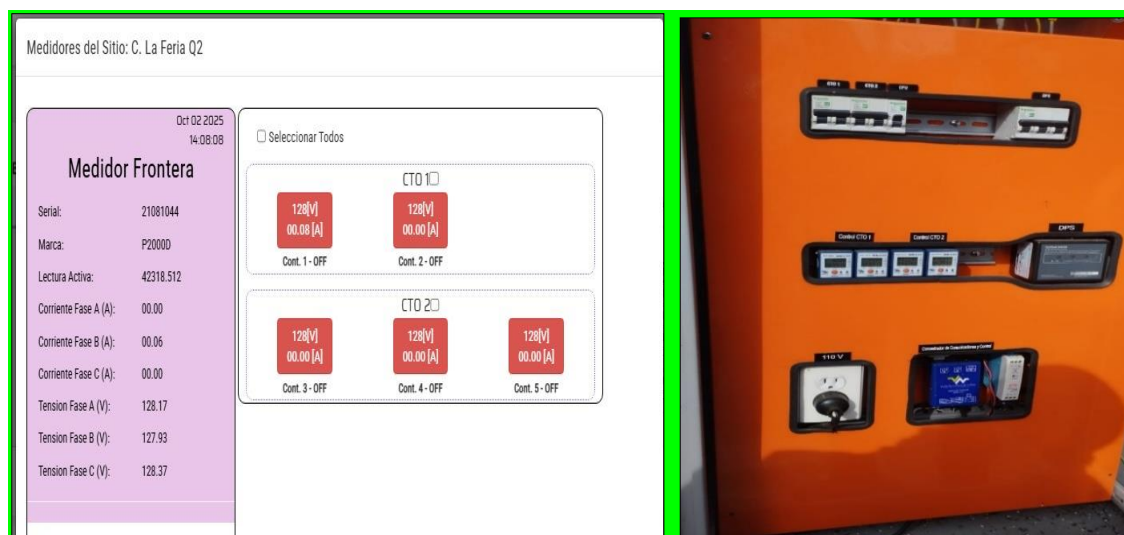

INFORMACIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL DE OPUS

- **CONTRATO:** 153 DEL 2025
- **OBJETO:** Renovación De Suscripción De 11 Licencias Del Software Opus 24 Por Dos Años Para Alumbrado Público Del Municipio De Bucaramanga.
- **VALOR:** \$ 58.821.460,00
- **FECHA DE INICIO:** 05/08/2025
- **FECHA FIN:** 04/09/2025
- **ESTADO:** EN RECIBO FINAL PARA INICIAR PROCESO DE LIQUIDACIÓN

OPUS está diseñado para optimizar la gestión de presupuestos, su principal objetivo es automatizar, controlar y analizar los presupuestos de manera eficiente, permitiendo una planificación financiera más precisa y un seguimiento en tiempo real de los gastos e ingresos. Con OPUS, la organización puede mejorar la asignación de recursos y garantizar el cumplimiento de los objetivos financieros establecidos.

Características del Software:

- **Planificación y Asignación de Presupuestos:** OPUS permite la creación de presupuestos detallados por áreas, proyectos o departamentos, con la capacidad de realizar ajustes conforme se desarrollan las actividades financieras.
- **Monitoreo en Tiempo Real:** Ofrece la capacidad de monitorear los gastos y compararlos con el presupuesto proyectado, alertando sobre desviaciones y facilitando la toma de decisiones correctivas.
- **Informes Detallados y Personalizados:** Genera informes financieros completos que muestran el estado de los presupuestos, permitiendo un análisis exhaustivo de las variaciones y facilitando la toma de decisiones.
- **Integración con Otros Sistemas Financieros:** OPUS puede integrarse con sistemas contables y de gestión de recursos, lo que garantiza la consistencia y precisión de los datos financieros a lo largo de la organización.

Beneficios para la Gestión de Presupuestos:

- **Optimización de Recursos Financieros:** El programa asegura que los recursos se asignen de manera eficiente, evitando sobrecostos y asegurando que cada área se mantenga dentro de su presupuesto.
- **Mejor Control y Seguimiento:** La capacidad de monitorear el presupuesto en tiempo real permite a los gerentes realizar ajustes inmediatos y evitar desviaciones que afecten los resultados financieros.
- **Mayor Precisión en la Planificación:** Gracias a las herramientas de análisis y simulación, los presupuestos se planifican con mayor precisión, considerando variables e imprevistos, lo que mejora la exactitud de las previsiones financieras.
- **Cumplimiento de Objetivos Financieros:** Con OPUS, se facilita el cumplimiento de metas financieras, ya que permite un seguimiento constante y detallado, ayudando



a las organizaciones a cumplir con sus objetivos sin exceder los límites presupuestarios.

La implementación del software OPUS para la gestión de presupuestos permitirá a la organización mejorar significativamente la precisión en la planificación financiera, optimizar los recursos y tener un control exhaustivo sobre los gastos. Esto no solo optimiza el proceso de presupuestación, sino que también contribuye al éxito financiero a largo plazo de la empresa, asegurando que cada área esté alineada con las metas financieras globales.

The screenshot displays the 'Estructura de tareas' (Task Structure) window in the OPUS software. It features a main table with columns for 'Clave', 'Descripción', 'Unidad', 'Cantidad', 'Costo unitario', 'Importe', 'Pronóstico contrato', 'EDC', and 'Descripción EDC'. Two rows are visible, both for 'Muro de tabique 6 x 12 x 24 cms hecho'. Below this is a summary bar with categories like 'Materiales', 'Mano de obra', 'Equipos', etc. A second table below shows a detailed breakdown of items with columns for 'De...', 'C', 'Tipo', 'Clave', 'Descripción', 'Unidad', 'Cantidad', 'Costo planeación', 'Costo oferta', and 'Total'. A dialog box titled '[Modificar] Material: PRMA-002' is open, showing fields for 'Clave', 'Tipo', 'Unidad', 'Familia', 'Costo planeación', and 'Costo propuesta'.

INFORMACIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SIAP

- **CONTRATO:** 175 DEL 2025
- **OBJETO:** Análisis Y Diagnostico De La Situación Actual E Implementación De Un Sistema De Información De Alumbrado Público - SIAP En El Municipio De Bucaramanga
- **VALOR:** \$ 259.205.210
- **FECHA DE INICIO:** 25/08/2025
- **FECHA FIN:** 31/12/2025
- **ESTADO:** EN RECIBO FINAL PARA INICIAR PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Información Sobre Avance De Ejecución Del Proceso

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN

1.1 Sobre la información base y la fase de diagnóstico

- La supervisión observa que una parte significativa de la información utilizada como insumo para el diagnóstico inicial correspondía a bases de datos desactualizadas y a información incompleta, situación que fue debidamente documentada por el contratista y validada por la supervisión.
- Se deja constancia de que dichas limitaciones no fueron atribuibles al contratista, sino a condiciones preexistentes del sistema de información del Alumbrado Público.
- La supervisión verificó que estas limitaciones fueran explícitamente reconocidas en los informes, permitiendo que las conclusiones y decisiones posteriores se adoptaran con conocimiento de los riesgos asociados.

1.2 Sobre la selección de la alternativa tecnológica

- La supervisión observa que la selección de la alternativa tecnológica se realizó con base en criterios funcionales y normativos alineados con las necesidades identificadas en el diagnóstico.



- No obstante, se deja constancia de que, para efectos de auditoría o control posterior, resulta conveniente fortalecer el expediente con evidencias adicionales que respalden la verificación de cumplimiento de todos los requisitos técnicos y normativos evaluados.
- La supervisión considera que esta observación no afecta la validez de la selección, sino que constituye una recomendación para robustecer la trazabilidad documental.

1.3 Sobre la implementación y puesta en marcha del SIAP

- La supervisión observa que la implementación del SIAP se realizó de manera progresiva y articulada con el Estudio Técnico de Referencia, considerando la decisión institucional de levantar la información desde cero.
- Se deja constancia de que la puesta en marcha corresponde a la **habilitación operativa del sistema**, y no a la culminación del levantamiento total del inventario de alumbrado público, el cual constituye un proceso posterior y continuo.
- La supervisión verificó la instalación del sistema, la creación de usuarios, la instalación de aplicaciones y la ejecución de capacitaciones como requisitos mínimos para la puesta en marcha.

1.4 Sobre la capacitación y apropiación del sistema

- La supervisión observa que las capacitaciones se priorizaron en las áreas críticas para el inicio de la operación del sistema, tales como bodega, almacén y levantamiento en campo.
- Se deja constancia de que, debido a la alta rotación de personal en algunas áreas, la capacitación integral de todos los usuarios finales fue prevista como un proceso progresivo, recomendándose su continuidad para garantizar la apropiación institucional del sistema.
- Esta situación fue conocida, aceptada y gestionada dentro del marco del contrato, sin afectar el cumplimiento de la actividad de implementación.

1.5 Sobre la documentación y versión de los informes

- La supervisión observa que algunos informes se presentan como versiones preliminares, debido a la programación de entrevistas y validaciones pendientes relacionadas con seguridad de la información y privacidad.
- Se recomienda que dichas validaciones sean incorporadas en una versión final consolidada del informe, con el fin de fortalecer el componente de seguridad y gobernanza de la información.
- Esta observación no impide el reconocimiento del cumplimiento de las actividades contractuales, pero sí se registra como un aspecto a cerrar formalmente en el expediente.

1.6 Sobre el ejercicio de la supervisión

- La supervisión deja constancia de que durante la ejecución del contrato se ejerció control permanente mediante revisión documental, seguimiento cronológico, requerimientos formales, mesas técnicas y validación de evidencias.
- Las observaciones realizadas al contratista fueron atendidas oportunamente, sin que se presentaran incumplimientos reiterados ni controversias que afectaran la ejecución del contrato.

2. CONCLUSIONES DE LA SUPERVISIÓN

1. Las actividades contractuales correspondientes a las **Actividades 1.1 (Recopilación), 1.2 (Análisis y Diagnóstico), 1.3 (Selección de Alternativa) y Actividad 2 (Implementación y Puesta en Marcha del SIAP)** fueron ejecutadas conforme al alcance definido en el Contrato Interadministrativo No. 175 de 2025.
2. El contratista dio cumplimiento a las obligaciones contractuales, entregando los productos esperados y atendiendo los requerimientos realizados por la supervisión durante la ejecución del contrato.
3. La supervisión ejerció de manera efectiva sus funciones de control, seguimiento y verificación, dejando trazabilidad documental y cronológica de las actuaciones realizadas.
4. El Sistema de Información de Alumbrado Público – SIAP fue implementado y puesto en marcha, quedando habilitado para su operación inicial por parte de la Entidad, con usuarios creados, dispositivos configurados y personal capacitado.



5. Las observaciones formuladas por la supervisión se enmarcan en un enfoque preventivo y de mejora continua, y no constituyen incumplimientos contractuales.
6. En consecuencia, y sin perjuicio de las recomendaciones consignadas, la supervisión concluye que el contrato **cumplió con el objeto y las actividades contratadas**, dejando constancia para los fines administrativos, técnicos y de control a que haya lugar.

6. OTROS PROYECTOS CONTRATADOS Y QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA LA CUAL NO ES ORDENADORA DE GASTO

CONTRATO DE OBRA MODALIDAD LLAVE EN MANO NO. 150 de fecha 17 de julio de 2025 -: CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA SAS' "OBRA PÚBLICA EN LA MODALIDAD LLAVE EN MANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MUROS DE CERRAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OFICIAL (IEO) DE SANTANDER (SEDEA) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OFICIAL (IEO) DÁMASO ZAPATA (SEDEA) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA".

Valor del contrato:	\$915.778.828,00
Valor Anticipo:	N/A
Plazo inicial:	4 Meses
Fecha de inicio:	30 de julio de 2025
Fecha de terminación:	29 de diciembre de 2025
Estado del Contrato:	EJECUCIÓN
Porcentaje estudios y diseños:	100%
Porcentaje avance de obra:	85%
Porcentaje avance financiero:	0%

Ubicación:

- Institución Educativa de Santander sede A ubicada en la Carrera 27 # 9-2
- Institución Educativa Técnico Damaso Zapata ubicada en la Carrera 25 # 8 - 2

Impacto:

Con la reconstrucción del muro colapsado en la Institución Educativa Santander – Sede A y de la Institución Educativa Técnico Damaso Zapata no solo restituye la estabilidad estructural del cerramiento del colegio y la seguridad física del plantel, sino que genera beneficios sociales directos e inmediatos en la comunidad educativa.

De manera que se garantiza un entorno seguro para estudiantes, docentes y personal administrativo, reduciendo la exposición a riesgos de accidentes, evitando que el resto de este muro de cerramiento presenta afectaciones a la normalidad y mejorando la percepción de confianza en las instalaciones.

Adicionalmente, con la recuperación de la infraestructura fortalece el sentido de pertenencia y protección de la comunidad frente a sus instituciones educativas, promoviendo un espacio digno, seguro y adecuado para el aprendizaje avanzando así en la consolidación de entornos escolares resilientes y para el goce de la comunidad

ESTADO DEL CONTRATO:


El proyecto contempló su ejecución en dos etapas, una etapa inicial correspondiente a los estudios de suelos y ajustes a los diseños de los muros de cerramiento.

En esta etapa se determinó el valor real de las obras requeridas dentro del objeto contractual. Como resultado, el CONTRATISTA elaboró un presupuesto, el cual parte de los ajustes técnicos realizados a los diseños, en especial de la exploración geotécnica



realizada, producto de la verificación en campo, los ensayos de laboratorio y las recomendaciones emitidas por los especialistas.

Por lo que, con esto, se ajustaron los demás diseños, obteniendo cantidades de obra y actividades actualizadas de acuerdo con las modificaciones técnicas identificadas para así poder iniciar la segunda etapa

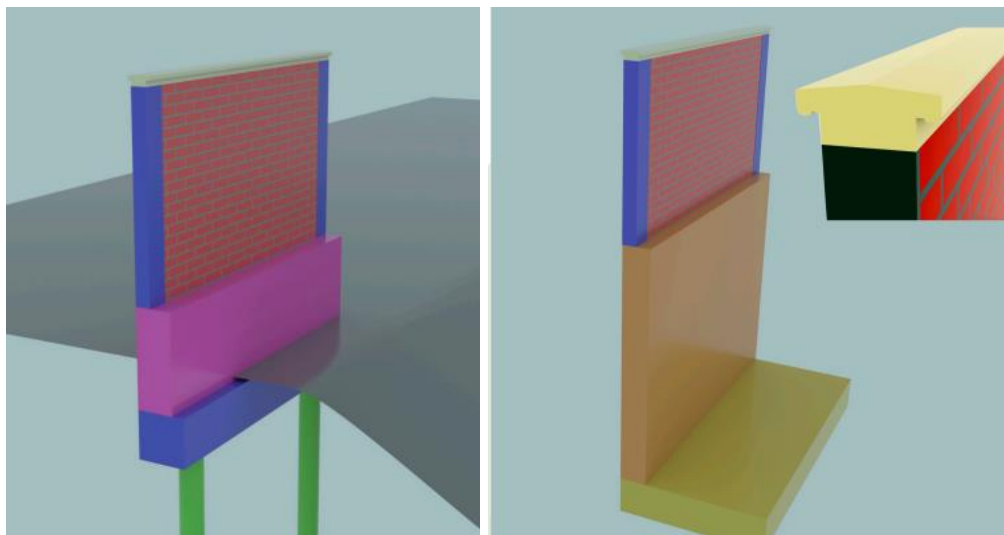

El 29 de septiembre de 2025, con base en los estudios y diseños entregados y aprobados, se dio inicio a la Etapa II de ejecución de obra. Cuyo objeto inicial es la construcción de aproximadamente 100 metros lineales de muro de cerramiento en la Institución Educativa Santander – Sede A, junto con sus respectivas obras de drenaje, así como la construcción de aproximadamente 120 metros lineales de muro de cerramiento en la Institución Educativa Técnico Dámaso Zapata, igualmente con sus obras complementarias de drenaje. Todo ello en cumplimiento de lo estipulado en el contrato de obra bajo la modalidad llave en mano.

Las actividades correspondientes se ejecutarán conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proceso contractual y estarán sujetas a la aprobación del Supervisor designado. En consecuencia, esta fase contempla la construcción integral y funcional de los muros mencionados, asegurando su estabilidad, durabilidad y la adecuada protección perimetral de las instituciones educativas intervenidas.

A continuación, se presentan imágenes de la ejecución:

I.E. SANTANDER



I.E. DAMASO ZAPATA



CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 166 DEL 2013 con objeto: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Valor del contrato: \$85.373.383.221
Duración del contrato: 38 Meses



Fecha de inicio: 12 de julio de 2023
Fecha de terminación: 11 de septiembre de 2026
Estado del Contrato: EJECUCIÓN
Porcentaje avance: 0%

Ubicación: Intervención en las siguientes Instituciones Educativas:

- Institución Educativa Tecnológico Dámaso Zapata
- Institución Educativa Custodio García Rovira INEM
- Institución Educativa: Santander

Descripción de actividades desarrolladas

1. Remisión de información a FINDETER

Desde la supervisión del municipio de Bucaramanga, se ha remitido a FINDETER la información necesaria para adelantar los respectivos procesos de contratación, en las siguientes fechas:

1. Proyecto Dámaso Zapata: Se envió el alcance del proyecto el **22 de mayo de 2025**, mediante radicado 2-S-SdIB-202505-00040686
2. Proyecto Institución Educativa Santander: Se envió el alcance del proyecto **el 30 de enero de 2025**, mediante radicado S-SdIB-202504-00003567 al cual se le dio alcance el pasado 25 de junio de 2025, a través radicado 2-S-SdIB-202506-00055252 realizando la actualización de precios al segundo semestre del 2025, así como incluyendo el proyecto de estudio de patología en esta institución.
3. Proyecto INEM: Se envió el link con la información que contiene el alcance final del proyecto el 06 de junio de 2025, y la actualización de precios para el segundo semestre el 25 de junio de 2025.

Así mismo, de manera oportuna se ha revisado y enviado las observaciones a los estudios previos remitidos por parte de Findeter.

2. Estado contractual y financiero del convenio

El valor del contrato se encuentra distribuido de la siguiente manera:

- VALOR INICIAL CONTRATO de SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M/CTE (\$79.668.991.613), correspondientes a los del **empréstito**.

A este convenio posteriormente se le realizaron 4 adiciones con cargo a los recursos del presupuesto de la alcaldía (no de empréstitos), de la siguiente forma:

- VALOR ADICIONAL 1: DOS MIL SEISCIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$2.601.319.769).
- VALOR ADICIONAL 2: DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$2.494.271.839).
- VALOR ADICIONAL 3: CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCT (\$ 163.800.000,00)
- VALOR ADICIONAL 4: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCT (\$445.000.000,00),

Para un valor total del contrato de OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE. (\$ 85.373.383.221,00)



3. Distribución presupuestal por institución educativa

Teniendo en cuenta el valor global del convenio, anteriormente indicado, se aclara que en este se encuentran incluidos todos los costos asociados, tales como: los estudios y diseños, los estudios de patología, la ejecución de las obras, las interventorías, la gerencia del proyecto, así como los correspondientes impuestos y tasas derivados de la suscripción del convenio, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera por Institución educativa:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	VALOR ASIGNADO
Institución Educativa Custodio García Rovira INEM	\$ 27.652.155.890
Institución Educativa: Santander	\$ 12.041.647.730
Institución Educativa Tecnológico Dámaso Zapata	\$ 45.679.579.601

4. Avances en procesos de contratación

De manera que a la fecha FINDETER ha adelantado los procesos de contratación de estudios, diseños y obra <https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atbucaramanga-o-052-2025> e interventoría <https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atbucaramanga-i-058-2025> para la Institución Educativa Tecnológico Dámaso Zapata

Teniendo en cuenta el link del proceso anteriormente indicado y de acuerdo a los términos de referencia publicados se tienen los siguientes plazos establecidos para la ejecución del proyecto:

ESTADO DEL PROYECTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DÁMASO ZAPATA

CONSTRUCCION

Estado: En proceso de contratación.

Link: <https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atbucaramanga-o-052-2025>

No de proceso de contratación: PAF-ATBUCARAMANGA-O-052-2025

Objeto: Contratar la “Elaboración de estudios y diseños, construcción y adecuación de edificaciones y espacios en la institución educativa técnico Dámaso Zapata del municipio de Bucaramanga, departamento de Santander”

Valor: \$28,004,682,260.00 COP

INTERVENTORIA

Estado: En proceso de contratación.

Link: <https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atbucaramanga-i-058-2025>

No de proceso de contratación: PAF-ATBUCARAMANGA-I-058-2025

Objeto: CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO DÁMASO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”



Por otra parte FINDETER ha adelantado los procesos de contratación de obra <https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atbucaramanga-o-062-2025> e interventoría <https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atbucaramanga-i-066-2025> para la Institución Educativa Santander

CONSTRUCCION

Estado: En proceso de contratación.

Link: <https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atbucaramanga-o-062-2025>

No de proceso de contratación: PAF-ATBUCARAMANGA-O-062-2025

Objeto: CONTRATAR “EL MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTANDER DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.””

INTERVENTORIA

Estado: En proceso de contratación.

Link <https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atbucaramanga-i-066-2025>

No de proceso de contratación: PAF-ATBUCARAMANGA-I-066-2025

Objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) AL MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTANDER DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”

Valor: \$316,381,250.00

En relación con la institución educativa IE Custodio García Rovira INEM la ALCALDIA DE BUCARAMANGA ha remitido varios oficios a FINDETER en dónde se adelanta el seguimiento a la ejecución del convenio y en especial a la publicación de los procesos tal como se evidencia en las siguientes comunicaciones:

- a. 22 de julio de 2025 – Radicado: 2-S-SdIB-202507-00065789 - Asunto: Convenio interadministrativo No. 166 de 2023 – Solicitud de información del estado de los procesos de contratación derivados
- b. 11 de agosto de 2025 – Radicado: 2-S-SdIB-202508-00071331- Asunto: Convenio interadministrativo No. 166 de 2023 – Reiteración sobre solicitud de información del estado de los procesos de contratación derivados
- c. 22 de agosto de 2025 – Radicado: 2-S-SdIB-202508-00074992- Asunto: Convenio interadministrativo No. 166 de 2023 – Requerimiento por presunto incumplimiento respecto a los procesos de contratación derivados
- d. 22 de septiembre de 2025 - Radicado: 2-S-SdIB-202509-00085121- Asunto: Convenio interadministrativo No. 166 de 2023 – Reiteración requerimiento por presunto incumplimiento respecto a los procesos de contratación derivados
- e. A la fecha FINDETER no ha publicado el proceso

En este sentido, desde la Supervisión del Municipio de Bucaramanga continuará realizando el seguimiento permanente a la publicación y avance de los procesos contractuales por parte de FINDETER, reiterando la necesidad de que estos se adelanten lo más pronto posible.



Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCE: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: A FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	2023680010005	\$ 42.999.999.999,00	\$ 42.999.999.999,00

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE OBRAS ADICIONALES EN LOS CAUSES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	202500000019488	\$ 21.135.251.009,00	\$ 21.135.251.009,00

CONTRATO DE OBRA 69 de 2023 -: **CONSORCIO LA FLORA 2023** “CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCE: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: A FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.

Valor inicial del contrato:	\$ 40.514.056.133,00
Valor adicional No 1:	\$ 20.168.495.053,00
Valor total:	\$ 60.682.551.186,00
Plazo inicial:	Dieciocho (18) meses
Plazo adicional No 1:	Un (01) mes
Plazo adicional No 2:	Cinco (05) meses
Plazo adicional No 3:	Siete (07) meses
Plazo adicional No 4:	Veintiún (21) días
Plazo total:	Treinta y un (31) meses y veintiún (21) días
Suspensión No 1:	04/12/2024
Reinicio No 1:	11/12/2024
Suspensión No 2:	23/12/2024
Fecha de inicio:	05 de mayo de 2023
Fecha de terminación:	04 de noviembre de 2024
Nueva fecha de terminación:	31 de diciembre de 2025
Porcentaje avance:	78.37%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra actualmente suspendido. A 23 de diciembre del 2025, se han construido 810 metros lineales de box culvert con dimensiones de 3.50 x 3.50 m, y 210 metros lineales adicionales con dimensiones de 3.00 x 3.00 m, ambos en concreto de 4.000 psi y se han construido 14 sumideros.

Se han realizado excavaciones con profundidades que varían desde 0,0 hasta más de 8,0 metros, alcanzando un volumen total de 85.916,74 m³. De igual manera, se ha instalado una longitud de 820 metros lineales de colector de 24 pulgadas, correspondiente al interceptor, y se han ejecutado rellenos en zanja por un volumen acumulado de 52.198 m³.

En relación con las obras de pavimentación, se han vaciado 990,8 m³ de concreto MR-41, correspondientes a una longitud aproximada de 825 metros lineales de vía. Adicionalmente, se han suministrado e instalado cerca de 1.150 m³ de base granular.



Se ha instalado una longitud de 820 metros lineales de colector de 24 pulgadas, correspondiente al interceptor. Finalmente, en cuanto al colector de 1,80 m de diámetro, a la fecha se han instalado 152,98 metros lineales de tubería en PEAD. Adicionalmente, se dio inicio a las actividades de embellecimiento y endurecimiento de zonas verdes, en las cuales se tiene prevista la instalación de los juegos.

REGISTRO FOTOGRAFICO

<p>Imagen: Endurecimiento y embellecimiento de zonas juegos</p>	<p>Imagen: Construcción de sumidero</p>
<p>Imagen: Construcción de box couvert de 3.0 x 3.0 m</p>	<p>Imagen: Pavimentación Concreto MR41</p>

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
<p>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL BARRIO LA FERIA, ASENTAMIENTO CAMILO TORRES Y CUYANITA ETAPA 1. UBICADOS EN LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER</p>	<p>2024680010080</p>	<p>\$ 43.840.721.399,25</p>	<p>\$ 43.840.721.399,25</p>



CONTRATO DE OBRA 226 de 2024 – MANUEL GUILLERMO CAMACHO CARVAJAL
“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL BARRIO LA FERIA, ASENTAMIENTO CAMILO TORRES Y CUYANITA ETAPA 1. UBICADOS EN LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”.

Valor del contrato:	\$ 27.395.301.404,00
Valor adicional No 1:	\$ 13.682.605.825,00
Valor total:	\$ 41.077.907.229,00
Plazo inicial:	Quince (15) meses
Plazo adicional No 1:	Siete (07) meses
Plazo total:	Veintidós (22) meses
Fecha de inicio:	17 de diciembre de 2024
Fecha de terminación:	16 de marzo de 2026
Nueva fecha de terminación:	16 de octubre de 2026
Porcentaje avance:	74.72%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en ejecución. Con avances significativos en varias de las actividades programadas. A continuación, se presenta el detalle de las actividades ejecutadas a la fecha:

En cuanto al retiro de sobrantes se han ejecutado 11926,30 m³, alcanzando un avance del 71.58%. Respecto a las perforaciones y construcción de drenes de penetración con tubería en PVC, se han desarrollado dos frentes de trabajo. Para los drenes con longitudes mayores a 20 ml, se han ejecutado 4.350 ml, con un avance del 70,56%. Por su parte, en los drenes con longitudes entre 0 y 20 ml, se han ejecutado 5.800 ml, alcanzando un 70,56% de cumplimiento.

En la actividad del encamisado de perforaciones horizontales para anclajes y drenes de penetración horizontal, se han ejecutado 6165,00 ml, logrando un avance del 100.00%. Por su parte, los anclajes alcanzan un total de 459 unidades ejecutadas, que representan un 100.00% de cumplimiento. De igual manera, los drenes en tubería de 2” con longitud de 35 ml presentan un 100.00% de avance, con 411 unidades ejecutadas.

Adicionalmente, durante el presente periodo se continua con las excavaciones y adecuaciones del terreno con el fin de continuar en la instalación de la tubería de alcantarillado NOVAFORT de 16 pulgadas, así como en la excavación de los pozos de colección de aguas, el cual lleva ejecutado 25.63m³ de concreto para pozos que representa el porcentaje avance 23.82%.

REGISTRO FOTOGRAFICO

	
Imagen: Drenes penetración	Imagen: Colocación de anclajes



Imagen: Reposición de alcantarillado

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN EL SECTOR CLUB GALLINERAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER	202500000004329	\$ 1.789.079.800	\$ 1.789.079.800

CONTRATO DE OBRA 99 de 2025 – CORPORACIÓN INGESEM IDEAS QUE CONTRUYEN FUTURO “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN EL SECTOR CLUB GALLINERAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER”.

Valor del contrato: \$ 1.513.937.250,00
Plazo inicial: Cuatro (04) meses
Plazo adicional No 1: Diecisiete (17) días
Fecha de inicio: 28 de julio de 2025
Fecha de terminación: 27 de noviembre de 2025
Nueva fecha de terminación: 14 de diciembre de 2025
Porcentaje avance: 100%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra terminado

REGISTRO FOTOGRAFICO



Imagen: Construcción de muro en gavión



Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN EL BARRIO CRISTAL BAJO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	202500000007089	\$ 5.774.128.850	\$ 5.774.128.850

CONTRATO DE OBRA 98 de 2025 – CONSORCIO GAVIONES LEWIS ROJAS “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN EL BARRIO CRISTAL BAJO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”.

Valor del contrato:	\$ 5.277.464.143,00
Plazo inicial:	Siete (07) meses
Fecha de inicio:	28 de julio de 2025
Fecha de terminación:	27 de febrero de 2026
Porcentaje avance:	81.17%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra actualmente en ejecución. A la fecha, se han desarrollado diversas actividades, entre las cuales se destacan: retiro de material del Jarillón, con un volumen ejecutado de 600 m³; excavaciones en material granular a cualquier profundidad, con 4.690 m³ ejecutados; y excavaciones en roca, con un volumen de 1.172 m³. Asimismo, se ha realizado el retiro de material a botadero, alcanzando un total de 111.493,79 m³.km.

En cuanto a la conformación de la estructura del Jarillón, se han ejecutado 1.620 m³. Respecto al acero de refuerzo Fy 4.200 MPa, se registra un avance de 945,83 kg ejecutados, y en la actividad de concreto ciclópeo de 3.500 psi se han ejecutado 1.083,48 m³.

La actividad de gaviones con malla de triple torsión C12 presenta un avance del 92 %, equivalente a 2.076 m³. De igual forma, se ha ejecutado el recubrimiento en concreto para gaviones por un volumen de 115,97 m³, así como la instalación de geotextil NT-2500, con un área total de 1.325,10 m².

REGISTRO FOTOGRAFICO





Imagen No 2: excavaciones en roca a maquina. Imagen No 3. Compactacion rellenos



Imagen No 6: armado de gaviones.



Imagen No 7: recubrimiento de gaviones en concreto.

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN EL SECTOR DE JOSÉ ANTONIO GALÁN, CARLOS PIZARRO Y 5 DE ENERO ETAPA 1, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	202500000004438	\$ 9.435.889.561,60	\$ 9.435.889.561,60

CONTRATO DE OBRA 97 de 2025 – CONSORCIO ONIX “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN EL SECTOR DE JOSÉ ANTONIO GALÁN, CARLOS PIZARRO Y 5 DE ENERO ETAPA 1, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”.

Valor del contrato: \$ 8.885.552.392,00
 Plazo inicial: Seis (06) meses
 Fecha de inicio: 28 de julio de 2025



Fecha de terminación: 27 de enero de 2026
Porcentaje avance: 3,16%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra actualmente en ejecución. Durante el desarrollo de las actividades, se constató la presencia de tuberías pertenecientes a Cénit y Promioriente en el margen derecho, aguas abajo de la quebrada Chimita, situación que incide en el alineamiento inicialmente previsto para la construcción de los muros en gaviones. En atención a lo anterior, se encuentran en curso los ajustes técnicos y diseños correspondientes, con el fin de definir nuevos alineamientos que garanticen la adecuada ejecución de dichas estructuras.

Adicionalmente, se dio inicio a la construcción del jarillón; no obstante, el modelamiento hidráulico continúa en proceso de revisión, con el propósito de asegurar la funcionalidad, estabilidad y seguridad integral de la obra

REGISTRO FOTOGRAFICO

	
<p>Imagen: Comités de obra</p>	<p>Imagen: Conformación estructura de Jarillón</p>

RESTAURACIÓN DEL COLISEO PERALTA INMUEBLE DECLARADO BIEN DE INTERESES CULTURAL DE ÁMBITO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.

Para la recuperación integral del Coliseo, fue necesario realizar gestiones para elaborar estudios técnicos y un proyecto de intervención como base para futuras obras. En 2023, el Ministerio de Cultura incluyó en su plan de acción recursos por el orden de quinientos millones de pesos (\$500.000.000) para iniciar la recuperación del BICN. Como contrapartida, la Alcaldía de Bucaramanga aportó trescientos millones de pesos (\$300.000.000) para cofinanciar la elaboración de los estudios técnicos y la interventoría de los mismos. El consultor ya hizo entrega de los productos de la consultoría, pero estos se encuentran en la etapa de aprobación por parte del Ministerio de Cultura.

A la fecha, no se ha producido un pronunciamiento por parte del gobierno Nacional. Por tanto, se ha tenido que prorrogar la suspensión No. 2 del 29 de mayo de 2024 hasta el 28



de agosto de 2025, a la espera del pronunciamiento de viabilidad del proyecto, documento soporte para la expedición de la licencia de construcción del proyecto. Estos dos documentos son hitos de cumplimiento para la finalización de los contratos derivados del convenio 3985 de 2023. La consultoría una vez recibida la documentación legal y culminadas las observaciones del ministerio de Cultura, el ministerio de Cultura Emite Resolución de aprobación de la intervención del Coliseo peralta estando pendiente la aprobación por parte de licencia de contrucción ante la Curaduría urbana No 1 trámite que se realizó según expediente VR25-4867 con fecha de ingreso de 16 de diciembre de 2025. A continuación, la información del convenio y contratos derivados:

Convenio Interadministrativo No. 3985-2023

Objeto	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la recuperación del Coliseo Peralta – Bien de Interés Cultural de ámbito Nacional – Decreto 292 del 24 de febrero de 1975, en el municipio de Bucaramanga, Santander
Fecha de suscripción	28 de junio de 2023
Valor total	\$ 800.000.000

Aportes

Ministerio de Cultura	\$500.000.000
Total aporte Ministerio	\$500.000.000
Municipio de Bucaramanga	\$300.000.000
Total aporte Departamento	\$300.000.000

Plazo de ejecución

Fecha de inicio	19 de julio de 2023
Término de ejecución	Hasta el 31 de marzo del 2026

Supervisión

Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes	Arquitecta Lina María Rosales Suárez. Supervisora convenio.
Municipio de Bucaramanga Secretaría de Infraestructura	Edgar Yamitd Pinto Hernández. Supervisor convenio.

Contratos derivados del convenio:

OBJETO	INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PROYECTO DE RESTAURACION DEL COLISEO PERALTA INMUBLE DECLARADO BIEN DE INTERES CULTURAL DEL AMBITO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
NÚMERO Y FECHA DEL CONTRATO	252-29/09/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$174.358.800,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	\$35.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 209.358.800,00
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES
PLAZO ADICIONAL DE EJECUCIÓN	DOS (2) MESES
PLAZO ADICIONAL DE EJECUCIÓN 2	UN (1) MES
PLAZO TOTAL DEL EJECUCIÓN	SEIS (6) MESES
CONTRATISTA	CONSULTORÍA ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCIÓN SAS
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS GABRIEL CAMACHO OBREGÓN
NIT	900160387
SUPERVISOR	EDGAR YAMITD PINTO HERNÁNDEZ
FECHA DE INICIO	23/10/2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	22/01/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	29/12/2023



FECHA DE AMPLIACIÓN No.1 DE LA SUSPENSIÓN No.1	24/01/2024
FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 DE LA SUSPENSIÓN No.1	18/02/2024
FECHA DE REINICIO	12/03/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	29/05/2024
FECHA DE AMPLIACIÓN No.1 DE LA SUSPENSIÓN No.2	28/08/2024
FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 DE LA SUSPENSIÓN No.2	28/11/2024
FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 DE LA SUSPENSIÓN No.3	23/12/2024
FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 DE LA SUSPENSIÓN No.4	27/02/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 DE LA SUSPENSIÓN No.5	28/04/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 DE LA SUSPENSIÓN No.6	28/06/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 DE LA SUSPENSIÓN No.7	28/08/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 DE LA SUSPENSIÓN No.8	28/09/2025
Suspensión No. 3	05/11/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN No.1 DE LA SUSPENSIÓN No.3	01/12/2025
FECHA DE REINICIO	09/12/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No 4	18/12/2025
FECHA DE TERMINACION	02/02/2026
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS – AC DE SUSPENSIÓN No. 3	20/11/2025
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
POLIZA	11-44-101209020 11-40-101055758
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP CONTRATO ORIGINAL	No 6208 del 2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL – RP CONTRATO ORIGINAL	No 12221 del 2023
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP RESERVA	Reserva No. 604 del 2024
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL – RP RESERVA	Reserva No. 394 del 2024
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP ADICIONAL	70634 de 2025
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – RP ADICIONAL	103591 de 20205
NUEVO CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL – CDP CONTRATO	00008181 de 2025
NUEVO CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL – RP CONTRATO	00011642 de 2025



1	ESTUDIOS PRELIMINARES	INT-PERALTA-097-2024	11/03/2024	APROBADO
2	LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y TOPOGRÁFICO			
2.1	ENTREGA DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	INT-PERALTA-085-2024	7/02/2024	APROBADO
2.2	LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO	INT-PERALTA-097-2024	11/03/2024	APROBADO
3	ESTUDIO PATOLÓGICO Y DIAGNOSTICO DEL INMUEBLE			
	Estudio patológico y diagnóstico del inmueble (Planos y fichas de calificación con fotografías y descripción de los deterioros de acuerdo al sistema constructivo) Incluir información de exploraciones constructivas y de cimentación según se requiera	INT-PERALTA-097-2024	11/03/2024	APROBADO
4	ESTUDIOS TÉCNICOS			
4.1	ESTUDIOS TÉCNICOS Y DIAGNÓSTICO DE HUMEDADES	INT-PERALTA-169-2024	5/06/2024	APROBADO
4.2	ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS DE SANIDAD DE MADERAS	INT-PERALTA-189-2024	6/08/2024	APROBADO
4.3	ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS DE REDES ELÉCTRICAS	INT-PERALTA-136-2024	25/04/2024	APROBADO
4.4	ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS DE REDES HIDROSANITARIAS	INT-PERALTA-092-2024	29/02/2024	APROBADO
4.5	ESTUDIOS HVAC	INT-PERALTA-202-2024	27/09/2024	APROBADO
4.6	ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS GEOTÉCNICOS	INT-PERALTA-242-2024	22/10/2025	APROBADO
4.7	ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA Y EVALUACIÓN ESTRUCTURAL	INT-PERALTA-207-2024	22/10/2024	APROBADO
4.8	CALAS ESTRATIGRÁFICAS	INT-PERALTA-191-2024	20/08/2024	APROBADO
4.9	ARQUEOLOGÍA (PLAN PREVENTIVO DE INVERSIÓN)	INT-PERALTA-119-2024	12/04/2024	APROBADO
5	PROYECTO DE INTERVENCIÓN			
FASE I				
5.1.1	PROYECTO ARQUITECTÓNICO	INT-PERALTA-213-2024	7/11/2024	APROBADO CON OBS



5.1.2	PROYECTO ESTRUCTURAL	INT-PERALTA-216-2024	20/11/2024	APROBADO
5.1.3	PROYECTO ELÉCTRICO, VOZ, DATOS Y SONIDO	INT-PERALTA-212-2024	7/11/2024	APROBADO
5.1.4	PROYECTO INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DRENAJES Y RCI	INT-PERALTA-208-2024	22/10/2024	APROBADO
5.1.5	PROYECTO DE SEGURIDAD (ALARMAS, CAMARAS, EVACUACIÓN)	INT-PERALTA-212-2024	7/11/2024	APROBADO
FASE II				
5.2.1	PROYECTO ARQUITECTÓNICO	INT-PERALTA-213-2024	7/11/2024	APROBADO
5.2.2	PROYECTO ESTRUCTURAL	INT-PERALTA-216-2024	20/11/2024	APROBADO
5.2.3	PROYECTO ELÉCTRICO, VOZ, DATOS Y SONIDO	INT-PERALTA-212-2024	7/11/2024	APROBADO
5.2.4	PROYECTO INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DRENAJES Y RCI	INT-PERALTA-208-2024	22/10/2024	APROBADO
5.2.5	PROYECTO DE SEGURIDAD (ALARMAS, CAMARAS, EVACUACIÓN)	INT-PERALTA-212-2024	7/11/2024	APROBADO
5.2.6	PROYECTO DE SEGURIDAD HUMANA	INT-PERALTA-240-2025	1/02/2025	APROBADO
5.2.7	COORDINACIÓN BIM	INT-PERALTA-300-2025	04/11/2025	APROBADO
6	PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA			
6.1	PRESUPUESTO, PROGRAMACIÓN, APUS, CANTIDADES, ESPECIFICACIONES	INT-PERALTA-299-2025	04/11/2025	APROBADO
6.2	RADICACIÓN DEL PROYECTO AL MINISTERIO DE CULTURA	CORREO ELECTRÓNICO	9/10/2025	ENTREGADO
	ACCESIBILIDAD			ENTREGADO

REGISTRO FOTOGRAFICO



Estado Fachada Actual



Estado Interior de la edificación.



7. ACCIONES POPULARES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

i. AP 2020-004 “PASEO ESPAÑA”

Radicado: 68001333300120200000400

Título del Caso: PASEO ESPAÑA

Resumen Pretensiones: *ORDENAR AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA realizar la recuperación, mantenimiento y/o reposición de todas y cada una de las 29 bancas ubicadas en el “paseo España” en la carrera 26 entre calles 32 y 37.*



Ilustración 1. Localización del proyecto Fuente: Google Earth

Ilustración 1. Ficha Técnica del Contrato de Obra

3.2. CONTRATO DE OBRA	
3.2.1. Ficha resumen del estado del contrato de obra 387 de 2022	
CONTRATO No.	387-2022
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA "CENTRO CAMINABLE "EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER
VALOR INICIAL	NUEVE MIL SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE (\$9.072.944.903)
ANTICIPO	N/A
VALOR ADICIONAL	DOS MIL SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL DIECINUEVE PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS M/CTE (\$2.075.728.019,29).
VALOR ACTUAL	ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$11.148.672.710,47)
PLAZO INICIAL	DIEZ (10) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
PLAZO ACTUAL	VEINTÍ CUATRO (24) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
CONTRATISTA	COINOBRAS S.A.S
	NIT. 804.000.152-8
	MILTON VILLARREAL MURILLO
INTERVENTOR	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
	NIT. 890.201.213-4
	R.L. HERNÁN PORRAS DÍAZ Administrador delegado UIS. Ing. Miller Humberto Salas Rondón Dir. Interventoría. Ing. Ricardo Andrés Sanz Londoño
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	21 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL:	20 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	27 DE DICIEMBRE DE 2025

Registro Fotográfico: Estado inicial – 2023





Registro Fotográfico: Avances del proyecto







Las condiciones de seguimiento financiero que se tuvieron durante el desarrollo del contrato con fecha de corte del **12 de noviembre de 2025** son:

- Valor ejecutado acumulado igual a \$8.310.440.465,52=
- La inversión programada correspondía a un valor igual a \$8.277.605.918,90=
- El porcentaje de obra ejecutado reportado es igual a 74,54% contra un 74,25% según programación de obra.

ii. AP 2018-663 “CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA Y QUEBRADA LA IGLESIA”

Radicado: 680012333000**20180066300**

Título del Caso: CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA Y QUEBRADA LA IGLESIA

Resumen Pretensiones: ORDENAR AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA ejecución del proyecto “Canalización Quebrada La Flora y Quebrada La Iglesia parte alta, y el Interceptor la Iglesia parte alta, que nace de la confluencia de los Interceptores de la Cascada y la Flora II”.

Estado actual:

CONTRATO DE OBRA No. 69 DEL 14 DE ABRIL DE 2023	
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA FLORA 2023
VALOR INICIAL:	\$ 40.514.056.113
VALOR ADICIONAL:	\$ 20.168.495.053
VALOR TOTAL:	\$ 60.682.551.186
% DE LA ADICIÓN:	49,78%
FECHA DE INICIO:	05 DE MAYO DE 2023
PLAZO INICIAL:	18 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	04 DE NOVIEMBRE DE 2024
PLAZO ADICIONAL No 1 (01/11/2024):	1 MESES
PLAZO ADICIONAL No 2 (11/12/2024):	5 MESES
PLAZO ADICIONAL No 3 (09/05/2025):	7 MESES
PLAZO TOTAL	31 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN No 1	04 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE REINICIO No 1	11 DE DICIEMBRE DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	10 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 85 DEL 26 DE ABRIL DE 2023


INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA CANALIZACION BGA
VALOR INICIAL:	\$ 2.485.943.885
VALOR ADICIONAL No 1:	\$ 690,539,968
VALOR ADICIONAL No 2:	\$ 966.755.956
VALOR TOTAL:	\$ 4.143.239.809
% DE LA ACIÓN:	66,67%

FECHA DE INICIO:	05 DE MAYO DE 2023
PLAZO INICIAL:	18 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	04 DE NOVIEMBRE DE 2024
PLAZO ADICIONAL No 1 (01/11/2024):	1 MESES
PLAZO ADICIONAL No 2 (11/12/2024):	5 MESES
PLAZO ADICIONAL No 3 (09/05/2025):	7 MESES
PLAZO TOTAL	31 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN No 1	04 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE REINICIO No 1	11 DE DICIEMBRE DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	10 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	% EJECUCIÓN OBRA
05/05/2023	31/12/2025	78.37% Corte 16/12/2205

Registro Fotográfico Estado Actual:



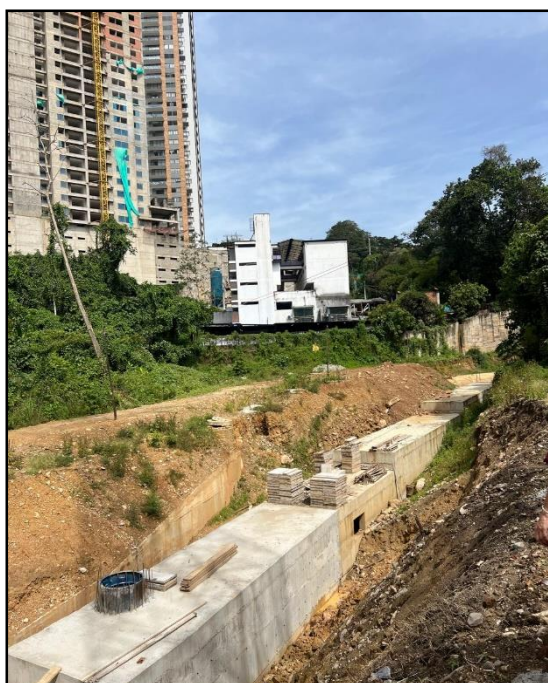



iii. AP 2017-191 “REDUCTORES DE VELOCIDAD”

Radicado: 68001333300120170019100

Título del Caso: REDUCTORES DE VELOCIDAD

Resumen Pretensiones: *ORDENAR AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y A LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA elaborar informe donde se identifiquen los sectores que requiere instalar reductores de velocidad y elaborar un cronograma de ejecución de los mismos.*

Estado actual:

Actualmente se ejecutan los reductores autorizados mediante **RESOLUCIÓN 328 DE 2024** de la DB, a través del **CONTRATO DE OBRA PUBLICA 052 DE 2025**, de la siguiente manera:



N°	UBICACIÓN - SECTORES	BARRIO	COMUNA	CANT.	TIPO	OBSERVACIÓN
1	Carrera 15 entre Calles 103 y 104, frente al Colegio Adventista La Libertad.	Manuela Beltrán	11	1	Pompeyano	Concepto Técnico 1138 - 2023.
2	Calle 53 entre Carreras 21 y 22, frente al Colegio Jorge Ardila Duarte.	La Concordia	6	1	Parabólico	Concepto Técnico 1139 - 2023.
3	Carrera 15 entre Calles 128 y 128B, frente al Instituto Educativo Provenza Sede B.	Cristal Bajo	10	1	Parabólico	Concepto Técnico 1140 - 2023.
4	Carrera 17C entre Calle 62 y 63, frente al Instituto Educativo María Goretti Sede B.	La Ceiba	6	1	Parabólico	Concepto Técnico 1141 - 2023.
5	Calle 40N entre Carreras 32 y la vía Bucaramanga-Charta, frente al Colegio Rural Bosconia Sede A.	Barrio Bosconia	Vereda Los Santos	1	Parabólico	Concepto Técnico 1142 - 2023.
6	Carrera 5 entre Calles 15BN y 16AN, frente a la Institución Educativa Gustavo Cote Uribe.	María Paz	1	1	Pompeyano	Concepto Técnico 1143 - 2023.
7	Calle 14 entre Carreras 34 y 35, frente a Colegio Integrado Santa Teresita.	Los Pinos	13	1	Parabólico	Concepto Técnico 1144 - 2023.
8	Carrera 23 entre Calles 17 y 18, frente al Colegio Virrey Solís.	San Francisco	3	1	Parabólico	Concepto Técnico 1145 - 2023.
9	Calle 3 N° 26A - 117, frente a Institución Educativa Santander Sede D.	Regaderos	2	2	Parabólico	Concepto Técnico 1155 - 2023.
10	Calle 59 entre Carreras 3W y 7W, costado Sur del Colegio José Celestino Mutis.	Mutis	17	1	Parabólico	Concepto Técnico 1168 - 2023.

11	Carrera 28 entre Calles 45 y 48, costado Oriental Colegio San Pedro Claver.	Sotomayor	12	1	Parabólico	Concepto Técnico 1156 - 2023.
12	Calle 16N entre Carreras 33 y 34, frente al Colegio Santander Sede B.	Los Angeles	2	1	Parabólico	Concepto Técnico 1157 - 2023.
13	Calle 37 entre Carreras 1W y 2W.	La Joya	5	1	Parabólico	Concepto Técnico 1126 - 2023.
14	Calle 37 entre Carreras 7W y 8W.	La Joya	5	1	Parabólico	Concepto Técnico 1126 - 2023.

1. Manuela Beltrán

Reductor tipo pompeyano en proceso constructivo con un avance del 50%, a falta de realizar actividades de fundido de concreto del lado derecho, para posteriormente ser pintado y señalizado.

1. La Concordia



Reductor tipo parabólico terminado en su totalidad y pintado a falta de instalación de señalización vertical, con un avance del 95%.

1. Cristal Bajo

Reductor tipo parabólico que no se va realizar con este contrato debido a que está ubicado en unas lozas en concreto que presentan pólizas de estabilidad de obra vigentes, de un proceso de mantenimiento de malla vial anterior.

2. La Ceiba






Reductor tipo parabólico terminado en su totalidad y pintado a falta de instalación de señalización vertical, con un avance del 95%.

1. Bosconia

Reductor tipo parabólico que no se va realizar con este contrato debido a que está ubicado en un corregimiento, se espera poder realizarlo en el año 2026, ya que la zona hace parte de una extensión urbana del municipio pero sus vías no están catalogadas de esa manera y el objetivo del contrato es “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA **RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER**”.

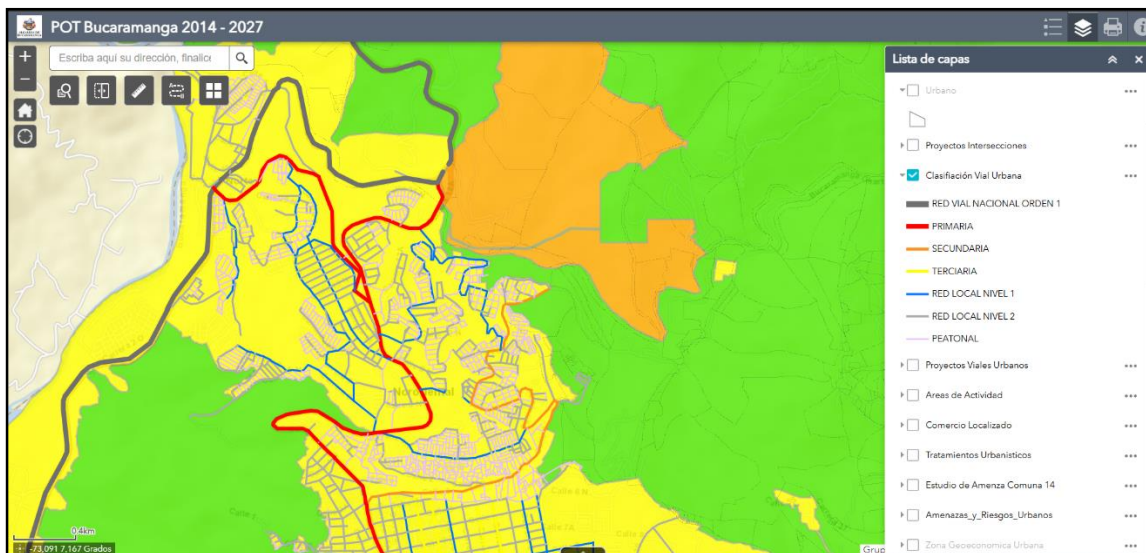

2. María Paz

Reductor tipo parabólico terminado en su totalidad, a falta de ser pintado y señalizado., con un avance del 80%.

3. Los Pinos

Reductor tipo parabólico terminado en su totalidad y pintado a falta de instalación de señalización vertical, con un avance del 95%.





2. San Francisco

Reductor tipo parabólico terminado en su totalidad y pintado a falta de instalación de señalización vertical, con un avance del 95%.



3. Regaderos

Reductores tipo parabólico terminado en su totalidad, a falta de ser pintado y señalizado., con un avance del 80%.

4. Mutis

Reductor tipo parabólico terminado en su totalidad, a falta de ser pintado y señalizado., con un avance del 80%.

5. Sotomayor





Reductor tipo parabólico terminado en su totalidad y pintado a falta de instalación de señalización vertical, con un avance del 95%.

6. Los Ángeles

Reductores tipo parabólico terminado en su totalidad, a falta de ser pintado y señalizado., con un avance del 80%.

7. La Joya

Reductores tipo parabólico terminado en su totalidad, a falta de ser pintado y señalizado., con un avance del 80%.

8. La Joya

Reductores tipo parabólico terminado en su totalidad, a falta de ser pintado y señalizado., con un avance del 80%.

CABE RESALTAR QUE TODOS LOS REDUCTORES QUE YA SE ENCUENTRAN REALIZADOS DEBEN ESTAR AL 100% PARA SER RECIBIDOS POR LA ENTIDAD COMPETENTE, EN ESTE CASO LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA – DTB.

iv. AP 2013-249 “ALCANTARILLADO LA FORTUNA”

Radicado: 68001333300820130024900

Título del Caso: ALCANTARILLADO LA FORTUNA

Resumen orden judicial:

ORDENAR AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA incorporar como asentamiento humano el sector LA FORTUNA.

ORDENAR A LA COMUNIDAD la construcción de las redes secundarias de alcantarillado.

ORDENAR AL EMPAS, una vez construidas las redes secundarias, conectar el servicio.

Ilustración 2. Ficha Técnica del Convenio

a) Número del convenio: 171 DEL 28 DE JUNIO DE 2023
b) Número de proceso en SECOP: CO1.PCCNTR.5167646
c) Objeto: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 171-2023, SUSCRITO ENTRE EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A E.SP. Y EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION, INTERVENTORIA GERENCIA Y SUPERVISION DEL ACUEDUCTO Y UNIDADES DE SANEAMIENTO BASICO (INDIVIDUALES) DE LA VEREDA SANTA RITA Y VEREDA CAPILLA BAJA 1 ETAPA; CONSTRUCCIÓN, INTERVENTORÍA, GERENCIA Y SUPERVISIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO LA FORTUNA; Y LIMPIEZA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, GERENCIA Y SUPERVISION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS PUNTOS ESPECIFICOS DEFINIDOS
d) Entidad contratante: ALCALDÍAD DE BUCARAMANGA
e) CONVENIDO: ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA AMB S.A. ESP

Ilustración 3. Valor del convenio

m) Valor inicial del convenio: \$5.717.873.362,00

Proyecto	Aporte Municipio	Aportes amb		Valor Total
	Valor (Obra+int)	EyD	Supervision+Ger	
Pluvial	\$ 750.652.693,24		\$ 69.423.000,00	\$ 820.075.693,24
La Fortuna	\$ 1.148.718.183,00	\$ 458.946.220,00	\$ 100.912.000,00	\$ 1.708.576.383,00
Capilla Baja	\$ 958.511.958,72		\$ 143.776.793,00	\$ 1.102.288.751,72
Santa Rita	\$ 1.813.947.856,04		\$ 272.984.678,00	\$ 2.086.932.534,04
	\$ 4.671.830.671,00		\$ 1.046.042.691,00	\$ 5.717.873.362,00

n) Modificaciones al convenio:

MODIFICACIÓN	FECHA
MODIFICATORIO No. 1 Y PRÓRROGA No. 1	5 de diciembre de 2024
PRÓRROGA No. 2	5 de diciembre de 2025

o) Descripción del Modificadorio No.1 y Prórroga No.1:

➤ Valor modificado del convenio: \$ 2.657.620.250,00

Proyecto	Aporte Municipio	Aportes amb		Valor Total
	Valor (Obra+int)	Obra	Supervision+Ger	
Pluvial	\$ 320.005.901,00		\$ 29.595.271,00	\$ 349.601.172,00
La Fortuna	\$ 1.579.364.955,00	\$ 592.337.817,00	\$ 136.316.306,00	\$ 2.308.019.078,00
Capilla Baja	\$ -		\$ -	\$ -
Santa Rita	\$ -		\$ -	\$ -
	\$ 1.899.370.856,00		\$ 758.249.394,00	\$ 2.657.620.250,00

Tabla 1. Ficha Contrato

CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL BARRIO LA FORTUNA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
CONTRATO DE OBRA No.	073 DE 2025
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO AMB REDES DS
VALOR TOTAL CONTRATO OBRA:	\$1.835.155.473
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	066 DE 2025
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	CONSORCIO LA FORTUNA
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	\$ 227.962.160,00
VALOR TOTAL (OBRA + INTERVENTORIA):	\$2.063.117.633
APORTES:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA: \$1.579.364.955,00 ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA: \$ 483.752.678,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIO:	12 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	12 DE FEBRERO DE 2026
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS:	<u>Obras de Alcantarillado:</u> Consiste en el suministro e instalación de 750 metros de tubería de alcantarillado con diámetro de 200mm (8") en PVC y 144 acometidas. Incluye obras de reconstrucción de vías y andenes intervenidos. <u>Obras de Acueducto:</u> Consiste en el suministro e instalación de 1.092 metros de tubería de acueducto con diámetros entre 3" y 4" en PVC y 144 acometidas. Incluye obras de reconstrucción de vías y andenes intervenidos
POBLACIÓN BENEFICIADA:	255 usuarios - 1020 habitantes



2. ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

a) Componente técnico

Construcción Acueducto y alcantarillado sanitario del barrio La Fortuna: ya contratado y actualmente en ejecución, de acuerdo con las siguientes características



Limpieza, operación y mantenimiento alcantarillado pluvial de los puntos específicos definidos: pendiente por iniciar su ejecución



Balance financiero:

De acuerdo con la forma de pago estipulada en el Modificadorio No.01 al Convenio 171 de 2023, numeral v. CLÁUSULA SEXTA: DESEMBOLSO O ENTREGA DE LOS APORTES, el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA realizó **Un único desembolso** equivalente al valor de los dos proyectos, cuya sumatoria correspondía al **100% del valor del aporte**, es decir la suma de **MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$1.899.370.856,00)**. El 100% de estos dineros, fueron entregados al amb oportunamente, de conformidad con el trámite efectuado el 18 de diciembre de 2024, en el cual se generó la CERTIFICACIÓN PARA PAGO DE ÚNICO DESEMBOLSO, por parte de la Ingeniera María del Rosario Torres Vargas, como Secretaria de Infraestructura y Supervisora del Convenio, en este momento del trámite.

ANEXO

- PRESUPUESTOS EJECUTADOS (Ejecución presupuestal)
- GASTO (Relación personal)
- GASTOS (Relación de Inversión)

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES						Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Pagar	% Ejecucion		
		Presupuesto Inicial	Adicion	Credito	Contracredito	Modificaciones Acumuladas	3 = 1 + 2				5,00	7,00				Obligaciones	Pagos Acumulados
		\$ 1,00				\$ 2,00										\$ 9,00	10 = 3 - 5
2.3.2.02.02.005.20 24680010210.2.24 01016.53251.251	GASODUCTOS LOCALES 251	\$ 500.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 282.560.879,63	\$ (282.560.879,63)	\$ 217.439.120,37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 217.439.120,37	\$ -	0			
	TRANSPORTE																
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS																
	ADQUISICION DE SERVICIOS																
	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION																
RUBRO	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS																
2.3.2.02.02.005.20 24680010248.2.24 01039.53221.201	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS 201	\$ 3.000.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000.000,00	\$ (3.000.000.000,00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0			
RUBRO	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES																
2.3.2.02.02.005.20 24680010253.2.24 02042.53211.201	CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 201	\$ 1.600.000.000,00	\$ -	\$ 500.000.000,00	\$ -	\$ 500.000.000,00	\$ 2.100.000.000,00	\$ 2.099.999.870,00	\$ 2.099.999.870,00	\$ 2.099.999.870,00	\$ 2.099.999.870,00	\$ 130,00	\$ -	99,99			
2.3.2.02.02.005.20 24680010253.2.24 02042.53211.267	CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 267	\$ 400.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.000.000,00	\$ 400.000.000,00	\$ 400.000.000,00	\$ 400.000.000,00	\$ 400.000.000,00	\$ -	\$ -	100			
2.3.2.02.02.005.20 24680010253.2.24 02042.53211.317	CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 317	\$ 4.000.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000.000,00	\$ 3.999.764.092,50	\$ 3.999.764.092,50	\$ 3.936.008.950,00	\$ 3.932.008.950,00	\$ 235.907,50	\$ 63.755.142,50	99,99			
2.3.2.02.02.005.20 24680010253.2.24 02042.53211.588	CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 588	\$ -	\$ 3.022.592.280,00	\$ -	\$ -	\$ 3.022.592.280,00	\$ 3.022.592.280,00	\$ 2.012.543.635,00	\$ 2.012.543.635,00	\$ 2.012.543.635,00	\$ 2.012.543.635,00	\$ 1.010.048.645,00	\$ -	66,58			
RUBRO	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS																
2.3.2.02.02.005.20 24680010248.2.24 02083.53221.201	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS 201	\$ 3.092.105.109,00	\$ -	\$ -	\$ 3.092.105.109,00	\$ (3.092.105.109,00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0			
2.3.2.02.02.005.20 24680010248.2.24 02083.53221.319	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS 319	\$ 907.894.891,00	\$ -	\$ -	\$ 907.894.891,00	\$ (907.894.891,00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0			
2.3.2.02.02.005.20 2500000028779.2. 2402083.53221.20 1	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS 201	\$ -	\$ -	\$ 2.421.437.130,00	\$ 1.937.149.704,00	\$ 484.287.426,00	\$ 484.287.426,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 484.287.426,00	\$ -	0			
RUBRO	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES																
2.3.2.02.02.005.20 24680010043.2.24 02112.53211.201	CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 201	\$ 3.000.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000.000,00	\$ 3.000.000.000,00	\$ 3.000.000.000,00	\$ 2.859.916.391,56	\$ 2.859.916.391,56	\$ -	\$ 140.083.608,44	100			
RUBRO	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES																
2.3.2.02.02.005.20 22680010100.2.24 02113.53211.230	CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 230	\$ 3.241.809.429,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.241.809.429,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.241.809.429,00	\$ -	0			
2.3.2.02.02.005.20 22680010100.2.24 02113.53211.255	CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 255	\$ 350.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350.000.000,00	\$ -	0			
2.3.2.02.02.005.20 24680010051.2.24 02114.53211.252	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 252	\$ -	\$ -	\$ 1.652.542.117,97	\$ -	\$ 1.652.542.117,97	\$ 1.652.542.117,97	\$ 1.652.542.117,97	\$ 1.652.542.117,97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.652.542.117,97	100			
2.3.2.02.02.005.20 24680010051.2.24 02114.53211.267	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 267	\$ -	\$ -	\$ 110.444.642,00	\$ -	\$ 110.444.642,00	\$ 110.444.642,00	\$ 110.444.642,00	\$ 110.444.642,00	\$ 110.444.642,00	\$ 110.444.642,00	\$ -	\$ -	100			
2.3.2.02.02.005.20 24680010051.2.24 02114.53211.319	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 319	\$ -	\$ -	\$ 2.092.105.109,00	\$ -	\$ 2.092.105.109,00	\$ 2.092.105.109,00	\$ 2.092.105.109,00	\$ 2.092.105.109,00	\$ 2.092.105.109,00	\$ 2.092.105.109,00	\$ -	\$ -	100			

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES						Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Pagar	% Ejecucion		
		Presupuesto Inicial	Adicion	Credito	Contracredito	Modificaciones Acumuladas	3 = 1 + 2				5,00	7,00				Obligaciones	Pagos Acumulados
		\$ 1,00				\$ 2,00										\$ 9,00	\$ 10 = 3 - 5
2.3.2.02.02.005.20 2500000018145.2. 4599011.53129.20 1	SEDES ADECUADAS 201	\$ -	\$ -	\$ 41.728.570,00	\$ -	\$ 41.728.570,00	\$ 41.728.570,00	\$ 41.000.120,00	\$ 41.000.120,00	\$ 41.000.120,00	\$ 41.000.120,00	\$ 728.450,00	\$ -	98,25			
2.3.2.02.02.005.20 2500000018145.2. 4599011.53129.25 1	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 251	\$ -	\$ -	\$ 15.969.850,00	\$ -	\$ 15.969.850,00	\$ 15.969.850,00	\$ 15.610.041,00	\$ 15.610.041,00	\$ 15.610.041,00	\$ 15.610.041,00	\$ 359.809,00	\$ -	97,74			
	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION																
RUBRO	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS ENERGETICOS																
2.3.2.02.02.008.20 2500000028264.2. 2102008.83324.21 3	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS ENERGETICOS 213	\$ -	\$ -	\$ 2.500.000.000,00	\$ -	\$ 2.500.000.000,00	\$ 2.500.000.000,00	\$ 1.250.000.000,00	\$ 1.250.000.000,00	\$ 1.250.000.000,00	\$ 1.250.000.000,00	\$ 1.250.000.000,00	\$ -	50			
RUBRO	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION																
2.3.2.02.02.008.20 24680010084.2.45 99006.83321.201	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	\$ 1.800.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.800.000.000,00	\$ 1.799.994.239,00	\$ 1.799.994.239,00	\$ -	\$ -	\$ 5.761,00	\$ 1.799.994.239,00	99,99			
2.3.2.02.02.008.20 2500000020993.2. 4599006.83321.20 1	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	\$ -	\$ -	\$ 445.000.000,00	\$ -	\$ 445.000.000,00	\$ 445.000.000,00	\$ 445.000.000,00	\$ 445.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 445.000.000,00	100			
2.3.2.02.02.008.20 2500000032340.2. 4599006.83321.25 1	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	\$ -	\$ -	\$ 120.489.877,19	\$ -	\$ 120.489.877,19	\$ 120.489.877,19	\$ 120.489.877,19	\$ 120.489.877,19	\$ 33.928.615,98	\$ 33.928.615,98	\$ -	\$ 86.561.261,21	100			
RUBRO	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO																
2.3.2.02.02.008.20 24680010049.2.45 99031.82120.201	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 201	\$ 1.000.000.000,00	\$ -	\$ 49.000.000,00	\$ 10.266.667,00	\$ 38.733.333,00	\$ 1.038.733.333,00	\$ 1.038.733.332,99	\$ 1.038.733.332,99	\$ 1.038.733.332,99	\$ 1.038.733.332,99	\$ 0,01	\$ -	99,99			
2.3.2.02.02.008.20 24680010049.2.45 99031.82120.501	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 501	\$ -	\$ 317.606.000,00	\$ -	\$ 7.489.333,35	\$ 310.116.666,65	\$ 310.116.666,65	\$ 310.116.666,65	\$ 310.116.666,65	\$ 310.116.666,65	\$ 310.116.666,65	\$ -	\$ -	100			
RUBRO	SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES																
2.3.2.02.02.008.20 24680010049.2.45 99031.83213.201	SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 201	\$ 800.000.000,00	\$ -	\$ 1.498.666,67	\$ 199.800.000,00	\$ (198.301.333,33)	\$ 601.698.666,67	\$ 601.698.666,67	\$ 601.698.666,67	\$ 601.698.666,67	\$ 600.200.000,00	\$ -	\$ -	100			
2.3.2.02.02.008.20 24680010049.2.45 99031.83213.501	SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 501	\$ -	\$ 171.018.000,00	\$ -	\$ -	\$ 171.018.000,00	\$ 171.018.000,00	\$ 171.018.000,00	\$ 171.018.000,00	\$ 171.018.000,00	\$ 170.416.666,67	\$ -	\$ -	100			
RUBRO	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION																
2.3.2.02.02.008.20 24680010049.2.45 99031.83321.201	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	\$ 2.500.000.000,00	\$ -	\$ 159.568.000,33	\$ -	\$ 159.568.000,33	\$ 2.659.568.000,33	\$ 2.659.568.000,33	\$ 2.659.568.000,33	\$ 2.659.568.000,33	\$ 2.659.568.000,33	\$ -	\$ -	100			
2.3.2.02.02.008.20 24680010049.2.45 99031.83321.501	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501	\$ -	\$ 903.957.000,00	\$ 7.489.333,35	\$ -	\$ 911.446.333,35	\$ 911.446.333,35	\$ 911.446.333,35	\$ 911.446.333,35	\$ 911.446.333,35	\$ 908.446.333,35	\$ -	\$ -	100			
RUBRO	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P																
2.3.2.02.02.008.20 24680010049.2.45 99031.83990.201	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	\$ 3.500.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 593.728.570,00	\$ (593.728.570,00)	\$ 2.906.271.430,00	\$ 2.898.468.343,30	\$ 2.898.468.343,30	\$ 2.898.468.343,30	\$ 2.894.685.009,96	\$ 7.803.086,70	\$ -	99,73			
2.3.2.02.02.008.20 24680010049.2.45 99031.83990.251	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	\$ -	\$ -	\$ 599.765.656,00	\$ 33.731.332,98	\$ 566.034.323,02	\$ 566.034.323,02	\$ 566.034.323,02	\$ 566.034.323,02	\$ 566.034.323,02	\$ 545.434.323,02	\$ -	\$ -	100			
2.3.2.02.02.008.20 24680010049.2.45 99031.83990.317	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 317	\$ -	\$ 450.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 450.000.000,00	\$ 450.000.000,00	\$ 450.000.000,00	\$ 450.000.000,00	\$ 450.000.000,00	\$ 448.350.000,00	\$ -	\$ -	100			

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES						TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Pagar	% Ejecucion		
		Presupuesto Inicial	Adicion	Credito	Contracredito	Modificaciones Acumuladas	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados				Obligaciones	Pagos Acumulados
		\$ 1,00				\$ 2,00	3 = 1 + 2	\$ 5,00	\$ 7,00				\$ 9,00	10 = 3 - 5
2.3.2.02.02.008.20 24680010049.2.45 99031.83990.501	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501	\$ -	\$ 830.664.000,00	\$ -	\$ -	\$ 830.664.000,00	\$ 830.664.000,00	\$ 830.664.000,00	\$ 830.664.000,00	\$ 830.664.000,00	\$ 830.664.000,00	\$ -	\$ -	100
RUBRO	OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P													
2.3.2.02.02.008.20 24680010049.2.45 99031.85999.201	OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 201	\$ 700.000.000,00	\$ -	\$ 107.000.000,00	\$ -	\$ 107.000.000,00	\$ 807.000.000,00	\$ 807.000.000,00	\$ 807.000.000,00	\$ 807.000.000,00	\$ 797.390.000,00	\$ -	\$ -	100
2.3.2.02.02.008.20 24680010049.2.45 99031.85999.501	OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 501	\$ -	\$ 219.881.000,00	\$ -	\$ -	\$ 219.881.000,00	\$ 219.881.000,00	\$ 219.881.000,00	\$ 219.881.000,00	\$ 219.881.000,00	\$ 218.814.333,33	\$ -	\$ -	100
	DISMINUCION DE PASIVOS													
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS													
RUBRO	EDIFICIOS COMERCIALES													
2.3.7.06.02.202500 000026116.2.4599 002.53122.501	EDIFICIOS COMERCIALES	\$ -	\$ 7.830.932,10	\$ -	\$ -	\$ 7.830.932,10	\$ 7.830.932,10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.830.932,10	\$ -	0
2.3.7.06.02.202500 000026116.2.4599 002.53122.573	EDIFICIOS COMERCIALES	\$ -	\$ 663.949.600,48	\$ -	\$ -	\$ 663.949.600,48	\$ 663.949.600,48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 663.949.600,48	\$ -	0
RUBRO	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES													
2.3.7.06.02.202500 000026116.2.4599 002.53129.501	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$ -	\$ 1.074.815.139,17	\$ -	\$ -	\$ 1.074.815.139,17	\$ 1.074.815.139,17	\$ 461.937.878,77	\$ 461.937.878,77	\$ 461.937.878,77	\$ 461.937.878,77	\$ 612.877.260,40	\$ -	42,97
2.3.7.06.02.202500 000026116.2.4599 002.53129.516	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$ -	\$ 259.826.547,30	\$ -	\$ -	\$ 259.826.547,30	\$ 259.826.547,30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 259.826.547,30	\$ -	0
2.3.7.06.02.202500 000026116.2.4599 002.53129.521	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$ -	\$ 48.244.044,00	\$ -	\$ -	\$ 48.244.044,00	\$ 48.244.044,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48.244.044,00	\$ -	0
2.3.7.06.02.202500 000026116.2.4599 002.53129.573	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$ -	\$ 30.793.074,71	\$ -	\$ -	\$ 30.793.074,71	\$ 30.793.074,71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.793.074,71	\$ -	0
RUBRO	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES													
2.3.7.06.02.202500 000026116.2.4599 002.53211.501	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES	\$ -	\$ 8.937.862.301,39	\$ -	\$ -	\$ 8.937.862.301,39	\$ 8.937.862.301,39	\$ 5.576.429.261,04	\$ 5.576.429.261,04	\$ 5.576.429.261,04	\$ 5.576.429.261,04	\$ 3.361.433.040,35	\$ -	62,39
RUBRO	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO													
2.3.7.06.02.202500 000026116.2.4599 002.53270.501	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO	\$ -	\$ 8.744.501.526,83	\$ -	\$ -	\$ 8.744.501.526,83	\$ 8.744.501.526,83	\$ 22.709.736,60	\$ 22.709.736,60	\$ 22.709.736,60	\$ 22.709.736,60	\$ 8.721.791.790,23	\$ -	0,25
2.3.7.06.02.202500 000026116.2.4599 002.53270.573	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO	\$ -	\$ 294.672.040,75	\$ -	\$ -	\$ 294.672.040,75	\$ 294.672.040,75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 294.672.040,75	\$ -	0
RUBRO	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES													
2.3.7.06.02.202500 000026116.2.4599 002.54129.501	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$ -	\$ 506.864.462,52	\$ -	\$ -	\$ 506.864.462,52	\$ 506.864.462,52	\$ 133.456.030,00	\$ 133.456.030,00	\$ 133.456.030,00	\$ 133.456.030,00	\$ 373.408.432,52	\$ -	26,32
2.3.7.06.02.202500 000026116.2.4599 002.54129.573	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$ -	\$ 220.730.892,00	\$ -	\$ -	\$ 220.730.892,00	\$ 220.730.892,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220.730.892,00	\$ -	0
RUBRO	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES													
2.3.7.06.02.202500 000026116.2.4599 002.54211.501	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES	\$ -	\$ 162.535.397,00	\$ -	\$ -	\$ 162.535.397,00	\$ 162.535.397,00	\$ 162.535.397,00	\$ 162.535.397,00	\$ 162.535.397,00	\$ 162.535.397,00	\$ -	\$ -	100
2.3.7.06.02.202500 000026116.2.4599 002.54211.582	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES	\$ -	\$ 326.759.820,01	\$ -	\$ -	\$ 326.759.820,01	\$ 326.759.820,01	\$ 42.731.910,92	\$ 42.731.910,92	\$ 42.731.910,92	\$ 42.731.910,92	\$ 284.027.909,09	\$ -	13,07

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES						TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Pagar	% Ejecucion			
		Presupuesto Inicial	Adicion	Credito	Contracredito	Modificaciones Acumuladas	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados				Obligaciones	Pagos Acumulados	
		\$ 1,00				\$ 2,00	3 = 1 + 2	\$ 5,00	\$ 7,00				\$ 9,00	10 = 3 - 5	12 = 7 - 9
	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO														
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS														
	ADQUISICION DE SERVICIOS														
	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION														
RUBRO	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES														
2.3.2.02.02.005.20 24680010050.2.40 02020.53211.282	CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 282	\$ 1.224.198.361,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.224.198.361,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.224.198.361,00	\$ -		0
2.3.2.02.02.005.20 24680010076.2.40 02020.53211.232	CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 232	\$ 1.040.039.097,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.040.039.097,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.040.039.097,00	\$ -		0
RUBRO	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 588														
2.3.2.02.02.005.20 2500000023367.2.40 4002020.53270.588	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 588	\$ -	\$ 798.881.660,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 798.881.660,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 798.881.660,00	\$ -		0
	FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRUBUCION DEL INGRESO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA														
	LINEA 2. TERRITORIO SEGURO QUE														
	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO														
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
	A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS														
	SUBVENCIONES PARA SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO														
RUBRO	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS														
2.3.3.01.02.004.01. 2024680010048.1. 4003047.91123.215	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 215	\$ 4.623.355.784,00	\$ -	\$ -	\$ 770.164.210,00	\$ (770.164.210,00)	\$ 3.853.191.574,00	\$ 3.493.424.238,00	\$ 3.493.424.238,00	\$ 3.493.424.238,00	\$ 3.493.424.238,00	\$ 359.767.336,00	\$ -		90,66
2.3.3.01.02.004.01. 2024680010048.1. 4003047.91123.228	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 228	\$ 40.801.926,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.801.926,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.801.926,00	\$ -		0
RUBRO	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS														
2.3.3.01.02.004.02. 2024680010048.1. 4003047.91123.215	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 215	\$ 2.013.361.364,00	\$ -	\$ -	\$ 399.423.201,00	\$ (399.423.201,00)	\$ 1.613.938.163,00	\$ 1.290.770.566,00	\$ 1.290.770.566,00	\$ 1.290.770.566,00	\$ 1.290.770.566,00	\$ 323.167.597,00	\$ -		79,97
2.3.3.01.02.004.02. 2024680010048.1. 4003047.91123.228	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 228	\$ 40.801.926,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.801.926,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.801.926,00	\$ -		0
RUBRO	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS														
2.3.3.01.02.004.03. 2024680010048.1. 4003047.91123.215	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 215	\$ 3.633.910.195,00	\$ -	\$ 1.096.282.137,44	\$ 439.093.782,62	\$ 657.188.354,82	\$ 4.291.098.549,82	\$ 3.941.015.966,00	\$ 3.941.015.966,00	\$ 3.941.015.966,00	\$ 3.941.015.966,00	\$ 350.082.583,82	\$ -		91,84
2.3.3.01.02.004.03. 2024680010048.1. 4003047.91123.228	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 228	\$ 40.801.926,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.801.926,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.801.926,00	\$ -		0
	MINIMO VITAL														
	SUBSIDIOS DE ASEO														
RUBRO	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS														
2.3.3.01.04.004.03. 2024680010048.1. 4003047.91123.215	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 215	\$ 737.362.620,00	\$ -	\$ -	\$ 103.916.752,16	\$ (103.916.752,16)	\$ 633.445.867,84	\$ 390.018.827,00	\$ 390.018.827,00	\$ 390.018.827,00	\$ 390.018.827,00	\$ 243.427.040,84	\$ -		61,57

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES						Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Pagar	% Ejecucion		
		Presupuesto Inicial	Adicion	Credito	Contracredito	Modificaciones Acumuladas	3 = 1 + 2				5,00	7,00				Obligaciones	Pagos Acumulados
		\$ 1,00				\$ 2,00										\$ 9,00	10 = 3 - 5
2.3.3.01.04.004.03.2024680010048.1.4003047.91123.228	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 228	\$ 81.603.851,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 81.603.851,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 81.603.851,00	\$ -	0			
2.3.3.01.04.004.03.2024680010048.1.4003047.91123.260	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 260	\$ 100.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.000.000,00	\$ -	0			
2.3.3.01.04.004.03.2024680010048.1.4003047.91123.268	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 268	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ -	0			
	ALUMBRADO PUBLICO																
	LINEA 3. TERRITORIO SEGURO Y MINAS Y ENERGIA																
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS																
	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO																
RUBRO	CUADROS PANELES CONSOLAS ARMARIOS Y DEMAS SOPORTES EQUIPADOS PARA EL CORTE SECCIONAMIENTO PROTECCION DERIVACION EMPALME O CONEXION DE CIRCUITOS ELECTRICOS PARA CONTROL Y DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD DE VOLTAJES NO SUPERIORES A 1000 V																
2.3.3.02.01.004.2024680010113.2.2102062.4621301.226	CUADROS PANELES CONSOLAS ARMARIOS Y DEMAS SOPORTES EQUIPADOS PARA EL CORTE SECCIONAMIENTO PROTECCION DERIVACION EMPALME O CONEXION DE CIRCUITOS ELECTRICOS PARA CONTROL Y DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD DE VOLTAJES NO SUPERIORES A 1000 V 226	\$ 3.000.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000.000,00	\$ (3.000.000.000,00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0			
	LINEA 4. TERRITORIO SEGURO QUE GENERA VALOR																
	GOBIERNO TERRITORIAL DISMINUCION DE PASIVOS																
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS																
RUBRO	PAPEL BOND																
2.3.7.06.02.20250000029579.1.4599002.3212801.526	PAPEL BOND 526	\$ -	\$ 5.996.886,00	\$ -	\$ -	\$ 5.996.886,00	\$ 5.996.886,00	\$ 5.996.886,00	\$ 5.996.886,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.996.886,00	100			
RUBRO	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO																
2.3.7.06.02.20250000029579.1.4599002.53270.501	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 501	\$ -	\$ 420.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 420.000.000,00	\$ 420.000.000,00	\$ 420.000.000,00	\$ 420.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 420.000.000,00	100			
RUBRO	SERVICIOS DE SOPORTE EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TI																
2.3.7.06.02.20250000029579.1.4599002.83132.526	SERVICIOS DE SOPORTE EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TI 526	\$ -	\$ 25.023.612,00	\$ -	\$ -	\$ 25.023.612,00	\$ 25.023.612,00	\$ 25.023.612,00	\$ 25.023.612,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.023.612,00	100			
RUBRO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE																
2.3.7.06.02.20250000029579.1.4599002.85970.526	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE 526	\$ -	\$ 133.776.325,00	\$ -	\$ -	\$ 133.776.325,00	\$ 133.776.325,00	\$ 133.776.325,00	\$ 133.776.325,00	\$ 133.776.325,00	\$ 133.776.325,00	\$ -	\$ -	100			
RUBRO	OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P																
2.3.7.06.02.20250000029579.1.4599002.85999.526	OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 526	\$ -	\$ 83.333,33	\$ -	\$ -	\$ 83.333,33	\$ 83.333,33	\$ 83.333,33	\$ 83.333,33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83.333,33	100			
RUBRO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE																
2.3.7.06.02.20250000029579.1.4599002.8715205.526	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION 526	\$ -	\$ 171.034.773,26	\$ -	\$ -	\$ 171.034.773,26	\$ 171.034.773,26	\$ 171.034.773,26	\$ 171.034.773,26	\$ 134.314.052,50	\$ 134.314.052,50	\$ -	\$ 36.720.720,76	100			
RUBRO	SERVICIOS DE FABRICACION DE EQUIPO DE ILUMINACION ELECTRICA																
2.3.7.06.02.20250000029579.1.4599002.88756.501	SERVICIOS DE FABRICACION DE EQUIPO DE ILUMINACION ELECTRICA 501	\$ -	\$ 689.885.166,86	\$ -	\$ -	\$ 689.885.166,86	\$ 689.885.166,86	\$ 689.885.166,86	\$ 689.885.166,86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 689.885.166,86	100			

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES						Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Pagar	% Ejecucion				
		Presupuesto Inicial	Adicion	Credito	Contracredito	Modificaciones Acumuladas	3 = 1 + 2				5,00	7,00				9,00	10 = 3 - 5	12 = 7 - 9	13 = 7 / 3
		\$ 1,00				\$ 2,00													
2.3.2.02.02.005.20 2500000013584.2. 2102069.54619.22 6	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 226	\$ -	\$ -	\$ 11.316.314.413,00	\$ -	\$ 11.316.314.413,00	\$ 11.316.314.413,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.316.314.413,00	\$ -	0					
2.3.2.02.02.005.20 2500000013584.2. 2102069.54619.25 3	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 253	\$ -	\$ -	\$ 3.500.000.000,00	\$ -	\$ 3.500.000.000,00	\$ 3.500.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.500.000.000,00	\$ -	0					
2.3.2.02.02.005.20 2500000015897.2. 2102069.54619.22 6	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 226	\$ -	\$ -	\$ 23.500.000.000,00	\$ 2.146.534.793,00	\$ 21.353.465.207,00	\$ 21.353.465.207,00	\$ 20.819.628.073,00	\$ 20.819.628.073,00	\$ -	\$ -	\$ 533.837.134,00	\$ 20.819.628.073,00	97,49					
	COMERCIO Y DISTRIBUCION ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD POR CUENTA PROPIA																		
2.3.2.02.02.006.20 24680010192.1.21 02069.69112.226	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD POR CUENTA PROPIA 226	\$ 15.624.142.085,00	\$ -	\$ -	\$ 2.769.775.617,00	\$ (2.769.775.617,00)	\$ 12.854.366.468,00	\$ 12.608.975.767,00	\$ 12.608.975.767,00	\$ 12.608.975.767,00	\$ 12.608.975.767,00	\$ 245.390.701,00	\$ -	98,09					
2.3.2.02.02.006.20 24680010192.1.21 02069.69112.526	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD POR CUENTA PROPIA 526	\$ -	\$ 5.890.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 5.890.000.000,00	\$ 5.890.000.000,00	\$ 3.970.438.881,00	\$ 3.970.438.881,00	\$ 3.970.438.881,00	\$ 3.970.438.881,00	\$ 1.919.561.119,00	\$ -	67,4					
	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES NO RESIDENCIALES DIFERENTES A VIVIENDA A COMISION O POR CONTRATO 226																		
2.3.2.02.02.007.20 24680010192.2.21 02069.72212.226	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES NO RESIDENCIALES DIFERENTES A VIVIENDA A COMISION O POR CONTRATO 226	\$ -	\$ -	\$ 253.461.204,00	\$ -	\$ 253.461.204,00	\$ 253.461.204,00	\$ 250.232.000,00	\$ 250.232.000,00	\$ 226.016.000,00	\$ 226.016.000,00	\$ 3.229.204,00	\$ 24.216.000,00	98,72					
	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO																		
2.3.2.02.02.008.20 24680010192.2.21 02069.82120.226	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 226	\$ 352.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 352.000.000,00	\$ 331.800.000,00	\$ 331.800.000,00	\$ 280.466.666,67	\$ 280.466.666,67	\$ 20.200.000,00	\$ 51.333.333,33	94,26					
2.3.2.02.02.008.20 24680010192.2.21 02069.82120.526	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 526	\$ -	\$ 450.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 450.000.000,00	\$ 450.000.000,00	\$ 219.900.000,00	\$ 219.900.000,00	\$ 215.466.666,66	\$ 211.999.999,99	\$ 230.100.000,00	\$ 4.433.333,34	48,86					
	SERVICIOS DE CONSULTORA EN GESTION ADMINISTRATIVA																		
2.3.2.02.02.008.20 24680010192.2.21 02069.83115.226	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA 226	\$ 90.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 90.000.000,00	\$ (90.000.000,00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0					
	SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES																		
2.3.2.02.02.008.20 24680010192.2.21 02069.83213.226	SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 226	\$ 110.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110.000.000,00	\$ 97.050.000,00	\$ 97.050.000,00	\$ 97.050.000,00	\$ 97.050.000,00	\$ 12.950.000,00	\$ -	88,22					
2.3.2.02.02.008.20 24680010192.2.21 02069.83213.526	SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 526	\$ -	\$ 220.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 220.000.000,00	\$ 220.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220.000.000,00	\$ -	0					
	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION																		
2.3.2.02.02.008.20 24680010192.2.21 02069.83321.226	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 226	\$ 220.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220.000.000,00	\$ 174.350.000,00	\$ 174.350.000,00	\$ 156.950.000,00	\$ 156.950.000,00	\$ 45.650.000,00	\$ 17.400.000,00	79,25					
2.3.2.02.02.008.20 24680010192.2.21 02069.83321.526	SERVICIO DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 526	\$ -	\$ 450.000.000,00	\$ -	\$ 250.000.000,00	\$ 200.000.000,00	\$ 200.000.000,00	\$ 105.100.000,00	\$ 105.100.000,00	\$ 105.100.000,00	\$ 105.100.000,00	\$ 94.900.000,00	\$ -	52,55					

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES						Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Pagar	% Ejecucion					
		Presupuesto Inicial	Adicion	Credito	Contracredito	Modificaciones Acumuladas	3 = 1 + 2				5,00	7,00				Obligaciones	Pagos Acumulados	10 = 3 - 5	12 = 7 - 9	13 = 7 / 3
		\$ 1,00				\$ 2,00														
2.3.2.02.02.008.20 24680010205.2.21 06033.83132.226	SERVICIOS DE SOPORTE EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (TI)	\$ 650.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 650.000.000,00	\$ 595.583.589,00	\$ 595.583.589,00	\$ 466.057.026,30	\$ 206.851.816,30	\$ 54.416.411,00	\$ 129.526.562,70	91,62						
2.3.2.02.02.008.20 24680010205.2.21 06033.83132.526	SERVICIOS DE SOPORTE EN TECNOLOGAS DE LA INFORMACION TI 526	\$ -	\$ 300.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 300.000.000,00	\$ 300.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.000.000,00	\$ -	0						
	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES																			
RUBRO	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS																			
2.3.2.02.02.009.20 24680010082.2.21 02069.91123.226	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 226	\$ 1.053.996.388,00	\$ -	\$ -	\$ 1.053.996.388,00	\$ (1.053.996.388,00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0						
2.3.2.02.02.009.20 24680010226.2.21 02069.91123.226	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 226	\$ 22.446.003.612,00	\$ -	\$ -	\$ 22.446.003.612,00	\$ (22.446.003.612,00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0						
TOTAL INFORME SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		\$ 211.437.078.952,00	\$ 57.231.672.743,38	\$ 91.359.163.751,95	\$ 106.825.708.823,82	\$ 41.765.127.671,51	\$ 253.202.206.623,51	\$ 175.606.930.931,00	\$ 175.606.930.931,00	\$ 119.577.398.242,89	\$ 116.433.449.207,54	\$ 77.595.275.692,51	\$ 56.029.532.688,11	69,3544236						

RELACION GASTOS DE INVERSION A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
11480	2/10/2025 11:24		901766502	CONSORCIO KENNEDY	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 57.121.190,00	2.3.7.06.02.202500000026116.2.459 9002.83321.501 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501	\$ 57.121.190,00	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 280 DE 2023, CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN EL BARRIO ALTOS DEL KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
11487	2/10/2025 11:40	4428	13926328	JAVIER DARIO CORREA OVIEDO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	\$ 16.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
11519	3/10/2025 10:26	4447	91480595	JULIO CESAR CONTRERAS GUERRERO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 10.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	\$ 10.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
11542	3/10/2025 15:11	169	901114547	SOLIUN INGENIERIA S.A.S	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 186.305.166,00	2.3.2.02.02.005.202500000016144.2 .2402114.53211.251 - CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 251	\$ 186.305.166,00	ADICIONAL NO. 8 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 169 DEL 15/07/2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ENMARCADO DENTRO DE LA ESTRATEGIA "PLAN REVITALIZACION DEL ESPACIO PUBLICO CENTRO" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
11543	3/10/2025 15:13	116	890201213	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER UIS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 142.500.000,00	2.3.2.02.02.005.202500000019302.2 .4002020.53211.251 - ESPACIO PUBLICO ADECUADO 251	\$ 142.500.000,00	ADICIONAL NO. 04 EN PLAZO Y VALOR AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 116 DEL 30/07/2024, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL EN LA CARRERA 26 (PASEO ESPAÑA) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER
11630	7/10/2025 10:04		804006674	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S A E S P	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 373.842.742,00	2.3.3.01.02.004.03.2024680010048. 1.4003047.91123.215 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 215	\$ 373.842.742,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES AGOSTO DE 2025 SEGÚN FACTURA NO. ES 383 \$ 373.842.742,00 VALOR TOTAL \$ 373.842.742,00- EMAB
11631	7/10/2025 10:05		900028989	LIMPIEZA URBANA S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 100.213.100,00	2.3.3.01.04.004.03.2024680010048. 1.4003047.91123.215 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 215	\$ 100.213.100,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES DE MAYO DE 2025 SEGÚN FACTURA FBUC NO.814 \$ 24.771.313,00, MES DE JUNIO DE 2025 SEGÚN FACTURA FBUC NO. 815 \$ 24.883.155,00, MES DE JULIO DE 2025 SEGÚN FACTURA FBUC NO. 816 \$ 25.222.717,00 Y AGOSTO DE 2025 SEGUN FACTURA FBUC NO. 820 \$ 25.335.915,00 VALOR TOTAL \$ 100.213.100,00 LIMPIEZA URBANA
11757	8/10/2025 8:17	4454	1098772574	RAFAEL ANDRES HINESTROZA MARTINEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	\$ 16.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACION PUBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
11758	8/10/2025 8:18	4461	1098799445	JAMES FERNANDO AGUIRRE HERNANDEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 13.750.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	\$ 13.750.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS, PROCESOS Y CONVENIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
11759	8/10/2025 8:19	4455	91201001	CARLOS GARCES MUÑOZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2 102069.85999.226 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 226	\$ 5.000.000,00	RESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO
11777	9/10/2025 9:14	240	901993553	CONSORCIO A.P. CVU	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.819.628.073,00	2.3.2.02.02.005.202500000015897.2 .2102069.54619.226 - SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 226	\$ 20.819.628.073,00	MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 45 ENTRE EL ANILLO VIAL Y LA CARRERA NOVENA; CALLE 61 ENTRE EL PUENTE EL BUENO Y LA PUERTA DE SOL; ASÍ COMO LA CALLE 105 ENTRE EL PUENTE DE PROVENZA Y EL PUENTE EL BUENO, EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
11818	9/10/2025 11:55		901457091	APPIANTICA S.A.S	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 325.158.907,50	2.3.7.06.02.202500000029579.1.459 9002.91123.526 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 526	\$ 325.158.907,50	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 254 DE 2023, CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS CAJAS DE INSPECCIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
11819	9/10/2025 11:55		804006674	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S A E S P	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 133.776.325,00	2.3.7.06.02.202500000029579.1.459 9002.85970.526 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE 526	\$ 133.776.325,00	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 116 DE 2023, CUYO OBJETO ES: ACTIVIDADES DE PODA PARA EL DESPEJE DE LUMINARIAS Y REDES QUE INTERFIEREN CON EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
11820	9/10/2025 11:55	286	901767961	CONSORCIO ILUMINAR BGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 52.329.557,90	2.3.7.06.02.202500000029579.1.459 9002.91123.526 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 526	\$ 52.329.557,90	PASIVOS EXIGIBLES CONTRATO NO. 286 DE 2023, CUYO OBJETO ES: MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 - FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA –LOTE 2
11821	9/10/2025 11:55		900930834	SOLUCIONES ELECTRICAS DE COLOMBIA S.A.S	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 98.840.084,58	2.3.7.06.02.202500000029579.1.459 9002.91123.526 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 526	\$ 98.840.084,58	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 424 DE 2022, CUYO OBJETO ES: ADICIÓN EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 424 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA A LA MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR Y SANTANDER, CALLE 56 FASE I Y II Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 3
11822	9/10/2025 11:55		901662108	UNIÓN TEMPORAL BUCARAMANGA ALUMBRADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 255.670.320,73	2.3.7.06.02.202500000029579.1.459 9002.91123.526 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 526	\$ 255.670.320,73	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 415 DE 2022, CUYO OBJETO ES: MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. LOTE 5
11823	9/10/2025 11:55		901774294	CONSORCIO ILUMINAR BGA R	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 152.417.959,10	2.3.7.06.02.202500000029579.1.459 9002.91123.526 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 526	\$ 152.417.959,10	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 332 DE 2023, CUYO OBJETO ES: AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONA RURAL - FASE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
11945	15/10/2025 15:53		810002747	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 205.076.334,35	2.3.7.06.02.202500000029579.1.459 9002.91123.526 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 526	\$ 205.076.334,35	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 422 DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA A LA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
11946	15/10/2025 15:53		901666929	CONSORCIO INTERURBANAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 167.263.648,30	2.3.7.06.02.202500000029579.1.459 9002.91123.526 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 526	\$ 167.263.648,30	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 421 DE 2022, CUYO OBJETO ES: ADICION EN VALOR Y PLAZO NO. 2 AL CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 421 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA A LA MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR Y SANTANDER, CALLE 56 FASE I Y II Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
11947	15/10/2025 15:53		901661891	CONSORCIO ALUMBRADO PBFAO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.607.950.675,27	2.3.7.06.02.202500000029579.1.459 9002.91123.526 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 526	\$ 1.187.950.675,27	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 412 DE 2022, CUYO OBJETO ES: MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. LOTE 2

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
11947	15/10/2025 15:53		901661891	CONSORCIO ALUMBRADO PBFAO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	2.3.7.06.02.202500000029579.1.459 9002.53270.501 - INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 501	\$ 420.000.000,00	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 412 DE 2022, CUYO OBJETO ES: MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. LOTE 2
11948	15/10/2025 15:53		900948622	SUESCUN COMPANY S.A.S.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.996.886,00	2.3.7.06.02.202500000029579.1.459 9002.3212801.526 - PAPEL BOND 526	\$ 5.996.886,00	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 351 DE 2023, CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
11949	15/10/2025 15:54		901772778	CONSORCIO ALUMBRADO NLC	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 65.773.277,51	2.3.7.06.02.202500000029579.1.459 9002.91123.526 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 526	\$ 65.773.277,51	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 323 DE 2023, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA A LA MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 - FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. LOTE 3.
11950	15/10/2025 15:54		890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 215.719.075,72	2.3.7.06.02.202500000029579.1.459 9002.88756.501 - SERVICIOS DE FABRICACION DE EQUIPO DE ILUMINACION ELECTRICA 501	\$ 215.719.075,72	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 253 DE 2022, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P., PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO 2022 EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
11951	15/10/2025 15:54		1098655902	SERGIO PICO RODRIGUEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 83.333,33	2.3.7.06.02.202500000029579.1.459 9002.85999.526 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 526	\$ 83.333,33	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 248 DE 2023, CUYO OBJETO ES: ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO N° 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 248 DE 16 DE ENERO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LA ELABORACIÓN, ORGANIZACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE LOS FORMATOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS, QUE PERMITAN TENER CONTROL EN EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. AP-33
11952	15/10/2025 15:54		14204110	ESNORALDO MUÑOZ PATIÑO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 89.780.031,95	2.3.7.06.02.202500000029579.1.459 9002.91123.526 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 526	\$ 89.780.031,95	PASIVOS EXIGIBLES CONTRATO NO. 217 DE 2021, CUYO OBJETO ES: ADICION EN VALOR Y PLAZO NO. 2 AL CONTRATO 217 DE 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
11953	15/10/2025 15:54		890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 474.166.091,14	2.3.7.06.02.202500000029579.1.459 9002.88756.501 - SERVICIOS DE FABRICACION DE EQUIPO DE ILUMINACION ELECTRICA 501	\$ 474.166.091,14	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 165 DE 2023, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P., PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO 2023 EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
11954	15/10/2025 15:54		805023598	COMISIONISTAS FINANCIEROS AGROPECUARIOS S.A.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.473.595.524,26	2.3.7.06.02.202500000029579.1.459 9002.91119.526 - OTROS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA N C P 526	\$ 1.473.595.524,26	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 136 DE 2021, CUYO OBJETO ES: DESARROLLAR LA PRIMERA FASE PARA LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PUNTOS DE GESTIÓN INTELIGENTE Y MEDIDAS PARA LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
11955	15/10/2025 15:55		901514835	CONSORCIO COPRINCEL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 204.094.038,66	2.3.7.06.02.202500000029579.1.459 9002.91123.526 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 526	\$ 204.094.038,66	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 218 DE 2021, CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO 1
11957	16/10/2025 8:11	4496	13700675	IVAN ALONSO FONSECA GUALDRON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 11.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	\$ 11.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
11959	16/10/2025 9:29		900506002	WILMAN MORALES REY PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S A S	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 25.023.612,00	2.3.7.06.02.202500000029579.1.459 9002.83132.526 - SERVICIOS DE SOPORTE EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TI 526	\$ 25.023.612,00	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 134 DE 2022, CUYO OBJETO ES: VERIFICAR LAS MEDIDAS DE VARIABLES ELÉCTRICAS QUE REALIZA EL DISPOSITIVO FOTOCONTROL CIMCON ISLC 3100-7P-C... CUYA CARGA SON LAS DISTINTAS LUMINARIAS QUE SE HAN SELECCIONADO PRODUCTO DEL ANÁLISIS Y ESPACIO MUESTRAL DE ACUERDO CON LA NORMA ISO NO. 2859-1:1999 PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO PARA INSPECCION DE ATRIBUTOS

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
11960	16/10/2025 9:30	139	830506952	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 134.314.052,50	2.3.7.06.02.20250000029579.1.459 9002.8715205.526 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION 526	\$ 134.314.052,50	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 139 DE 2023, CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – LOTE 2
11961	16/10/2025 9:30		860041968	COMPañIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 36.720.720,76	2.3.7.06.02.20250000029579.1.459 9002.8715205.526 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION 526	\$ 36.720.720,76	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 143 DE 2023, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – LOTE O GRUPO 2.
12018	17/10/2025 12:07		900293868	VEOLIA ASEO BUCARAMANGA S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 12.583.638,00	2.3.3.01.04.004.03.2024680010048.1.4003047.91123.215 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 215	\$ 12.583.638,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES ABRIL DE 2025 SEGÚN FACTURA NO. OPE123 \$ 3.691.461,00 MES MAYO DE 2025 SEGÚN FACTURA NO. OPE124 \$ 4.334.865,00 Y MES DE JUNIO DE 2025 SEGÚN FACTURA NO. OPE125 \$ 4.557.312,00 VALOR TOTAL \$ 12.583.638,00- VEOLIA
12021	20/10/2025 10:14		890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.309.588.095,00	2.3.2.02.02.006.2024680010192.1.2 102069.69112.526 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD POR CUENTA PROPIA 526	\$ 1.309.588.095,00	ENERGIA - ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGÚN FACTURA 239564702 NUMERO DE CUENTA 1075933
12070	20/10/2025 15:06	255	811042483	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANETA E.S.P.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 7.000.000.000,00	2.3.2.02.01.004.20250000034624.2 .2102010.4653201.226 - INSTALACIONES ELECTRICAS NAVIDEÑAS 226	\$ 7.000.000.000,00	DISEÑO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE LA ILUMINACIÓN DECORATIVA PARA EL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
12088	21/10/2025 11:55	2222	1098749339	ROBINSON FABIAN FIGUEROA MALDONADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 9.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2 102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	\$ 9.000.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES #2222 DEL227 DE ABRIL DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTROMECHANICO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO
12099	21/10/2025 22:25	114	901953669	HCL CONSTRUCCION COLOMBIA S.A.S.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 939.190.220,75	2.3.2.02.02.005.2024680010043.2.2 402112.53211.201 - CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 201	\$ 939.190.220,75	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, VOLQUETAS Y VEHÍCULOS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA RED VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
12100	22/10/2025 7:53	4510	1098725811	ELVER DANILO FUQUENE RINCON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 12.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2 102069.82120.526 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 526	\$ 12.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN DENTRO DE SUS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO
12158	24/10/2025 10:12	4532	79127641	HECTOR ALFONSO RODRIGUEZ GARNICA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 11.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	\$ 11.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
12166	24/10/2025 13:44	69	901283904	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE MONSERRATE Y RETIRO GRANDE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 21.408.093,00	2.3.2.02.02.005.2024680010253.2.2 402042.53211.317 - CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 317	\$ 21.408.093,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONVENIO SOLIDARIO NO. 069 DEL 09 DE MAYO DE 2025, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE MONSERRATE Y RETIRO GRANDE, DEL CORREGIMIENTO DOS (2) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR DEL MUNICIPIO DE

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
12173	27/10/2025 11:43		890200162	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA AMB S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 323.769.765,00	2.3.3.01.02.004.01.2024680010048.1.4003047.91123.215 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 215	\$ 323.769.765,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL MES DE JUNIO DE DE 2025 SEGUN FACTURA NO. 0006422 \$ 323.769.765,00 VALOR TOTAL \$ 323.769.765,00- ACUEDUCTO METROPOLITANO
12192	27/10/2025 15:18		890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.583.952,00	2.3.2.02.02.006.2024680010192.1.2.102069.69112.226 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD POR CUENTA PROPIA 226	\$ 3.583.952,00	CONSUMO DE ENERGÍA DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 14 DE OCTUBRE DE 2025, SEGÚN FACTURA DE LA ESSA 240364071 - NUMERO DE CUENTA 32675.
12223	28/10/2025 17:17		900831020	CASTRO ARQUITECTOS- DISEÑO, ARQUITECTURA Y CIUDAD SAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.373.250,00	2.3.7.06.02.202500000026116.2.459.9002.83211.545 - SERVICIOS DE ASESORIA EN ARQUITECTURA	\$ 4.373.250,00	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 200 DE 2023, CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MONUMENTO CONMEMORATIVO A LA CELEBRACIÓN 400 AÑOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
12291	29/10/2025 10:52		890200162	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA AMB S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 56.252.410,00	2.3.3.01.02.004.02.2024680010048.1.4003047.91123.215 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 215	\$ 56.252.410,00	RECONOCER Y ORDENAR EL PAGO DE LA SUMA DE CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS MCTE (\$56.252.410), A FAVOR DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P., IDENTIFICADO CON NIT. NO. 890.200.162-2 POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTES A LOS SUBSIDIOS APLICADOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3, DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 Y LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2025.
12338	31/10/2025 8:50		800153993	COMCEL S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.497.014,24	2.3.2.02.02.008.2024680010192.1.2.102069.84120.526 - SERVICIO DE TELEFONA FIJA (ACCESO) 526	\$ 3.497.014,24	PLAN DE DATOS DE TELEMEDIDA, TELEGESTION Y PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 20 DE OCTUBRE DE 2025 SEGÚN FACTURA DE CLARO NO E5088050677 REFERENCIA 8221383845
12339	31/10/2025 10:15	3037	91106800	WALTER YEZID MARTINEZ VEGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.500.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4.599031.83213.501 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 501	\$ 1.500.000,00	DICIONAL EN VALOR NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3037 DEL 06 DE AGOSTO DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
12340	31/10/2025 10:16	2250	91249193	GERMAN ALBERTO MORENO BREGULLA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 8.250.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4.599031.83213.501 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 501	\$ 8.250.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2250 DEL 29/04/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
12353	31/10/2025 14:23	268	901940738	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BOLARQUI ALTO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 410.000.000,00	2.3.2.02.02.005.2024680010253.2.2.402042.53211.201 - CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 201	\$ 49.999.143,00	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BOLARQUI ALTO DEL CORREGIMIENTO 2, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, ATRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER
12353	31/10/2025 14:23	268	901940738	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BOLARQUI ALTO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	2.3.2.02.02.005.2024680010253.2.2.402042.53211.317 - CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 317	\$ 360.000.857,00	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BOLARQUI ALTO DEL CORREGIMIENTO 2, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, ATRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER
12354	31/10/2025 14:25	269	901913158	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BOLARQUI BAJO DEL CORREGIMIENTO DOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 273.881.925,00	2.3.2.02.02.005.2024680010253.2.2.402042.53211.588 - CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 588	\$ 273.881.925,00	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BOLARQUI BAJO DEL CORREGIMIENTO 2, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, ATRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER
12356	31/10/2025 15:02	3808	1098712839	SILVIA JULIANA SUAREZ SARQUEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.100.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4.599031.83990.317 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 317	\$ 2.100.000,00	ADICIONAL EN VALOR NO.1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3808 DEL 03/09/2025 CUYO OBJETO ES: "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA"

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
12529	7/11/2025 12:24	52	901904407	CONSORCIO GENPRO GROUP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.855.091.868,97	2.3.2.02.02.005.2024680010051.2.2 402114.53211.252 - CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 252	\$ 1.652.542.117,97	ADICIONAL EN VALOR NO. 2 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 051 DEL 21 DE ABRIL DE 2025, CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
12529	7/11/2025 12:24	52	901904407	CONSORCIO GENPRO GROUP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	2.3.2.02.02.005.2024680010051.2.2 402114.53211.267 - CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 267	\$ 110.444.642,00	ADICIONAL EN VALOR NO. 2 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 051 DEL 21 DE ABRIL DE 2025, CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
12529	7/11/2025 12:24	52	901904407	CONSORCIO GENPRO GROUP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	2.3.2.02.02.005.2024680010051.2.2 402114.53211.319 - CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 319	\$ 2.092.105.109,00	ADICIONAL EN VALOR NO. 2 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 051 DEL 21 DE ABRIL DE 2025, CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
12619	10/11/2025 17:14	3174	1095951874	DIANA CAROLINA ARISTIZABAL GOMEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 6.416.666,67	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	\$ 6.416.666,67	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3174 DEL 14/08/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GEOLOGA PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE EJECUTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
12698	11/11/2025 14:14	3529	91274635	JAIME LUIS PARRA VERGARA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.033.333,33	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	\$ 4.033.333,33	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3529 DEL 27/08/2025 CUYO OBJETO ES:PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA APOYAR EL ÁREA DE BANCO DE PROYECTOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
12699	11/11/2025 14:14	3694	55300011	LIZETH JOHANA BAYONA GONZALEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.483.333,33	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	\$ 3.483.333,33	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3694 DEL 29/08/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA APOYAR EL ÁREA DE BANCO DE PROYECTOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
12700	11/11/2025 14:16	3540	1007726234	JENITH KATHERINE DUARTE GALVIS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.933.333,33	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.85999.501 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 501	\$ 2.933.333,33	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 3540 DEL 27/08/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
12725	12/11/2025 11:21	3622	91251913	MIGUEL ANTONIO HERRERA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.750.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.85999.501 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 501	\$ 1.750.000,00	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 3622 DEL 28/08/2025 CUYO OBJETO ES:PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
12726	12/11/2025 11:22	3332	1098785392	GIANN KARLO MEJIA NIÑO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.986.666,67	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.85999.501 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 501	\$ 2.986.666,67	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 3332 DEL 21/08/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA
12731	12/11/2025 17:09	3639	91265526	RAFAEL ROJAS PEÑA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.850.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83990.317 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 317	\$ 2.400.000,00	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3639 DEL 28/08/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
12731	12/11/2025 17:09	3639	91265526	RAFAEL ROJAS PEÑA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	\$ 1.450.000,00	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3639 DEL 28/08/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
12732	12/11/2025 17:10	3518	1096228039	JHOSIAS MONTESINOS BALLESTEROS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.150.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	\$ 3.150.000,00	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3518 DEL 26/08/2025 CUYO OBJETO ES:PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
12796	13/11/2025 16:26	3291	1193235341	ANA MARIA LIZARAZO BECERRA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 900.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	\$ 900.000,00	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3291 DEL 20/08/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURIDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
12797	13/11/2025 16:27	3107	37748334	KERLLY LUCERO TOLOZA PRADA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.333.333,33	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	\$ 2.333.333,33	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3107 DEL 12/08/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES PRESUPUESTALES RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
12798	13/11/2025 16:28	2974	63339406	MARIA PATRICIA MONSALVE MONSALVE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 800.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	\$ 800.000,00	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS COMO APOYO NO. 2974 DEL 5/08/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER EL AREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
12852	18/11/2025 10:21	278	900494267	MIGUEL SILVA INGENIERIA S.A.S.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 120.489.877,19	2.3.2.02.02.008.202500000032340.2 4599006.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	\$ 120.489.877,19	PRESTACION DE SERVICIOS DE TOMAS DE MUESTRA Y ELABORACION DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE ESTUDIO DE SUELOS PARA LOS PROYECTOS EN ESTRUCTURACIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
12853	18/11/2025 10:57	3114	63505805	LAURA PAOLA AMOROCHO MONTAGUT	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.566.666,67	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	\$ 2.566.666,67	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3114 DEL 12/08/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO FINANCIERO PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS QUE EJECUTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
12854	18/11/2025 10:57	3011	37830644	MARIA ELENA GUTIERREZ DUARTE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.800.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.82120.501 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 501	\$ 1.800.000,00	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3011 DEL 05/08/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURIDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE DEFENSA JUDICIAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
12855	18/11/2025 10:58	3792	1098662774	ANDRES FELIPE DUEÑAS SANCHEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.850.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	\$ 3.850.000,00	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3792 DEL 3/09/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA APOYAR EL ÁREA DE BANCO DE PROYECTOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
12856	18/11/2025 11:04	3757	1100962680	KAREN JULIETH GUALDRON CHAPARRO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.850.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	\$ 3.850.000,00	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3757 DEL 2/09/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
12857	18/11/2025 15:16		900115931	EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S A ESP EMPAS S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 104.077.202,00	2.3.3.01.02.004.02.2024680010048.1.4003047.91123.215 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 215	\$ 104.077.202,00	PAGO DE SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL MES JUNIO DE 2025 SEGÚN FACTURA NO. 0003931 \$ 104.077.202,00 VALOR TOTAL \$ 104.077.202,00 - EMPAS
12858	18/11/2025 15:20		890200162	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA AMB S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 325.525.402,00	2.3.3.01.02.004.01.2024680010048.1.4003047.91123.215 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 215	\$ 325.525.402,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL MES DE JULIO DE DE 2025 SEGUN FACTURA NO. 0006459 \$ 325.525.402,00 VALOR TOTAL \$ 325.525.402,00- ACUEDUCTO METROPOLITANO

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
12876	18/11/2025 16:27	3275	1098742245	JOSE ANTONIO FLOREZ POVEDA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.500.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	\$ 4.400.000,00	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3275 DEL 19/08/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
12876	18/11/2025 16:27	3275	1098742245	JOSE ANTONIO FLOREZ POVEDA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83321.501 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501	\$ 1.100.000,00	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3275 DEL 19/08/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
12877	18/11/2025 17:01		804006674	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S A E S P	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 198.910.478,73	2.3.7.06.02.202500000026116.2.459 9002.85970.513 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE	\$ 198.910.478,73	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 144 DE 2023, CUYO OBJETO ES: ACTIVIDADES DE TALA Y MANEJO INTEGRAL DEL COMPONENTE ARBÓREO UBICADOS EN EL ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
12889	19/11/2025 15:19	2445	1098773241	FABIAN ANDRES ARDILA PABON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.100.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.82120.501 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 501	\$ 1.100.000,00	ADICIONAL NO. 2 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2445 DEL 26/06/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS, PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
12890	19/11/2025 15:22	3264	13717147	NELSON ALBA CONTRERAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.866.666,66	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	\$ 3.866.666,66	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SRVICIOS COMO APOYO NO. 3264 DEL 19/08/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNÓLOGO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
12891	19/11/2025 15:22	4003	37550043	MARLY YOLIMA ARDILA MANTILLA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.750.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	\$ 2.750.000,00	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES NO. 4003 DEL 11/09/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA APOYAR EL AREA DE BANCO DE PROYECTOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
12892	19/11/2025 15:22	3541	1000469358	ANGIE NATALIA GIL MARTINEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.300.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	\$ 3.300.000,00	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 3541 DEL 27/08/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
12893	19/11/2025 15:23	3578	91466987	RICARDO BLANCO PEÑA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.240.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.85999.501 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 501	\$ 2.240.000,00	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 3578 DEL 27/08/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE MAQUINARIA AMARILLA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.
12894	19/11/2025 15:55	3329	1098816293	JORGE LUIS BARAJAS CHANAGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.133.333,33	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83321.501 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501	\$ 5.133.333,33	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3329 DEL 21/08/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
12901	20/11/2025 9:36	3553	5605285	FEDERICO ARIAS GARCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.400.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	\$ 4.400.000,00	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3553 DEL 27/08/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
12949	20/11/2025 15:42	3612	1102369209	JULIETH BOLAÑOS BARANDICA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.850.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	\$ 3.850.000,00	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3612 DEL 28/08/2025 CUYO OBJETO ES:PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
12956	20/11/2025 16:06	3335	60368629	MARTHA LUCIA BAUTISTA LAGOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.133.333,33	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	\$ 5.133.333,33	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3335 DEL 21/08/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE
12957	20/11/2025 16:06	3368	1098707994	LADY DIANE MORANTES JAIME	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.133.333,33	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	\$ 5.133.333,33	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3368 DEL 21/08/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
12958	20/11/2025 17:11	3365	1098719331	JHON FREDDY RAMIREZ JAIMES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.133.333,33	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	\$ 5.133.333,33	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3365 DEL 21/08/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
12976	21/11/2025 15:36	2367	1095843401	MARIA LUCIA DURAN AGUIRRE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.333.333,33	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.82120.501 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 501	\$ 2.333.333,33	ADICIONAL NO. 2 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2367 DEL 06/06/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURIDICAS EN EL AREA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
13004	25/11/2025 8:18		800153993	COMCEL S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.400.694,18	2.3.2.02.02.008.2024680010192.1.2 102069.84120.526 - SERVICIO DE TELEFONA FIJA (ACCESO) 526	\$ 3.400.694,18	PLAN DE DATOS DE TELEMEDIDA, TELEGESTION Y PLATAFORMA TECNOLOGICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEL 20 DE OCTUBRE DE 2025 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGÚN FACTURA DE CLARO NO.E5998580261 REFERENCIA 8221383845.
13005	25/11/2025 8:25		800153993	COMCEL S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.665.719,63	2.3.2.02.02.008.2024680010192.1.2 102069.84120.526 - SERVICIO DE TELEFONA FIJA (ACCESO) 526	\$ 2.665.719,63	CONSUMO DE VOZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04 DE OCTUBRE DE 2025 AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2025 PLAN DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y SIM CARD DE PRUEBA DE TELEMEDIDA, SEGÚN FACTURA E5992801182 DE CLARO REFERENCIA 8221401342
13007	25/11/2025 10:03		890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.354.068.402,00	2.3.2.02.02.006.2024680010192.1.2 102069.69112.526 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD POR CUENTA PROPIA 526	\$ 1.354.068.402,00	ENERGIA - ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025 SEGÚN FACTURA 240718773 NUMERO DE CUENTA 1075933
13012	25/11/2025 13:42	3288	1005564365	KAREN JULIETH TOLOZA LAMUS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 700.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO A N C P 251	\$ 700.000,00	ADICIONAL NO. 2 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 3288 DEL 20/08/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
13013	25/11/2025 13:43	3808	1098712839	SILVIA JULIANA SUAREZ SARQUEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.266.666,67	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	\$ 3.266.666,67	ADICIONAL NO. 2 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3808 DEL 3/09/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
13258	1/12/2025 16:09		900115931	EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S A ESP EMPAS S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 101.781.111,00	2.3.3.01.02.004.02.2024680010048.1.4003047.91123.215 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 215	\$ 101.781.111,00	PAGO DE SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL MES JULIO DE 2025 SEGÚN FACTURA NO. 0004150 \$ 101.781.111,00 VALOR TOTAL \$ 101.781.111,00 - EMPAS
13259	1/12/2025 16:09	4409	91356086	GERMAN YESID PEÑA RUEDA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.666.666,67	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2 102069.82120.526 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 526	\$ 1.666.666,67	ADICIONAL EN VALOR NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES # 4409 DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN DENTRO DE SUS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO
13264	1/12/2025 17:02	3758	1098602362	VICTOR ELIAS MENESES AGRESOTH	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.400.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	\$ 4.400.000,00	ADICIONAL NO.1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3758 DEL 2/09/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL AREA DE EQUIPAMIENTO URBANO EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
13265	1/12/2025 17:02	3826	1101175096	ANDRES ORLANDO RODRIGUEZ PINEDA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.216.666,67	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	\$ 4.216.666,67	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3826 DEL 3/09/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
13266	1/12/2025 17:02	3007	63550793	DIANA CAROLINA CARRILLO RIVEROS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.100.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83213.201 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 201	\$ 1.498.666,67	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3007 DEL 05/08/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO ESPECIALIZADO PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
13266	1/12/2025 17:02	3007	63550793	DIANA CAROLINA CARRILLO RIVEROS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83213.501 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 501	\$ 601.333,33	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3007 DEL 05/08/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO ESPECIALIZADO PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
13267	1/12/2025 17:03	3367	37747602	PAOLA ALEJANDRA GARCIA GALAN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.566.666,67	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	\$ 2.566.666,67	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3367 DEL 21/08/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA PLANEACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE GESTION DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
13290	2/12/2025 10:49	3164	1095828668	ERWING LEONARDO ARIAS CANO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83321.501 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501	\$ 2.000.000,00	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3164 DEL 14/08/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE EJECUTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
13291	2/12/2025 10:50	3037	91106800	WALTER YEZID MARTINEZ VEGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.566.666,67	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83213.501 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 501	\$ 2.566.666,67	ADICIONAL NO. 2 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3037 DEL 6/08/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
13292	2/12/2025 10:50	2922	1095942578	ANGIE DANIELA FIGUEROA TORRES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.066.666,67	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	\$ 1.066.666,67	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS COMO APOYO NO. 2922 DEL 1/08/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
13293	2/12/2025 10:51	3172	1101687332	WILLIAM JOSE CALA VALBUENA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.800.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83321.501 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501	\$ 1.800.000,00	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 3172 DEL 14/08/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS QUE EJECUTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
13294	2/12/2025 10:51	3008	1007402713	DAYANA CRISTINA ARENAS BAYONA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.750.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	\$ 2.750.000,00	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3008 DEL 05/08/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
13295	2/12/2025 10:51	3165	1098700548	JUAN FELIPE RODRIGUEZ ARAMBULA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.400.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	\$ 2.400.000,00	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3165 DEL 14/08/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
13296	2/12/2025 12:48	3735	13874585	JOHN JEFFERSON MORENO RODRIGUEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.200.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	\$ 1.175.666,66	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 3735 DEL 01/09/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR APOYO AL SEGUIMIENTO Y RESPUESTA OPORTUNA DE LAS PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
13296	2/12/2025 12:48	3735	13874585	JOHN JEFFERSON MORENO RODRIGUEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.85999.501 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 501	\$ 24.333,34	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 3735 DEL 01/09/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR APOYO AL SEGUIMIENTO Y RESPUESTA OPORTUNA DE LAS PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
13297	2/12/2025 12:48	3166	63348331	LILIANA CARVAJAL SALAMANCA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.400.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	\$ 2.400.000,00	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3166 DEL 14/08/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA LA PLANEACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE EJECUTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
13298	2/12/2025 12:49	3807	1098731681	DIEGO FERNANDO RAMIREZ SARMIENTO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.216.666,67	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	\$ 2.013.579,96	ADICIONAL NO.1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3807 DEL 3/09/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
13298	2/12/2025 12:49	3807	1098731681	DIEGO FERNANDO RAMIREZ SARMIENTO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	\$ 2.203.086,71	ADICIONAL NO.1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3807 DEL 3/09/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
13303	2/12/2025 12:57	3267	1093798962	KAREN MARCELA GUTIERREZ BARRAGAN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.386.666,67	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	\$ 1.386.666,67	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 3267 DEL 19/08/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
13325	3/12/2025 9:37	2357	13719438	DIEGO ALFONSO OREJARENA DIAZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2 102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	\$ 2.000.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES # 2357 DEL 03 DE JUNIO DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO
13328	3/12/2025 11:14	3488	1098726540	CLAUDIA MILENA SANCHEZ QUIROGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.833.333,33	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	\$ 1.833.333,33	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3488 DEL 25/08/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
13337	3/12/2025 16:25	4624	1098813065	ANGIE PAOLA GOMEZ SEPULVEDA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.150.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2 102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	\$ 3.150.000,00	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO
13370	4/12/2025 15:39		901320986	JESAK SAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 42.731.910,92	2.3.7.06.02.202500000026116.2.459 9002.54211.582 - SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES	\$ 42.731.910,92	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 429 DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER.
13392	4/12/2025 18:49	3623	91235541	EDUARDO TORRES QUINTANA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.700.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	\$ 2.700.000,00	ADICIONAL NO.1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS DE APOYO NO. 3623 DEL 28/08/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TOPOGRAFO PARA APOYAR LA PLANEACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
13441	5/12/2025 10:12	3115	63499554	MONICA JOHANNA IGLESIAS ACEVEDO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	\$ 501.333,67	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3115 DEL 12/08/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
13441	5/12/2025 10:12	3115	63499554	MONICA JOHANNA IGLESIAS ACEVEDO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83321.501 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501	\$ 498.666,33	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3115 DEL 12/08/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
13442	5/12/2025 10:12	3617	91212669	OMAR BALLESTEROS BUENO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.700.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	\$ 2.700.000,00	ADICIONAL NO.1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SRVICIOS COMO APOYO NO. 3617 DEL 28/08/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TOPÓGRAFO PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
13443	5/12/2025 10:13	3193	91488348	HAROLD ANDRES NIÑO VARGAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.333.333,33	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	\$ 1.333.333,33	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3193 DEL 15/08/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
13576	9/12/2025 10:10	3049	1098766174	DANIEL EDUARDO JAIMES RUIZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.600.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	\$ 1.600.000,00	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3049 DEL 11/08/2025 CUYO OBJETO ES: "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA"
13577	9/12/2025 10:11	3531	1095833106	JOSE TOMAS ZULUAGA FLOREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.566.666,67	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	\$ 2.518.999,64	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3531 DEL 27/08/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
13577	9/12/2025 10:11	3531	1095833106	JOSE TOMAS ZULUAGA FLOREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83321.501 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501	\$ 47.667,03	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3531 DEL 27/08/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
13578	9/12/2025 10:12	4410	80160454	FABIO ALEXANDER MOLANO SILVA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 750.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	\$ 750.000,00	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES NO. 4410 DEL 30/09/2025 CUYO OBJETO ES: "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR PUBLICO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTUALES EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS"
13580	9/12/2025 10:22	3933	1102374007	JOSE ALEJANDRO SANDOVAL MEDINA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.116.666,67	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	\$ 3.116.666,67	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3933 DEL 9/09/2025 CUYO OBJETO ES:PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
13581	9/12/2025 10:48	3819	1098788845	MARIA FERNANDA SUAREZ ESTEBAN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.566.666,67	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	\$ 2.566.666,67	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3819 DEL 3/09/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
13583	9/12/2025 11:29		804006674	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S A E S P	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 385.452.998,00	2.3.3.01.02.004.03.2024680010048.1.4003047.91123.215 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 215	\$ 385.452.998,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES SEPTIEMBRE DE 2025 SEGÚN FACTURA NO. ES 385 \$ 385.452.998,00 VALOR TOTAL \$ 385.452.998,00- EMAB
13614	9/12/2025 14:21	4358	1193127272	JESUS DAVID MARTINEZ SEPULVEDA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	\$ 1.000.000,00	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NO. 4358 DEL 25/09/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES TECNICAS DE DISEÑO, PLANOS Y PROYECCIONES EN LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA"

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
13615	9/12/2025 14:21	4288	1098775717	MARIA CAMILA PICO MENDEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.800.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	\$ 1.800.000,00	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES NO. 4288 DEL 23/09/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURIDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE DEFENSA JUDICIAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA"
13640	9/12/2025 18:28	4086	1098769464	EDSON ALBERTO ACEVEDO BAUTISTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.833.333,33	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	\$ 1.833.333,33	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES NO. 4086 DEL 15/09/2025 CUYO OBJETO ES: " PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA"
13641	9/12/2025 18:29	3108	37860468	MARIA FERNANDA SANDOVAL LOPEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.800.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4 599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	\$ 2.800.000,00	ADICIONAL NO.1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3108 DEL 12/08/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
13795	12/12/2025 10:38		804006674	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S A E S P	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 392.593.919,00	2.3.3.01.02.004.03.2024680010048.1.4003047.91123.215 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 215	\$ 392.593.919,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES OCTUBRE DE 2025 SEGÚN FACTURA NO. ES 386 \$ 392.593.919,00 VALOR TOTAL \$ 392.593.919,00- EMAB
13796	12/12/2025 10:39		890200162	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA AMB S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 328.104.832,00	2.3.3.01.02.004.01.2024680010048.1.4003047.91123.215 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 215	\$ 328.104.832,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL MES DE AGOSTO DE DE 2025 SEGUN FACTURA NO. 0006471 \$ 328.104.832,00 VALOR TOTAL \$ 328.104.832,00- ACUEDUCTO METROPOLITANO
13986	16/12/2025 14:51	3185	1098605320	SILVIA ANDREA FERREIRA BLANCO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 933.333,33	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2 102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	\$ 933.333,33	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION # 3185 DEL 15/08/2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTALES Y DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO
13987	16/12/2025 14:52	3798	13742344	DAVID CAMILO FLOREZ CORDOBA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.283.333,33	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2 102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	\$ 1.283.333,33	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES # 3798 DEL 03/09/2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO
13994	17/12/2025 9:14		800153993	COMCEL S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 380.817,09	2.3.2.02.02.008.2024680010192.1.2 102069.84120.526 - SERVICIO DE TELEFONA FIJA (ACCESO) 526	\$ 380.817,09	CONSUMO DE VOZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2025 PLAN DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y SIM CARD DE PRUEBA DE TELEMEDIDA, SEGÚN FACTURA E6002462280 DE CLARO REFERENCIA 8221401242
14005	17/12/2025 10:05	341	902009210	CONSORCIO EYC1 2025	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 6.930.979.159,70	2.3.2.02.02.008.2024680010189.2.2 102069.8715205.226 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION 226	\$ 6.930.979.159,70	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRDO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- LOTE 01 (COMUNAS 1,2,3,4,13,14,15 Y CORREGIMIENTOS 1 Y 2) LOTE 02 (COMUNAS 5,6,7,8,9,10,11,12,16,17 Y CORREGIMIENTO 3)
14006	17/12/2025 10:06	342	900232348	JALGAVI INGENIEROS LTDA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.033.955.610,00	2.3.2.02.02.008.2024680010189.2.2 102069.85970.226 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE 226	\$ 1.033.955.610,00	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - LOTE 03 (COMUNAS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 Y CORREGIMIENTOS 1,2,3)
14057	17/12/2025 17:18	4153	63333265	CARMEN ELISA LEON PATIÑO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.500.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2 102069.82120.526 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 526	\$ 1.500.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES # 4153 DEL 17/09/2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
14070	18/12/2025 8:22		890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.302.893.749,00	2.3.2.02.02.006.2024680010192.1.2 102069.69112.526 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD POR CUENTA PROPIA 526	\$ 1.302.893.749,00	ENERGIA - ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGÚN FACTURA 241864948 NUMERO DE CUENTA 1075933
14176	18/12/2025 18:56	3217	1098634815	JAVIER BARAJAS CASTRO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2 102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	\$ 2.000.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES # 3217 DEL 15/08/2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRÓNICO PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO
14186	19/12/2025 7:51		890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.888.635,00	2.3.2.02.02.006.2024680010192.1.2 102069.69112.526 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD POR CUENTA PROPIA 526	\$ 3.888.635,00	CONSUMO DE ENERGÍA DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL 15 DE OCTUBRE DE 2025 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGÚN FACTURA DE LA ESSA 241536760 - NUMERO DE CUENTA 32675.
14273	19/12/2025 14:45	4510	1098725811	ELVER DANILO FUQUENE RINCON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.800.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2 102069.82120.526 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 526	\$ 1.800.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES # 4510 DEL 21/10/2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN DENTRO DE SUS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO
14274	19/12/2025 14:46	4409	91356086	GERMAN YESID PEÑA RUEDA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.833.333,33	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2 102069.82120.526 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 526	\$ 2.833.333,33	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 2 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES # 4409 DEL 30/09/2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN DENTRO DE SUS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO
14275	19/12/2025 14:49		900293868	VEOLIA ASEO BUCARAMANGA S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 14.008.546,00	2.3.3.01.04.004.03.2024680010048.1.4003047.91123.215 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 215	\$ 14.008.546,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES DE JULIO DE 2025 SEGÚN FACTURA NO. OPE152 \$ 5.287.837, MES DE AGOSTO DE 2025 SEGÚN FACTURA NO. OPE153 \$ 3.865.834 Y MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGÚN FACTURA NO. OPE154 \$ 4.854.875 VALOR TOTAL \$ 14.008.546,00 VEOLIA
14286	19/12/2025 18:28		900115931	EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S A ESP EMPAS S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 108.488.271,00	2.3.3.01.02.004.02.2024680010048.1.4003047.91123.215 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 215	\$ 108.488.271,00	PAGO DE SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL MES AGOSTO DE 2025 SEGÚN FACTURA NO. 0004610 \$ 108.488.271,00 VALOR TOTAL \$ 108.488.271,00 - EMPAS
14402	22/12/2025 11:24	2271	9395175	GERMAN ENRIQUE CARVAJAL GOMEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 600.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2 102069.85999.226 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 226	\$ 600.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 2 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION # 2271 DEL 07 DE MAYO DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
14403	22/12/2025 11:25	2416	1098669467	EDWIN FERNANDO AYALA CADENA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.283.333,33	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2 102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	\$ 1.283.333,33	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES # 2416 DEL 20/06/2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA EJECUTAR EL DISEÑO, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS; ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DESDE LA OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO
14404	22/12/2025 11:25	2233	1098784128	DANIEL ALEXANDER LOPEZ MALDONADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 680.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2 102069.85999.226 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 226	\$ 680.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 2 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION # 2233 DEL 25 DE ABRIL DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ELECTRICISTA DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO
14405	22/12/2025 11:25	2234	1095948947	JOSUE FERNANDO QUIROGA SIERRA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 680.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2 102069.85999.226 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 226	\$ 680.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 2 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO # 2234 DEL 25 DE ABRIL DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ELECTRICISTA DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
14473	23/12/2025 11:48		800153993	COMCEL S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.400.694,18	2.3.2.02.02.008.2024680010192.1.2 102069.84120.526 - SERVICIO DE TELEFONA FIJA (ACCESO) 526	\$ 3.400.694,18	PLAN DE DATOS DE TELEMEDIDA, TELEGESTION Y PLATAFORMA TECNOLOGICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGÚN FACTURA DE CLARO NO. E6009198183 REFERENCIA 8221383845.
14541	29/12/2025 15:07		830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P BIC	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 82.876.201,74	2.3.2.02.02.008.2024680010192.1.2 102069.84120.526 - SERVICIO DE TELEFONA FIJA (ACCESO) 526	\$ 82.876.201,74	CONSUMO DE TELEFONIA LOCAL - ADSL (FIBRA OPTICA, SERVIDOR) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SEGUN FACTURA 580831378376 \$ 25.708.019,17, MES DE OCTUBRE DE 2025, SEGUN FACTURA 580831389390 \$ 28.339.973,17 Y MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGUN FACTURA 580831400405 \$ 28.828.209,40 DE MOVISTAR CUENTA NO.010 POR VALOR DE \$

RELACION PERSONAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2025	2222	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ROBINSON FABIAN	FIGUEROA MALDONADO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTROMECHANICO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 9.000.000,00	17/10/2025	23/10/2025	22/12/2025
2025	2233	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DANIEL ALEXANDER	LOPEZ MALDONADO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ELECTRICISTA DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 680.000,00	19/12/2025	25/12/2025	30/12/2025
2025	2234	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSUE FERNANDO	QUIROGA SIERRA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ELECTRICISTA DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 680.000,00	19/12/2025	25/12/2025	30/12/2025
2025	2250	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	GERMAN ALBERTO	MORENO BREGULLA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 8.250.000,00	29/10/2025	5/11/2025	19/12/2025
2025	2271	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	GERMAN ENRIQUE	CARVAJAL GOMEZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 600.000,00	19/12/2025	26/12/2025	30/12/2025
2025	2357	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIEGO ALFONSO	OREJARENA DIAZ	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 2.000.000,00	1/12/2025	4/12/2025	18/12/2025
2025	2367	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA LUCIA	DURAN AGUIRRE	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURIDICAS EN EL AREA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.333.333,33	18/11/2025	13/12/2025	26/12/2025
2025	2416	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EDWIN FERNANDO	AYALA CADENA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELÉCTRICISTA PARA EJECUTAR EL DISEÑO, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS; ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESDE LA OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 1.283.333,33	19/12/2025	24/12/2025	30/12/2025
2025	2445	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FABIAN ANDRES	ARDILA PABON	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS, PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 1.100.000,00	12/11/2025	21/12/2025	26/12/2025
2025	2922	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANGIE DANIELA	FIGUEROA TORRES	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.066.666,67	26/11/2025	19/12/2025	26/12/2025

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2025	2974	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA PATRICIA	MONSALVE MONSALVE	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER EL AREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 800.000,00	13/11/2025	21/12/2025	26/12/2025
2025	3007	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIANA CAROLINA	CARRILLO RIVEROS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO ESPECIALIZADO PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.100.000,00	26/11/2025	18/12/2025	26/12/2025
2025	3008	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DAYANA CRISTINA	ARENAS BAYONA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.750.000,00	26/11/2025	12/12/2025	26/12/2025
2025	3011	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA ELENA	GUTIERREZ DUARTE	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURIDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE DEFENSA JUDICIAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.800.000,00	13/11/2025	18/12/2025	26/12/2025
2025	3037	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	WALTER YEZID	MARTINEZ VEGA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 1.500.000,00	29/10/2025	11/08/2025	15/12/2025
2025	3037	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	WALTER YEZID	MARTINEZ VEGA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 2.566.666,67	25/11/2025	16/12/2025	26/12/2025
2025	3049	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DANIEL EDUARDO	JAIMES RUIZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.600.000,00	4/12/2025	12/12/2025	19/12/2025
2025	3107	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	KERLLY LUCERO	TOLOZA PRADA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES PRESUPUESTALES RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.333.333,33	12/11/2025	13/12/2025	26/12/2025
2025	3108	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA FERNANDA	SANDOVAL LOPEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA	\$ 2.800.000,00	3/12/2025	13/12/2025	26/12/2025
2025	3114	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LAURA PAOLA	AMOROCHO MONTAGUT	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO FINANCIERO PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS QUE EJECUTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.566.666,67	13/11/2025	13/12/2025	26/12/2025
2025	3115	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MONICA JOHANNA	IGLESIAS ACEVEDO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.000.000,00	3/12/2025	13/12/2025	17/12/2025
2025	3164	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ERWING LEONARDO	ARIAS CANO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE EJECUTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.000.000,00	26/11/2025	15/12/2025	26/12/2025

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2025	3165	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN FELIPE	RODRIGUEZ ARAMBULA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.400.000,00	27/11/2025	15/12/2025	26/12/2025
2025	3166	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LILIANA	CARVAJAL SALAMANCA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA LA PLANEACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE EJECUTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.400.000,00	26/11/2025	15/12/2025	26/12/2025
2025	3172	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	WILLIAM JOSE	CALA VALBUENA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS QUE EJECUTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.800.000,00	26/11/2025	15/12/2025	26/12/2025
2025	3174	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIANA CAROLINA	ARISTIZABAL GOMEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GEOLOGA PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE EJECUTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 6.416.666,67	30/10/2025	15/11/2025	19/12/2025
2025	3185	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SILVIA ANDREA	FERREIRA BLANCO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTALES Y DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 933.333,33	5/12/2025	19/12/2025	25/12/2025
2025	3193	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HAROLD ANDRES	NIÑO VARGAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA	\$ 1.333.333,33	18/11/2025	19/12/2025	26/12/2025
2025	3217	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JAVIER	BARAJAS CASTRO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRÓNICO PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 2.000.000,00	18/12/2025	19/12/2025	30/12/2025
2025	3264	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	NELSON	ALBA CONTRERAS	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNÓLOGO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 3.866.666,66	18/11/2025	21/11/2025	19/12/2025
2025	3267	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	KAREN MARCELA	GUTIERREZ BARRAGAN	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 1.386.666,67	26/11/2025	11/12/2025	23/12/2025
2025	3275	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE ANTONIO	FLOREZ POVEDA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.500.000,00	13/11/2025	20/11/2025	19/12/2025
2025	3288	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	KAREN JULIETH	TOLOZA LAMUS	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 700.000,00	24/11/2025	21/12/2025	26/12/2025
2025	3291	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANA MARIA	LIZARAZO BECERRA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 900.000,00	12/11/2025	21/12/2025	26/12/2025

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2025	3329	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LUIS	BARAJAS CHANAGA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.133.333,33	18/11/2025	22/11/2025	19/12/2025
2025	3332	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	GIANN KARLO	MEJIA NIÑO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA	\$ 2.986.666,67	10/11/2025	22/11/2025	19/12/2025
2025	3335	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARTHA LUCIA	BAUTISTA LAGOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 5.133.333,33	19/11/2025	22/11/2025	19/12/2025
2025	3365	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JHON FREDDY	RAMIREZ JAIMES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 5.133.333,33	19/11/2025	22/11/2025	19/12/2025
2025	3367	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PAOLA ALEJANDRA	GARCIA GALAN	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA PLANEACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE GESTION DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 2.566.666,67	27/11/2025	13/12/2025	26/12/2025
2025	3368	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LADY DIANE	MORANTES JAIME	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 5.133.333,33	19/11/2025	22/11/2025	19/12/2025
2025	3488	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CLAUDIA MILENA	SANCHEZ QUIROGA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 1.833.333,33	27/11/2025	17/12/2025	26/12/2025
2025	3518	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JHOSIAS	MONTESINOS BALLESTOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA	\$ 3.150.000,00	31/10/2025	29/11/2025	19/12/2025
2025	3529	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JAIME LUIS	PARRA VERGARA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA APOYAR EL ÁREA DE BANCO DE PROYECTOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 4.033.333,33	4/11/2025	28/11/2025	19/12/2025
2025	3531	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE TOMAS	ZULUAGA FLOREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 2.566.666,67	4/12/2025	10/12/2025	23/12/2025
2025	3540	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JENITH KATHERINE	DUARTE GALVIS	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.933.333,33	10/11/2025	28/11/2025	19/12/2025
2025	3541	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANGIE NATALIA	GIL MARTINEZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 3.300.000,00	13/11/2025	28/11/2025	19/12/2025

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2025	3553	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FEDERICO	ARIAS GARCIA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.400.000,00	18/11/2025	28/11/2025	19/12/2025
2025	3578	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	RICARDO	BLANCO PEÑA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE MAQUINARIA AMARILLA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	\$ 2.240.000,00	12/11/2025	28/11/2025	18/12/2025
2025	3612	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JULIETH	BOLAÑOS BARANDICA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 3.850.000,00	13/11/2025	29/11/2025	19/12/2025
2025	3617	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OMAR	BALLESTEROS BUENO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TOPOGRAFO PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 2.700.000,00	3/12/2025	9/12/2025	26/12/2025
2025	3622	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MIGUEL ANTONIO	HERRERA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 1.750.000,00	11/11/2025	29/11/2025	19/12/2025
2025	3623	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EDUARDO	TORRES QUINTANA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TOPOGRAFO PARA APOYAR LA PLANEACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.700.000,00	3/12/2025	9/12/2025	26/12/2025
2025	3639	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	RAFAEL	ROJAS PEÑA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 3.850.000,00	5/11/2025	29/11/2025	19/12/2025
2025	3694	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LIZETH JOHANA	BAYONA GONZALEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA APOYAR EL ÁREA DE BANCO DE PROYECTOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 3.483.333,33	5/11/2025	1/12/2025	19/12/2025
2025	3735	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOHN JEFFERSON	MORENO RODRIGUEZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR APOYO AL SEGUIMIENTO Y RESPUESTA OPORTUNA DE LAS PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 1.200.000,00	26/11/2025	17/12/2025	25/12/2025
2025	3757	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	KAREN JULIETH	GUALDRON CHAPARRO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 3.850.000,00	13/11/2025	3/12/2025	23/12/2025
2025	3758	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	VICTOR ELIAS	MENESES AGRESOTH	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL AREA DE EQUIPAMIENTO URBANO EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 4.400.000,00	28/11/2025	3/12/2025	26/12/2025
2025	3792	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANDRES FELIPE	DUEÑAS SANCHEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA APOYAR EL ÁREA DE BANCO DE PROYECTOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.850.000,00	13/11/2025	5/12/2025	25/12/2025

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2025	3798	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DAVID CAMILO	FLOREZ CORDOBA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 1.283.333,33	10/12/2025	19/12/2025	25/12/2025
2025	3807	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIEGO FERNANDO	RAMIREZ SARMIENTO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 4.216.666,67	1/12/2025	4/12/2025	26/12/2025
2025	3808	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SILVIA JULIANA	SUAREZ SARQUEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA	\$ 2.100.000,00	29/10/2025	4/09/2025	12/12/2025
2025	3808	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SILVIA JULIANA	SUAREZ SARQUEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA	\$ 3.266.666,67	19/11/2025	13/12/2025	26/12/2025
2025	3819	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA FERNANDA	SUAREZ ESTEBAN	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 2.566.666,67	3/12/2025	13/12/2025	26/12/2025
2025	3826	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANDRES ORLANDO	RODRIGUEZ PINEDA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 4.216.666,67	26/11/2025	4/12/2025	26/12/2025
2025	3933	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE ALEJANDRO	SANDOVAL MEDINA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 3.116.666,67	3/12/2025	10/12/2025	26/12/2025
2025	4003	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARLY YOLIMA	ARDILA MANTILLA	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA APOYAR EL AREA DE BANCO DE PROYECTOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 2.750.000,00	18/11/2025	12/12/2025	26/12/2025
2025	4086	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EDSON ALBERTO	ACEVEDO BAUTISTA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 1.833.333,33	4/12/2025	16/12/2025	25/12/2025
2025	4153	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CARMEN ELISA	LEON PATIÑO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 1.500.000,00	17/12/2025	18/12/2025	26/12/2025
2025	4288	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA CAMILA	PICO MENDEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE DEFENSA JUDICIAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 1.800.000,00	4/12/2025	14/12/2025	25/12/2025
2025	4358	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JESUS DAVID	MARTINEZ SEPULVEDA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE DISEÑO, PLANOS Y PROYECCIONES EN LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.000.000,00	5/12/2025	16/12/2025	25/12/2025

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2025	4409	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	GERMAN YESID	PEÑA RUEDA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN DENTRO DE SUS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 1.666.666,67	27/11/2025	1/10/2025	20/12/2025
2025	4409	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	GERMAN YESID	PEÑA RUEDA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN DENTRO DE SUS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 2.833.333,33	18/12/2025	21/12/2025	30/12/2025
2025	4410	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FABIO ALEXANDER	MOLANO SILVA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR PUBLICO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTUALES EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS.	\$ 750.000,00	3/12/2025	22/12/2025	26/12/2025
2025	4428	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JAVIER DARIO	CORREA OVIEDO	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 16.000.000,00	1/10/2025	6/10/2025	25/12/2025
2025	4447	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JULIO CESAR	CONTRERAS GUERRERO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 10.000.000,00	2/10/2025	6/10/2025	20/12/2025
2025	4454	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	RAFAEL ANDRES	HINESTROZA MARTINEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACION PUBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA	\$ 16.000.000,00	7/10/2025	8/10/2025	27/12/2025
2025	4455	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CARLOS	GARCES MUÑOZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 5.000.000,00	7/10/2025	8/10/2025	22/12/2025
2025	4461	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JAMES FERNANDO	AGUIRRE HERNANDEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS, PROCESOS Y CONVENIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA	\$ 13.750.000,00	7/10/2025	8/10/2025	22/12/2025
2025	4496	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	IVAN ALONSO	FONSECA GUALDRON	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 11.000.000,00	15/10/2025	16/10/2025	15/12/2025
2025	4510	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ELVER DANILO	FUQUENE RINCON	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN DENTRO DE SUS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 12.000.000,00	21/10/2025	22/10/2025	30/12/2025

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2025	4510	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ELVER DANILO	FUQUENE RINCON	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN DENTRO DE SUS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 1.800.000,00	18/12/2025	22/12/2025	30/12/2025
2025	4532	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HECTOR ALFONSO	RODRIGUEZ GARNICA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 11.000.000,00	23/10/2025	24/10/2025	23/12/2025
2025	4624	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANGIE PAOLA	GOMEZ SEPULVEDA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 3.150.000,00	3/12/2025	4/12/2025	24/12/2025
