

# INFORME DE OBRAS PÚBLICAS CUARTO TRIMESTRE



TRANSPARENCIA  
BUCARAMANGA  
#BGA+TRANSPARENTE



ALCALDÍA DE  
BUCARAMANGA  
Municipio de Bucaramanga



Construcción Social,  
Transparencia y Dignidad



Comprometidos con los principios de **Transparencia y Acceso a la Información Pública**, el Gobierno de los Ciudadanos y las Ciudadanas entrega su **cuarto Informe de Obras Públicas** con corte a **31 de diciembre de 2018**. En esta versión encontrará información sobre la ejecución contractual de las obras públicas a cargo de la Administración Central de acuerdo a su avance de ejecución durante el **cuarto trimestre de 2018**. Las inversiones reportadas suman más de **171.236'463.200** en las obras financiadas por el Municipio, que con respecto al trimestre anterior, hay **13 mil millones más en ejecución**.

El informe consta de una primera parte informativa donde el ciudadano y los interesados encontrarán toda la información resumida y clasificada por porcentaje de avance correspondiente a las obras a cargo de la Administración Central. En seguida, se presenta la información de las obras gestionadas por la Alcaldía con la participación en la ejecución de las obras de más actores como el Gobierno Nacional, la Gobernación, privados y entidades descentralizadas.

Por último, se exponen otras herramientas de seguimiento como lo son el **Mapa de Obras Públicas** y la **Galería de Obras Antes-Ahora**.

INFORME DE  
**OBRAS PÚBLICAS**  
CUARTO TRIMESTRE



TRANSPARENCIA  
**BUCARAMANGA**  
#BGA+TRANSPARENTE



ALCALDÍA DE  
**BUCARAMANGA**  
Municipio de Bucaramanga



Construcción Social,  
Transparencia y Dignidad



# INTRODUCCIÓN

El siguiente informe es el producto del seguimiento constante a las obras públicas en ejecución por parte de la Alcaldía de Bucaramanga con el fin de garantizar que la ejecución de las obras públicas se de en el marco de la transparencia y la eficacia. Durante el periodo comprendido entre octubre al 31 de diciembre de 2018, la Administración municipal tuvo a su cargo el desarrollo de 44 contratos para la ejecución de obras públicas a cargo de la Secretaría de Infraestructura y la Oficina de Alumbrado Público. **Con una inversión de más de 32.000 millones se entregó a la ciudadanía parques y zonas verdes renovados; gracias a la instalación de prado japonés, la dotación de luminarias LED para 11 comunas, el alumbrado público nuevo para el Barrio Ciudad Bolívar y la inversión en infraestructura vial urbana; gracias a la construcción de 22 placa huellas.** Cabe desatacar que en este lapso de tiempo también continuaron las obras de construcción de aulas para la Jornada Única en La Escuela la Normal; obra muy avanzada, y en la I.E Santa María Goretti, prácticamente terminada. Adicionalmente, encontramos obras por encima del 90%, como: el Intercambiador Vial del Mesón de los Bucaros, la construcción de los 13 ambientes de transición, 22 escenarios deportivos repotenciados y el mantenimiento del alumbrado público de la ciudad.





# OBRAS ENTREGADAS 100%



Placa huella – Vereda Retiro Grande



Placa huella – Vereda Los Santos



Mantenimiento parques - EMAB

INFORME DE OBRAS PUBLICAS CUARTO TRIMESTRE



Construcción Social, Transparencia y Dignidad

# OBRAS ENTREGADAS 100%

OBRAS CON EL 100%								
Comuna	Barrio	Nombre	Valor inicial	Valor adicional	Porcentaje adicional	Plazo inicial	Plazo adicional	Inversión total
7-Ciudadela	Ciudad Bolívar	Alumbrado Ciudad Bolívar	2.176.343.155	0.0	0.0%	4 meses	1 mes 15 días	<b>2.176.343.156</b>
Toda la ciudad	Toda la ciudad	Mantenimiento de Parques	4.241.198.080	0.0	0.0%	11 meses		<b>4.241.198.080</b>
Toda la ciudad	Toda la ciudad	Sistemas de riego de parques y zonas verdes	251.100.819	0.0	0.0%	8 meses	2 meses	<b>251.100.819</b>
Correg. 1	V. San Cayetano	Placa Huellas San Cayetano	1.250.571.151	400.000.000	32.0%	3 meses	1 mes	<b>1.650.571.151</b>
Correg. 1	V. Santa Rita	Placa Huellas Santa Rita						
Correg. 1	V. El Aburrido	Placa Huellas El Aburrido						
Correg. 1	V. San Pedro	Placa Huellas Verada San Pedro Alto						
Correg. 1	V. La Sabana	Placa Huellas Verada La Sabana PP 2016						
Correg. 1	V. Angelinos	Placa Huellas Vereda Angelinos (Bosconia) PP 2016						
Correg. 1	V. Angelinos	Placa Huellas Vereda Angelinos La Cemento PP 2016						
Correg. 1	V. La Esmeralda	Placa Huellas Vereda La Esmeralda PP 2017						
Correg. 2	V. Capilla Alta	Placa Huellas Vereda Capilla Alta						
Correg. 2	V. Magueyes	Placa Huellas Vereda Magueyes						
Correg. 2	V. Bolarqui Alto	Placa Huellas Vereda Bolarqui Alto						
Correg. 2	V. Los Santos	Placa Huellas Vereda Los Santos PP 2017						
Correg. 3	V. San Jose	Placa Huellas Vereda San Jose via Los Leones						
Correg. 3	V. Retiro Grande	Placa Huellas Vereda Retiro Grande						
Correg. 3	V. La Malaña	Placa Huellas PAVIMENTO Vereda La Malaña PP 2016						
Correg. 3	V. El Pedregal	Placa Huellas Vereda El Pedregal PP 2017						
Correg. 3	V. Gualilo Alto	Placa Huellas PAVIMENTO Vereda Gualilo Alto PP 2017						
Correg. 3	V. Retiro Chiquito	Placa Huellas Vereda Retiro Chiquito PP 2017						
Toda la ciudad	Toda la ciudad	Suministro luminarias LED	23.725.301.046	0.0	0.0%	5 meses		<b>23.725.301.046</b>
7-Ciudadela	Ciudadela Real de Minas	Espacio Público Goretti	145.885.800	0.0	0.0%	2 meses		<b>145.885.800</b>
<b>TOTAL</b>			<b>31.790.400.052</b>	<b>400.000.000</b>				<b>32.190.400.052</b>





# OBRAS ENTRE EL 76% - 99%



Ambiente de transición - Club Unión Sede E



Intercambiador Mesón de los Bucaros



Cancha Parque Los Leones

INFORME DE  
OBRAS PÚBLICAS  
CUARTO TRIMESTRE



Construcción Social,  
Transparencia y Dignidad

# OBRAS ENTRE EL 76% - 99%

OBRAS ENTRE EL 76% - 99%								
Comuna	Barrio	Nombre	Valor inicial	Valor adicional	Porcentaje adicional	Plazo inicial	Plazo adicional	Inversión total
Toda la ciudad	Toda la ciudad	Mantenimiento Alumbrado Público-Grupo 1	810.496.307.5	333.734.795.0	41.2%	12 meses	5 meses 13 días	<b>1.144.231.102.5</b>
Toda la ciudad	Toda la ciudad	Mantenimiento Alumbrado Público-Grupo 2	671.856.316.6	306.254.504.3	45.6%	12 meses	5 meses 14 días	<b>978.110.820.8</b>
Toda la ciudad	Toda la ciudad	Mantenimiento Alumbrado Público-Grupo 3	922.025.613.6	294.908.757.2	32.0%	12 meses	5 meses 13 días	<b>1.216.934.370.8</b>
3-San Francisco	San Francisco	Intercambiador Vial Mesón de los Bucaros	54.909.500.000.0	28.347.108.022	51.6%*	14 meses	25 meses	<b>83.256.608.022.0</b>
13-Oriental	Álvarez Las Américas	Cubierta Plaza Guarín	585.620.639.0	0.0	0.0%	45 días	84 días	<b>585.620.639.0</b>
1-Norte	Altos del Progreso	Escenarios deportivos Altos del Progreso	79.247.777.10	95.470.784.0	11.2%	4 meses	1 mes	<b>946.555.004.5</b>
1-Norte	Campo Madrid	Escenarios deportivos Campo Madrid	222.226.760.74					
17-Mutis	Monterredondo	Escenarios deportivos Monterredondo	189.191.194.87					
17-Mutis	Brisas del Mutis	Escenarios deportivos Brisas del Mutis	119.460.396.81					
1-Norte	Kennedy	Escenarios deportivos Kennedy	140.608.476.64					
8-Suboccidente	Bucaramanga	Escenarios deportivos Bucaramanga 2	100.349.614.31					
13-Oriental	Antonia Santos	Escenarios deportivo Antonia Santos	255.202.380.02	137.741.245.0	15.1%	4 meses	1 mes	<b>1.050.581.507.8</b>
13-Oriental	Álvarez Las Américas	Escenarios deportivos Álvarez	92.355.614.90					
12-Cabecera del Llano	Cabecera del Llano	Escenarios deportivos Parque de Los Leones	106.942.317.28					
12-Cabecera del Llano	La Floresta	Escenarios deportivos La Floresta	80.320.190.05					
16-Lagos del Cacique	Hacienda San Juan	Escenarios deportivos Hacienda San Juan	43.662.138.55					
6-La Concordia	Candiles	Escenarios deportivos Candiles	76.988.756.90					
8-Suboccidente	Canelos	Escenarios deportivos Canelos	75.565.130.53					
8-Suboccidente	San Gerardo	Escenarios deportivos San Gerardo	85.830.739.79					
4-Occidental	Santander	Escenarios deportivos Santander	95.972.994.80					

\*(El valor no supera el tope por ley del valor del contrato representado en SMLV, siendo el tope en valor adicional 44.569 SMLV. Con el tercer adicional en valor se han sumado 43.161 SMLV )



# OBRAS ENTRE EL 76% - 99%

1-Norte	Colorados	Ambientes de transición Club Unión Sede C	441.300.921.64	217.395.070.0	49.3%	4 meses	658.695.991.6
1-Norte	Café Madrid	Ambientes de transición Club Unión Sede E					
1-Norte	Villa Rosa	Ambientes de transición Santo Ángel					
1-Norte	Claveriano	Ambientes de transición Claveriano Fe y Alegría					
1-Norte	María Paz	Ambientes de transición Gustavo Cote Uribe	336.328.888.89	168.142.610.0	50.0%	4 meses	504.471.498.9
2-Nororiental	La Juventud	Ambientes de transición La Juventud					
4-Occidental	José Antonio Galán	Ambientes de transición Campo Hermoso Sede C					
13-Oriental	San Alonso	Ambientes de transición Damáso Zapata Sede D	744.233.836.04	312.153.460.0	41.9%	4 meses	1.056.387.296.0
2-Nororiental	Independencia	Ambientes de transición Santander Sede D					
13-Oriental	Álvarez Las Américas	Ambientes de transición Las Américas					
<b>TOTAL</b>			<b>61.185.287.006.5</b>	<b>30.212.909.247.5</b>			<b>91.398.196.254.0</b>



# OBRAS ENTRE EL 51% - 75%

Club de tenis - Parque de Los Niños



Ludoteca Café Madrid



Centro de salud Café Madrid

INFORME DE  
OBRAS PUBLICAS  
CUARTO TRIMESTRE



ALCALDÍA DE  
BUCARAMANGA  
Municipio de Bucaramanga



Construcción Social,  
Transparencia y Dignidad

# OBRAS ENTRE EL 51% - 75%

OBRAS ENTRE EL 51% - 75%								
Comuna	Barrio	Nombre	Valor inicial	Valor adicional	Porcentaje adicional	Plazo inicial	Plazo adicional	Inversión total
1-Norte	Café Madrid	Centro de Salud Café Madrid	1.598.565.682.8	759.317.216.4	47.5%	6 meses	3 meses	2.357.882.899.2
1-Norte	Café Madrid	Ludoteca Café Madrid	1.254.823.459.7	607.576.566.0	48.4%	8 meses	1 mes 19 días	1.862.400.025.7
13-Oriental	Antonia Santos	Cancha de Tenis Parque de los Niños	2.359.817.188.4	0.0	0.0%	5 meses		2.359.817.188.4
Toda la ciudad	Toda la ciudad	Mantenimiento de Malla Vial Urbana	2.746.373.202.0	0.0	0.0%	4 meses		2.746.373.202.0
1-Norte	Villas de San Ignacio-Bavaria	Alumbrado Público Parque Lineal Río de Oro	965.458.895	0.0	0.0%	4 meses		965.458.895.0
Todos los corregimientos	Todos los corregimientos	Expansión Alumbrado Público en Zonas Rurales	892.917.138.0	0.0	0.0%	3 meses		892.917.138.0
Toda la ciudad	Toda la ciudad	Espacio público cumplimiento de acciones judiciales	329.808.266.0	0.0	0.0%	3 meses		329.808.266.0
<b>TOTAL</b>			<b>10.147.763.831.9</b>	<b>1.366.893.782.4</b>				<b>11.514.657.614.3</b>



# OBRAS ENTRE EL 25% - 50%



Repotenciación - Parque La Flora



Cancha Sintética INEM



Cancha Tejar Norte

INFORME DE  
OBRAS PUBLICAS  
CUARTO TRIMESTRE



Construcción Social,  
Transparencia y Dignidad

# OBRAS ENTRE EL 25% - 50%

OBRAS ENTRE EL 25% - 50%								
Comuna	Barrio	Nombre	Valor inicial	Valor adicional	Porcentaje adicional	Plazo inicial	Plazo adicional	Inversión total
13-Oriental	Álvarez Las Américas	Parque La Ceiba	3.185.372.854.8	0	0%	3 meses 15 d		<b>3.185.372.854.8</b>
12-Cabecera del Llano	La Floresta	Parque La Flora (juegos, gimnasios y senderos)	2.546.957.564.76	0	0%	3 meses 15 d		<b>2.546.957.564.8</b>
10-Provenza	Granjas de Provenza	Parque Granjas de Provenza	2.221.897.961.1	0	0%	3 meses 15 d		<b>2.221.897.961.1</b>
11-Sur	Dangond	Parque Deportivo Dangond	1.804.896.749.55	0	0%	5 meses		<b>1.804.896.749.5</b>
4-Occidental	Nápoles	Parque Deportivo Nápoles	1.310.604.460.47	0	0%	5 meses		<b>1.310.604.460.5</b>
12-Cabecera del Llano	Los Cedros	Parque Deportivo Pan de Azúcar	1.304.975.930.68	0	0%	5 meses		<b>1.304.975.930.7</b>
11-Sur	Jardines de Coaviconsá	Parque Deportivo Coaviconsá	1.093.831.780.87	0	0%	5 meses		<b>1.093.831.780.9</b>
1-Norte	Betania-Tejar Norte	Parque Deportivo Tejar Norte (cancha sintética)	787.841.949.85	0	0%	5 meses		<b>787.841.949.9</b>
6-La Concordia	La Concordia	Parque Deportivo La Concordia	586.516.576.17	0	0%	5 meses		<b>586.516.576.2</b>
2-Nororiental	Esperanza II	Parque Deportivo Esperanza II	494.548.972.79	0	0%	5 meses		<b>494.548.972.8</b>
5-García Rovira	Alfonso López	Parque Deportivo Alfonso López	463.880.000.28	0	0%	5 meses		<b>463.880.000.3</b>
2-Nororiental	Esperanza I	Repotenciación IE Promoción Social Sede C Grupo 1	1.573.977.075.78	0	0%	4 meses		<b>1.573.977.075.78</b>
2-Nororiental	Transición	Repotenciación IE Promoción Social Sede D Grupo 1						
1-Norte	Kennedy	Repotenciación IE Maiporé sede C Grupo 3	1.454.009.727.20	0	0%	4 meses		<b>1.454.009.727.20</b>
1-Norte	Olas Bajas	Repotenciación IE Club Unión Sede D Grupo 3						
Correg. 1	Vereda el Paulon	Repotenciación IE Rural Paulón Grupo 4	1.386.169.767.87	0	0%	4 meses		<b>1.386.169.767.9</b>
15- Centro	García Rovira	Mantenimiento Comando de Policía Metropolitano de Bucaramanga	1.203.940.390.46	0	0%	3 meses		<b>1.203.940.390.46</b>
10-Provenza	Fontana	Cancha sintética INEM	2.738.806.431.2	0	0%	1 mes 15 días		<b>2.738.806.431.2</b>
<b>TOTAL</b>			<b>24.158.228.193.8</b>					<b>24.158.228.193.8</b>





# OBRAS ENTRE EL 0% - 24%



Repotenciación - Colegio Aurelio Martínez



Mantenimiento - Aurelio Martínez Sede B



Plazoleta Los Edecanes

INFORME DE  
OBRAS PUBLICAS  
CUARTO TRIMESTRE



ALCALDÍA DE  
BUCARAMANGA  
Municipio de Bucaramanga



Construcción Social,  
Transparencia y Dignidad

# OBRAS ENTRE EL 0% - 24%

OBRAS ENTRE EL 0% - 24%								
Comuna	Barrio	Nombre	Valor inicial	Valor adicional	Porcentaje adicional	Plazo inicial	Plazo adicional	Inversión total
13-Oriental	Álvarez Las Américas	Mantenimiento Colegio Bicentenario Sede B	1.524.762.067.4	0.0	0%	2 meses 15 días		<b>1.524.762.067</b>
6-La Concordia	La Victoria	Mantenimiento Colegio Aurelio M. Mutis	1.033.961.744.4	0.0	0%	2 meses 15 días		<b>1.033.961.744</b>
1-Norte	Kennedy	Mantenimiento Colegio Maipore Sede B						
11-Sur	El Rocío	Mantenimiento Colegio INEM Sede B	924.175.430.9	0.0	0%	2 meses 15 días		<b>924.175.431</b>
6-La Concordia	Ricaurte	Mantenimiento Colegio Aurelio M. Mutis Sede B						
6-La Concordia	La Ceiba	Mantenimiento Colegio Santa María Goretti Sede						
17-Mutis	Mutis	Mantenimiento Colegio José Celestino Mutis						
5-García Rovira	La Joya	Mantenimiento Colegio Andres Paez de Sotomayor	881.067.523.0	0.0	0%	2 meses 15 días		<b>881.067.523</b>
4-Occidental	Granada	Mantenimiento Colegio Politecnico Sede B						
3-San Francisco	San Rafael	Mantenimiento Colegio Club Union Sede A	882.682.552.2	0.0	0%	2 meses 15 días		<b>882.682.552</b>
3-San Francisco	Norte Bajo	Mantenimiento Colegio Club Union Sede B						
Correg. 1	Vijagual	Mantenimiento Colegio Vigajual Sede A						
3-San Francisco	Universidad	Mantenimiento Colegio Santander Sede A						
2-Nororiental	La Juventud	Mantenimiento Colegio La Juventud Sede A	873.439.183.0	0.0	0%	2 meses 15 días		<b>873.439.183</b>
Correg. 2	Vereda Bolarqui	Mantenimiento Colegio Bosconia Bolarquí Sede D						
Correg. 2	Vereda Cuchilla Alta	Mantenimiento Colegio Bosconia Cuchilla Alta						



# OBRAS ENTRE EL 0% - 24%

6-La Concordia	La Concordia	Repotenciación IE Jorge Ardila Duarte Grupo 2	1.512.077.835	0.0	0%	4 meses		1.512.077.836
7-Ciudadela	Ciudadela Real de Minas	Repotenciación IE Aurelio Martínez Mutis Grupo 2						
15-Centro	Centro	Parque Los Edecanes	1.223.767.860	0.0	0%	2 meses		1.223.767.860
Toda la ciudad	Toda la ciudad	Andenes. pasamano y escaleras	1.343.937.014	0.0	0%	3 meses		1.343.937.015
10-Provenza. 5-García Rovira. 14-Morrórico. 3-San Francisco. 1-Norte y 2-Nororiental	Fontana. La Joya. Morrórico. Universidad. Café Madrid y Transición	Mantenimiento y adecuación de los puntos Vive Digital INEM. La Joya. Morrórico. Colegio Santander. Café Madrid. Promoción Social y Colegio Tecnológico Dámaso Zapata	134.148.150	0.0	0%	3 meses		134.148.151
9-La Pedregosa	Diamante I	Juegos infantiles. gimnasios y escenarios deportivos Diamante I	865.122.208	0.0	0%	3 meses		865.122.208
9-La Pedregosa	La Libertad	Juegos infantiles. gimnasios y escenarios deportivos La Libertad						
16-Lagos del Cacique	Altos del Cacique	Juegos infantiles. gimnasios y escenarios deportivos Altos del Cacique						
8-Suboccidente	20 de Julio	Juegos infantiles. gimnasios y escenarios deportivos 20 de Julio						
16-Lagos del Cacique	Bosques del Cacique	Juegos infantiles. gimnasios y escenarios deportivos Bosques del Cacique						
1-Norte	Villa Rosa	Juegos infantiles. gimnasios y escenarios deportivos Villa Rosa	775.839.494	0.0	0%	3 meses		775.839.495
4-Occidental	Girardot	Juegos infantiles. gimnasios y escenarios deportivos Girardot						
5-García Rovira	La Ceiba	Juegos infantiles. gimnasios y escenarios deportivos La Ceiba						
17-Mutis	Brisas del Mutis	Juegos infantiles. gimnasios y escenarios deportivos Brisas del Mutis						
2-Nororiental	Villa Helena II	Juegos infantiles. gimnasios y escenarios deportivos Villa Helena 2						
<b>TOTAL</b>			<b>11.974.981.066</b>					<b>11.974.981.066</b>

# OBRAS GESTIONADAS POR EL MUNICIPIO



TRANSPARENCIA  
BUCARAMANGA  
#BGA+TRANSPARENTE




Construcción Social,  
Transparencia y Dignidad

Centro de Convenciones



Teatro Santander

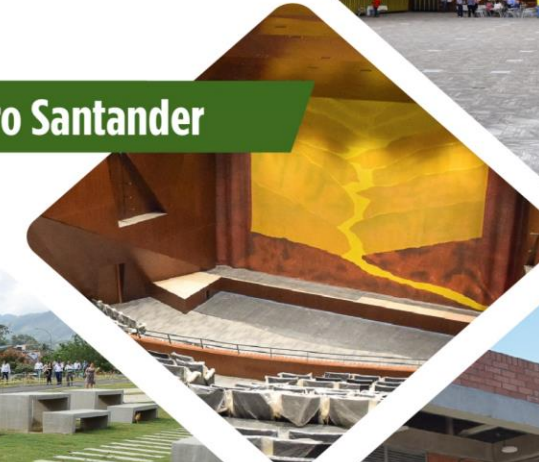

Teatrino Verde - San Martín



Parque Lineal Río de Oro



Santa María Goretti





# OBRAS ENTRE EL 76% - 99%

Escuela La Normal



Neomundo



Teatro Santander



INFORME DE  
OBRAS PÚBLICAS  
CUARTO TRIMESTRE



ALCALDÍA DE  
BUCARAMANGA  
Municipio de Bucaramanga



Construcción Social,  
Transparencia y Dignidad

# OBRAS ENTRE EL 76% - 99%

OBRAS ENTRE EL 76% - 99%								
Comuna	Barrio	Nombre	Inversión total	Aportes del Municipio	Plazo inicial	Plazo adicional	Fecha estimada de entrega	Entidad contratante
16-Lagos del Cacique	Guayacanes	Construcción Centro de Convenciones Neomundo	76.840.000.000	28.590.000.000 (37.2%)	20 meses	20 meses	2019	FONTUR
15-Centro	Centro	Recuperación Teatro Santander	24.749.000.000	6.749.000.000 (27%)	6 meses	4 meses	2019	Fundación Teatro Santander
6-La Concordia	La Victoria	Santa María Goretti Jornada Única	5.356.115.183	2.588.115.183 (48.3%)	12 meses		1er Trimestre 2019	FFIE
13-Oriental	La Aurora	Escuela La Normal Jornada Única	11.300.206.459	5.961.206.459 (52.8%)	12 meses		1er Trimestre 2019	FFIE
1-Norte	Villas de San Ignacio-Bavaria	Parque Lineal Río de Oro	9.313.550.075	Alumbrado público	10 meses	20 días	1er Trimestre 2019	AMB
11-Sur	El Porvenir	Parque Contemplativo El Carrasco	2.954.987.951	Alumbrado público	6 meses		1er Trimestre 2019	AMB
<b>TOTAL</b>			<b>130.513.859.669</b>					



# OBRAS ENTRE EL 51% - 75%



Teatrino Verde - San Martín

INFORME DE  
OBRAS PÚBLICAS  
CUARTO TRIMESTRE



Construcción Social,  
Transparencia y Dignidad

# OBRAS ENTRE EL 51% - 75%

OBRAS ENTRE EL 51% - 75%								
Comuna	Barrio	Nombre	Valor total	Aportes del Municipio	Plazo inicial	Plazo adicional	Fecha estimada de entrega	Entidad contratante
9-La Pedregosa	San Martín	Teatro Verde San Martín	\$ 855.220.018	Predio	2 meses 23 días		23 de febrero de 2019	AMB
5-García Rovira	Campo Hermoso	Retazo Campo Hermoso - Obelisco	\$ 378.221.358	Permiso uso del predio	3 meses		1er Trimestre 2019	AMB
1-Norte	Café Madrid	Retazo Café Madrid	\$ 269.539.382	Permiso uso del predio	3 meses		1er Trimestre 2019	AMB
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 1.502.980.759</b>					





# OBRAS ENTRE EL 25% - 50%

Portal Piedecuesta Metrolínea

Portal Norte Metrolínea

OBRAS PÚBLICAS  
CUARTO TRIMESTRE

INFORME DE



Construcción Social,  
Transparencia y Dignidad




# OBRAS ENTRE EL 25% - 50%

OBRAS ENTRE EL 25% - 50%								
Comuna	Barrio	Nombre	Valor total	Aportes del Municipio	Plazo inicial	Plazo adicional	Fecha estimada de entrega	Entidad contratante
Piedecuesta	Piedecuesta	Portal Piedecuesta Metrolínea	32,336,405,603.0	Gestión	18 meses		Septiembre de 2019	Metrolínea
1-Norte	Miramar	Portal Norte Metrolínea	31,824,861,249.0	Gestión	18 meses		Septiembre de 2019	Metrolínea
TOTAL			64,161,266,852.0					





# Mapa de Obras Públicas

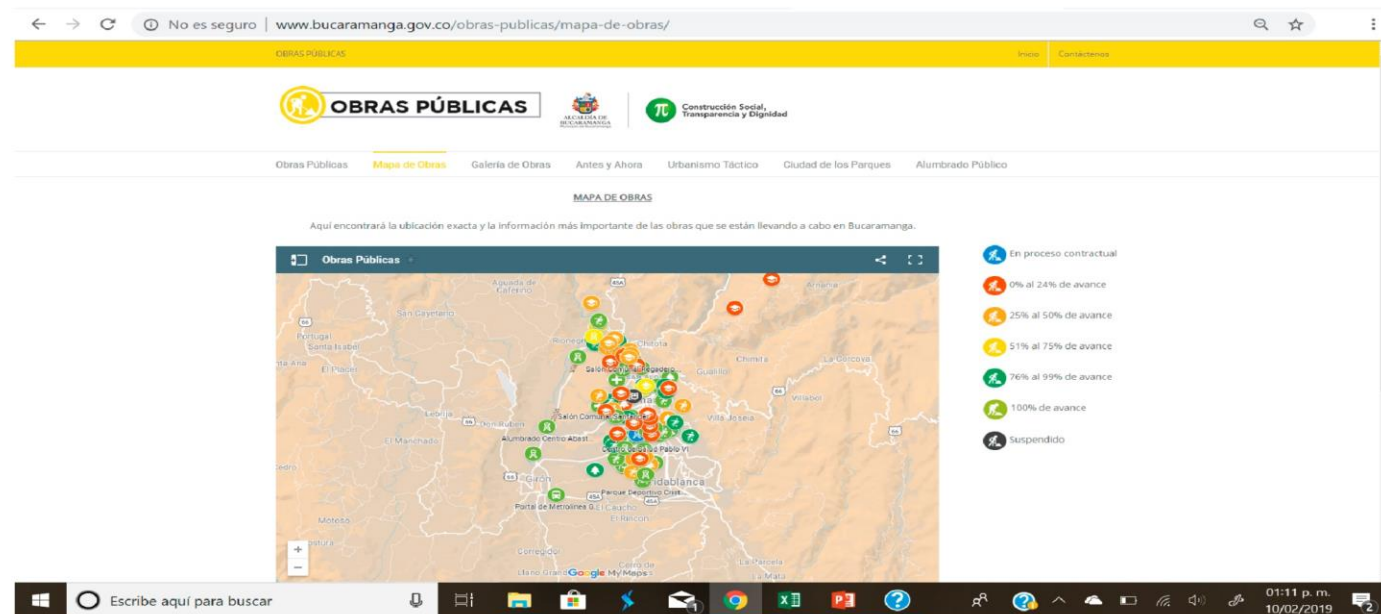

Para consultar información georreferenciada sobre las intervenciones de obra pública adelantadas por la Alcaldía Municipal, el gobierno de los ciudadanos ha dispuesto la herramienta Mapa de Obras Públicas en la sección obras públicas de la página web del Municipio. Aquí podrá encontrar la ubicación exacta, el monto invertido, el porcentaje de avance, entre otras, de las intervenciones en infraestructura. Además, desde el mapa de obras podrá acceder directamente al Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP para obtener mayor información sobre la ejecución contractual. La actualización de esta sección se realiza mensualmente. Enlace del Mapa de Obras Públicas: <http://www.bucaramanga.gov.co/obras-publicas/mapa-de-obras/>

INFORME DE  
OBRAS PÚBLICAS  
CUARTO TRIMESTRE



TRANSPARENCIA  
BUCARAMANGA  
#BGA+TRANSPARENTE



ALCALDÍA DE  
BUCARAMANGA  
Municipio de Bucaramanga



Construcción Social,  
Transparencia y Dignidad

# Galería de Obras Públicas



Contiene las fotos sobre las intervenciones de obras adelantadas por el Municipio. En estas secciones podrá encontrar imágenes que permiten apreciar la transformación de los sectores intervenidos: el antes, el durante y el ahora.

Antes y ahora: <http://www.bucaramanga.gov.co/obras-publicas/antes-y-ahora/>

Galería de obras: <http://www.bucaramanga.gov.co/obras-publicas/galeria-de-obras/>

INFORME DE  
OBRAS PÚBLICAS  
CUARTO TRIMESTRE



TRANSPARENCIA  
BUCARAMANGA  
#BGA+TRANSPARENTE



ALCALDÍA DE  
BUCARAMANGA  
Municipio de Bucaramanga



Construcción Social,  
Transparencia y Dignidad
