

INFORME DE OBRAS PÚBLICAS PRIMER TRIMESTRE - 2019




TRANSPARENCIA
BUCARAMANGA
#BGA+TRANSPARENTE



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad

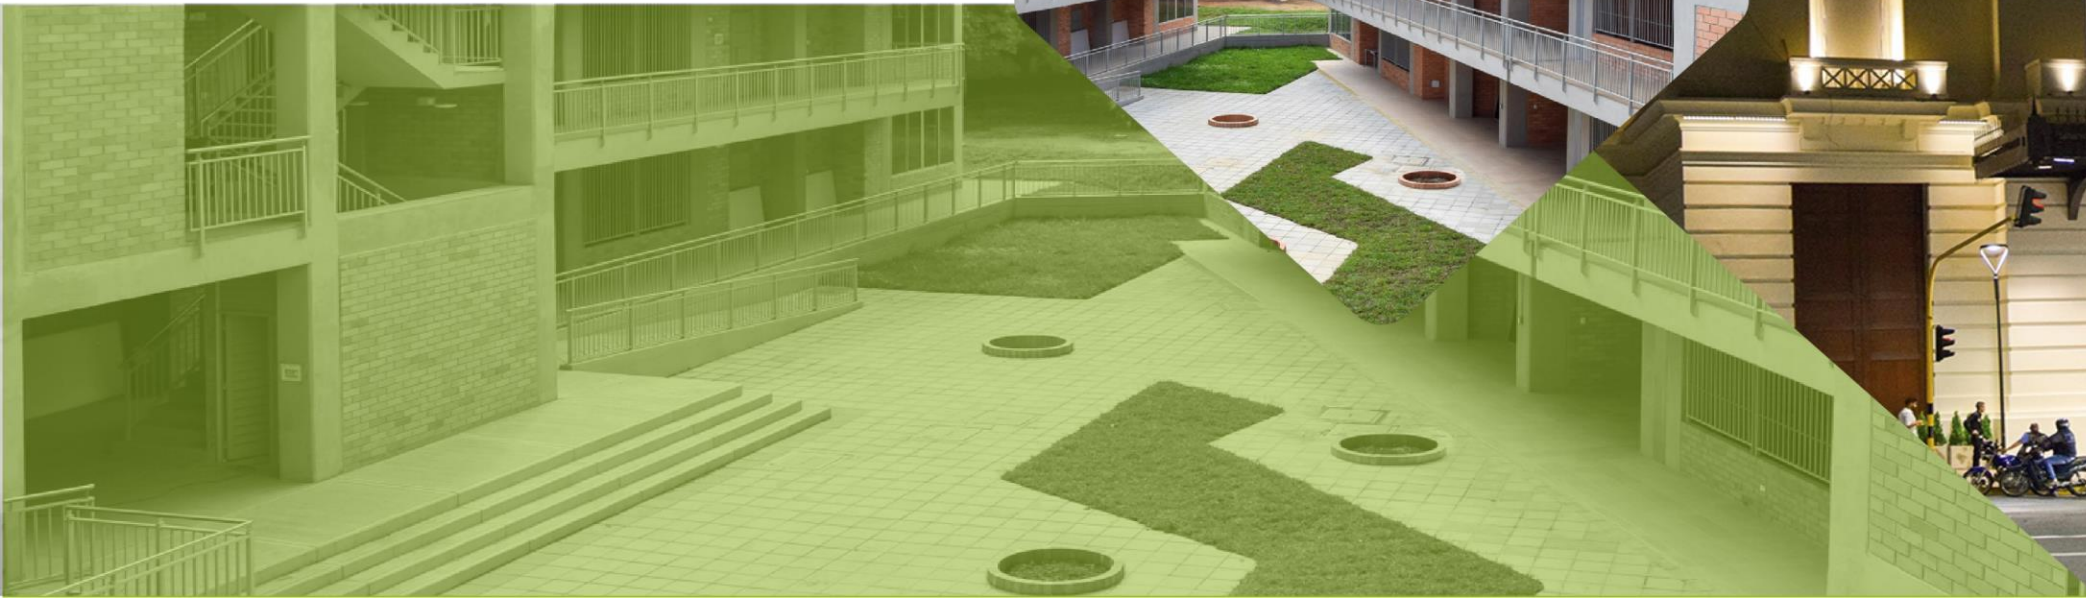

Comprometidos con los principios de **Transparencia y Acceso a la Información Pública**, el Gobierno de los Ciudadanos y las Ciudadanas entrega su **primer Informe de Obras Públicas de la vigencia 2019** con corte a **31 de marzo**. En esta versión encontrará información sobre la ejecución contractual de las obras públicas a cargo de la Administración Central de acuerdo a su avance de ejecución durante el **cuarto trimestre de 2018**. Las inversiones reportadas suman más de **156.159.273.816,9** en las obras financiadas y ejecutadas por el **Municipio**. Es de resaltar que solo las obras de la instalación de luminarias en **11 comunas** del municipio tienen un porcentaje de ejecución menor al 25%.

El informe consta de una primera parte informativa donde el ciudadano y los interesados encontrarán toda la información resumida y clasificada por porcentaje de avance correspondiente a las obras a cargo de la Administración Central. En seguida, se presenta la información de las obras gestionadas por la Alcaldía con la participación en la ejecución de las obras de más actores como el Gobierno Nacional, la Gobernación, privados y entidades descentralizadas.

Por último, se exponen otras herramientas de seguimiento como lo son el **Mapa de Obras Públicas** y la **Galería de Obras Antes-Ahora**.

INFORME DE
OBRAS PÚBLICAS
CUARTO TRIMESTRE



TRANSPARENCIA
BUCARAMANGA
#BGA+TRANSPARENTE



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad

OBRAS ENTREGADAS 100%



Ambiente de transición Colegio Claverianos



Ambiente de transición Instituto Santo Angel

Cancha Parque Los Leones

INFORME DE
OBRAS PUBLICAS
PRIMER TRIMESTRE - 2019



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad

OBRAS ENTREGADAS 100%

OBRAS CON EL 100%

Comuna	Barrio	Nombre	Valor inicial	Valor adicional	Porcentaje adicional	Plazo inicial	Plazo adicional	Inversión total
Toda la ciudad	Toda la ciudad	Mantenimiento Alumbrado Público-Grupo 1	810.496.307,5	333.734.795,0	41,2%	12 meses	5 meses 13 d	1.144.231.102,54
Toda la ciudad	Toda la ciudad	Mantenimiento Alumbrado Público-Grupo 2	671.856.316,6	306.254.504,3	45,6%	12 meses	5 meses 14 d	978.110.820,84
Toda la ciudad	Toda la ciudad	Mantenimiento Alumbrado Público-Grupo 3	922.025.613,6	294.908.757,2	32,0%	12 meses	5 meses 13 d	1.216.934.370,75
Todos los corregimientos	Todos los corregimientos	Expansión alumbrado público en zonas rurales 2018	892.917.138,0	0,0	0,0%	3 meses		892.917.138
1-Norte	Altos del Progreso	Escenario Deportivo Altos del Progreso	79.247.777,1	45.958.009,9	58,0%	4 meses	1 mes	125.205.787
1-Norte	Campo Madrid	2 Escenario deportivos Campo Madrid	222.226.760,7	11.891.993,0	5,4%	4 meses	1 mes	234.118.754
17-Mutis	Monterredondo	2 Escenarios deportivos Monterredondo	189.191.194,9	13.265.374,5	7,0%	4 meses	1 mes	202.456.569
17-Mutis	Brisas del Mutis	2 Escenarios deportivos Brisas del Mutis	119.460.396,8	24.380.488,5	20,4%	4 meses	1 mes	143.840.885
1-Norte	Kennedy	Escenario deportivo Kennedy	140.608.476,6	0,0	0,0%	4 meses	1 mes	140.608.477
8-Suboccidente	Bucaramanga	Escenario deportivo Bucaramanga II	100.349.614,3	0,0	0,0%	4 meses	1 mes	100.349.614



OBRAS ENTREGADAS 100%

13-Oriental	Antonia Santos	3 Escenarios Deportivos Antonia Santos (parque de Los niños)	255.202.380,0	36.437.203,4	14,3%	4 meses	1 mes	291.639.583
13-Oriental	Álvarez Las Américas	Escenario deportivo Álvarez	92.355.614,9	0,0	0,0%	4 meses	1 mes	92.355.615
12-Cabecera del Llano	Cabecera del Llano	2 Escenarios deportivos Parque de Los Leones	106.942.317,3	18.379.081,9	17,2%	4 meses	1 mes	125.321.399
12-Cabecera del Llano	La Floresta	Escenario deportivo La Floresta	80.320.190,1	13.432.056,6	16,7%	4 meses	1 mes	93.752.247
16-Lagos del Cacique	Hacienda San Juan	Escenario deportivo Hacienda San Juan	43.662.138,6	0,0	0,0%	4 meses	1 mes	43.662.139
6-La Concordia	Candiles	Escenario deportivo Candiles	76.988.756,9	0,0	0,0%	4 meses	1 mes	76.988.757
8-Suboccidente	Canelos	Escenario deportivo Canelos	75.565.130,5	18.803.715,7	24,9%	4 meses	1 mes	94.368.846
8-Suboccidente	San Gerardo	Escenario deportivo San Gerardo	85.830.739,8	14.495.566,4	16,9%	4 meses	1 mes	100.326.306
4-Occidental	Santander	Escenario deportivo Santander	95.972.994,8	36.193.608,6	37,7%	4 meses	1 mes	132.166.603
1-Norte	Colorados	Ambientes de transición Club Unión Sede C	441.300.921,64	217.395.070,0	49,3%	4 meses	2 meses	658.695.991,6
1-Norte	Café Madrid	Ambientes de transición Club Unión Sede E						
1-Norte	Villa Rosa	Ambientes de transición Santo Ángel						
1-Norte	Claveriano	Ambientes de transición Claveriano Fe y Alegría						



OBRAS ENTREGADAS 100%

1-Norte	María Paz	Ambientes de transición Gustavo Cote Uribe						
2-Nororiental	La Juventud	Ambientes de transición La Juventud	336.328.888,89	168.142.610,0	50,0%	4 meses	2 meses	504.471.498,9
4-Occidental	José Antonio Galán	Ambientes de transición Campo Hermoso Sede C						
10-Provenza	Fontana	Punto Vive Digital INEM						
5-García Rovira	La Joya	Punto Vive Digital La Joya						
14-Morrórico	Morrórico	Punto Vive Digital Morrórico						
3-San Francisco	Universidad	Punto Vive Digital Colegio Santander	134.148.150,9	29.038.525,4	22%	58 días		134.148.150,9
1-Norte	Café Madrid	Punto Vive Digital Café Madrid						
2-Nororiental	Transición	Punto Vive Digital Promoción Social de						
3-San Francisco	Universidad	Punto Vive Digital Tecnológico Damazo Zapata						
11-Sur	El Rocio	Mantenimiento INEM Sede B Grupo 3						
6-La Concordia	Ricaurte	Mantenimiento Aurelio Sede B Grupo 3	924.175.430,9	98.013.529,0	11%	75 días	44 días	1.022.188.959,9
6-La Concordia	La Ceiba	Mantenimiento Goretti Sede B Grupo 3						
17-Mutis	Mutis	Mantenimiento José Celestino Mutis Grupo 3						
5-García Rovira	La Joya	Mantenimiento Andres Paez de Sotomayor Grupo 4	881.067.522,98	0,0	0%	75 días	44 días	881.067.522,98
4-Occidental	Granada	Mantenimiento Politecnico Sede B Grupo 4						
TOTAL			7.778.240.774,3	1.680.724.889,3				9.429.927.138



OBRAS ENTRE EL 76% - 99%



Parque La Flora



Club de Tenis Parque de los Niños



Colegio El Paulón

INFORME DE
OBRAS PÚBLICAS
PRIMER TRIMESTRE - 2019



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad

OBRAS ENTRE EL 76% - 99%

OBRAS ENTRE EL 76% - 99%								
Comuna	Barrio	Nombre	Valor inicial	Valor adicional	Porcentaje adicional	Plazo inicial	Plazo adicional	Inversión total
1-Norte	Café Madrid	Centro de Salud Café Madrid	1.598.565.682,8	789.592.516,9	49,4%	6 meses	5 meses	2.388.158.199,7
3-San Francisco	San Francisco	Intercambiador Vial Mesón de los Bucaros	54.909.500.000,0	34.579.499.929,24*	62,97%*	14 meses	33 meses	89.488.999.929,2
13-Oriental	Álvarez Las Américas	Plaza Guarín-Cubierta módulo norte	585.620.639,0	87.219.862,6	14,9%	45 días	5 meses	672.840.501,6
1-Norte	Café Madrid	Ludoteca Café Madrid	1.254.823.459,7	607.576.566	48,4%	8 meses	5 meses 20 días	1.862.400.025,7
13-Oriental	Antonia Santos	Club de Tenis Parque de Los Niños	2.359.817.188,4	370.497.530,3	15,7%	5 meses	3 meses 10 días	2.730.314.718,7
13-Oriental	San Alonso	Ambientes de transición instituciones educativas Damáso Zapata Sede D	741.206.653,26	312.153.460,87	42,11%	4 meses	2 meses	1.053.360.114,13
2-Nororiental	Independencia	Ambientes de transición instituciones educativas Santander Sede D						
13-Oriental	Álvarez Las Américas	Ambientes de transición instituciones educativas Las Américas						
6-La Concordia	La Concordia	Parque Deportivo Concordia	586.516.576,17	0,0	0,00%	5 meses	2 meses 15 días	586.516.576,17
1-Norte	Betania-Tejar Norte	Parque Deportivo Tejar Norte sintético	787.841.949,85	0,0	0,00%	5 meses	2 meses 15 días	787.841.949,85
2-Nororiental	Esperanza II	Parque Deportivo Esperanza II	494.548.972,79	22.403.779,36	4,53%	5 meses	2 meses 15 días	516.952.752,15
5-García Rovira	Alfonso López	Parque Deportivo Alfonso López	463.880.000,28	87.610.621,89	18,89%	5 meses	2 meses 15 días	551.490.622,17
4-Occidental	Nápoles	Parque Deportivo Nápoles	1.310.604.460,47	59.121.418,42	4,51%	5 meses	2 meses 15 días	1.369.725.878,89

*(El valor no supera el tope por ley del valor del contrato representado en SMLV, siendo el tope en valor adicional 44.569 SMLV)

OBRAS ENTRE EL 76% - 99%

11-Sur	Dangond	Parque Deportivo Dangond	1.804.896.749,55	237.966.242,95	13,18%	5 meses	2 meses 15 días	2.042.862.992,50
1-Norte	Villas de San Ignacio-Bavaria	Alumbrado Público Parque Lineal Rio de Oro	965.458.895,00	0,0	0,00%	4 meses		965.458.895,00
13-Oriental	Álvarez Las Américas	Parque La Ceiba Fase I	3.185.372.854,80	420.582.071,25	13,20%	3 meses 15 días	3 meses	3.605.954.926,05
2-Nororiental	Transición	Repotenciación IE Promoción Social Sede D Grupo 1	1.018.416.153,82	0,00	0,00	4 meses	4 meses	1.018.416.153,82
6-La Concordia	La Concordia	Repotenciación IE Jorge Ardila Duarte Grupo 2	951.229.208,55	247.056.730,08	25,97%	4 meses	3 meses 15 días	1.198.285.938,63
7-Ciudadela	Ciudadela Real de Minas	Repotenciación IE Aurelio Martínez Mutis Grupo 2	560.848.627,25	0,00	0%	4 meses	3 meses 15 días	560.848.627,25
1-Norte	Kennedy	Repotenciación IE Maiporé sede C Grupo 3	710.691.521,20	193.783.302,59	27,27%	4 meses	3 meses	904.474.823,79
1-Norte	Olas Bajas	Repotenciación IE Club Unión Sede D Grupo 3	743.318.205,60	149.331.600,75	20,09%	4 meses	3 meses	892.649.806,35
Correg. 1	Vereda el Paulon	Repotenciación IE Rural Paulón Grupo 4	1.386.169.767,87	469.896.345,00	33,90%	4 meses	3 meses	1.856.066.112,87
15- Centro	García Rovira	Mantenimiento Comando de Policía Metropolitano de Bucaramanga	1.203.940.390,46	0,0	0%	3 meses	3 meses 4 días	1.203.940.390,46
12-Cabecera del Llano	La Floresta	Parque La Flora	2.546.957.564,76	255.674.787,21	10%	2 meses	2 meses 17 días	2.802.632.351,97
9-La Pedregosa	Diamante I	Juegos infantiles, gimnasios y escenarios deportivos Diamante I	865.122.208,42	179.108.571,2	20,70%	3 meses	4 meses	1.044.230.779,60
9-La Pedregosa	La Libertad	Juegos infantiles, gimnasios y escenarios deportivos La Libertad						
16-Lagos del Cacique	Altos del Cacique	Juegos infantiles, gimnasios y escenarios deportivos Altos del Cacique						
8-Suboccidente	20 de Julio	Juegos infantiles, gimnasios y escenarios deportivos 20 de Julio						
16-Lagos del Cacique	Bosques del Cacique	Juegos infantiles, gimnasios y escenarios deportivos Bosques del Cacique						

OBRAS ENTRE EL 76% - 99%

6-La Concordia	La Victoria	Mantenimiento Colegio Aurelio M. Mutis	1.033.961.744,35	22.026.837	2,13%	75 días	44 días	1.055.988.581,35
1-Norte	Kennedy	Mantenimiento Colegio Maipore Sede B						
3-San Francisco	San Rafael	Mantenimiento Colegio Club Union Sede A	882.682.552,2	78.980.952,00	8,95%	75 días	44 días	961.663.504,21
3-San Francisco	Norte Bajo	Mantenimiento Colegio Club Union Sede B						
Correg. 1	Vijagual	Mantenimiento Colegio Vigajual Sede A						
3-San Francisco	Universidad	Mantenimiento Colegio Santander Sede A						
2-Nororiental	La Juventud	Mantenimiento Colegio La Juventud Sede A	873.439.183,0	36.072.261,00	4,13%	75 días	44 días	909.511.444,03
Correg. 2	Vereda Bolarqui	Mantenimiento Colegio Bosconia Bolarquí Sede D						
Correg. 2	Vereda Cuchilla Alta	Mantenimiento Colegio Bosconia Cuchilla Alta						
Toda la ciudad	Toda la ciudad	Espacio Público Acciones Judiciales	329.808.266,00	0,0	0%	3 meses	1 mes	329.808.266,00
TOTAL			84.155.239.475,6	4.626.655.457,3				123.361.394.862,1



OBRAS ENTRE EL 51% - 75%



Parque deportivo Coaviconsa



Parque Granjas de Porvenza

INFORME DE
OBRAS PUBLICAS
PRIMER TRIMESTRE - 2019



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad

OBRAS ENTRE EL 51% - 75%

OBRAS ENTRE EL 51% - 75%

Comuna	Barrio	Nombre	Valor inicial	Valor adicional	Porcentaje adicional	Plazo inicial	Plazo adicional	Inversión total
Toda la ciudad	Toda la ciudad	Mantenimiento de Malla Vial Urbana	2.746.373.202,0	1.034.022.757,3	37,7%	6 meses	3 meses	3.780.395.959,3
12-Cabecera del Llano	Los Cedros	Remodelación cancha Pan de Azucar	1.304.975.930,7	0,0	0,0%	8 meses	2 meses	1.304.975.930,7
11-Sur	Jardines de Coaviconsa	Remodelación cancha Coaviconsa	1.093.831.780,9	0,0	0,0%	5 meses	2 meses	1.093.831.780,9
10-Provenza	Granjas de Provenza	Construcción Parque Granjas de Provenza Grupo 2	2.221.897.961,1	468136941,2	21,1%	3 meses 15 días	3 meses	2.690.034.902,3
2-Nororiental	Esperanza I	Reparación y mantenimiento de IE Promoción Social Sede C Grupo 1	555.561.129	436808110,5	78,6%	4 meses	4 meses	992.369.239,8
15-Centro	Centro	Plazoleta Los Edecanes	1.223.767.860,2	0,0	0,0%	2 meses	3 meses 14 días	1.223.767.860,2
10-Provenza	Fontana	Mejoramiento de la Cancha del Colegio INEM Custodio García Rovira	2.738.806.431,2	90.722.525,6	3%	1 mes 15 días	3 meses 14 días	2.829.528.956,8
TOTAL			11.885.214.295,3	2.029.690.334,6				13.914.904.629,9

OBRAS ENTRE EL 25% - 50%



Andenes, pasamanos y escaleras



Mantenimiento Colegio Bicentenario

INFORME DE
OBRAS PUBLICAS
PRIMER TRIMESTRE - 2019



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad

OBRAS ENTRE EL 25% - 50%

OBRAS ENTRE EL 25% - 50%

Comuna	Barrio	Nombre	Valor inicial	Valor adicional	Porcentaje adicional	Plazo inicial	Plazo adicional	Inversión total
Toda la ciudad	Toda la ciudad	Andenes, pasamano y escaleras	1.343.937.014,9	0	0%	3 meses	5 meses 28 días	1.343.937.014,9
1-Norte	Villa Rosa	Juegos infantiles, gimnasios y escenarios deportivos Villa Rosa	775.839.494,90	284.232.672,40	37%	3 meses	4 meses	775.839.494,9
4-Occidental	Girardot	Juegos infantiles, gimnasios y escenarios deportivos Girardot						
5-García Rovira	La Ceiba	Juegos infantiles, gimnasios y escenarios deportivos La Ceiba						
17-Mutis	Brisas del Mutis	Juegos infantiles, gimnasios y escenarios deportivos Brisas del Mutis						
2-Nororiental	Villa Helena II	Juegos infantiles, gimnasios y escenarios deportivos Villa Helena 2						
3-San Francisco y 4-Occidental	Todos los barrios	Instalación de Luminarias Grupo 2	1.560.166.824,00	0	0%	5 meses		1.560.166.824,0
13-Oriental	Álvarez Las Américas	Mantenimiento Colegio Bicentenario	1.524.762.067,35	0	0%	2 meses 15 días	4 meses 20 días	1.524.762.067,4
TOTAL			3.679.943.333,8					3.679.943.333,8



OBRAS ENTRE EL 0% - 24%

INFORME DE
OBRAS PUBLICAS
PRIMER TRIMESTRE - 2019



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad

OBRAS ENTRE EL 0% - 24%

OBRAS ENTRE EL 0% - 24%

Comuna	Barrio	Nombre	Valor inicial	Valor adicional	Porcentaje adicional	Plazo inicial	Plazo adicional	Inversión total
1-Norte y 2-Nororiental	Todos los barrios	Instalación de Luminarias Grupo 1	1.855.918.171,0	0,0	0%	5 meses		1.855.918.171,0
5-García Rovira, 6-La Concordia, 7-Ciudadela y 8-Suroccidente	Todos los barrios	Instalación de Luminarias Grupo 3	2.001.758.182,0	0,0	0%	5 meses		2.001.758.182,0
1-Norte	Todos los barrios	Instalación de Luminarias Grupo 4	1.915.427.500,0	0,0	0%	5 meses		1.915.427.500,0
TOTAL			5.773.103.853,0					5.773.103.853,0



OBRAS GESTIONADAS POR EL MUNICIPIO



TRANSPARENCIA
BUCARAMANGA
#BGA+TRANSPARENTE



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad



OBRAS ENTREGADAS 100%



Parque Lineal Río de Oro



Neomundo



I.E GORETTI SEDE C

INFORME DE OBRAS PÚBLICAS PRIMER TRIMESTRE - 2019



Construcción Social, Transparencia y Dignidad

OBRAS ENTREGADAS 100%

OBRAS CON EL 100%								
Comuna	Barrio	Nombre	Valor total	Aportes del Municipio	Plazo inicial	Plazo adicional	Fecha estimada de entrega	Entidad contratante
6-La Concordia	La Victoria	Santa María Goretti Jornada Única	5.356.115.183,0	2.588.115.183 (48.3%)	12 meses		1er Trimestre 2019	FFIE
1-Norte	Villas de San Ignacio-Bavaria	Parque Lineal Río de Oro	11.263.838.683,3	Alumbrado público	10 meses		1er Trimestre 2019	AMB
11-Sur	El Porvenir	Parque Contemplativo El Carrasco	2.954.987.951,5	Alumbrado público	6 meses	20 días	1er Trimestre 2019	AMB
5-García Rovira	Campo Hermoso	Retazo Campo Hermoso - Obelisco	484.986.442,14	Permiso uso del predio	3 meses	2 meses 15 días	1er Trimestre 2019	AMB
1-Norte	Café Madrid	Retazo Café Madrid	324.943.546,40	Permiso uso del predio	3 meses	1 mes	1er Trimestre 2019	AMB
1-Norte	Campo Madrid	Biblioteca Campo Madrid	4.774.212.998	Gestión	5 meses		1er Trimestre 2019	INVISBU
1-Norte	Campo Madrid	CDI Campo Madrid			8 meses		1er Trimestre 2019	INVISBU
1-Norte	Urb. La Inmaculada	Estabilización La Inmaculada etapa 1	1.950.288.607,4	Gestión	6 meses	24 días	1er Trimestre 2019	INVISBU
1-Norte	Urb. Norte Club Tiburones	Sendero Ecológico Urb. Norte Club Tiburones	494667665,5	Gestión	4 meses		1er Trimestre 2019	INVISBU
TOTAL			27.604.041.077	2.588.115.183				



OBRAS ENTRE EL 76% - 99%



Neomundo



Teatro Santander



Colegio La Normal

INFORME DE
OBRAS PUBLICAS
PRIMER TRIMESTRE - 2019



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad

OBRAS ENTRE EL 76% - 99%

OBRAS ENTRE EL 76% - 99%

Comuna	Barrio	Nombre	Inversión total	Aportes del Municipio	Plazo inicial	Plazo adicional	Fecha estimada de entrega	Entidad contratante
16-Lagos del Cacique	Guayacanes	Construcción Centro de Convenciones Neomundo	76.840.000.000	28.590.000.000 (37,2%)	20 meses	20 meses	2019	FONTUR
15-Centro	Centro	Teatro Santander	41.700.348.155	17.153.413.620 (41%)	6 meses	10 meses*	2019	Fundación Teatro Santander
13-Oriental	La Aurora	Escuela La Normal Jornada Única	11.300.206.459,0	5.961.206.459 (52,8%)	12 meses		2019	FFIE
1-Norte	Urb. La Inmaculada	Colegio La Inmaculada	10.263.957.567,0	Gestión	9 meses		2019	INVISBU
1-Norte	Urb. La Inmaculada	CDI La Inmaculada						
TOTAL			140.104.512.181					



OBRAS ENTRE EL 51% - 75%

Portal Metrolínea de Piedecuesta

INFORME DE
OBRAS PÚBLICAS
PRIMER TRIMESTRE - 2019



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad



OBRAS ENTRE EL 51% - 75%

OBRAS ENTRE EL 51% - 75%

Comuna	Barrio	Nombre	Valor total	Aportes del Municipio	Plazo inicial	Plazo adicional	Fecha estimada de entrega	Entidad contratante
Piedecuesta	Piedecuesta	Portal Piedecuesta Metrolínea	32.336.405.603,00	Gestión	18 meses		Septiembre de 2019	Metrolínea
9-La Pedregosa	San Martín	Teatro Verde San Martín	1.068.785.989,53	Predio	2 meses 15 días	2 meses 20 días	Segundo Trimestre 2019	AMB
1-Norte	Urb. La Inmaculada	Estabilización Urbanización La Inmaculada y Reserva 3 y 4	2.488.837.886,99	Gestión	10 meses		Septiembre de 2019	INVISBU
TOTAL			\$ 35.894.029.479,52					

OBRAS ENTRE EL 25% - 50%

Portal Norte Metrolínea



INFORME DE
OBRAS PÚBLICAS
PRIMER TRIMESTRE - 2019



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad

OBRAS ENTRE EL 25% - 50%

OBRAS ENTRE EL 25% - 50%								
Comuna	Barrio	Nombre	Valor total	Aportes del Municipio	Plazo inicial	Plazo adicional	Fecha estimada de entrega	Entidad contratante
1-Norte	Miramar	Portal Norte Metrolínea	31.824.861.249,0	Gestión	18 meses		Septiembre de 2019	Metrolínea
TOTAL			31.824.861.249,0					



OBRAS ENTRE EL 0% - 24%

Centralidad Norte - Club Tiburones



INFORME DE
OBRAS PÚBLICAS
PRIMER TRIMESTRE - 2019



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga




Construcción Social,
Transparencia y Dignidad

OBRAS ENTRE EL 0% - 24%

OBRAS ENTRE EL 25% - 50%								
Comuna	Barrio	Nombre	Valor total	Aportes del Municipio	Plazo inicial	Plazo adicional	Fecha estimada de entrega	Entidad contratante
1-Norte	Urb. Norte Club Tiburones	Centralidad Comunitaria Norte Club Tiburones	2.732.420.837,1	Gestión	8 meses		27 de agosto de 2019	INVISBU
TOTAL			31.824.861.249,0					



Mapa de Obras Públicas

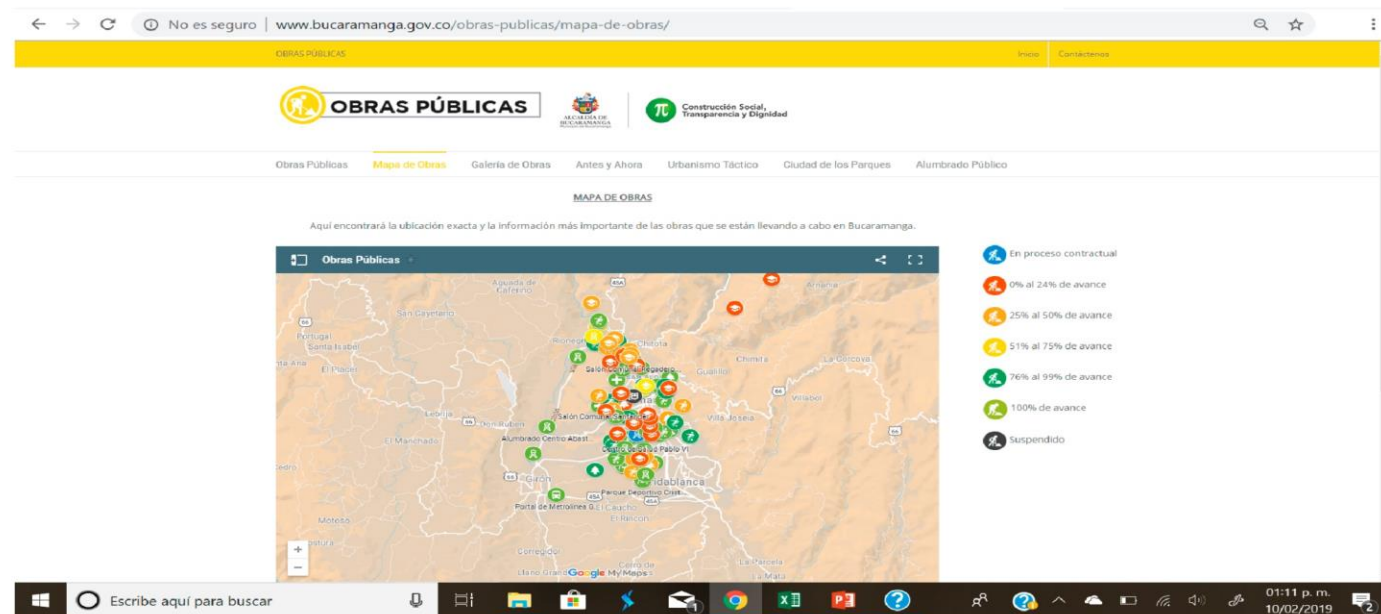

Para consultar información georreferenciada sobre las intervenciones de obra pública adelantadas por la Alcaldía Municipal, el gobierno de los ciudadanos ha dispuesto la herramienta Mapa de Obras Públicas en la sección obras públicas de la página web del Municipio. Aquí podrá encontrar la ubicación exacta, el monto invertido, el porcentaje de avance, entre otras, de las intervenciones en infraestructura. Además, desde el mapa de obras podrá acceder directamente al Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP para obtener mayor información sobre la ejecución contractual. La actualización de esta sección se realiza mensualmente. Enlace del Mapa de Obras Públicas:

<http://www.bucaramanga.gov.co/obras-publicas/mapa-de-obras/>

INFORME DE
OBRAS PÚBLICAS
CUARTO TRIMESTRE



TRANSPARENCIA
BUCARAMANGA
#BGA+TRANSPARENTE



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad

Galería de Obras Públicas



Contiene las fotos sobre las intervenciones de obras adelantadas por el Municipio. En estas secciones podrá encontrar imágenes que permiten apreciar la transformación de los sectores intervenidos: el antes, el durante y el ahora.

Antes y ahora: <http://www.bucaramanga.gov.co/obras-publicas/antes-y-ahora/>

Galería de obras: <http://www.bucaramanga.gov.co/obras-publicas/galeria-de-obras/>

INFORME DE
OBRAS PÚBLICAS
CUARTO TRIMESTRE



TRANSPARENCIA
BUCARAMANGA
#BGA+TRANSPARENTE



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad
