

INFORME DE GESTIÓN

ANTE EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ZORAIDA ORTIZ GOMEZ

SEGUNDO TRIMESTRE 2016
Abril 01 - Junio 30



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga



Lógica Ética & Estética
Gobierno de los Ciudadanos



INFORME DE GESTION

El presente informe resume los principales avances en los programas de la Secretaria de Infraestructura, teniendo en cuenta las metas programadas en el Plan de Desarrollo 2016 -2019 “Gobierno de las Ciudadanas y los Ciudadanos”

Las obras adelantadas obedecen a las necesidades de la comunidad quienes solicitan los proyectos por medio de oficios, derechos de petición y a visitas técnicas realizadas por profesionales adscritos a esta Secretaria. Con el fin de verificar, priorizar y viabilizar cada uno de los proyectos a ejecutar con el propósito de mantener, mejorar y diseñar la infraestructura de la ciudad de acuerdo a los recursos asignados.

A continuación se detalla la gestión que ha realizado la Secretaria de Infraestructura en el Segundo trimestre de la presente vigencia y a su vez se muestra el avance de las metas allí planteadas.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: GOBERNANZA DEMOCRÁTICA

1.1. PROGRAMA: VIVE DIGITAL PARA LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS

La Secretaria de infraestructura adelanta el proyecto “Mantenimiento de la planta física de puntos vive digital en el Municipio de Bucaramanga”

No.	No. REGISTRO	OBJETO	VALOR TOTAL PROYECTO	VALOR VIGENCIA 2016
1	2016068010201	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE PUNTOS VIVE DIGITAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.	\$ 85.574.024,79	\$ 85.574.024,79

El proyecto esta encaminado al mantenimiento y adecuación de los puntos vive digital, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los mismos, las principales actividades a ejecutar son: mantenimiento en pintura, carpintería metálica, carpintería en madera, reparación de aparatos sanitarios, limpieza de canales, entre otros.

1.2. PROGRAMA: UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES

En este programa se encuentra todos los diseños, estudios, consultorías e interventorías para ejecutar los proyectos y las obras del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, los cuales es importante resaltar:

No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
032 de 2016	"INTERVENTORIA PARA LA AMPLIACION Y ADECUACION DEL COLISEO BICENTENARIO PARA EL MUNDIAL DE FUTBOL SALA 2016 EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"	\$ 223.081.920	19 de Abril de 2016	18 de Octubre de 2016
036 de 2016	INTERVENTORÍA A LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL ADICIONAL EN VALOR DEL CONTRATO DE OBRA NUMERO 483 DEL 05 DE NOVIEMBRE	\$ 64.000.000	26 de Abril de 2016	25 de Julio de 2016

	DE 2015, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION EN LOS SECTORES CON AMENAZA DE FENOMENOS DE REMOCION EN MASA EN LA COMUNA 8 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
080 de 2016	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SALONES COMUNALES DE DOCE BARRIOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$104.999.928.80	Fecha de Contrato: 14 de Julio de 2016

Asi mismo la Secretaria adelanta el proceso No. SI-CM-003-2016 "INTERVENTORIA A LA OBRAS DE PARCHEO DE HUECOS, FALLOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES EN LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" por valor \$ 89.660.025,00.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: INCLUSIÓN SOCIAL

2.1. PROGRAMA: ADULTO MAYOR Y DIGNO

La Secretaria adelanta el proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"

No.	No. REGISTRO	OBJETO	VALOR TOTAL PROYECTO	VALOR VIGENCIA 2016
1	20160680010196	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA BARRIO KENNEDY FASE II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER (INCLUYE INTERVENTORÍA)	\$ 1.866.478.847.050	\$ 425.256.071,20

El proyecto consiste en la terminación de la planta física del centro vida del Barrio Kennedy, el cual consta de; sótano, primer piso, segundo piso y tercer piso, el proyecto brindara a la población de la tercera edad, en temas como salud, recreación, deporte y aprovechamiento del tiempo libre.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

3.1. PROGRAMA: REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE

De acuerdo al Convenio interadministrativo No. 228 de 2013 Municipio de Bucaramanga - Departamento de Prosperidad social-DPS, El Municipio de Bucaramanga, en la vigencia 2015 adelanto el Proceso SI-LP-029-2015, el cual se legalizo en la vigencia 2016.

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Contrato	Estado
43 de 2016	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION PARA EL CONTROL DE LA AMENAZA POR FENOMENOS DE REMOCIÓN EN MASA EN EL SECTOR DEL BARRIO	\$ 1.608.416.915,67	12 Mayo de 2016	A la espera de aprobación de la Interventoría por parte del DPS, para dar Inicio a

	BUCARAMANGA-COCACOLA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DEPARTAMENTO DE SANTANDER			la Obra
--	---	--	--	---------

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: CALIDAD DE VIDA

4.1. PROGRAMA: OBSERVAR Y SER OBSERVADO: FOMENTO AL TURISMO

Este programa se encuentra la terminación del Centro de Convenciones Neomundo, que mediante el Convenio de Cooperación FNT-328-2014, suscrito entre Fiducoldex, vocera del Patrimonio Autónomo Fontur, el Municipio de Bucaramanga y el Departamento de Santander, para el cumplimiento de su objeto: “Aunar esfuerzos humanos, administrativos, financieros, jurídicos y de asistencia técnica para la construcción y dotación del Centro de Convenciones "Neomundo" de la ciudad de Bucaramanga, Santander para promover su desarrollo y proyección como destino turístico a nivel nacional e internacional.

En estos momentos el Municipio de Bucaramanga debe realizar el giro de los recursos por valor de \$ **3.287.402.027,64** con cargo a los recursos respaldados en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 1967 del 19 de Mayo de 2016, de acuerdo a la cláusula segunda del Otro si No. 4 del Convenio de Cooperación FNT -328 -2014.

4.2. PROGRAMA: INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO

- **Mantenimiento a los Parques “Ciudad de los Parques”**

Se ha realizado jornadas de limpieza a parques y zonas verdes dentro del programa maratón de aseo, labor que la Administración Municipal está desarrollando con la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga EMAB, Área Metropolitana de Bucaramanga y la Policía Nacional.

COMUNA	DIRECCION
Comuna 1	Zonas verdes Barrio Villas de San Ignacio
	Zonas verdes Barrio Inmaculada
	Zonas verdes alrededor del Colegio San Ignacio
Comuna 2	Vía Matanza Entrada por la Virgen
	Alrededores cancha B. Esperanza III
	Punto vive digital B. San Cristobal Norte y la Juventud
	Zonas Verdes Barrio Bosque Bajo
Comuna 3	Parque San Francisco
	Parque Cristo Rey
	Boulevard Santander
Comuna 4	Parque B. Girardot
Comuna 5	Vía Calle 45
	Caminódromo la Joya
	Zona B. Pantano II
	Zonas Verdes Medicina Legal
Comuna 6	Parque Tres B

	Parque Concordia
	Parque Giordano Bruno
Comuna 9	Zona verde B. San Martín Zona verde B. San Pedro
Comuna 10	Paralela Estación Metrolínea Provenza Zona verde alrededores Puente de Provenza
Comuna 12	Parque San Pio Parque Leones Parque la loma Parque y Polideportivo Pan de Azúcar Parque Conucos Separador Calle 56 Zona verde carrera 38 con calle 48 Parque Turbay
Comuna 13	Parque Niños Parque Bolívar Separador Avda. la Rosita Parque Barrio los Pinos Zona Verde Plaza Guarín Parque B. Álvarez
Comuna 14	Sendero Morrórico
Comuna 15	Parque Centenario Parque García Rovira Zona Verde Carrera 10 con Calle 35 y 34 Calle 35 Parque Santander Separador Quebrada Seca Glorieta de la Carrera 9 con Quebrada Seca Separador Calle 36 Parque Romero Carrera 9 con Calle 45
Comuna 17	Prados del mutis Parque B. Mutis Parque B. Manzanares Parque B. Mutis

A continuación, el registro fotográfico de algunos sitios intervenidos:

Comuna 1

- **Zonas verdes alrededor del Colegio San Ignacio**



Comuna 2

- **Alrededores cancha B. Esperanza III**



Comuna 3

- **Parque Cristo Rey**



Comuna 4

- **Parque B. Girardot**



Comuna 10

- **Zona verde alrededores Puente de Provenza**



Comuna 12

- **Parque San Pio**



Comuna 17

- **Prados del mutis**



La Secretaría de Infraestructura adelanta diferentes procesos para las siguientes obras:

- ✓ Mantenimiento de Parques, zonas verdes y espacios públicos
- ✓ Actividades de poda y tala de árboles del espacio público

Los cuales se empezaran a ejecutar en el segundo semestre de la presente vigencia.

• **Equipamientos Comunitarios (Sociales, deportivos y Culturales).**

No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
29 de 2016	AMPLIACION Y ADECUACION DEL COLISEO BICENTENARIO PARA EL MUNDIAL DE FUTBOL SALA 2016 EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 5.020.601.988,44	19 de Abril de 2016	18 de Octubre de 2016

Estado: Avance de Obra: 30% primer Trimestre; Avance de Obra Segundo Trimestre 49%.



Se firmó Convenio Interadministrativo No. 951 entre el Departamento de Santander y el Municipio de Bucaramanga.

Convenio No.	objeto	Valor	Fecha de Convenio
951 de 2016	CONSTRUCCION DE REDES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS INSTALACIONES DEL TEATRO SANTANDER DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.000.000.000,00	30 de Junio de 2016

Así mismo se radica el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE REDES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS INSTALACIONES DEL TEATRO SANTANDER - MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”, con el fin de poder adelantar convenio con la Fundación Teatro Santander.

LÍNEA ESTRATÉGICA 6: INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD

6.1. PROGRAMA: MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA

- **Mantenimiento Malla Vial Urbana**

La Secretaria de Infraestructura adelanta el proyecto “MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”, por valor de \$ **1.319.458.103,82**, con el propósito de poder dar trámite a solicitudes de la comunidad de acuerdo al cuadro de necesidades que tiene este despacho.

Se espera dar inicio a la licitacion publica en el tercer trimestre de la presente vigencia.

- **Megaobras de Infraestructura Vial**

No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
272 de 2014	CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL MESÓN DE LOS BÚCAROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	Valor Inicial \$ 54.909.500.000 Adicional 1. \$ 14.516.066.713 Adicional 2. \$ 10.945.041.309 Valor Total \$ 80.370.608.022	10 de septiembre de 2014	09 de septiembre de 2016

Estado: Avance de obra del 60% en el Primer Trimestre de 2016.

Avance de Obra 65% en el segundo trimestre: Se dio apertura vehicular deprimido Carrera 27 sentido Sur –Norte; deprimido Quebrada Seca Sentido Oriente Occidente.



No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
022 de 2015	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INTERCAMBIADOR VIAL AVENIDA QUEBRADASECA CON CARRERA 15 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	\$ 45.317.679.804,61	28 de Febrero de 2015	25 de Noviembre de 2016

Estado: Avance de obra del 90% puentes 100% en el Primer Trimestre de 2016

Avance de Obra 95% en el segundo trimestre: plazoleta terminada. Se espera que el tercer trimestre se realice los acabados de los locales comerciales



OPTIMIZACIÓN DEL CORREDOR PRIMARIO ENTRE BUCARAMANGA Y FLORIDABLANCA EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL PUENTE PROVENZA Y EL INTERCAMBIADOR DE TRÁFICO PUERTA DEL SOL

No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
331 DE 2014	INTERVENTORÍA AMPLIACIÓN DEL CORREDOR VIAL PRIMARIO BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA SECTOR PUERTA DEL SOL - PUENTE PROVENZA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	Valor Inicial \$ 7.518.263.339,5 Adicional 1. \$ 5.640.000.000 Valor Total \$ 13.158.263.339,5	01 de Octubre de 2014	31 de Enero de 2017

Principales Actividades Ejecutadas

Puerta del Sol – Puente K33: Este sector de la puerta del sol al Puente de la Carrera 33 presenta un avance el 70% de construcción.

En este sector se realizara la construcción de dos muros de contención uno en el parque de las hormigas y otro en el talud de conucos.

Puente K33 - Antonia Santos: Este sector del Puente de la Carrera 33 al barrio Antonia Santos presenta un avance de 45% de construcción.

En este sector la calzada norte – sur tendrá una ampliación de 2 carriles mixtos a 5 carriles mixtos, mientras en la calzada sur – norte se dará la misma ampliación del sector anterior.

Viaducto García Cadena: Este sector del Puente de la Carrera 33 al Barrio Antonia Santos presenta un avance de 84% de construcción.

En el antiguo Viaducto García Cadena se realizara la demolición del separador y barreras de protección para reconstruirlas teniendo en cuenta el nuevo alineamiento vial.

Diamante II – Provenza: Este sector del Puente de la Carrera 33 al barrio Antonia Santos presenta un avance de 60% de construcción.

La ampliación se dará sobre el costado oriental, afectando Motoreste. Se realizarán la construcción de un muro de contención, una pantalla anclada, el desmonte de la estación de metrolínea del diamante para reubicarla en el nuevo separador y el puente peatonal actual para instalar un nuevo puente dado la ampliación de las calzadas. En el ingreso al barrio diamante se realizará la construcción de un deprimido como solución vial a los puntos de conflictos de este sector.

6.2. PROGRAMA: MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL RURAL

La Secretaría de Infraestructura realizó, mantenimiento periódico a las diferentes vías del sector urbano y rural ejecutando diferentes actividades con la Maquinaria Adscrita a este Despacho.

A continuación algunos sectores intervenidos.

Limpieza cuneta y derrumbes Calle 45 (Cárcel de Mujeres - Quinta Estrella y Norte vía Babarúa (Abril 5 al 15 de abril de 2016)

Corregimiento N° 1: V. La Pastora (Mayo 23 - 27), V. Santa Rita- Los Angelinos (Mayo 23 – Junio 10), V. La Esmeralda (Mayo 31 – Junio 10), V. San Pedro Bajo – San Pedro Alto (Junio 13 – 24)

Corregimiento N° 2: V. Capilla Baja – Capilla Alta (Abril 18 – Mayo 20), V. Magueyes (Mayo 23 – 24), V. Capilla Alta – Los Santos (Mayo 25 – Junio 31)

Corregimiento N° 3: V. Gualilo (Abril 18 - 22), V. San José (Abril 25- Mayo 6), V. Retiro Grande (Mayo 4 – 20), V. San Barbara (Junio 7 - 10)



6.3. PROGRAMA: SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS Y RURALES


De acuerdo al Convenio interadministrativo No. 2133635 de 2013 – Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo -FONADE y el Municipio de Bucaramanga - adelanto el Proceso SI-LP-030-2015, el cual se legalizo en la vigencia 2016.

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Contrato	Estado
50 de 2016	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO BARRIO GRANJAS DE PROVENZA - MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.971.561.920,93	24 Mayo de 2016	A la Espera de la Asignación de Interventoría por parte de FONADE.

6.4. PROGRAMA: ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL

La Secretaria de Infraestructura a traves de la Oficina de Alumbrado Publico ha realizado Mantenimiento de la siguiente Manera:

MES	PQR'S RECIBIDAS EN EL MES	PQR'S ATENDIDAS DEL MES
Abril	648	111
Mayo	513	1
Junio	987	607
TOTAL	2.148	719

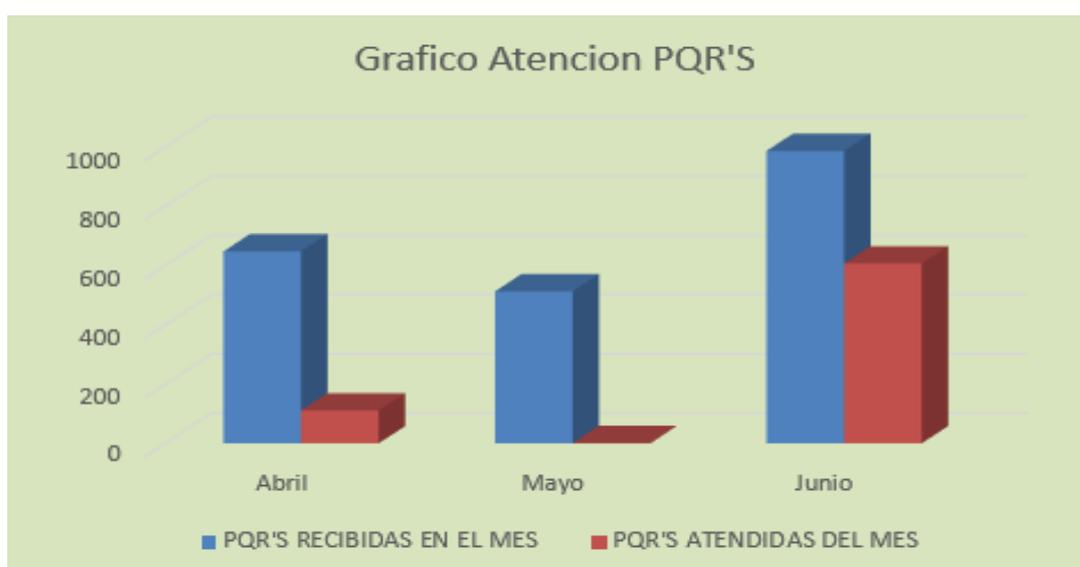

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
54 de 2016	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES SECTORES DE LA ZONA URBANA Y ZONA RURAL	EICON LTDA (\$473.843.532)	16 de Junio de 2016	15 de Abril de 2017
55 de 2016		EME INGENIERIA S.A.(\$829.386.532)		
57 de 2016		IGS INGENIERIA E.U.(\$446.808.720)		

Estado: Avance de Obra: 2%

SECTORES A INTEVENIR

- ❖ **GRUPO EICON Intervienen:** Comunas 1, 10, 11, 13, 16 y Corregimiento 2
- ❖ **GRUPO EME Intervienen:** Comunas 4, 5, 7, 12, 17, Corregimiento 3 y Viaducto Provincial
- ❖ **GRUPO IGS Intervienen:** Comunas 2, 3, 6, 8, 9, 14, 15 y Corregimiento 1

7. OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR LA SECRETARIA

El Municipio de Bucaramanga, en la vigencia 2015 adelanto el Proceso SI-LP-026-2015, el cual se legalizo en la vigencia 2016.

Contrato No.	objeto	Valor	A la espera de la legalización de la Interventoría para dar Inicio
083 de 2016	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARÁ LA ESTACIÓN DE POLICÍA CENTRO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	\$1.000.727.512.65	

IMPACTO: La Estación de Policía Centro, que en la actualidad se encuentra ubicada en la Carrera 38 N° 33 – 34 del Barrio Álvarez, buscando una sustancial mejora para dicha estación en aspectos tan relevantes como la ubicación estratégica, el impacto sobre la percepción de seguridad ciudadana, la imagen corporativa institucional, la atención al usuario y el bienestar del personal.

8. CONTRATOS QUE VENIAN EN EJECUCION DE LA VIGENCIA 2015

8.1 Contratos Liquidados en el Segundo Trimestre de 2016

No. Contrato	Objeto	Valor	
497 de 2015	MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y PARQUES INFANTILES EN DIFERENTES BARRIO DEL MUNICIPIO DE BUCRAMANGA	\$ 999.999.654	

INFORME DE GESTIÓN

ANTE EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

Contrato No.	objeto	Valor	
348 de 2015	REMODELACIÓN DEL ESTADIO DE ATLETISMO LA FLORA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.334.549.334,82	

No. Contrato	Objeto	Valor	
467 de 2015	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARA LA ESTABILIZACION DEL TALUD UBICADO EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DEL BARRIO VILLAS DE SAN IGNACIO.	\$ 800.000.000	

No. Contrato	Objeto	Valor	
483 de 2015	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION EN LOS SECTORES CON AMENAZA DE FENOMENOS DE REMOCION EN MASA EN LA COMUNA 8 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	Valor Inicial \$ 9.063.912.416,09 Adicional \$ 2.500.000.000 Valor total \$ 11.563.912.416,09	

No. Contrato	Objeto	Valor	
485 de 2015	CONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO I.E GUSTAVO COTE URIBE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 397.195.188	

Contrato No.	objeto	Valor	
435 de 2015	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL CORREGIMIENTO I DEL MUNICIPIO DE BUCRAMANGA.	\$ 603.694.485	

INFORME DE GESTIÓN

ANTE EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

No. Contrato	Objeto	Valor	
402 DE 2015	CONSTRUCCION CENTRO VIDA BARRIO KENNEDY FASE I MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	1.284.719.430,63	

No. Contrato	Objeto	Valor	
479 de 2015	CONSTRUCCION DE ANDENES Y MURO DE CONTENCIÓN Y RECUPERACION MALLA VIAL BARRIO VEGAS DE MORRORICO.	\$ 379.997.253,22	

No. Contrato	Objeto	Valor	
403 de 2015	RECUPERACION DE ANDENES Y VIAS PEATONALES EN SECTORES DE LAS COMUNAS 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12,13 Y 14 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 395.823.497,55	

No. Contrato	Objeto	Valor	
405 de 2015	RECUPERACION DE ANDENES Y VIAS PEATONALES EN SECTORES DE LAS COMUNAS 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12,13 Y 14 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 499.074.057,39	

Contrato No.	objeto	Valor	
482 de 2015	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO SECTOR ENTRADA BARRIO VEGAS DE MORRORICO COMUNA 14 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 63.552.894,3	

8.2 Contratos en proceso de liquidacion en el Segundo Trimestre de 2016

No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
158 de 2015	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE PILOTES EN EL BARRIO RINCÓN DE LA PAZ DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.518.048.726,69	16 de Octubre de 2015	15 de Marzo de 2016

Se construyeron tres muros de contención longitud 105 metros lineales. Convenio interadministrativo No. 228 de 2013 Municipio de Bucaramanga - Departamento de Prosperidad social-DPS.



No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
407 de 2015	CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTROL DE EROSION Y ESTABILIZACION PARA EL SECTOR CRÍTICO UBICADO EN EL BARRIO BALCONCITOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 11.425.760.663,1	14 de Diciembre de 2015	13 de Septiembre de 2016



No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
375 de 2015	MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE USO PEATONAL EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SECTOR CENTRO.	\$ 4.496.001.754,5	14 de Septiembre de 2015	27 de Marzo de 2016

Se realizó mejoramiento de andenes sobre la calle 36 entre la carrera 12 y 26 en los dos costados.



No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
No. 308 de 2015	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION Y CONTROL DE AMENAZAS GEOTECNICAS DEL TALUD SUR DEL BARRIO LA FLORESTA DE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- OBRA FINANCIADA CON RECURSOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL.	\$ 2.452.481.078,99	01 de Septiembre de 2015	31 de Enero de 2016



No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
313 DE 2015	CONSTRUCCIÓN DE REDES PLUVIALES Y SISTEMA DE COLECTORES EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 695.520.214,96	21 de Septiembre de 2015	13 de Febrero de 2016

Se construyó redes de alcantarillado, cunetas de manejo de aguas lluvias, pavimentación acceso vía principal.

Se ordenó arreglar las losas de cubierta del tanque de almacenamiento de agua.



No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
439 DE 2015	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DEL BARRIO BALCONES DEL SUR DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - FASE I.	\$ 999.739.024	16 de Diciembre de 2015	14 de Abril de 2016

Se restituyeron huellas vehiculares construidas por la comunidad que fueron demolidas como consecuencia del trazado de las redes de alcantarillado.



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
402 de 2015	CONSTRUCCION CENTRO VIDA BARRIO KENNEDY FASE I MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 1.284.719.430,63	23 de Noviembre de 2015	22 de Marzo de 2016



INFORME DE GESTIÓN

ANTE EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha de Terminación
143 de 2014	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS GABRIELA MISTRAL Y JORGE ARDILA DUARTE SEDE B	\$ 1.869.951.084,94	07 de Julio de 2014	14 dic 2015



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
409 de 2015	CONSTRUCCIÓN POZOS SÉPTICOS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 798.226.887,9	28 de Octubre de 2015	12 de Mayo de 2016



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
481 de 2014	MEJORAMIENTO PUENTE PEATONAL COLGANTE SOBRE EL RÍO SURATÁ SECTOR CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 499.042.880,40	09 de Marzo de 2015	30 de Septiembre de 2016

Estado: 100% ejecutado – En recibo de Obra



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
297 de 2015	RECONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS VEREDALES DE LOS CORREGIMIENOS 1 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA AFECTADOS POR LA OLA INVERNAL 2010 – 2011.	\$ 3.619.163.382,8	13 de Julio de 2015	08 de Mayo de 2016

RECURSOS DE FONADE, INVERSION POR PARTE DEL MUNICIPIO \$ 191.243.382, se va programar visita de obra para verificar acta de recibo a satisfacción por parte de la comunidad.



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
444 de 2015	CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE CARLOS VIRVIASCAS PINZON DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 818.743.743	02 de Diciembre de 2015	11 de Junio de 2016



8.3 Contratos en Ejecucion en el Segundo Trimestre de 2016

No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
532 de 2015	RECUPERACION DEL ESPACIO PÚBLICO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS FALLOS POR ACCION POPULAR Y DEMAS ACCIONES DISPUESTA POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCRAMANGA.	\$ 582.030.201,46	21/12/2015	14/07/2016

Estado: En el Primer trimestre Avance de Obra: 50%. En el segundo trimestre de 2016, avance de obra: 70%

Se ha recuperado espacio público en el Barrio San Francisco, Diamante II, Provenza, San Pio, Calle 36, Carrera 44, se han cumplido 17 de 37 acciones populares.



No. Contrato	Objeto	Valor	Estado
476 DE 2015	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CON PARTICIPACION CIUDADANA EN LAS DIFERENTES COMUNAS Y CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 5.809.991.124,62	Avance de Obra: 30%

Se sigue realizando las intervenciones en cumplimiento del objeto contractual, el cual es importante resalta:

Mejoramiento de Escenarios Deportivo Provenza y Mejoramiento vía peatonal Barrio los Ángeles, Villarosa.



Mejoramiento y construcción vía peatonal y barandas Barrio Colombia



Reposición de vías peatonales Barrio Kennedy y Esperanza II



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
186 de 2015	ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES DE DISEÑOS A DIFERENTES CENTROS DE SALUD Y DISEÑOS DE CENTROS DE SALUD INDICADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 878.995.800	13 de Diciembre de 2015	12 de Julio de 2016

El Contrato contempla la intervención de los Centros de Salud: Barrios Bucaramanga, Campo Hermoso, Gaitán, La Joya, La Libertad, Kennedy, San Rafael, nuestra señora del Rosario, Girardot, Antonia santos y la Unidad Materno Infantil Santa Teresita.

Se encuentran en el proceso de legalización por parte del consultor ante el Ministerio y la curaduría correspondiente.

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
397 de 2015	OBRAS DE EMBELLECIMIENTO PARQUE SAN PIO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 386.255.059,54	10 de Noviembre de 2015	03 de Noviembre de 2016

Estado: Primer Trimestre Avance de Obra: 25% - Suspendido, en el segundo trimestre de 2016, se reinició avance de obra: 40%.

Se está realizando la recuperación de los senderos peatonales en el sector de la calle 45 entre carreras 33 y 35 a, de los cuales se ha realizado la demolición de pisos y bordillos, excavaciones, instalación de súbbase, antepiso en concreto y construcción de bordillos. Sobre el sector de la carrera 35 a ente calles 45 y 46 se ha realizado la demolición de pisos.



No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
429 de 2015	REMODELACION DEL ESPACIO PUBLICO CALLE 33 ENTRE CRA 18 Y 19 Y CARRERA 19 ENTRE CALLES 33 Y 35 DEL MUNICIPIO DE BUCRAMANGA.	\$ 799.803.429,75	16 de Diciembre de 2015	22 de Noviembre de 2016

Estado: Primer Trimestre Avance de Obra: 20% - Suspendido, en el segundo trimestre de 2016, se reinició avance de obra: 40%.

Se logró redefinir el perfil vial del sector sobre la carrera 19 y la calle 33 haciéndolo más amigables con el peatón y con el medio ambiente y se ha realizado las demoliciones respectivas y la instalación de súbbase granular, sardineles y tabletas en el sector de la calle 33 entre carreras 18 y 19 costado del teatro Santander y demoliciones e instalación de sardinel y súbbase en el sector del costado occidental de la carrera 19 entre calles 33 y 34.



8.4. Contratos Suspendidos y por iniciar en el Segundo Trimestre de 2016

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
296 de 2015	ADECUACION DE TRES HOGARES INFANTILES EL TRENCITO ACOMUNAL ZONA 4 Y DOMINGO SABIO PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 536.273.840,97	07 de Septiembre de 2015	07 de Diciembre de 2015

Estado: Avance de Obra: 35% - Suspendido

Está pendiente la aprobación del ICBF para intervenir los hogares infantiles del Trencito y Domingo Sabio.

Contrato No.	objeto	Valor	Estado
556 de 2015	EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SALONES COMUNALES EN DOCE BARRIOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 1.499.371.237.74	A la espera que la Secretaria de Hacienda actualice el Registro Presupuestal.

Una vez se actualice el registro presupuestal, se procederá a dar inicio a la obra, como a la interventoría.

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Suspensión
457 de 2015	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO A TECNOLOGÍA EN EL SECTOR DE LA CALLE 33 ENTRE CARRERAS 18 Y 19 Y CARRERA 19 ENTRE CALLES 35 Y 31 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 433.663.175	11 de Diciembre de 2015	21 de Diciembre de 2015

Estado: Suspendido por modificación de diseño urbanístico



9. ACCIONES POPULARES

Durante el periodo de Enero a Junio de 2016, los Juzgados Administrativos y el Tribunal Administrativo de Santander han proferidos en ACCIONES POPULARES y ACCIONES DE TUTELA, fallos a favor y en contra en los procesos que cursan en los despachos judiciales de esta Secretaria.

En el primer trimestre se relacionó lo siguiente:

ACCIONES POPULARES:

Sentencias a favor	5
Sentencias en contra	1

ACCIONES DE TUTELA

Sentencias a favor	10
Sentencias en contra	0
Pendientes de fallo	2

En el Segundo trimestre se dio trámite de la siguiente manera:

ACCIONES DE TUTELA

Fallos a Favor:	28
Procesos Tramitados	28
Procesos Notificados	28

De los procesos tramitados, en primera instancia se fallaron dos procesos en contra pero fueron apelados y en segunda instancia el fallo salió a favor del Municipio.

INCIDENTE DE DESACATO - EN ACCIONES DE TUTELA

A.T. 2015-0572 (La Malaña). Se abstuvo de sancionar al Alcalde. Se está cumpliendo el fallo **A.T. 2008-0175 (Montemayor).** Se cerró el Incidente de desacato.

ACCION POPULAR

2014-0225 Demandante: RICARDO PINTO MARTINEZ (Escuela Normal de Bucaramanga) **Juzgado:** Tercero Administrativo Oral de Bucaramanga
Estado Actual: Se encuentra en etapa de pruebas

A continuación relaciono las Acciones de tutela tramitadas durante el trimestre

PROCESO No.	JUZGADO	ACCIONANTE	ORDEN JUDICIAL	ESTADO ACTUAL
2016-0056	1° C.M. Ejecucion .Sent.	Carlos Villamizar	El fallo fue a favor	Archivado
2016-0025	6° Penal del Cto.	Giovanny Reyes	En 1ª Instancia en contra. En 2ª. Instancia a favor	Archivado
2016-0129	24 Civil Municipal	Hilario Anaya	El fallo fue a favor	Archivado
2016-0060	5° P.M. con F.C.	Yolanda Sanchez	El fallo fue a favor	Archivado
2016-0292	Tribunal Superior	Nelson Gil Ardila	El fallo fue a favor	Archivado
2016-0197	3° Civil Municipal	Lucila Restrepo R.	Condena a Inspección E.P. El fallo de 2ª fue a Favor	Archivado
2016-0050	3o Penal Municipal	Nelson Castellanos	El fallo fue a favor	Archivado
2016-0258	3° Civil Municipal	Defensoría del Pueblo	El fallo fue a favor	Archivado
2016-0056	10 Penal Mpal.	Ludwing Mantilla	El fallo fue a favor	Archivado
2016-0120	5o P. M. F.C.	Mariela Cuadros	El fallo fue a favor	Archivado
2016-0085	5° P. M. F.C.	Lizeth J. Sanabria	El fallo fue a favor	Archivado
2016-0084	1°. Civil Municipal	Marisol Cardenas	El fallo fue a favor	Archivado
2016-0112	5° P. M. F.C.	Jose Williams Ruiz	Se declaró improcedente pero se ordenó retirar bolardos	Archivado
2016-0112	5° P. M. F.C.	Oscar J. Estevez	Se declaró improcedente pero se ordenó retirar bolardos	Archivado
2016-0112	5° P. M. F.C.	Luis Carlos Pinto	Se declaró improcedente pero se ordenó retirar bolardos	Archivado
2016-0112	5° P. M. F.C.	Fredy Gonzalez	Se declaró improcedente pero se ordenó retirar bolardos	Archivado
2016-0112	5° P. M. F.C.	Margarita Macias	Se declaró improcedente pero se ordenó retirar bolardos	Archivado
2016-0112	5° P. M. F.C.	Leonor Araque	Se declaró improcedente pero se ordenó retirar bolardos	Archivado
2016-0112	5° P. M. F.C.	Elsa Niño de Arias	Se declaró improcedente	Archivado

			pero se ordenó retirar bolardos	
2016-0112	5° P. M. F.C.	Eloina Bareño	Se declaró improcedente pero se ordenó retirar bolardos	Archivado
2016-0112	5° P. M. F.C.	Audrey García	Se declaró improcedente pero se ordenó retirar bolardos	Archivado
2016-0296	16 Civil Municipal	Andrés M. Rincón	El fallo fue a favor	Archivado
2016-0316	20 Civil Municipal	Tatiana A. Beltran	El fallo fue a favor	Archivado
2016-0320	23 Civil Municipal	Ana Diva Esteban	El fallo fue a favor	Archivado
2016-0329	12 Civil Municipal	Luis F. Ballesteros	El fallo fue a favor	Archivado
2016-0112	5° P. M. F.C.	Orlando Ali Mendoza	Se declaró improcedente pero se ordenó retirar bolardos	Archivado
2016-0075	16 P.M. F.C.G.	Ana Milena Granados	El fallo fue a favor	Archivado
2016-0404	2° Lab.de Peq.C.	Rosalba Tellez	El fallo fue a favor	Archivado

Trámites y respuestas a incidentes de desacato, en acciones populares a cargo de otras dependencias (Planeación, Secretaría del Interior y DADEP). Dentro de estos trámites se ejecutaron obras en los siguientes procesos.

RADICADO	JUZGADO	DEMANDANTE	ESTADO ACTUAL
2012-0184	15 Administrativo	John Eduard Jaimes	Se incluyo en contrato
2009-0326	15 Administrativo	Salvador Serrano Ariza	Fallo Cumplido
2008-0098	15 Administrativo	Daniel Villamizar Basto	Fallo Cumplido
2010-0412	15 Administrativo	Martin Alberto Sarmiento	Fallo Cumplido
2009-0351	15 Administrativo	Salvador Serrano Ariza	Fallo Cumplido
2009-0394	15 Administrativo	Jaime Orlando Martínez	Fallo Cumplido
2010-0292	15 Administrativo	Erik Roney Chaparro	Fallo Cumplido
2009-0358	15 Administrativo	Jaime Orlando Martinez	Fallo Cumplido

ACCIONES POPULARES:

Sentencias a favor **7**
Sentencias en contra **5**

PROCESO No.	JUZGADO	SENTENCIA	ORDEN JUDICIAL	ESTADO ACTUAL
2012-0157	15 Administrativo	FALLO A FAVOR	No condeno al Municipio	Archivado
2010-0160	15 Administrativo	En contra	Adecuar espacio público carrea 34 con 35	Archivado
2014-0189	5° Administrativo.	A FAVOR	Sentencia a favor (terminó con Pacto)	Archivado
2012-0161	6 Administrativo	EN CONTRA	Se condeno al Municipio	Cierre Incidente Archivado
2015-0090	4° Administrativo	A FAVOR	No se condenó al Municipio	En apelación
2012-0098	9 Administrativo	A FAVOR	No condeno al Municipio	Archivado
2013-0220	7° Administrativo	A FAVOR	No se condenó al Municipio	Archivado
2010-0406	6° Administrativo	A FAVOR	No se condenó al Municipio	Archivado
2013-0288	1° Administrativo	EN CONTRA	Se condenó al Municipio	En apelación
2014-0183	11 Administrativo	A FAVOR	No se condenó al Municipio	Archivado
2011-0035	T.A.S.	A FAVOR	No se condenó al Municipio	Archivado
2015-0118	9° Administrativo	EN CONTRA	Se condenó al Municipio	En apelación
2013-0330	14 Administrativo	EN CONTRA	Se condenó al Municipio	En apelación

En la Oficina Jurídica de la Secretaría de Infraestructura igualmente se adelantaron las siguientes funciones relacionadas con la defensa judicial del Municipio:

- **Veinte (20)** procesos de Acciones Populares. Se logró el archivo de estos procesos
- **dos (2)** Demandas nuevas contestadas durante el periodo.
- **siete (07)** diligencias de audiencia en los Juzgados
- **cuatro (4)** tramites de pago a los actores Populares
- **dos (2) Reuniones.** Se asistió en representación de la Sec. Infraestructura
- **seis (06) Comités.** Asistencia a citación para Comité de Conciliación.

10. CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: GOBERNANZA DEMOCRÁTICA

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2016	LOGRO 2016
CONSTRUIR Y MANTENER 1 PUNTO VIVE DIGITAL.	Construir y mantener 1 punto VIVE DIGITAL.	1	1	0

Actualmente se adelanta el proceso para el Mantenimiento de la Planta Física de Puntos Vive Digital en el Municipio de Bucaramanga, por un valor \$ 85.574.024,79, se espera el cumplimiento de este indicador en el Cuarto trimestre de la presente vigencia.

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2016	LOGRO 2016
GESTIÓN INTELIGENTE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL.	Adquirir el 100% de los predios requeridos para la ejecución de obras de desarrollo para la ciudad.	100%	100%	0

En cuanto al porcentaje de predios adquiridos para la ejecución de obras, la meta para el cuatrenio es que por cada vigencia se adquieran los predios requeridos para dar trámite a los diferentes procesos que se desarrollan por la Secretaría de Infraestructura, hasta el momento no se ha requerido la compra de predios para los proyectos desarrollados.

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2016	LOGRO 2016
UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES	Realizar el 100% de los diseños, estudios, consultorías e interventorías para ejecutar los proyectos y las obras del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 y otros planes de ciudad.	100%	100%	100%

En cuanto a la realización de los diseños, estudios, consultorías e interventorías requeridos, la meta para el cuatrenio es que por cada vigencia se realicen los estudios, diseños, estudios, consultorías e interventorías requeridos por cada programa para el correcto funcionamiento de los mismos, por lo tanto esta meta se ha cumplido el 100%.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: INCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2016	LOGRO 2016
ADULTO MAYOR Y DIGNO	Adecuar y/o Readecuar 3 Centros Vida.	3	1	0

Actualmente se adelanta el proyecto bajo el registro No. 20160680010196, para la terminación de la Fase II de la CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, se espera en el cuarto trimestre de 2016, darle cumplimiento a este indicador.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2016	LOGRO 2016
REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE	Realizar 20 obras de mitigación en comunas que presenten riesgo de desastre.	20	1	1

Actualmente se encuentra contratado las obras de estabilización del Barrio Bucaramanga – Coca cola, contrato No. 43 de 2016.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: CALIDAD DE VIDA

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2016	LOGRO 2016
OBSERVAR Y SER OBSERVADO: FOMENTO AL TURISMO	Terminar el Centro de Convenciones - NEOMUNDO.	1	1	0

Se adelantan los trámites con el fin de poder realizar el giro de los recursos por valor de \$ 3.287.402.027,64, teniendo en cuenta que la obra será realizada por parte de FONTUR.

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2016	LOGRO 2016
INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO	Realizar mantenimiento anual al 100% de los parques "Ciudad de los parques".	100%	100%	100%

Actualmente se adelantan los procesos para el Mantenimiento de los parques las zonas verdes y actividades de poda y tala de árboles, adicionalmente se han realizado jornadas de limpieza a parques y zonas verdes dentro del programa maratón de aseo, labor que la Administración Municipal está desarrollando con la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga EMAB, Área Metropolitana de Bucaramanga y la Policía Nacional.

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2016	LOGRO 2016
INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO	Intervenir y/o construir 100 equipamientos comunitarios (sociales, deportivos y culturales: canchas sintéticas, multacentros deportivos, salones comunales, entre otros).	100	5	2

Para dar cumplimiento a este indicador se adelantó la remodelación del Coliseo Bicentenario, además del convenio con la fundación teatro Santander para la construcción de redes, se espera dar cumplimiento al finalizar la vigencia.

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2016	LOGRO 2016
INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO	Construir 30.000 M2 de andenes.	30.000	200	0

Para el cumplimiento de este indicador se pretende adicionar en valor al contrato de fallos de acciones populares, teniendo en cuenta los fallos pendientes por cumplimiento, se espera dar cumplimiento al finalizar la presente vigencia.

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2016	LOGRO 2016
INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO	Realizar 50 intervenciones en espacios públicos "La piel de la democracia".	50	5	0

Una vez se adicione el contrato de fallos de acciones populares para la recuperación del espacio público, se dará cumplimiento a este indicador.

LÍNEA ESTRATÉGICA 6: INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2016	LOGRO 2016
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA	Mejorar y/o construir 60.000 M2 de malla vial urbana.	60.000	3.000	0

Actualmente se adelanta el proceso No. SI-LP-002-2016 "OBRAS DE PARCHEO DE HUECOS, FALLOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES EN LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" por valor de \$ 1.319.458.103,82 y se espera que al terminar la vigencia se dé cumplimiento a este indicador.

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2016	LOGRO 2016
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA	Terminar la construcción de 3 megaobra.	3	1	0

Actualmente se encuentra en ejecución la obra "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INTERCAMBIADOR VIAL AVENIDA QUEBRADASECA CON CARRERA 15 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS", la cual presenta avance de obra del 95% y se espera que al terminar la vigencia se pueda dar cumplimiento a este indicador en un 100%.

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2016	LOGRO 2016
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA	Apoyar el 100% de la gestión para la estructuración de la nueva concesión vial de la Zona Metropolitana de Bucaramanga (ZMB).	100%	80%	100%

Se realizó el estudio de las condiciones de liquidación de la Concesión ZMB, así mismo se adelantó una evaluación de las obras ejecutadas y obras inconclusas, además se determinaron obras adicionales necesarias para la optimización de la malla vial.

Igualmente se realizó la estructuración de modelo de obra pública para la ejecución de proyectos a través de modelos independientes.

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2016	LOGRO 2016
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL RURAL	Mantener la transitabilidad de los 140 kms de vías rurales.	140%	140%	140%

En cuanto al Número de Km/carril de vías rurales con transitabilidad. Mantenido, la meta para el cuatrenio es que por cada vigencia se mantengan 140 Km/carril, por lo tanto ésta meta se ha cumplido al 100% en esta vigencia.

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2016	LOGRO 2016
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL RURAL	Beneficiar 3.448 usuarios con la cobertura de electrificación rural en los tres corregimientos.	3.448	250	0

Se adelanta gestión para beneficiar a 298 familias de la zona rural del Municipio de Bucaramanga, con recursos recaudo estampilla pro-electrificación rural Departamental y se encuentra por parte nuestra todo viabilizado los estudios técnicos de acuerdo a la metodología MGA departamento nacional de planeación con código de registro, así mismo se radicado y fue viabilizado por la Gobernación y se espera que a más tardar en el mes de Noviembre saquen el proceso contractual, para que sea adjudicado en la presente vigencia y se ejecuta la mayor parte en el primer semestre del 2017.

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2016	LOGRO 2016
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL RURAL	Garantizar el 92% de la cobertura del servicio de gas del sector urbano.	92%	92%	92%

Se ha mantenido el 92% de cobertura del servicio de gas natural domiciliario en la zona urbana de Bucaramanga, se espera que cuando se legalicen los Barrios se amplíe esta cobertura al 95%.

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2016	LOGRO 2016
ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL	Sustituir a LED 36.000 luminarias.	36.000	1.000	0

Se tiene proyectado con vigencias futuras realizar el cumplimiento de este indicador de la siguiente manera; (Comuna 2 y Villa Prado 1197 luminarias), de acuerdo al proyecto Administración, operación, mantenimiento, energía y facturación del Alumbrado Público del Municipio de Bucaramanga.

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2016	LOGRO 2016
ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL	Expandir 1.000 luminarias.	1.000	200	0

Se tiene proyectado con vigencias futuras realizar el cumplimiento de este indicador de la siguiente manera; (Vía Cenfer: 374 luminarias) de acuerdo al proyecto Administración, operación, mantenimiento, energía y facturación del Alumbrado Público del Municipio de Bucaramanga.

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2016	LOGRO 2016
ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL	Elaborar 1 proyecto de acuerdo municipal para la exención del alumbrado público de la zona residencial rural.	1	1	0

Se realizó la gestión ante la Secretaria de Hacienda Municipal, para que se incluya dentro del Nuevo Estatuto Tributario la exención del AP de la Zona residencial rural, se espera que este sea presentado ante el Honorable Concejo Municipal.

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2016	LOGRO 2016
ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL	Instalar y poner en marcha 50 puntos de telediagnóstico.	50	5	0

Se tiene proyectado con vigencias futuras realizar el cumplimiento de este indicador de la siguiente manera; (Vía Cenfer: 4 medidores, parque guayacanes 1 medidor, los recursos están incluidos en los contratos de expandir 1000 luminarias y en parque guayacanes) de acuerdo al proyecto Administración, operación, mantenimiento, energía y facturación del Alumbrado Público del Municipio de Bucaramanga.

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2016	LOGRO 2016
ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL	Modernizar el alumbrado público de 20 parques y/o escenarios públicos.	20	3	0

Se tiene proyectado con vigencias futuras realizar el cumplimiento de este indicador de la siguiente manera; (Parque Guayacanes: 4 canchas) de acuerdo al proyecto Administración, operación, mantenimiento, energía y facturación del Alumbrado Público del Municipio de Bucaramanga.

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2016	LOGRO 2016
ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL	Instalar el alumbrado público al 100% de los nuevos espacios públicos.	100	100%	0

Para el cumplimiento de este indicador se debe tener nuevos espacios públicos y a la fecha se encuentran en proceso, se espera dar cumplimiento al finalizar la presente vigencia.

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2016	LOGRO 2016
ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL	Mantener en funcionamiento al menos el 96% de las luminarias.	96	96%	96%

De acuerdo al mantenimiento que se realizad de acuerdo a solicitudes de la comunidad se ha podido dar cumplimiento a este indicador.

11. RESPUESTA A OFICIOS Y/O DERECHOS DE PETICION

PRIMER TRIMESTRE DE 2016

Oficios recibidos: 1602
Respuestas: 1373

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016

Oficios recibidos: 2.096
Respuestas: 1.902

**12. TOTAL INVERSION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
A 30 DE JUNIO DE 2016**

Programas Plan de Desarrollo 2016-2019

PROGRAMAS	INVERSION	%
Una ciudad que hace y ejecuta planes	\$ 104.999.928,8	94,04
Servicios Públicos Urbanos y Rurales	\$ 6.658.071,68	5,96
TOTAL	\$ 111.658.000,48	100 %

Inversión en la vigencia 2016 a los programas del Plan de Desarrollo 2012-2015 antes de que se aprobara el Nuevo Plan de Desarrollo

PROGRAMAS	INVERSION	%
Escenarios para la Gente	\$ 5.243.683.908,45	22,97
Conocimiento Prevención y Reducción del Riesgo	\$ 1.608.416.915,67	7,04
Ordenamiento del Territorio	\$ 63.993.140	0,28
Servicios Públicos Amigables	\$ 12.157.053.457,76	53,25
Obras con Participación Ciudadana	\$ 445.913,00	0,00
Fortalecimiento Institucional	3.757.127.027,64	16,46
TOTAL	\$ 22.830.720.362,52	100%

INVERSION TOTAL A 30 DE JUNIO DE 2016	\$ 22.942.378.363,00
--	-----------------------------
