



INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad

INFORME DE GESTION PRIMER SEMESTRE DE 2019

El presente informe resume los principales avances que la Secretaria de Infraestructura ha generado en los diferentes programas que conforman el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Gobierno de las Ciudadanas y los Ciudadanos”. Durante el primer Semestre de 2019 ha ejecutado y realizado las gestiones pertinentes para el control del avance de las diferentes obras que ejecuta la Secretaria.

A continuación se detalla la gestión que ha realizado la Secretaria de Infraestructura en el primer Semestre de 2019.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: GOBERNANZA DEMOCRÁTICA

1.1 PROGRAMA: PRESUPUESTOS INCLUYENTES

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Número de comunas con obras comunitarias ejecutadas con presupuesto participativo.	17	1	\$ 6.937.298	\$ 1.796.198	0


Durante la vigencia 2019, se tienen estructurados los proyectos los diferentes grupos de presupuestos participativos, en las cuales se ha adelantado las siguientes gestiones: En salones comunales se encuentra en proceso de contratación bajo el número **SI-LP-012-2019** y su fecha de iniciación está programada para el próximo mes de Agosto.

El proyecto de andenes y pasamanos se encuentra en proceso de contratación bajo el número **SI-LP-026-2019**, por valor de \$1.008.335.088.

El proyecto de malla vial urbana se encuentra en proceso de contratación bajo el numero **SI-LP-013-2019**, igualmente el proyecto de placa huellas también se encuentra en proceso de contratación bajo el numero **SI-LP-022-2019**.

Así mismo se encuentra en formulado el proyecto Adecuación y mejoramiento de equipamiento urbano (quioscos, plazolas, jugos infantiles, gimnasios, entre otros) por valor de \$ 3.761.199.172 bajo el SSEPI 2019-0680010115 y próximo a iniciar proceso de contratación.

El contrato de andenes y pasamanos de la vigencia 2018, se le realizo adicional en valor, y se encuentran en ejecución como se detallan a continuación:



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
210 de 2018	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ANDENES, PASAMANOS Y ESCALERAS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER	\$ 1.343.937.014,91	19/09/2018	29/07/2019

Estado: Avance de obra: 73.28% - en ejecución

REGISTRO FOTOGRAFICO

SECTOR CENTRO

Calle 31 entre carreras 13 esquina sur occidental



SECTOR GOMEZ NIÑO

Calle 56 entre carreras 13 costado norte



SECTOR ANTONIA SANTOS

Carrera 25 entre calles 31 y 32 costado occidental



Los contratos de escenarios deportivos de la vigencia 2018 se adicionaron en valor en la presente vigencia, como se muestra a continuación:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
256 de 2018	MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS E INSTALACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE Y JUEGOS INFANTILES, VIABILIZADOS POR EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO II	\$ 775.839.494,9 Valor adicional \$ 284.232.672,40	02/11/2018	30/07/2019

Estado: Avance de obra: 100% - En proceso de liquidación



BARRIO ESPERANZA III



BARRIO GIRARDOT



BARRIO CEIBA



BARRIO BRISAS DEL MUTIS



BARRIO VILLA HELENA



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
258 de 2018	MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS E INSTALACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE Y JUEGOS INFANTILES, VIABILIZADOS POR EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO I	\$ 865.122.208,42 Adicional \$ 179.108.571,86	02/11/2018	05/07/2019

Estado: Avance de obra: 100% - En proceso de liquidación



BARRIO BOSQUES DEL CACIQUE



ALTOS DEL CACIQUE




BARRIO DIAMANTE I



BARRIO LA LIBERTAD ESCENARIO DEPORTIVO



BARRIO 20 DE JULIO

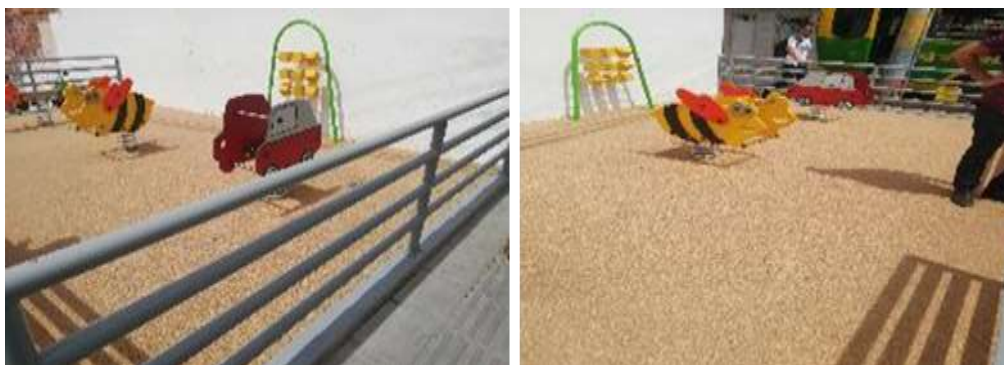

1.2 PROGRAMA: GESTIÓN INTELIGENTE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Porcentaje de predios requeridos adquiridos para la ejecución de obras de desarrollo para la ciudad.	100%	100%	\$ 0	\$ 0	0

En la presente vigencia a la fecha no se ha requerido adquirir nuevos predios, dado que las obras se están construyendo en predios de propiedad del municipio.



1.3 PROGRAMA: DISEÑO URBANO INTELIGENTE Y SUSTENTABLE

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Número de equipos de diseño de los talleres de arquitectura conformados y mantenidos.	1	1	\$ 800.000	\$ 800.000	0
Número de propuestas para proyectos básicos realizados que contengan los lineamientos de diseño urbano.	25	52	\$ 0	\$ 0	0

La Secretaria de Infraestructura cuenta con el personal de apoyo para la planificación de las obras de esta dependencia desde el inicio de la vigencia, así mismo este personal ha venido realizando los proyectos básicos que ejecuta la Secretaria.

1.4 PROGRAMA: UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Porcentaje de diseños, estudios, consultorías e interventorías realizadas para para ejecutar los proyectos y las obras del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 y otros planes de ciudad.	100%	100%	\$ 893.349	\$ 893.349	0

En este programa se encuentran todos los diseños, estudios, consultorías e interventorías para ejecutar los proyectos y las obras del Plan de Desarrollo 2016 – 2019.

Igualmente se continúa con la supervisión y control a través de proceso de interventorías de los proyectos que se encuentran en ejecución.



LINEA ESTRATEGICO 2: INCLUSIÓN SOCIAL

2.1. PROGRAMA: ADULTO MAYOR Y DIGNO

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Número de Centros vida adecuados y/o readecuados.	1	1	\$ 2.595.618	\$ 2.068.967	0

La Secretaria de Infraestructura adjudico el proceso **SI-LP-008 de 2019**, para el Centro vida Años Maravillosos, el cual consiste en la recuperación de la calle peatonal, rampas de acceso, mejoramiento de parqueaderos, arreglo de fachada, construcción de baños, adecuación del salón múltiple, mobiliario, ascensor, sendero peatonal, jardines, mesas de juego lúdico, cancha de bolo criollo, meta que se cumple en su totalidad con el siguiente contrato y que es preciso mencionar:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
204 de 2019	MEJORAMIENTO DEL CENTRO VIDA AÑOS MARAVILLOSOS EN LA CIUADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.068.967.088,83	Por iniciar	Por iniciar

Estado: Avance de obra: 0% - En proceso de legalización.


LINEA ESTRATEGICA 3: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

3.1 PROGRAMA: REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Número de obras de mitigación realizadas en comunas que presenten riesgos de desastre.	9	1	\$ 0	\$ 0	\$ 536.462

La Secretaria de Infraestructura firmo convenio Interadministrativo para la construcción de un muro, el cual es preciso mencionar:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
226 de 2019	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS, FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	\$ 1.072.924.729,93 Aporte Municipio Floridablanca	Por iniciar	Por iniciar

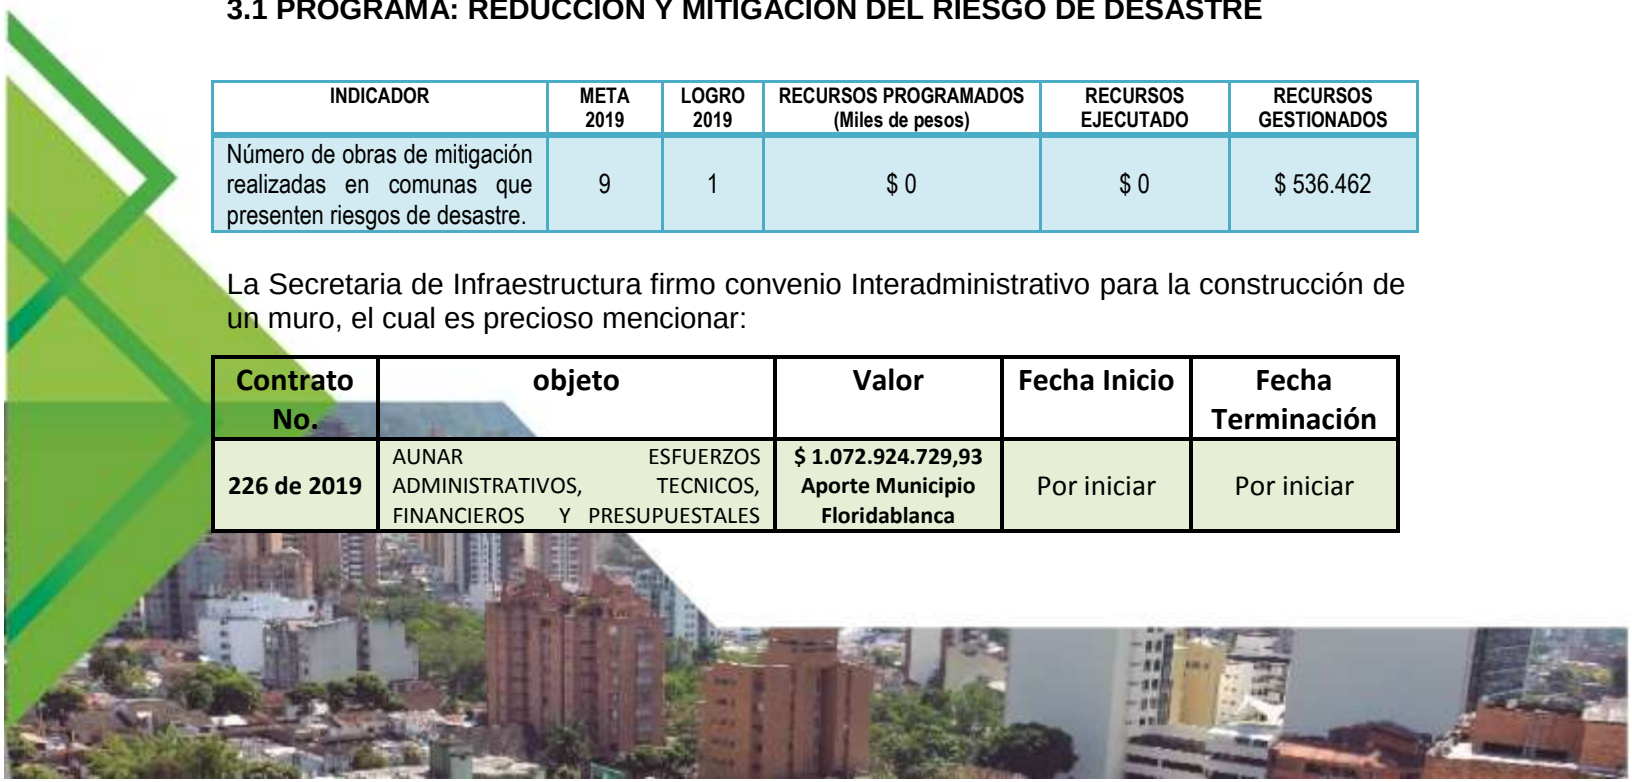

ENTRE EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PARA LA MITIGACION DEL RIESGO DE DESLIZAMIENTO SOBRE LA CARRERA 34 ENTRE LA CALLE 98 Y LA CALLE 104 DEL BARRIO BELLAVISTA CASAS COSTADO POSTERIOR DEL CONJUNTO RESIDENCIAL BALCON DEL TEJAR V ETAPA DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA AP 2002-2646 DEL DOS (02) DE AGOSTO DE 2006 EMITIDA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER.	(\$ 536.462.364,96) Aporte Municipio de Bucaramanga (\$ 536.462.364,96)		
---	--	--	--

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: CALIDAD DE VIDA

4.1 PROGRAMA: AMBIENTES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Número de parques RECREAR adecuados y/o modernizados.	1	1	\$ 7.607.669	\$ \$ 7.607.669	0

La Secretaria de Infraestructura adelanto el siguiente proyecto en el parque RECREAR, el cual consiste en el mejoramiento de 3 canchas múltiples, mejoramiento de 3 piscinas, construcción del edificio de acceso y parqueaderos, construcción de zonas húmedas (baños, sauna, turco), construcción de cafetería, construcción de 5 quioscos, construcción de una biblioteca pequeña, mejoramiento de senderos peatonales, mejoramiento de la plazoleta de eventos, instalación de juegos infantiles de 0 a 7 años y de 7 a 15 años, la construcción de un salón de reuniones, remodelación de red hidrosanitaria, eléctrica e instalación de luminarias, adecuación de área de gimnasios y la instalación de aparatos para gimnasia, así como el mobiliario urbano. La intervención se estima en 4.136 metros cuadrados, contrato con el cual se da cumplimiento total a este indicador:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
151 de 2019	MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 7.297.395.222,86	04/06/2019	03/12/2019

Estado: Avance de obra: 2,38% - En ejecución





4.2 PROGRAMA: OBSERVAR Y SER OBSERVADO: FOMENTO AL TURISMO

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Número de espacios garantizados del centro de convenciones de Bucaramanga como eje central del desarrollo del turismo de reuniones en el municipio.	1	1	\$ 0	\$ 0	0

El centro de convenciones neomundo se encuentra al servicio de la Comunidad, por lo que fue reportado en la presente vigencia.

4.3 PROGRAMA: INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Porcentaje de parques con mantenimiento anual realizado.	100%	100%	\$ 5.177.330	\$ 4.977.331	0

La administración Municipal a través de la Secretaria de Infraestructura adelanto convenio con la EMAB, el cual se encuentra en ejecución:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
4 de 2019	MANTENIMIENTO DE PARQUES, ZONAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER, EN LOS SECTORES INDICADOS	\$ 4.977.330.765,00	04/02/2019	31/12/2019



	POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO			
--	--	--	--	--

Estado: Avance de Obra: 45,45% - En ejecución

Dentro del presente Contrato Interadministrativo se está realizando rocería a las zonas verdes ubicadas en Parques, separadores y vías del Municipio de Bucaramanga, asignación de 77 parqueros distribuidos en 69 Parques y Zonas verdes, Mantenimiento de Prado y Siembra de Prado.

Durante el Primer Trimestre debido a las condiciones climáticas que se presentó el proceso de siembra de prado se aplazó, una vez iniciado el periodo de lluvias se programó la siembra de Prado, A continuación se relaciona los sitios donde se ha instalado la grama.

- **Siembra de Prado**

ITEM	DIRECCION	GRAMA M2
1	CANCHA TENIS PARQUE LOS NIÑOS	80
2	PARQUE 3B MURAL	70
3	CENTRO SALUD CAFÉ MADRID	250
4	BAÑOS PUBLICOS PARQUE LOS NIÑOS	85.6
5	GLORIETA CR 27 MESON BUCAROS	314.4
6	CANCHA TENIS PARQUE LOS NIÑOS	903
7	PARQUE EL ROCIO	101
8	PARQUE CALLE 113 CR 21 PROVENZA	96
TOTAL PRADO SEMBRADO		1900



Registro Fotográfico

Cancha Tenis Parque Los Niños



Parque El Rocío



Registro Fotográfico: Rocería

SEPARADOR NOVENA PUENTE PROVINCIAL



INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad



PUERTA DEL SOL



INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Número de equipamientos comunitarios (sociales, deportivos y culturales: canchas sintéticas, muulticentros deportivos, salones comunales, entre otros) intervenidos y/o construidos.	35	22	\$ 43.310.648	\$ 12.485.652	0

Las siguientes son las actividades que dan cumplimiento a la meta referida:



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
09 de 2019	AUNAR ESFUERZOS EN LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD PARA EL ACCESO GRATUITO A INTERNET A TRAVÉS DE LAS ZONAS WI-FI DE LA COMUNIDAD DE BUCARAMANGA SANTANDER.	\$ 1.266.893.693	25/01/2019	31/12/2019

Actualmente se encuentra el servicio en las zonas WIFI en los sitios establecidos, desde el inicio del convenio.

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
112 de 2019	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA TERMINACION DEL EDIFICIO DE APOYO TEATRO SANTANDER Y TEATRINO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES (EMA) EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 4.057.438.420	22/03/2019	21/10/2019

De los \$ 4.057.438.420 se ha efectuado un desembolso inicial del 50% por \$2.028.719.210, los cuales la Fundación Teatro Santander ha ejecutado en la compra de equipos de Audio y video, instalaciones hidrosanitarias, pisos y enchapes, estuco y pintura, y equipos de baños; teniendo en general un **avance aproximado al 15%** del total del convenio. A la fecha se encuentra contratado en su totalidad este primer desembolso y se adelanta el informe para realizar el segundo cobro del 30% (\$ 1.217.231.526) para continuar con las actividades.



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
153 de 2019	"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA BODEGA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA PUERTA DEL SOL, LA COMISARÍA DE FAMILIA DEL BARRIO LA JOYA Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LOS LOCALES DONDE FUNCIONA LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE BUCARAMANGA, SANTANDER"	\$ 29.008.104	27/05/2019	11/07/2019

Estado: Avance de obra: 100% -En proceso de liquidación

BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO (Mantenimiento y reparaciones en la cubierta para subsanar filtraciones y humedades en predio colindante por el costado norte).



COMISARIA DE FAMILIA DEL BARRIO LA JOYA (Reparaciones para subsanar filtraciones de aguas servidas por el costado occidental)



LOCAL CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL (Adecuaciones para independizar local 110, entrada 8, de la Uranización Plaza Mayor de la Ciudadela Real de Minas).



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
186 de 2019	"ADECUACION PLAZOLETA DE LA DEMOCRACIA DEL CENTRO ADMINIS-TRATIVO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, SANTANDER"	\$ 288.727.643,16	11/06/2019	10/08/2019

Estado: Avance de obra: 12% -En ejecución

A la fecha se han realizado las siguientes actividades:

1. Localización y replanteo
2. Cerramiento del lote donde se ejecuta el proyecto de la plazoleta.
3. Demolición de piso en piedra de acuerdo a los diseños.
4. Demolición de placa en concreto que se encuentra debajo de la placa piso en piedra.





Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
196 de 2019	MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO I	\$ 1.063.680.300	Por iniciar	Por iniciar
197 de 2019	MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO II	\$ 1.371.448.073		

Estado: Avance de Obra: 0% - En proceso de legalización

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
205 de 2019	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DE ATLETISMO LUIS ENRIQUE FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER	\$ 7.328.306.699,1	Por iniciar	Por iniciar

Estado: Avance de Obra: 0% - En proceso de legalización

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
234 de 2019	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE CENTRALIDAD NORTE EN EL TEJAR NORTE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 4.528.233.551,23	Por iniciar	Por iniciar

Estado: Avance de Obra: 0% - En proceso de legalización



INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Porcentaje de avance en la construcción del subsector del parque lineal Rio de Oro.	40%	15%	\$ 0	\$ 0	0

Este proyecto fue ejecutado por el Área Metropolitana de Bucaramanga, el porcentaje del 85% fue en la vigencia 2018 y el porcentaje del 15% obedece a la obra final que se realizó en la presente vigencia, por lo cual este indicador ya se encuentra cumplido en su totalidad.

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Porcentaje de recuperación de la estación Café Madrid.	40%	25%	\$ 0	\$ 0	0

El reporte a este indicado obedece al contrato que se menciona a continuación:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
71 de 2018	RECONSTRUCCIÓN DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DEL CAFÉ MADRID PARA LA HABILITACIÓN DE UN LUDOTECA EN EL BARRIO CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.254.823.459.69 Adicional (\$607.576.566,07)	12/03/2018	13/07/2019

Estado: Avance de Obra: 95% - El proyecto se encuentra actualmente suspendido mientras se obtiene la certificación RETIE – RETILAP



INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Número de estudios y diseños actualizados de la plaza San Mateo.	1	1	\$ 0	\$ 0	0

Los estudios y diseños actualizados de la plaza san Mateo se realizó a través del equipo del taller de arquitectura.



LINEA ESTRATEGICA 6: INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD

6.1 PROGRAMA: PROMOCIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Número de kms de ciclorutas para transporte urbano implementados.	10	17,33	\$ 14.973.409	\$ 13.786.020	0

La Secretaria de Infraestructura se encuentra ejecutado el siguiente contrato en cumplimiento de la meta referida así:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
161 de 2019	CONSTRUCCIÓN DE CICLO-INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO I	\$ 6.518.280.839	30/05/2019	26/12/2019
162 de 2019	CONSTRUCCIÓN DE CICLO-INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO II	\$ 6.260.637.436,76		

Estado: Avance de Obra: - Grupo I: 0.18% - Grupo II: 0.37%

El proyecto de **CONSTRUCCIONDECICLO-INFRAESTRUCTURA** se localiza en el Municipio de Bucaramanga, en los sectores comprendidos entre:

GRUPO I

Corredor 1 calle 9 desde la carrera 15 hasta la carrera 27.

Corredor 2 carrera 21 desde la calle 56 hasta la calle 5.

Corredor 4 bulevar Santander desde la carrera 15 hasta la carrera 24 y calle 14 desde la carrera 24 hasta la carrera 28.

Corredor 5 real de minas zona oriental calle 55 desde carrera 21 hasta la carrera 16, carrera 16 entre calle 55 y calle 4, calle 55 A entre carrera 14 y carrera 15 y calle 54ª

Corredor 6 parque García Rovira carrera 11 desde la calle 34 hasta la calle 33 y desde la calle 33 entre la carrera 11 hasta la carrera 26.

GRUPO II


Corredor 5 real de minas entre carrera 3w y 21

Corredor 8 calle 41 avenida la Rosita

Corredor 9 carrera 35 y 35ª entre calles 36 y 52

Corredor 10 articulación Guarín

Corredor 12 carrera 29 entre calle 41 y avenida Gonzales Valencia.

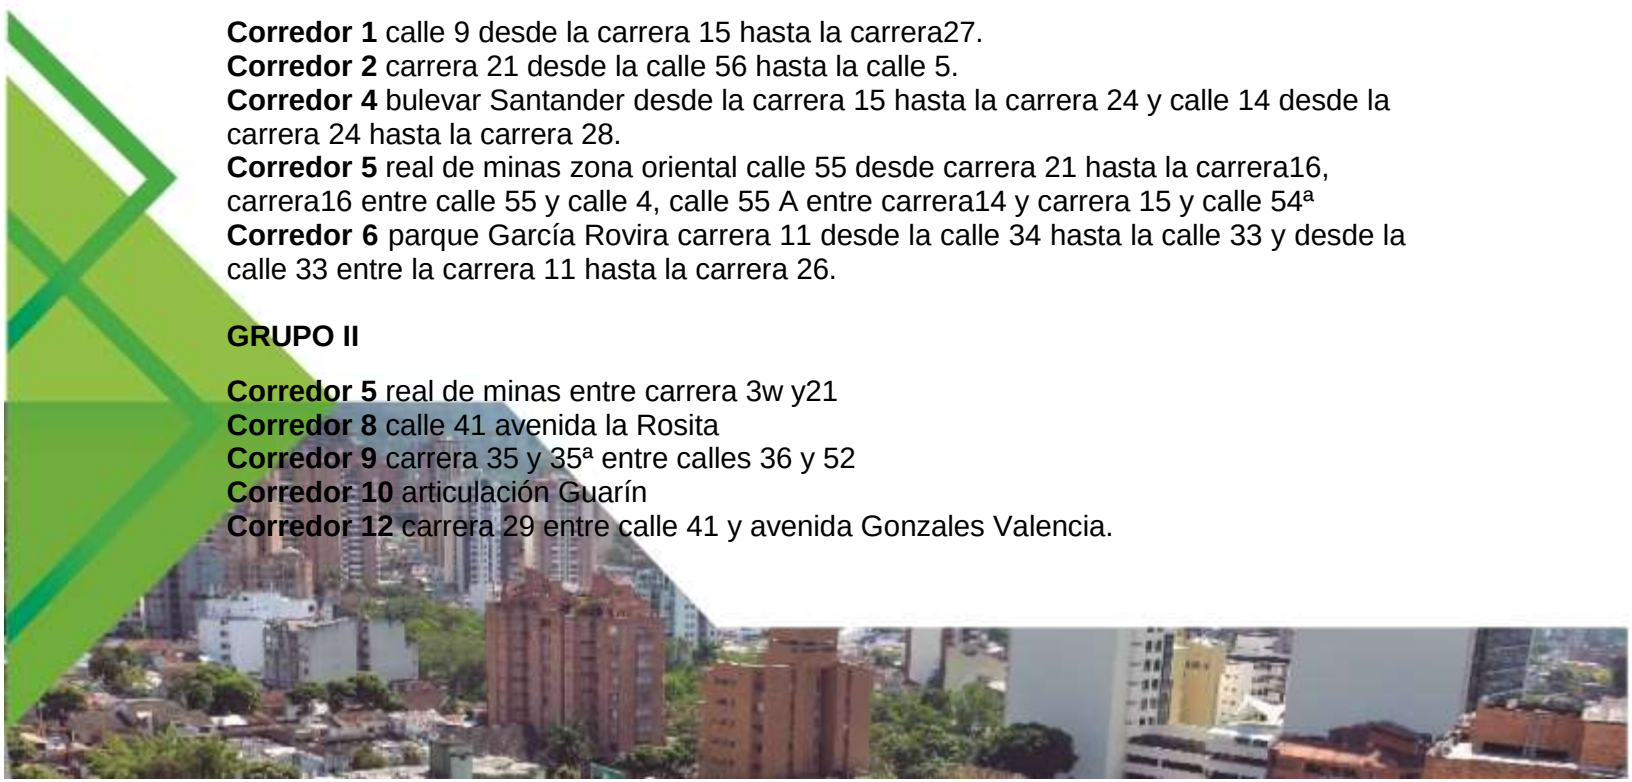

PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS

Demarcación de áreas de parcheo Corredor 1. Calle 9 entre Cra. 26 y Cra. 20.



LOCALIZACION Y REPLANTEO CORREDOR 2.




6.2 PROGRAMA: MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Número de M2 de malla vial urbana mejorados y/o construidos.	30.500	7.660	\$ 15.534.829	\$ 1.161.968	0

Las actividades que dan logro a este indicador se encuentran en proceso de contratación bajo el número SI-LP-013-2019 por valor de \$ 14.136.551.346, con fecha prevista de inicio el mes de Agosto de 2019.

Igualmente al contrato que se encontraba en ejecución se le adicionó valor y plazo que en la presente vigencia, el cual ya se encuentra terminado y en liquidación, como se ilustra a continuación:



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
176 de 2018	OBRAS DE PARCHEO DE HUECOS, FALLOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES EN LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.746.373.202,00 Adicional \$1.034'022.757,26	30/08/2018	20/05/2019


Estado: Avance de Obra: 100% - En proceso de liquidación

REGISTRO FOTOGRAFICO


BARRIO CIUDAD VENECIA SECTOR CALLE 93 ENTRE CRA 14 Y 13B Y CRA 14 ENTRE CALLES 95 Y 96



BARRIO DELICIAS ALTAS CALLE 104ª ENTRE CARRERAS 15 Y 16:

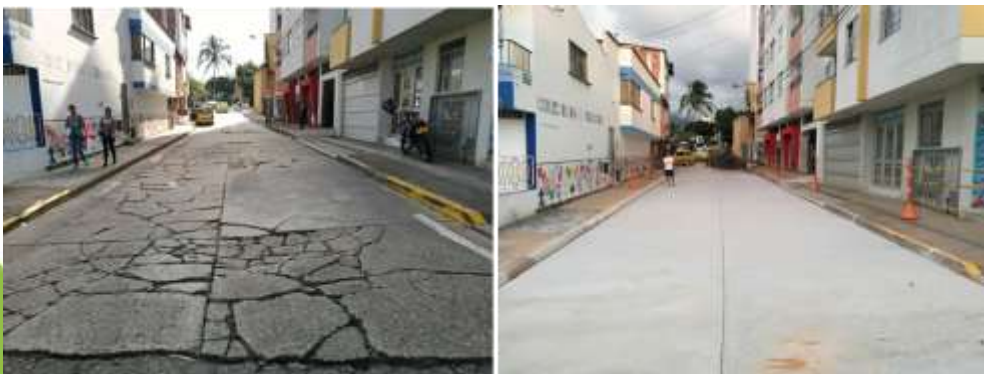

BARRIO SAN PEDRO CALLE 73 ENTRE CRA 28ª Y 29ª Y CARRERA 29 ENTRE CALLES 72 Y 73

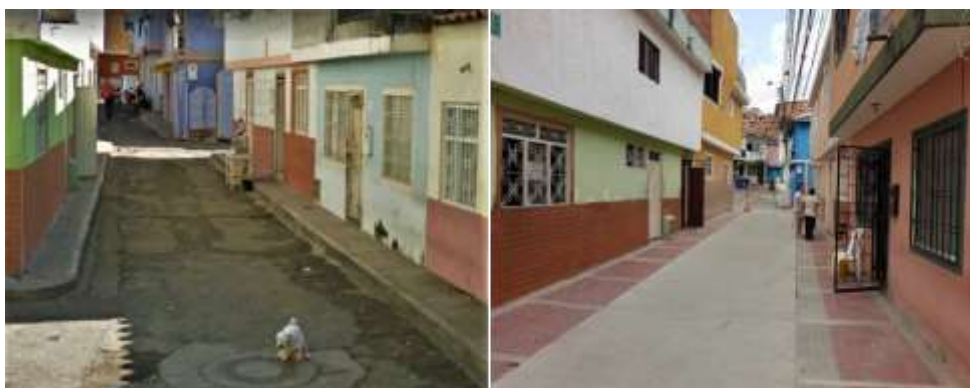

BARRIO PUERTO RICO VÍA VEHICULAR DE ACCESO AL BARRIO PUERTO RICO DIAGONAL 32C CON 9



6.3 PROGRAMA: MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL RURAL

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Número de kms de vías rurales con transitabilidad mantenida.	140	140	\$ 78.072	\$ 78.071	0

En la presente vigencia también se ejecutó el contrato de obra para atención de emergencias en la red veredal. Las siguientes son las actividades que dan cumplimiento a este indicador:



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
160 de 2019	PREVENCIÓN Y ATENCION DE EMERGENCIAS CON EL FIN DE HABILITAR Y BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"	\$ 60.071.625	20/05/2019	19/08/2019

Estado: Avance de Obra: 100% - En proceso de liquidación

Las intervenciones a la malla Vial Rural consiste en atender los puntos críticos de la red terciaria del Municipio de Bucaramanga en los corregimientos 1, 2, 3, de acuerdo a los puntos Geo-Referenciados. Veredas: Angelinos – San Cayetano – Santa Rita – Capilla Alta – Magueyes – Capilla Media y Baja – Retiro Chiquito – Retiro Grande.



Así mismo durante los meses de mayo y junio se atendieron los corregimientos 1 y 2 con la Maquinaria del Municipio (1 retroexcavadora, 1 voqueta y 1 minicargador) realizando actividades como: remoción de derrumbes, cuneteo y conformación de subrasante, provocados por la ola Invernal.

6.4 PROGRAMA: SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS Y RURALES

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Porcentaje de proyectos complementarios de obras de conducción para el embalse de Bucaramanga gestionados.	10%	10%	\$ 0	\$ 0	\$ 13.297.762

El cumplimiento a este indicador obedece a la gestión que realizó el Municipio de Bucaramanga con el Acueducto Metropolitano para realizar el contrato de obra pública No. 104 del 17 de Septiembre de 2018, para la CONSTRUCCION DE LA LINEA DE



ADUCCION DEL PROYECTO EMBALSE DE BUCARAMANGA (SECTOR SHALOM – BOSCONIA).

6.5 PROGRAMA: ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Número de luminarias expandidas.	300	36	\$ 320.000	\$ 35.000	0

A continuación las actividades quedan cumplimiento a la meta referida.

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
173 de 2019	EXPANSIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 446.384.674	28/05/2019	27/07/2019

Estado: Avance de obra 45% – En ejecución



Betania



La Floresta



Villa Alegría

Así mismo se realizó Instalación Luminarias Vía Vereda el Pedregal, con los Contratos de Mantenimiento que se encuentran en ejecución; No. 154, 155, 156 y 157 de 2019

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Número de puntos de teledirigida instalados y puestos en marcha.	20	6	\$ 1.650.000	\$ 1.621.316	0

Las actividades que dan cumplimiento a este indicador tienen los dos componentes, obra civil (Infraestructura) y Alumbrado público, Los puntos de teledirigida reportados son:



Edecanes, Tejar Norte 1, Granjas de Provenza, La Flora, Teatrino y Tejar Norte Cancha Sintética.

Así mismo se ejecutan otros contratos en cumplimiento del indicador referido.


Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
118 de 2019	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE ALUMBRADO PUBLICO-SGAP Y EL HARDWARE DE CONTROL EN LOS DIFERENTES SITIOS CON TELEMEDIDA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 161.581.351	01/04/2019	30/12/2019

Estado: Avance de Obra: 33.33% - En ejecución

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Número de parques y/o escenarios públicos modernizados en su alumbrado público.	7	8	\$ 7.553.926	\$ 1.263.469	0

Las actividades que dan cumplimiento a la meta referida son:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
209 de 2019	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - INVISBU Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LOS ESPACIOS RECREO-DEPORTIVOS, COMERCIO, LUDOTECA EN LA URBANIZACIÓN NORTE CLUB TIBURONES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"	\$ 215.358.304	20/06/2019	03/11/2019

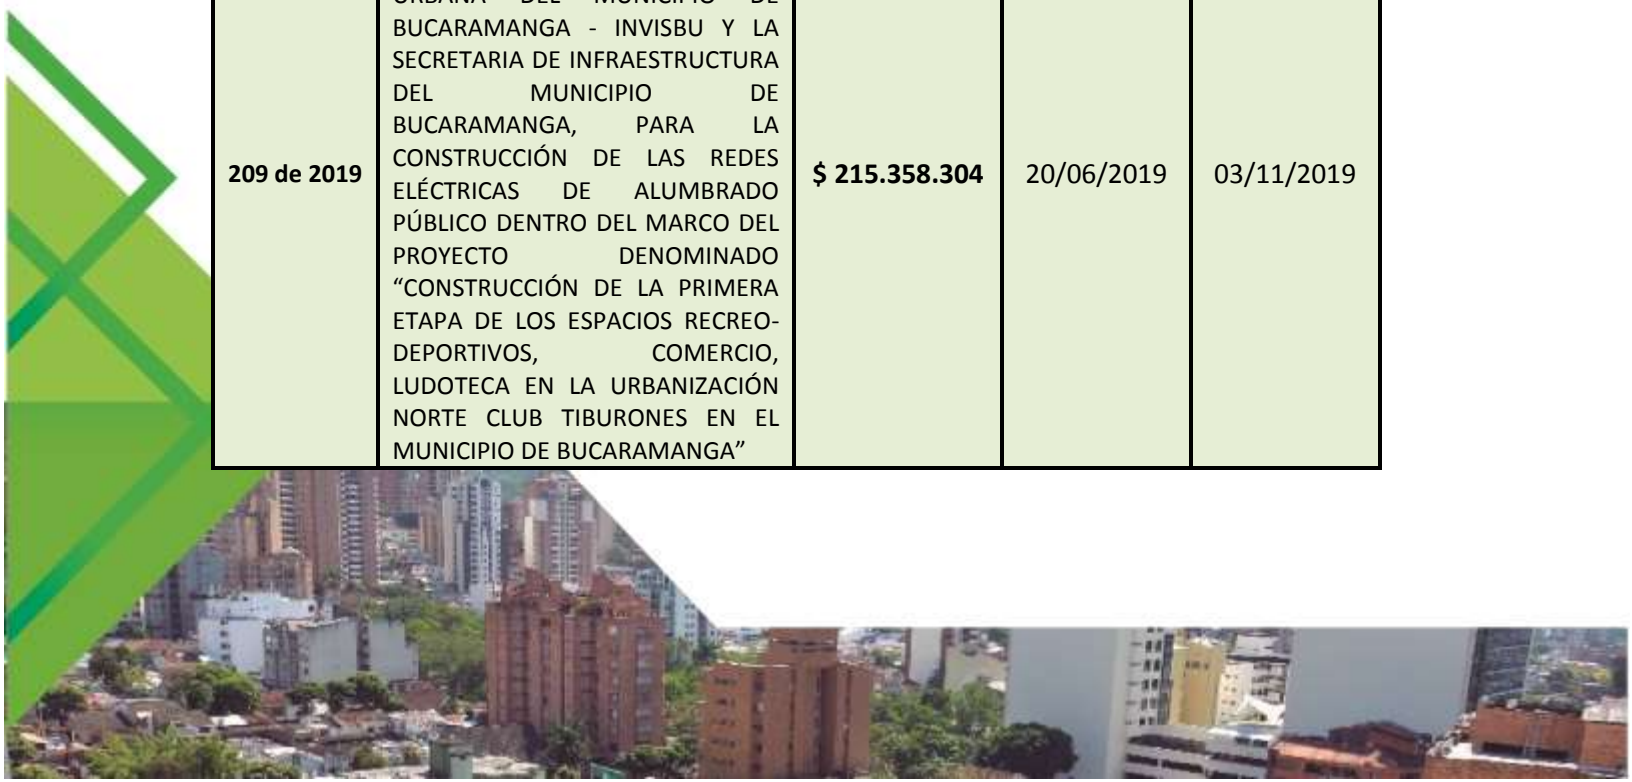

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
192 de 2019	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LOS CANELOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 161.581.351	27/06/2019	26/10/2019

Estado: Avance de obra: 0% – En ejecución –consta de 2 canchas de micro, 1 cancha de basketball, 1 parque y una vía.



Replanteo cancha
canelos

Así mismo con el Contrato de expansión No. 173 de 2019, da cumplimiento a este indicador con las siguientes canchas: Villa Alegría II, Betania, Campo Madrid, Villa luz campestre, La Floresta y Canchas del norte de Bucaramanga, además de las canchas del parque centralidad norte.

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Porcentaje de nuevos espacios públicos con alumbrado público instalado.	100%	100%	\$ 11.850.000	\$ 109.026	0

Este indicador se cumple con las obras civiles en los cuales se instala el alumbrado público

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Porcentaje de luminarias que se encuentran en funcionamiento.	96%	97%	\$ 31.934.006	\$ 14.221.936	0


Las actividades que dan cumplimiento a este indicador son los siguientes:



CONTRATOS MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO							
CONCEPTO	N° Cont	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	154	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, GRUPO N-01	22/05/2019	31/12/2019	\$ 554.559.219	BIOTECNOLOGIA - GRUPO 01	19,20%
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	155	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, GRUPO N-02	21/05/2019	31/12/2019	\$ 439.559.461	UT CIVACON - GRUPO 02	19,56%
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	156	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, GRUPO N-03	21/05/2019	31/12/2019	\$ 426.749.586	UT APB 2019 - GRUPO 03	19,56%
INTERVENTORIA ALUMBRADO PUBLICO	164	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	21/05/2019	31/12/2019	\$ 606.677.490	HCR INGENIEROS SAS	19,56%

SECTORES A INTERVENIR

- ❖ GRUPO 01 Intervienen: Comunas 4, 5, 7, 12, 17, Corregimiento 3 y Viaducto Provincial.
- ❖ GRUPO 02 Intervienen: Comunas 2, 3, 6, 8, 9, 14, 15 y Corregimiento 1
- ❖ GRUPO 03 Intervienen: Comunas 1, 10, 11, 13, 16 y Corregimiento 2






Igualmente a este indicador se suman los gastos operativos y administrativos de la Oficina de Alumbrado Público entre los cuales esta:

1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON BOLSA DE REPUESTOS DE LA UPS DE 6 KVA MARCA TOSHIBA DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
2. MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION A LOS SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA "GODMS", SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DE DIGITALIZACION DE REDES "SIIDAR", SISTEMA DE GESTION DE ALUMBRADO PUBLICO "GESTION EME", SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL "SCADO", PAGINA WEB UTILIZADOS POR LA OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE BUCARAMANGA
3. ARRENDAMIENTO AL MUNICIPIO, LA CASA UBICADA EN LA CARRERA 12 NO 33-51DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) PARA QUE ALLI FUNCIONEN LA OFICINAS Y LA BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL
4. AUDITORIA BAJO LA NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC ISO 50001:2011 A LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
5. COMPRAVENTA DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA, TINTAS Y TONERES PARA LA OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
6. Entre otros

7. INDICADORES QUE TIENE META PERO AUN NO ALCANZAN LOGRO A 30 DE JUNIO DE 2019

PROGRAMA: VIVE DIGITAL PARA LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Número de puntos vive DIGITAL construidos y mantenidos.	1	0	\$ 0	\$ 0	0



PROGRAMA: SENDEROS PARA LA VIDA

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Porcentaje de avance en la habilitación del subsector del gran bosque de los cerros orientales de escala metropolitana.	40%	0	\$ 6.800.000	\$ 0	0

PROGRAMA: INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Número de M2 de andenes construidos.	10.400	0	\$ 3.334.340	\$ 0	0

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Número de adecuaciones y/o mantenimientos realizados a las plazas de mercado a cargo del municipio.	2	0	\$ 542.180	\$ 0	0

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Número de intervenciones en espacio público "La piel de la democracia" realizadas.	15	0	\$ 0	\$ 0	0

PROGRAMA: SITM EFICIENTE Y CONFIABLE

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Número de puentes peatonales construidos.	1	0	\$ 0	\$ 0	0

PROGRAMA: MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL RURAL

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Número de ML de placa huella construidas.	4.000	0	\$ 3.845.449	\$ 0	0



En la actualidad se encuentra en proceso de contratación bajo el número SI-LP-022-2019, el cual se tiene previsto iniciar la obra el próximo mes de agosto.

PROGRAMA: SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS Y RURALES

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Número de unidades familiares beneficiadas con gas (sector rural).	60	0	\$ 0	\$ 0	0
Número de plantas de potabilización (sector rural) adquiridas.	10	0			
Número de acueductos (sector rural) repotenciados.	2	0			
Número de Plantas de Tratamiento de Agua Residuales - PTAR compactas adquiridas para el sector rural.	3	0			
Número de pozos sépticos construidos para el sector rural.	30	0			
Número de redes de acueducto y alcantarillado gestionados y/o construidos en barrios legalizados.	3	0			
Número de usuarios beneficiados con la cobertura de electrificación rural en los tres corregimientos.	1.669	0			
Número de acueductos veredales construidos.	0	0			

Gestiones realizadas para el cumplimiento de las metas: La Secretaria de Infraestructura para el cumplimiento de las metas de la repotenciación de los dos acueductos, se cuenta con los diseños y permisos de concesión de agua de las veredas Magueyes, Monserrate, Pedregal sector las Granjitas y Rosablanca, se cuenta con el banco de proyectos SSEPI - 2019-068- 0010098 por valor de \$ 512.024.948. (Anexo), el cual inicia su proceso de contratación a finales del mes de julio de 2019.

Para la construcción de los dos acueductos veredales, se cuenta con los diseños actualizados para las veredas Capilla Baja-Bolarqui Baja, proyecto que no ha podido radicarse ante el Banco de proyectos de inversión por la carencia del permiso de concesión de aguas de la quebrada la Aguada, gestión que únicamente puede realizar la comunidad, solicitud que se encuentra radicada ante la CDMB desde el 18 de julio de 2017 y a pesar de la insistencia por parte de esta entidad ante los líderes comunales y la



CDMB, no ha sido posible que la comunidad radique la totalidad de los documentos, según lo informa la CDMB mediante oficio del 5 de julio de 2019 (Anexo).

Ante la premura de licitar la obra, la Administración municipal realizó mesa de trabajo en el salón comunal de la vereda Capilla Baja, el pasado 8 de julio, donde la comunidad se comprometió a entregar los documentos faltantes a más tardar el 19 de julio de 2019. (se anexa acta de reunión). El costo del proyecto asciende a la suma de \$ 2.483 millones, el cual incluye planta de tratamiento, redes y 86 pozos sépticos.

En relación a los pozos sépticos se ha realizado la convocatoria para elegir a 210 usuarios, los cuales beneficiara a un promedio de 7 pozos por vereda, proyecto que a la fecha se encuentra en la etapa de estructuración y que se proyecta iniciar su proceso de contratación en el mes de Agosto de 2019.

Concerniente a las plantas de potabilización se tienen previsto construirlas en 10 Instituciones Educativas del sector rural, a la fecha se encuentra en estructuración del proyecto y se prevé realizar el proceso de contratación en el mes de Agosto.

PROGRAMA: ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL


INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Número de luminarias sustituidas a LED.	12.000	0	\$ 15.204.371	\$ 0	0

Se encuentra en proceso de contratación el suministro de luminarias mediante el proceso SI-SASI-004-2019

8. METAS QUE PESE A LA GESTION YA NO PRESENTARAN AVANCE

PROGRAMA: SALUD AMBIENTAL

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Porcentaje de avance en la construcción del centro de bienestar animal.	50%	0	\$ 0	\$ 0	0
Porcentaje de avance en la construcción del coso municipal.	50%	0	\$ 0	\$ 0	0

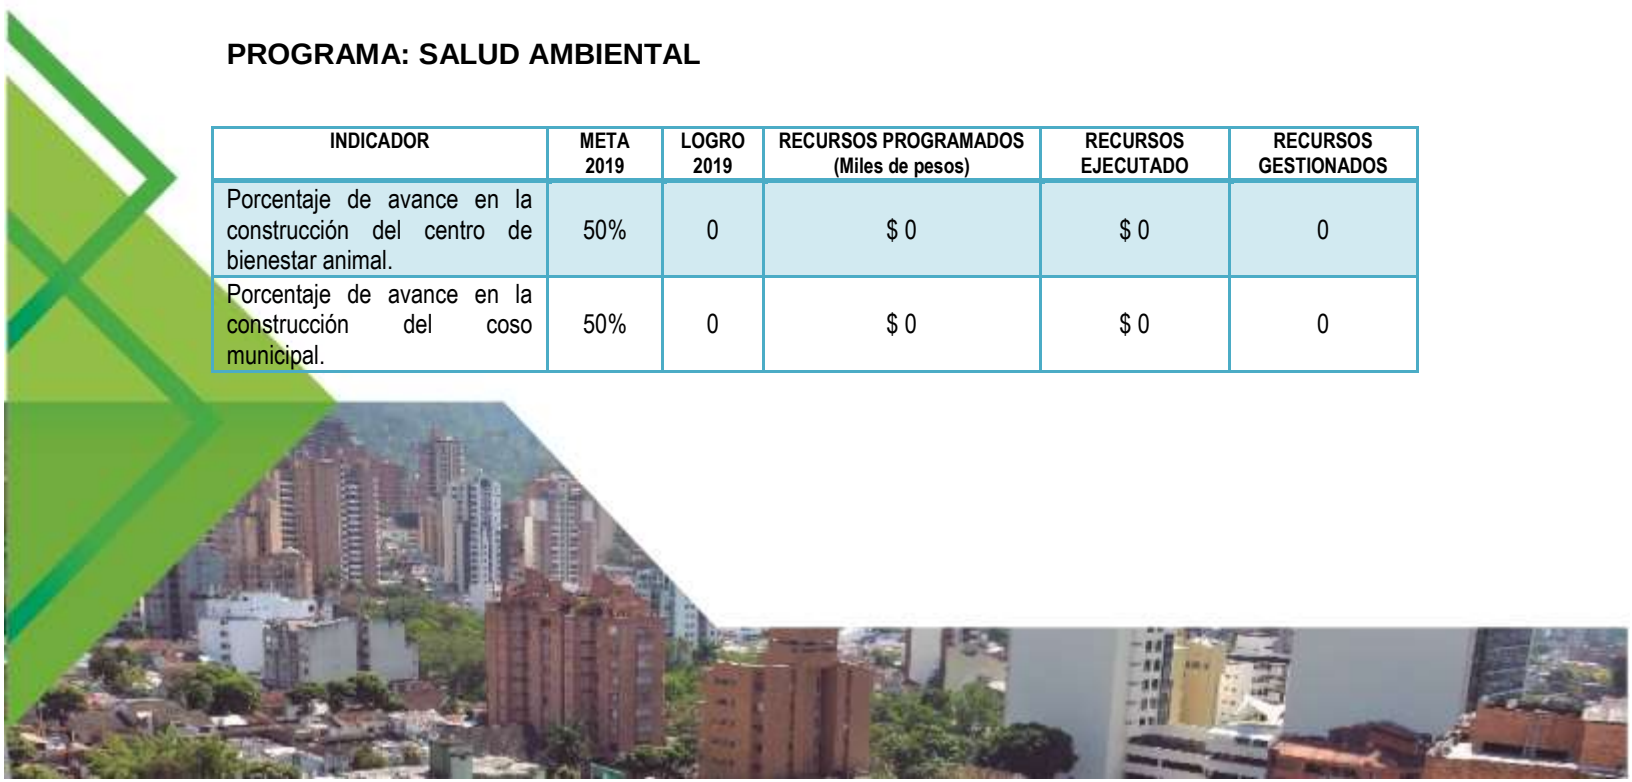

PROGRAMA: INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Porcentaje de avance en la rehabilitación de la plaza San Mateo.	50%	0	\$ 0	\$ 0	0
Porcentaje de avance en la construcción del subsector del parque sobre la quebrada la Esperanza.	50%	0	\$ 0	\$ 0	0
Porcentaje de avance en la construcción del subsector del parque lineal sobre la Quebrada la Iglesia.	40%		\$ 0	\$ 0	0
Porcentaje de recuperación paisajística del parque metropolitano del norte.	40%		\$ 0	\$ 0	0

PROGRAMA: PROMOCIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS


INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Porcentaje de avance en la evaluación del sistema de transporte alternativo para el norte.	50%	0	\$ 0	\$ 0	0

PROGRAMA: MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Porcentaje de avance en la evaluación del sistema de transporte alternativo para el norte.	80%	0	\$ 0	\$ 0	0

9. CONTRATOS QUE SE CONTINUAN EJECUTANDO EN LA PRESENTE VIGENCIA

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
178 DE 2018	MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS	\$ 2.359.817.188,38	13/08/2018	24/04/2019

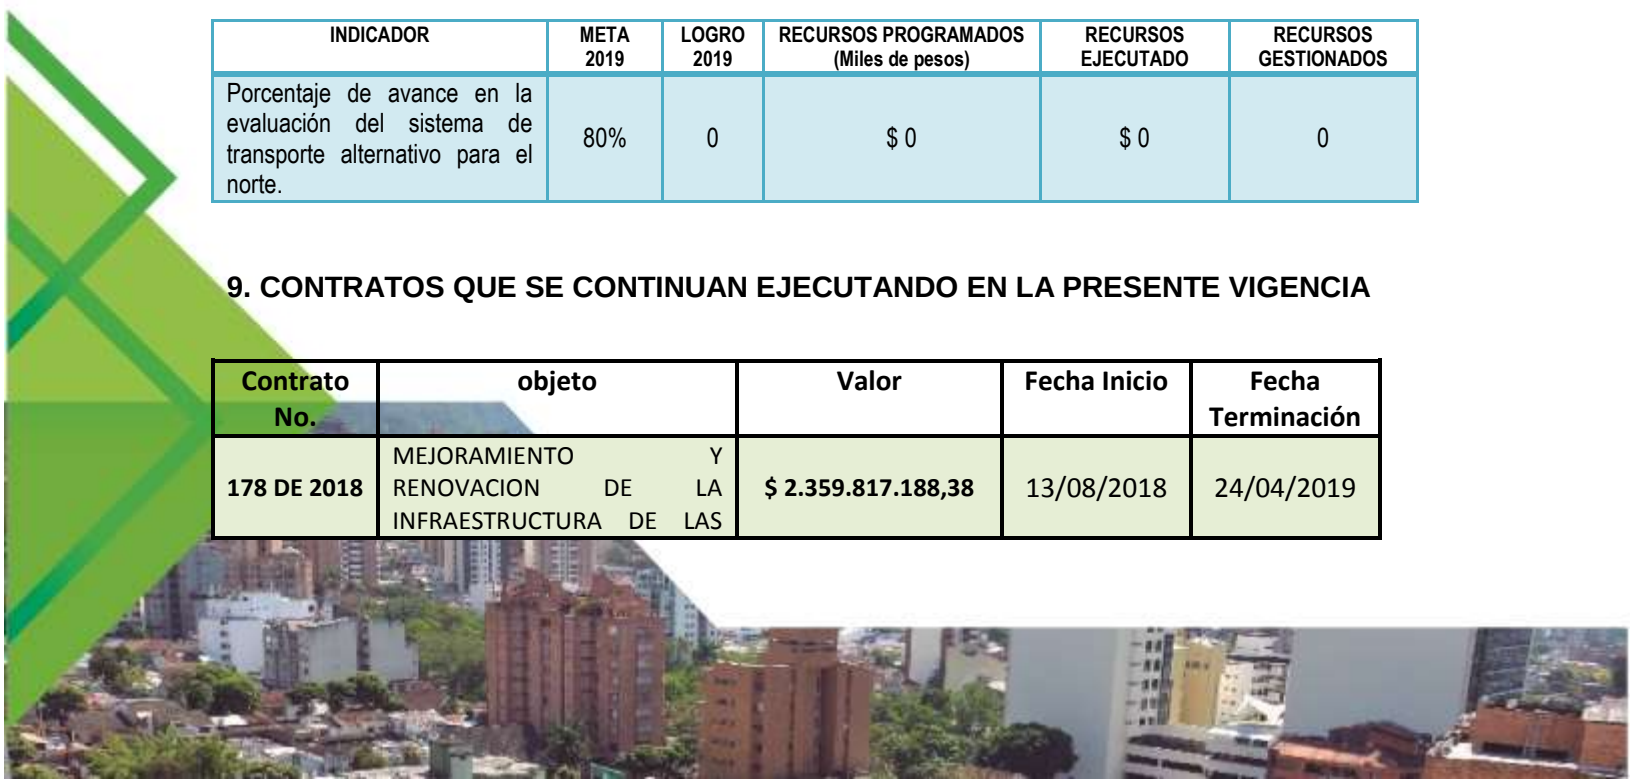

	CANCHAS DE TENIS DEL PARQUE DE LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			
--	--	--	--	--

Estado: Avance de obra: 98% -Suspendido

El contrato alcanza un avance del **98%**, encontrándose terminada su obra física. En este momento se encuentra suspendido debido a la demora en los trámites de aprobación para la conexión definitiva de los servicios públicos de energía y agua, y las certificaciones RETIE y RETILAB.




Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
349 DE 2018	INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.398.424.293,54	06/05/2019	05/07/2019

Estado: Avance de Obra: 90%

El contrato alcanza un avance del **90%**, encontrándose en la fase final de acabados, cerramiento perimetral, siembra de prado natural y actividades de limpieza general.

El contrato incluyó la intervención de los siguientes parques:

- Parque Villa Rosa Estación, sector norte.
- Parque Villa Rosa, sector norte.
- Parque Esperanza 2, sector norte.
- Parque Esperanza 3, sector norte.
- Parque Gaitán.
- Parque Girardot.
- Parque San Francisco.
- Parque Corona, sector La Ceiba.



- Parque Robledo, sector Provenza.
- Parque Cristal Bajo, sector Provenza.



Parque Villa Rosa

Parque Corona La Ceiba

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
282 de 2018	GRUPO 1 – ADECUACIONES LOCATIVAS, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, BICENTENARIO.”.	\$ 1.524.762.067,62	26/11/2018	01/05/2019

Estado: Avance de obra: 80% - En ejecución

El contrato alcanza un avance del **80%**, e incluye la intervención del área de cocina, cafetería y comedor del **COLEGIO BICENTENARIO**, en el cual se han adelantado los trabajos de estructura, cubierta y cielo raso del comedor que cuenta con un área de 600 m2, y se está adelantando la terminación de los acabados del área de cocina y la iluminación del proyecto.



ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA COMEDOR



ACABADOS AREA DE COCINA



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
291 de 2018	GRUPO 2 – ADECUACIONES LOCATIVAS, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, (MAIPORE B, AURELIO MARTINEZ MUTIS SEDE C)	\$ 1.033.961.774,35	26/11/2018	18/06/2019

Estado: Avance de obra: 98%

El contrato alcanza un avance del **98%**, en el cual se encuentra casi terminada las obras contratadas del Colegio Maiporé B. La Sede C del Colegio Aurelio Martínez Mutis, ya fue entregada. En este momento se está definiendo el adicional en valor y plazo No. 3 del contrato, en el cual se contempla la reposición de las redes de alcantarillado del Colegio Maiporé sede B, las cuales han venido ocasionando filtraciones hacia la Institución Educativa contigua.




CONSTRUCCION BATERIAS DE BAÑOS (EXTERNO)



CONSTRUCCIÓN DE LAS BATERÍAS DE BAÑOS (INTERNO)

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
286 de 2018	"GRUPO 5 – ADECUACIONES LOCATIVAS, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, (VIJAGUAL A, CLUB UNION A Y B, SANTANDER SEDE A)	\$ 882.682.552,21	26/11/2018	18/06/2019

Estado: Avance de obra: 98% en ejecución

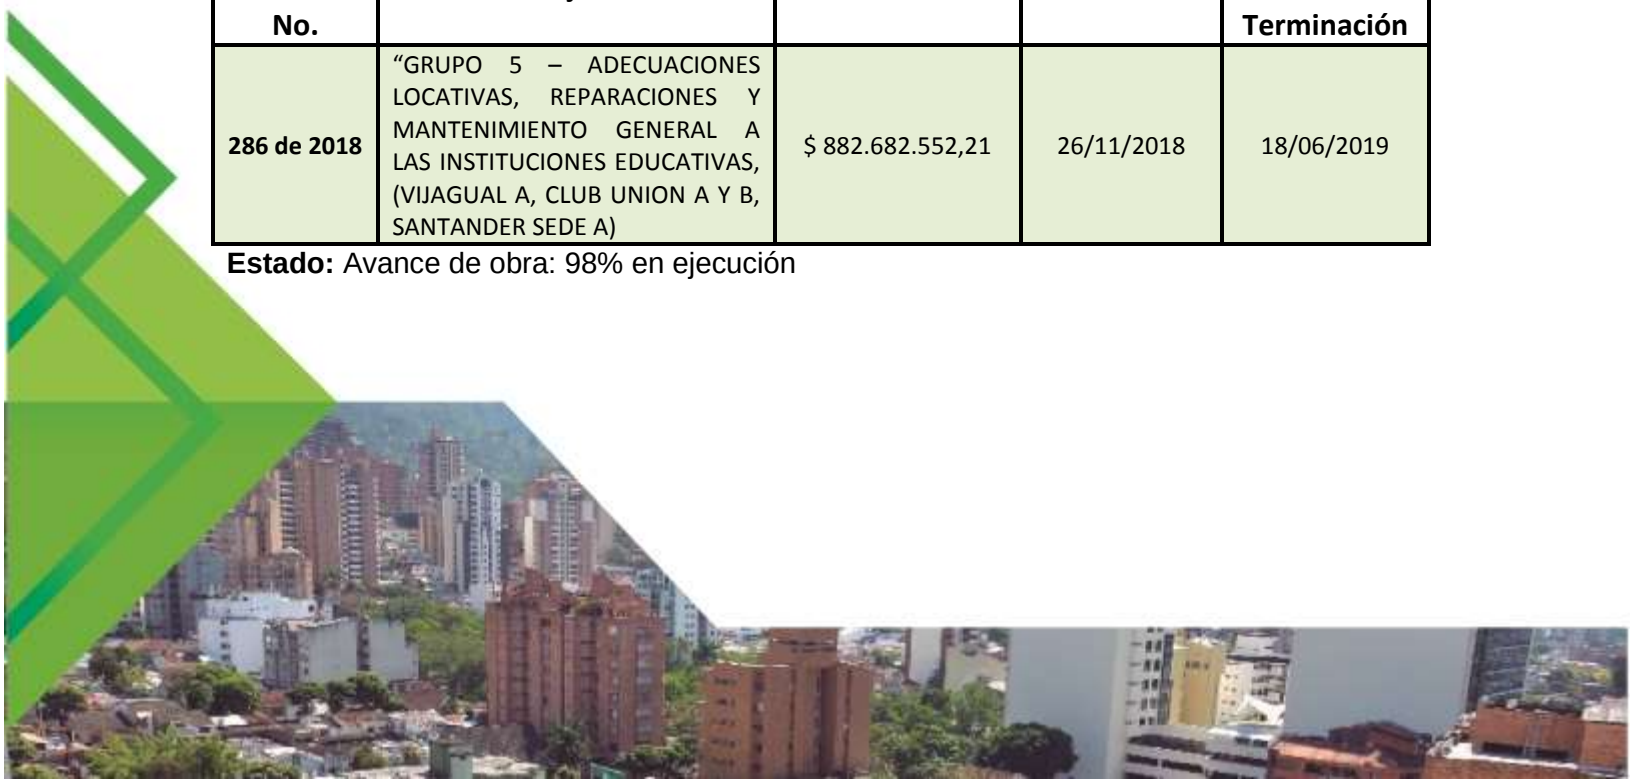

INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad



COLEGIO CLUB UNION B

COLEGIO VIAGUALA

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
242 de 2018	REPARACIONES LOCATIVAS Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA: PROMOCIÓN SOCIAL SEDES D Y C Y SANTAINES. GRUPO – GRUPO I.	\$ 1.573.977.283,05 Adicional (\$436.808.110,53)	05/10/2018	09/05/2019

Estado: Avance de Obra: 87% - Suspendido

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
284 DE 2018	ADECUACION DE LA PLAZOLETA DE LOS EDECANES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 1.223.767.860,23 Adicional \$211,372,321.48	04/12/2018	19/06/2019

Estado: Avance de Obra de: 98% - en ejecución



INSTALACION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECNOLOGIA LED PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – FASE II, EN LAS COMUNAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 11.

INSTALACION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECNOLOGIA LED PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – FASE II, EN LAS COMUNAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 11.									
GRUPO	CONTRATISTA	VALOR	FECHA DE INICIO	PLAZO (días)	FECHA FINAL	ADICIONAL PLAZO	ADICIONAL VALOR	NUEVA FECHA FINAL	AVANCE
1	BIOTECNOLOGIA	\$ 1.855.918.171	23/01/2019	150	22/06/2019	30	0	22/07/2019	76,00%
2	UT ILUMINACION URBANA	\$ 1.560.166.824	27/12/2018	150	26/05/2019	30	0	26/06/2019	97,23%
3	CONSORCIO ALUMBRADO PUBLICO 2018	\$ 2.001.758.182	27/12/2018	150	26/05/2019	30	0	26/06/2019	100,00%
4	CONSORCIO ALUMBRADO FASE II	\$ 1.915.427.500	23/01/2019	150	22/06/2019	30	0	22/07/2019	89,92%
INTER VENTORIA	INTER 24000	\$ 842.775.897	27/12/2018	150	26/05/2019	60	\$ 314.344.811,60	26/07/2019	85,71%



11. CONTRATOS EN PROCESO DE LIQUIDACION

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
283 de 2018	"GRUPO 4 – ADECUACIONES LOCATIVAS, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, (ANDRES PAEZ SOTO JOYA, POLITECNICO SEDE B)	\$ 881.067.522,98	26/11/2018	23/03/2019

Estado: Avance de obra: 100% - en proceso de liquidación



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
285 de 2018	"GRUPO 6 – ADECUACIONES LOCATIVAS, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, (LA JUVENTUD, BOSCONIA,, BOLARQUI SEDE B, BOSCONIA LA CUCHILLA)	\$ 873.439.182,03	26/11/2018	07/04/2019

Estado: Avance de obra: 100% - en proceso de liquidación

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
304 DE 2018	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEL COLEGIO INEM CUSTODIO GARCIA ROVIRA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.738.806.431,2	03/12/2018	04/06/2019

Estado: Avance de Obra de: 100% - En proceso de liquidación



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
221 de 2018	"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN LOCATIVA DE AMBIENTES DE TRANSICIÓN UBICADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO III	\$ 741.206.653,26	18/10/2018	29/03/2019

Estado: Avance de Obra: 100% - En proceso de liquidación



EL GRUPO III CONFORMADO POR LOS COLEGIO LAS AMÉRICAS, SANTANDER SEDE D, TEC.

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
224 de 2018	"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN LOCATIVA DE AMBIENTES DE TRANSICIÓN UBICADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO I"	\$443.300.921,64	27/09/2018	29/03/2019

Estado: Avance de Obra: 100% - En proceso de liquidación

EL GRUPO I CONFORMADO POR LOS COLEGIO CLUB UNIÓN SEDE C (BARRIO COLORADOS), SANTO ÁNGEL (BARRIO VILLA ROSA), CLUB UNIÓN SEDE E (BARRIO CAFÉ MADRID), CLAVERIANO.

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
225 de 2018	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN LOCATIVA DE AMBIENTES DE TRANSICIÓN UBICADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO II	\$ 336,328.888,00	27/09/2018	27/02/2019

Estado: Avance de Obra: 100% - En proceso de liquidación

EL GRUPO II CONFORMADO POR LOS COLEGIO GUSTAVO COTE URIBE, LA JUVENTUD, CAMPO HERMOSO SEDE C - JOSÉ ANTONIO GALÁN.

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
218 DE 2018	CONSTRUCCION DEL PARQUE LA CEIBA EN LA COMUNA 13 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 3.185.372.854,8 Adicional (\$420.582.071,25)	24/09/2018	08/07/2019

Estado: Avance de obra: 100 % -En proceso de liquidación



INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
216 DE 2018	CONSTRUCCION DEL PARQUE GRANJAS DE PROVENZA EN LA COMUNA 10 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.221.897.961,11 Adicional (\$ 468.136.941,16)	24/09/2018	06/05/2019

Estado: Avance de obra: 100 % -En proceso de liquidación



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
274 DE 2018	ADECUACION DEL PARQUE ECOLOGICO LA FLORA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.546.957.564,76	19/11/2018	15/04/2019

Estado: Avance de obra: 100 % -En proceso de liquidación





Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
245 de 2018	REPARACIONES LOCATIVAS Y MANTENIMIENTO GENERAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA: JORGE ARDILA DUARTE Y AURELIO MARTÍNEZ MUTIS. GRUPO II	\$1.512.077.835,80	05/10/2018	09/04/2019

Estado: Avance de Obra: 100% - En proceso de liquidación

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
243 de 2018	REPARACIONES LOCATIVAS Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA: CLUB UNION SEDE D (OLAS BAJAS) Y MAIPORE SEDE C. GRUPO III.	\$ 1.454.009.727,20	05/10/2018	09/04/2019

Estado: Avance de Obra: 100% - En proceso de liquidación

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
247 de 2018	REPARACIONES LOCATIVAS Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA: SEDE RURAL EL PABLON. GRUPO IV.	\$ 1.386.169.767.87	05/10/2018	12/04/2019

Estado: Avance de Obra: 100% - En proceso de liquidación



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
118 de 2017	"AUNAR ESFUERZOS, TECNICOS, FINANCIEROS, Y ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INTERES PUBLICO "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PARA TERMINACIÓN DE LA GRAN SALA DEL TEATRO SANTANDER MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER."	\$ 2.500.000.000 Adicional \$ 1.249.000.000	03/05/2017	21/12/2018

Estado: Avance de Obra: 100% - En proceso de liquidación

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
198 de 2018	AUNAR ESFUERZOS, TECNICOS, FINANCIEROS, Y ADMINISTRATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INTERÉS PÚBLICO Y PROVISIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA GRAN SALA DEL TEATRO SANTANDER – MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.652.000.000	24/08/2018	28/02/2019

Estado: Avance de Obra 100% - En proceso de liquidación

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
191 DE 2018	REMODELACION DE CANCHAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO II	\$ 4.073.930.183,1	03/09/2018	26/03/2019

Estado: Avance de Obra de: 100% - En proceso de liquidación

A la fecha han sido entregadas las canchas de Alfonso López, Esperanza II y Dangond, pendiente la entrega de Nápoles.

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
192 DE 2018	REMODELACION DE CANCHAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO I	\$ 3.773.166.237,58	03/09/2018	26/03/2019

Estado: Avance de Obra de: 100% - En proceso de liquidación



12. CONTRATOS LIQUIDADOS

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
405 de 2017	CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.598.565.682,8	01/02/2018	27/05/2019

Estado: Liquidado

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
288 de 2018	"GRUPO 3 – ADECUACIONES LOCATIVAS, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, (INEM SEDE B, SANTA MARIA GORETY SEDE B, AURELIO MARTINEZ SEDE B, JOSE CELESTINO MUTIS)	\$ 924.175.430,89	26/11/2018	23/03/2019

Estado: Liquidado

El contrato se encuentra terminado, liquidado y recibidas las obras por parte de la comunidad educativa.

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
315 DE 2018	"MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS EN DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"	\$ 137.641.322,51	19/12/2018	23/03/2019

Estado: Liquidado – 17 de Junio de 2019

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
263 DE 2018	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS PUNTOS VIVE DIGITAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	\$ 134.148.150,90	06/11/2018	25/03/2019

Estado: Liquidado – 19 de Junio de 2019



13. PROYECTOS PRESENTADOS Y VIABILIZADOS

No.	No. REGISTRO	OBJETO	VALOR VIGENCIA	ESTADO
1	20160680010121	MEJORAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS TRANSVERSALES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.563.200.000,00	Certificado - Actualización
2	20160680010088	ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, ENERGÍA Y FACTURACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	\$ 17.933.000.000,00	Certificado - Actualización
3	20170680010016	APOYO EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 864.250.000,00	Certificado - Actualización
4	20170680010118	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE Y CANCHA DEL BARRIO CRISTAL BAJO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 317.509.812,84	Certificado - Actualización
5	20160680010226	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER	\$ 1.008.735.035,13	Certificado - Actualización
6	20170680010090	MEJORAMIENTO DEL PARQUE BOCAPRADERA DEL BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 501.661.954,67	Certificado - Actualización
7	20170680010141	CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA DE COLUMNATA Y PUENTE DE INTEGRACIÓN EDIFICIOS EXISTENTE Y NUEVO CENTRO DE CONVENCIONES NEOMUENDO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 4.000.000.000,00	Certificado - Actualización Vigencias Futuras
8	20180680010010	APOYO AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS DIFERENTES OBRAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 105.932.922,80	Certificado - Proyecto Nuevo
9	20170680010046	SUBSIDIO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO A LA POBLACION DE ESTRATO 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 4.552.898.870,00	Certificado - Actualización
10	20170680010174	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO LOS PINOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 154.989.631,00	Certificado - Proyecto Nuevo
11	20170680010084	CONSTRUCCIÓN CORREDOR CICLISTA UIS - PARQUE DE LOS NIÑOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 466.793.508,99	Certificado - Actualización
12	20170680010093	ADECUACIÓN DEL PARQUE RELIGIOSO MORRORICO BUCARMANGA	\$ 127.923.589,32	Certificado - Actualización
13	20170680010133	CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS CANCHAS Y SUS ALREDEDORES DE LOS BARRIOS PORVENIR I PORVENIR II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.449.984.504,67	Certificado - Actualización
14	20170680010057	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA GRAN SALA DEL TEATRO SANTANDER MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	\$ 999.000.000,00	Certificado - Proyecto Nuevo


15	20180680010013	MATENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.977.910.290,37	Certificado - Proyecto Nuevo
16	20160680010245	CONSTRUCCION, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.	\$ 1.109.208.202,83	Certificado - Actualización
17	20160680010154	MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	\$ 4.541.798.899,48	Certificado - Actualización
18	20170680010111	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEL BARRIO CAFÉ MADRID DE BUCARAMANGA	\$ 89.084.660,00	Certificado - Actualización
19	20160680010196	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA BARRIO KENNEDY FASE II MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	\$ 599.555.869,61	Certificado - Actualización
20		MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE MICROFUTBOL DEL BARRIO LA JOYA FASE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 96.841.447,00	Proyecto Nuevo, en espera de ser certificado.
21	20170680010165	RENOVACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 88.017.400,27	En Actualización
22	20180680010030	APOYO AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INTERCAMBIADOR MESÓN DE LOS BÚCAROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, FASE III EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 1.242.467.100,00	Certificado - Proyecto Nuevo
23	20180680010023	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO A TECNOLOGÍA LED FASE II: COMUNAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 11 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 32.213.762.885,00	Certificado - Proyecto Nuevo
24	20180680010024	REMODELACION DE ANDENES Y ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.900.224.580,99	Certificado - Proyecto Nuevo
25	20180680010025	MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS CANCHAS DE TENIS DEL PARQUE DE LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.670.083.624,31	Certificado - Proyecto Nuevo
26	20180680010028	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA FASE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 3.146.145.207,00	Certificado - Proyecto Nuevo
27	20160680010226	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.	\$ 2.313.417.707,11	Certificado - Actualización
28	20180680010049	CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ZONAS VERDES DEL BARRIO LOS CANELOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.089.462.658,32	Certificado - Proyecto Nuevo
29	20180680010036	AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO RURAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 1.101.039.013,00	Certificado - Proyecto Nuevo
30	20180680010041	ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LAS VÍAS ARTERIALES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS Y DETERMINACIÓN DE COTA DE INUNDACIÓN DEL CENTRO DE ZOONOSIS DE VIJAGUAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 85.150.354,00	Certificado - Proyecto Nuevo



31	20180680010031	REMODELACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 7.706.773.585,37	Certificado - Proyecto Nuevo
32	20170680010139	MEJORAMIENTO DEL PARQUE LINEAL RIO DE ORO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.102.623.391,00	Certificado - Actualización
33	20170680010137	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.494.116.686,62	Certificado - Actualización
34	20170680010137	APOYO PARA LA INTERVENCIÓN, RESTAURACIÓN Y FINALIZACIÓN DEL TEATRINO DEL ESTADIO, FACHADAS DE LA CARRERA 20 Y LA CALLE 31, Y ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO DEL CENTRO CULTURAL DEL ORIENTE COLOMBIANO BUCARAMANGA	\$ 499.900.000,00	Certificado - Actualización
35	20180680010052	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE GRANJAS DE PROVENZA EN LA COMUNA 10 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 313.711.370,55	Certificado - Proyecto Nuevo
36	20180680010051	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LA CEIBA EN LA COMUNA 13 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 3.493.871.261,00	Certificado - Proyecto Nuevo
37	20180680010054	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PARA TERMINACIÓN DE LA GRAN SALA DEL TEATRO SANTANDER FASE II EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 2.652.000.000,00	Certificado - Proyecto Nuevo
38	20180680010050	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE PUNTOS VIVE DIGITAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 135.502.973,00	Certificado - Proyecto Nuevo
39	20180680010035	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DE ATLETISMO, LUIS ENRIQUE FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE BUCARMANGA	\$ 66.155.135,00	Certificado - Proyecto Nuevo
40	20180680010068	ADECUACIÓN DE LA PLAZOLETA DE LOS EDECANES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.332.056.223,40	Certificado - Proyecto Nuevo
41	20180680010061	ADECUACIÓN PARQUE ECOLÓGICO LA FLORA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.749.844.108,09	Certificado - Proyecto Nuevo
42	20190680010043	MANTENIMIENTO DE LA PLAZOLETA DE LA DEMOCRACIA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 298.931.496,30	Certificado - Proyecto Nuevo
43	20180680010060	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD INTERMEDIA MATERNO INFANTIL SANTA TERESITA UIMIST EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.269.036.943,02	Certificado - Proyecto Nuevo
44	20180680010074	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEL COLEGIO INEM CUSTODIO GARCIA ROVIRA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.852.182.127,80	Certificado - Proyecto Nuevo
45	20180680010079	INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 1.549.627.148,08	Certificado - Proyecto Nuevo
46	20180680010078	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO ADYACENTE A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 147.697.706,00	Certificado - Proyecto Nuevo



47	20180680010079	MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS EN DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 139.276.828,00	Certificado - Proyecto Nuevo
48	20190680010050	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE CENTRALIDAD NORTE EN EL TEJAR NORTE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 5.305.067.870,00	Certificado - Proyecto Nuevo
49	20180680010097	REMDELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE SALUD SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 695.184.903,27	Certificado - Proyecto Nuevo
50	20180680010103	REMDELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE SALUD GIRARDOT DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 827.021.551,30	Certificado - Proyecto Nuevo
51	20180680010098	REMDELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE SALUD KENNEDY DE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 667.260.839,09	Certificado - Proyecto Nuevo
52	20180680010102	REMDELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE SALUD BUCARAMANGA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 817.939.591,39	Certificado - Proyecto Nuevo
53	20180680010099	REMDELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE SALUD CAMPO HERMOSO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 607.752.633,50	Certificado - Proyecto Nuevo
54	20180680010104	REMDELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE SALUD LA JOYA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 816.698.446,48	Certificado - Proyecto Nuevo
55	20180680010100	REMDELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE SALUD LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 821.006.085,37	Certificado - Proyecto Nuevo
56	20196800010054	ESTUDIO GEOTECNICO Y DISEO DE OBRAS DE ESTABILIZACION EN EL LOTE DE LA CARRERA 39 No. 42-29 BARRIO CABECERA DEL LLANO, DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO DE LA ACCION JUDICIAL - TUTELA 680014003007-2018-00828-1 BUCARAMANGA.	\$ 54.633.852,00	Certificado - Proyecto Nuevo
57	2019680010056	MEJORAMIENTO DEL PARQUE SANTANDER DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 70.371.440,00	Certificado - Proyecto Nuevo
58	20180680010092	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA PUERTA DEL SOL Y LA COMISARIA DEL BARRIO LA JOYA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 34.515.546,00	Certificado - Proyecto Nuevo
59	20190680010064	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LOS SALONES COMUNALES EN LOS BARRIOS BUCARAMANGA, DIAMANTE 1, LA LIBERTAD, EL GAITAN, LA FERIA, CAFÉ MADRID, NUEVA COLOMBIA, NORTE BAJO, SAN MIGUEL Y VILLA DEL PRADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 4.766.483.038,31	Certificado - Proyecto Nuevo
60	20190680010058	MEJORAMIENTO DEL CENTRO VIDA AÑOS MARAVILLOSOS EN LA CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 2.363.218.571,70	Certificado - Proyecto Nuevo

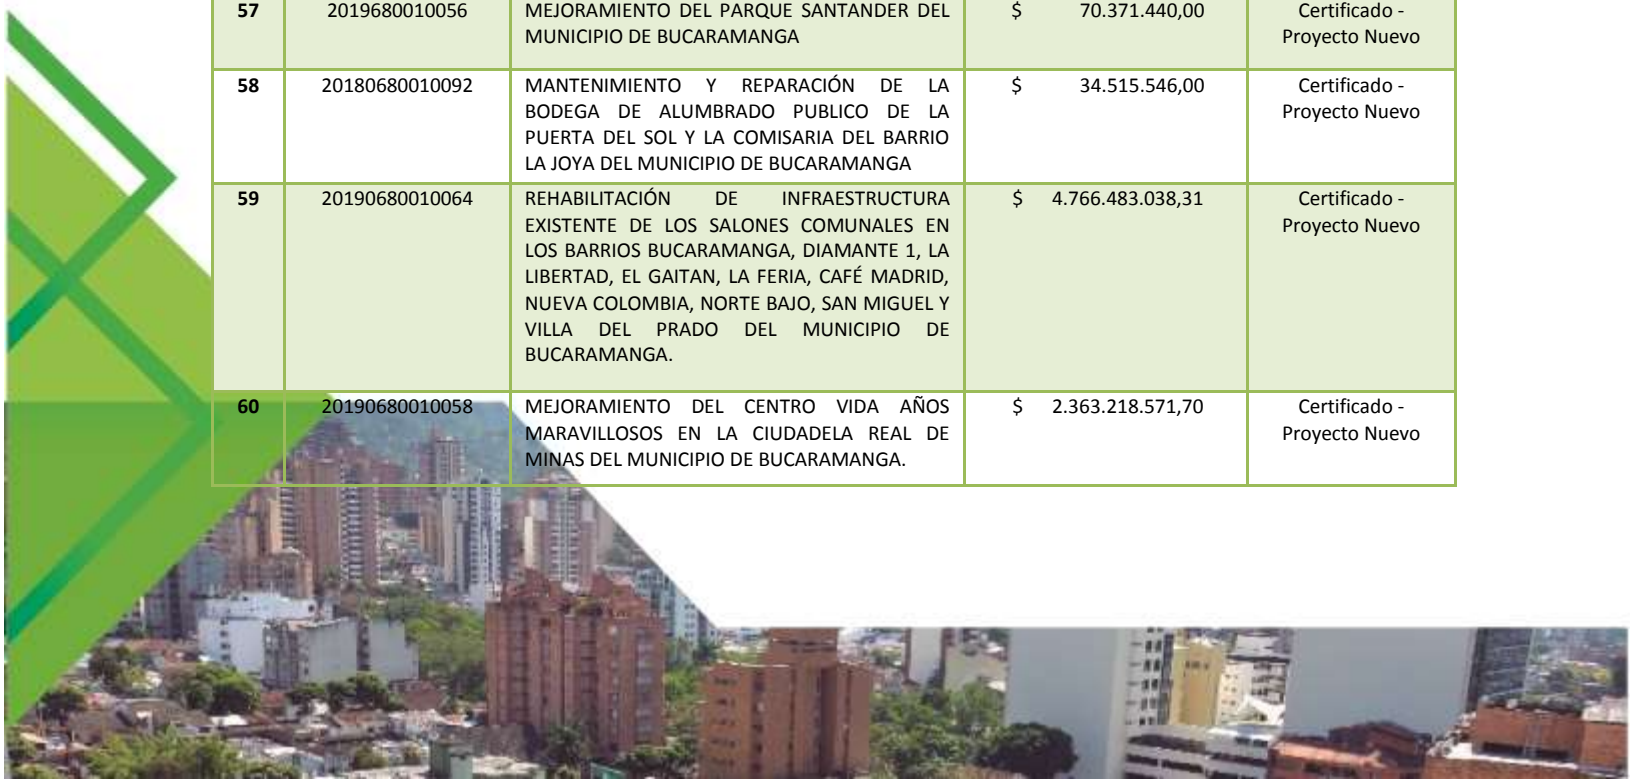

61	20190680010044	MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE ARTES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 5.742.579.420,00	Certificado - Proyecto Nuevo
62	20190680010076	RENOVACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO FASE II EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 70.245.209,84	Certificado - Proyecto Nuevo
63	20190680010075	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CON EL FIN DE HABILITAR Y BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 70.006.950,00	Certificado - Proyecto Nuevo
64	20190680010069	APOYO AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DE ATLETISMO LUIS ENRIQUE FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 522.681.023,00	Certificado - Proyecto Nuevo
65	20180680010082	CONSTRUCCION DE GALERIAS DE BOVEDAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA	\$ 384.960.116,70	Certificado - Proyecto Nuevo
66	20190680010082	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 15.120.221.760,00	Certificado - Proyecto Nuevo
67	20190680010091	ADQUISICION DEL PREDIO PARA LA RESTAURACION DE LA CASA MUSEO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO BUCARAMANGA	\$ 642.612.000,00	Certificado - Proyecto Nuevo
68	20190680010098	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS VEREDALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 512.024.948,00	Certificado - Proyecto Nuevo
69	20190680010097	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 4.519.598.786,00	Certificado - Proyecto Nuevo
70	20190680010101	IMPLEMENTACIÓN DEL MANEJO INTEGRAL DEL COMPONENTE ARBOREO EN EL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 192.534.968,00	Certificado - Proyecto Nuevo
71	20190680010100	CONSTRUCCION DEL SENDERO DE LOS CAMINANTES EN LOS CERROS ORIENTALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 11.509.644.779,00	Certificado - Proyecto Nuevo
72	20190680010086	CONSTRUCCION DEL PARQUE LA CEIBA (FASE II) MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 5.628.404.798,00	Certificado - Proyecto Nuevo
73	20190680010105	ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.202.847.110,97	Certificado - Proyecto Nuevo



14. LICITACIONES PUBLICAS

No.	OBJETO	No. PROCESO	ESTADO	VALOR TOTAL
1	MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-001-2019	ADJUDICADO	\$ 7.545.402.520,90
2	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LOS CANELOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-002-2019	ADJUDICADO	\$ 943.979.472,90
3	CONSTRUCCIÓN DE CICLO-INFRAESTRUCTURA PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-003-2019	ADJUDICADO	\$ 13.239.423.934,17
4	MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-004-2019	ADJUDICADO	\$ 2.521.772.813,00
5	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-005-2019	ADJUDICADO	\$ 1.633.278.514,67
6	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DE ATLETISMO LUIS ENRIQUE FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER, BASADA Y DANDO CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE ACCIÓN POPULAR RAD No. 2009-00069	SI-LP-006-2019	ADJUDICADO	\$ 7.520.073.336,00
7	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE CENTRALIDAD NORTE EN EL TEJAR NORTE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-007-2019	ADJUDICADO	\$ 4.583.348.898,00
8	MEJORAMIENTO DEL CENTRO VIDA AÑOS MARAVILLOSOS EN LA CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	SI-LP-008-2019	ADJUDICADO	\$ 2.088.988.096,86
9	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA PASARELA DE CALZADO (LA CARRERA 22 ENTRE CALLES 19 Y 20 Y CALLES 19, 20, 21 Y 22 ENTRE	SI-LP-009-2019	PLIEGO DEFINITIVO	\$ 902.870.221,95

	CARRERAS 21 Y 23) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			
10	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL PARQUE MORRORICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-010-2019	TRASLADO SECREATRIAL	\$ 2.486.424.225,16
11	CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO ALIMENTADO CON ENERGIA SOLAR PARA EL PARQUE CONTEMPLATIVO EL CARRASCO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-011-2019	TRASLADO SECREATRIAL	\$ 1.365.425.385,72
12	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LOS SALONES COMUNALES EN LOS BARRIOS BUCARAMANGA, DIAMANTE I, LA LIBERTAD, EL GAITAN, LA FERIA, CAFÉ MADRID, NUEVA COLOMBIA, NORTE BAJO, SAN MIGUEL Y VILLA DEL PRADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-012-2019	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	\$ 4.168.866.109,00
13	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-013-2019	PROYECTO DE PLIEGOS	\$ 14.248.129.258,00
14	CONSTRUCCION PARQUE LINEAL METROPOLITANO DEL RIO SURATA EN EL BARRIO EL CLAVERIANO, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	SI-LP-014-2019	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	\$ 6.172.805.446,00
15	CONSTRUCCION DEL PARQUE LA CEIBA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA FASE II.	SI-LP-015-2019	PLIEGO DEFINITIVO	\$ 5.220.254.730,81
16	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO ENTRE LAS CALLES 34 Y 37 Y ENTRE LAS CARRERAS 10 A LA 12 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-016-2019	PLIEGO DEFINITIVO	\$ 1.808.449.168,95
17	AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO PERIMETRAL EXTERIOR DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-017-2019	PLIEGO DEFINITIVO	\$ 1.404.736.826,58
18	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE 30 ENTRE LAS CARRERAS 26 Y 27 DEL MUNICIPIO DE	SI-LP-018-2019	PLIEGO DEFINITIVO	\$ 1.077.015.042,30



	BUCARAMANGA			
19	MODERNIZACION Y EXPANSION DEL ALUMBRADO PÚBLICO PERIMETRAL DEL PARQUE ECOLOGICO LA FLORA DE BUCARAMANGA	SI-LP-019-2019	PLIEGO DEFINITIVO	\$ 2.346.905.293,92
20	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLES DE LOS ESTUDIANTES ENTRE LA CALLE 54A Y LA DIAGONAL 14 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-020-2019	PROYECTO DE PLIEGOS	\$ 3.946.121.191,10
21	CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-021-2019	PROYECTO DE PLIEGOS	\$ 1.230.536.053,13
22	CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	SI-LP-022-2019	PROYECTO DE PLIEGOS	\$ 4.051.263.598,00
23	CONSTRUCCION DE SENDEROS DE LOS CAMINANTES EN LOS CERROS ORIENTALES DE BUCARAMANGA.	SI-LP-024-2019	PROYECTO DE PLIEGOS	\$ 10.509.664.779,00

15. CONCURSO DE MERITOS

No.	OBJETO	No. PROCESO	ESTADO	VALOR TOTAL
1	MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-001-2019	ADJUDICADO	\$ 7.545.402.520,90
2	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LOS CANELOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-002-2019	ADJUDICADO	\$ 943.979.472,90



3	CONSTRUCCIÓN DE CICLO-INFRAESTRUCTURA PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-003-2019	ADJUDICADO	\$ 13.239.423.934,17
4	MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-004-2019	ADJUDICADO	\$ 2.521.772.813,00
5	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-005-2019	ADJUDICADO	\$ 1.633.278.514,67
6	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DE ATLETISMO LUIS ENRIQUE FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER, BASADA Y DANDO CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE ACCIÓN POPULAR RAD No. 2009-00069	SI-LP-006-2019	ADJUDICADO	\$ 7.520.073.336,00
7	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE CENTRALIDAD NORTE EN EL TEJAR NORTE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-007-2019	ADJUDICADO	\$ 4.583.348.898,00
8	MEJORAMIENTO DEL CENTRO VIDA AÑOS MARAVILLOSOS EN LA CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	SI-LP-008-2019	ADJUDICADO	\$ 2.088.988.096,86
9	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA PASARELA DE CALZADO (LA CARRERA 22 ENTRE CALLES 19 Y 20 Y CALLES 19, 20, 21 Y 22 ENTRE CARRERAS 21 Y 23) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-009-2019	PLIEGO DEFINITIVO	\$ 902.870.221,95
10	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL PARQUE MORRORICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-010-2019	TRASLADO SECREATRIAL	\$ 2.486.424.225,16
11	CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO ALIMENTADO CON ENERGIA SOLAR PARA EL PARQUE CONTEMPLATIVO EL CARRASCO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-011-2019	TRASLADO SECREATRIAL	\$ 1.365.425.385,72



12	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LOS SALONES COMUNALES EN LOS BARRIOS BUCARAMANGA, DIAMANTE I, LA LIBERTAD, EL GAITAN, LA FERIA, CAFÉ MADRID, NUEVA COLOMBIA, NORTE BAJO, SAN MIGUEL Y VILLA DEL PRADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-012-2019	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	\$ 4.168.866.109,00
13	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-013-2019	PROYECTO DE PLIEGOS	\$ 14.248.129.258,00
14	CONSTRUCCION PARQUE LINEAL METROPOLITANO DEL RIO SURATA EN EL BARRIO EL CLAVERIANO, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	SI-LP-014-2019	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	\$ 6.172.805.446,00
15	CONSTRUCCION DEL PARQUE LA CEIBA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA FASE II.	SI-LP-015-2019	PLIEGO DEFINITIVO	\$ 5.220.254.730,81
16	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO ENTRE LAS CALLES 34 Y 37 Y ENTRE LAS CARRERAS 10 A LA 12 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-016-2019	PLIEGO DEFINITIVO	\$ 1.808.449.168,95
17	AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO PERIMETRAL EXTERIOR DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-017-2019	PLIEGO DEFINITIVO	\$ 1.404.736.826,58
18	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE 30 ENTRE LAS CARRERAS 26 Y 27 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-018-2019	PLIEGO DEFINITIVO	\$ 1.077.015.042,30



16. SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

No.	OBJETO	No. PROCESO	ESTADO	VALOR TOTAL
1	ACTIVIDADES DE PODA PARA EL DESPEJE DE LUMINARIAS Y REDES QUE INTERFIERAN CON EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-SAMC-002-2019	ADJUDICADO	\$ 582.643.995,00
2	EXPANSIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-SAMC-003-2019	ADJUDICADO	\$ 459.661.191,33
3	ADECUACION PLAZOLETA DE LA DEMOCRACIA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, SANTANDER	SI-SAMC-0004-2019	ADJUDICADO	\$ 291.155.981,61

17. INVERSION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 30 DE JUNIO DE 2019

PROGRAMAS	INVERSION	%
ADMINISTRACION ARTICULADA Y COHERENTE	\$ 2.775.891.694,00	9,97
UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES	\$ 51.643.191,60,00	0,20
ADULTO MAYOR Y DIGNO	\$ 2.068.967.088,83	
RECUPERACION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO	\$ 5.057.438.420,00	15,91
INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO	\$ 19.851.519.013,77	41,36
PROMOCION DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS	\$ 13.786.019.895,76	
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA	\$ 7.452.792.734,87	5,62
MANTENIMIENTO DE RED VIAL RURAL	\$ 60.071.625,00	
ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL	\$ 17.250.747.315,94	26,94
TOTAL (1)	\$ 68.355.090.979,77	100%

OTROS VALORES EN LA EJECUCION

DESCRIPCION	VALOR
VALOR SUBSIDIOS DE SERVICIOS PUBLICOS, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	\$ 5.062.474.728,76
TOTAL (2)	\$ 5.062.474.728,76

TOTAL INVERSION (1+2)	\$ 73.417.565.708,53
------------------------------	-----------------------------

