



INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad

INFORME DE GESTION CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

En el presente informe se resume los principales avances que la Secretaria de Infraestructura ha generado en los diferentes programas que conforman el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Gobierno de las Ciudadanas y los Ciudadanos” con corte a 30 de Septiembre de 2019, en el cual ha ejecutado y realizado las gestiones pertinentes para el control del avance de las diferentes obras que ejecuta la Secretaria.

A continuación se detalla la gestión que ha realizado la Secretaria de Infraestructura con corte a 30 de Septiembre de 2019.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: GOBERNANZA DEMOCRÁTICA

1.1 PROGRAMA: PRESUPUESTOS INCLUYENTES

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Número de comunas con obras comunitarias ejecutadas con presupuesto participativo.	17	17	\$ 6.937.298	\$ 3.552.819	0

Durante la vigencia 2019, se tienen estructurados los proyectos en los diferentes grupos de presupuestos participativos, en las cuales se ha adelantado las siguientes contrataciones:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
266 de 2019 y 267 de 2019	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LOS SALONES COMUNALES EN LOS BARRIOS BUCARAMANGA, DIAMANTE I, LA LIBERTAD, EL GAITAN, LA FERIA, CAFÉ MADRID, NUEVA COLOMBIA, NORTE BAJO, SAN MIGUEL Y VILLA DEL PRADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 4.046.882.947.00	06/08/2019	30/12/2019

Dentro de este proceso se encuentran dos (2) salones comunales de los Barrios Gaitán y Café Madrid viabilizados por el comité de presupuestos participativos, los cuales se encuentran en ejecución.



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
323 de 2019	ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.000.392.123,45	Por iniciar	Por iniciar

Estado: El contrato de encuentra adjudicado y en proceso de legalización.

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
261 de 2019	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - GRUPO 1	\$ 4.446.523.289	06/09/2019	30/12/2019
263 de 2019	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - GRUPO 2	\$ 4.316.014.490	06/09/2019	30/12/2019
264 de 2019	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. - GRUPO 3	\$ 3.838.463.454,08	06/09/2019	30/12/2019

Dentro de este proceso de contratación se encuentran las obras viabilizadas por presupuestos participativos, la cuales es precioso mencionar:

	BARRIO	DIRECCIÓN	METROS
1	PUERTO RICO	Carrera 30 entrada principal barrio puerto rico	70 ML
2	ANTONIO NARIÑO	Carrera 7 entre calles 21 y 23	80 ML
3	GIRARDOT	Carrera 8 entre calles 29 y 31	110 ML
4	TOLEDO PLATA	Calle 106 entre Carreras 15b y 15c	70 ML
5	ALVAREZ- LAS AMERICAS	Carrera 40 entre calles 32 y 33	120 ML
6	ALVAREZ- LOS ALPES	Calle 31a entre carreras 41 y 44	100 ML
7	ANTONIA SANTOS CENTRO (Paseo del	Carrera 26 entre las Calles 31 a la 35	300 ML



	Comercio)		
8	MIRAFLORES	Calle 19 #54-13 hasta Calle 21 #52a-04	120 ML
9	BUENAVISTA	La Ye- entre Carrera 66a entre Calle 19 a la 21	100 ML
11	GUAYACANES	Calle 70a con Carrera 70 entrada por la parte superior de guayacanes	120 ML
12	VILLA SARA	Calle 15c entre carreras 105 y 106	120 ML
13	BRISAS EL MUTIS	*Carrera 13aw N° 60 bis-71 hasta Carrera 13aw N° 60bis-93 *Carrera 14w N° 60 bis-65 Hasta la Carrera 14w N° 60 bis- 93	135 ML

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
282 de 2019	CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 1	\$ 1.136.548.602	15/08/2019	29/12/2019
283 de 2019	CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 2	\$ 1.180.683.854	15/08/2019	29/12/2019
284 de 2019	CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 3	\$ 1.300.079.710	15/08/2019	29/12/2019

Dentro de este proceso de contratación se encuentran las obras viabilizadas por presupuestos participativos, la cuales es precioso mencionar:



CORREGIMIENTO 1	Vereda San Ignacio	Sector el Mango
	Vereda San Pedro	Sector el Tanque
	Vereda San Cayetano	Sector curva el Mamón
CORREGIMIENTO 2	Vereda Cuchilla Alta	Sector Palo Blanco
	Vereda Capilla Baja	Sector curva escondida
CORREGIMIENTO 3	Vereda San José	Sector el Caracolí
	Vereda Santa Bárbara	Sector 10 de Mayo, tramo la UDES km 8+500

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Por Numerar	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO URBANO MEDIANTE EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.475.498.399,47 Grupo 1	Por iniciar	Por iniciar
		\$ 1.152.739.167,19 Grupo 2	Por iniciar	Por iniciar
		\$ 1.092.913.615,92 Grupo 3	Por iniciar	Por iniciar

Estado: El contrato de encuentra adjudicado y en proceso de legalización.

Dentro del equipamiento urbano se encuentran (quioscos, plazoletas, juegos infantiles, gimnasios, entre otros viabilizados en el ejercicio de presupuestos participativos).

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
326 de 2019	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES MAGUEYES, MONSERRATE, ROSA BLANCA Y LAS GRANJITAS EN EL MUNICIPIO DE	\$ 504.058.620	Por iniciar	Por iniciar



	BUCARAMANGA, SANTANDER"			
--	-------------------------	--	--	--

Estado: El contrato de encuentra adjudicado y en proceso de legalización.

Así mismo se encuentra pendiente por contratar las obras de estabilización viabilizadas por el comité de presupuestos participativos los cuales se detallan así:

Sector Rural: (2) Veredas: Cuchilla Alta y Vijagual sector la jabonera.

Sector Urbano: (3) Barrios: Cristal bajo, Quebrada la Iglesia y la Libertad

Igualmente se incluirán dos sitios en malla vial urbana en los barrios: Bucaramanga y Buenos Aires.

Se continúa ejecutando las obras contratadas durante la vigencia 2018, en el que se encuentra el contrato de andenes y pasamanos, se le realizo adicional en valor, y se encuentran en etapa de recibo final como se detallan a continuación:


Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
210 de 2018	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ANDENES, PASAMANOS Y ESCALERAS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER	\$ 1.343.937.014,91	19/09/2018	29/07/2019

Estado: Avance de obra: 100% - en proceso de acta de recibo final

REGISTRO FOTOGRAFICO

SECTOR CENTRO

Calle 31 cra 12 -11 SUR



SECTOR GOMEZ NIÑO

Calle 14 Calle 56 costado oriental



SECTOR ANTONIA SANTOS

Carrera 25 entre calles 31 y 32



1.2 PROGRAMA: GESTIÓN INTELIGENTE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Porcentaje de predios requeridos adquiridos para la ejecución de obras de desarrollo para la ciudad.	100%	100%	\$	\$ 0	0



En la presente vigencia se requiero la compra del predio PARA LA RESTAURACION DE LA CASA MUSEO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO, BUCARAMANGA, el cual fue adquirido por el municipio y los demás proyectos se encuentran desarrollados en predios de propiedad del Municipio de Bucaramanga.

1.3 PROGRAMA: DISEÑO URBANO INTELIGENTE Y SUSTENTABLE

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Número de equipos de diseño de los talleres de arquitectura conformados y mantenidos.	1	1	\$ 800.000	\$ 800.000	0
Número de propuestas para proyectos básicos realizados que contengan los lineamientos de diseño urbano.	25	52	\$ 0	\$ 0	0

La Secretaria de Infraestructura cuenta con el personal de apoyo para la planificación de las obras de esta dependencia desde el inicio de la vigencia, así mismo este personal ha venido realizando los proyectos básicos que ejecuta la Secretaria.


1.4 PROGRAMA: UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Porcentaje de diseños, estudios, consultorías e interventorías realizadas para ejecutar los proyectos y las obras del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 y otros planes de ciudad.	100%	100%	\$ 1.352.183	\$ 1.352.183	0

En este programa se encuentran todos los diseños, estudios, consultorías e interventorías para ejecutar los proyectos y las obras del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, entre los cuales se encuentra:

- ✓ “ESTUDIO GEOTECNICO Y DISEÑO DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN EL LOTE DE LA CARRERA 39 N°42-29 BARRIO CABECERA DEL LLANO, DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN JUDICIAL - TUTELA 68001403007-2018-00828-1 - BUCARAMANGA” por valor de \$ 39.158.259,00

Igualmente se continúa con la supervisión y control a través de proceso de interventorías de los proyectos que se encuentran en ejecución.

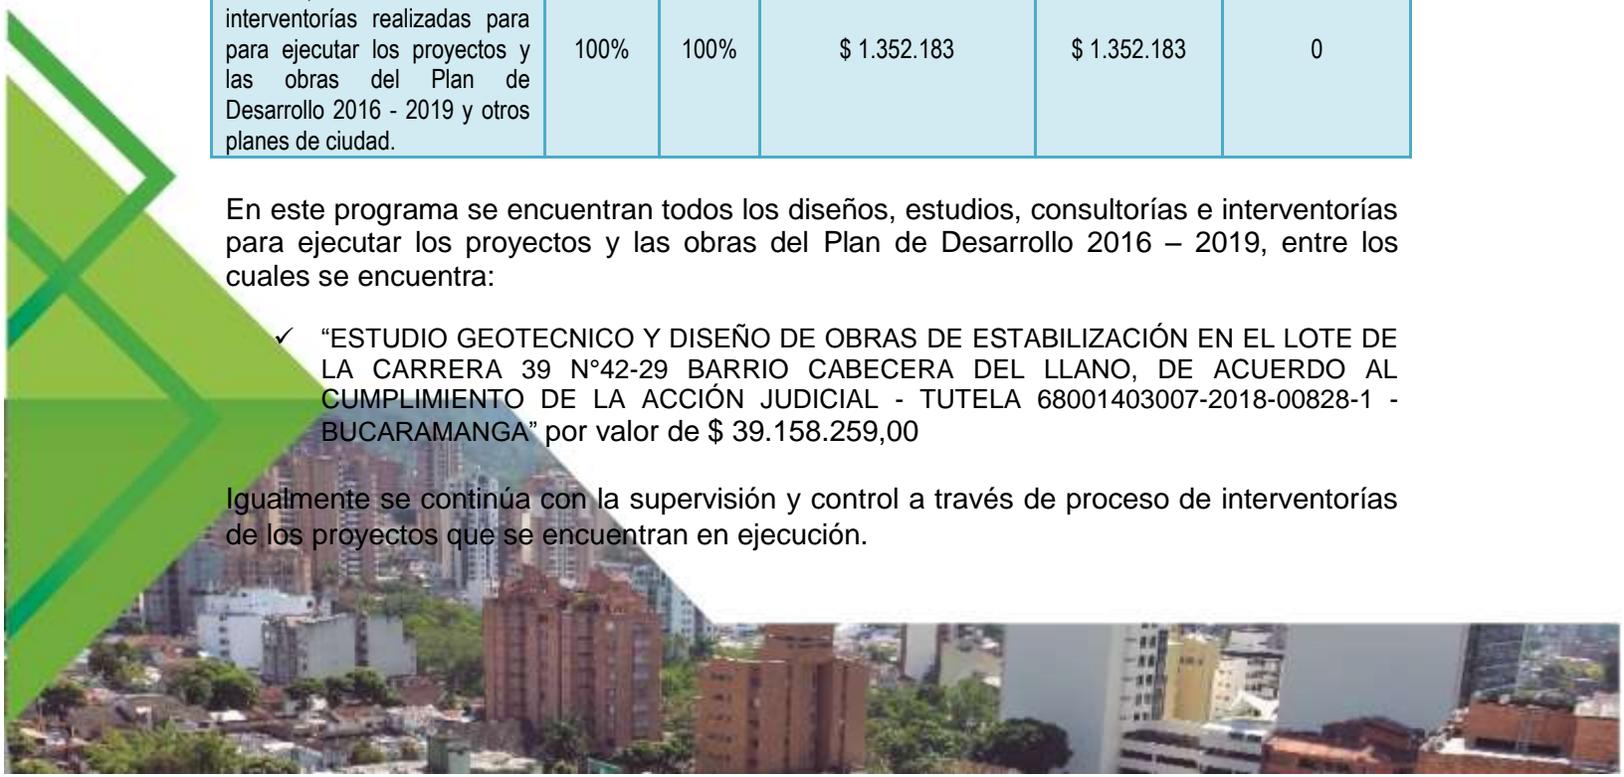

LINEA ESTRATEGICA 2: INCLUSIÓN SOCIAL

2.1. PROGRAMA: ADULTO MAYOR Y DIGNO

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Número de Centros vida adecuados y/o readecuados.	1	1	\$ 2.595.618	\$ 2.346.900	0

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
204 de 2019	MEJORAMIENTO DEL CENTRO VIDA AÑOS MARAVILLOSOS EN LA CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.068.967.088,83	22/07/2019	21/11/2019

Estado: Avance de obra: 24,95% - en ejecución



LINEA ESTRATEGICA 3: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

3.1 PROGRAMA: SENDEROS PARA LA VIDA

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Porcentaje de avance en la habilitación del subsector del gran bosque de los cerros orientales de escala metropolitana.	40%	2%	\$ 5.593.774	\$ \$ 5.593.774	\$ 0



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
303 de 2019	CONSTRUCCION DE SENDEROS DE LOS CAMINANTES EN LOS CERROS ORIENTALES DE BUCARAMANGA. - GRUPO 1-Puerta Corcovado	\$ 4.835.552.381,69	30/08/2019	19/12/2019

Estado: Avance de obra: 5% - en ejecución



Excavaciones



Elaboración de cajas

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
306 de 2019	CONSTRUCCION DE SENDEROS DE LOS CAMINANTES EN LOS CERROS ORIENTALES DE BUCARAMANGA. - GRUPO 2-Puerta Jardín	\$ 5.605.876.851	16/09/2019	30/12/2019

Estado: Avance de obra: 1% - en ejecución



Campamento



3.2 PROGRAMA: REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Número de obras de mitigación realizadas en comunas que presenten riesgos de desastre.	9	1	\$ 0	\$ 0	\$ 536.462

La Secretaria de Infraestructura firmo convenio Interadministrativo para la construcción de un muro, el cual es precioso mencionar:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
226 de 2019	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS, FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES ENTRE EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PARA LA MITIGACION DEL RIESGO DE DESLIZAMIENTO SOBRE LA CARRERA 34 ENTRE LA CALLE 98 Y LA CALLE 104 DEL BARRIO BELLAVISTA CASAS COSTADO POSTERIOR DEL CONJUNTO RESIDENCIAL BALCON DEL TEJAR V ETAPA DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA AP 2002-2646 DEL DOS (02) DE AGOSTO DE 2006 EMITIDA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER.	\$ 1.072.924.729,93 Aporte Municipio Floridablanca (\$ 536.462.364,96) Aporte Municipio de Bucaramanga (\$ 536.462.364,96)	27/06/2019	26/12/2019

Estado: En trámite documentación previa al desembolso del aporte del Municipio de Bucaramanga.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: CALIDAD DE VIDA

4.1 PROGRAMA: AMBIENTES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Número de parques RECREAR adecuados y/o modernizados.	1	1	\$ 7.607.669	\$ \$ 7.607.669	0



La Secretaria de Infraestructura adelanto el proyecto en el parque RECREAR, con el cual se da cumplimiento total a este indicador:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
151 de 2019	MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 7.297.395.222,86	04/06/2019	03/12/2019

Estado: Avance de obra: 38% - En ejecución



4.2 PROGRAMA: OBSERVAR Y SER OBSERVADO: FOMENTO AL TURISMO

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Número de espacios garantizados del centro de convenciones de Bucaramanga como eje central del desarrollo del turismo de reuniones en el municipio.	1	1	\$ 0	\$ 0	0

El centro de convenciones neomundo se encuentra al servicio de la Comunidad, por lo que se dio cumplimiento a este indicador en la presente vigencia.

4.3 PROGRAMA: INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Porcentaje de parques con mantenimiento anual realizado.	100%	100%	\$ 5.177.330	\$ 5.142.727	0



La administración Municipal a través de la Secretaria de Infraestructura adelanto convenio con la EMAB, el cual se encuentra en ejecución:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
4 de 2019	MANTENIMIENTO DE PARQUES, ZONAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER, EN LOS SECTORES INDICADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO	\$ 4.977.330.765,00	04/02/2019	31/12/2019

Estado: Avance de Obra: 72,72% - En ejecución

Como se había indicado en los informes anteriores el presente Contrato Interadministrativo se está realizando rocería a las zonas verdes ubicadas en Parques, separadores y vías del Municipio de Bucaramanga, asignación de 70 parqueros distribuidos en 69 Parques y Zonas Verdes, Mantenimiento de Prado y Siembra de Prado.


- ✓ 25 Cuadrillas conformadas por 4 personas cada una, ubicadas en los Parques y zonas Verdes de las 17 Comunas del Municipio de Bucaramanga.
- ✓ 4 cuadrillas conformadas por 4 personas cada una, las cuales atienden las entradas principales a Bucaramanga, separadores y rompoys.
- ✓ Personal para Siembra y mantenimiento de Prado conformada por 9 Trabajadores.

Durante el Primer Trimestre debido a las condiciones climáticas que se presentó el proceso de siembra de prado se aplazó, una vez iniciado el periodo de lluvias se programó la siembra de Prado, A continuación se relaciona los sitios donde se ha instalado la grama.

- **Siembra de Prado**

Mes de Julio

ITEM	DIRECCION	GRAMA M2
1	PARQUE SANTANDER	260
2	COLEGIO PROMOCIÓN SOCIAL SEDE D TRANSICIÓN	28

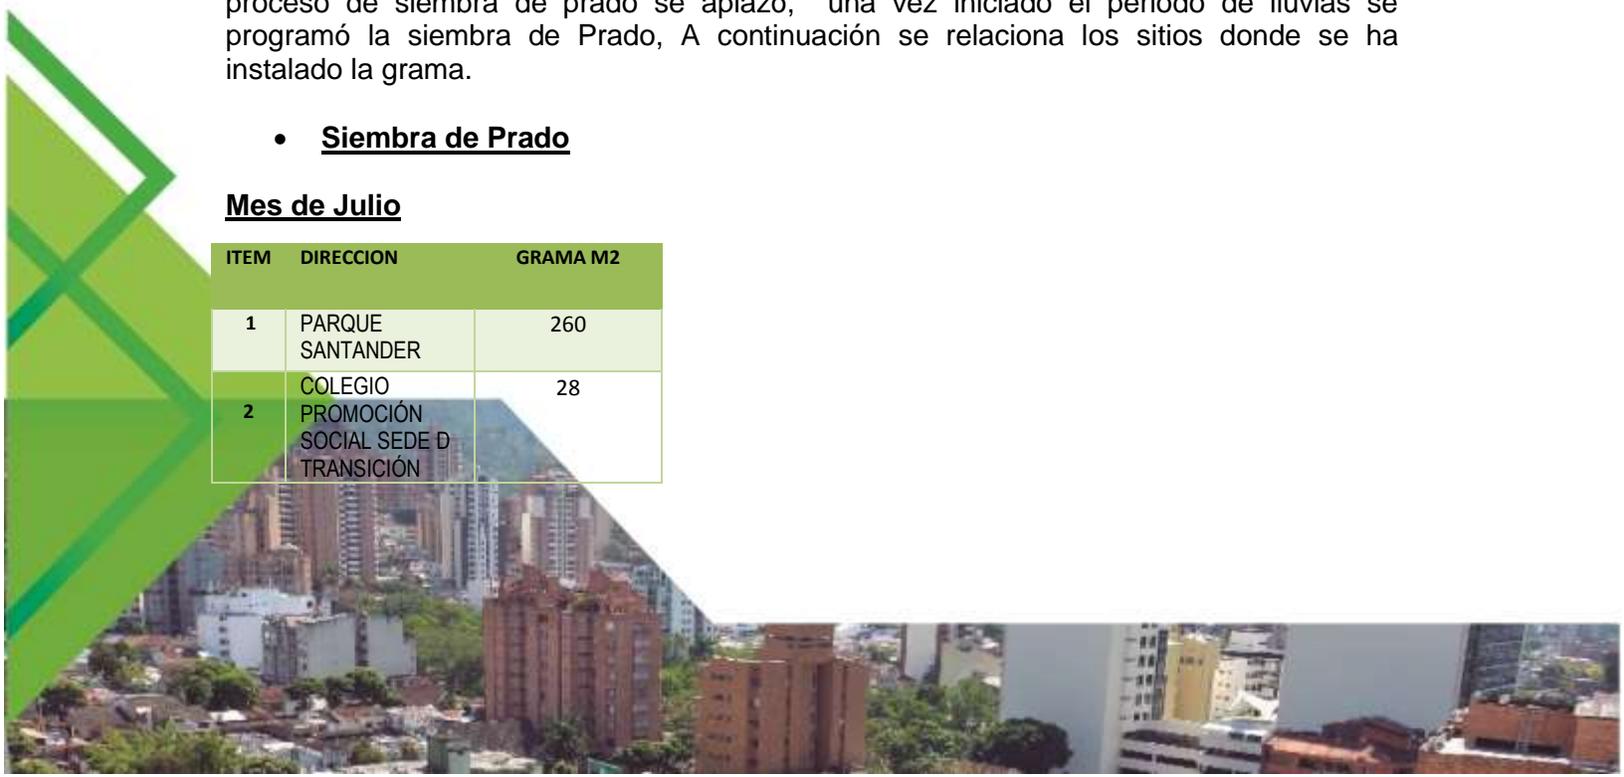

3	CANCHA DE TENIS PARQUE DE LOS NIÑOS	57
4	ZONA PEATONAL GOMEZ NIÑO	15
TOTAL PRADO SEMBRADO		360

Mes de Septiembre

ITEM	DIRECCION	GRAMA M2
1	BIBLIOTECA ESTACIÓN CAFÉ MADRID	65
2	VILLA ALICIA	9
3	BALCONCITOS	183
4	CICLORUTA SAN MIGUEL	56
5	PARQUE VILLA ALICIA	327
TOTAL PRADO SEMBRADO		640

Mes de Agosto

ITEM	DIRECCION	GRAMA M2
1	ZONA PEATONAL GOMEZ NIÑO	75
2	VILLA ALICIA	25
TOTAL PRADO SEMBRADO		100

Registro Fotográfico

Cancha Tenis Parque Los Niños



Zona Peatonal Gómez Niño




Biblioteca Estación Café Madrid



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
306 de 2019	"TALA DE ÁRBOLES Y MANEJO INTEGRAL DEL COMPONENTE ARBÓREO EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"	\$ 165.396.096,61	16/09/2019	21/12/2019

Estado: Avance de Obra: 15,63% - En ejecución

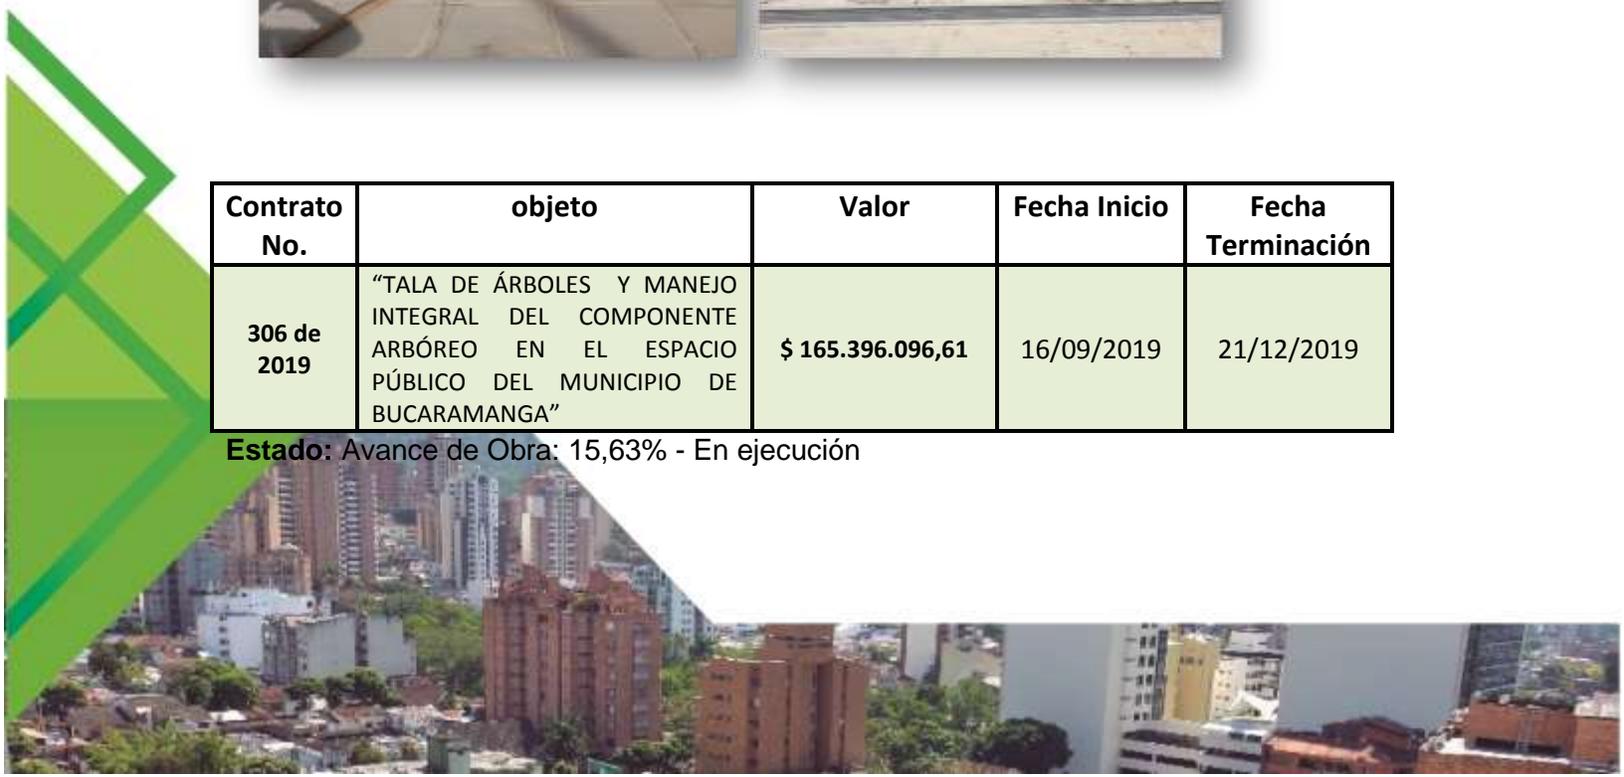

El presente contrato tiene como actividad principal ejecutar la tala de los árboles secos, enfermos, con peligro inminente de caída y adicionalmente por solicitud de la Secretaría de Infraestructura se podrán realizar actividades de manejo integral como podas y control fitosanitario de los árboles del Municipio de Bucaramanga.

Total Árboles talados al 30 de Septiembre de 2019: **55 árboles**

Autorización CDMB / AMB	Dirección	Barrio	No. Árboles
Ley 1523 del 2012 (Por la cual se adopta la política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres)	Parque Las Ardillas	Mutis	2
AMB No.338	Parque Las Ardillas	Mutis	1
Ley 1523 del 2012 (Por la cual se adopta la política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres)	Carretera vieja, detrás del Colegio Nuestra Señora del Pilar	Ciudadela Real de Minas	2
AMB No.381	Zona verde frente a la carrera 3 No.62-50	Ciudadela Real de Minas	1
Ley 1523 del 2012 (Por la cual se adopta la política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres)	Parque Las Cigarras	Ciudadela Real de Minas	1
AMB No.096	Parque Los Guayacanes	Ciudad Bolívar	1
	Calle 64C Casa 105B		1
	Zona del Gimnasio		2
Ley 1523 del 2012 (Por la cual se adopta la política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres)	Calle 64D Casa 98	Ciudad Bolívar	1
	Calle 64A Manzana N Costado Iglesia Divino Niño Jesús	Ciudad Bolívar	1
	Carrera 3 # 58-41	Los Naranjos	1
	Carrera 3 con Calle 57 esquina.		1
	Carrera 3 # 56-23		1
	Carrera 3 # 56-11		1
	Carrera 3 # 55-59		1
	Avenida Búcaros # 3-155		1



Autorización CDMB / AMB	Dirección	Barrio	No. Árboles
AMB No.338	Carrera 7Occ con Calle 61	Mutis	1
Ley 1523 del 2012 (Por la cual se adopta la política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres)	Parque Las Ardillas	Mutis	4
AMB No.373	Parque los Abuelos	Ciudadela Real de Minas	2
Ley 1523 del 2012 (Por la cual se adopta la política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres)	Parque Los Gatos	Ciudad Bolívar	1
	Calle 64 Vehicular		3
CDMB No.007569	Institución Educativa San Francisco de Asís	Santander	1
CDMB No.10451	Carrera 29 # 19-74	San Alonso	1
Ley 1523 del 2012 (Por la cual se adopta la política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres)	Carrera 29 con Calle 20 esquina	San Alonso	1
Ley 1523 del 2012 (Por la cual se adopta la política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres)	Carrera 29 # 20-23 Edf. Luna Flor	San Alonso	1
Ley 1523 del 2012 (Por la cual se adopta la política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres)	Carrera 33 # 33-03	Sector Guarín	1
AMB No.069	Diferentes sectores B. Fontana	Fontana	12
AMB No.338	Calle 105 alrededor de la Cancha, Frente a la Petaca	Porvenir	1



Autorización CDMB / AMB	Dirección	Barrio	No. Árboles
Ley 1523 del 2012 (Por la cual se adopta la política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres)	Parque San Pio	Cabecera	1
AMB No.368			1
Ley 1523 del 2012 (Por la cual se adopta la política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres)	Calle 1N # 16D-25 Frente al ICBF	Juventud	1
AMB No.338			1
	Carrera 10 # 9N-23		1
AMB No.338	Carrera 10 con Calle 7N		2

✓ **Carrera 29 # 19-74 B. San Alonso**



✓ **Carrera 10 con Calle 7N B. Minuto de Dios**





INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Número de equipamientos comunitarios (sociales, deportivos y culturales: canchas sintéticas, multicentros deportivos, salones comunales, entre otros) intervenidos y/o construidos.	35	41	\$ 47.218.175	\$ 39.478.715	0

Las siguientes son las actividades que dan cumplimiento a la meta referida:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
09 de 2019	AUNAR ESFUERZOS EN LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD PARA EL ACCESO GRATUITO A INTERNET A TRAVÉS DE LAS ZONAS WI-FI DE LA COMUNIDAD DE BUCARAMANGA SANTANDER.	\$ 1.493.693.693	25/01/2019	31/12/2019

Actualmente se encuentra el servicio en las zonas WIFI en los sitios establecidos, desde el inicio del convenio.



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
112 de 2019	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA TERMINACION DEL EDIFICIO DE APOYO TEATRO SANTANDER Y TEATRINO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES (EMA) EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 4.057.438.420	22/03/2019	21/10/2019

Estado: Avance de Obra: 51% - En ejecución



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
186 de 2019	"ADECUACION PLAZOLETA DE LA DEMOCRACIA DEL CENTRO ADMINIS-TRATIVO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, SANTANDER"	\$ 288.727.643,16 Adicional \$ 86.115.428,68	11/06/2019	08/10/2019

Estado: Avance de obra: 83% -En ejecución



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
196 de 2019	MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO I (Villa Rosa 4,5,6 , Villa Elena I, los Ángeles, Villa Alegría, Nuevo Horizonte, Villa Helena II)	\$ 1.063.680.300	05/07/2019	04/12/2019
197 de 2019	MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO II (San Cristóbal, Villa Mercedes, Colegio Santo Ángel, Esperanza I, María Paz)	\$ 1.371.448.073		

Estado: Avance de Obra: 30% -Grupo I y 38% Grupo 2 - En Ejecución

Grupo I: El contrato se encuentra en proceso de ejecución con un avance del 30%, e incluye la intervención de los siguientes escenarios deportivos de las comunas 1 y 2 del norte de la ciudad: CANCHA MULTIPLE BARRIO LOS ANGELES, CANCHA MULTIPLE ASENTAMIENTO URBANO NUEVO HORIZONTE, CANCHA MULTIPLE VILLA HELENA I, CANCHA MULTIPLE VILLA HELENA II, CANCHA MULTIPLE VILLA ROSA SECTOR 4, 5, 6, y CANCHA MULTIPLE VILLA ALEGRIA.



CANCHA MULTIPLE B. VILLA ROSA SECTOR 4, 5 Y 6



CANCHA MULTIPLE BARRIO VILLA ALEGRIA





CANCHA MULTIPLE BARRIO LOS ANGELES



CANCHA MULTIPLE ASENT. URBANO NUEVO
HORIZONTE

Grupo II: El contrato se encuentra en proceso de ejecución con un avance del 38%, e incluye la intervención de los siguientes escenarios deportivos de las comunas 1 y 2 del norte de la ciudad: CANCHA MULTIPLE BARRIO SAN CRISTOBAL, CANCHA MULTIPLE BARRIO ESPERANZA I, CANCHA MULTIPLE BARRIO MARIA PAZ, CANCHA MULTIPLE VILLA MERCEDES y CANCHA MULTIPLE BARRIO VILLA ROSA-COLEGIO SANTO ANGEL.



CANCHA MULTIPLE BARRIO SAN CRISTOBAL



CANCHA MULTIPLE BARRIO ESPERANZA



CANCHA MULTIPLE BARRIO VILLA ROSA SECTOR 4, 5 Y 6



CANCHA MULTIPLE VILLA ROSA-
COLEGIO SANTO ANGEL



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
205 de 2019	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DE ATLETISMO LUIS ENRIQUE FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER	\$ 7.328.306.699,1	10/07/2019	24/12/2019

Estado: Avance de Obra: 48,41% - En ejecución

AVANCE DE LA OBRA

- ✓ **REDES DE ALCANTARILLADO:** En la actualidad el contratista se encuentra realizando la construcción de un pozo y terminando las labores del alcantarillado pluvial y la instalación de filtros actividad en la cual se ha realizado el control de la debida instalación de los elementos cumpliendo con los parámetros para su buen funcionamiento.
- ✓ **REFORZAMIENTO DE LAS VIGAS** que se encuentran en el área de camerinos, el contratista ya se encuentra terminando esta actividad e inicio la demolición de piso para la instalación de las redes necesarias para el sector de los camerinos.
- ✓ **ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PISTA.** Demolición de cunetas, la semana pasada se inició con el mejoramiento en la zona de salto triple, en la cual debido al suelo expansivo que se encontró, la consultoría CONSOLTEC recomendó la construcción de pedraplén en el sector.



Construcción de Red y pozos de alcantarillado



INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad




Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
234 de 2019	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE CENTRALIDAD NORTE EN EL TEJAR NORTE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 4.528.233.551,23	15/07/2019	14/12/2019

Estado: Avance de Obra: 26% - En ejecución



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
304 de 2019	"MEJORAMIENTO DEL PARQUE SANTANDER DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"	\$ 51.371.682,03	Por iniciar	Por iniciar

Estado: Avance de obra: 0% - Legalizado y perfeccionado



INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
265 de 2019	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LA CEIBA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA FASE II.	\$ 5.156.747.554	06/08/2019	30/12/2019

Estado: Avance de obra: 12% - En ejecución



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
241 de 2019	CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL METROPOLITANO DEL RÍO SURATÁ EN EL BARRIO EL CLAVERIANO, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA..	\$ 6.103.224.071	16/07/2019	15/12/2019

Estado: Avance de obra: 6% - En ejecución



El contrato presenta un avance del 6%, representado en las obras preliminares, de movimiento de tierras e inicio de actividades de cimentación de muros de contención.

El mínimo avance de obra se debe principalmente a la necesidad de realizar un ajuste del proyecto en lo relacionado con las redes de alcantarillado, muros en gaviones y en la inclusión de un área de parque en la parte alta del barrio Claveriano, sobre el costado sur del mismo, que busca ampliar la cobertura del proyecto en beneficio de la comunidad, mediante un balance financiero de los recursos, sin necesidad de modificar el valor contractual.




CONSTRUCCION DE BORDILLO Y SARDINELES



ANDENES EN LOSETA Y ADOQUIN EN CONCRETO

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
266 de 2019	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LOS SALONES COMUNALES EN LOS BARRIOS. GRUPO 1 (BUCARAMANGA, EL GAITAN, LA FERIA, SAN MIGUEL Y VILLA DEL PRADO)	\$ 2.041.243.497,09	06/08/2019	30/12/2019
267 de 2019	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LOS SALONES COMUNALES EN LOS BARRIOS. GRUPO 2 (DIAMANTE – LA LIBERTAD – NORTE BAJO – NUEVA COLOMBIA – CAFÉ MADRID)	\$ 2.005.639.450,19	06/08/2019	30/12/2019

Estado: Avance de obra: 5,9% Grupo I – 9,18% Grupo 2- En ejecución

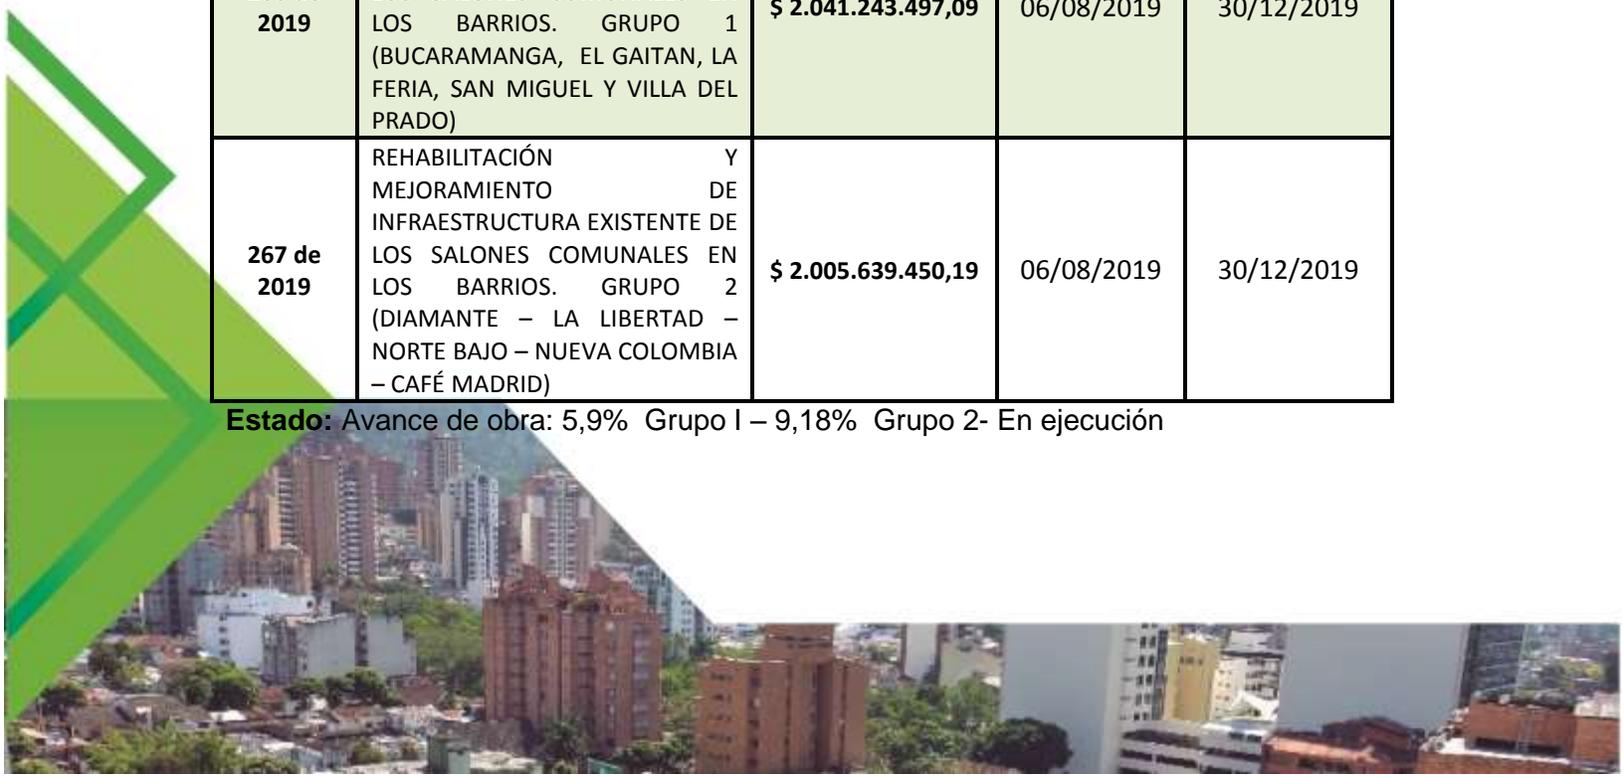

GRUPO 1 (BUCARAMANGA – LA FERIA – GAITAN – SAN MIGUEL – VILLA DEL PRADO)



B. Bucaramanga



B. La Feria



B. Gaitán



B. San Miguel

GRUPO 2 (DIAMANTE – LA LIBERTAD – NORTE BAJO – NUEVA COLOMBIA – CAFÉ MADRID)



B. Diamante I



B. La Libertad





B. Nueva Colombia

B. Café Madrid

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
316 de 2019	PROYECTO DE LA REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA UIMIST DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 927.076.940	20/09/2019	29/12/2019

Estado: Avance de obra: 15% - En ejecución


Este proyecto contempla los diseños tanto arquitectónicos, hidráulicos, sanitario, redes hospitalarias, estudio de suelos, presupuestos, especificaciones entre otros para realizar el proceso de contratación.

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Número de M2 de andenes construidos.	10.400	12.799	\$ 3.334.340	\$ 966.813	0

Dentro de este indicador se encuentran los M2 de andenes de los siguientes proyectos:

- ✓ Construcción del Bosque de los Caminantes en los Cerros Orientales Grupo I y II
- ✓ Mejoramiento del Parque Santander
- ✓ Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos.

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Número de intervenciones en espacio público "La piel de la democracia" realizadas.	15	15	\$ 0	\$ 0	0

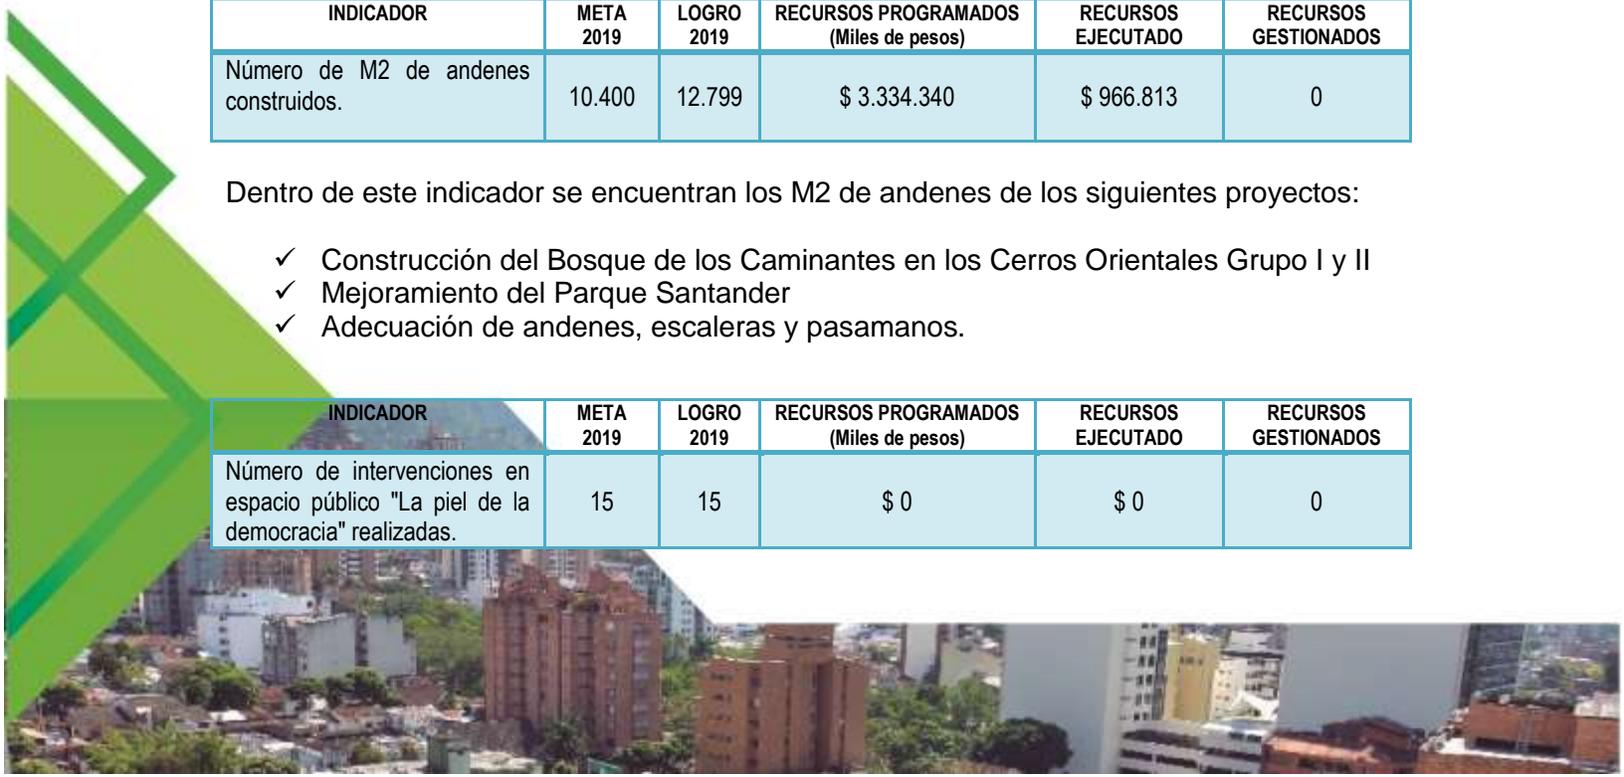

El cumplimiento a este indicador obedece a las intervenciones que se han realizado en los siguientes sitios: Parque recrear del Kennedy, plazoleta de la Democracia, Centralidad Norte y 6 alumbrado público, Morrónico, García Rovira, calle de las Letras, Parque la Flora, villa olímpica, Canelos y Bosque de los Caminantes.

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Porcentaje de avance en la construcción del subsector del parque lineal Río de Oro.	40%	15%	\$ 0	\$ 0	0

Este proyecto fue ejecutado por el Área Metropolitana de Bucaramanga, el porcentaje del 85% fue en la vigencia 2018 y el porcentaje del 15% obedece a la obra final que se realizó en la presente vigencia, así mismo con el aporte de la iluminación por parte del alumbrado público, ya se encuentra cumplido en su totalidad este indicador.

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Porcentaje de recuperación de la estación Café Madrid.	40%	25 %	\$ 0	\$ 0	0

El reporte a este indicador obedece al contrato que se menciona a continuación:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
71 de 2018	RECONSTRUCCIÓN DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DEL CAFÉ MADRID PARA LA HABILITACIÓN DE UN LUDOTECA EN EL BARRIO CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.254.823.459.69 Adicional (\$607.576.566,07)	12/03/2018	13/07/2019

Estado: Avance de Obra: 100% - En proceso de liquidación.





INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Número de estudios y diseños actualizados de la plaza San Mateo.	1	1	\$ 0	\$ 0	0

Los estudios y diseños actualizados de la plaza san Mateo se realizó a través del equipo del taller de arquitectura.

LINEA ESTRATEGICA 6: INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD


6.1 PROGRAMA: PROMOCIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Número de kms de ciclorutas para transporte urbano implementados.	10	17,33	\$ 14.083.527	\$ 13.786.020	0

La Secretaria de Infraestructura se encuentra ejecutado el siguiente contrato en cumplimiento de la meta referida así:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
161 de 2019	CONSTRUCCIÓN DE CICLO-INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO I	\$ 6.518.280.839	30/05/2019	26/12/2019
162 de 2019	CONSTRUCCIÓN DE CICLO-INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO II	\$ 6.260.637.436,76		

Estado: Avance de Obra: - Grupo I: 43.87% - Grupo II: 15.16%

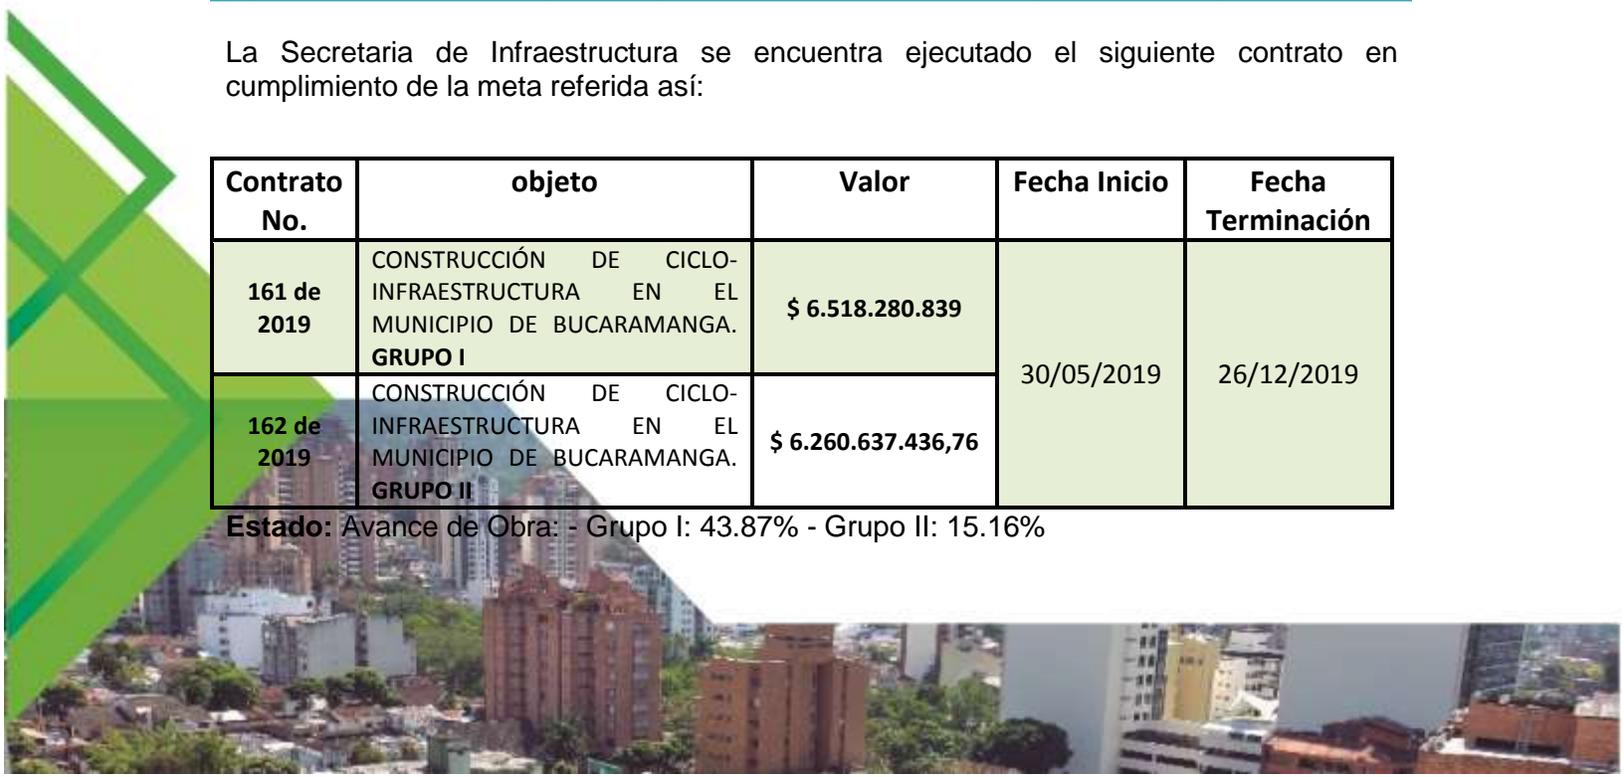

El proyecto de **CONSTRUCCIONDECICLO-INFRAESTRUCTURA** se localiza en el Municipio de Bucaramanga, en los sectores comprendidos entre:

GRUPO I

Corredor 1

CALLE 9 ENTRE CARRERA 25 Y CARRERA 26 -CALLE 9 ENTRE CARRERA 23 Y CARRERA 24



Corredor 2

CARRERA 21 ENTRE CALLE 18 Y CALLE 19 – CARRERA 21 GLORIETA PARQUE SAN FRANCISCO



Corredor 4



BULEVAR SANTANDER ENTRE GLORIETA SAN FRANCISCO Y CARRERA 20



GRUPO II

Corredor 8 Avenida la Rosita Entre la glorieta del Chicamocha, pasando por la carrera 27 hasta llegar al tanque de acueducto. Además la calle 41 y la carrera 10.



Corredor 5 barrios de Real de Minas, Mutis y Calle de los estudiantes.



6.2 PROGRAMA: MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Número de Puentes Peatonales construidos.	1	1	\$ 0	\$ 0	0

El cumplimiento a este indicador, obedece al puente peatonal construido en el proyecto de la Construcción del Intercambiador Carrera 27 (Mesón de los Búcaros)

6.3 PROGRAMA: MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA


INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Número de M2 de malla vial urbana mejorados y/o construidos.	30.500	90.398	\$ 15.740.748	\$ 13.853.044	0

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
261 de 2019	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - GRUPO 1	\$ 4.446.523.289	06/09/2019	30/12/2019
263 de 2019	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - GRUPO 2	\$ 4.316.014.490	06/09/2019	30/12/2019
264 de 2019	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. - GRUPO 3	\$ 3.838.463.454,08	06/09/2019	30/12/2019

Estado: Avance de Obra: 37.55% Grupo 1 – 40.74% Grupo 2 – 32.46% Grupo 3 – En ejecución.

Grupo 1

Área aproximada a intervenir = 27.314 m²
Área acumulada intervenida = 15.532 m²

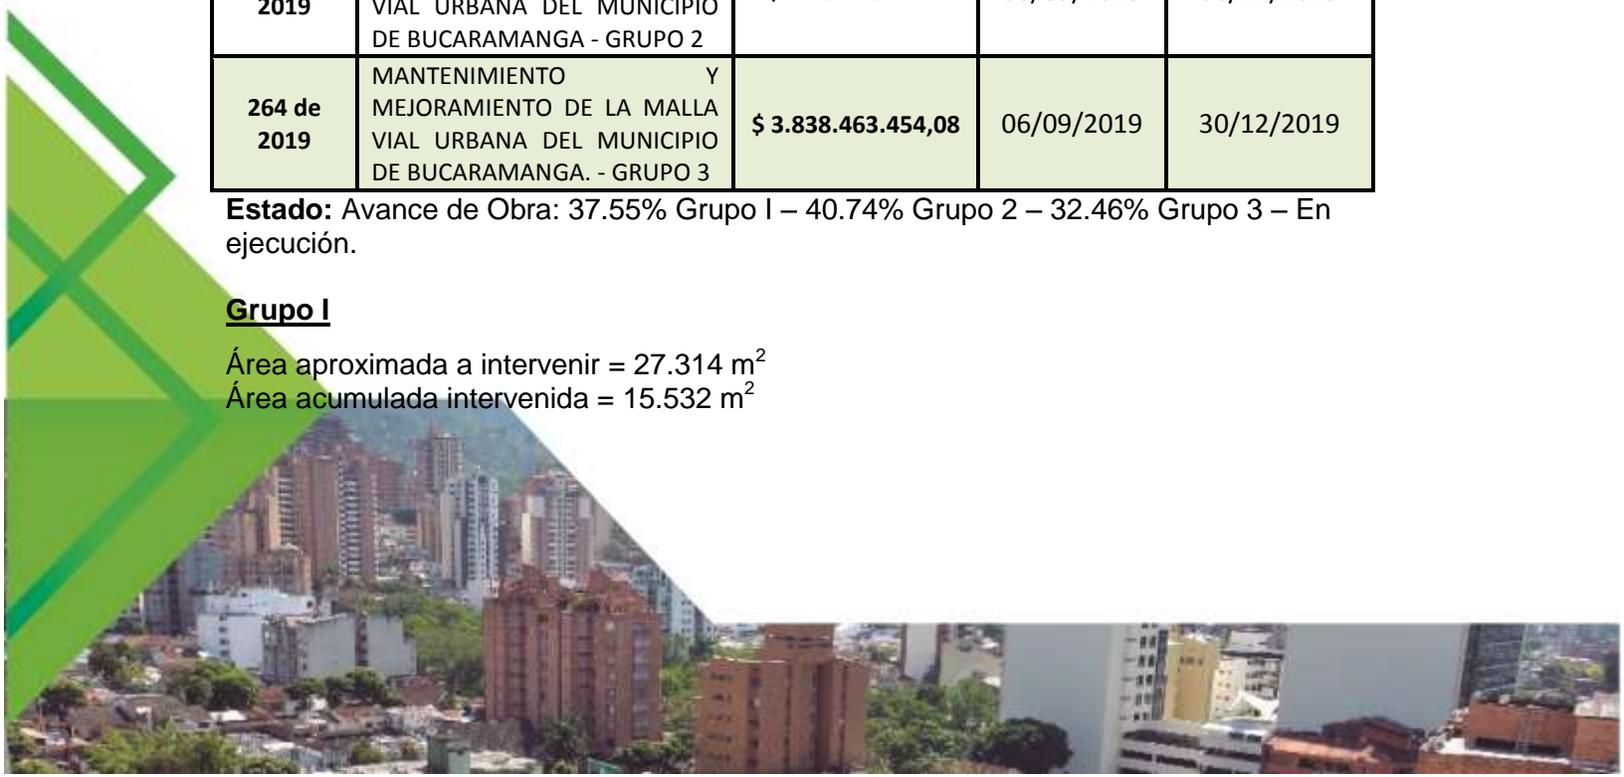



Colorados



Boulevard Bolívar

Grupo 2

Área aproximada a intervenir = 28.068 m²
Área acumulada intervenida = 21197 m²



Cll 45 con Cra 12w Calzada Norte



Calle 14 con Cra 32

Grupo 3

Área aproximada a intervenir = 23.646 m²
Área acumulada intervenida = 9.755,48 m²



Cra 28 con Cll 86 – Barrio San Martín



Calle 105 (Occ-Or) Desde Cra 26
hasta el puente Provenza



6.4 PROGRAMA: MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL RURAL


INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Número de kms de vías rurales con transitabilidad mantenida.	140	140	\$ 78.072	\$ 78.071	0

Así mismo se atendieron los corregimientos 1 y 2 con la Maquinaria del Municipio (1 retroexcavadora, 1 voqueta y 1 minicargador) realizando actividades como: remoción de derrumbes, cuneteo y conformación de subrasante, provocados por la ola Invernal.

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Número de ML de placa huella construidas.	4.000	3.810	\$ 3.863.449	\$ 3.495.804	0

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
282 de 2019	CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 1	\$ 1.136.548.602	15/08/2019	29/12/2019
283 de 2019	CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 2	\$ 1.180.683.854	15/08/2019	29/12/2019
284 de 2019	CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 3	\$ 1.300.079.710	15/08/2019	29/12/2019

Estado: Avance de obra de los tres grupos: 33%

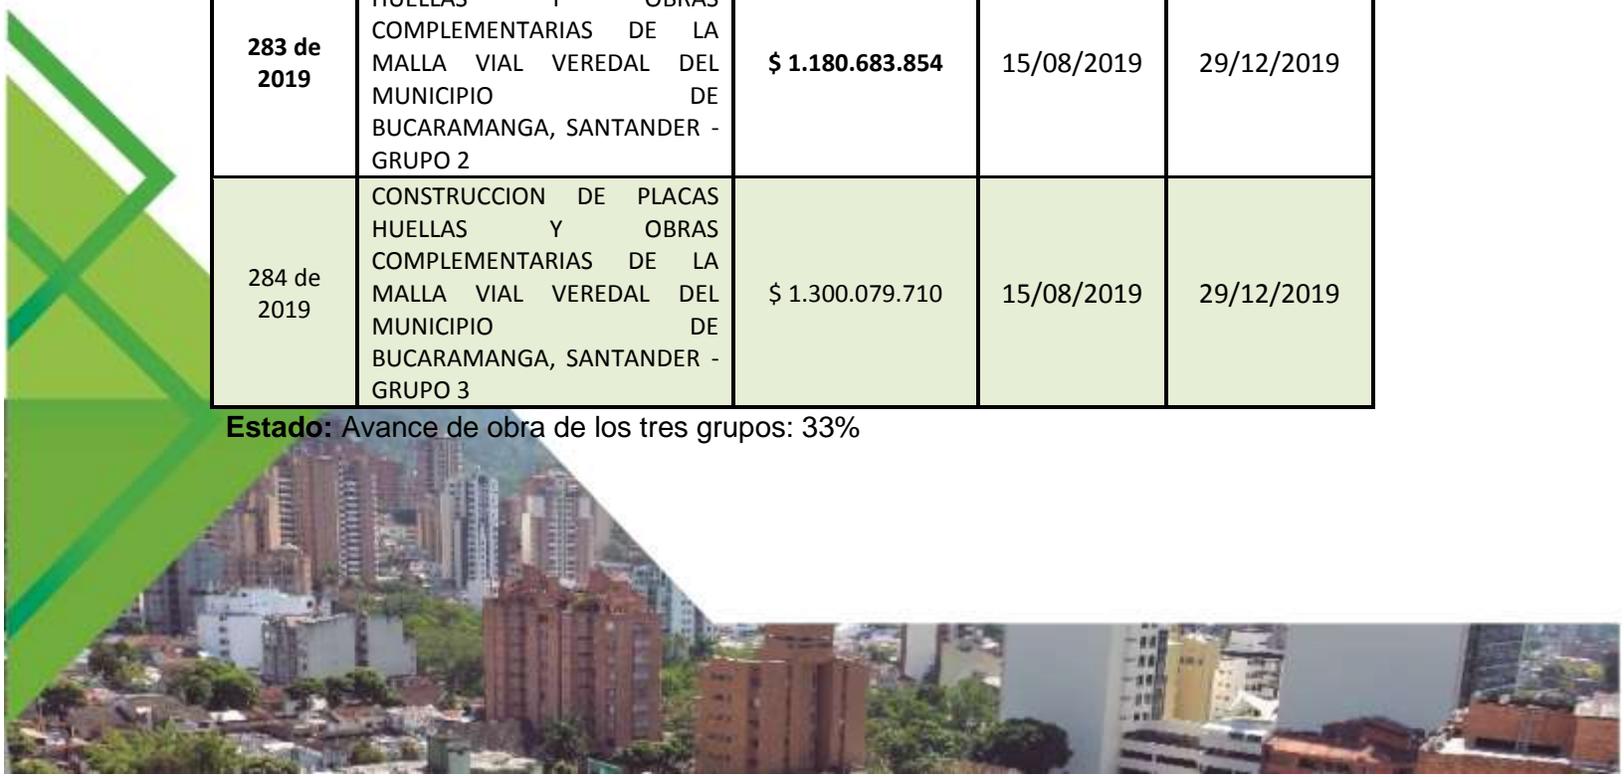

Grupo 1 - Corregimiento I

VEREDA	SITIO ESPECIFICO
ANGELINOS	SECTOR CARABINEROS TRAMO No. 1, 2, 3
LA ESMERALDA	FINCA LUCILA SAAVEDRA
	FINCA SIEMPRE VIVA
	FINCA GENY LA PISCINA
	VIA A SAN PEDRO BAJO
	FINCA EL CALZO
SAN IGNACIO	DESPULPADORA
	DESDE PUENTE TIERRA HACIA SAN IGNACIO LA SABANA
	EL MANGO
EL ABURRIDO	FINCA DE LA CDMB
SANTA RITA	FINCA DON DANIEL
	VIA MAGUEYES CURVA LA TALARA
SAN CAYETANO	CURVA EL MAMON
SAN PEDRO BAJO	MIRAMAR SECTOR EL TANQUE



FINCA GENY



FINCA LUCILA SAAVEDRA



FINCA LUCILA SAAVEDRA



EL MANGO



EL MANGO



EL MANGO



Grupo 2 Corregimiento 2

VEREDA	SITIO ESPECIFICO
LOS SANTOS	FINCA EL PORVENIR
CAPILLA ALTA	FINCA IVAN LOPEZ
	CURVA EL CUCHARAL
	MIRADOR No. 3
CAPILLA BAJA	CARDENALES
	FINCA JORGE JAIMES, INVERNADERO No. 1
CUCHILLA ALTA	DORIS ARDILA Y ACCESO ESCUELA RURAL
	PALO BLANCO
MONSERRATE	GERMAN VILLABONA
	FINCA GALLEGO
ROSA BLANCA	GAVIONES
BOLARQUI ALTO	FINCA LA HERMOSA
BOLARQUI BAJO	CASA TABLA
	AGUA BLANCA
MAGUEYES	FINCA EL TRAPICHE



FINCA IVAN LOPEZ



ESTUDIO DE SUELOS EN MIRADOR



INICIO DE ARMADO PARILLA PARA PLACA HUELLA DE MIRADOR




COMPACTACION DE BASE EN CURVA CUCHARAL



ARMADO DE OLACA HUELLA FINCA IVAN LOPEZ



COMPACTACION DE BASE EN CURVA CUCHARAL



6.5 PROGRAMA: SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS Y RURALES

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Número de acueductos (sector rural) repotenciados.	2	4	\$ 583.372	\$ 504.058	\$ 0

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
326 de 2019	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES MAGUEYES, MONSERRATE, ROSA BLANCA Y LAS GRANJITAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"	\$ 504.058.620	Por iniciar	Por iniciar

Estado: El contrato de encuentra adjudicado y en proceso de legalización.

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Porcentaje de proyectos complementarios de obras de conducción para el embalse de Bucaramanga gestionados.	10%	10%	\$ 0	\$ 0	\$ 13.297.762

El cumplimiento a este indicador obedece a la gestión que realizó el Municipio de Bucaramanga con el Acueducto Metropolitano para realizar el contrato de obra pública No. 104 del 17 de Septiembre de 2018, para la CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ADUCCION DEL PROYECTO EMBALSE DE BUCARAMANGA (SECTOR SHALOM – BOSCONIA).

6.6 PROGRAMA: ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Número de luminarias sustituidas a LED.	12.000	8.555	\$ 12.204.371	\$ 8.427.194	0

Para el cumplimiento de estos indicadores se adelanta:



Para la fase III se tiene estimado la instalación de luminarias tipo led en las comunas 12, 13, 14, 15 y 17.

Comuna 12: Altos del jardín, Antiguo campestre, Bolarqui, Cabecera, Conucos, El Jardín, La Floresta, Cedros, Mercedes, Nuevo Sotomayor, Pan de azúcar, Puerta del sol, Terrazas y Sotomayor.

Comuna 13: Álvarez, Las Américas, Antonia Santos, Bolívar, Prado, Galán, Aurora, Los Pinos, Mejoras Públicas, Quinta Dania y San Alonso.

Comuna 14: Albania, Buena Vista, Buenos Aires, Diviso, Limoncito, Miraflores, Morrórico, Quinta Brigada, Sauces, Vegas de Morrórico y Venado de Oro.

Comuna 15: García Rovira, Centro y Avenida Libertador.


Comuna 17: Balconcitos, Brisas del Mutis, Estoraques, La Gran Ladera, Héroes, Manzanares, Monterredondo, Mutis, Prados del Mutis y Quebrada La Iglesia.

INSTALACION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECNOLOGIA LED PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – FASE II, EN LAS COMUNAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 11.

"INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECNOLOGÍA LED PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – FASE II, EN LAS COMUNAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11".										
GRUPO	CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	FEHCA DE INICIO	PLAZO (días)	FECHA FINAL	ADICIONAL PLAZO	ADICIONAL VALOR	NUEVA FECHA FINAL	AVANCE INSTALACION	ESTADO
1	BIOTECNOLOGIA	\$ 1.855.918.171	23/01/2019	150	22/06/2019	30	0	22/07/2019	100%	En liquidacion
2	UNION TEMPORAL ILUMINACION URBANA	\$ 1.560.166.824	27/12/2018	150	26/05/2019	30	0	26/06/2019	100%	En liquidacion
3	CONSORCIO ALUMBRADO PUBLICO 2018	\$ 2.001.758.182	27/12/2018	150	26/05/2019	30	0	26/06/2019	100%	En liquidacion
4	CONSORCIO ALUMBRADO PUBLICO FASE II	\$ 1.915.427.500	23/01/2019	150	22/06/2019	30	0	22/07/2019	100%	En liquidacion
INTER VENTORIA	INTER 24000	\$ 842.775.897	27/12/2018	150	26/05/2019	60	\$ 314.844.912	25/07/2019	100%	En liquidacion

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
251 de 2019	Modernización del alumbrado público entre las calles 34 y 37 y entre las carreras 10 a la 12 del municipio de Bucaramanga.	\$1.785.201.572.00	31 de Julio de 2019	30 de Diciembre de 2019

Estado: Avance de Obra 21.93% - En Ejecución

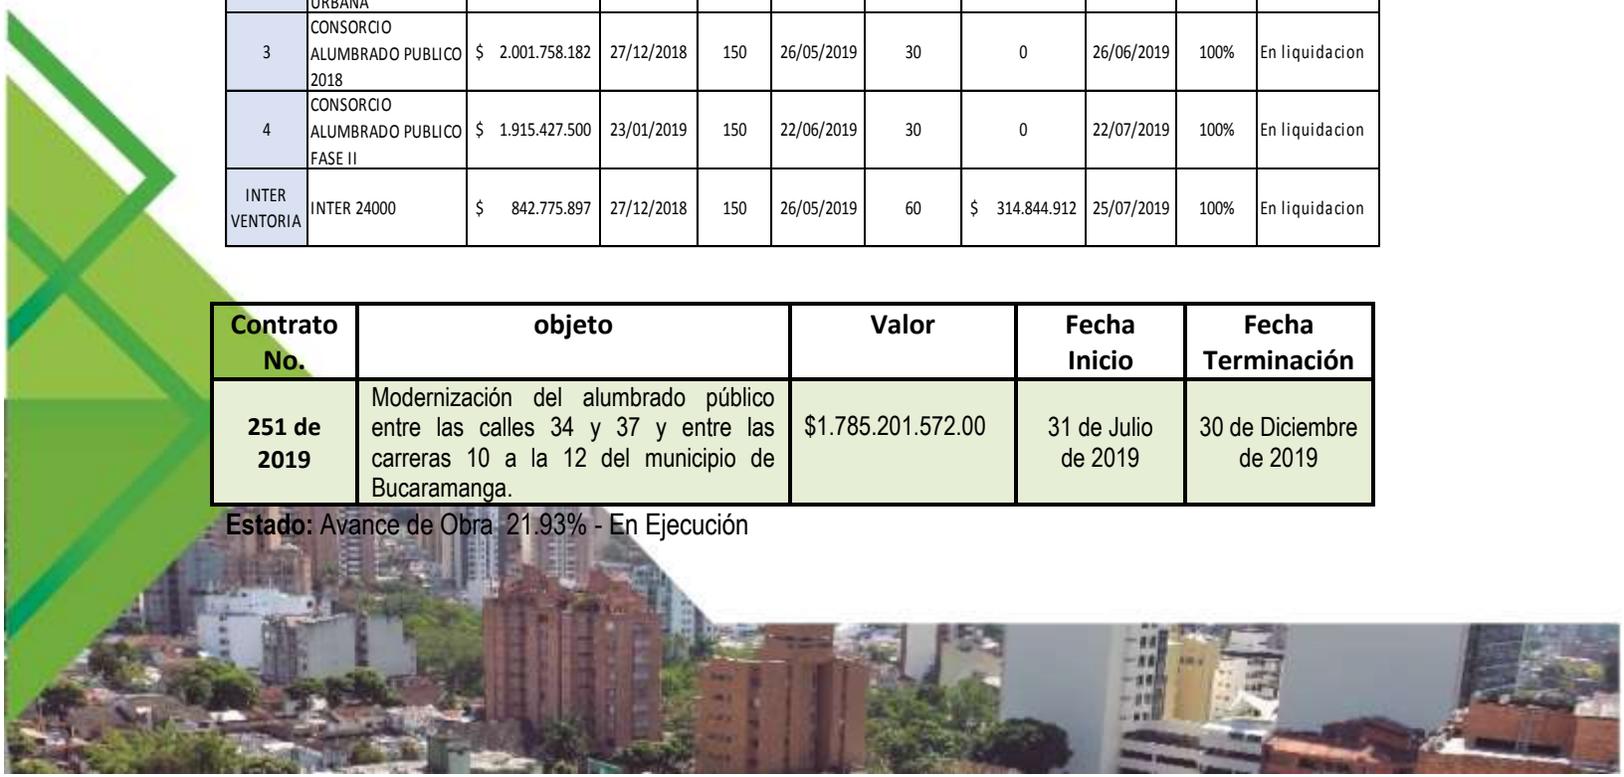

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
269 de 2019	interventoría a las obras de modernización del alumbrado público entre las calles 34 y 37 y entre las carreras 10 a la 12 del municipio de Bucaramanga	\$ 181.709.311.00	31 de Julio de 2019	30 de Diciembre de 2019

Estado: Avance de Obra 38.16% - En Ejecución.



**EXCAVACIONES PARA BANCOS DE DUCTOS
FRENTE A LA PLAZOLETA DE LA DEMOCRACIA**

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
173 de 2019	Eexpansión y modernización del sistema de alumbrado público de los escenarios deportivos de diferentes sectores del municipio de Bucaramanga	\$446.384.674 Adicional \$8.090.929,51	Mayo 28 de 2019	Octubre 10 de 2019.

Estado: Avance de Obra 100% - En Ejecución. Obra terminada, pendiente recibo de la obra por trámites del contratista de RETIE y RETILAP.

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
141 de 2019	Actividades de poda para el despeje de luminarias y redes que interfieren con el alumbrado público en el municipio de Bucaramanga.	\$638.961.999.63	Mayo 6 de 2019	Diciembre 20 de 2019

Estado: Avance de Obra 67.5% - En Ejecución

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Numero de luminarias expandidas	300	504	\$3.320.000	\$3.209.984	0

A continuación las actividades quedan cumplimiento a la meta referida.



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
325 de 2019	Construcción y expansión del alumbrado público en zonas rurales del municipio de Bucaramanga.	\$ 695.170.137,00	Septiembre 25 de 2019	Diciembre 26 de 2019

Estado: Avance de Obra 1% - En Ejecución

VEREDAS A INTERVENIR EN PROYECTO DE EXPANSION RURAL 2019

Corregimiento 1: Angelinos, Aburrido Parte Baja, El Pablón, La Sabana, San Ignacio, San Pedro Sector, Miramar, San Pedro Alto, Colorados Campestre Norte.

Corregimiento 2: Bolarquí Alta, Bolarquí Baja, Capilla Alta, Magueyes, Cuchilla Alta.

Corregimiento 3: Santa Bárbara, Gualilo, Retiro Chiquito.


FRENTE 1: CORREGIMIENTO 1		FRENTE 2: CORREGIMIENTO 2		FRENTE 3: CORREGIMIENTO 3	
VEREDAS	LUMINARIAS	VEREDAS	LUMINARIAS	VEREDAS	LUMINARIAS
Angelinos,	7	Bolarquí Alta,	9	Santa Bárbara,	35
Aburrido Parte Baja,	5	Bolarquí Baja,	27	Gualilo,	45
El Pablón,	3	Capilla Alta,	8	Retiro Chiquito,	20
La Sabana,	3	Magueyes,	4		
San Ignacio,	16	Cuchilla Alta.	10		
San Pedro Sector Miramar,	30				
San Pedro Alto,			10		
Colorados Campestre Norte.	7				
TOTAL LUMINARIAS	71	TOTAL LUMINARIAS	68	TOTAL LUMINARIAS	100

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
297 de 2019	Modernización y expansión del alumbrado público perimetral del parque ecológico la flora de Bucaramanga	\$2.327.801.828,00	28 de agosto de 2019	27 de diciembre de 2019

Estado: Avance de Obra 14% - En Ejecución



EXCAVACIONES PARA BANCOS DE DUCTOS COSTADO ORIENTAL PARQUE.

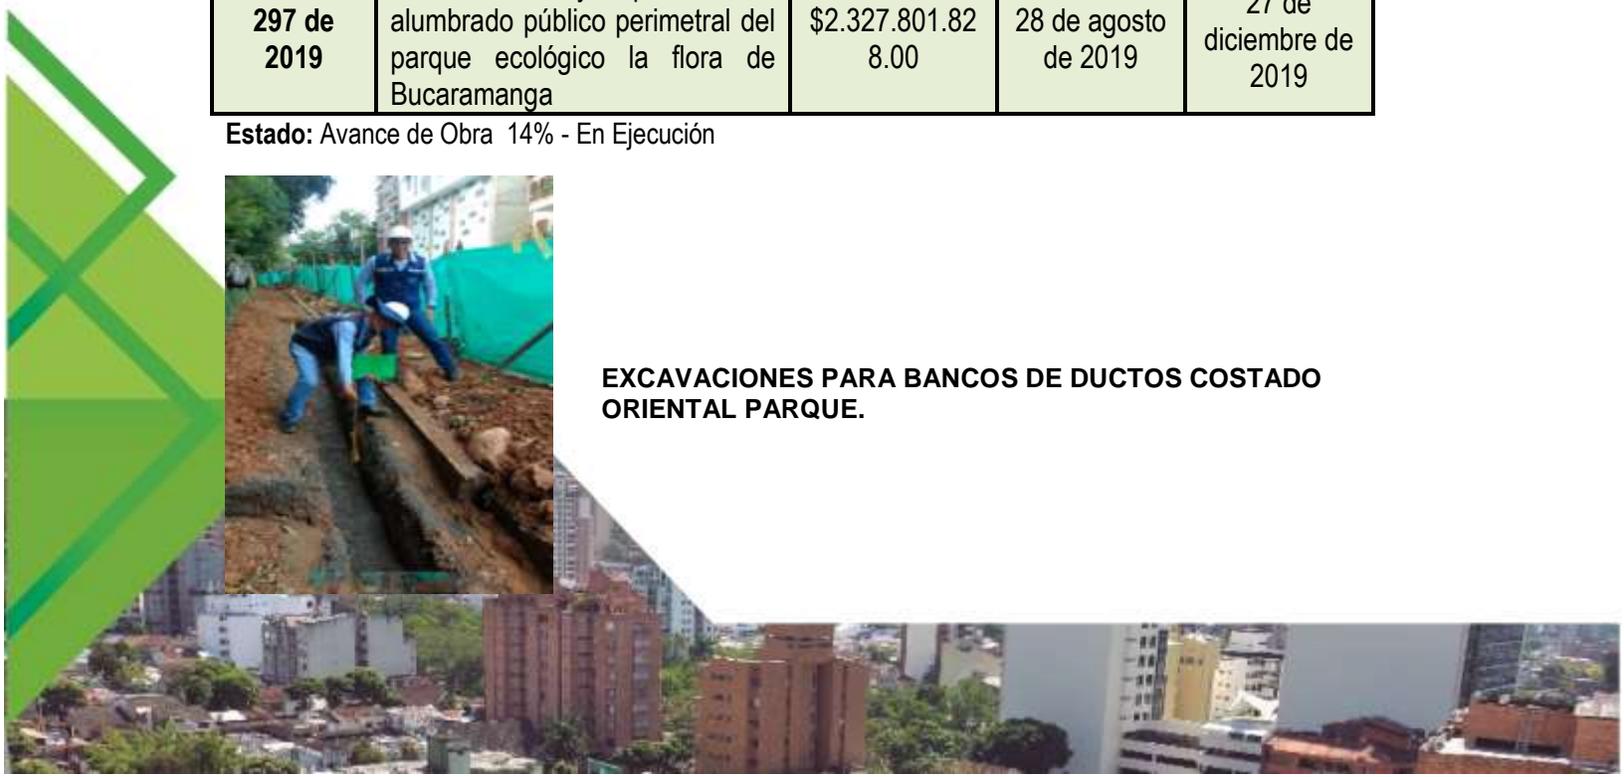

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Número de puntos de telemedida instalados y puestos en marcha.	20	6	\$1.650.000	\$1.633.233	0

Las actividades que dan cumplimiento a este indicador tienen los dos componentes, obra civil (Infraestructura) y Alumbrado público, Los puntos de telemedida reportados son:

Edecanes, Tejar Norte 1, Granjas de Provenza, La Flora, Teatrino y Tejar Norte Cancha Sintética.

Así mismo se ejecutan otros contratos en cumplimiento del indicador referido.

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
157 de 2019	Servicio de mantenimiento y actualización a los sistemas de información geográfica "gocms", sistema integrado de información y digitalización de redes "siidar", sistema de gestión de alumbrado público "gestión-eme", sistema de gestión documental "scado", pagina web utilizados por la oficina de alumbrado público de Bucaramanga.	\$141.390.961	Mayo 13 de 2019	Noviembre 12 de 2019


Estado: Avance de Obra 80% - En Ejecución


Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
118 de 2019	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE ALUMBRADO PUBLICO-SGAP Y EL HARDWARE DE CONTROL EN LOS DIFERENTES SITIOS CON TELEMEDIDA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 161.581.351	01/04/2019	30/12/2019

Estado: Avance de Obra: 69% - En ejecución

TELEGESTION Y TELEMEDIDA

Monitoreo permanente de los estados de los diferentes parques de la ciudad que están telegestionados.

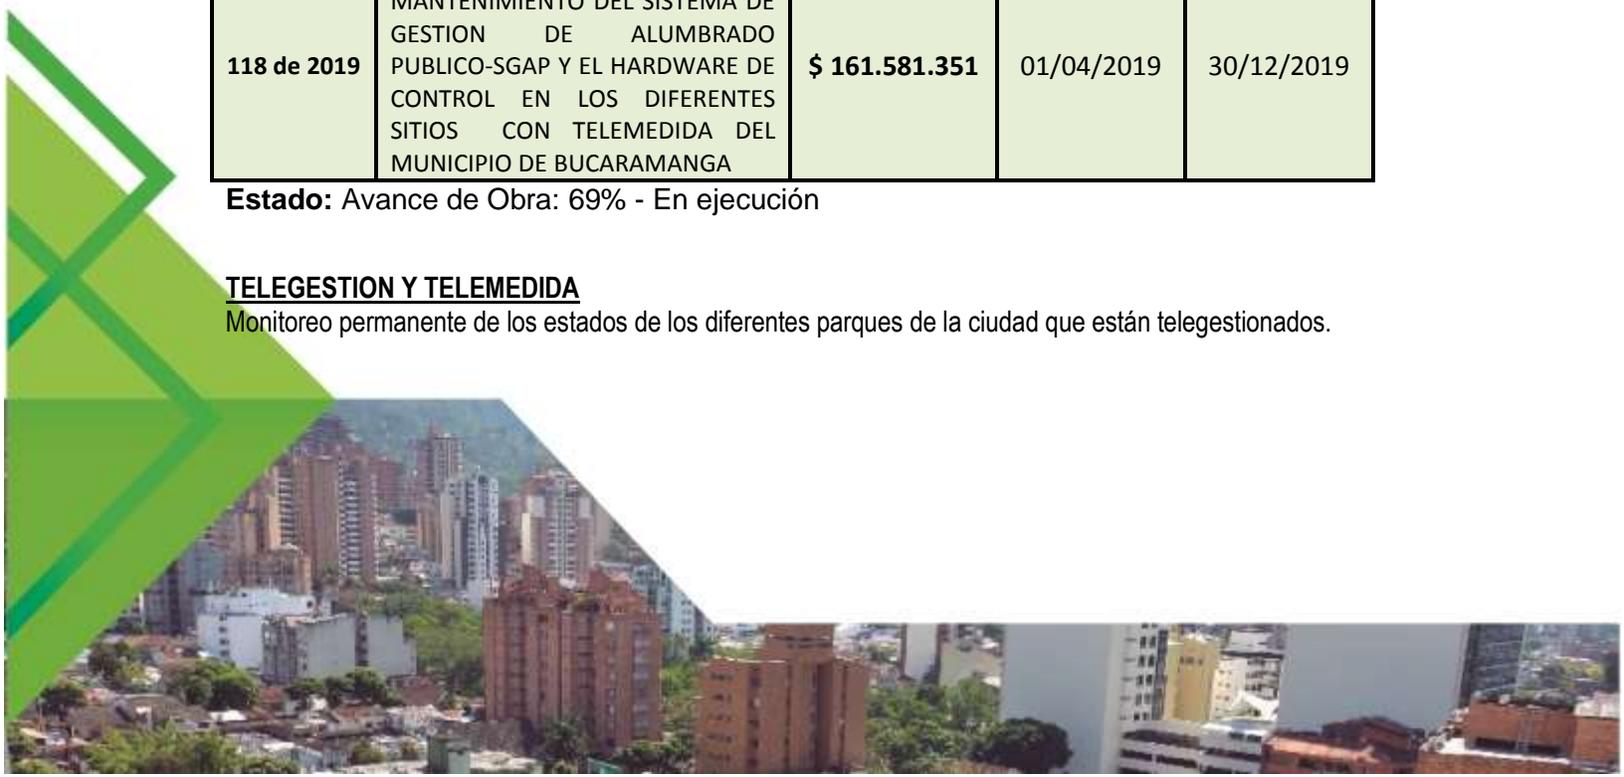

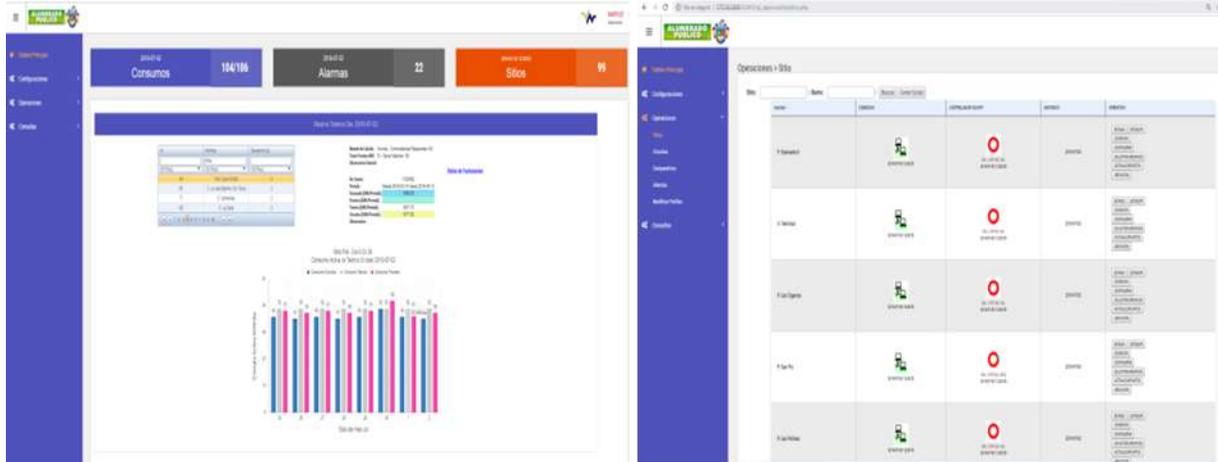

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Número de proyectos pilotos de energía solar puestos en funcionamiento.	1	1	\$2.000.000	\$1.460.175	0

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
246 de 2019	Construcción del alumbrado público alimentado con energía solar para el parque contemplativo el carrasco en el municipio de Bucaramanga	\$1.351.805.677,00	31 de Julio de 2019	30 de Diciembre de 2019

Estado: Avance de Obra 20% - En Ejecución



INSTALACIÓN DE POSTE CON PANEL SOLAR Y LUMINARIAS EN PARQUE EL CARRASCO.



INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Número de parques y/o escenarios públicos modernizados en su alumbrado público.	7	34	\$14.000.000	\$13.844.391	0

Las actividades que dan cumplimiento a la meta referida son:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
245 de 2019	Modernización y expansión del alumbrado público perimetral del parque ecológico la flora de Bucaramanga	\$2.327.801.828.00	28 de agosto de 2019	27 de diciembre de 2019

Estado: Avance de Obra 13.19% - En Ejecución




DEMOLICIONES DE ANDENES PARA BANCOS DE DUCTOS, TENDIDO DE BANCOS DE DUCTOS Y CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE HALADO.

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
260 de 2019	Modernización del alumbrado público de la pasarela de calzado (la carrera 22 entre calles 19 y 20 y calles 19, 20, 21 y 22 entre carreras 21 y 23) del municipio de Bucaramanga.	\$893.074.153.50	08 de Agosto de 2019	07 de Diciembre de 2019

Estado: Avance de Obra 20% - En Ejecución.



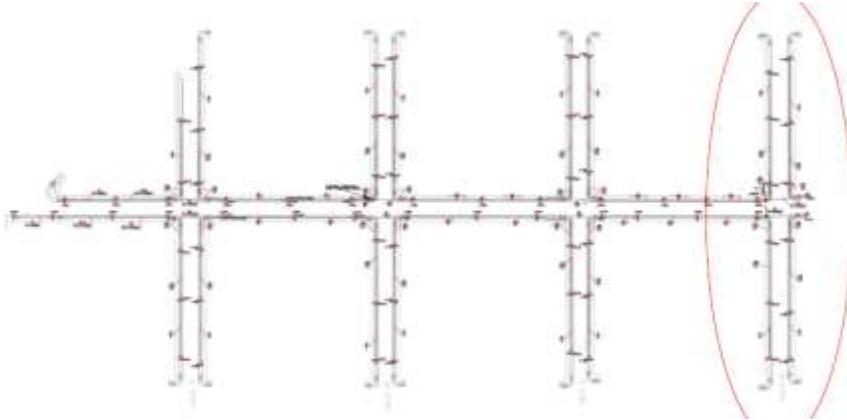

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
256 de 2019	Ampliación del alumbrado público perimetral exterior de la villa olímpica del municipio de Bucaramanga	\$1.388.093.264.00	14 de Agosto de 2019	13 de Diciembre de 2019

Estado: Avance de Obra 6.82% - En Ejecución.



EXCAVACIONES PARA BANCOS DE DUCTOS, CERRAMIENTOS Y REPLANTEO DEL PROYECTO.

CONTRATO PARQUES DE BUCARAMANGA: Villa Rosa, Robledo, Esperanza 2, Esperanza 3, San Francisco, La Ceiba, Cristal Bajo, Girardot, Estación Villa Rosa y Gaitán

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
294 de 2019	Construcción y modernización del alumbrado público de los parques del municipio de Bucaramanga (Villa Rosa, Robledo, Esperanza 2,	\$1.224.136.553.00	22 de Agosto de 2019	21 de Diciembre de 2019



	Esperanza 3, San Francisco, La Ceiba, Cristal Bajo, Girardot, Estación Villa Rosa y Gaitán)			
--	---------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Estado: Avance de Obra 22% - En Ejecución



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
275 de 2019	Modernización del alumbrado público de la calle 30 entre las carreras 26 y 27 del municipio de Bucaramanga.	\$1.068.518.465.00	20 de agosto de 2019	19 de diciembre de 2019



Excavaciones para bancos de ductos, cerramientos y replanteo del proyecto, frente a sede de la Normal.

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
285 de 2019	Modernización del alumbrado público de la calle de los estudiantes entre la calle 54 A y la diagonal 14 municipio de Bucaramanga	\$3.911.411.963	15 de Agosto de 2019	29 de Diciembre de 2019



Estado: Avance de Obra 5% - En Ejecución



DEMOLICIONES PARA TENDIDO DE DUCTOS SISTEMA ELÉCTRICO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE HALADO.

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
192 de 2019	Modernización del sistema de alumbrado público de los escenarios deportivos y parque principal del barrio los canelos del municipio de Bucaramanga.	\$920.749.354	Junio 27 de 2019	Octubre 26 de 2019

Estado: Avance de Obra 82% - En Ejecución.

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Porcentaje de nuevos espacios públicos con alumbrado público instalado	100%	100%	\$4.403.926	\$3.728.569	0

Este indicador se cumple con las obras civiles en las cuales se instala el alumbrado público.

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Porcentaje de luminarias que se encuentran en funcionamiento	96%	97%	\$31.934.006	\$18.223.619	0

Las actividades que dan cumplimiento a este indicador son los siguientes:



CONTRATOS MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO							
CONCEPTO	N° Cont	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	154	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, GRUPO N-01	22/05/2019	31/12/2019	\$ 554.559.219	BIOTECNOLOGIA - GRUPO 01	60,71%
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	155	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, GRUPO N-02	21/05/2019	31/12/2019	\$ 439.559.461	UT CIVACON - GRUPO 02	60,89%
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	156	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, GRUPO N-03	21/05/2019	31/12/2019	\$ 426.749.586	UT APB 2019 - GRUPO 03	60,89%
INTERVENTORIA ALUMBRADO PUBLICO	164	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	21/05/2019	31/12/2019	\$ 606.677.490	HCR INGENIEROS SAS	60,89%

SECTORES A INTERVENIR

- ❖ GRUPO 01 Intervienen: Comunas 4, 5, 7, 12, 17, Corregimiento 3 y Viaducto Provincial.
- ❖ GRUPO 02 Intervienen: Comunas 2, 3, 6, 8, 9, 14, 15 y Corregimiento 1
- ❖ GRUPO 03 Intervienen: Comunas 1, 10, 11, 13, 16 y Corregimiento 2

MANTENIMIENTO EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DANDO COBERTURA AL SECTOR URBANO Y RURAL



Igualmente a este indicador se suman los gastos operativos y administrativos de la Oficina de Alumbrado Público entre los cuales esta:

1. EL ARRENDADOR ENTREGA AL ARRENDATARIO A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO, EL USO Y GOCE DE LA BODEGA NO 6 DEL " CENTRO INDUSTRIAL RUTA 169 PROPIEDAD HORIZONTAL, UBICADO EN LA CARRERA 8 NO 20 N-148 DE BUCARAMANGA, CUYOS LINDEROS SE ENCUENTRAN EN LA ESCRITURA PÚBLICA 1518 DE 2016 DE LA NOTARIA DECIMA DE BUCARAMANGA, LE CORRESPONDE EL FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA 300-403751, LA CUAL SE DESTINARA COMO BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE LUMINARIAS DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
2. EL ARRENDADOR ENTREGA EN ARRENDAMIENTO AL MUNICIPIO, LA CASA UBICADA EN LA CARRERA 12 NO. 33-51 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) PARA QUE ALLÍ FUNCIONEN LAS OFICINAS Y LA BODEGA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL.
3. PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA UPS DE 6 KVA MARCA TOSHIBA DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
4. Entre otros

7. INDICADORES QUE TIENE META PERO AUN NO ALCANZAN LOGRO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PROGRAMA: VIVE DIGITAL PARA LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Número de puntos vive DIGITAL construidos y mantenidos.	1	0	\$ 0	\$ 0	0

PROGRAMA: INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Número de adecuaciones y/o mantenimientos realizados a las plazas de mercado a cargo del municipio.	2	0	\$ 542.180	\$ 0	0

PROGRAMA: SITM EFICIENTE Y CONFIABLE

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Número de puentes peatonales construidos.	1	0	\$ 0	\$ 0	0




PROGRAMA: SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS Y RURALES

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Número de unidades familiares beneficiadas con gas (sector rural).	60	0	\$ 0	\$ 0	0
Número de plantas de potabilización (sector rural) adquiridas.	10	0			
Número de Plantas de Tratamiento de Agua Residuales - PTAR compactas adquiridas para el sector rural.	3	0			
Número de pozos sépticos construidos para el sector rural.	30	0			
Número de redes de acueducto y alcantarillado gestionados y/o construidos en barrios legalizados.	3	0			
Número de usuarios beneficiados con la cobertura de electrificación rural en los tres corregimientos.	1.669	0			
Número de acueductos veredales construidos.	0	0			

Para la construcción de los dos acueductos veredales, se cuenta con los diseños actualizados para las veredas Capilla Baja-Bolarqui Baja, proyecto que no ha podido radicarse ante el Banco de proyectos de inversión por la carencia del permiso de concesión de aguas de la quebrada la Aguada, gestión que únicamente puede realizar la comunidad, solicitud que se encuentra radicada ante la CDMB desde el 18 de julio de 2017 y a pesar de la insistencia por parte de esta entidad ante los líderes comunales y la CDMB, no ha sido posible que la comunidad radique la totalidad de los documentos, según lo informa la CDMB mediante oficio del 5 de julio de 2019 (Anexo).

Ante la premura de licitar la obra, la Administración municipal realizó mesa de trabajo en el salón comunal de la vereda Capilla Baja, el pasado 8 de julio, donde la comunidad se comprometió a entregar los documentos faltantes a más tardar el 19 de julio de 2019 para poder culminar el proceso del permiso de concesión de agua de la quebrada la Rana ante la autoridad ambiental CDMB. (se anexa acta de reunión). El costo del proyecto asciende a la suma de \$ 2.483 millones, el cual incluye planta de tratamiento, redes y 86 pozos sépticos.

En relación a los pozos sépticos se realizó la licitación **No. SI-LP-029 -2019**, el cual se encuentra adjudicado y en proceso de legalización, se espera que dé inicio en el mes de



Octubre de 2019, el cual contempla la construcción de **148** pozos sépticos en los tres corregimientos.

Concerniente a las plantas de potabilización, también se realizó proceso de contratación **SI-SAMC-016-2019** para la construcción de 10 plantas en Instituciones Educativas del sector rural, el cual se encuentra adjudicado y en proceso de legalización.


8. METAS QUE PESE A LA GESTION YA NO PRESENTARAN AVANCE

PROGRAMA: SALUD AMBIENTAL

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Porcentaje de avance en la construcción del centro de bienestar animal.	50%	0	\$ 0	\$ 0	0
Porcentaje de avance en la construcción del coso municipal.	50%	0	\$ 0	\$ 0	0

PROGRAMA: INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Porcentaje de avance en la rehabilitación de la plaza San Mateo.	50%	0	\$ 0	\$ 0	0
Porcentaje de avance en la construcción del subsector del parque sobre la quebrada la Esperanza.	50%	0	\$ 0	\$ 0	0
Porcentaje de avance en la construcción del subsector del parque lineal sobre la Quebrada la Iglesia.	40%		\$ 0	\$ 0	0
Porcentaje de recuperación paisajística del parque metropolitano del norte.	40%		\$ 0	\$ 0	0

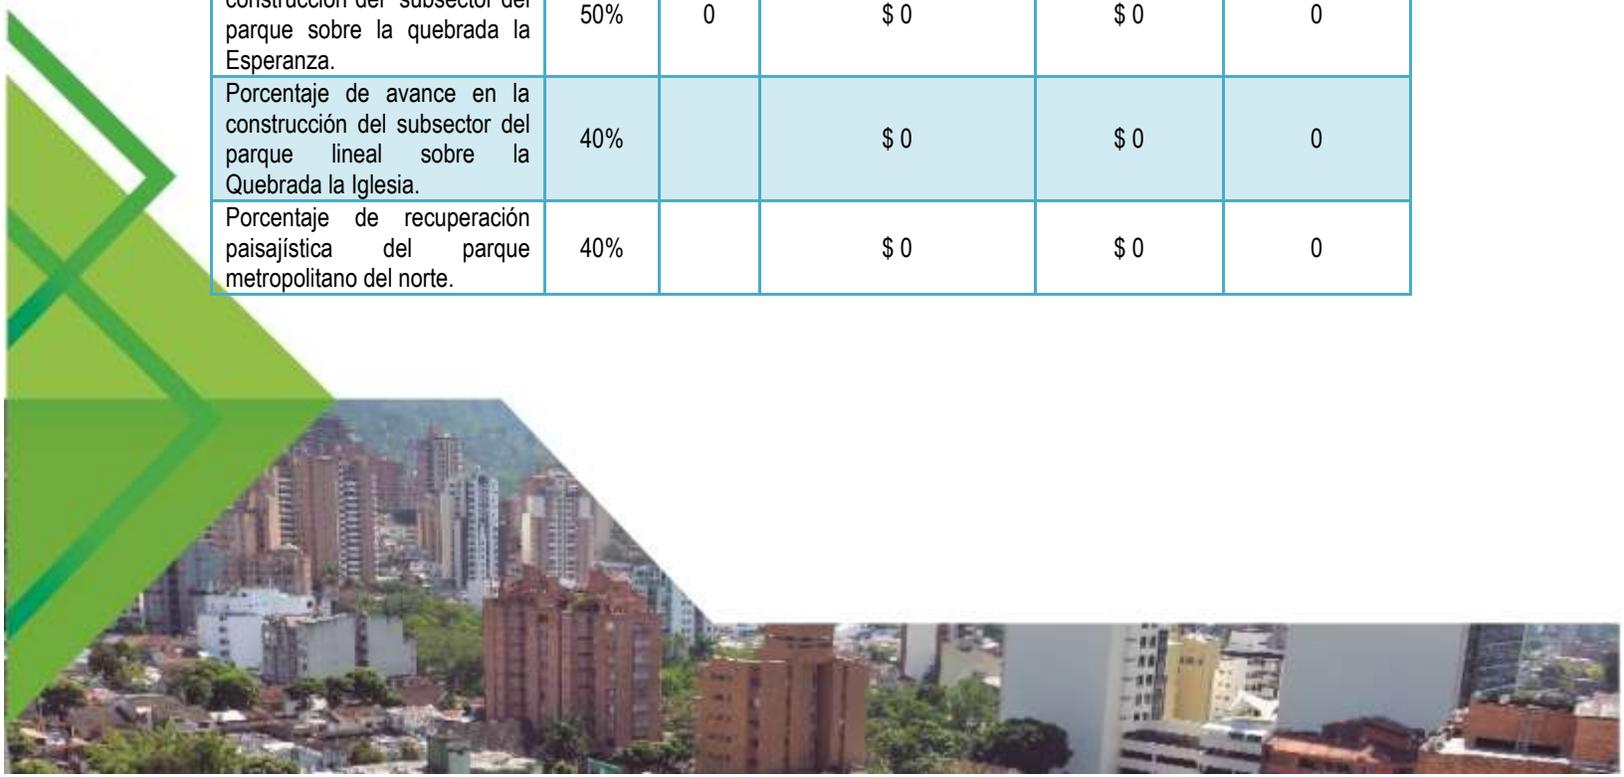

PROGRAMA: PROMOCIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS

INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019	RECURSOS PROGRAMADOS (Miles de pesos)	RECURSOS EJECUTADO	RECURSOS GESTIONADOS
Porcentaje de avance en la evaluación del sistema de transporte alternativo para el norte.	50%	0	\$ 0	\$ 0	0

Se gestionó con Metro línea la construcción del portal del Norte y la optimización de las rutas de transporte para un mayor cubrimiento en el norte.

9. CONTRATOS EN PROCESO DE LIQUIDACION

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
178 DE 2018	MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS CANCHAS DE TENIS DEL PARQUE DE LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.359.817.188,38	13/08/2018	24/04/2019

Estado: Avance de obra: 100% - Actualmente en funcionamiento a través del INDERBU, entidad a cargo de su administración.



VISTA GENERAL CANCHAS DE TENIS



ACCESO ESCENARIO CLUB DE TENIS

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
349 DE 2018	INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (VILLA ROSA, VILLA ROSA-ESTACIÓN,	\$ 1.398.424.293,54	06/05/2019	05/07/2019



	ESPERANZA II, ESPERANZA II, GIRARDOT, GAITÁN, SAN FRANCISCO, LA CEIBA, PROVENZA (ROBLEDO) y CRISTAL BAJO.			
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Estado: Avance de Obra: 100% - En proceso de liquidación

Actualmente se ha realizado la entrega a las comunidades beneficiadas, que incluye los siguientes barrios de la ciudad: VILLA ROSA, VILLA ROSA-ESTACIÓN, ESPERANZA II, ESPERANZA II, GIRARDOT, GAITÁN, SAN FRANCISCO, LA CEIBA, PROVENZA (ROBLEDO) y CRISTAL BAJO.




Parque Villa Rosa

Parque Corona La Ceiba

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
282 de 2018	GRUPO 1 – ADECUACIONES LOCATIVAS, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, BICENTENARIO.”.	\$ 1.524.762.067,62	26/11/2018	01/05/2019

Estado: Avance de obra: 100% - En proceso de liquidación

El contrato que contempló la construcción del área de comedor y de cocina del COLEGIO BICENTENARIO, así como el mantenimiento de las graderías y cancha del mismo, se encuentra terminado y recibido, y en proceso de liquidación.

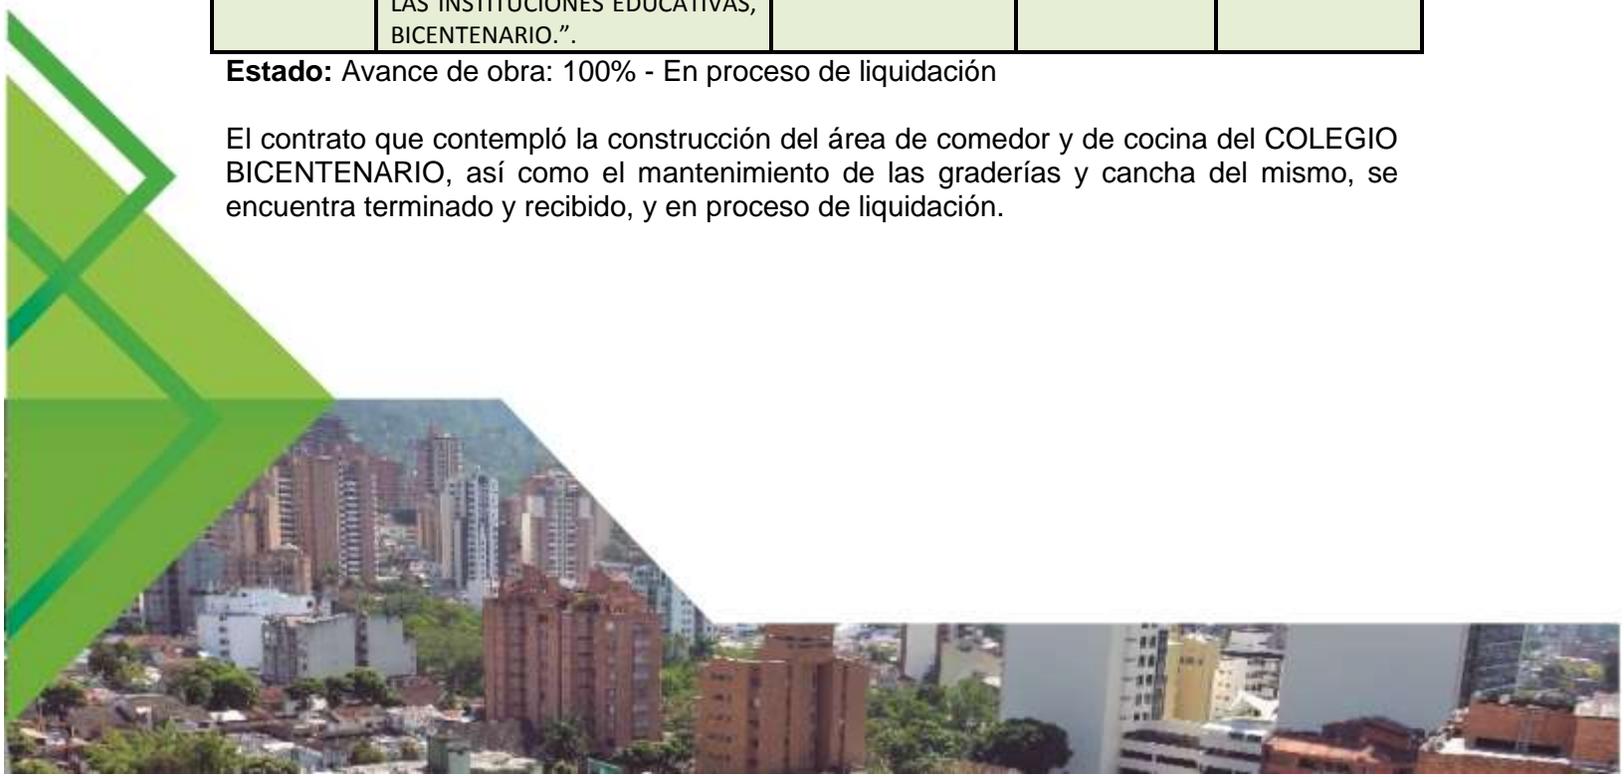



VISTA GENERAL AREA INTERVENIDA



AREA DE COMEDOR Y SERVICIOS

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
291 de 2018	GRUPO 2 – ADECUACIONES LOCATIVAS, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, (MAIPORE B, AURELIO MARTINEZ MUTIS SEDE C)	\$ 1.033.961.774,35	26/11/2018	18/06/2019

Estado: Avance de obra: 100% - En proceso de liquidación

El contrato incluyó la intervención de los Colegios MAIPORE SEDE B y AURELIO MARTÍNEZ MUTIS SEDE C, cuyas actividades de obra se encuentran concluidas.



COLEGIO MAIPORE



COLEGIO MAIPORE

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
286 de 2018	“GRUPO 5 – ADECUACIONES LOCATIVAS, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, (VIJAGUAL A, CLUB UNION A Y B, SANTANDER SEDE A)	\$ 882.682.552,21	26/11/2018	18/06/2019

Estado: Avance de obra: 100% en proceso de liquidación





COLEGIO SANTANDER



COLEGIO CLUB UNION A

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
284 DE 2018	ADECUACION DE LA PLAZOLETA DE LOS EDECANES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 1.223.767.860,23 Adicional \$211,372,321.48	04/12/2018	19/06/2019

Estado: Avance de Obra de: 100% - en Proceso de liquidación



13. OTROS PROCESOS ADELANTADOS POR LA SECRETARIA

Convenio Interadministrativo **No. 152 de 2019** con ESE-ISABU para "Aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos con el fin de ejecutar los proyectos de remodelación de la infraestructura física de los centros de salud del Municipio de Bucaramanga. Por valor de (\$5.235.537.883,4) y adicional por valor de (\$1.787.305.419,75)



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
152 DE 2019	Convenio ESE-ISABU (Aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos con el fin de ejecutar los proyectos de remodelación de la infraestructura física de los centros de salud del Municipio de Bucaramanga)	\$5.235.537.883,4 Adicional \$1.787.305.419,75	08/05/2019	23/12/2019

Los contratos derivados del convenio ya fueron adjudicados y se encuentran en ejecución en los siguientes centros de Salud: **Girardot, Campo Hermoso, La Joya, Libertad, Bucaramanga, Kennedy y san Rafael.**

14. PROYECTOS PRESENTADOS Y VIABILIZADOS

No.	No. REGISTRO	OBJETO	VALOR VIGENCIA	ESTADO
1	20160680010121	MEJORAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS TRANSVERSALES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.563.200.000,00	Certificado - Actualización
2	20160680010088	ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, ENERGÍA Y FACTURACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	\$ 17.933.000.000,00	Certificado - Actualización
3	20170680010016	APOYO EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 864.250.000,00	Certificado - Actualización
4	20170680010118	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE Y CANCHA DEL BARRIO CRISTAL BAJO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 317.509.812,84	Certificado - Actualización
5	20160680010226	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER	\$ 1.008.735.035,13	Certificado - Actualización
6	20170680010090	MEJORAMIENTO DEL PARQUE BOCAPRADERA DEL BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 501.661.954,67	Certificado - Actualización



7	20170680010141	CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA DE COLUMNATA Y PUENTE DE INTEGRACIÓN EDIFICIOS EXISTENTE Y NUEVO CENTRO DE CONVENCIONES NEOMUENDO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 4.000.000.000,00	Certificado - Actualización Vigencias Futuras
8	20180680010010	APOYO AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS DIFERENTES OBRAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 105.932.922,80	Certificado - Proyecto Nuevo
9	20170680010046	SUBSIDIO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO A LA POBLACION DE ESTRATO 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 4.552.898.870,00	Certificado - Actualización
10	20170680010174	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO LOS PINOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 154.989.631,00	Certificado - Proyecto Nuevo
11	20170680010084	CONSTRUCCIÓN CORREDOR CICLISTA UIS - PARQUE DE LOS NIÑOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 466.793.508,99	Certificado - Actualización
12	20170680010093	ADECUACIÓN DEL PARQUE RELIGIOSO MORRORICO BUCARMANGA	\$ 127.923.589,32	Certificado - Actualización
13	20170680010133	CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS CANCHAS Y SUS ALREDEDORES DE LOS BARRIOS PORVENIR I PORVENIR II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.449.984.504,67	Certificado - Actualización
14	20170680010057	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA GRAN SALA DEL TEATRO SANTANDER MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	\$ 999.000.000,00	Certificado - Proyecto Nuevo
15	20180680010013	MATENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.977.910.290,37	Certificado - Proyecto Nuevo
16	20160680010245	CONSTRUCCION, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.	\$ 1.109.208.202,83	Certificado - Actualización
17	20160680010154	MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	\$ 4.541.798.899,48	Certificado - Actualización
18	20170680010111	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEL BARRIO CAFÉ MADRID DE BUCARAMANGA	\$ 89.084.660,00	Certificado - Actualización
19	20160680010196	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA BARRIO KENNEDY FASE II MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	\$ 599.555.869,61	Certificado - Actualización
20		MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE MICROFUTBOL DEL BARRIO LA JOYA FASE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 96.841.447,00	Proyecto Nuevo, en espera de ser certificado.
21	20170680010165	RENOVACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 88.017.400,27	En Actualización



22	20180680010030	APOYO AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INTERCAMBIADOR MESÓN DE LOS BÚCAROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, FASE III EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 1.242.467.100,00	Certificado - Proyecto Nuevo
23	20180680010023	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO A TECNOLOGÍA LED FASE II: COMUNAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 11 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 32.213.762.885,00	Certificado - Proyecto Nuevo
24	20180680010024	REMODELACION DE ANDENES Y ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.900.224.580,99	Certificado - Proyecto Nuevo
25	20180680010025	MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS CANCHAS DE TENIS DEL PARQUE DE LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.670.083.624,31	Certificado - Proyecto Nuevo
26	20180680010028	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA FASE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 3.146.145.207,00	Certificado - Proyecto Nuevo
27	20160680010226	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.	\$ 2.313.417.707,11	Certificado - Actualización
28	20180680010049	CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ZONAS VERDES DEL BARRIO LOS CANELOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.089.462.658,32	Certificado - Proyecto Nuevo
29	20180680010036	AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO RURAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 1.101.039.013,00	Certificado - Proyecto Nuevo
30	20180680010041	ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LAS VÍAS ARTERIALES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS Y DETERMINACIÓN DE COTA DE INUNDACIÓN DEL CENTRO DE ZONOSIS DE VIJAGUAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 85.150.354,00	Certificado - Proyecto Nuevo
31	20180680010031	REMODELACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 7.706.773.585,37	Certificado - Proyecto Nuevo
32	20170680010139	MEJORAMIENTO DEL PARQUE LINEAL RIO DE ORO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.102.623.391,00	Certificado - Actualización
33	20170680010137	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.494.116.686,62	Certificado - Actualización



34	20170680010137	APOYO PARA LA INTERVENCIÓN, RESTAURACIÓN Y FINALIZACIÓN DEL TEATRINO DEL ESTADIO, FACHADAS DE LA CARRERA 20 Y LA CALLE 31, Y ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO DEL CENTRO CULTURAL DEL ORIENTE COLOMBIANO BUCARAMANGA	\$ 499.900.000,00	Certificado - Actualización
35	20180680010052	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE GRANJAS DE PROVENZA EN LA COMUNA 10 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 313.711.370,55	Certificado - Proyecto Nuevo
36	20180680010051	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LA CEIBA EN LA COMUNA13 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 3.493.871.261,00	Certificado - Proyecto Nuevo
37	20180680010054	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PARA TERMINACIÓN DE LA GRAN SALA DEL TEATRO SANTANDER FASE II EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 2.652.000.000,00	Certificado - Proyecto Nuevo
38	20180680010050	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE PUNTOS VIVE DIGITAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 135.502.973,00	Certificado - Proyecto Nuevo
39	20180680010035	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DE ATLETISMO, LUIS ENRIQUE FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE BUCARMANGA	\$ 66.155.135,00	Certificado - Proyecto Nuevo
40	20180680010068	ADECUACIÓN DE LA PLAZOLETA DE LOS EDECANES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.332.056.223,40	Certificado - Proyecto Nuevo
41	20180680010061	ADECUACIÓN PARQUE ECOLÓGICO LA FLORA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.749.844.108,09	Certificado - Proyecto Nuevo
42	20190680010043	MANTENIMIENTO DE LA PLAZOLETA DE LA DEMOCRACIA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 298.931.496,30	Certificado - Proyecto Nuevo
43	20180680010060	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD INTERMEDIA MATERNO INFANTIL SANTA TERESITA UIMIST EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.269.036.943,02	Certificado - Proyecto Nuevo
44	20180680010074	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEL COLEGIO INEM CUSTODIO GARCIA ROVIRA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.852.182.127,80	Certificado - Proyecto Nuevo
45	20180680010079	INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 1.549.627.148,08	Certificado - Proyecto Nuevo
46	20180680010078	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO ADYACENTE A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 147.697.706,00	Certificado - Proyecto Nuevo



47	20180680010079	MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS EN DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 139.276.828,00	Certificado - Proyecto Nuevo
48	20190680010050	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE CENTRALIDAD NORTE EN EL TEJAR NORTE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 5.305.067.870,00	Certificado - Proyecto Nuevo
49	20180680010097	REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE SALUD SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 695.184.903,27	Certificado - Proyecto Nuevo
50	20180680010103	REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE SALUD GIRARDOT DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 827.021.551,30	Certificado - Proyecto Nuevo
51	20180680010098	REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE SALUD KENNEDY DE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 667.260.839,09	Certificado - Proyecto Nuevo
52	20180680010102	REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE SALUD BUCARAMANGA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 817.939.591,39	Certificado - Proyecto Nuevo
53	20180680010099	REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE SALUD CAMPO HERMOSO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 607.752.633,50	Certificado - Proyecto Nuevo
54	20180680010104	REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE SALUD LA JOYA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 816.698.446,48	Certificado - Proyecto Nuevo
55	20180680010100	REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE SALUD LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 821.006.085,37	Certificado - Proyecto Nuevo
56	20196800010054	ESTUDIO GEOTECNICO Y DISEO DE OBRAS DE ESTABILIZACION EN EL LOTE DE LA CARRERA 39 No. 42-29 BARRIO CABECERA DEL LLANO, DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO DE LA ACCION JUDICIAL - TUTELA 680014003007-2018-00828-1 BUCARAMANGA.	\$ 54.633.852,00	Certificado - Proyecto Nuevo
57	2019680010056	MEJORAMIENTO DEL PARQUE SANTANDER DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 70.371.440,00	Certificado - Proyecto Nuevo
58	20180680010092	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA BÓDEGA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA PUERTA DEL SOL Y LA COMISARIA DEL BARRIO LA JOYA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 34.515.546,00	Certificado - Proyecto Nuevo
59	20190680010064	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LOS SALONES COMUNALES EN LOS BARRIOS BUCARAMANGA, DIAMANTE 1, LA LIBERTAD, EL GAITAN, LA FERIA, CAFÉ MADRID, NUEVA COLOMBIA, NORTE BAJO, SAN MIGUEL Y VILLA DEL PRADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 4.766.483.038,31	Certificado - Proyecto Nuevo



60	20190680010058	MEJORAMIENTO DEL CENTRO VIDA AÑOS MARAVILLOSOS EN LA CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 2.363.218.571,70	Certificado - Proyecto Nuevo
61	20190680010044	MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE ARTES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 5.742.579.420,00	Certificado - Proyecto Nuevo
62	20190680010076	RENOVACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO FASE II EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 70.245.209,84	Certificado - Proyecto Nuevo
63	20190680010075	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CON EL FIN DE HABILITAR Y BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 70.006.950,00	Certificado - Proyecto Nuevo
64	20190680010069	APOYO AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DE ATLETISMO LUIS ENRIQUE FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 522.681.023,00	Certificado - Proyecto Nuevo
65	20180680010082	CONSTRUCCION DE GALERIAS DE BOVEDAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA	\$ 384.960.116,70	Certificado - Proyecto Nuevo
66	20190680010082	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 15.120.221.760,00	Certificado - Proyecto Nuevo
67	20190680010091	ADQUISICION DEL PREDIO PARA LA RESTAURACION DE LA CASA MUSEO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO BUCARAMANGA	\$ 642.612.000,00	Certificado - Proyecto Nuevo
68	20190680010098	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS VEREDALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 512.024.948,00	Certificado - Proyecto Nuevo
69	20190680010097	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 4.519.598.786,00	Certificado - Proyecto Nuevo
70	20190680010101	IMPLEMENTACIÓN DEL MANEJO INTEGRAL DEL COMPONENTE ARBOREO EN EL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 192.534.968,00	Certificado - Proyecto Nuevo
71	20190680010100	CONSTRUCCION DEL SENDERO DE LOS CAMINANTES EN LOS CERROS ORIENTALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 11.509.644.779,00	Certificado - Proyecto Nuevo
72	20190680010086	CONSTRUCCION DEL PARQUE LA CEIBA (FASE II) MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 5.628.404.798,00	Certificado - Proyecto Nuevo
73	20190680010105	ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.202.847.110,97	Certificado - Proyecto Nuevo
74	20180680010097	REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE SALUD SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 695.184.903,27	Certificado - Actualización



75	20180680010103	REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE SALUD GIRARDOT DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 827.021.551,30	Certificado - Actualización
76	20180680010098	REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE SALUD KENNEDY DE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 667.260.839,09	Certificado - Actualización
77	20180680010102	REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE SALUD BUCARAMANGA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 817.939.591,39	Certificado - Actualización
78	20180680010099	REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE SALUD CAMPO HERMOSO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 607.752.633,50	Certificado - Actualización
79	20180680010104	REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE SALUD LA JOYA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 816.698.446,48	Certificado - Actualización
80	20180680010100	REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE SALUD LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 821.006.085,37	Certificado - Actualización
81	20190680010076	RENOVACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO FASEII EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 70.245.209,84	Certificado - Proyecto Nuevo
82	20180680010058	MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS E INSTALACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE Y JUEGOS INFANTILES, VIABILIZADOS POR EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO	\$ 710.860.857,26	Certificado - Actualización
83	20190680010103	ASESORIA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS 130 AVALUOS DE LOS INMUEBLES	\$ 74.256.000,00	Certificado - Proyecto Nuevo
84	20190680010082	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 15.120.221.760,00	Certificado - Proyecto Nuevo
85	20190680010133	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ATENDER POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE VIJAGUAL, BOSCONIA, MIRAFLORES Y CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MALAÑA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 583.371.806,43	Certificado - Proyecto Nuevo
86	20190680010134	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INMACULADA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 576.336.661,46	Certificado - Proyecto Nuevo
87	20190680010115	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO URBANO MEDIANTE EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 4.103.313.343,80	Certificado - Proyecto Nuevo



88	20190680010116	APOYO AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA OBRA AMPLIACIÓN DEL CORREDOR VIAL PRIMARIO BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA SECTOR PUERTA DEL SOL - PUENTE PROVENZA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 458.833.973,00	Certificado - Proyecto Nuevo
89	20190680010126	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A TRAVES DE POZOS SEPTICOS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.695.690.272,56	Certificado - Proyecto Nuevo
90	20190680010135	MEJORAMIENTO DE LA RED DE GAS PARA EQUIPOS INDUSTRIALES Y TRATAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN TERRAZA DEL CENTRO VIDA KENNEDY EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 35.406.634,36	Certificado - Proyecto Nuevo
	20190680010100	CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO DE LOS CAMINANTES EN LOS CERROS ORIENTALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 11.509.664.779,00	Certificado - Proyecto Nuevo

15. LICITACIONES PUBLICAS

No.	OBJETO	No. PROCESO	ESTADO	VALOR TOTAL
1	MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-001-2019	ADJUDICADO	\$ 7.545.402.520,90
2	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LOS CANELOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-002-2019	ADJUDICADO	\$ 943.979.472,90
3	CONSTRUCCIÓN DE CICLO-INFRAESTRUCTURA PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-003-2019	ADJUDICADO	\$ 13.239.423.934,17
4	MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-004-2019	ADJUDICADO	\$ 2.521.772.813,00
5	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-005-2019	ADJUDICADO	\$ 1.633.278.514,67
6	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DE ATLETISMO LUIS ENRIQUE FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER, BASADA Y DANDO CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE ACCIÓN POPULAR RAD No. 2009-00069	SI-LP-006-2019	ADJUDICADO	\$ 7.520.073.336,00
7	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE CENTRALIDAD NORTE EN EL TEJAR NORTE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-007-2019	ADJUDICADO	\$ 4.583.348.898,00



8	MEJORAMIENTO DEL CENTRO VIDA AÑOS MARAVILLOSOS EN LA CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	SI-LP-008-2019	ADJUDICADO	\$ 2.088.988.096,86
9	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA PASARELA DE CALZADO (LA CARRERA 22 ENTRE CALLES 19 Y 20 Y CALLES 19, 20, 21 Y 22 ENTRE CARRERAS 21 Y 23) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-009-2019	ADJUDICADO	\$ 902.870.221,95
10	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE MORRORICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-010-2019	ADJUDICADO	\$ 2.486.424.225,16
11	CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO ALIMENTADO CON ENERGIA SOLAR PARA EL PARQUE CONTEMPLATIVO EL CARRASCO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-011-2019	ADJUDICADO	\$ 1.365.425.385,72
12	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LOS SALONES COMUNALES EN LOS BARRIOS BUCARAMANGA, DIAMANTE I, LA LIBERTAD, EL GAITAN, LA FERIA, CAFÉ MADRID, NUEVA COLOMBIA, NORTE BAJO, SAN MIGUEL Y VILLA DEL PRADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-012-2019	ADJUDICADO	\$ 4.168.866.109,00
13	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-013-2019	ADJUDICADO	\$ 14.248.129.258,00
14	CONSTRUCCION PARQUE LINEAL METROPOLITANO DEL RIO SURATA EN EL BARRIO EL CLAVERIANO, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	SI-LP-014-2019	ADJUDICADO	\$ 6.172.805.446,00
15	CONSTRUCCION DEL PARQUE LA CEIBA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA FASE II.	SI-LP-015-2019	ADJUDICADO	\$ 5.220.254.730,81
16	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO ENTRE LAS CALLES 34 Y 37 Y ENTRE LAS CARRERAS 10 A LA 12 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-016-2019	ADJUDICADO	\$ 1.808.449.168,95
17	AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO PERIMETRAL EXTERIOR DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-017-2019	ADJUDICADO	\$ 1.404.736.826,58
18	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE 30 ENTRE LAS CARRERAS 26 Y 27 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-018-2019	ADJUDICADO	\$ 1.077.015.042,30
19	MODERNIZACIÓN Y EXPANSION DEL ALUMBRADO PÚBLICO PERIMETRAL DEL PARQUE ECOLOGICO LA FLORA DE BUCARAMANGA	SI-LP-019-2019	ADJUDICADO	\$ 2.346.905.293,92
20	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLES DE LOS ESTUDIANTES ENTRE LA CALLE 54A Y LA DIAGONAL 14 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-020-2019	ADJUDICADO	\$ 3.946.121.191,10
21	CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-021-2019	ADJUDICADO	\$ 1.230.536.053,13



22	CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	SI-LP-022-2019	ADJUDICADO	\$ 4.051.263.598,00
23	CONSTRUCCION DE SENDEROS DE LOS CAMINANTES EN LOS CERROS ORIENTALES DE BUCARAMANGA.	SI-LP-024-2019	ADJUDICADO	\$ 10.509.664.779,00
24	ADECUACIONES LOCATIVAS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA IE CLUB UNION , IE TECNICO DAMASO ZAPATA-SEDE VILLA HELENA, IE SANTO ANGEL SEDE A, IE GUSTAVO COTE URIBE SEDE A, IE RAFAEL GARCIA HERREROS, IE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR SEDE A, IE PROMOCION SOCIAL DEL NORTE SEDE A, CENTRO EDUCATIVO RURAL VIJAGUAL SEDE A, IE LA JUVENTUD SEDE A, E IE JORGE ARDILA DUARTE SEDE A, PARA LA IMPLEMENTACION DE DIEZ (10) AMBIENTES DE APRENDIZAJE CON ENFOQUE STEAM EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE CIUDAD.	SI-LP-025-2019	ADJUDICADO	\$ 818.508.844,18
25	ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-026-2019	ADJUDICADO	\$ 1.008.335.088,97
26	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECNOLOGÍA LED PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – FASE III	SI-LP-027-2019	TRASLADO SECRETARIAL	\$ 3.252.106.676,78
27	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO URBANO MEDIANTE EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-028-2019	ADJUDICADO	\$ 3.761.199.172,80
28	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A TRAVES DE POZOS SEPTICOS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER	SI-LP-029-2019	ADJUDICADO	\$ 2.420.122.418,56

16. CONCURSO DE MERITOS

No.	OBJETO	No. PROCESO	ESTADO	VALOR TOTAL
1	INTERVENTORÍA A LA INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-001-2019	ADJUDICADO	\$ 154.388.667,00
2	INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-002-2019	ADJUDICADO	\$ 627.370.380,00
3	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE CICLO-INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-004-2019	ADJUDICADO	\$ 977.701.620,00



4	INTERVENTORÍA AL MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-005-2019	ADJUDICADO	\$ 313.093.463,00
5	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-006-2019	ADJUDICADO	\$ 600.677.490,00
6	INTERVENTORIA A LAS OBRAS MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LOS CANELOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-007-2019	ADJUDICADO	\$ 91.863.046,03
7	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE CENTRALIDAD NORTE EN EL TEJAR NORTE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”	SI-CM-008-2019	ADJUDICADO	\$ 485.578.013,00
8	INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DE ATLETISMO LUIS ENRIQUE FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.	SI-CM-009-2019	ADJUDICADO	\$ 445.110.635,00
9	INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO DEL CENTRO VIDA AÑOS MARAVILLOSOS EN LA CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-010-2019	ADJUDICADO	\$ 216.513.360,00
10	INTERVENTORÍA A LA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE MORRORICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-011-2019	ADJUDICADO	\$ 239.316.662,00
11	INTERVENTORIA A LAS OBRAS MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA PASARELA DE CALZADO (LA CARRERA 22 ENTRE CALLES 19 Y 20 Y CALLES 19 Y 20 Y CALLES 19,20,21 Y 22 ENTRE CARRERAS 21 Y 23) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-012-2019	ADJUDICADO	\$ 71.386.358,00
12	PREMIACION DEL CONCURSO PUBLICO DE ANTEPROYECTO A LOS GANADORES DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL “ANTEPROYECTO DE LA REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA UIMIST DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	SI-CM-014-2019	ADJUDICADO	\$ 1.003.521.103,02
13	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO ALIMENTADO CON ENERGÍA SOLAR PARA EL PARQUE CONTEMPLATIVO EL CARRASCO	SI-CM-015-2019	ADJUDICADO	\$ 108.369.776,41
14	INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO PERIMETRAL EXTERNO DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMAGA	SI-CM-016-2019	ADJUDICADO	\$ 143.321.622,00
15	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL METROPOLITANO DEL RIO SURATA EN EL BARRIO EL CLAVERIANO, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	SI-CM-018-2019	ADJUDICADO	\$ 408.150.068,00



16	INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO ENTRE LAS CALLES 34 Y 37 Y ENTRE LAS CARRERA 10 A LA 12 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-019-2019	ADJUDICADO	\$ 181.709.714,00
17	INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE 30 ENTRE LAS CARRERAS 26 Y 27 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-020-2019	ADJUDICADO	\$ 128.476.134,00
18	INTERVENTORÍA A LA MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO PERIMETRAL DEL PARQUE ECOLÓGICO LA FLORA DE BUCARAMANGA	SI-CM-021-2019	ADJUDICADO	\$ 143.320.815,40
19	INTERVENTORIA A LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LOS SALONES COMUNALES EN LOS BARRIOS BUCARAMANGA, DIAMANTE I, LA LIBERTAD, EL GAITAN, LA FERIA, CAFE MADRID, NUEVA COLOMBIA, NORTE BAJO, SAN MIGUEL Y VILLA DEL PRADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-022-2019	ADJUDICADO	\$ 597.053.226,00
20	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DEL PARQUE LA CEIBA FASE II, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-023-2019	ADJUDICADO	\$ 408.150.068,00
21	INTERVENTORÍA AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-024-2019	ADJUDICADO	\$ 872.090.305,00
22	INTERVENTORÍA A LA CONTRUCCION DE PLACA HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-025-2019	ADJUDICADO	\$ 439.735.107,00
23	INTERVENTORÍA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO A TECNOLOGÍA LED FASE III: DE LAS COMUNAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-027-2019	ADJUDICADO	\$ 203.158.847,00
24	"INTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"	SI-CM-028-2019	ADJUDICADO	\$ 189.129.711,00
25	INTERVENTORIA A LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO URBANO MEDIANTE EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	SI-CM-029-2019	ADJUDICADO	\$ 318.238.011,00



26	INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: ADECUACIONES LOCATIVAS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA IE CLUB UNION , IE TECNICO DAMASO ZAPATA-SEDE VILLA HELENA, IE SANTO ANGEL SEDE A, IE GUSTAVO COTE URIBE SEDE A, IE RAFAEL GARCIA HERREROS, IE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR SEDE A, IE PROMOCION SOCIAL DEL NORTE SEDE A, CENTRO EDUCATIVO RURAL VIJAGUAL SEDE A, IE LA JUVENTUD SEDE A, E IE JORGE ARDILA DUARTE SEDE A, PARA LA IMPLEMENTACION DE DIEZ (10) AMBIENTES DE APRENDIZAJE CON ENFOQUE STEAM EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE CIUDAD.	SI-CM-030-2019	ADJUDICADO	\$ 135.117.360,00
27	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A TRAVÉS DE POZOS SÉPTICOS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	SI-CM-031-2019	ADJUDICADO	\$ 240.313.212,00

17. SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

No.	OBJETO	No. PROCESO	ESTADO	VALOR TOTAL
1	ACTIVIDADES DE PODA PARA EL DESPEJE DE LUMINARIAS Y REDES QUE INTERFIERAN CON EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-SAMC-002-2019	ADJUDICADO	\$ 582.643.995,00
2	EXPANSIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-SAMC-003-2019	ADJUDICADO	\$ 459.661.191,33
3	ADECUACION PLAZOLETA DE LA DEMOCRACIA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, SANTANDER	SI-SAMC-004-2019	ADJUDICADO	\$ 291.155.981,61
4	MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE DIFERENTES SECTORES DEL NORTE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-SAMC-005-2019	ADJUDICADO	\$ 643.429.977,96
5	TALA DE ARBOLES Y MANEJO INTEGRAL DEL COMPONENTE ARBOREO EN EL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	SI-SAMC-006-2019	ADJUDICADO	\$ 171.142.194,00
6	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES MAGUEYES MONSERRATE ROSA BLANCA Y LAS GRANJITAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER	SI-SAMC-007-2019	ADJUDICADO	\$ 512.024.948,00



7	MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DE CONFORMIDAD CON LAS SENTENCIAS DE ACCIONES CONSTITUCIONALES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 2019.	SI-SAMC-008-2019	ADJUDICADO	\$ 381.855.070,00
8	CONSTRUCCIÓN Y EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-SAMC-009-2019	ADJUDICADO	\$ 701.923.348,00
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES Y CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISIÓN EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA PARA EL ORDEN PÚBLICO	SI-SAMC-010-2019	ADJUDICADO	\$ 249.880.705,00
10	ADQUISICION ADECUACION Y ACTUALIZACION DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL SITIO DE REPETICION CERRO PALONEGRO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA DEL ORDEN PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	SI-SAMC-011-2019	ADJUDICADO	\$ 274.918.494,00
11	MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCION INMEDIATA CAIS ADSCRITOS A LA POLICIA METROPOLITANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	SI-SAMC-012-2019	ADJUDICADO	\$ 474.478.058,08
12	CONSTRUCCION DE GALERIAS DE BOVEDAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, SANTANDER	SI-SAMC-014-2019	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	\$ 384.960.116,70
13	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL REGIONAL ORIENTE MIGRACION COLOMBIA PARA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	SI-SAMC-015-2019	PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	\$ 542.140.497,90
14	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ATENDER LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE VIJAGUAL, BOSCONIA, MIRAFLORES Y CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MALAÑA; DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER.	SI-SAMC-016-2019	PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	\$ 583.371.806,40
15	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACION EN EL LOTE DE LA CARRERA 39 NO 42-29 BARRIO CABECERA DEL LLANO, DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN JUDICIAL – TUTELA 68001403007 – 2018- 00828 – 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"	SI-SAMC-018-2019	PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS	\$ 284.727.760,89
16	CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	SI-SAMC-019-2019	PROYECTO DE PLIEGOS	\$ 507.031.001,46



18. INVERSION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PROGRAMAS	INVERSION	%
ADMINISTRACION ARTICULADA Y COHERENTE	\$ 2.819.225.027,33	1,82
UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES	\$ 1.028.204.044,60	0,67
ADULTO MAYOR Y DIGNO	\$ 2.346.901.421,22	1,52
RECUPERACION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO	\$ 5.700.050.420,00	3,69
INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO	\$ 54.168.741.317,89	35,05
PROMOCION DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS	\$ 13.786.019.895,76	8,92
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA	\$ 20.602.692.652,87	13,33
MANTENIMIENTO DE RED VIAL RURAL	\$ 3.555.877.067,00	2,30
ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL	\$ 50.527.165.677,40	32,70
TOTAL (1)	\$ 154.534.877.524,07	100%

OTROS VALORES EN LA EJECUCION

DESCRIPCION	VALOR
VALOR SUBSIDIOS DE SERVICIOS PUBLICOS, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	\$ 6.771.046.717,89
TOTAL (2)	\$ \$ 6.771.046.717,89

TOTAL INVERSION (1+2)	\$ 161.305.924.241,96
------------------------------	------------------------------



RESUMEN DE OBRAS:

Descripción	Cantidad.	Unidad
MANTENIMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS	33	Und
CONSTRUCCION DE PARQUES	4	Und
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE PARQUES	244	Und
MANTENIMIENTO CANCHAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	43	Und
KIOSKOS, PARQUES , PLAZOLETAS Y MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTOS URBANOS	24	Und
SALONES COMUNALES CONVERTIDOS EN AGORAS	10	Und
MANTENIMIENTO MALLA VIAL URBANA	90.000	M2
MANTENIMIENTO MALLA VIAL RURAL	3.8	Km

