

INFORME DE GESTION

El presente informe resume los principales avances que la Secretaria de Infraestructura ha generado en los diferentes programas que conforman el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Gobierno de las Ciudadanas y los Ciudadanos”. Durante el Tercer Trimestre de la vigencia 2018.

La Secretaria de Infraestructura ejecutó y realizo las gestiones pertinentes para el control del avance de los diferentes proyectos.

A continuación se detalla la gestión que ha realizado la Secretaria de Infraestructura en el tercer trimestre de la vigencia.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: GOBERNANZA DEMOCRÁTICA

1.1 PROGRAMA: PRESUPUESTOS INCLUYENTES

Este programa contempla la ejecución de obras con presupuestos participativos en las diferentes comunas:

Actualmente se encuentran ejecutados dos contratos con cargo a presupuestos participativos vigencia 2016, los cuales se relacionan a continuación:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
411 de 2017	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO BUCARAMANGA. GRUPO II	\$ 903.596.605,74 Adicional \$ 433.294.420,98	02/02/2018	23/08/2018

Estado: Avance de Obra: 100% - En proceso de liquidación

✓ ESCENARIO QUEBRADA LA IGLESIA

Avance de ejecución: 100%

Informe de **GESTIÓN**

Ante el Honorable
Concejo Municipal



✓ **ESCENARIO BARRIO SAN LUIS**

Avance de ejecución 100%



✓ **ESCENARIO BARRIO CONDADO DE GIBRALTAR**

Avance de ejecución: 100%



✓ ESCENARIO BARRIO EL ROCIO

Avance de ejecución 100%



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
412 de 2017	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 613.301.169,82 Adicional \$ 306.845.384,58	02/02/2018	23/08/2018

Estado: Avance de obra: 100%

✓ ESCENARIO BARRIO COMUNEROS

Avance de ejecución: 100%



✓ ESCENARIO BARRIO ALFONSO LOPEZ

Avance de ejecución 100%

Informe de **GESTIÓN**

Ante el Honorable
Concejo Municipal



✓ **ESCENARIO BARRIO VILLA DEL PRADO**

Avance de ejecución 100%



✓ **ESCENARIO BARRIO SAN MIGUEL**

Avance de ejecución 100%



✓ **ESCENARIO BARRIO EL PRADO (SAN PIO)**

Avance de ejecución 100%



A la fecha se encuentra estructurada la atención de necesidades con relación a las obras viabilizadas en los grupos de presupuestos participativos vigencias 2016 y 2017. En la presente vigencia se tiene programada la contratación de dichas obras, las cuales se realizarán en nueve grupos de acuerdo a actividades afines, como se relacionan a continuación:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
210 de 2018	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ANDENES, PASAMANOS Y ESCALERAS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER	\$ 1.343.937.014,91	19/09/2018	18/12/2018

Estado: Avance de obra: 2.23%

BARRIO LA JUVENTUD



BARRIO SAN CRISTOBAL



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
159 de 2018	"CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LOS DIFERENTES CORREGIMIENTOS QUE COMPRENDE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"	\$ 1.250.571.151,13	27/08/2018	26/11/2018

Estado: En ejecución, Avance de obra: 12%

A continuación los sitios que están siendo intervenidos en cumplimiento de este contrato:

CORREGIMIENTO 1 - VEREDA: Vereda la Esmeralda

Sector: 4A
LONGITUD: 40.00 ML
ANCHO VARIABLE:

Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable
Concejo Municipal

Sector: A



- Instalación de formaleta en madera para confinamiento de cintas placa huellas
- Armado e instalación de aceros para (refuerzo longitudinal y transversal de placa huellas y riostras).



- Nivelación de terreno en área de cuneta e instalación de formaleta externa en madera.
- Armado de aceros para batea de ingreso a predio (costado izquierdo de la vía).



- Fundida de batea previo al ingreso a predio.
- Lavado de piedra que se utilizó para el ciclópeo de franja central y sobre anchos.

Informe Corregimiento 2 - VEREDA: Magueyes Sector 12 - curva el palomar

LONGITUD: 50.00 ML

ANCHO VARIABLE:



SEREO DE LA BASE GRANULAR



EXTENDIDO Y SUMINISTRO DE LA BASE GRANULAR.

Informe Corregimiento 3 - VEREDA: Retiro Grande Sector 19 (acueducto km 11 finca Rosedal)

LONGITUD: 50 ML

ANCHO VARIABLE:

Informe de **GESTIÓN**

Ante el Honorable
Concejo Municipal



**DEMOLICION DE CUNETA EN
CONCRETO**



ARMADO DE RIOSTRAS



**INSTALACION DE FORMALETAS PARA
HUELLAS**



**REGADO Y COMPACTACION DE BASE
GRANULADA.**



**APLICACIÓN DE CONCRETO A
FORMALETAS**



**FUNDICION DE CONCRETO PLACA
HUELLAS**

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
256 de 2018	MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS E INSTALACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE Y JUEGOS INFANTILES, VIABILIZADOS POR EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO II	\$ 775.839.494,9	Por iniciar	Por iniciar

Estado: Por iniciar

Barrios que serán intervenidos:

- BARRIO VILLA ROSA (CALLE 8 BN- MANZANA 32 NO 19-18)
- BARRIO GIRARDOT (CALLE 6 CON CARRERA 25N Y 27N)
- BARRIO LA CEIBA (CARRERA 17E CON CALLE 65 Y 64ª)
- BARRIO BRISAS DEL MUTIS (CARRERA 11W CON CALLE 60A BIS)
- BARRIO VILLA HELENA II CALLE 16N ENTRE CARRERAS 26 Y 27)

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
258 de 2018	MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS E INSTALACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE Y JUEGOS INFANTILES, VIABILIZADOS POR EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO I	\$ 865.122.208,42	Por iniciar	Por iniciar

Estado: Por iniciar

Barrios que serán intervenidos:

- BARRIO DIAMANTE I (CALLE 105 ENTRE CARRERAS 30 Y 31)
- BARRIO LA LIBERTAD (CALLE 100 ENTRE CARRERAS 31 Y 32)
- BARRIO ALTOS DEL CACIQUE (CALLE 84 CON CARRERA 56 ESQUINA)
- BARRIO 20 DE JULIO (CALLE 69 NO 10C - 36)
- BARRIO BOSQUES DEL CACIQUE (CARRERA 60 CON CALLE 87 ESQUINA).

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
176 de 2018	OBRAS DE PARCHEO DE HUECOS, FALLOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES EN LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.746.373.202	30/08/2018	29/12/2018

Estado: En ejecución 11 %

En cumplimiento de este contrato se adelanta los presupuestos participativos vigencia 2016 y 2017, además de las obras de malla vial urbana.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016				
PROYECTO	VALOR	% AVANCE	BARRIO	COMUNA
MALLA VIAL URBANA	\$ 152.500.151,00	LICITACION	BUENA VISTA	COMUNA 14
MALLA VIAL URBANA	\$ 37.814.894,00	LICITACION	CIUDAD VENECIA	COMUNA 11
MALLA VIAL URBANA	\$ 33.417.594,00	LICITACION	DELICIAS ALTAS	COMUNA 11
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017				
PROYECTO	VALOR	% AVANCE	BARRIO	COMUNA
MALLA VIAL URBANA	\$ 88.822.713,00	LICITACION	PUERTO RICO	COMUNA 3
MALLA VIAL URBANA	\$ 257.427.779,00	LICITACION	SAN RAFAEL	COMUNA 3
MALLA VIAL URBANA	\$ 59.771.608,00	LICITACION	PABLO VI	COMUNA 8
MALLA VIAL URBANA	\$ 46.341.205,00	LICITACION	SAN GERARDO I	COMUNA 8
MALLA VIAL URBANA	\$ 147.260.703,00	LICITACION	ALVAREZ LAS AMERICAS	COMUNA 13

A la fecha se adelanta los trabajos en el Barrio Pablo VI de la Comuna 8

MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS VEREDALES.

A la fecha este proyecto se encuentra en formulación para ser presentado en Banco de Proyectos.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016				
PROYECTO	VALOR	% AVANCE	BARRIO	COMUNA
MANTENIMIENTO ACUEDUCTO	\$124'200.000,00 (VALOR APROBADO POR COMITÉ)}	FORMULACION DE PROYECTO	VEREDA PEDREGAL BAJO SECTOR LAS GRANJITAS	CORREGIMIENTO 3
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017				
PROYECTO	VALOR	% AVANCE	BARRIO	COMUNA
MANTENIMIENTO ACUEDUCTO	\$130'500.000,00 (VALOR APROBADO POR COMITÉ)}	FORMULACION DE PROYECTO	VEREDA MAGUEYES	CORREGIMIENTO 2
MANTENIMIENTO ACUEDUCTO	\$ 94'250.000,00 (VALOR APROBADO POR COMITÉ)}	FORMULACION DE PROYECTO	VEREDA MONSERRATE	CORREGIMIENTO 2
VALOR TOTAL ACUEDUCTOS VEREDALES	\$ 348.950.000,00			

MANTENIMIENTO DE SALONES COMUNALES, COMEDORES INFANTILES Y ESCUELAS

Se encuentra para formulación de Banco de Proyectos, el salón comunal el Gaitán, los salones comunales Café Madrid en diseños, Comedor Infantil de Santander en diseño, así como la Escuela Bosconia.

MANTENIMIENTO DE PARQUES, KIOSKOS Y PLAZOLETAS

Se encuentra para formulación de Banco de Proyectos:

- Barrio Naranjo (Construcción parque)
- Barrio Antonia Santos Sur (Construcción de parques)
- Barrio Ciudad Bolívar (mantenimiento 2 parques)
- Barrio Santa Maria (Mantenimiento 1 parque)
- Plazuela Real (Construcción de 1 Cerramiento)
- Barrio Almendros (Adecuación Cuarto basuras)

Así mismo se está realizando diseño por consultoría para el siguiente proyecto:

- ✓ CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCIÓN

✓ CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2018	LOGRO 2018
PRESUPUESTOS INCLUYENTES.	Número de comunas con obras comunitarias ejecutadas con presupuesto participativo.	17	17	15

Una vez se realice la contratación a los diferentes grupos de presupuestos participativos vigencia 2016 y 2017, se actualizará el reporte a las metas del plan de desarrollo en harás de dar cumplimiento a este indicador.

1.2 PROGRAMA: GESTIÓN INTELIGENTE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL

A la fecha se adelanta el proyecto para la adquisición del predio para la reubicación del Centro de Salud Antonia Santos, el cual fue demolido en el año 2015 con ocasión de la ejecución de obras necesarias para la construcción del proyecto denominado "Ampliación del corredor vial primario entre Bucaramanga y Floridablanca en el sector comprendido entre el puente del Barrio Provenza y el intercambiador de tráfico de la Puerta del Sol.

El Municipio de Bucaramanga ha manifestado interés a la CDMB en la adquisición del inmueble, por lo cual formulo oferta de compra según resolución No. 0250 del 12 de Septiembre de 2018.

✓ CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2018	LOGRO 2018
GESTIÓN INTELIGENTE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL.	Porcentaje de predios requeridos adquiridos para la ejecución de obras de desarrollo para la ciudad.	100%	100%	100%

La Secretaría de Infraestructura, durante el tercer semestre de 2018 no ha requerido la adquisición de ningún predio para la ejecución de los proyectos, ya que estos se están realizando en predios del municipio, sin embargo surge la primera necesidad de adquirir un predio para la construcción del centro de Salud Antonia Santos, por lo tanto el % de cumplimiento es del 100%.

1.3 PROGRAMA: UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES

En este programa se encuentran todos los diseños, estudios, consultorías e interventorías para ejecutar los proyectos y las obras del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, los cuales es importante resaltar:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
139 de 2018	INTERVENTORÍA AL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 196.204.820,00	01/08/2018	30/11/2018
170 de 2018	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS Y REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LOS DIFERENTES CORREGIMIENTOS QUE COMPRENDE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA".	\$ 222.427.660,00	24/08/2018	08/12/2018
181 de 2018	INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS CANCHAS DE TENIS DEL PARQUE DE LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 272.295.592,00	13/08/2018	31/12/2018
184 de 2018	INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE PARCHEO DE HUECOS, FALLOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES EN LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAM	\$ 318.262.376,00	21/08/2018	31/12/2018
194 de 2018	INTERVENTORÍA A LA REMODELACIÓN DE CANCHAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 427.575.330,00	03/09/2018	31/12/2018

	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ANDENES, PASAMANOS Y ESCALERAS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 199.953.425,00	19/09/2018	31/12/2018
231 de 2018	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LA CEIBA EN LA COMUNA 13 DEL MUNICIPIO DE BUCARAM	\$ 202.405.613,00	24/09/2018	31/12/2018


Asi mismo se adelantaron los siguientes estudios, consultorias y/o interventorias.

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
156 de 2018	ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y GEOLÓGICOS PARA LAS DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 220.515.259,00	24/07/2018	08/10/2018

Estado: En Ejecucion, avance de obra: 40%

De 13 sitios se han entregado 4 sitios, que son:

- Salón Comunal Villa del Prado.
- Salón Comunal Ciudad Bolívar.
- Granjas de Provenza.
- Institución educativa Jorge Gaitán sede B.

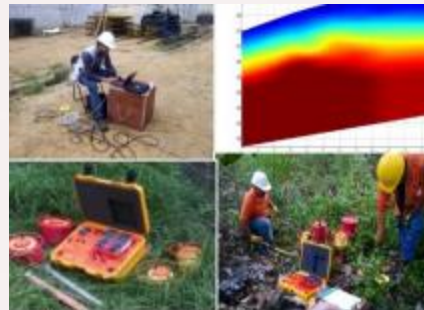


Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
174 de 2018	CONSULTORÍA PARA DEFINIR LA COTA DE INUNDACIÓN DEL CENTRO ZONOSIS DE VIJAGUAL EN EL MUNICIPIO DE BUCAR	\$ 15.315.300,00	13/08/2018	12/09/2018

Estado: En Ejecucion, avance de obra: 100%

Se encuentra radicado en la CDMB a la espera de respuesta.

Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable Concejo Municipal



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
186 de 2018	REALIZAR MEDICIONES A LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO EN LOS LUGARES QUE INDIQUE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA UBICADOS EN LAS VÍAS ARTERIALES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 35.916.100,00	21/08/2018	04/09/2018

Estado: En ejecución, avance de obra: 100%

Se realizaron lecturas en una longitud de 113.3 Km-carril, con medidas cada 50 metros.



Igualmente se continúa con la supervisión y control a través de proceso de interventorías de los siguientes proyectos:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
379 de 2017	INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA PLAZA GUARÍN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 116.521.031,00 Adicional \$ 122.185.453,00	19/12/2017	03/05/2018
341 DE 2017	AUNAR ESFUERZOS EN LA FORMULACION DE POLITICAS CICLO- INCLUSIVAS PARA BUCARAMANGA EN EL MARCO DEL PROYECTO "ESTRATEGIA DE LA BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE Y DISEÑO DE 20 KILOMETROS DE CICLO-INFRAESTRUCTURA.	\$ 850.450.389,00	10/11/2017	31/12/2018 % Avance: 85%
414 de 2017	INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 153.020.612,5 Adicional \$ 84.063.087,5	02/02/2018	23/08/2018
417 de 2017	INTERVENTORIA CONSTRUCCION, ADECUACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD CAFÉ MADRID MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 125.761.818,00	01/02/2018	30/07/2018

✓ CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2018	LOGRO 2018
UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES	Realizar el 100% de los diseños, estudios, consultorías e interventorías para ejecutar los proyectos y las obras del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 y otros planes de ciudad.	100%	100%	100%

En cuanto a la realización de los diseños, estudios, consultorías e interventorías requeridos, la meta para el cuatrenio es que por cada vigencia se realicen los estudios, diseños, consultorías e interventorías requeridos por cada programa para el correcto funcionamiento de los mismos, por lo tanto esta meta se ha cumplido el 100%.

LINEA ESTRATEGICA 2: INCLUSIÓN SOCIAL

2.1. PROGRAMA: ADULTO MAYOR Y DIGNO

La Secretaria de Infraestructura continúa con la ejecución del contrato relacionado a continuación:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
229 de 2017	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA BARRIO KENNEDY FASE II - MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.024.528.836,64 Adicional \$ 520.033.939,2	01/08/2017	30/07/2018

Estado: Avance de Obra 97% - En recibo final



✓ CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2018	LOGRO 2018
ADULTO MAYOR Y DIGNO	Número de Centros vida adecuados y/o readecuados.	3	1	0

Se tiene proyectado realizar el Mejoramiento Centro Vida Años Maravillosos – Real de Minas, en la próxima vigencia el cual se encuentra en curaduría para aprobación, igualmente se tiene previsto atender el Centro vida Álvarez para dar cumplimiento a este indicador.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

3.1. PROGRAMA: SENDEROS PARA LA VIDA

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
330 de 2017	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EN FASE III PARA LA HABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR GRAN BOSQUE DE LOS CERROS ORIENTALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.160.000.000,00	10/11/2017	30/08/2018

Estado: Avance de la consultoria: 100% - en proceso de liquidación

AVANCE DEL PROYECTO:

El proyecto se encuentra entregado y en revisión, y así mismo, se encuentra en trámite la solicitud del cambio de categoría a uso público dentro del DRMI, ante la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB.

✓ CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2018	LOGRO 2018
SENDEROS PARA LA VIDA	Número de subsectores del gran bosque de los cerros orientales de escala metropolitana diseñados.	1	0	0

Para la vigencia 2018 no existe meta programada, el cumplimiento a este indicador se realizó con el contrato en mención durante la vigencia 2017.

3.2. PROGRAMA: REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE

A la fecha se encuentra realizando gestiones para la consecución de estudios y diseños, así como la gestión de recursos para su materialización.

✓ CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATREÑO	META 2018	LOGRO 2018
REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE	Número de obras de mitigación realizadas en comunas que presenten riesgos de desastre.	20	9	0

Una vez estas obras sean contratadas, se realizara el reporte para poder dar cumplimiento a este indicador.


LÍNEA ESTRATÉGICA 4: CALIDAD DE VIDA

4.1 PROGRAMA: CUIDAR LO QUE ES VALIOSO": RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
118 de 2017	"AUNAR ESFUERZOS, TECNICOS, FINANCIEROS, Y ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INTERES PUBLICO "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PARA TERMINACIÓN DE LA GRAN SALA DEL TEATRO SANTANDER MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER."	\$ 2.500.000.000 Adicional \$ 1.249.000.000	03/05/2017	13/07/2018

Estado: Avance de Obra 75%

La obra presenta un porcentaje de avance aproximado del 75%, representado en las actividades de mecánica teatral, equipos de sonido, cielo raso, aislamiento acústico.

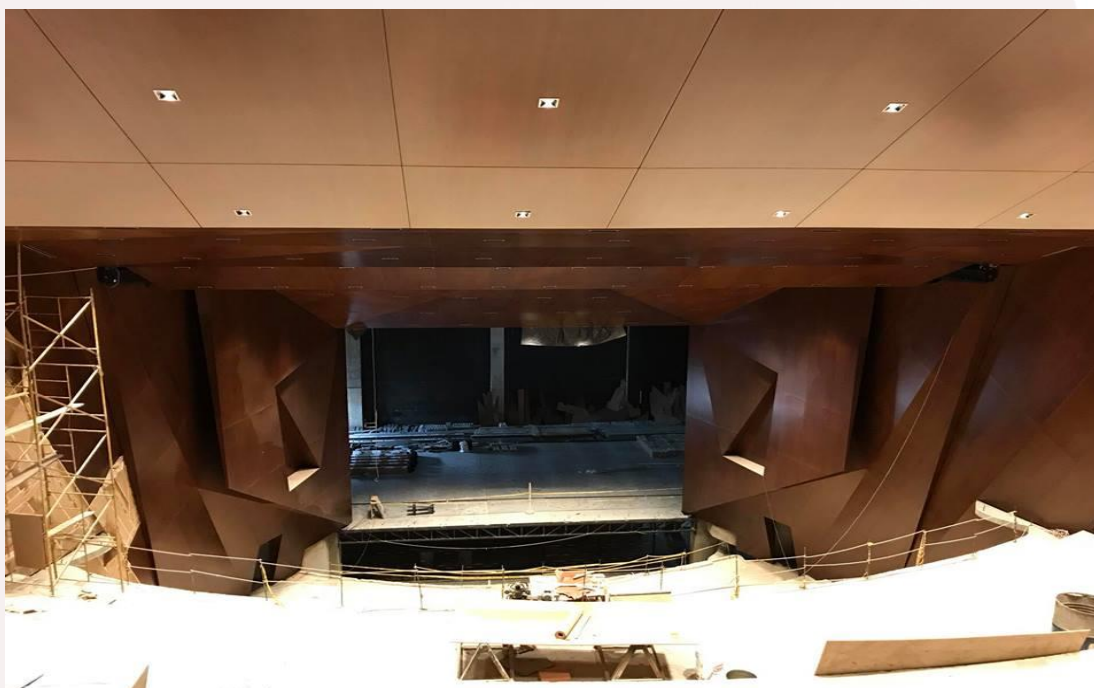

Terminación en madera al interior de la Gran Sala

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
198 de 2018	AUNAR ESFUERZOS, TECNICOS, FINANCIEROS, Y ADMINISTRATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INTERÉS PÚBLICO y PROVISIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA GRAN SALA DEL TEATRO SANTANDER – MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.652.000.000	24/08/2018	23/12/2018

Estado: Avance de Obra 31%

La obra presenta un porcentaje de avance aproximado del 31%, representado en las actividades de iluminación técnica, dotación y carpintería.

✓ CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2018	LOGRO 2018
CUIDAR LO QUE ES VALIOSO": RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO	Número de acciones de fortalecimiento para el Teatro Santander.	1	0	1


Para la actual vigencia no existe meta programada, sin embargo se adelantó el convenio antes mencionado con el fin de poner en marcha la gran sala del teatro.

4.2 PROGRAMA: OBSERVAR Y SER OBSERVADO: FOMENTO AL TURISMO

Se realizó el giro por valor de \$ 4.000.000.000, de acuerdo a la vigencia futura aprobado mediante acuerdo No. 039 del 21 de Septiembre de 2017, para adicionar el convenio FNT – 328 de 2014 “Construcción y dotación del Centro de Convenciones NEOMUNDO de Bucaramanga.

El gran salón se encuentra con un porcentaje de avance del 99% y al servicio de la Comunidad.

La construcción para la unificación de las dos fachadas mediante una columnata, así como la construcción de un puente que une los edificios en su costado occidental y la integración de los parqueaderos y las oficinas de la estructura existente con las oficinas de prensa, se encuentra con un avance del 70% y se espera poder terminar para el mes de enero de 2019. Cabe resaltar que el gran salón se encuentra en servicio de la comunidad y los 4 salones de la estructura existente.

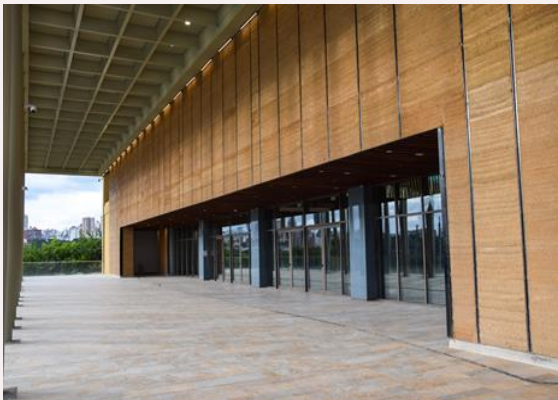

✓ CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2018	LOGRO 2018
OBSERVAR Y SER OBSERVADO: FOMENTO AL TURISMO	Número de espacios garantizados del centro de convenciones de Bucaramanga como eje central del desarrollo del turismo de reuniones en el municipio.	1	0	1
OBSERVAR Y SER OBSERVADO: FOMENTO AL TURISMO	Número de centros de convenciones - NEOMUNDO terminados.	1	0	0

Con respecto a la terminación del centro de convenciones, este indicador presenta un cumplimiento del 0.5 de la vigencia 2016, el reporte total se hará una vez el Centro de Convenciones sea terminado, el cual se tiene proyectado entregar en la próxima vigencia fiscal.

4.3 PROGRAMA: INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO

✓ Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes

La administración Municipal a través de la Secretaria de Infraestructura se encuentra ejecutando los siguientes contratos:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
7 de 2018	MANTENIMIENTO DE PARQUES, ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 4.241.198.080,00	30/01/2018	29/12/2018

Estado: Avance de Obra: 72,72%

Instalado de Prado:

Durante el Primer Trimestre de la presente vigencia el proceso de siembra de prado se aplazó por las condiciones climáticas que se presentaron.

Durante el segundo Trimestre se realizó siembra de prado en los siguientes sitios:

Informe de **GESTIÓN**

Ante el Honorable
Concejo Municipal

MES / No.M2	SITIOS
ABRIL / 800	Parque Guayacanes B. Ciudad Bolívar (45 m2) Av Quebrada Seca Carrera 18 a la Carrera 22 (130 m2) Parque los Enamorados – Barrio Provenza (25 M2) Separador de Acrópolis (600 M2)
MAYO / 2.728	CAI San Alonso (164 M2) Separador Calle 56 Acrópolis (1.084 M2) Parque Cristal Bajo (440 M2) Parque Parroquia Niño Jesús Ciudad Bolívar (1.040 M2)
JUNIO / 3.150	Zona Verde La Feria (90 M2) Calle Los Estudiantes UTS (160 M2) Parque Ciudad Bolívar (440 M2) Parque Fontana Real (630 M2) Parque Los Niños Zona Infantil (830 M2) Caminodromo Fontana Real (320 M2) Parque Bruno Batello (680 M2)

**TOTAL INSTALADO DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO 2018 =
5556 M2**

ZONA VERDE CENTRO CULTURAL DEL ORIENTE (221 M2)



PARQUE LA GRAN LADERA MONTE REDONDO 232 m2



TOTAL INSTALADO MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018 = 4.826 M2

FECHA	DIRECCION	M2
Agosto	Molino Porvenir	676
Septiembre		515
Agosto	Neomundo	650
Septiembre		1.315
Septiembre	Jardineras Carrera 15	25
Septiembre	Parque Romero	800
Septiembre	Parque la paz	650
Septiembre	Calle De Los Estudiantes	80
Septiembre	Intercesión Entrada Al Mutis	115



Neomundo



Parque Romero

✓ **Rocería:**

MANTENIMIENTO ANTES Y DESPUES PARQUE LA BOMBONERA LA JOYA



MANTENIMIENTO ANTES Y DESPUES PARQUE LAS CIGARRAS



✓ Parqueros:

LIMPIEZA DIARIA PARQUE LA IGLESIA CIUDAD BOLIVAR



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
09 DE 2018	MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y ZONAS VERDES CONSISTENTE EN LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO EN LOS PARQUES INDICADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 251.100.819,00	01/02/2018	30/09/2018

Estado: Avance de Obra: 100%

El avance de obra es del 100% puesto que se instalaron los puntos de agua de los 50 parques propuestos, por optimización de recursos quedo un saldo en dinero del contrato; por este motivo se procedió a realizar un adicional en tiempo equivalente a dos meses con el fin de cubrir nuevos parques con sistemas de riego.

Puntos de Agua Instalados Durante el Segundo Semestre de 2018:

- Parque Nacuma B. Monterredondo
- Parque Barrio Monterredondo
- Parque Manzanares
- Separador Acrópolis

ZONA VERDE CAI SAN PIO



PARQUE VALLEDUPAR



✓ METAS PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2018	LOGRO 2018
INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO	Porcentaje de parques con mantenimiento anual realizado.	100%	100%	100%

El cumplimiento de este indicador obedece a los contratos que se encuentran en ejecución.

- Equipamientos Comunitarios (Sociales, deportivos, Culturales entre otros).

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
218 DE 2018	CONSTRUCCION DEL PARQUE LA CEIBA EN LA COMUNA 13 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 3.185.372.854,8	24/09/2018	21/12/2018

Estado: Avance de obra: 1%



Exploración del Sitio para la construcción

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
216 DE 2018	CONSTRUCCION DEL PARQUE GRANJAS DE PROVENZA EN LA COMUNA 10 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.221.897.961,11	24/09/2018	21/12/2018

Estado: Avance de obra: 1%



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
138 DE 2018	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA GRUPO 1"	\$ 851.084.220,48	01/08/2018	30/11/2018

Estado: Avance de obra: 35%

El contrato incluye los siguientes escenarios deportivos:

- Cancha múltiple en concreto Barrio Brisas del Mutis (Comuna 17)
- Cancha de Microfútbol y Baloncesto Barrio Monteredondo (Comuna 17)
- Cancha Múltiple en concreto Barrio Altos del Progreso (Comuna 1)
- Cancha múltiple en concreto Barrio Kennedy (Comuna 1)
- Canchas de microfútbol en tierra Campo Madrid (Comuna 1)
- Cancha múltiple en concreto Barrio Bucaramanga (Comuna 8)

AVANCE DEL PROYECTO:

El contrato alcanza un avance del 35% en donde se han adelantado en una primera fase las canchas de los barrios Altos del Progreso y Kennedy que están próximas a ser terminadas, y se están iniciando las intervenciones en los otros barrios. Ya se adelantaron los permisos de poda y/o tala de árboles que afectan el funcionamiento

Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable Concejo Municipal

de los diferentes escenarios y ponen en riesgo la estabilidad de la estructura de los pisos.



ARREGLOS CERRAMIENTO ALTOS DEL PROGRESO



RECONSTRUCCIÓN GRADERIAS ALTOS DEL PROGRESO



ARREGLO CERRAMIENTO BARRIO KENNEDY




ARREGLO GRADERIAS BARRIO KENNEDY



ARREGLO CERRAMIENTO Y GRADERIAS CAMPO MADRID



REPOSICIÓN LOSAS DE PISO BARRIO MONTEREDONDO

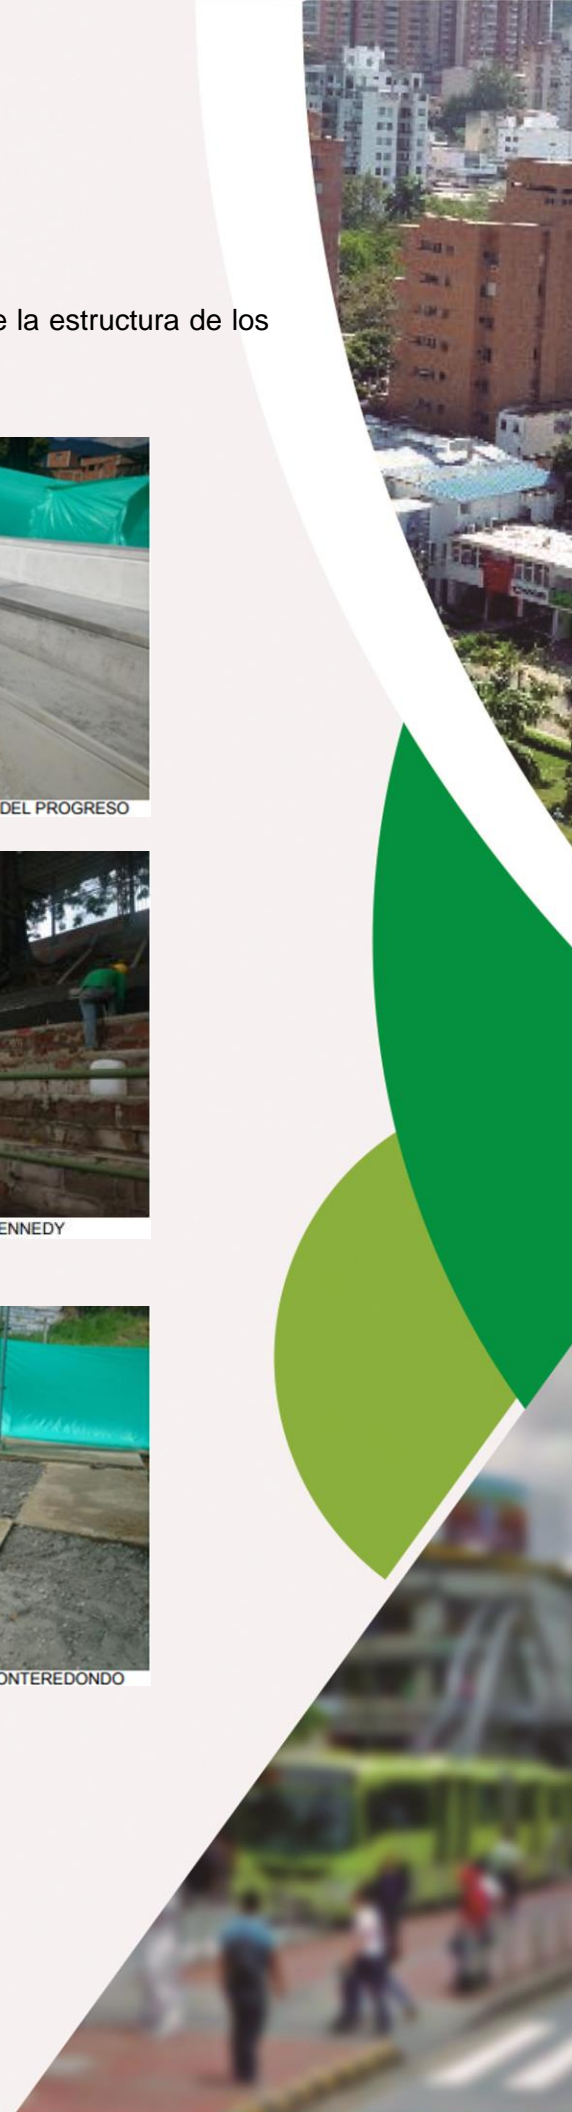

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
136 DE 2018	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA GRUPO II"	\$ 912.840.262,83	01/08/2018	30/11/2018

Estado: Avance de obra: 10%

El contrato incluye los siguientes escenarios deportivos:

- Cancha múltiple en concreto Barrio Hacienda San Juan (Comuna 16)
- Canchas de Fútbol en tierra Barrio Santander (Comuna 4)
- Canchas de Microfútbol y Baloncesto Parque de los Niños (Comuna 13)
- Cancha de Microfútbol en asfalto Barrio Álvarez (Comuna 13)
- Cancha múltiple y de mini baloncesto en concreto Parque Los Leones (Comuna 13)
- Cancha múltiple en concreto Barrio La Floresta (Comuna 12)
- Cancha múltiple en concreto Barrio San Gerardo (Comuna 8)
- Cancha de Mini fútbol en tierra Barrio Candiles (Comuna 6)
- Cancha de Baloncesto en concreto Barrio Canelos (Comuna 8)

AVANCE DEL PROYECTO:

El contrato alcanza un avance del 10% iniciando en los barrios Santander, Canelos, San Gerardo y Parque Los Leones, donde no se ha tenido el mejor rendimiento debido a modificaciones en las intervenciones, solicitados por los representantes de los barrios. En estos momentos se está poniendo en acción un plan de contingencia por parte del contratista para mejorar el rendimiento.

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
178 DE 2018	MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS CANCHAS DE TENIS DEL PARQUE DE LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.359.817.188,38	13/08/2018	31/12/2018

Estado: Avance de obra: 12%

Informe de **GESTIÓN**

Ante el Honorable
Concejo Municipal

El contrato alcanza un avance del 12% en donde se han adelantado hasta el momento las actividades de demolición de la construcción existente, excavaciones y concreto ciclópeo de la cimentación. Cabe recordar que el proyecto involucra la reconstrucción total del edificio y de las canchas de tenis, obra que no había tenido intervención alguna desde su construcción, hace aproximadamente 60 años.

El proyecto incluye una nueva estructura de soporte para el piso de las dos canchas, ajustada a las especificaciones dadas por la Liga de Tenis de Santander. El edificio central consta de dos plantas con modernos acabados, planta libre en primer piso con acceso desde la plazoleta central del Parque de los Niños, servicios de cafetería, vestieres, baños, cuarto técnico y rampa que desciende a la cancha 2.



El segundo piso incluye dos áreas de calentamiento con muros de rebote y cerramiento en malla de nylon. Adicionalmente, servicios, bodega y cafetería.



DEMOLICIÓN A MAQUINA EDIFICIO ANTIGUO



EXCAVACIONES Y ACTIVIDADES DE CIMENTACION EDIFICIO CENTRAL

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
192 DE 2018	MEREMODELACION DE CANCHAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO I	\$ 3.773.166.237,58	03/09/2018	31/12/2018

Estado: en Ejecución, Avance de Obra de: 4%

Canchas a intervenir: La Concordia, Pan de Azúcar, Tejar Norte y Coaviconsá.

Se realizaron las actividades de localización y replanteo, demolición sardinel en concreto, desmante arcos metálicos, desmante baranda metálicas, desmante módulos de cerramiento en ángulo y malla, desmante postes metálicos alumbrado, excavaciones manuales, excavaciones con máquina, suministro e instalación tubería PVC, excavación para canaleta de desagüe, limpieza de canales, desmante aparatos eléctricos, retiro de infraestructura existente, figurada acero de refuerzo y excavación para muros de contención.



Coaviconsá



Tejar Norte

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
191 DE 2018	REMODELACION DE CANCHAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO II	\$ 4.073.930.183,1	03/09/2018	31/12/2018

Estado: en Ejecución, Avance de Obra de: 7.5%

Canchas a intervenir: Alfonso López, Esperanza II, Nápoles, y Dangond.

✓ CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2018	LOGRO 2018
INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO	Número de equipamientos comunitarios (sociales, deportivos y culturales: canchas sintéticas, multicentros deportivos, salones comunales, entre otros) intervenidos y/o construidos.	100	30	34

El cumplimiento a este indicador obedece a los contratos antes mencionados.

- **Mantenimiento a Plazas de Mercado**

Se continua con la ejecucion del contrato relacionado a continuacion:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
359 de 2017	REPOSICIÓN DE LA CUBIERTA DEL MODULO NORTE DE LA PLAZA GUARÍN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 585.620.639,85	23/11/2017	15/12/2018

Estado: En ejecución, avance de Obra 6%

El contratista ya tramito el anticipo, contrato el suministro e instalación de la teja de cubierta, dando inicio de esta actividad en esta semana, realizo los cambios de canales en el costado norte e inicia el desmonte de elementos verticales de fachada.



Estado Inicial Cubierta y Fachada



Render Facha y Cubierta

✓ CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2018	LOGRO 2018
INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO	Número de adecuaciones y/o mantenimientos realizados a las plazas de mercado a cargo del municipio.	4	1	0

Se espera terminar con la intervención a la plaza de mercado Guarín y realizar las gestiones para lograr dar cumplimiento a este indicador.

- **Andenes Construidos**

Se continua con la ejecucion del contrato relacionado a continuacion:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
376 de 2017	ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA PLAZA GUARÍN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 1.982.938.940,48 Adicional \$ 870.848.763	19/12/2017	30/07/2018

Estado: Avance de Obra 100% - La Obra se encuentra terminada y entregada, en proceso de liquidación.



ACCESO POR LA CALLE 32



PEATONAL CALLE 32

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
182 de 2018	MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DE CONFORMIDAD CON LAS SENTENCIAS DE ACCIONES CONSTITUCIONALES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$329.808.266,00	19/09/2018	18/12/2018

Estado: en ejecución Avance del 0.70%

CALLE 32B Bis N°17ª-10



CARRERA 20 N°51A-25



✓ CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2018	LOGRO 2018
INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO	Número de M2 de andenes construidos.	30.000	10.400	18.706

El cumplimiento a este indicador obedece al contrato de andenes y pasamanos, fallos judiciales y las intervenciones en los diferentes escenarios deportivos.

LÍNEA ESTRATÉGICA 6: INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD

6.1. PROGRAMA: PROMOCIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
281 de 2017	CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR CICLISTA UIS-PARQUE DE LOS NIÑOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.171.015.163,58 Adicional \$ 433.232.617,99	12/10/2017	11/05/2018

Estado: Avance de obra 100% - En proceso de liquidación – Falta realizar el pago final de obra.



Acabados Conexión – Caballo Bolívar - Uis



Acabados Carrera 30 Calle 31 -32

✓ CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2018	LOGRO 2018
PROMOCIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS	Número de kms de ciclorutas para transporte urbano implementados.	20	7	0

Para dar cumplimiento a este indicador, se encuentra en ejecución el Convenio de Cooperación Internacional No. 341 de 2017 “Diseño definitivo de 20 Kilómetros de Cicloruta”, una vez se han entregados los diseños se podrá realizar la contratación y dar cumplimiento a este indicador.

6.2. PROGRAMA: MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA

- Mantenimiento Malla Vial Urbana


Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
176 de 2018	OBRAS DE PARCHEO DE HUECOS, FALLOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES EN LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.746.373.202,00	30/08/2018	29/12/2018

Estado: Avance de Obra: 11%

1. SECTORES ATENDIDOS Y EN EJECUCIÓN

- Carrera 27 entre puerta del sol y avda. Quebradaseca
- Carrera 18 entre av. La Rosta y calle 55
- Calle 50 entre Cra. 18 y 19
- Vías internas del barrio Pablo VI
- Carrera 16 entre diag. 15 y calle 45
- Barrio Ciudad Venecia, calle 94 entre Cra. 13ª y 14

Carrera 27 entre puerta del sol y av. Quebradaseca. (fotos antes izq. y después der.)

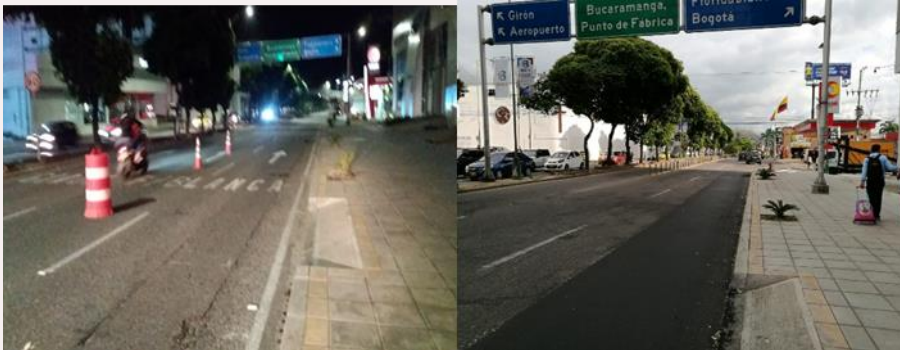

Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable Concejo Municipal


Carrera 18 entre avda La Rosta y calle 55 (fotos antes izq. y después der.)



Calle 50 entre cras. 18 y 19



Vías internas del barrio Pablo VI

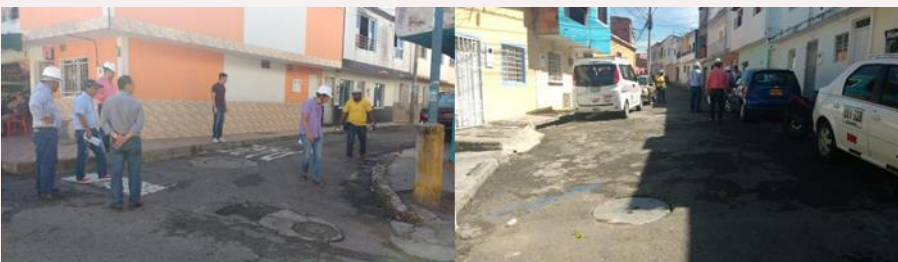

Carrera 16 entre diag. 15 y calle 45





Barrio Ciudad Venecia, calle 94 entre Cra. 13ª y 14



✓ CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2018	LOGRO 2018
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA	Número de M2 de malla vial urbana mejorados y/o construidos.	60.000	10.000	12.000

El cumplimiento a este indicador obedece al contrato antes mencionado.

• Megaobras de Infraestructura Vial

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
272 de 2014	CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL MESÓN DE LOS BÚCAROS Y OBRAS	Valor Inicial \$ 54.909.500.000 Adicional 1. \$ 14.516.066.713 Adicional 2. \$ 10.945.041.309 Valor Total \$ 80.370.608.022	10 de septiembre de 2014	24 de Noviembre de 2018

	COMPLEMENTARIAS.			
--	------------------	--	--	--

Estado: Avance de Obra: 93%

ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE EL REINICIO DE LA OBRA

- Con motivo de la providencia que ordenó el levantamiento de la medida cautelar impuesta quedo ejecutoriada el día seis (6) de Febrero de 2018.
- El acta de Reinicio de Obra fue a partir del 17 de Mayo de 2018
- De acuerdo de la resolución del AMB se procedió a la tala de árboles el día 19 de Mayo de 2018.
- Excavaciones para la construcción de los ejes viales que conforman la glorieta.
- Definición en sitio del trazado del muro de cerramiento en la plazoleta contiguo al acceso de la escuela normal superior.
- Se reanudaron las actividades de tala de árboles en el área de plazoleta No. 1, los cuales fueron aprobados mediante resolución 000509 del 15 de Mayo de 2018, la cual revoca la resolución No. 000203 de 21 de Febrero de 2018. Se autorizó la tala de 113 árboles y el traslado el 4.
- Se inicia la instalación del concreto ciclópeo para la cimentación del muro de contención.
- Se realiza la demolición de los salones de la escuela Normal Superior de Bucaramanga
- Construcción de Micropilotes Zona 2
- Construcción de Micropilotes Zona 1
- Red Interna Acueducto Diámetro: 2 1/2
- Construcción de Muro de Contención
- Red alcantarillado, pendiente corona de pozos
- Conformación del Eje Vial N° 14
- Cimentación Puente Peatonal
- Fabricación Puente Peatonal Metálico



Construcción Muro de Contención



Construcción de Alcantarillado

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
331 de 2014	INTERVENTORÍA AMPLIACIÓN DEL CORREDOR VIAL PRIMARIO BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA SECTOR PUERTA DEL SOL - PUENTE PROVENZA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	Valor Inicial \$ 7.518.263.339,5 Adicional 1. \$ 5.640.000.000,00 Adicional 2. \$ 298.124.079,52 Adicional 3. \$ 279.998.312,00 Adicional 4. \$ 503.068.682,00 Adicional 5 \$ 576.556.101,00 Adicional 7 \$ 576.411.857,00 Valor Total 15.392.422.371,02	01 de Octubre de 2014	07/07/2018

Estado: Avance de obra: 97.82% - **SUSPENDIDO**

Entre las actividades que se encuentran realizando están:

Actividades eléctricas de la variante, maniobras aéreas entre las torres de noemundo y la subestación eléctrica conucos, construcción de la vía 1, 2,3, construcción de la rampa de acceso del constado occidental del puente peatonal del Barrio Antonia Santos y Adecuación del espacio público para la implantación de la signografía Guane, adicionalmente se requiere recuperación de la carpeta asfáltica y señalización.

✓ CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2018	LOGRO 2018
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA	Número de megaobras terminadas.	3	0	0

El cumplimiento a este indicador obedece a la terminación del Tercer carril y la Construcción del intercambiador del Mesón de los Búcaros que debió ser reportado en la vigencia 2017, pero como no ha sido posible la terminación de dichas obras, durante la vigencia 2018 se espera realizar el reporte.

6.2 PROGRAMA: MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL RURAL

La Secretaria de Infraestructura tiene dentro de sus funciones el manejo de la Maquinaria Pesada del Municipio, sin embargo la contratación para el Mantenimiento de dicha maquinaria esta en cabeza de la Secretaria Administrativa – Subsecretaria de Bienes y Servicios, quienes se encuentran realizando todas las gestiones para contratar y realizar el mantenimiento a la maquinaria con el fin de ponerla al servicio de la Comunidad, es por ello que desde el 30 de Junio de la presente vigencia no ha sido posible la intervención periódica a las diferentes vías del sector urbano y rural.

Es de anotar que actualmente se encuentran realizando trabajos en la vía en cumplimiento del Contrato de Placa Huellas que alcanza ya un porcentaje de avance del 12%, este contrato tiene recursos de presupuestos participativos y de Malla vial rural por valor de \$ 400.000.000,00

✓ CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2018	LOGRO 2018
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL RURAL	Número de kms de vías rurales con transitabilidad mantenida.	140	140	140
	Número de ML de placa huella construidas.	5.000	500	1.080

El cumplimiento a este indicador obedece a la transitabilidad mantenida en los 3 corregimientos y al contrato de Placas Huellas que se encuentra en ejecución.

1.3 PROGRAMA: SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS Y RURALES

6.4. PROGRAMA: ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL

La Secretaria de Infraestructura a través de la Oficina de Alumbrado Publico ha realizado Mantenimiento de la siguiente Manera:

INDICADORES 2018								
MES	PQR'S RECIBIDAS EN EL MES	PQR'S ATENDIDAS DEL MES	% ATENCION PQR'S DELMES	TIEMPO DE RESPUESTA (DIAS)	PQR'S ATENDIDOS DE OTROS MESES	ACUMULADA PQR'S RECIBIDAS	ACUMULADA PQR'S ATENDIDAS	% ATENCION PQR'S ACUMULADO
Enero	1120	655	58%	5	446	1120	1101	98%
Febrero	846	428	51%	4	310	1966	1839	94%
Marzo	806	469	58%	5	262	2772	2570	93%
Abril	1090	644	59%	5	190	3862	3404	88%
Mayo	925	545	59%	5	251	4787	4200	88%
Junio	648	409	63%	5	260	5435	4869	90%
Julio	997	505	51%	4	227	6432	5601	87%
Agosto	1156	478	41%	5	216	7588	6295	83%
Septiembre	1058	506	48%	5	245	8646	7046	81%
Octubre								
Noviembre								
Diciembre								
TOTAL	8646	4639			2407			
TOTAL PQR'S ACUMULADO RECIBIDAS					8646			
TOTAL PQR'S ACUMULADO ATENDIDAS					7046			
PORCENTAJE DE ATENCION PQR'S					81%			

Se continúa con la ejecución de los contratos de mantenimientos para el alumbrado público en cumplimiento de los siguientes procesos contractuales:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
302 de 2017	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN	COINGESER LTDA \$ 810.496.307,50	18 de Octubre de 2017	31 de Diciembre de 2018
303 de 2017	DIFERENTES SECTORES DE LA ZONA URBANA Y ZONA	EME INGENIERIA \$671.856.316,58		
304 de 2017	RURAL	CIVAREL INGENIERIA \$651.732.060,00		

Estado: Avance de obra: 96% - Se adelanta adicional en valor y plazo

SECTORES A INTEVENIR

- ❖ GRUPO COINGESER Intervienen: Comunas 4, 5, 7, 12, 17, Corregimiento 3 y Viaducto Provincial
- ❖ GRUPO EME Intervienen: Comunas 2, 3, 6, 8, 9, 14, 15 y Corregimiento 1
- ❖ GRUPO CIVAREL Intervienen: Comunas 1, 10, 11, 13, 16 y Corregimiento 2

Informe de GESTIÓN


Ante el Honorable Concejo Municipal

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
003 de 2017	CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO VIA CENFER – PUERTA DEL SOL –GRUPO 1 –CENFER INTERCAMBIADOR EL BUENO	\$ 3.296.758.330,00	15/02/2017	30/10/2017

Estado: Avance de obra: 100% ejecutado – En proceso de Liquidación

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
004 de 2017	CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO VIA CENFER – PUERTA DEL SOL. GRUPO 2 – INTERCAMBIADOR EL BUENO INTERCAMBIADOR PUERTA DEL SOL	\$ 2.881.620.453,00	15/02/2017	30/10/2017

Estado: Avance de Obra: 100% - Ejecutado en proceso de liquidación

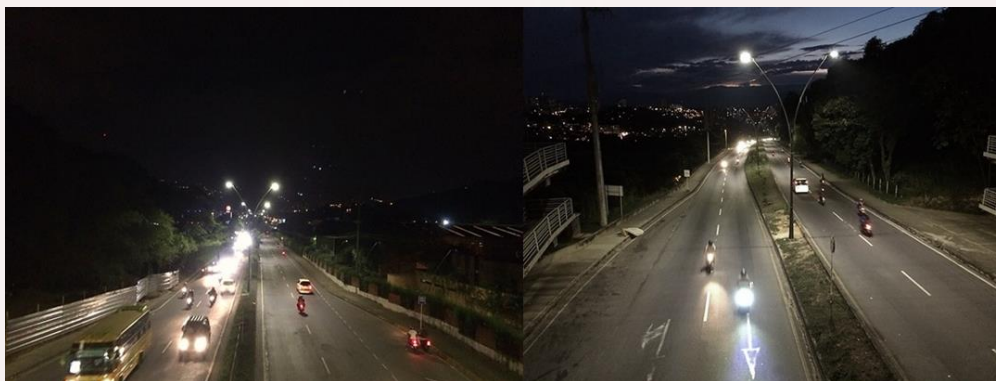

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
008 de 2017	PARQUE GUAYACANES - BAVARIA II – COMUNA 1 Y VILLA DEL PRADO – COMUNA 5	\$ 1.239.726.530,00	16/02/2017	15/07/2017

Porcentaje Ejecución: Bavaria II - 100%


Porcentaje Ejecución: Villa del Prado – 100% - LIQUIDACION

Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable Concejo Municipal

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
219 de 2017	CONSTRUCCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL TRAMO 4 – CENTRO ABASTOS CAFÉ MADRID	\$ 2.621.711.740,95	27/07/2017	09/06/2017
220 de 2017		\$ 1.813.213.811,70	27/07/2017	09/06/2017

Estado: Liquidado

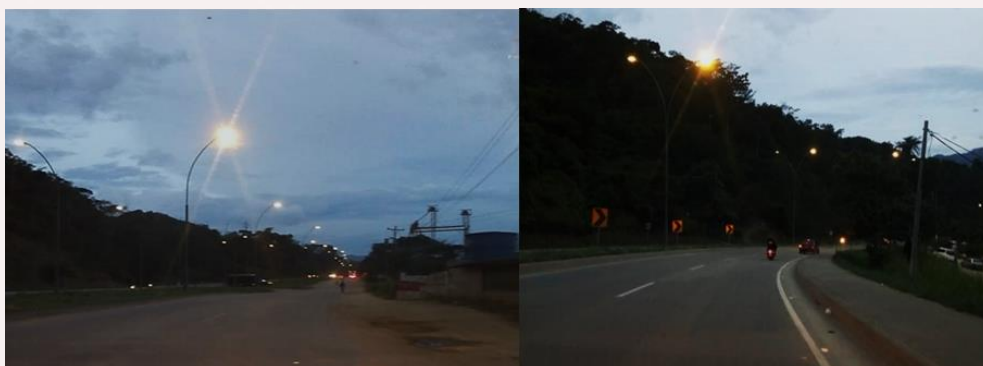

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
312 de 2017	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO ETAPA 2 – BARRIO CIUDAD BOLÍVAR	\$ 2.176.343.155,91	21/06/2018	20/11/2018

Estado: en ejecución, 82% de avance de obra



Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable Concejo Municipal

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
117 de 2018	ACTIVIDADES DE PODA PARA EL DESPEJE DE LUMINARIAS Y REDES QUE INTERFIEREN CON EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 593.923.343.45	15/05/2018	29/12/2018

Estado: Avance de Obra: 62%



PODAS EN EL PLAZA GUARIN PARA DESPEJAR LUMINARIAS Y RECUPERAR ILUMINACION

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
188 de 2018	SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA –FASE II: COMUNAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 23.725.301.046,00	27/08/2018	31/12/2018

Estado: En ejecución, avance de obra: 20%



Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable Concejo Municipal

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
214 de 2018	CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE LINEAL RIO DE ORO FASE II.	\$ 965.458.895,00	19/09/2018	31/12/2018

Estado: En ejecución, avance de obra: 5%



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
238 de 2018	EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA -2018	\$ 892.917.138,00	01/10/2018	30/12/2018

Estado: En ejecución, avance de obra: 1%



PROYECTOS CONTRATADOS EN CONJUNTO CON LA OBRA CIVIL

Objeto	Valor contrato.	Contrato No.	Contratista
INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS CANCHAS DE TENIS DEL PARQUE DE LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 16.286.429,50	181	CONSORCIO ASOCIADOS CONSULTORES
MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS CANCHAS DE TENIS DEL PARQUE DE LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 242.037.741,60	178	CONSORCIO DEPORTES CCC
REMODELACION DE CANCHAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO II	\$ 545.552.711,36	191	CONSORCIO OBRAS BUCARAMANGA 2018
REMODELACION DE CANCHAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO I	\$ 834.724.387,16	192	CONSORCIO CANCHAS DE LUZ 2018
CONSTRUCCION DEL PARQUE GRANJAS DE PROVENZA EN LA COMUNA 10 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 289.207.265,40	216	CONSORCIO PARQUE LA CEIBA
CONSTRUCCION DEL PARQUE LA CEIBA EN LA COMUNA 13 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.280.363.539,95	218	CONSORCIO YELLOWSTONE

✓ CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2018	LOGRO 2018
ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL	Número de luminarias sustituidas a LED.	36.000	12.000	24.569
	Número de luminarias expandidas.	1.000	300	873
	Número de puntos de telemedida instalados y puestos en marcha.	50	15	10
	Número de parques y/o escenarios públicos modernizados en su alumbrado público.	20	5	12
	Porcentaje de nuevos espacios públicos con alumbrado público instalado.	100%	100%	100%
	Porcentaje de luminarias que se encuentran en funcionamiento.	96%	96%	90%

El reporte a estos indicadores se viene realizando con los contratos antes mencionados.

7. OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR LA SECRETARIA

Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable
Concejo Municipal

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
405 de 2017	CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.598.565.682,8	01/02/2018	30/07/2018

Estado: Avance de Obra: 42%



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
71 de 2018	RECONSTRUCCION DE LA ANTIGUA ESTACION DEL CAFÉ MADRID PARA LA HABILITACIÓN DE UN LUDOTECA EN EL BARRIO CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.254.823.459.69	12/03/2018	11/11/2018

Estado: Avance de Obra: 31.4%

Actualmente ya se encuentran fundidas en su totalidad las estructuras en concreto reforzado ubicadas en el costado sur de la antigua estación café Madrid (Ejes 8-12 y A-F), ya se encuentran fundidas las zapatas, vigas de cimentación y columnas ubicadas entre los ejes 6-7-E-A y las columna ubicadas en el eje 5A y 4A, ya se finalizaron las labores de friso de los muros en el costado sur de la antigua estación café Madrid (Ejes 8-12 y A-F), se realizó la re-construcción de los vanos que fueron demolidos en el costado norte, también se demolió la cubierta existente. Actualmente se trabaja, en el retiro del friso presente en los muros en mampostería existentes, en el replanteo necesario para el mejoramiento del suelo de obra, en labores de relleno de acuerdo a los diseños, en la construcción del reforzamiento estructural de los muros en mampostería de acuerdo a los diseños, se continua con la construcción de los muros en mampostería faltantes, se inició la fundida de las placas de piso en el costado sur de la antigua estación Café Madrid (Ejes 8-12 y A-F), se continua con las labores constructivas de las redes hidrosanitarias del

proyecto , y se continua las labores constructivas del tanque de almacenamiento y del cuarto de bombas para el proyecto..



COSTADO SUR DE LA LUDOTECA



ESTRUCTURA NUEVA DEL COSTADO SUR

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
151 de 2018	REALIZAR UN PLAN DE INTERVENCIÓN PARA REMOVER LA CUBIERTA QUE COMPRENDE EL ALERO DE LA VIVIENDA UBICADA EN LA CARRERA 12 No. 37-51 Y LA RESPECTIVA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA	\$31.794.971,00	09/08/2018	23/09/2018

Estado: Avance de Obra: 90% - En proceso de Liquidación



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
140 de 2018	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN CERRAMIENTO Y RELLENO DEL TERRENO UBICADO	\$348.397.190,08	01/08/2018	30/09/2018

	EN LA DIAGONAL 32 No. 33ª-132 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.			
--	---	--	--	--

Estado: Avance de Obra: 100%



8. PROYECTOS PRESENTADOS Y VIABILIZADOS

No.	No. REGISTRO	OBJETO	VALOR VIGENCIA	ESTADO
1	20160680010121	MEJORAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS TRANSVERSALES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.563.200.000,00	Certificado - Actualización
2	20160680010088	ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, ENERGÍA Y FACTURACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	\$ 17.933.000.000,00	Certificado - Actualización
3	20170680010016	APOYO EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 864.250.000,00	Certificado - Actualización
4	20170680010118	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE Y CANCHA DEL BARRIO CRISTAL BAJO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 317.509.812,84	Certificado - Actualización
5	20160680010226	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER	\$ 1.008.735.035,13	Certificado - Actualización
6	20170680010090	MEJORAMIENTO DEL PARQUE BOCAPRADERA DEL BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 501.661.954,67	Certificado - Actualización
7	20170680010141	CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA DE COLUMNATA Y PUENTE DE INTEGRACIÓN EDIFICIOS EXISTENTE Y NUEVO CENTRO DE CONVENCIONES NEOMUENDO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 4.000.000.000,00	Certificado - Actualización Vigencias Futuras

Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable
Concejo Municipal

8	20180680010010	APOYO AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS DIFERENTES OBRAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 105.932.922,80	Certificado - Proyecto Nuevo
9	20170680010046	SUBSIDIO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO A LA POBLACION DE ESTRATO 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 4.552.898.870,00	Certificado - Actualización
10	20170680010174	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO LOS PINOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 154.989.631,00	Certificado - Proyecto Nuevo
11	20170680010084	CONSTRUCCIÓN CORREDOR CICLISTA UIS - PARQUE DE LOS NIÑOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 466.793.508,99	Certificado - Actualización
12	20170680010093	ADECUACIÓN DEL PARQUE RELIGIOSO MORRORICO BUCARAMANGA	\$ 127.923.589,32	Certificado - Actualización
13	20170680010133	CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS CANCHAS Y SUS ALREDEDORES DE LOS BARRIOS PORVENIR I PORVENIR II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.449.984.504,67	Certificado - Actualización
14	20170680010057	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA GRAN SALA DEL TEATRO SANTANDER MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	\$ 999.000.000,00	Certificado - Proyecto Nuevo
15	20180680010013	MATENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.977.910.290,37	Certificado - Proyecto Nuevo
16	20160680010245	CONSTRUCCION, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.	\$ 1.109.208.202,83	Certificado - Actualización
17	20160680010154	MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	\$ 4.541.798.899,48	Certificado - Actualización
18	20170680010111	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEL BARRIO CAFÉ MADRID DE BUCARAMANGA	\$ 89.084.660,00	Certificado - Actualización
19	20160680010196	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA BARRIO KENNEDY FASE II MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	\$ 599.555.869,61	Certificado - Actualización
20		MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE MICROFUTBOL DEL BARRIO LA JOYA FASE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 96.841.447,00	Proyecto Nuevo, en espera de ser certificado.
21	20170680010165	RENOVACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 88.017.400,27	En Actualización

22	20180680010030	APOYO AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INTERCAMBIADOR MESÓN DE LOS BÚCAROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, FASE III EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 1.242.467.100,00	Certificado - Proyecto Nuevo
23	20180680010023	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO A TECNOLOGÍA LED FASE II: COMUNAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 11 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 32.213.762.885,00	Certificado - Proyecto Nuevo
24	20180680010024	REMDELACION DE ANDENES Y ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.900.224.580,99	Certificado - Proyecto Nuevo
25	20180680010025	MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS CANCHAS DE TENIS DEL PARQUE DE LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.670.083.624,31	Certificado - Proyecto Nuevo
26	20180680010028	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA FASE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 3.146.145.207,00	Certificado - Proyecto Nuevo
27	20160680010226	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.	\$ 2.313.417.707,11	Certificado - Actualización
28	20180680010049	CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ZONAS VERDES DEL BARRIO LOS CANELOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.089.462.658,32	Certificado - Proyecto Nuevo
29	20180680010036	AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO RURAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 1.101.039.013,00	Certificado - Proyecto Nuevo
30	20180680010041	ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LAS VÍAS ARTERIALES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS Y DETERMINACIÓN DE COTA DE INUNDACIÓN DEL CENTRO DE ZONOSIS DE VIJAGUAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 85.150.354,00	Certificado - Proyecto Nuevo
31	20180680010031	REMDELACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 7.706.773.585,37	Certificado - Proyecto Nuevo
32	20170680010139	MEJORAMIENTO DEL PARQUE LINEAL RIO DE ORO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.102.623.391,00	Certificado - Actualización
33	20170680010137	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.494.116.686,62	Certificado - Actualización

34	20170680010137	APOYO PARA LA INTERVENCIÓN, RESTAURACIÓN Y FINALIZACIÓN DEL TEATRINO DEL ESTADIO, FACHADAS DE LA CARRERA 20 Y LA CALLE 31, Y ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO DEL CENTRO CULTURAL DEL ORIENTE COLOMBIANO BUCARAMANGA	\$ 499.900.000,00	Certificado - Actualización
35	20180680010052	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE GRANJAS DE PROVENZA EN LA COMUNA 10 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 313.711.370,55	Certificado - Proyecto Nuevo
36	20180680010051	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LA CEIBA EN LA COMUNA13 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 3.493.871.261,00	Certificado - Proyecto Nuevo
37	20180680010054	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PARA TERMINACIÓN DE LA GRAN SALA DEL TEATRO SANTANDER FASE II EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 2.652.000.000,00	Certificado - Proyecto Nuevo
38	20180680010050	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE PUNTOS VIVE DIGITAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 135.502.973,00	Certificado - Proyecto Nuevo
39	20180680010035	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DE ATLETISMO, LUIS ENRIQUE FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE BUCARMANGA	\$ 66.155.135,00	Certificado - Proyecto Nuevo
40	20180680010068	ADECUACIÓN DE LA PLAZOLETA DE LOS EDECANES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.332.056.223,40	Certificado - Proyecto Nuevo
41	20180680010061	ADECUACIÓN PARQUE ECOLÓGICO LA FLORA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.749.844.108,09	Certificado - Proyecto Nuevo
42		ADECUACIÓN DE LA PLAZOLETA DE LA DEMOCRACIA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 456.314.841,09	En revisión en el Banco de Proyectos
43	20180680010060	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD INTERMEDIA MATERNO INFANTIL SANTA TERESITA UIMIST EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.269.036.943,02	Certificado - Proyecto Nuevo
44		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA 1, BARRIOS VILLALUZ, VILLAGRIA II, BETANIA Y CAMPO MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 526.883.396,19	En revisión en el Banco de Proyectos
45	20180680010074	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEL COLEGIO INEM CUSTODIO GARCIA ROVIRA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.852.182.127,80	Certificado - Proyecto Nuevo
46	20180680010079	INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 1.549.627.148,08	Certificado - Proyecto Nuevo

47	20180680010078	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO ADYACENTE A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 147.697.706,00	Certificado - Proyecto Nuevo
48	20180680010079	MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS EN DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 139.276.828,00	Certificado - Proyecto Nuevo

9. PROCESOS ADJUDICADOS

9.1 LICITACIONES PÚBLICAS

No.	OBJETO	No. PROCESO	ESTADO	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-001-2018	ADJUDICADO	\$ 1.798.100.263,97
2	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LOS DIFERENTES CORREGIMIENTOS QUE COMPRENDE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-002-2018	ADJUDICADO	\$ 1.277.358.628,60
3	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ANDENES, PASAMANOS Y ESCALERAS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER	SI-LP-003-2018	ADJUDICADO	\$ 1.553.175.389,00
4	MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS CANCHAS DE TENIS DEL PARQUE DE LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-004-2018	ADJUDICADO	\$ 2.397.714.936,81
5	OBRAS DE PARCHEO DE HUECOS, FALLOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES EN LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-005-2018	ADJUDICADO	\$ 2.827.830.619,00
6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN LOCATIVA DE AMBIENTES DE TRANSICIÓN UBICADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-006-2018	ADJUDICADO	\$ 1.541.933.624,00
7	REMODELACIÓN DE CANCHAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-007-2018	ADJUDICADO	\$ 7.948.719.254,88
8	CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE LINEAL RIO DE ORO FASE II	SI-LP-008-2018	ADJUDICADO	\$ 977.185.114,00
9	EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA -2018	SI-LP-009-2018	ADJUDICADO	\$ 929.061.838,00

10	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LA CEIBA EN LA COMUNA 13 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE GRANJAS DE PROVENZA EN LA COMUNA 10 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-010-2018	ADJUDICADO	\$ 5.518.618.108,00
11	MANTENIMIENTO DE LA FACHADA Y ÁREAS INTERNAS DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	SI-LP-011-2018	ADJUDICADO	\$ 1.225.397.026,84
12	REPARACIONES LOCATIVAS Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA: PROMOCIÓN SOCIAL SEDES D Y C, CLUB UNION SEDE D, RURAL EL PAULON, MAIPORE SEDE C, JORGE ARDILA DUARTE Y AURELIO MARTÍNEZ MUTIS.	SI-LP-012-2018	ADJUDICADO	\$ 6.088.211.143,36
13	MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS E INSTALACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE Y JUEGOS INFANTILES, VIABILIZADOS POR EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	SI-LP-014-2018	ADJUDICADO	\$ 1.669.567.590,00
14	CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LOS CANELOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-015-2018	REVOCADO	\$ 911.108.471,40
15	ADECUACION DEL PARQUE ECOLOGICO LA FLORA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-016-2018	TRASLADO SECRETARIAL	\$ 2.575.284.495,09
16	ADECUACIONES LOCATIVAS, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, INEM SEDE B, ANDRES PAEZ SOTO JOYA, AURELIO SEDE B, CLUB UNIÓN SEDE A, CLUB UNIÓN SEDE B, JUVENTUD, BOSCONIA BOLARQUI SEDE B, BOSCONIA CUCHILLA, VIJAGUAL SEDE A, SANTANDER SEDE A, POLITECNICO SEDE B, SANTA MARIA GORETTI SEDE B, JOSE CELESTINO MUTIS, AURELIO MARTINEZ MUTIS SEDE C, MAIPORE SEDE B, BICENTENARIO.	SI-LP-017-2018	TRASLADO SECRETARIAL	\$ 6.215.632.944,00
17	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECNOLOGÍA LED PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – FASE II, EN LAS COMUNAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11	SI-LP-018-2018	PROYECTO DE PLIEGOS	\$ 7.406.002.193,00
18	ADECUACION DE LA PLAZOLETA DE LOS EDECANES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-019-2018	TRASLADO SECRETARIAL	\$ 1.237.379.823,72
19	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEL COLEGIO INEM CUSTODIO GARCIA ROVIRA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-020-2018	PROYECTO DE PLIEGOS	\$ 2.768.557.108,80

9.2 CONCURSO DE MERITOS

No.	OBJETO	No. PROCESO	ESTADO	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-001-2018	ADJUDICADO	\$ 1.798.100.263,97
2	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LOS DIFERENTES CORREGIMIENTOS QUE COMPRENDE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-002-2018	ADJUDICADO	\$ 1.277.358.628,60
3	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ANDENES, PASAMANOS Y ESCALERAS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER	SI-LP-003-2018	ADJUDICADO	\$ 1.553.175.389,00
4	MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS CANCHAS DE TENIS DEL PARQUE DE LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-004-2018	ADJUDICADO	\$ 2.397.714.936,81
5	OBRAS DE PARCHEO DE HUECOS, FALLOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES EN LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-005-2018	ADJUDICADO	\$ 2.827.830.619,00
6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN LOCATIVA DE AMBIENTES DE TRANSICIÓN UBICADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-006-2018	ADJUDICADO	\$ 1.541.933.624,00
7	REMODELACIÓN DE CANCHAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-007-2018	ADJUDICADO	\$ 7.948.719.254,88
8	CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE LINEAL RIO DE ORO FASE II	SI-LP-008-2018	ADJUDICADO	\$ 977.185.114,00
9	EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA -2018	SI-LP-009-2018	ADJUDICADO	\$ 929.061.838,00
10	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LA CEIBA EN LA COMUNA 13 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE GRANJAS DE PROVENZA EN LA COMUNA 10 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-010-2018	ADJUDICADO	\$ 5.518.618.108,00
11	MANTENIMIENTO DE LA FACHADA Y ÁREAS INTERNAS DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	SI-LP-011-2018	ADJUDICADO	\$ 1.225.397.026,84

12	REPARACIONES LOCATIVAS Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA: PROMOCIÓN SOCIAL SEDES D Y C, CLUB UNION SEDE D, RURAL EL PAULON, MAIPORE SEDE C, JORGE ARDILA DUARTE Y AURELIO MARTÍNEZ MUTIS.	SI-LP-012-2018	ADJUDICADO	\$ 6.088.211.143,36
13	MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS E INSTALACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE Y JUEGOS INFANTILES, VIABILIZADOS POR EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	SI-LP-014-2018	ADJUDICADO	\$ 1.669.567.590,00
14	CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LOS CANELOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-015-2018	REVOcado	\$ 911.108.471,40
15	ADECUACION DEL PARQUE ECOLOGICO LA FLORA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-016-2018	TRASLADO SECRETARIAL	\$ 2.575.284.495,09
16	ADECUACIONES LOCATIVAS, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, INEM SEDE B, ANDRES PAEZ SOTO JOYA, AURELIO SEDE B, CLUB UNIÓN SEDE A, CLUB UNIÓN SEDE B, JUVENTUD, BOSCONIA BOLARQUI SEDE B, BOSCONIA CUCHILLA, VIJAGUAL SEDE A, SANTANDER SEDE A, POLITECNICO SEDE B, SANTA MARIA GORETTI SEDE B, JOSE CELESTINO MUTIS, AURELIO MARTINEZ MUTIS SEDE C, MAIPORE SEDE B, BICENTENARIO.	SI-LP-017-2018	TRASLADO SECRETARIAL	\$ 6.215.632.944,00
17	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECNOLOGÍA LED PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – FASE II, EN LAS COMUNAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11	SI-LP-018-2018	PROYECTO DE PLIEGOS	\$ 7.406.002.193,00
18	ADECUACION DE LA PLAZOLETA DE LOS EDECANES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-019-2018	TRASLADO SECRETARIAL	\$ 1.237.379.823,72
19	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEL COLEGIO INEM CUSTODIO GARCIA ROVIRA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-LP-020-2018	PROYECTO DE PLIEGOS	\$ 2.768.557.108,80
1	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA UIMIST DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-001-2018	DECLARADO DESIERTO	\$ 563.582.156,00
2	INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO A LED – ETAPA 2 DEL BARRIO CIUDAD BOLÍVAR DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-002-2018	ADJUDICADO	\$ 194.462.541,00

Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable
Concejo Municipal

3	ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y GEOLÓGICOS PARA LAS DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-003-2018	ADJUDICADO	\$ 220.566.078,00
4	INTERVENTORÍA AL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-004-2018	ADJUDICADO	\$ 196.449.960,00
5	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS Y REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LOS DIFERENTES CORREGIMIENTOS QUE COMPRENDE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-005-2018	ADJUDICADO	\$ 222.698.385,00
6	INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS CANCHAS DE TENIS DEL PARQUE DE LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-006-2018	ADJUDICADO	\$ 272.368.687,50
7	INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE PARCHEO DE HUECOS, FALLOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES EN LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-007-2018	ADJUDICADO	\$ 318.314.588,00
8	INTERVENTORÍA A LA REMODELACIÓN DE CANCHAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-008-2018	ADJUDICADO	\$ 427.575.330,00
9	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ANDENES, PASAMANOS Y ESCALERAS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER	SI-CM-009-2018	ADJUDICADO	\$ 199.953.425,00
10	INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE LINEAL RIO DE ORO FASE II	SI-CM-010-2018	ADJUDICADO	\$ 125.435.091,60
11	INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE CONFORMIDAD CON LAS SENTENCIAS DE ACCIONES CONSTITUCIONALES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-011-2018	ADJUDICADO	\$ 81.945.557,00
12	INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - 2018	SI-CM-012-2018	ADJUDICADO	\$ 170.191.967,40
13	INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN LOCATIVA DE AMBIENTES DE TRANSICIÓN UBICADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-013-2018	ADJUDICADO	\$ 305.850.022,00
14	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA (CIC) PARA EL SECTOR DE LA DIVA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER.	SI-CM-014-2018	ADJUDICADO	\$ 59.410.179,00
15	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LA CEIBA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-015-2018	ADJUDICADO	\$ 202.405.613,00

16	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE GRANJAS DE PROVENZA EN LA COMUNA 10 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-016-2018	ADJUDICADO	\$ 202.402.132,00
17	INTERVENTORÍA A MANTENIMIENTO DE LA FACHADA Y ÁREAS INTERNAS DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	SI-CM-017-2018	ADJUDICADO	\$ 10.628.483,00
18	INTERVENTORIA A LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARA-MANGA: PROMOCIÓN SOCIAL SEDES D Y C, CLUB UNION SEDE D, RURAL EL PAULON, MAIPORE SEDE C, JORGE ARDILA DUARTE Y AURELIO MARTÍNEZ MUTIS.	SI-CM-018-2018	ADJUDICADO	\$ 595.347.480,00
19	INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS E INSTALACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE Y JUEGOS INFANTILES, VIABILIZADOS POR EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	SI-CM-019-2018	ADJUDICADO	\$ 250.996.883,00
20	INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LOS CANELOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-020-2018	REVOCADO	\$ 118.381.973,80
21	INTERVENTORIA A LAS ADECUACIONES LOCATIVAS, REPARACIONES Y MANTENIMIETO GENERAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, INEM SEDE B, ANDRES PAEZ SOTO JOYA, AURELIO SEDE B, CLUB UNIÓN SEDE A, CLUB UNIÓN SEDE B, JUVENTUD, BOSCONIA BOLARQUI SEDE B, BOSCONIA CUCHILLA, VIJAGUAL SEDE A, SANTANDER SEDE A, POLITECNICO SEDE B, SANTA MARIA GORETTI SEDE B, JOSE CELESTINO MUTIS, AURELIO MARTINEZ MUTIS SEDE C, MAIPORE SEDE B, BICENTENARIO	SI-CM-021-2018	TRASLADO SECRETARIAL	\$ 551.524.837,50
22	INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO LA FLORA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CM-022-2018	PROYECTO DE PLIEGOS	\$ 125.916.132,00

9.3 SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

No.	OBJETO	No. PROCESO	ESTADO	VALOR TOTAL
1	ACTIVIDADES DE PODA PARA EL DESPEJE DE LUMINARIAS Y REDES QUE INTERFIERAN CON EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-SAMC-002-2018	ADJUDICADO	\$ 604.312.372,00

2	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION CERRAMIENTO Y RELLENO DE TERRENO UBICADO EN LA DIAGONAL 32 No. 33ª - 132 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-SAMC-003-2018	ADJUDICADO	\$ 355.000.192,00
3	MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO DE CONFORMIDAD CON LAS SENTENCIAS DE ACCIONES CONSTITUCIONALES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-SAMC-004-2018	ADJUDICADO	\$ 334.830.339,00
4	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PUNTOS VIVE DIGITAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	SI-SAMC-005-2018	ADJUDICADO	\$ 135.502.973,00

9.4 MINIMA CUANTIA

No.	OBJETO	No. PROCESO	ESTADO	VALOR TOTAL
1	REALIZAR UN PLAN DE INTERVENCIÓN PARA REMOVER LA CUBIERTA QUE COMPRENDE EL ALERO DE LA VIVIENDA UBICADA EN LA CARRERA 12 No 37-51 Y LA RESPECTIVA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA PARA PREVENIR EL RIESGO EN QUE SE ENCUENTRA LA COMUNIDAD QUE CIRCULA POR EL SECTOR Y CON EL PROPÓSITO DE CUMPLIR FALLO DENTRO DE LA ACCIÓN POPULAR RADICADA CON EL No 680013333009-2017-00178-00 EMANANDO DEL JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA	SI-CMC-002-2018	SE DECLARÓ DESIERTO	\$ 5.781.943,00
2	CONSULTORIA PARA DEFINIR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MOBILIARIO DEL CENTRO METROPOLITANO DE CONVENCIONES DE BUCARAMANGA NEOMUNDO-GRAN SALON	SI-CMC-003-2018	ADJUDICADO	\$ 38.080.000,00
3	SUMINISTRO DE PLANTAS ORNAMENTALES E INSUMOS AGRÍCOLAS PARA REALIZAR INTERVENCIONES DE URBANISMO TÁCTICO EN ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CMC-004-2018	ADJUDICADO	\$ 14.779.900,00
4	OBRA CIVIL EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM FASE II-PISO I PARA LA ADECUACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS REGULADA Y NORMAL	SI-CMC-005-2018	ADJUDICADO	\$ 49.996.168,00
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL CAMION CANASTA GRUA DE PLACA OSA 790 CON BRAZO ARTICULADO HIDRAULICO PROPIEDAD DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CMC-006-2018	ADJUDICADO	\$ 34.802.621,00

6	CONSULTORÍA PARA DEFINIR LA COTA DE INUNDACIÓN DEL CENTRO ZONOSIS DE VIJAGUAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CMC-008-2018	ADJUDICADO	\$ 22.276.800,00
7	COMPRVENTA DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA, TINTAS Y TONERES PARA LA OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CMC-009-2018	ADJUDICADO	\$ 15.746.116,89
8	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN CERRAMIENTO Y RELLENO DE TERRENO UBICADO EN LA DIAGONAL 32 No. 33ª - 132 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SI-CMC-010-2018	ADJUDICADO	\$ 65.577.330,00
9	REALIZAR UN PLAN DE INTERVENCIÓN PARA REMOVER LA CUBIERTA QUE COMPRENDE EL ALERO DE LA VIVIENDA UBICADA EN LA CARRERA 12 No 37-51 Y LA RESPECTIVA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA PARA PREVENIR EL RIESGO EN QUE SE ENCUENTRA LA COMUNIDAD QUE CIRCULA POR EL SECTOR Y CON EL PROPOSITO DE CUMPLIR FALLO DENTRO DE LA ACCIÓN POPULAR RADICADA CON EL No 680013333009-2017-00178-00 EMANADO DEL JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA	SI-CMC-011-2018	ADJUDICADO	\$ 44.159.897,00
10	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DE ATLETISMO LUIS ENRIQUE FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER	SI-CMC-012-2019	ADJUDICADO	\$ 66.155.135,00

10. DEFENSA JUDICIAL

Durante el periodo de Enero a Septiembre 30 de 2018, los Juzgados Administrativos y el Tribunal Administrativo de Santander han proferidos en ACCIONES POPULARES y ACCIONES DE TUTELA, fallos a favor y en contra en los procesos que cursan en los despachos judiciales de esta Secretaria de la Siguiete manera:

✓ ACCIONES POPULARES

Total procesos Notificados	16
Total procesos tramitados	153
Fallos a Favor Notificados	15
Fallos en Contra Notificados	03
Actuaciones Surtidas	203

A continuación relaciono las Acciones populares tramitadas durante el periodo (Julio a Septiembre de 2018)

PROCESO No.	JUZGADO	SENTENCIA	ORDEN JUDICIAL	ESTADO ACTUAL
2015-0177	J 12 Adtivo	FALLO A FAVOR	JUZGADO EMITE FALLO A FAVOR Sentencia 1 Instancia	FALLO A FAVOR
2011-0026	J.15°	FALLO SEGUNDA INSTANCIA A FAVOR	Tribunal revoca sentencia de primera Instancia	FALLO A FAVOR
2010-0301	J.12°	FALLO PRIMERA INSTANCIA A FAVOR	JUZGADO EMITE FALLO A FAVOR Sentencia 1 Instancia	FALLO A FAVOR

✓ ACCIONES DE TUTELA

Procesos Notificados:	18
Procesos tramitados	18
Fallos a favor	17
Fallos en contra	0
Otras actuaciones en procesos de tutela	6
Procesos pendientes de fallo	1

A continuación relaciono las Acciones de tutela tramitadas durante el periodo

PROCESO No.	JUZGADO	ACCIONANTE	ORDEN JUDICIAL	ESTADO ACTUAL
2018-0099	4o Penal Municipal F.C.	Olivo Cruz	Fallo a favor del Municipio	Archivado
2018-0112	11 Penal Municipal	Jose Héctor Cardona contra Alcalde	Fallo a Favor del Municipio	Archivado
2018-0113	8° P.M. con F.C	Jorge E. Florez	Fallo a favor del Municipio	Archivado
2018-0543	21 Civil Municipal	Marcos Grateron	Fallo a favor del Municipio	Archivado
2018-0572	3° Civil Municipal	Julio Cesar Barajas	Fallo a favor del Municipio	Archivado
2018-0112	11 Penal Municipal F.C.	Jose Héctor Cardona contra S. Infraestructura	A favor del Municipio en primera instancia	En curso
2015-0572	13 Civil Municipal	Dulfo Rojas	Respuesta Incidente D.	
2016-0112	5° P.M. con F.C.	C. R. Plaza Mayor	Respuesta Incidente D.	En curso
2015-0572	13 Civil Municipal.	<u>Dulfo Rojas Delgado</u>	Respuesta a la Procuraduría Prov.	En curso

2016-0112	15 P. M. F.C.	Conjunto R. Plaza Mayor	Respuesta Incidente D.	En curso
2015-0572	13 Civil Municipal	Dulfo Rojas Delgado	Respuesta Incidente contra Alcalde	En curso
2015-0572	13 Civil Municipal	Dulfo Rojas Delgado	Respuesta Incidente contra Sec. Infraestructura	En curso

11. INVERSION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

PROGRAMAS	INVERSION	%
ADMINISTRACION ARTICULADA Y COHERENTE	\$ 2.573.103.333,37	3
UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES	\$ 265.515.840,00	0,31
RECUPERACION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO	\$ 3.151.900.000,00	3,68
OBSERVAR Y SER OBSERVADO FOMENTO AL TURISMO	\$ 4.000.000.000,00	4,67
INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO	\$ 29.475.947.199,17	34,39
PROMOCIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS	\$ 466.793.508,00	0,54
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA	\$ 3.395.951.336,34	3,96
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL RURAL	\$ 400.000.000,00	0,47
ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL	\$ 41.902.866.245,93	48,88
SERVICIOS PUBLICOS URBANOS Y RURALES	\$ 85.800.000,00	0,10
TOTAL (1)	\$ 85.717.877.462,81	100%

12. OTROS VALORES EN LA EJECUCION

DESCRIPCION	VALOR
VALOR ACTUALIZACION REGISTROS PRESUPUESTALES – MESON DE LOS BUCAROS	\$ 2.398.740.947,54
VALOR SUBSIDIOS DE SERVICIOS PUBLICOS, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	\$ 3.354.564.065,00
TOTAL (2)	\$ 5.753.305.012,54
TOTAL INVERSION (1+2)	\$ 91.471.182.475,35
