



# **INFORME DE GESTION SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015**

## **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

**OCTUBRE DE 2015**



## **INFORME DE GESTION SEGUNDO TRIMESTRE 2015**

El presente informe resume los principales avances que la Secretaria de Infraestructura ha generado en los diferentes programas que conforman el Plan de Desarrollo 2012 – 2015 “Bucaramanga Capital Sostenible”

A continuación se detalla la gestión que ha realizado la Secretaria de Infraestructura en el Segundo trimestre de 2015.

### **1. PROGRAMA: BUCARAMANGA DINAMICA Y SALUDABLE**

#### **1.1. SUBPROGRAMA: ESCENARIOS PARA LA GENTE**

##### **Mantenimiento a Escenarios y Campos Deportivos**

<b>Contrato No.</b>	<b>objeto</b>	<b>Valor</b>	<b>Estado</b>
075 de 2015	ADECUACION CANCHA MULTIPLE BARRIO DIAMANTE I UBICADA EN LA CARRERA 30 ENTRE CALLES 103 Y 104 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 61.368.903,45	100% Ejecutado



<b>Contrato No.</b>	<b>objeto</b>	<b>Valor</b>	<b>Estado</b>
138 de 2015	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO CANCHAS DE FUTBOL DE SALON BARRIO LOS CANELOS COMUNA 8 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 238.913.581,05	100% Ejecutado

## INFORME DE GESTION 2015-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



Contrato No.	objeto	Valor	Estado
348 de 2015	REMODELACIÓN DEL ESTADIO DE ATLETISMO LA FLORA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.334.549.334,82	Porcentaje de Ejecución: 10%

Contrato No.	objeto	Valor	Estado
307 de 2015	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LAS DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 839.575.188,45	Porcentaje de Ejecución: 30%



Gualilo bajo



La Malaña

### Construcción de Gimnasios al Aire libre y Parques Infantiles

## INFORME DE GESTION 2015-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato No.	objeto	Valor	Estado
325 de 2015	CONSTRUCCION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE Y PARQUES INFANTILES FASE III EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA	\$ 1.598.976.095,64	Porcentaje de Ejecución: 70%

**Barrios:** Esperanza II, Betania etapa 12, Bucaramanga, San Pedro, Villa Rosa, Estoraques, La Feria, los Héroes, Nápoles, Toledo Plata, Transición, Ciudad Venecia, Jardines de Coaviconsá, Parque Romero, Vereda el Pedregal, Parque Giordano Bruno.



## 2. PROGRAMA: BUCARAMANGA FRENTE A LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

### 2.1. SUBPROGRAMA: CONOCIMIENTO, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO

- Muros de Contención

Contrato No.	objeto	Valor	Estado
104 de 2015	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ESTABILIZACION DEL TALUD UBICADO EN LA PARTE POSTERIOR DE LOS CONJUNTOS RESIDENCIALES PORTALES DE FONTANA ALTOS DE FONTANA Y CONDADO DE GIBRALTAR DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 182.096.426	100% Ejecutado

## INFORME DE GESTION 2015-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



Contrato No.	objeto	Valor	Estado
158 de 2015	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE PILOTES EN EL BARRIO RINCÓN DE LA PAZ DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.518.048.726,69	SE ENCUENTRAN EN TRAMITES LOS PERMISOS DE INTERVENCIÓN DEL CAUCE DE LA QUEBRADA LA IGLESIA.



Contrato No.	objeto	Valor	Estado
295 de 2015	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION PARA LA ESTABILIZACION DEL TALUD UBICADO EN LA VEREDA EL PEDEGRAL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 990.246.616,49	Porcentaje de ejecución: 40%



**PROYECTOS ADJUDICADOS Y QUE SE ENCUENTRAN POR INICIAR**

- ✓ CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION Y CONTROL DE EROSION EN DIFEERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. (BARRIO NÁPOLES Y QUINTA ESTRELLA). **Valor \$ 5.009.318.394,3**
- ✓ CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION Y CONTROL DE AMENAZA GEOTECNICA EL TALUD SUR DEL BARRIO LA FLORESTA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - OBRA FINANCIADA CON RECURSOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL. **Valor \$ 2.452.481.078,99**
- ✓ CONSTRUCCION FASE I DE OBRAS DE MITIGACION GEOTECNICA EN EL BARRIO VILLAS DE SAN IGNACIO Y COLEGIO VILLAS DE SAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. **Valor \$ 1.889.653.032,45**

**3. PROGRAMA: BUCARAMANGA CIUDAD VERDE DE AMÉRICA LATINA**

**3.1. SUBPROGRAMA: ESPACIOS PÚBLICOS SOSTENIBLES**

- **Áreas Verdes Mantenidas**

<b>Contrato No.</b>	<b>objeto</b>	<b>Valor</b>	<b>Estado</b>
396 de 2014	ADECUACION, MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DEL PARQUE DE LA VIDA, BARRIO CAMPO HERMOSO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 201.202.265,08	Se dio inicio el 04 de Noviembre de 2014 y se encuentra 100% Ejecutado en la presente vigencia

## INFORME DE GESTION 2015-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

### REGISTRO FOTOGRAFICO



Contrato No.	objeto	Valor	Estado
475 de 2014	MEJORAMIENTO DE PARQUE LOS SARRAPIOS UBICADO EN LA CALLE 46 CON CARRERA 39 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 984, 485,917.89.	Se dio inicio el 24 de Marzo de 2015. Avance de obra 50%.

### REGISTRO FOTOGRAFICO



## INFORME DE GESTION 2015-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



Contrato No.	objeto	Valor	Estado
043 de 2015	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Y EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA AUNAR ESFUERZOS EN LA CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES MANTENIMIENTO DE HÁBITAT URBANOS DESARROLLO DE LA CULTURA AMBIENTAL EN ESPACIOS PÚBLICOS MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL URBANA	\$ 3.677.652.127 Aporte Municipio: \$ 1.453.188.386 Aporte Área: \$ 2.224.463.741	En Ejecución desde el 08 de Abril de 2015

### REGISTRO FOTOGRAFICO



**PARQUE KENNEDY**

**PARQUE TEJAR NORTE**

## INFORME DE GESTION 2015-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



De acuerdo a la responsabilidad directa de esta secretaría para racionalizar y articular lo pertinente a la política pública de parques y zonas verdes urbanas según Acuerdo No.044 del 26 de Noviembre de 2013, se sigue trabajando con el Programa de la Red Protectora de Parques y haciendo seguimiento a los diferentes lineamientos de las Secretaría según su competencia.

### **Sitios Intervenidos por la red protectora de parques durante este periodo:**

Parque Candiles, Parque Cristo Rey, Parque Fontana Real, Parque Tortugas B. La Juventud, Parque Leones, Parque Conucos, Parque el Molino B. el Porvenir, Parque San Pio, Parque Turbay, Parque Canelos.



## INFORME DE GESTION 2015-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

### PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN POR INICIAR

- PODA Y CORTE DE ÁRBOLES EN PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. **\$ 506.679.300,00**
- CONSTRUCCIÓN DE JARDINES CON PLANTAS ORNAMENTALES Y EMPRADIZACION DE PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. **\$ 596.018.264,85**
- OBRAS DE EMBELLECIMIENTO PARQUE SAN PIO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. **\$ 386.255.059,54**

### Parques Construidos

Contrato No.	objeto	Valor	Estado
101 de 2015	CONSTRUCCION FASE FINAL DEL PARQUE FONTANA REAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 799.678.831,5	Avance de la obra es del 95%.

#### REGISTRO FOTOGRAFICO



Juegos Infantiles



Gimnasio al Aire Libre



Sector Mirador o Deck en madera



Siembra de Arboles

## INFORME DE GESTION 2015-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

	
Recuperación de Zonas Verdes (Prado)	Instalación de losetas de Concreto

### 3.2. SUBPROGRAMA: ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

En este subprograma se han realizado los siguientes procesos contractuales los cuales son importantes resaltar:

Contrato No.	objeto	Valor	Estado
088 de 2015	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INTERVENCION INTEGRAL DE DEMOLICION REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y HABILITACION DE INFRAESTRUCTURA MULTIFUNCIONAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA.	\$ 299.997.576	Inicio: 09 de Junio de 2015
221 de 2015	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR EL ANALISIS GEOTÉCNICO O DE ESTABILIDAD CAPACIDAD Y DISEÑO DE LLENADO DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DENOMINADO EL CARRASCO.	\$ 150.000.000	Inicio: 22 de Junio de 2015
186 de 2015	ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES DE DISEÑOS A DIFERENTES CENTROS DE SALUD Y DISEÑOS DE CENTROS DE SALUD INDICADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 878.995.800	Inicio: 14 de Julio de 2015
354 de 2015	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL DIAGNÓSTICO EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOS PARA LOS ASENTAMIENTOS CAMILO TORRES CIUDAD PERDIDA CUYAMITA LAURELES PARTE BAJA MILAGRO DE DIOS NÁPOLES CURTIEMBRE PANTANO SANTANDER	\$ 1.949.931.000	Inicio: 25 de Agosto de 2015

## INFORME DE GESTION 2015-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA


	PORTAL DE LOS ÁNGELES VILLAS DE GIRARDOT Y ZARABANDA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.		
--	--	--	--

### 4. PROGRAMA: ESPACIO PÚBLICO: DE TODAS Y TODOS PARA TODAS Y TODOS

#### 4.1. SUBPROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA GENTE

##### ✓ Vías Peatonales Construidas y Mantenidas

Contrato No.	objeto	Valor	Estado
109 de 2015	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y SARDINELES DE LA TRANSVERSAL 29 ENTRE CALLES 104 Y 105 Y TRANV 29A ENTRE CALLE 105 Y 106 BARRIO ASTURIAS MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 61.434.389,25	Porcentaje de Ejecución: 100%

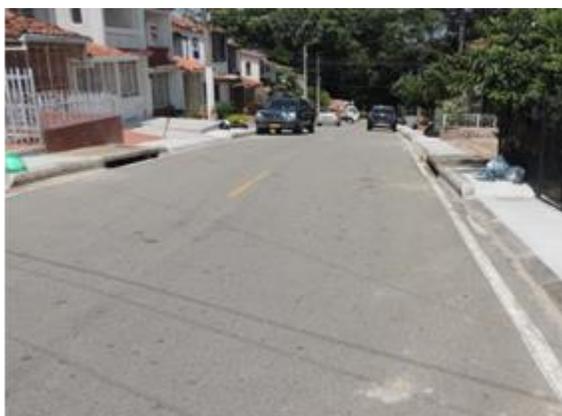

Contrato No.	objeto	Valor	Estado
203 de 2015	RECUPERACION DE ANDENES EN EL CENTRO Y EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.057.957.424,9	Porcentaje de Ejecución: 30%

Contrato No.	objeto	Valor	Estado
301 de 2015	ADECUACIÓN MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA CALLE 67 ENTRE CARRERAS 21 Y 27 COLEGIO LA SALLE BARRIO LA VICTORIA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 228'788.991,87	Porcentaje de Ejecución: 90%

## INFORME DE GESTION 2015-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



### ✓ Puente Peatonal

Contrato No.	objeto	Valor	Estado
481 de 2014	MEJORAMIENTO PUENTE PEATONAL COLGANTE SOBRE EL RÍO SURATÁ SECTOR CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 395.568.068	Porcentaje de Avance: 50% Se ha realizado la carpintería metalizada y están pendiente los concretos.

## 5. PROGRAMA: BUCARAMANGA ÁGIL Y SEGURA

### 5.1. SUBPROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA

NOMBRE COMUNA		INVERSION EJECUTADA JULIO DE 2015
COMUNA 1	(Norte)	4.472.223.678,39
COMUNA 2	(Nororiental)	854.660.018,48
COMUNA 3	(San Francisco)	5.549.507.371,71
COMUNA 4	(Occidental)	3.914.128.574,70
COMUNA 5	(Garcia Rovira)	1.986.949.939,33
COMUNA 6	(La Concordia)	2.183.587.490,19
COMUNA 7	(Real de Minas)	978.419.179,55
COMUNA 8	(Suroccidental)	359.121.837,09
COMUNA 9	(La Pedregosa)	2.747.836.538,61
COMUNA 10	(Provenza)	1.460.779.738,96
COMUNA 11	(Sur)	815.188.488,19
COMUNA 12	(Cabecera)	4.862.041.748,12

## INFORME DE GESTION 2015-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

COMUNA 13	(Oriental)	3.574.526.350,43
COMUNA 14	(Morrórico)	360.924.870,89
COMUNA 15	(Centro)	2.726.539.411,32
COMUNA 16	(Lagos del Cacique)	3.000.771.290,14
COMUNA 17	(Mutis)	2.323.006.455,35
	<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>42.170.212.981,00</b>

### PORCENTAJE DE EJECUCION Y KILOMETROS RECUPERADOS, POR EL CONTRATO 377 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2012

VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCION	VIAS REHABILITADAS EN KILOMETROS
\$ 42.712.265.156	\$ 42.170.212.981	98,73%	80,60

### REGISTRO FOTOGRAFICO



CARRERA 22A ENTRE CALLE 107 Y CALLE 109

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



CALLE 44 ENTRE CARRERA 8 Y CARRERA 9



CALLE 1N ENTRE CARRERA 21N Y CARRERA 22A



PASEO LA FERIA

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



CL 37 ENTRE CRA 14 Y CRA 15



CL 71 ENTRE CRA 29A, CRA 30 Y CRA 30A



CRA 18 ENTRE CL 70 Y CL 71

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



CARRERA 11 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 5



CRA 12 ENTRE CALLE 2N Y CALLE 3N



CARRERA 21 ENTRE CALLE 99 Y CALLE 100

## **INFORME DE GESTION 2015-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

### **5.2. SUBPROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL**

#### **MANTENIMIENTO CON MAQUINARIA DEL MUNICIPIO**

La Secretaria de Infraestructura, ha realizado mantenimiento periódico a las diferentes vías de los corregimientos 1 2 y 3, ejecutando diferentes actividades con la Maquinaria Adscrita a este Despacho manteniendo la transitabilidad en los 140 km/carril de malla vial veredal.

<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS CON MAQUINARIA Y VOLQUETAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015</b>			
<b>ABRIL DE 2015</b>			
<b>SEMANA</b>	<b>LUGAR - VEREDA - CORREGIMIENTO - URBANO (U)</b>	<b>C N °</b>	<b>ACTIVIDADES</b>
<b>ABRIL 6-10</b>	V. LA PASTORA EL ABURRIDO	<b>1</b>	Nivelación, Perfilado, Cuneteo Vía y Retiro de Derrumbes V. La Pastora-V. Aburrido
	VEREDA EL GUALILO	<b>3</b>	Limpieza y Despeje de Derrumbes
	COMANDO AMBIENTAL	<b>U</b>	Limpieza Vía de Bucaramanga
	CANCHA DE SOFBOLDEMOLICION	<b>U</b>	Demolición Caseta Cancha de Softbol
<b>ABRIL 13-17</b>	V. LA PASTORA EL ABURRIDO RAMAL CURVA DE LA MORA	<b>1</b>	Nivelación, Perfilado, Cuneteo Vía y Retiro de Derrumbes V. La Pastora-V. Aburrido
	VEREDA EL GUALILO	<b>3</b>	Limpieza y Despeje de Derrumbes
	COMANDO AMBIENTAL	<b>U</b>	Limpieza Vía de Bucaramanga
	CANCHA DE SOFBOLDEMOLICION	<b>U</b>	Demolición Caseta Cancha de Softbol
<b>ABRIL 20-24</b>	V. LA PASTORA -EL ABURRIDO- RAMAL CURVA DE LA MORA	<b>1</b>	Nivelación, Perfilado, Cuneteo Vía y Retiro de Derrumbes V. La Pastora-V. Aburrido
	LA VIRGEN TIBURONES-ICBF NORTE	<b>U</b>	Retiro de material sobre andenes y vías
	VEREDA MAGUEYES	<b>2</b>	Nivelación, Perfilado, Cuneteo Vía y Retiro de Derrumbes
	V. GUALILO- SAN JOSE- LEONES	<b>3</b>	Limpieza y Despeje Derrumbes

## INFORME DE GESTION 2015-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

<b>ABRIL</b> 27-30	RAMAL EL PRADO	1	Nivelación, Perfilado, Cuneteo Vía y Retiro de Derrumbes.
	VEREDA MAGUEYES	2	Nivelación, Perfilado, Cuneteo Vía y Retiro de Derrumbes
	V. CUCHILLA ALTA	2	Retiro de derrumbes
	RAMAL LOS LEONES	3	Limpieza y Despeje Derrumbes
	COMANDO AMBIENTAL	U	Limpieza Vía de Bucaramanga. Martha de Gómez
<b>MAYO DE 2015</b>			
<b>MAYO</b> 4-8	V. SAN PEDRO BAJO - RAMALES	1	Nivelación, Perfilado, Cuneteo Vía y Retiro de Derrumbes, Cargador varado desde martes
	V. MAGUEYES	2	Nivelación, Perfilado, Cuneteo Vía y Retiro de Derrumbes
	V. BOLARQUI ALTO	2	Nivelación, Perfilado, Cuneteo Vía y Retiro de Derrumbes
	V. EL PRADO	1	Nivelación, Perfilado, Cuneteo Vía y Retiro de Derrumbes.
	CAMANDO AMBIENTAL	U	Retiro de material de Inservibles
<b>MAYO</b> 11-15	V. SAN PEDRO BAJO - SAN PEDRO ALTO - MIRAMAR	1	Nivelación, Perfilado, Cuneteo Vía y Retiro de Derrumbes.
	V. LOS SANTOS	2	Nivelación, Perfilado, Cuneteo Vía y Retiro de Derrumbes.
	V. BOLARQUI ALTO, VEREDA MONSERRATE	2	Nivelación, Perfilado, Cuneteo Vía y Retiro de Derrumbes.
	COMANDO AMBIENTAL, CENTRO CULTURAL DEL ORIENTE	U	Retiro de material de Inservibles
<b>MAYO</b> 19-23	V. EL PRADO Y TRAVESIA SAN PEDRO ALTO - YEE SANTA RITA	1	Ampliación, Nivelación, Perfilado, Cuneteo y Afirmado de Vías Internas
	V. LOS SANTOS	2	Ampliación, Nivelación, Perfilado y Cuneteo
	V. MAGUEYES - V. CAPILLA	2	Ampliación, Nivelación, Perfilado y Cuneteo
	COMANDO AMBIENTAL	U	Recolección de inservibles
<b>MAYO</b> 26-30	TRAVESIA SAN PEDRO ALTO - YEE SANTA RITA- YEE LOS SANTOS - YEE CAPILLA	1	Ampliación, Nivelación, Perfilado, Cuneteo y Afirmado de Vías Internas
	V. MAGUEYES	1	Ampliación, Nivelación, Perfilado, Cuneteo y Afirmado de Vías Internas
	V. PALMAS, V. BOLARQUI BAJO	2	Ampliación, Nivelación, Perfilado, Cuneteo y Afirmado de Vías Internas

## INFORME DE GESTION 2015-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

	V. GUALILO ALTO, V. SANTA BARBARA	3	Ampliación, Nivelación, Perfilado, Cuneteo y Afirmado de Vías Internas
	V. EL ABURRIDO ALTO	1	Ampliación, Nivelación, Perfilado, Cuneteo y Afirmado de Vías Internas
	<b>JUNIO DE 2015</b>		
<b>JUNIO 1-5</b>	V. SAN PEDRO ALTO, V. EL PRADO	1	Ampliación, Nivelación, Perfilado, Cuneteo y Afirmado de Vías Internas
	V. LOS SANTOS, RAMALES	2	Ampliación, Nivelación, Perfilado, Cuneteo y Afirmado de Vías Internas
	COMANDO AMBIENTAL	U	Recolección de inservibles
	LOTE BOCA PRADERA	U	Limpieza Lote Boca Pradera
<b>JUNIO 8-12</b>	TTALLER MUNICIPAL	-	Sin Combustible
<b>JUNIO 16-20</b>	LOTE BOCA PRADERA	U	Limpieza de Lote
	V. EL PRADO	1	Ampliación, Nivelación, Perfilado, Cuneteo y Afirmado de Vías Internas
	TRAVESIA LOS SANTOS-CAPILLA ALTA	2	Ampliación, Nivelación, Perfilado, Cuneteo y Afirmado de Vías Internas
	INVENTARIOS	U	Recolección de Inservibles de Inventarios
	COMANDO AMBIENTAL	U	Recolección de Inservibles
<b>JUNIO 22-26</b>	V. SAN CAYETANO	1	Ampliación, Nivelación, Perfilado, Cuneteo y Afirmado de Vías Internas
	V. SAN IGNACIO	1	Ampliación, Nivelación, Perfilado, Cuneteo y Afirmado de Vías Internas
	V. CUCHILLA ALTA	2	Cuneteo y Derrumbes de Vías Internas.
<b>JUNIO 30- JULIO 3</b>	V. MIRAMAR, V. SAN CAYETANO	1	Ampliación, Nivelación, Perfilado, Cuneteo y Afirmado de Vías Interna
	V. EL PRADO	1	Ampliación, Nivelación, Perfilado, Cuneteo y Afirmado de Vías Internas
	INVENTARIOS	U	Recolección de Inservibles
	V. SAN IGNACIO	1	Ampliación, Nivelación, Perfilado, Cuneteo y Afirmado de Vías Interna
	V. CUCHILLA ALTA	2	Ampliación, Nivelación, Perfilado, Cuneteo y Afirmado de Vías Interna

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



El Aburrido Alto –Ramal El Inicio – Ramal Curva de la Mora. Mantenimiento General



Ramal Vijagual Parte Baja



Travesía Santa Rita – San Cayetano. Destape de vía por derrumbes y Mantenimiento

## INFORME DE GESTION 2015-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato No.	objeto	Valor	Estado
206 de 2015	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO SECTOR LA ENTRADA DE LA VÍA VEREDA SANTA BÁRBARA DEL CORREGIMIENTO 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 107.999.774,37	Porcentaje de Avance: 100%



### 5.3. SUBPROGRAMA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

- **CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE LA CARRERA 27 CON AVENIDA QUEBRADASECA**

No. Contrato	Objeto	Valor	Estado
272 de 2014	CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL MESÓN DE LOS BÚCAROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	\$ 54.909.500.000	En Ejecución
279 de 2014	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL MESÓN DE LOS BÚCAROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	\$ 3.584.516.000	Ejecución



## INFORME DE GESTION 2015-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

- CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR DEL MUTIS**

No. Contrato	Objeto	Valor	Estado
365 de 2014	CONSTRUCCIÓN INTERCAMBIADOR DEL MUTIS. CONEXIÓN VIAL DESARROLLADA ENTRE EL ESTRIBO SUR DEL VIADUCTO LA NOVENA Y LA CARRERA 2W DEL BARRIO MUTIS.	\$ 18.413.084.169,58	En Ejecución Avance Obra: 80%
313 de 2014	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERCAMBIADOR DEL MUTIS. CONEXIÓN VIAL DESARROLLADA ENTRE EL ESTRIBO SUR DEL VIADUCTO LA NOVENA Y LA CARRERA 2W DEL BARRIO MUTIS	\$ 1.267.779.950	Ejecución



- OPTIMIZACIÓN DEL CORREDOR PRIMARIO ENTRE BUCARAMANGA Y FLORIDABLANCA EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL PUENTE PROVENZA Y EL INTERCAMBIADOR DE TRÁFICO PUERTA DEL SOL**

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	INVERSION (MILLONES)	% EJECUCION
<b>TERCER CARRIL</b>	<b>\$ 156.123*</b>	<b>17%</b>

Nota: \* Departamento \$ 93.013 Municipio \$ 63.110 (Predios + Interventoría)



## INFORME DE GESTION 2015-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

- CONSTRUCCION FASE 1 CENTRO DE CONVENCIONES**

No. Contrato	Objeto	Valor	Estado
384 de 2014	CONSTRUCCION FASE I "OBRAS GERENCIALES Y ESTRUCTURALES GRAN SALON DEL CENTRO DE CONVENCIONES NEOMUNDO BUCARAMANGA.	\$ 18.775.798.070,94	En Ejecución Avance Obra: 60%
376 de 2014	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES FASE I DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 1.276.799.902	Ejecución



- CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INTERCAMBIADOR VIAL AVENIDA QUEBRADASECA CON CARRERA 15**

No. Contrato	Objeto	Valor	Estado
022 de 2015	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INTERCAMBIADOR VIAL AVENIDA QUEBRADASECA CON CARRERA 15 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	\$ 45.317.679.804,61	En Ejecución Avance Obra: 47%, puentes: 60%
023 de 2015	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INTERCAMBIADOR VIAL AVENIDA QUEBRADASECA CON CARRERA 15 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.599.977.600	Ejecución



**6. PROGRAMA: PLAZAS DE MERCADO Y SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES**

**6.1. SUBPROGRAMA: SERVICIOS PÚBLICOS AMIGABLES**

**1. MODERNIZACIÓN Y EXPANSION EN PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS**

No. Contrato	Objeto	Valor	Estado
216 de 2015	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO SANTANDER.	\$ 297.625.460	Porcentaje de ejecución: 30%



## INFORME DE GESTION 2015-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

No. Contrato	Objeto	Valor	Estado
175 de 2015	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL BARRIO ESTORAQUES I Y II	\$ 832.803.416	Porcentaje de ejecución: 50%



No. Contrato	Objeto	Valor	Estado
072 de 2015	MODERNIZACION Y EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BARRIO LOS HEROES.	\$ 190.574.630,00	Porcentaje de ejecución: 100%



No. Contrato	Objeto	Valor	Estado
159 de 2015	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE DE LOS NIÑOS.	\$ 2.028.313.440	Porcentaje de ejecución: 70%

## INFORME DE GESTION 2015-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



No. Contrato	Objeto	Valor	Estado
166 de 2015	CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CANCHA MULTIPLE Y CAMBIO DE TODA LA ILUMINACIÓN A TECNOLOGÍA LED EN EL BARRIO PASEO LA FERIA II.	\$ 599.861.145	Porcentaje de ejecución: 50%



### 2. CONSTRUCCION Y/O MODERNIZACIÓN DEL AP EN LED EN BARRIOS

No. Contrato	Objeto	Valor	Estado
327 de 2015	CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN TECNOLOGÍA LED EN LA URBANIZACIÓN CAMPO MADRID.	\$ 1.060.331.680	Porcentaje de ejecución: 20%

## INFORME DE GESTION 2015-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



No. Contrato	Objeto	Valor	Estado
371 de 2015	CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN TECNOLOGÍA LED EN LA URBANIZACIÓN INMACULADA.	\$ 553.821.633	Porcentaje de ejecución: 20%



No. Contrato	Objeto	Valor	Estado
314 de 2015	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN TECNOLOGÍA LED CON TELEMEDIDA EN EL BARRIO CIUDAD BOLIVAR – ETAPA 1.	\$ 1.088.160.604	Porcentaje de ejecución: 30%

## INFORME DE GESTION 2015-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



### 3. PROYECTOS VIA LED CON TELEGESTION

No. Contrato	Objeto	Valor	Estado
197 de 2015	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO A TECNOLOGÍA LED, COMPLEMENTADO CON SISTEMA DE TELEGESTIÓN EN LA CARRERA 27 DESDE LA AVENIDA QUEBRADA SECA HASTA LA CALLE 60.	\$ 1'188.848.728	Porcentaje de ejecución: 70%



### 4. MODERNIZACION Y/O EXPANSION EN LA ZONA URBANA Y RURAL

No. Contrato	Objeto	Valor	Estado
400 de 2015	EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES SECTORES DE LA ZONA URBANA.	\$ 1.775.221.593	Porcentaje de ejecución: 0%

## INFORME DE GESTION 2015-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

### SECTORES A INTEVENIR


- ❖ Parque Los Pinos
- ❖ Parques del Barrio Álvarez
- ❖ Cancha Múltiple El Hoyo y Ecogymnasio Barrio Villa Helena
- ❖ Cancha de Fútbol y Múltiple Barrio Nápoles
- ❖ Barrio Quinta Estrella

No. Contrato	Objeto	Valor	Estado
400 de 2015	EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES SECTORES DE LA ZONA URBANA.	\$ 1.775.221.593	Porcentaje de ejecución: 0%

### SECTORES A INTEVENIR

- ❖ Corregimiento 1
- ❖ Corregimiento 2
- ❖ Corregimiento 3

#### • MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO

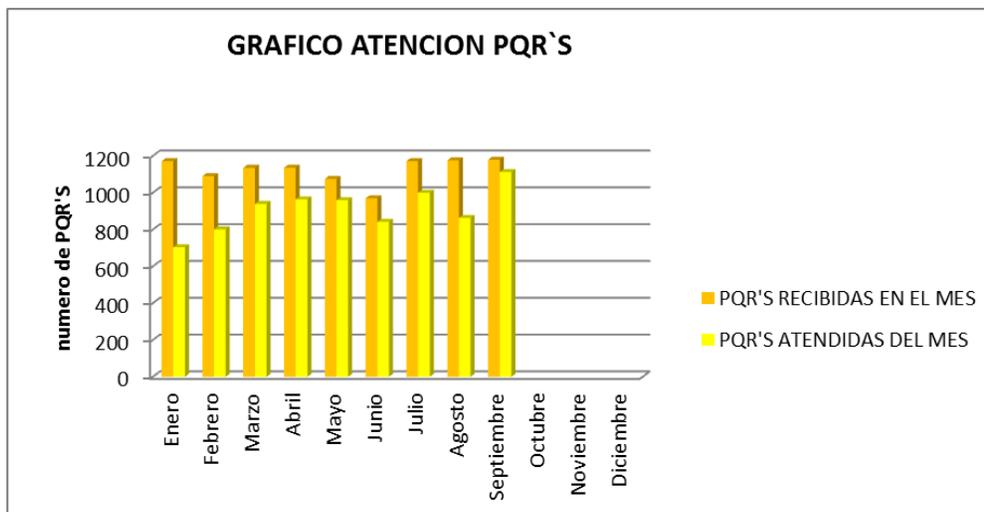

### 5. SERVICIOS PUBLICOS SECTOR RURAL

## INFORME DE GESTION 2015-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

No. Contrato	Objeto	Valor	Estado
297 de 2015	RECONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS VEREDALES DE LOS CORREGIMIENTOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA AFECTADOS POR LA OLA INVERNAL 2010-2011.	\$ 3.619.163.382,84	Porcentaje de ejecución: 24%



**Vereda Rosa Blanca**



**Vereda Gualilo**

**Vereda San Cayetano**

No. Contrato	Objeto	Valor	Estado
413 de 2015	CONSTRUCCION DE POZOS SEPTICOS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 856,640,965	En Ejecución.

## INFORME DE GESTION 2015-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



### 7. PROGRAMA: PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CIUDADANA

#### 7.1. SUBPROGRAMA: OBRAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Contrato No.	objeto	Valor	Estado
032 de 2015	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS DIFERENTES COMUNAS Y CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 4.999.887.086,1 ADICIONAL \$ \$ 699'997.121	Porcentaje de ejecución: 90%



Contrato No.	objeto	Valor	Estado
073 de 2015	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES EN EL SALON COMUNAL DEL BARRIO DIAMANTE I DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 57.587.419,8	Ejecutado 100%

## INFORME DE GESTION 2015-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



Contrato No.	objeto	Valor	Estado
340 de 2015	ELABORACION MANTENIMIENTO JUEGOS INFANTILES Y GIMNASIOS AL AIRE LIBRE Y ELABORACION E INSTALACION DE ECO - GIMNASIOS EN VARIAS COMUNAS Y VEREDAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 639.018.723,48	Porcentaje de ejecución: 70%



### ✓ OTROS PROYECTOS QUE REALIZA LA SECRETARIA

Contrato No.	objeto	Valor	Estado
045 de 2015	ADECUACIÓN REPARACIONES LOCATIVAS Y MOBILIARIO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	\$ 998.971.197,48	Ejecutado 100%

## INFORME DE GESTION 2015-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



Contrato No.	objeto	Valor	Estado
071 de 2015	CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL LOCALIZADO EN LA CALLE 42 CON CARRERA 13 ESQUINA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 188.165.024,24	Inicio: 27 de abril de 2015

	
Pisos, iluminación y ventanales instalados en el sector de Salones de Archivo	Estado Actual Fachada Interior

Contrato No.	objeto	Valor	Estado
313 de 2015	CONSTRUCCIÓN DE REDES PLUVIALES Y SISTEMA DE COLECTORES EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 695.520.214,96	Porcentaje de Avance: 10%

## INFORME DE GESTION 2015-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato No.	objeto	Valor	Estado
296 de 2015	ADECUACION DE TRES HOGARES INFANTILES EL TRENCITO ACOMUNAL ZONA 4 Y DOMINGO SABIO PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 536.273.840,97	Porcentaje de Avance: 30%



### 8. ACCIONES POPULARES

Durante el periodo de Abril a Junio de 2015, los Juzgados Administrativos y el Tribunal Administrativo de Santander han proferidos en ACCIONES POPULARES y ACCIONES DE TUTELA, fallos a favor y en contra en los procesos que cursan en los despachos judiciales de esta Secretaria de la siguiente manera:

**Fallos de acciones populares a favor : 3**

**Fallos de acciones populares en contra : 3**

PROCESO No.	JUZGADO	SENTENCIA	ORDEN JUDICIAL	ESTADO ACTUAL
2010-0148	5° Descong.	A favor	Se emitió fallo a favor del Municipio	Archivado
2010-0311	5° Descong.	A favor	Se emitió fallo a favor del Municipio	Archivado
2008-0169	TAS Descong.	En Contra	Construir muro de Contencion en la Calle 14 No. 40-30 B. Morrórico	Pendiente para apropiar recursos para ejecutar
2008-0194	TAS Descong.	En contra	Inventario de postes que invaden el espacio publico y reubicarlos	Se esta elaborando el inventario
2010-0364	10 Administrativo	En contra	Andenes sin continuidad en la Cra. 63 No. 32-76	Fallo Cumplido
2010-0187	9° Administrativo	Fallo a favor	Fallo a favor del Municipio	Archivado

## INFORME DE GESTION 2015-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Durante el periodo mencionado se recibieron diecisiete (7) acciones de tutela, las cuales se tramitaron en su totalidad y fueron falladas como se señala a continuación:

**Fallos de Acciones de Tutela a favor : 7**  
**Fallos de Acciones de Tutela en contra : 0**

PROCESO No.	JUZGADO	DECISION	ORDEN JUDICIAL	ESTADO ACTUAL
2015-0574	Consejo Seccional	Fallo a favor	Se denegó la acción	Archivado
2015-0118	Tercero Civil Mpal.	Fallo a favor	Se negó la acción	Archivado
2015-0117	Tercero Civil Mpal.	Fallo a favor	Se negó la acción	
2015-0118	Once Civil Mpal.	Fallo a favor	El fallo fue en contra de la Dirección de Transito	Archivado
2015-0077	12 PM. Con F.C.G.	A favor	Se denegó por improcedente	Archivado
2015-0092	6° Penal Municipal	A favor	Se denegó por improcedente	Archivado
2015-0067	13 P.M. con F.C.G.	A favor	Se denegó por improcedente	Archivado

### 9. ROTURAS

Dando cumplimiento a la normatividad vigente para las licencias de intervención y ocupación del espacio público en lo relacionado con redes de servicios públicos y/o de particulares, la secretaria de infraestructura relaciona las actividades desarrolladas de Abril a Junio de 2015.

A continuación se presenta las diferentes intervenciones en el Espacio Público

INTERVENCIONES EN EL ESPACIO PUBLICO EN LO RELACIONADO CON REDES DE SERVICIOS PUBLICOS				
Abril a Junio de 2015	Domiciliarias	Edificios obra nueva	Redes	Total M2
<b>amb</b>	207,12	501,35	459,50	1.167,97
<b>EMPAS</b>	51,89	230,92	1.647,93	1.930,74
<b>GASORIENTE</b>	70,95	248,00	19,50	338,45
<b>ESSA</b>		457,99	7,47	465,46
<b>CLARO COLOMBIA</b>			94,47	94,47
<b>METROLINEA</b>			1,00	1,00
<b>ETB</b>			16,72	16,72
<b>LAZUS</b>			28,14	28,14
<b>TOTAL</b>	<b>329,96</b>	<b>1.438,26</b>	<b>2.274,73</b>	<b>4.042,95</b>

## INFORME DE GESTION 2015-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

---

### 10. INVERSION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A 30 DE JUNIO - 2015

SUBPROGRAMAS	INVERSION	%
Escenarios para la Gente	\$ 965.124.000	0,46
Conocimiento, Prevención y Reducción del Riesgo	\$ 3.177.274.000	1,50
Espacios Públicos Sostenibles	\$ 2.634.431.000	1,25
Ordenamiento del Territorio	\$ 32.188.288.000	15,23
Construcción y/o Mantenimiento de Espacios Públicos	\$ 1.160.560.000	0,55
Construcción y Mantenimiento de la Malla Vial Urbana	\$ 11.542.515.000	5,46
Construcción y Mantenimiento de la Malla Vial Rural	\$ 424.682.000	0,20
Construcción de Obras de Infraestructura Vial	\$ 117.235.881.000	55,49
Construcción y Mantenimiento de Plazas de Mercado	\$ 213.608.000	0,10
Servicios Públicos Amigables	\$ 15.313.348.000	7,25
Obras con Participación Ciudadana	\$ 26.423.526.000	12,51
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 211.279.238.000</b>	<b>100%</b>

