



PRIMER INFORME DE GESTION 2014

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ABRIL DE 2014



INFORME DE GESTION 2014

El presente informe resume los principales avances que generó la Secretaría de Infraestructura en los diferentes programas, teniendo en cuenta las metas programadas en el Plan de Desarrollo 2012 -2015 “Bucaramanga Capital Sostenible.

A continuación se detalla la gestión que realizó la Secretaría de Infraestructura en el segundo semestre del año 2013 y la gestión que ha realizado durante la presente vigencia.

1. PROGRAMA: BUCARAMANGA DINAMICA Y SALUDABLE

1.1. SUBPROGRAMA: ESCENARIOS PARA LA GENTE

- **Mantenimiento a Escenarios Deportivos Recreativos**

Contrato No.	objeto	Contratista	Valor	Estado
533 de 2013	Mantenimiento y Remodelación de escenarios deportivos fase II del Municipio de Bucaramanga.	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS	\$ 3.193.141.135,5	En Ejecución

Se ha continuado ejecutando los trabajos en cumplimiento del objeto contractual el cual se encuentran incluidas la intervención a 70 canchas aproximadamente, a continuación las imágenes que corresponden a algunos de los sitios a intervenir:

		
BARRIO VILLAROSA	BARRIO VILLA HELENA	BARRIO CIUDAD BOLIVAR


INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

- Mantenimiento a Escenarios Deportivos Alto Rendimiento**

Contrato No.	objeto	Contratista	Valor	Estado
169 de 2013	Mejoramiento y Mantenimiento velódromo Alfonso Flórez en el Municipio de Bucaramanga	EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL	\$ 482.375.452,07	Liquidado



Contrato No.	objeto	Contratista	Valor	Estado
388 de 2013	Recuperación y Remodelación del Patinodromo Roberto García Peña del Municipio de Bucaramanga	CONSORCIO BUCARAMANGA 2013	\$ 999.944.634,99	Liquidado

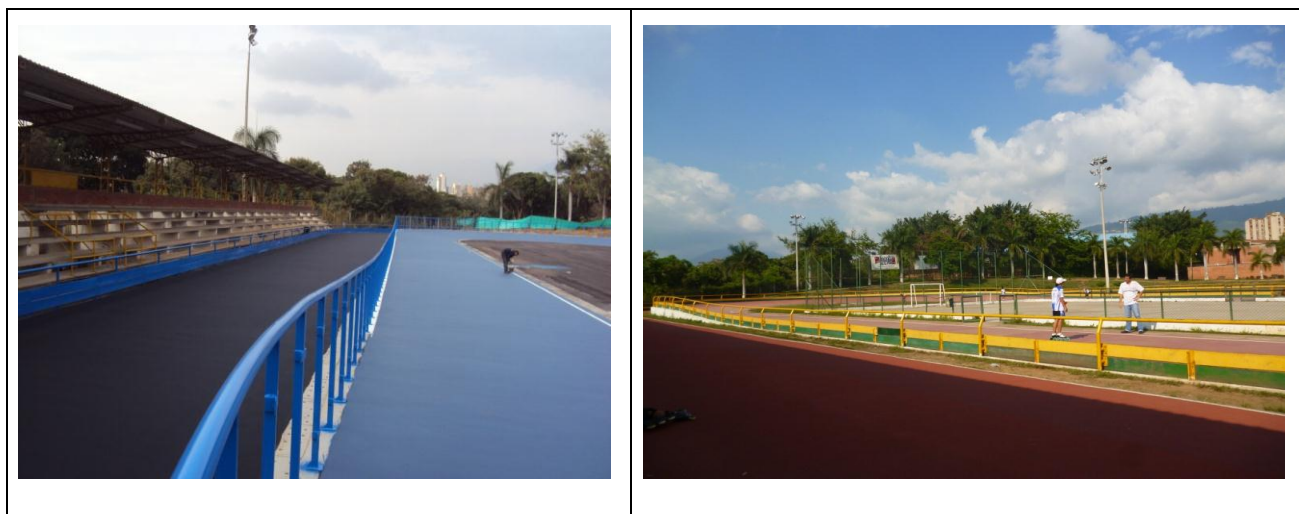

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	LOGRO 2012	LOGRO 2013	META 2014
BUCARAMANGA DINAMICA Y SALUDABLE	Número de obras de mantenimiento realizados a escenarios y campos deportivos.	151	59	104	58
	Número de obras de mantenimiento realizados a parques recreativos.	14	32	3	4
	Número de canchas sintéticas construidas en el municipio.	4	0	2	2

2. PROGRAMA: BUCARAMANGA FRENTE A LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

2.1. SUBPROGRAMA: CONOCIMIENTO, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO

- Convenios – Unidad Nacional de Gestión del Riesgo – Obras de Estabilización en la Escarpa

Contrato No.	objeto	Contratista	Valor	Estado
381 de 2013	Construcción Fase I de obras de Estabilización en sectores con amenaza de fenómenos de remoción en masa de la Comuna 14 Barrio Buenos Aires, la Malaña y Miraflores parte alta en el Municipio de Bucaramanga	MANUEL GUILLERMO CAMACHO CARVAJAL	\$ 6.999.637.086,26	Liquidado

A continuación registro fotográfico de los trabajos adelantados en cada uno de los Barrios:

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



La Malaña vía a Cúcuta-



Buenos aires



Miraflores parte alta

- ✓ Durante la presente vigencia se firmó convenio con **Unidad Nacional de Gestión del Riesgo** Fase II para la CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE SECTORES POR AMENAZA DE REMOCION EN MASA COMUNA 14 BARRIO MORORICO, VEGAS DE MORRORICO, BUENOS AIRES PARTE ALTA, ALBANIA, MIRAFLOREZ PARTE BAJA. Por valor de \$ **9.455.716.440**, el cual estará próximo a ejecutarse.

• **Obras de Estabilización en la Escarpa – Recursos Propios del Municipio**

Contrato No.	objeto	Contratista	Valor	Estado
395 de 2013	Construcción obras de Estabilización para los Barrios Villarosa el Porvenir Pan de Azúcar y Nápoles del Municipio de Bucaramanga	CIMECEL S.A.S.	\$ 3.103.925.484,22	En Ejecución

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MURO VILLAROSA	MURO BARRIO PORVENIR
	
CONSTRCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES EN LAS ZONAS AFECTADAS POR INESTABILIDAD Y MOVIMIENTOS EN MASA.	

Contrato No.	objeto	Contratista	Valor	Estado
494 de 2013	Construcción muro de contención en el sector de la Calle 14 No 50-112 en el Barrio Morrórico-Limoncito del Municipio de Bucaramanga.	CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA	\$ 657.590.713	En Ejecución



INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato No.	objeto	Contratista	Valor	Estado
587 de 2013	Construcción de muro de contención para realizar las obras de estabilización en los Barrios Morrorrico la Juventud y Buenos Aires del Municipio de Bucaramanga	CONSORCIO MUROS BUCARAMANGA	\$ 410.136.283,6	En Ejecución




Contrato No.	objeto	Contratista	Valor	Estado
471 de 2013	Construcción de obras de estabilización Barrió Miraflores sector ubicado en la calle 22 con carrera 21 parte baja en el Municipio de Bucaramanga.	UNION TEMPORAL MIRAFLORES BUCARAMANGA	\$ 464.567.456,7	En Ejecución



INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato No.	objeto	Contratista	Valor	Estado
742 de 2013	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO UBICADO EN LA CARRERA 33 CON CALLE 103-10 EN CUMPLIMIENTO ACCION POPULAR No. 2010-0190 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	CONSORCIO LA PEDREGOSA	\$ \$401.550.809.,06	En Ejecución

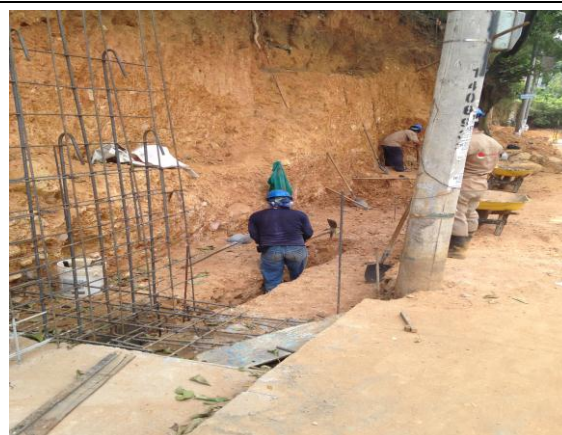

CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	LOGRO 2012	LOGRO 2013	META 2014
BUCARAMANGA FRENTE A LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO	Número de obras de mitigación realizadas en comunas que presenten situación de riesgo de desastre.	12	17	4	3
	Número de obras de mitigación realizadas en comunas que presenten situación de riesgo de desastre.	8	3	11	2

3. PROGRAMA: BUCARAMANGA CIUDAD VERDE DE AMÉRICA LATINA

3.1. SUBPROGRAMA: ESPACIOS PÚBLICOS SOSTENIBLES

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

- Áreas Verdes Mantenidas


Contrato No.	Objeto	Contratista	Valor	Estado
017 de 2013	Empradizacion del parque san pio del municipio de Bucaramanga.	JOHANY ALBERTO RAMÍREZ OTERO	\$ 48.034.350	En proceso de Liquidación

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES

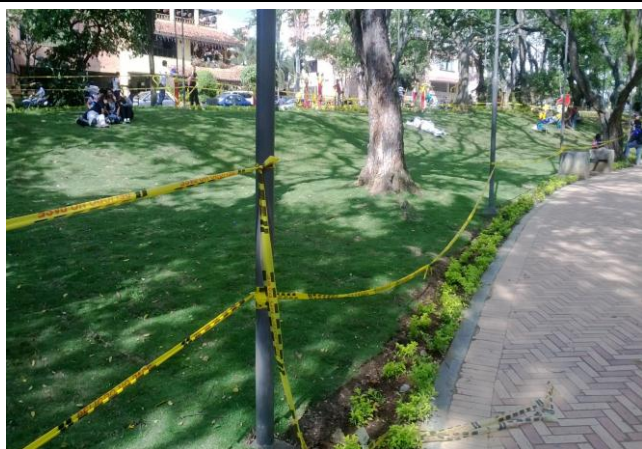

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA


Contrato No.	Objeto	Contratista	Valor	Estado
053 de 2013	Convenio Interadministrativo entre el área metropolitana de Bucaramanga y el municipio de Bucaramanga para aunar esfuerzos en el aumento mejoramiento y cualificación del espacio público parques y zonas verdes.	AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	\$ 772.492.060	En Proceso de Liquidación

SITIOS INTERVENIDOS				
Parque ubicado en el Sector Betania	Parque de la Virgen Barrio Villa Rosa	Parque del Kennedy	Parque ubicado en el sector de Villa Rosa	Parque de Villas de San Ignacio
Parque y cancha Tejar Norte 2	Polideportivo Villa Rosa Cancha Cosmos	Parque Ubicado Barrio San Cristóbal	Parque Plaza Banderas	Caballo Bolívar
Zona verde diagonal al SENA	Parque Cristo Rey	Parque San Francisco	Parque San cayetano B	Parque Ubicado En El Barrio Santander Carrera 7 Occ Con Calle 28
Parque Ubicado En El Barrio Santander Carrera 4 Occ Con Calle 31	Parque Girardot, Parque La Joya	CAMINODROMO La Joya	Parque La Vida	Parque Los Periodistas
Las 3 B	Zona Verde Carrera 15 Con Calle 47	Parque La Concordia	Motos (Regueros Peralta)	Parque Marcelino Gilibert La Salle
Parque Salle	Parque Corona	Parque Al Lado Del Salón Comunal Ceiba	Parque Guayacanes Ciudad Bolívar	Parque Cigarras
Parque Canelos	Parque Asturias	Diamante I	Parque San Martín	Parque Ubicado En La Urbanización Sol I Y Sol II
Parque Diamante II	Parque San Luis Carrera 17e Con Calle 89	Parque San Luis Carrera 17b Con Calle 89 ^a	Parque Fontana	Caminodromo La 22 De Provenza
Parque el Porvenir Calle 104B con Cra 7 ^a	Parque El Porvenir Cll 104c Con Cra 8	Parque Coaviconsa	Parque Las Hormigas	Zona Verde Coomeva
Zona Verde Frente Funeraria Los Olivos	Zona Verde Al Lado Oftalmológica			
Parques:	Solón Wilches,	Turbay	Benjamín Herrera	Parque La Loma
Parque San Pio	Parque Pan De Azúcar	Parque Terrazas	Parque Las Palmas	Parque Divino Niño
Parque Uribe Uribe/ Sarrapios	Parque La Papaya	Zona Verde Club Unión	Parque Leones	Parque Giordano Bruno
Parque Cerca A Giordano Bruno	Parque La Floresta	Parque Bolívar	Parque Los Niños	Parque Antonia Santos
Parque Álvarez	Parque La Virgen Barrio Álvarez	Parque Álvarez	Parque Los Pinos	Parque Centenario
Parque Romero	Parque -Unitransa-Las Flores	Parque García Rovira	Parque Santander	Parque Altos Del Cacique
Parque Los Estoraques I	Parque Los Estoraques II	Parque Las Ardillas Mutis	Parque Bruno Batello	Parque Ecológico Mutis
Parque Los Héroes.				

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

A continuación registro fotográfico de algunos sitios intervenidos y mencionados anteriormente:

Parque San Pio

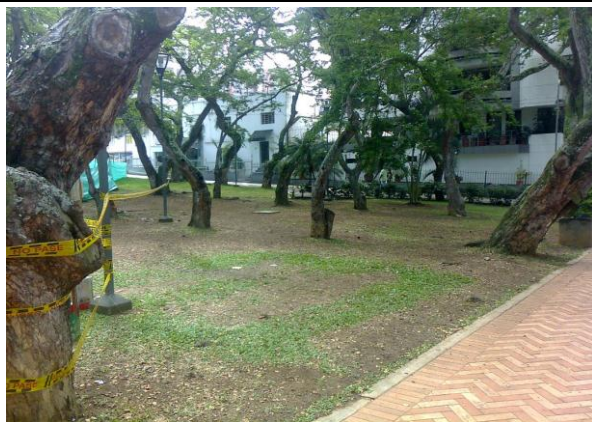

Se realizó limpieza diariamente por parte del Parquero asignado a dicho Parque.

Parque Las Palmas



Se realizó limpieza diariamente por parte del Parquero asignado a dicho Parque.

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Parque Leones




Se realizó limpieza diariamente por parte del Parquero asignado a dicho Parque.

Parque Turbay



Se realizó limpieza diariamente por parte del Parquero asignado a dicho Parque.

Parque de los Periodistas



Se realizó limpieza diariamente por parte del Parquero asignado a dicho Parque.

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Parque Santander



Se realizó limpieza diariamente por parte del Parquero asignado a dicho Parque.

Parque García Rovira



Se realizó limpieza diariamente por parte del Parquero asignado a dicho Parque.

Contrato No.	Objeto	Contratista	Valor	Estado
224 de 2013	Poda y corte de árboles en Parques y zonas verdes del Municipio de Bucaramanga y rocería sobre los bordillos de los corredores viales.	CONSORCIO EMBELLECEER VERDE	\$ 631.683.684,00	Se encuentra en ejecución

A continuación registro fotográfico de algunas intervenciones realizadas en cumplimiento del objeto contractual:

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Podas de Arboles:

Poda y Rocería - Colegio - Puesto de Salud - Cancha de Microfútbol



ANTES



DESPUES

Barrio la Esperanza



ANTES



DESPUES

Poda frente a la cancha de la contraloría



ANTES



DESPUES

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Despeje de líneas eléctricas y luminarias en el barrio Kennedy



ANTES



DESPUES

Poda de árboles rincón de los caballeros



ANTES



DESPUES

Hacienda San Juan (cra 57 entre calles 85 y 92 polideportivo.)



INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ANTES	DESPUES
Parque Extremo	
	
ANTES	DESPUES

Campo Hermoso (Calle 45)	
	
ANTES	DESPUES

Campo Hermoso (Calle 45)	
	

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ANTES	DESPUES
-------	---------

Contrato No.	Objeto	Contratista	Valor	Estado
263 de 2013	Reposición de andenes, instalación de bordillos, conformación de las zonas verdes, poda descope y limpieza del componente arbóreo del parque Centenario del Municipio de Bucaramanga.	UNION TEMPORAL PAISAJISMO URBANO DE BUCARAMANGA	\$525.518.285	Se encuentra en ejecución, avance de obra del 55%

Nota: Se suspendió el: 15 de Octubre de 2013 y Reinicio en el mes de febrero de 2014.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Movimiento de Tierra



Empradización e Instalación de Jardines



Construcción de Bordillos

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato No.	Objeto	Contratista	Valor	Estado
326 de 2013	Compra de canecas para basura en fibra de vidrio para parques y zonas verdes del Municipio de Bucaramanga.	CONSTRUCTORA INSTITUCIONAL DEL ORIENTE S.A.S	\$58.024.357	Liquidado

Sitios Intervenido: Parque Santander, Parque Custodio García Rovira, Parque Leones, Parque Palmas, Parque Solón Wilches, Parque Conucos, Parque Benjamín Herrera, Parque Turbay, Parque San Francisco, Parque San Pio, Caminodromo Fontana, Parque Ubicado en Carrera 36 con Calle 54, Parque Los Niños, Parque Candiles, Parque San Miguel, Parque Cigarras, Parque Ubicado en la Carrera 10 con Calle 45 Frente a las Instalaciones de Unitransa, Parque Concordia, Parque Kennedy, Parque Antonia Santos, Parque Hormigas, Parque Las Estatuas “Uribe Uribe”.

REGISTRO FOTOGRAFICO	
Parque Santander 	Parque García Rovira 
Parque Leones 	Parque Solón Wilches 

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato No.	Objeto	Contratista	Valor	Estado
394 de 2013	Construcción de jardines con plantas ornamentales y emhradizacion de parques y zonas verdes del Municipio de Bucaramanga..	NACIONAL DE PRADOS ORNAMENTALES S.A.S.	\$266.920.380	Liquidado

Empradización zonas verdes Parque García Rovira.



ANTES



DESPUES

Empradización zonas verdes Parque García Rovira.



ANTES



DESPUES

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Siembra de Cayenos Parque Turbay.



ANTES



DESPUES

Siembra de Prado Parque San Pio Costado Sur Occidental



ANTES



DESPUES

Contrato No.	Objeto	Contratista	Valor	Estado
592 de 2013	Mantenimiento y Recuperación de bancas de los parques del Municipio de Bucaramanga.	DELIA INES URREA DE QUIJANO	\$ 57.975.241	Reinicio el 24 de Febrero de 2014

Registro Fotográfico



Estado actual de las Bancas y desmonte de las mismas para su mantenimiento en el Parque San Pío.

Por otra parte se sigue trabajando con el Programa de la Red Protectora de Parques del Municipio de Bucaramanga.

Sitios Intervenidos durante este periodo: Parque de la Estatuas, Parque de los Niños, Parque Dangond, Parque los Pinos, Parque de la Vida, Parque Antonia Santos, Parque Santander, Parque las Palmas, Parque San Francisco, Parque de los Niños, con el fin de brindar seguridad y confiabilidad en dichos sitios.

Parque San Francisco



INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



- **Parques Construidos**

Contrat o No.	Objeto	Contratista	Valor	Estado
104 de 2013	Construcción Parque Fontana real del Municipio de Bucaramanga.	UNION TEMPORAL PARQUE FONTANA	\$1.499.721.809,92	Porcentaje de Avance del 90%

Actualmente se está trabajando en la instalación del piso para los senderos, con lo cual se culmina la primera fase del parque, que está proyectada para desarrollarse en tres (3) fases.

La siguiente fase es la construcción del Alumbrado Público, cuyo proceso se encuentra en etapa de evaluación y adjudicación de la Invitación Pública.

La tercera etapa corresponde a la instalación de estructuras y bancas en madera y elementos metálicos principalmente.

El área total del parque es de 6.960.95m².

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	LOGRO 2012	LOGRO 2013	META 2014
BUCARAMANGA CIUDAD VERDE DE AMERICA LATINA	Número de parques construidos en el municipio.	2	0	1	1
	Número de M2 de área verdes mantenidas para la conservación de parques.	1.418.000 M2	1.508.222	1.452.531	1.418.000

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

3.2. SUBPROGRAMA: ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

En este subprograma se han realizado los siguientes procesos contractuales los cuales son importantes resaltar:

Contrato No.	Objeto	Contratista	Valor	Estado
300 de 2013	Realizar los estudios de suelos para identificar las causas de deslizamiento erosión remoción en masa o falla geotécnica y realizar recomendaciones sobre algunos sectores del Municipio de Bucaramanga.	CONSORCIO CONSULTORIA Y OBRAS POR SANTANDER	\$ 58.767.340	Liquidado
386 de 2013	Interventoría para la recuperación y remodelación del patinodromo Roberto García Peña del Municipio de Bucaramanga	FERNANDO ALBERTO CHACON GELVEZ	\$ 58.921.000	Ejecución
451 de 2013	Estudios y Diseños para la Construcción del Parque de Agua en el Municipio de Bucaramanga. IMAGEN OSCAR VILLABONA	TORRES Y ZARATE ARQUITECTURA E INGENIERIA LTDA.	\$ 498.897.440	Ejecución
536 de 2013	Contratar la investigación geológica geotécnica y diseño para la mitigación de la amenaza geotécnica y control de erosión del talud ubicado en la vereda San Ignacio del Municipio de Bucaramanga	JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ	\$ 184.469.000	Ejecución
537 de 2013	Contratar la investigación geológica geotécnica y diseño para la mitigación de la amenaza geotécnica control de erosión sistemas de drenaje de aguas subterráneas y sistema de alcantarillado de la masa de suelo del Barrio Transición del Municipio de Bucaramanga	JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ	\$ 250.021.760	Ejecución

CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	LOGRO 2012	LOGRO 2013	META 2014
BUCARAMANGA CIUDAD VERDE DE AMERICA LATINA	Porcentaje de estudios y diseños requeridos realizados para el desarrollo de la ciudad	100%	100%	100%	100%

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

4. PROGRAMA: ESPACIO PÚBLICO: DE TODAS Y TODOS PARA TODAS Y TODOS

4.1. SUBPROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA GENTE

Contrat o No.	Objeto	Contratista	Valor	Estado
250 de 2013	Construcción de Andenes en la Carrera 26 con Calle 4 del Barrio la Independencia del Municipio de Bucaramanga	OBCELC S.A.S.	\$ 84.791.753,10	100% ejecutado

REGISTRO FOTOGRAFICO	
Antes de la Intervención	Intervenida
	

Contrat o No.	Objeto	Contratista	Valor	Estado
105 de 2013	Recuperación espacio público sectores vía a morrorico entre la cra 47a (km-1) y la cra 50 cll 24 entre cras 23 y 26 y la cra 22 entre calles 54 y 55 del Municipio de Bucaramanga	UNION TEMPORAL ESPACIO PUBLICO	\$ 1.432.031.510,30	75% avance de obra

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

El proyecto consiste en la recuperación del espacio público en los siguientes tres (3) sectores:

1. Andenes localizados en la Carrera 22 entre calles 54 y 55. El ancho promedio de los andenes a recuperar es de 3.50m. (TRABAJOS TERMINADOS)



Antes – Cra 22 entre Clls 54 y 55



Después – Cra 22 entre Clls 54 y 55

2. Vías peatonales, localizadas en la vía a Morrорico entre las Cras 47a (Sector Venado de Oro) y la Cra 50 (Acceso al Barrio Albania). El tramo a recuperar es de 675ml con un ancho promedio de 1.80m. (TRABAJOS TERMINADOS)



Antes – Andenes Vía a Morrорico



Ahora – Andenes Vía a Morrорico

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

3. Andenes localizados en la Calle 24 entre carreras 23 y 26. El ancho promedio de los andenes a recuperar es de 2.50m **(TRABAJOS EN EJECUCION)**

	
Antes andenes Calle 24 entre Cras 23 y 26	Ahora-andenes Calle 24 entre Cras 23 y 26

Contrat o No.	Objeto	Contratista	Valor	Estado
142 de 2013	Construcción baranda peatonal cra 39a entre calles 13 y 14 y cra 38 entre calles 13 y 14 sector 2 Barrio Morrорico diferentes sectores de la calle 69 Barrio Juan XXIII en las escaleras que comunican las manzanas 37 y 38 Barrio Villa Rosa Bucaramanga.	CESAR ANDRES AVELLANEDA AMAYA	\$ 71.893.514,70	Ejecutado

El proyecto consistió en el suministro e instalación de 272.55ml de barandas en tres sectores de Bucaramanga, con lo cual se buscó mejorar las condiciones de accesibilidad y calidad de vida de sus habitantes.

En total se instaló 89.60ml de barandas en las peatonales ubicadas en la carrera 39ª y 38 entre calles 13 y 14 del sector barrio Morrорico, 133.70ml de barandas en diferentes sectores de la calle 69 barrio Juan XXIII y 49.25ml de barandas en las escaleras que comunican las manzanas 37 y 38 barrio Villa Rosa.

Adicionalmente se realizó el mantenimiento de 26.95m2 de barandas de módulos en malla eslabonada en la calle 69 barrio Juan XXIII.

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



1. CARRERA 39A ENTRE CALLES 13 Y 14 Y EN LA CARRERA 38 ENTRE CALLES 13 Y 14
SECTOR 2 DEL BARRIO MORRORICO



2. CALLE 69 DEL BARRIO JUAN XXIII

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



3. ESCALERAS QUE COMUNICAN LAS MANZANAS 37 Y 38 DEL BARRIO VILLA ROSA



Contrato No.	Objeto	Contratista	Valor	Estado
620 de 2013	RECUPERACIÓN DE LAS VÍAS PEATONALES EN LOS 21 BARRIOS INDICADOS EN ESTE PROYECTO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	CONSORCIO ANDENES 2013	\$ 477.696.130,49	Ejecución

A continuación los sitios que se están interviniendo en cumplimiento de este proceso contractual.

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

No	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN
1	RECUPERACIÓN DE PEATONALES EN DIFERENTES SECTORES DEL BARRIO OLAS 2 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
2	MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL UBICADO ENTRE LA CARRERA 22B CON CALLE 7N Y LA VIA A MATANZA Y RECUPEACION DE ANDENES EN LA CARRERA 24 ENTRE LA CALLE 7N Y CALLE 8 N Y ANDEN EN FRENTE A LA CANCHA MULTIPLE DEL BARRIO ESPERANZA 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
3	RECUPERACION DE VIAS PEATONALES EN LA CALLE 17N ENTRE CARRERAS 24 Y CARRERA 25, EN LA CALLE 15N CON CARRERA 23 A , EN LA CARRERA 23 A CON CALLE 16N Y RECUPERACION DE BARANDAS PEATONALES EN LA CARRERA 23 CON CALLE 13N DEL BARRIO ESPERANZA 2 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
4	RECUPERACION DE VIAS PEATONALES (ESCALERAS) EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 18N CON CARRERA 25 y CARRERA 23 DEL BARRIO LIZCANO 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
5	RECUPERACION Y CONSTRUCCION DE PEATONALES EN DIFERENTES SECTORES DEL BARRIO PAISAJES NORTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
6	RECUPERACION DE ANDENES EN LA CARRERA 6 W ENTRE CALLE 30 Y CALLE 31 Y ENTRE LA CALLE 32 No 5 W - 75 Y LA CARRERA 6W DEL BARRIO SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
7	RECUPERACIÓN DE BARANDAS PEATONALES POR MITIGACION DE RIESGO UBICADAS EN EL BARRIO LOS LAURELES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
8	RECUPERACION DE ANDENES EN DIFERENTES SECTORES DEL BARRIO JUAN XXIII DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
9	RECUPERACION DE ANDENES Y SARDINELES EN LA CARRERA 30 ENTRE CALLE 103 Y CALLE 104 , EN LA CARRERA 31 ENTRE CALLE 102 , CALLE 103, CALLE 104 Y CALLE 105 DEL BARRIO DIAMANTE 1 EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
10	RECUPERACION DE ANDENES Y SARDINELES EN LA AVENIDA 88 CON TRANSVERSAL 23 (costado oriental) Y EN LA TRANSVERSAL 23 ENTRE LA AVENIDA 88 Y LA AVENIDA 89 (costado norte) DEL BARRIO DIAMANTE 2 EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
11	CONSTRUCCION DE ANDENES EN DIFERENTES SECTORES DEL BARRIO EL CRISTAL ALTO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
12	RECUPERACION DE VIAS PEATONALES E INSTALACION DE BARANDAS EN DIFERENTES SECTORES DEL BARRIO LIMONCITO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
13	RECUPERACION DE ANDENES Y ESCALERAS PEATONALES EN DIFERENTES SECTORES DEL BARRIO ALBANIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
14	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS POR MITIGACION DE RIESGO UBICADAS EN LA CALLE EL 1A CON 3 - CALLE 27 CON 5A Y EN LA CARRERA 2B DEL BARRIO LA CUYANITA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

15	RECUPERACION DE PEATONALES E INSTALACION DE BARANDAS EN DIFERENTES SECTORES DEL BARRIO TRANSICION V DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
16	RECUPERACION DE ANDENES Y SARDINELES EN DIFERENTES SECTORES DEL BARRIO NORTE BAJO DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
17	RECUPERACION DE ANDENES Y SARDINELES UBICADOS EN LA CALLE 47 # 10 OCC. - 58 FRENTE AL COLEGIO CAMPOHERMOSO Y EN LA CALLE 47 ENTRE CARRERA 1 OCC Y 2 OCC. EN EL BARRIO CAMPOHERMOSO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
18	RECUPERACION DE ANDENES EN LA CALLE 67 A # 9 - 61 (frene a la sede H colegio INEM), INSTALACION DE BARANDAS PEATONALES EN DIFERENTES SECTORES DEL BARRIO MANZANA 10 BUCARAMANGA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
19	CONSTRUCCIÓN DE PEATONALES, UBICADAS EN EL KILOMETRO 4 VIA PAMPLONA, BARRIO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
20	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES UBICADOS EN LA PEATONAL DE LA CALLE 53 CON CARRERA 4W EN EL BARRIO BALCONCITOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
21	RECUPERACION DE ANDENES EN AMBOS COSTADOS DE LA CARRERA 33 ENTRE CALLES 45 A LA 56 DEL BARRIO CABECERA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Se ha adelantado la licitación SI-LP-036-2013 cuyo objeto es: RECUPERACIÓN DE VÍAS PEATONALES EN BARRIOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. la cual se encuentra adjudicada y en proceso de legalización e inicio.

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contrato se ejecutará por grupos los cuales sus ubicaciones son:

Grupo A) Comunas 6 y 8

COMUNA	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN
6	CALLE 68 CON CARRERA 11, CARRERA 11 CON CALLE 67, CALLE 65 ENTRE CARRERA 18 Y 19 (FRENTE COLEGIO MARÍA GORETTI) DEL BARRIO LA VICTORIA
	CARRERA 17 C ENTRE CALLES 61 A LA 63 DEL BARRIO LA CEIBA
	CARRERA 16 CON CALLE 45 Y 46, EN LA MARGEN NORTE DE LA AVENIDA LA ROSITA ENTRE CARRERAS 20 Y 21 DEL BARRIO LA CONCORDIA
8	DIFERENTES SECTORES DEL BARRIO CORDONCILLOS 2
	CARRERA 10B CON CALLE 69 Y RECUPERACIÓN DE PEATONALES EN LA CALLE 69A CON CALLE 10 Y EN LA CARRERA 10C CON CALLE 69 BARRIO ÁFRICA

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

	CALLE 67 ENTRE CARRERAS 10A Y 10B DEL BARRIO PABLO VI
	CALLE 68 CON CARRERA 5 DEL BARRIO LA HOYADA
	CALLE 69 CON CARRERA 10C DEL BARRIO 20 DE JULIO
	DIFERENTES SECTORES DEL BARRIO LOS CANELOS

Grupo B) Comunas 7 y 17

COMUNA	DESCRIPCIÓN - UBICACIÓN
7	FRENTE A LOS CONJUNTOS RESIDENCIALES SAMANES VI Y JUAN PABLO II (AVENIDA BUCAROS NO.3-35 CIUDADELA REAL DE MINAS) Y FRENTE AL CONJUNTO RESIDENCIAL CALLE REAL.
	AVENIDA GUAYACANES CON CARRERA 1 , EN LA AVENIDA GUAYACANES DESDE EL BLOQUE 8,9 Y 10 Y AVENIDA GUAYACANES CON EL BLOQUE 19 Y EN LA PEATONAL DIAGONAL A LA PARROQUIA DEL BARRIO CIUDAD BOLIVAR
	CARRERA 3 ENTRE CALLES 63 Y 63A DEL BARRIO LOS NARANJOS
17	CALLE 60 ENTRE CARRERA 17W Y 19W Y EN LA CARRERA 19W ENTRE CALLES 60 Y 62 DEL BARRIO PRADOS DEL MUTIS
	CALLE 59 ENTRE CARRERAS 3W Y 8W DEL BARRIO MUTIS
	VIA PRINCIPAL CALLE 66 Y SOBRE LAS VÍAS PEATONALES DESDE LA CARRERA 14 HASTA LA CARRERA 27 DEL BARRIO LA GRAN LADERA
	CALLE 65 ENTRE CARRERA 16W Y 21W Y ENTRE 22W Y 25W DEL BARRIO MONTERREDONDO

Grupo C) Comunas 12 y 13

COMUNA	DESCRIPCION - UBICACIÓN
12	SARDINEL VEHICULAR SOBRE EL COSTADO OCCIDENTAL DE LA CARRERA 46 ENTRE CALLES 54 Y 55 EN EL BARRIO TERRAZAS
	CALLE 63 ENTRE CARRERA 32 Y 33 FRENTE A LA IGLESIA DIVINO NIÑO DEL BARRIO CONUCOS
	CARRERA 24 ENTRE CALLES 52 Y 53 DEL BARRIO BOLARQUI
	CARRERA 45 ENTRE CALLES 55 Y 56 DEL BARRIO TERRAZAS
13	COSTADO NORTE DEL PARQUE DEL AGUA SOBRE LA VIA QUE CONDUCE A PAMPLONA DEL BARRIO QUINTA BRIGADA.
	CARRERA 39 Y 40 CON CALLES 33A Y 34 DEL BARRIO LAS AMERICAS

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

	CARRERA 33A, ENTRE CALLES 13 Y 14 COSTADO OCCIDENTAL DEL BATALLON DE INFANTERIA EN EL BARRIO SAN ALONSO.
	CARRERA 29 CON CALLE 32 DEL BARRIO LA AURORA.

También se ha adelantado un proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N° SI – SAMC – 045- 2013, para la RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y ZONAS VERDES EN DIFERENTES SITIOS DE LOS BARRIOS LOS ÁNGELES, BOSQUE NORTE, LA JUVENTUD Y REGADEROS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, el cual se encuentra adjudicada y en proceso de legalización e inicio.

El proyecto se encuentra localizado en los barrios Los Ángeles, Bosque Norte, La Juventud y Regaderos de la Comuna 2 del municipio de Bucaramanga

CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	LOGRO 2012	LOGRO 2013	META 2014
ESPACIO PUBLICO DE TODAS Y TODOS PARA TODAS Y TODOS	Número de ml/carril de vías peatonales construidas y mantenidas en la ciudad.	1.000 ml/carril	832,40	6.267	300
	Porcentaje de avance en la construcción de un puente peatonal.	1	0	0	20%

5. PROGRAMA: BUCARAMANGA ÁGIL Y SEGURA

5.1. SUBPROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA

ESTRUCTURACION DE TRABAJO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL PERIODO 2012-2015 Secretaria de Infraestructura de Bucaramanga

Antecedentes:

La Universidad Industrial de Santander, en el año 2010, realizó el estudio de movilidad denominado “**PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD BUCARAMANGA 2.010 – 2.030**”, el cual contempla la necesidad de ejecutar un programa tendiente a la Optimización de la Infraestructura vial, señalando y priorizando un conjunto de obras

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

necesarias, que garantizaran el mejoramiento de la movilidad en la ciudad de Bucaramanga.


- **Proyecto de mantenimiento y conservación de la malla vial de Bucaramanga** (Pág....89 plan maestro de movilidad)
- ✓ Mantener y conservar en óptimas condiciones las vías de la ciudad para mejorar la movilidad de la ciudad.
- ✓ Según el estudio de caracterización de las vías de la ciudad, elaborado por la Universidad Industrial de Santander – UIS, en Sep./2010, se determina necesario una inversión de **\$257.300.000.000**, para optimizar la malla vial.
- **Nueva Infraestructura vial** (Pág....89 plan maestro de movilidad)
- ✓ Señala 60 nuevos proyectos necesarios con el fin de mejorar los niveles de servicio en corredores saturados y la velocidad media vehicular. La actual administración ha priorizado 12 proyectos a través de la secretaria de infraestructura.

Para dar cumplimiento a lo anterior, la administración municipal estructuro un plan que denomino Plan de Movilidad 2012 – 2015, el cual contempla las siguientes obras:

OBRAS A EJECUTAR DEL PLAN MAESTRO MOVILIDAD 2012 - 2015				
N°.		CONCEPTO	VALOR (MILES)	PORCENTAJE (%)
ALCALDIA DE BUCARAMANGA				
1	1	VIADUCTO ATIRANTADO CARRERA NOVENA	127.715	68,19
2	2	TERCER CARRIL	66.000	
3	3	RECUPERACION MALLA VIAL	45.000	
4	4	TRONCAL NORTE/SUR (APP)	350.000	
5	5	APORTES AL SITM - METROLINEA	100.000	
		APORTES DEL MUNICIPIO A OBRAS POR VALORIZACION	82.318	
6	6	1. Intercambiador de Neomundo		
7		2. Intercambiador Av. Quebradaseca Cra 27		
8		3. Intercambiador Av. Quebradaseca Cra 15		
9		Conexión Oriente Occidente (Cabecera-Mutis)		
SUBTOTAL			771.033	
GESTION ANTE LA GOBERNACION DE SANTANDER				
10	1	TERCER CARRIL	93.000	8,22
SUBTOTAL			93.000	
GESTION ANTE EL GOBIERNO NACIONAL				
11	1	INTERCAMBIADOR DEL MUTIS	20.000	2,65
12	2	RECUPERACION AV. QUEBRADASECA	10.000	
SUBTOTAL			30.000	
APORTES DE LA COMUNIDAD POR VALORIZACION				
-	1	ACUERDO MUNICIPAL N°. 075 DE 2010: 1. Intercambiador de Neomundo 2. Intercambiador Av. Quebradaseca Cra 27 3. Intercambiador Av. Quebradaseca Cra 15 4. Conexión Oriente Occidente (Cabecera-Mutis)	236.822	20,94
SUBTOTAL			236.822	
TOTAL			1.130.855	100%

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Y su estructuración financiera es la siguiente:

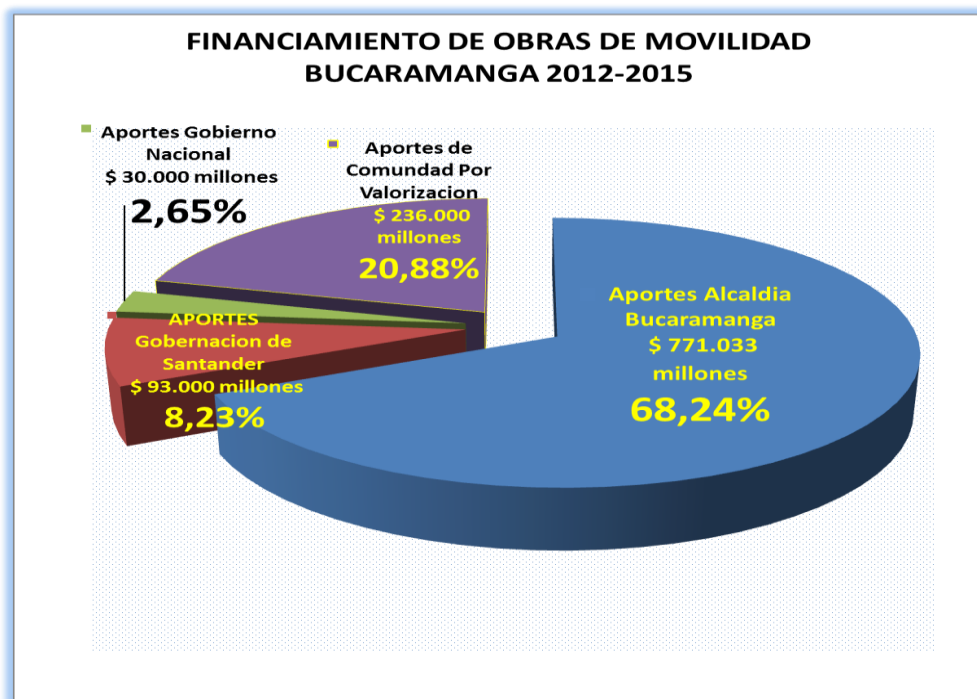

La secretaria de Infraestructura adelanta la ejecución de dos contratos para el mejoramiento de la malla vial:

1. RECUPERACION AVENIDA QUEBRADA SECA

La Construcción del Proyecto de Conectividad Regional – “Troncal Metropolitana Norte Sur del Municipio de Bucaramanga – Tramo 7 o Avenida Quebrada Seca.


Se concibe teniendo en cuenta que la movilidad de los habitantes del área metropolitana está establecida en tres ejes longitudinales, las Carreras 15, 27 y 33, y los ejes transversales, las Avenidas Quebrada seca

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.:	0253 del 16 de Julio de 2013
OBJETO:	Construcción del Proyecto de Conectividad Regional – Troncal Metropolitana Norte Sur del Municipio de Bucaramanga – Tramo 7- Avenida Quebrada Seca.
VALOR INICIAL:	\$ 9.314.838.761,62

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATISTA:	CONSORCIO METROPOLITANO. R.L. FERNANDO VALDERRAMA CORDERO
SUPERVISOR:	Ing. Wilson Motta
INTERVENTOR CONTRATO:	CONSORCIO INSOL., Contrato No. 0284 del 30 de Julio de 2013
FECHA DE INICIACION:	26/08/2013

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	0284 del 30 de Julio de 2013
OBJETO:	Interventoría para la Construcción del Proyecto de Conectividad Regional – Troncal Metropolitana Norte Sur del Municipio de Bucaramanga – Tramo 7 - Avenida Quebrada Seca.
VALOR INICIAL:	\$ 685.034.078,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO INSOL.
SUPERVISOR:	Ing. Wilson Motta

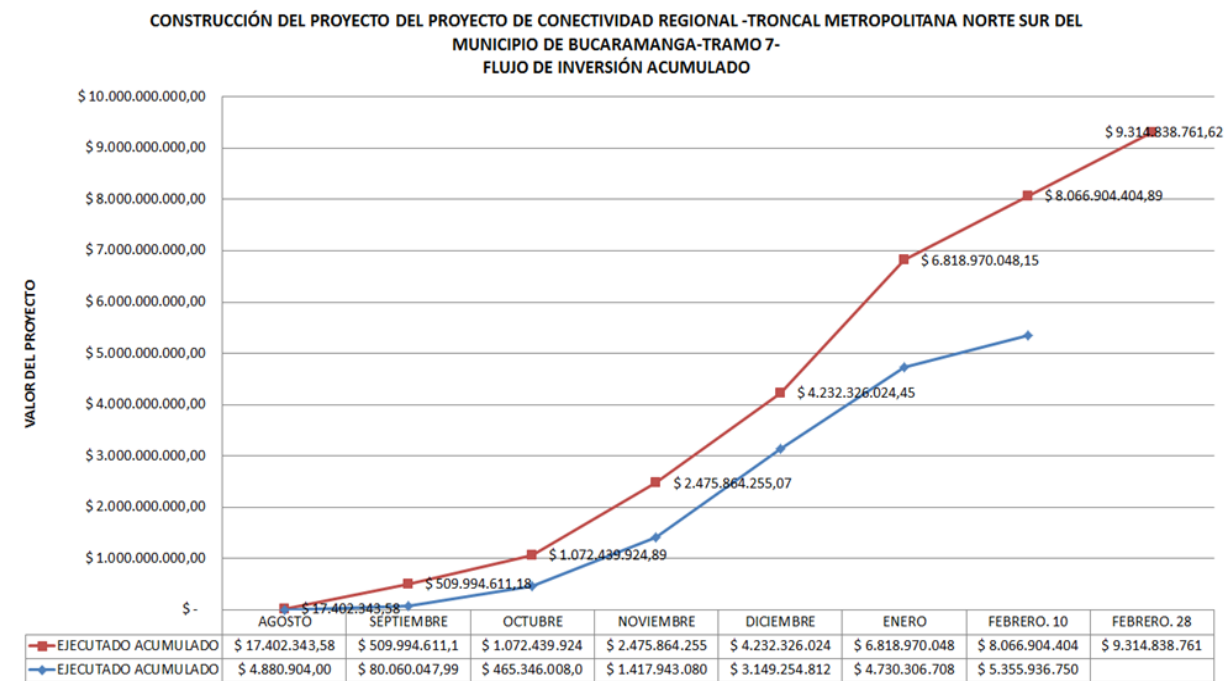

2. RECUPERACION MALLA VIAL DE LA CIUDAD

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.:	377 del 12 de Diciembre de 2012
OBJETO:	La construcción, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial urbana del municipio de Bucaramanga, en los sectores indicados por la Secretaría de Infraestructura
VALOR INICIAL:	\$ 42.712.265.156
CONTRATISTA:	CONSORCIO MANTENIMIENTOS URBANOS R.L. GUSTAVO RODRIGUEZ
SUPERVISOR:	Arq. Oscar Villabona García
INTERVENTOR CONTRATO:	Unión Temporal Malla vial Urbana., Contrato No. 083 de 5 de abril de 2013
FECHA DE INICIACION:	03/01/2013

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	083 de 5 de abril de 2013
OBJETO:	interventoría para la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial urbana del municipio de Bucaramanga, en los sectores indicados por la Secretaría de Infraestructura
VALOR INICIAL:	\$2.726.909.948
CONTRATISTA:	Unión Temporal Malla vial Urbana
SUPERVISOR:	Arq. Oscar Villabona García

A la fecha se han intervenido 16 comunas de las 17 existentes en la ciudad de Bucaramanga, dentro de las cuales se han intervenidos las siguientes comunas y barrios:

Comuna	Nombre	Barrio	Inversión (Miles)
1	Norte	Colorados, El Rosal, Café Madrid, las Hamacas, Kennedy, Olas bajas, Mirarmar, Villa Rosa	\$ 2.785,00
2	Nororiental	Transición, Regaderos	\$ 38,00
3	San Francisco	San Francisco y comuneros	\$ 3.271,00
4	Occidental	Nápoles y Gaitán	\$ 154,00
5	García Rovira	Alfonso López, Chorreras de Don Juan, Campo hermoso y vía a Chimitá	\$ 792,00
6	La Concordia	La Victoria, Ricaurte y San Miguel	\$ 1.855,00
7	Real de Minas	Transversal Metropolitana	\$ 911,00

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

9	La Pedregosa	Quebrada la Iglesia, San Martín, San Pedro Claver, Torres de Alejandría	\$ 818,00
10	Provenza	Diamante II	\$ 413,00
11	Sur	Manuela Beltrán	\$ 436,00
12	Cabecera	Carrera 33 entre calles 56 y 67, Terrazas, Carrera 36 entre calles 56 y 51, calle 56 entre carreras 33 y 36	\$ 2.455,00
13	Oriental	Carrera 39 y 40 entre calles 41 y 44, Sector Megamall	\$ 1.814,00
14	Morrorico	Buenos Aires	\$ 119,00
15	Centro	Carrera 19 entre calle 31 y q Seca y Carrera 16 entre calles 31 y 33	\$ 1.821,00
16	Lagos del Cacique	Hacienda San Juan	\$ 805,00
17	Mutis	Mutis y Monterredondo	\$ 422,00
TOTAL			\$ 18.900,00

- ✓ Durante el periodo de obra se han instalado aproximadamente 35 km de pavimento flexible en los diferentes sectores ya mencionados.
- ✓ Se han realizado aproximadamente 725 parcheos con un área aproximada de 26 mil metros cuadrados de mezcla asfáltica instalada.

Adicionalmente, se construyen vías nuevas entre las que se resalta:

Vía	Estado Actual	Área Pavimento
Conexión Variante Los Estudiantes	950 millones aproximadamente, ya entregada	990 m2 aprox
Calle 70 Vías Las Colinas	532 millones invertido a la fecha, inversión proyectada 1300 millones aproximadamente, terminación vía 12 de abril y espacio público y otros abril 30 de 2014	8400 m2 aprox
Carrera 15 B entre calles 3 y 4	Iniciando actividades	560 m2 aprox
Vía La Gran Ladera	Iniciando actividades	945 m2 aprox

Dentro de este contrato se han recuperado aproximadamente 830 metros lineales de espacio público, correspondientes a un área aprox de 646 m2, en diferentes sectores:

- Punto 30 Carrera 18 entre calle 30 y 31, calle 31 entre 18 y 16, Carrera 19 entre 30 y 31, Calle 30 desde la carrera 16 a la 19
- Vía de los estudiantes
- Calle 70 Vía Las Colinas

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO



CARRERA 57 ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18



CARRERA 10W CON CALLE 50.

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



CALLE 13 ENTRE CARRERA 21 Y CARRERA 22.



CARRERA 32 ENTRE CALLE 18 Y CALLE 19.



CARRERA 32 ENTRE CALLE 17 Y CALLE 18.



INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



CARRERA 32 ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18



CARRERA 32 CON CALLE 19

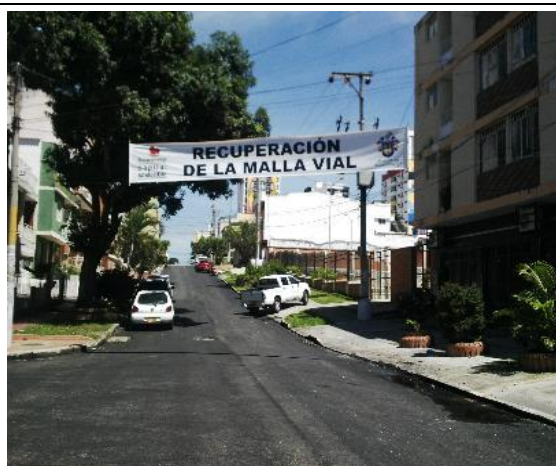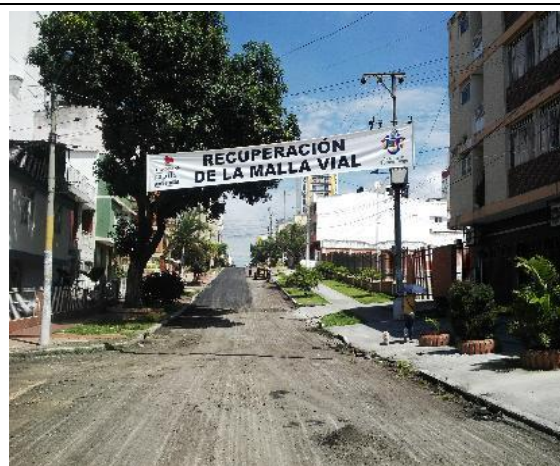

CARRERA 32 ENTRE CALLE 20 Y AVENIDA QUEBRADA SECA

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



CALLE 54 ENTRE CARRERA 22 Y CARRERA 28



CALLE 55 ENTRE CARRERA 25B Y CARRERA 26



CALLE 56 CON CARRERA 22

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



CALLE 28 ENTRE CARRERA 0 Y CARRERA 1




CALLE 24N ENTRE CARRERA 16 Y CARRERA 17




CALLE 93 ENTRE TORRES DE MONTERREY Y TORRES DE ALEJANDRIA.

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

En lo que va corrido de la presente vigencia se ha continuado realizando los trabajos en los siguientes sitios:

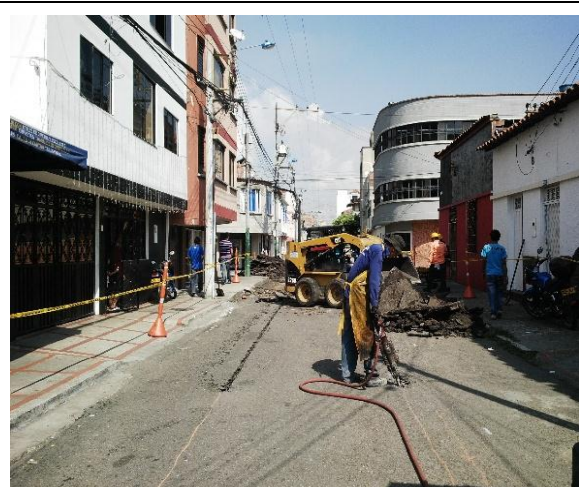

CARRERA 16 ENTRE CALLE 51A Y CALLE 52.

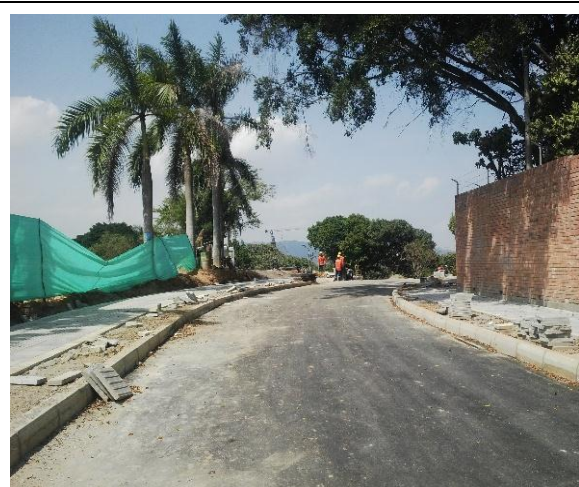

CALLE DE LOS ESTUDIANTES

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



CALLE 50 ENTRE CARRERA 14 Y CARRERA 15.





CALLE 70 (VÍAS A LAS COLINAS).



CARRERA 15 ENTRE CALLE 50 Y CALLE 50A

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

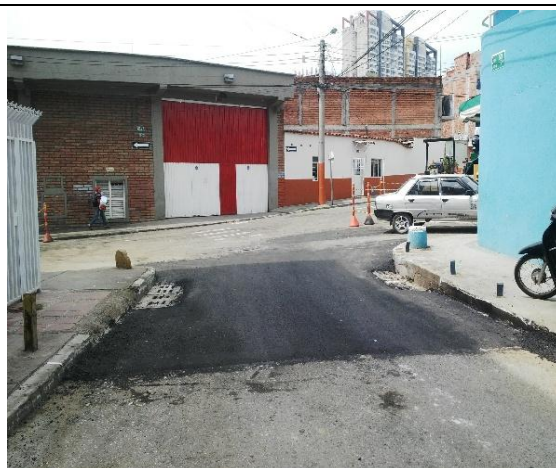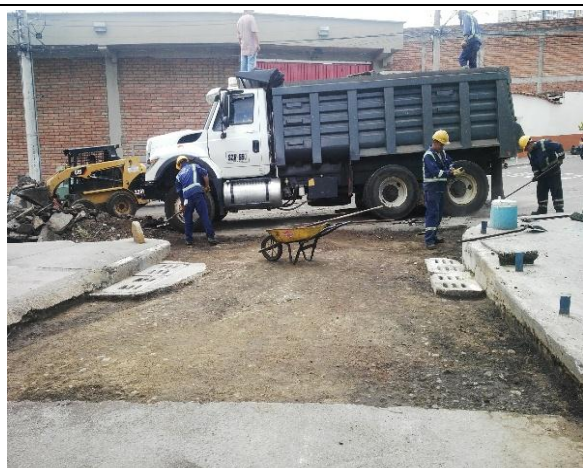

CARRERA 17A ENTRE CALLE 58; CALLE 60 Y CALLE 61.



CARRERA 17B1 ENTRE CALLE 58 Y CALLE 59




CARRERA 17B1 ENTRE CALLE 58 Y CALLE 59.

5.2. SUBPROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL

Contrato No.	Objeto	Contratista	Valor	Estado
384 de 2012	Recuperación del anillo vial veredal de los corregimientos 1 y 2, veredas santa rita, mayagues y los santos con construcción de alcantarillas, muros de contención, cunetas y pavimento en lozas de concreto en sectores críticos, Municipio de Bucaramanga.	BONIFACIO FLOREZ ANTELIZ	\$ 533.918.717,32	Proceso de Liquidación

En cumplimiento de este contrato se ejecutó lo siguiente:

- 7 pavimentos rígidos en puntos críticos
- 5 muros de contención en sitios donde amenazaba la inestabilidad de la banca.
- un filtro de longitud 70 m para manejo de aguas.

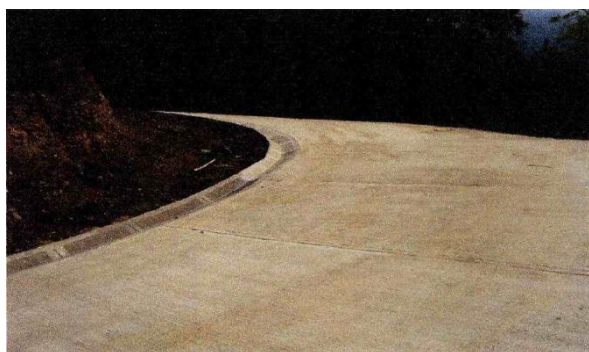

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato No.	Objeto	Contratista	Valor	Estado
035 de 2013	Mantenimiento y Rehabilitación de vías terciarias del Municipio de Bucaramanga Departamento de Santander (rehabilitación puente vehicular vía estación de policía carabineros del norte al café Madrid para recuperar la transitabilidad del Corregimiento 1 y 2 recuperación vía udes k9 a Cúcuta vereda Santa Bárbara Corregimiento 3 del Municipio de Bucaramanga	CONSORCIO VÍAS NACIONALES 2012	\$ 298.504.068, 92	En Proceso de Liquidación

En cumplimiento de este contrato se realizaron los siguientes trabajos:

- construcción de 4 muros para estabilización de la banca.
- demolición y reposición de pavimento rígido.
- construcción de la superestructura del puente vehicular vía la cemento – carabineros del norte.



INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato No.	Objeto	Contratista	Valor	Estado
393 de 2013	construcción Fase II de las obras del acueducto vereda los Santos parte alta Corregimiento dos del Municipio de Bucaramanga	RAÚL AMAYA TOLOZA	\$ 934.490.027,74	Ejecución 70%



Contrato No.	Objeto	Contratista	Valor	Estado
064 de 2013	Apoyo para las redes locales complementarias de acueducto y alcantarillado necesarias para la ejecución del programa de conexiones Intradomiciliarias en el Municipio de Bucaramanga	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.	\$ 6.632.739.918,65	Ejecución

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REDES LOCALES BARRIO CAMPESTRE NORTE




REDES LOCALES BARRIO CONQUISTADORES



INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



REDES LOCALES BARRIO SAN VALENTIN

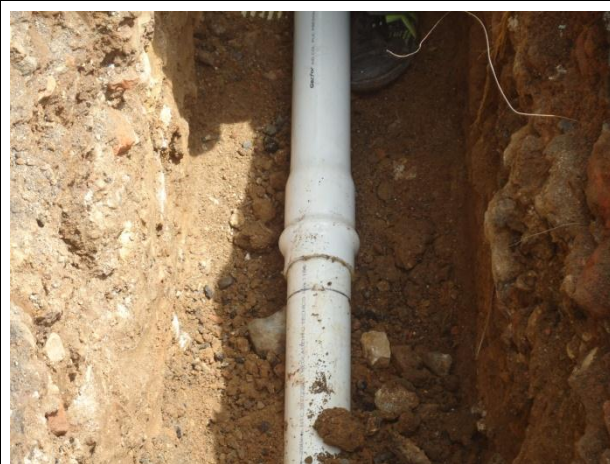

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REDES LOCALES BARRIO VIVEROS DE PROVENZA



Contrato No.	Objeto	Contratista	Valor	Estado
283 de 2013	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA VIJAGUAL - SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	CONSORCIO VIJAGUAL-SANPEDRO 2013	\$ 374.999.994,99	Liquidado

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ANTES:



DURANTE:



DESPUES



Contrato No.	Objeto	Contratista	Valor	Estado
145 de 2013	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA EL ABURRIDO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	JOSE JOAQUIN POSADA NOREÑA	\$ 2.678.600.000	En proceso de Liquidación



5.3. SUBPROGRAMA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

- **CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO LA NOVENA**

La construcción de la calzada o tablero del Viaducto Carrera Novena estará concluida el próximo 28 de julio.

La afirmación la hizo el director de obra, Jesús Manzo Suárez, al explicar que para esa fecha está programada la dovela de cierre.

Es decir, ese día será cuando se encuentren los dos tramos de vía en el centro de este paso elevado.

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Como se recordará, la calzada del puente se está ejecutando desde las torres hacia el centro y hacia los extremos de manera simultánea.

De acuerdo con Manzo Suárez, la obra continúa avanzando ajustada al último cronograma establecido y todo indica que en agosto próximo ya estará listo el tan anunciado megaproyecto vial.

En efecto, el director de obra precisó que el avance de ejecución ya alcanzó el 75 %.

Explicó que de los 550 metros de longitud que tendrá el puente, ya se han construido más de 300 metros.

“Nos falta cuatro dovelas para llegar a los estribos y seis para llegar al centro”, afirmó.

Cabe precisar que las dovelas son los tramos de puente de 6,8 metros que van conformando la calzada.

Señaló que los estribos (que son las estructuras donde queda soportado el puente en los extremos) ya están terminados y se avanza en un 80% en la construcción del acceso norte del puente, es decir el de la calle 45.

“El propósito es que antes de junio quede listo el acceso norte y en el sur se deja algo provisional que permita posteriormente hacer el empalme con el intercambiador del mutis que construirá el Municipio”, dijo.

Avance en tirantes

Cada una de las torres tendrá 61 metros de altura y actualmente ya se han levantado 54 metros.

Estas torres están reforzadas por unos cajones metálicos modulados en 20 piezas que permitirán la instalación de los 20 pares de tirantes en cada columna.

Según Manzo Suárez, ya se han colocado 19 cajones y el último se pondría después de Semana Santa.

Precisó que a mediados de mayo ya estarán concluidas las torres.

“En la Pila 2 ya se instalaron trece pares de tirantes y en la Pila 3 se va a poner el tirante doce”, dijo el director de la obra, Jesús Manzo Suárez.

La obra se entregara el próximo 30 de Septiembre



INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato No.	Objeto	Contratista	Valor	Estado
233 de 2013	REUBICACIÓN DEL COLECTOR QUEBRADASECA Y CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR NORTE SUR PARQUE INTERCAMBIADOR VIAL AVENIDA QUEBRADA SECA CON CARRERA 15 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	CONSORCIO UNIDOS 2013	\$ 10.735.828.687,99	Ejecución 70%

REGISTRO FOTOGRAFICO



CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	LOGRO 2012	LOGRO 2013	META 2014
BUCARAMANGA AGIL Y SEGURA	Número de M2 de malla vial urbana mejorados.	100.000 M2	24.465	187.603	25.000

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Número de M2 de huecos existentes tapados en la malla vial urbana.	100.000 M2	1.516	19.958	25.000
Número de km/carril de vías terciarias con transitabilidad mantenida.	140 km/carril	140	140	140
Número de intersecciones viales construidas.	4	0	0,20	1
Porcentaje de avance en la construcción de la solución vial puerta del sol - Provenza.	1	5%	10%	25%
Número de obras de infraestructura vial terminadas.	2	1	0	1

6. PROGRAMA: PLAZAS DE MERCADO Y SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES

6.1 SUBPROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PLAZAS DE MERCADO

Contrato No.	Objeto	Contratista	Valor	Estado
028 DE 2013	Contratar la obra pública para el Mejoramiento y Adecuación instalaciones Plaza Mercado San Francisco del Municipio de Bucaramanga	CONSORCIO SAN FRANCISCO	\$ 984.008.552,68	Ejecutado



INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato No.	Objeto	Contratista	Valor	Estado
448 de 2013	Mantenimiento y Ampliación del cuarto de aseo de la Plaza de Mercado Guarín Municipio de Bucaramanga	UNION TEMPORAL PLAZA GUARIN	\$ 58.570.529,76	Ejecutado



Contrato No.	Objeto	Contratista	Valor	Estado
375 de 2013	Adecuación de locales ubicados en la plaza central del Municipio de Bucaramanga	CONSORCIO PLAZA CENTRAL	\$ 37.057.686,3	Ejecución 50%



INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	LOGRO 2012	LOGRO 2013	META 2014
PLAZAS DE MERCADO Y SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES	Número de obras de mantenimiento realizados en las plazas de mercado a cargo del municipio.	6	0	6	1
	Terminar la construcción de 1 plaza de mercado.	1	1	0	0

6.1. SUBPROGRAMA: SERVICIOS PÚBLICOS AMIGABLES

A continuación el informe detallado de la Oficina de Alumbrado Público de contratos suscritos durante la vigencia 2013.

- Modernización y Expansión de Parques

Contrato No.	Objeto	Contratista	Valor	Estado
107 de 2013	Modernización y Mejoramiento de los niveles de iluminación del Parque Antonia Santos	Consorcio R&Z	\$ 565.576.755	Ejecutado 100%



INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato No.	Objeto	Contratista	Valor	Estado
181 de 2013	Modernización y Mejoramiento de los niveles de iluminación de la glorieta San Francisco	Consorcio Parque San Francisco 2013	\$ 652,646,513	Ejecutado 100%




Contrato No.	Objeto	Contratista	Valor	Estado
208 de 2013	Construcción del alumbrado público del Parque Centenario ubicado en la carrera 18 con calle 31	Consorcio Parque Centenario 2013	\$ 1.019.189.151	Ejecución 90%



INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato No.	Objeto	Contratista	Valor	Estado
421 de 2013	Mmodernización y Mejoramiento de los niveles de iluminación del Parque Corona	Unión Temporal Parque Corona 2013	\$ 141.479.310	Ejecución 20%

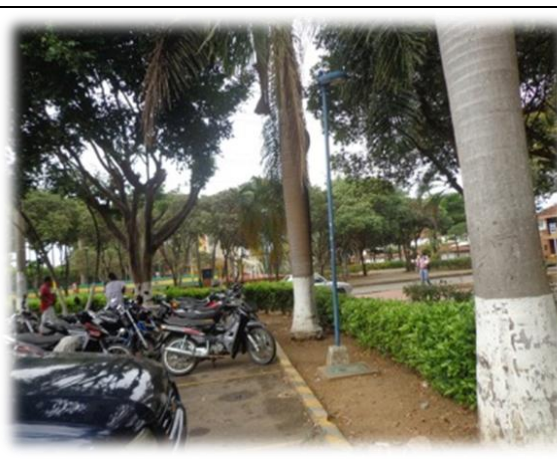

Contrato No.	Objeto	Contratista	Valor	Estado
310 de 2013	Modernización y Mejoramiento de los niveles de iluminación del Parque y Escenarios Deportivos del Barrio la Ceiba	EME INGENIERIA S.A	\$ 370.004.244	Ejecución 90%



INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato No.	Objeto	Contratista	Valor	Estado
508 de 2013	Modernización del alumbrado público a tecnología LED, del caminodromo y zonas verdes a su alrededor del Barrio Fontana	Consortio Alumbrado Fontana	\$ 576.304.931	Ejecución 30%



- **Modernización de Escenarios Deportivos**

Contrato No.	Objeto	Contratista	Valor	Estado
050 de 2013	Cancha de futbol del Barrio Mutis y reposición y expansión del alumbrado público sobre las vías de alrededor de la cancha y vía principal de entrada Barrios Brisas del Mutis, Prados de Mutis y Manzanares	Consortio Mutis	\$ 346.620.535	Ejecución 30%

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



Contrato No.	Objeto	Contratista	Valor	Estado
108 de 2013	modernización y mejoramiento de los niveles de iluminación de la Cancha de fútbol el Bueno y parque ubicados en la carrera 1 occ con calle 64 del Barrio Ciudad Bolívar	Consortio Obras Eléctricas	\$ 418.644.973	Ejecución 100%



Contrato No.	Objeto	Contratista	Valor	Estado
061 de 2013	Modernización, Expansión y Mejoramiento de las Canchas deportivas del Barrio Manzanares	IRC S.A.S	\$ 493.880.609	Ejecución 90%

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



Contrato No.	Objeto	Contratista	Valor	Estado
032 de 2013	Mejoramiento de la Iluminación del patinodromo y Parque Infantil del Barrio Provenza	Unión Temporal Provenza	\$ 114.214.113	Ejecución 100%



Contrato No.	Objeto	Contratista	Valor	Estado
314 de 2013	Construcción del alumbrado público de las vías alrededores de los escenarios deportivos de la Villa Olímpica	Consorcio Alumbrado CONSANER	\$ 2.051.913.429	Ejecución 90%

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



Contrato No.	Objeto	Contratista	Valor	Estado
491 de 2013	Modernización y mejoramiento de los niveles de iluminación de las canchas de futbol y minifutbol del Barrio Prados del Mutis	IGS INGENIERIA E.U.	\$ 481.925.226	Ejecución 70%



Contrato No.	Objeto	Contratista	Valor	Estado
589 de 2013	Modernización y mejoramiento de los niveles de iluminación de las canchas y zonas verdes del Parque Principal del Barrio Girardot	CONSORCIO PARQUE GIRARDOT 2013	\$ 508.376.276	Ejecución 70%

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



Contrato No.	Objeto	Contratista	Valor	Estado
542 de 2013	Modernización y mejoramiento de los niveles de iluminación de la cancha de futbol del Barrio Dangond	OBCIVEL LTDA	\$ 299.337.991	Ejecución 30%



- Modernización y Expansión con Tecnología LED**

Contrato No.	Objeto	Contratista	Valor	Estado
268 de 2013	Modernización del sistema de alumbrado público a tecnología LED, complementado con sistema de telegestión en la carrera 27 desde la avenida quebrada seca hasta la Uis y calle 11 entre carrera 27 y carrera 15	Asoingeniería del Oriente LTDA	\$ 896.013.883	Ejecución 90%

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



Contrato No.	Objeto	Contratista	Valor	Estado
319 de 2013	Modernización y mejoramiento de los niveles de iluminación de la calle 35 entre carreras 12 y 19	EME INGENIERIA S.A	\$ 1.018.878.237	Ejecución 100%



- **Expansión Zona Urbana**

Contrato No.	Objeto	Contratista	Valor	Estado
365 de 2013	Modernización y expansión de la Zona Urbana	CONDISLEC E.U	\$ 1.278.194.911	Ejecución 80%

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

	Barrios
Comuna 1	Mirador de Colorados
	Campestre Norte
	El Nogal
	Bonanaza
	Barrio Nueva
	Café Madrid Sector El Switch
	Café Madrid Sector El Túnel
	María Paz
	Villa Carmelo
	Betania
	Getsemani
	La Fortuna
	Villa Luz Campestre
Comuna 2	Lizcano 1
	Los Cuadros
Comuna 3	San Rafael
	Comuneros
	El Cinal
	Calle 10
	Diagonal 15
	Puerto Rico
	San francisco
	Mirador de la UIS
Comuna 4	Nápoles
	La Gloria
	La Feria
Comuna 6	San Miguel
	La Salle
	Triángulo de Gasoriente
Comuna 7	Calle de los Estudiantes
	Los Guanes
Comuna 9	Nueva Granada
	San Martín
	San Pedro
Comuna 10	El Cristal
Comuna 11	Villas del Nogal
	Villa Real
	Luz de Salvación
Comuna 12	Quebrada Pan de Azucar
Comuna 13	Los pinos
Comuna 14	Buena Vista

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Comuna 16	Lagos del Cacique
	Guayacanes
	Santa Barbara

Contrato No.	Objeto	Contratista	Valor	Estado
464 de 2013	Expansion del alumbrado público en diferentes sectores de la zona rural del Municipio de Bucaramanga	EME INGENIERIA S.A.	\$ 878.458.330	Ejecución 60%

	VEREDA
CORREGIMIENTO 1	EL PABLON
	LA ESMERALDA
	SAN IGNACIO
	SAN PEDRO ALTO Y BAJO
	SANTA RITA
CORREGIMIENTO 2	CAPILLA BAJA
	CHITOTA
	LOS SANTOS PARTE BAJA Y ALTA
CORREGIMIENTO 3	GUALILO BAJO
	RETIRO GRANDE

- **Proyectos en Pagina WEB**

Los siguientes son los proyectos que se encuentran en página Web – Licitaciones para iniciar en la vigencia 2014

1. Cancha de Futbol Sintética del Barrio Kennedy
2. Tramo 7 Avenida Quebradaseca con tecnología LED y Sistema de telegestión
3. Transversal Oriental con tecnología LED y Sistema de telegestión
4. Carrera 27 con tecnología LED y Sistema de telegestión
5. Carrera 15 con tecnología LED y Sistema de telegestión
6. Colseguros Norte y canchas de María Paz
7. Parque Fontana Real
8. Parque de la Vida
9. Parque Cristo Rey
10. Parque Leones

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

La Alcaldía de Bucaramanga, tiene la "única empresa de servicios públicos", que tiene TRES (3) certificaciones a nivel nacional y TRES (3) certificaciones a nivel internacional, la gran mayoría de las empresas de servicios públicos tiene una o máximo dos certificaciones.

1.- ISO 14001:2004 : En virtud que los procesos que realiza el Alumbrado Público de la Secretaria de Infraestructura, con respecto a los materiales con tecnologías limpias de última generación que se traduce en ahorros de contaminación por el CO2, la disposición de los residuos se realiza cumpliendo todas las normas señaladas para tal fin, todos los procesos de operación, mantenimiento, modernización, reposición y expansión utiliza insumos, equipos y herramientas que utiliza en todos sus procesos no afectan el medio ambiente.

2. OHSAS 18001:2007: En virtud que los procesos que realiza el Alumbrado Público de la Secretaria de Infraestructura, con respecto a la Salud ocupacional de sus empleados y subcontratistas utilizan todos los elementos de protección individual, adicionalmente que todo el personal está debidamente capacitado para desempeñar las funciones con los más altos índices de formación.

3. ISO9001:2008: En virtud que los procesos que realiza el Alumbrado Público de la Secretaria de Infraestructura, con respecto a que las técnicas de operación, mantenimiento, modernización, reposición y expansión son de calidad en lo que respecta a sus procedimientos de contratación, manual procedimental y documental. Por lo anterior Sr. Alcalde mis más sinceras felicitaciones. ICONTEC, le solicita muy amablemente que las certificaciones sean entregadas en ceremonia solemne, espero instrucciones al respecto.

CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	LOGRO 2012	LOGRO 2013	META 2014
PLAZAS DE MERCADO Y SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES	Porcentaje de las luminarias que se encuentran en funcionamiento.	96%	98%	99,24%	96%
	Número de parques y/o escenarios deportivos con el alumbrado público modernizado.	20	4	17	6
	Número de luminarias expandidas.	5.000	2.288	2.120	1.500
	Número de proyectos en tecnología LEDS implementados.	4	2	4	1

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Número de puntos de telemedida instalados y puestos en marcha.	110	8	24	30
Número de proyectos pilotos de telegestión implementados.	3	1	1	1
Número de usuarios rurales beneficiados con potabilización de agua.	1.322 Usuarios	272	0	350
Número de usuarios rurales beneficiados con potabilización de agua.	500	0	320	200

7. PROGRAMA: PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CIUDADANA

7.1. SUBPROGRAMA: OBRAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Contrato No.	Objeto	Contratista	Valor	Estado
408 de 2013	Construcción de gimnasios al aire libre y parques infantiles para el Municipio de Bucaramanga - Santander	CONSORCIO GIMNASIO JORDAN - ROJAS	\$ 3.199.007.663,38	Ejecución 100%

A continuación los sitios los cuales fueron intervenidos en cumplimiento del objeto contractual:

COMUNA	DESCRIPCION-UBICACIÓN	GIMNASIO	JUEGOS INFANTILES
1	COLORADOS-CALLE 52N CARRERA 25	1	1
1	CAFÉ MADRID-ESTACION FASE I	2	1
2	SAN CRISTOBAL-PARQUE CRA 24 CON CALLE 1 Y 2	1	1
3	COMUNEROS-CRISTO REY CALLE 9 CARRERA 10	1	1
3	SAN FRANCISCO-GLORIETA SAN FRANCISCO	1	1
4	BARRIO LA JOYA-CALLE 37 CARRERA 7 OCC	1	1
4	BARRIO SANTANDER-PARQUE SAN CAYETANO CALLE 30 CARRERA 5	1	0
5	CAMPO HERMOSO-PARQUE DE LA VIDA CALLE 45 CARRERA 1	1	1
6	BARRIO CANDILES-CALLE 50 ENTRE CARRERA 12 Y 13	1	0
8	BARRIO CANELOS-CARRERA 12 CALLE 50	1	1
9	BARRIO DIAMANTE I-CALLE 105 Y 106 ENTRE CARRERA 30 Y 31	1	0
10	BARRIO PROVENZA-PARQUE LA VIRGEN CARRERA 21ª CON CALLE 109	1	0

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

11	BARRIO EL PORVENIR-PARQUE MOLINO CALLE 104 B Y 104 CARRERA 7 A Y 7	1	1
13	BARRIOS LOS PINOS-PARQUE CALLE 10 Y 11 CON CARRERA 35	1	1
17	BARRIO MUTIS-PARQUE LAS PALMAS CARRERA 7 W CALLE 55	1	1
1	TEJAR NORTE II-CARRERA 10B CALLE 17	1	1
9	NUEVA GRANADA-CALLE 71 CARRERA 20 Y 21	1	1
17	MONTERREDONDO-CALLE 65 CARRERA 11W	1	0
14	BUENOS AIRES-KILOMETRO 4 VIA CUCUTA	1	1
6	LA VICTORIA-CALLE 69 CARRERA 14 Y 16	1	0
17	PRADOS DEL MUTIS-CARRERA 19 W CALLE 61	1	1
12	LAS MERCEDES – CALLE 62 CARRERA 27	1	1
13	SAN ALONSO – VILLA OLIMPICA ESTADIO ALFONSO LOPEZ	1	1
10	FONTANA-CAMINODROMO CALLE 98 CARRERA 19 Y 21B	1	0
7	CIUDELA-PARQUE DE LAS CIGARRAS	1	0
13	ANTONIA SANTOS SUR-PARQUE DE LOS NIÑOS	1	0

A continuación registro fotográfico de los gimnasios y parques infantiles que fueron instalados



Para la presente vigencia, se está estructurando la etapa precontractual del proyecto: CONSTRUCCION DE GIMNASIOS Y PARQUES INFANTILES FASE II, para intervenir los siguientes sitios:

COMUNA	DESCRIPCION-UBICACIÓN	GIMNASIO	JUEGOS INFANTILES
1	BARRIO KENNEDY-PARQUE PRINCIPAL	1	0
1	BARRIO VILLAS DE SAN IGNACIO PARTE ALTA	1	1
4	BARRIO DON BOSCO	1	1
6	BARRIO LA SALLE	1	0
7	BARRIO CIUDELA REAL DE MINAS-CANCHA EL BUENO	1	1
8	BARRIO PABLO VI-CANCHA DE FUTBOL	1	0
4	BARRIO LA FERIA (PASEO LA FERIA)	1	1

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

10	BARRIO DIAMANTE II – AL LADO DE LA IGLESIA	1	1
10	PROVENZA-CARRERA 25 CON CALLE 10-DISCAPACIDAD	1	0
11	BARRIO SANTA MARIA – CALLE 103B CON CARRERA 13	1	0
11	BARRIO EL ROCIO	1	1
13	BARRIO BOLIVAR – PARQUE PRINCIPAL	1	1
16	BARRIO EL TEJAR – INTERCAMBIADOR NEOMUNDO	1	0
17	BARRIO MANZANARES	1	1

Contrato No.	Objeto	Contratista	Valor	Estado
484 de 2013	Construcción mantenimiento y mejoramiento de juegos infantiles y gimnasios metálicos al aire libre en algunos sectores del Municipio de Bucaramanga	INGESAN INGENIERIA SERVICIOS Y ASESORIAS DE SANTANDER S.A.S.	\$ 573.632.440,65	Ejecución 80%

A continuación los sitios los cuales fueron intervenidos en cumplimiento del objeto contractual:

No.	Dirección	No.	Dirección
1	PARQUE DEL ESTADIO	14	PARQUE CONCORDIA CALLE 53 CON CRA 21
2	PARQUE COMUNEROS CRA 25 CALLE 7A	15	PARQUE B. NUEVA GRANADA CRA 19 CON CALLE 70
3	PARQUE BARRIO BALCONCITOS	16	PARQUE B. NUEVA GRANADA CALLE 71 CON CRA 20
4	BARRIO MONTERREDONDO –PARQUE CALLE 69W CON CRA 27	17	PARQUE B. NUEVA GRANADA CRA 16 CON CALLE 71
5	BARRIO MONTERREDONDO PARQUE NACUMAS	18	PARQUE B. NUEVA GRANADA CALLE 70 MINI
6	BARRIO MONTERREDONDO-PARQUE CALLE 63W CON CRA 33	19	PARQUE BARRIO LA SALLE
7	BARRIO MONTERREDONDO-PARQUE CALLE 64W CON CRA 27	20	PARQUE BARRIO CIUDAD BOLIVAR
8	ESTORAQUES-PARQUE CALLE 59W CON CRA 47 A	21	PARQUE B. SAN MARTIN CALLE 73 CON CRA 26
9	ESTORAQUES-PARQUE CALLE 58W CON CRA 42 A	22	PARQUE B. SAN MARTIN CRA 30 CON CALLE 80
10	ESTADIO CANCHA MARTE	23	PARQUE BARRIO EL SOL CALLE 71D CON CRA 31
11	PARQUE DE LOS NIÑOS	24	PARQUE NUEVA FONTANA
12	PARQUE CONCORDIA CALLE 50 CON CRA 21	25	PARQUE QUEBRADA LA IGLESIA
13	PARQUE CONCORDIA CALLE 52 CON CRA 21		

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

A continuación registro fotográfico de algunos sitios que se intervinieron.



CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	LOGRO 2012	LOGRO 2013	META 2014
PARTICIPACION COMUNITARIA Y CIUDADANA	Número de obras de interés comunitario realizadas en los barrios.	180	26	74	50

• OTROS PROYECTOS EJECUTADOS POR LA SECRETARIA

Construcción y remodelación de planteles educativos a cargo del Municipio de Bucaramanga

Se realizó mantenimiento general de cinco instituciones educativas oficiales del Municipio de Bucaramanga, en cumplimiento del Contrato No. 140 del 09 de Mayo de 2013 con una Inversión de \$ 495.526.278

➤ SEDE C: COL. AURELIO MARTINEZ MUTIS	\$ 61.428.578
➤ SEDE B: COL. POLITECNICO	\$ 45.620.280
➤ SEDE C: COL. POLITECNICO	\$ 34.682.283
➤ COL. CAMACHO CARREÑO	\$ 172.328.306
➤ COL. CAFÉ MADRID	\$ 181.466.831

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

✓ LICITACION PUBLICA

Durante la presente vigencia se adjudicó la Licitación Publica SI-LP-001-2014 cuyo objeto es "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS GABRIELA MISTRAL Y JORGE ARDILA DUARTE (SEDE B) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. **Por valor de \$ 1.900.973.188,10**

Construcción y remodelación de puntos vive digital

Se realizó la construcción y remodelación de varios puntos vive digital, en cumplimiento del Contrato No. 376 del 13 de Septiembre de 2013 con una inversión de \$ 880.233.591

COLEGIO SANTANDER



COLEGIO DEL ORIENTE - MORRORICO



INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA


BARRIO CAFÉ MADRID



Contrato No.	Objeto	Contratista	Valor	Estado
101 de 2013	Adecuación de la planta física del edificio ubicado entre calles 41 y 42 con carrera 13 para el funcionamiento del archivo Central Municipal.	UNION TEMPORAL ARCHIVO CENTRAL	\$297.046.053,43	Ejecución 100%

El proyecto consistió en las obras de adecuaciones necesarias para poner en funcionamiento el Archivo Central del Municipio de Bucaramanga en la edificación de cuatro (4) pisos localizada en la cll 42 con cra 13 esquina. El área adecuada fue de 1.000m²

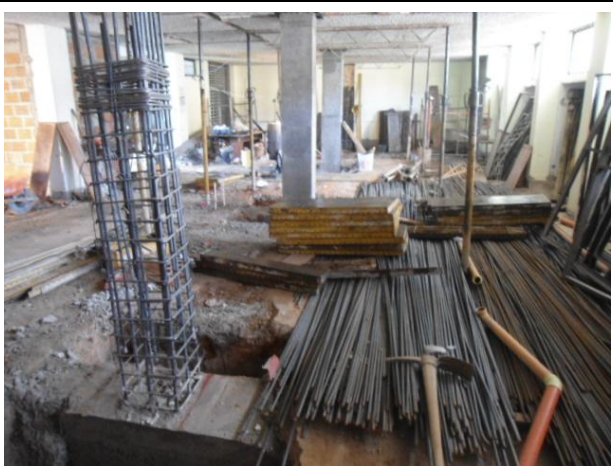

	
Reforzamiento Estructural de la edificación	Estado Actual

8. ACCIONES POPULARES

Durante el periodo de Octubre a Diciembre de 2013, los Juzgados Administrativos y el Tribunal Administrativo de Santander han proferidos en ACCIONES POPULARES y ACCIONES DE TUTELA, fallos a favor y en contra en los procesos que cursan en los despachos judiciales de esta Secretaria de la siguiente manera:

Acciones Populares

Fallos a favor del Municipio de Bucaramanga	10
Fallos en contra	9

Acciones de Tutela: Durante este periodo se tramitaron siete (7) acciones de tutela en contra del Municipio

Acciones de tutela recibida	7
Tramitadas	7
(5 a favor del Municipio y 2 en contra)	

Así mismo la oficina de jurídica de esta Secretaria, recibió algunos fallos de procesos adelantados en las diferentes Secretarias de despacho de la Administración Municipal, donde se ordena la ejecución de obras, las cuales fueron remitidas a la Oficina de contratación para ser incluidas en el contrato que se va a suscribir para cumplimiento de ordenes judiciales:

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Radicado	Juzgado	Descripción
2004-0851	Juzgado Primero Administrativo	Recuperación de espacio público (antejardín)
2008-0328	Juzgado Primero Administrativo	Recuperación de espacio público (antejardín)
2010-0168	Juzgado Primero Descongestión	Arreglo Parque Paseo La Feria
2008-0091	Juzgado Trece Administrativo	Retiro de Obstáculos en área espacio publico
2009-0130	Juzgado Once Administrativo	Retiro Obstáculo en la calzada-Cra 21 Calle 12
2010-0241	Juzgado Primero Descongestión	Adecuación andenes Conjunto Sierra Verde
2004-1485	Juzgado Séptimo Descongestión	Adecuación anden. Calle 17 cra 24
2009-0351	Juzgado Cuarto Descongestión	Recuperación anden y zona verde calle 37 cra 27
2009-0382	Juzgado Cuarto Descongestión	Recuperación anden y zona verde cra 24 cll 107
2009-0333	Juzgado Cuarto Descongestión	Recuperación de antejardín-anden cra 17 calle 65

9. ROTURAS

Dando cumplimiento a la normatividad vigente para las licencias de intervención y ocupación del espacio público en lo relacionado con redes de servicios públicos y/o de particulares, la secretaria de infraestructura relaciona las actividades desarrolladas de Septiembre a Diciembre de 2013.

A continuación se presenta las diferentes intervenciones en el Espacio Público


INTERVENCIONES EN EL ESPACIO PUBLICO EN LO RELACIONADO CON REDES DE SERVICIOS PUBLICOS				
Septiembre-Diciembre de 2013	Domiciliarias	Edificios obra nueva	Redes	Total M2
amb	633,93	1.847,85	5.390,98	7.872,76
EMPAS	174,64	996,92	5.577,73	6.749,29
GASORIENTE	174,95	473,50	347,00	995,45
PROMITEL			248,84	248,84
PROMIGAS			221,65	221,65
ESSA	55,73	1.299,41		1.355,14
UNE			112,86	112,86
ALUMBRADO PUBLICO			169,28	169,28
CLARO COLOMBIA	28,14	80,94	309,47	418,55
TOTAL	1.067,39	4.698,62	12.377,81	18.143,82

INFORME DE GESTION 2014-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

10.TOTAL INVERSION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIGENCIA 2013

SUBPROGRAMAS	INVERSION	%
Escenarios para la Gente	\$ 7.818.730.544	4,77
Conocimiento Prevención y Reducción del Riesgo	\$ 13.453.987.640	8,21
Espacios Públicos Sostenibles	\$ 4.175.579.207	2,55
Ordenamiento del Territorio	\$ 11.060.439.186	6,75
Construcción y/o Mantenimiento de Espacios Públicos para la Gente	\$ 2.209.996.799	1,35
Construcción y Mantenimiento de la Malla Vial Urbana	\$ 16.972.975.514	10,35
Construcción y Mantenimiento de la Malla Vial Rural	\$ 4.311.829.629	2,63
Construcción de Obras de Infraestructura Vial	\$ 58.270.290.284	35,55
Construcción y Mantenimiento de Plazas de Mercado	\$ 2.301.441.457	1,40
Servicios Públicos Amigables	\$ 31.203.907.959	19,04
Obras con Participación Ciudadana	\$ 12.134.854.894	7,40
TOTAL	\$ 163.914.033.113	100%

TOTAL INVERSION VIGENCIA 2013

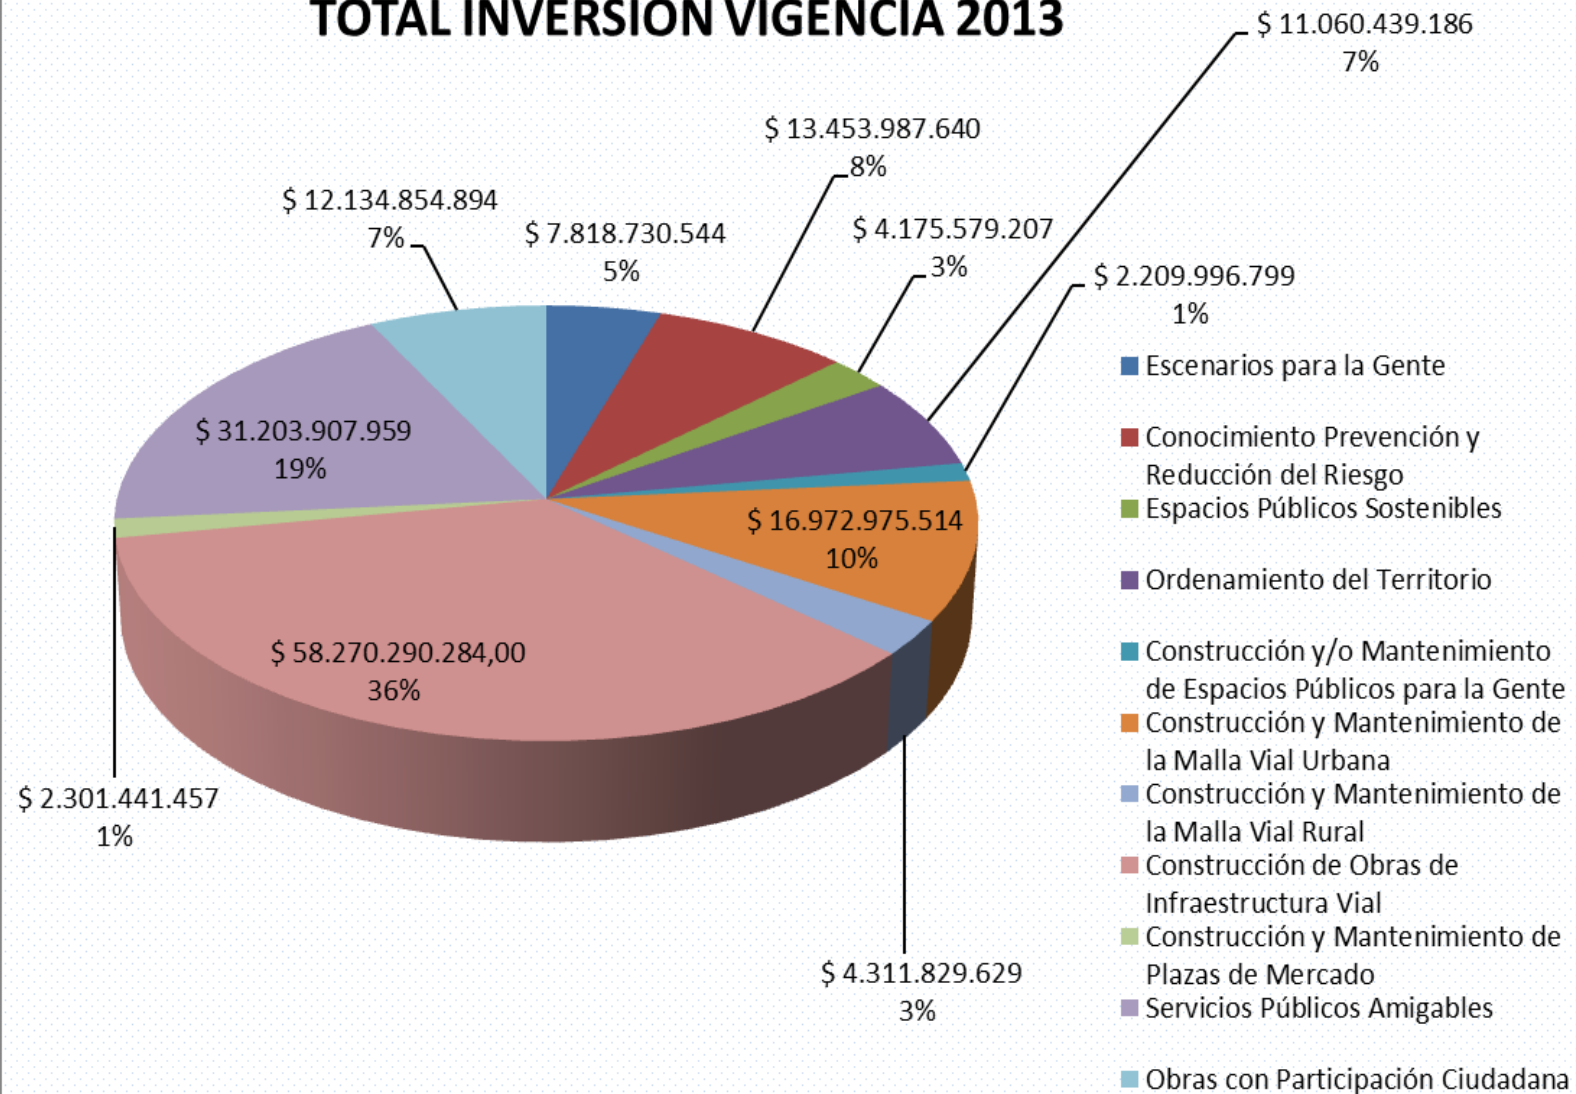

SUBPROGRAMAS
