

INFORME DE GESTIÓN

II TRIMESTRE 2023

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

www.bucaramanga.gov.co



**GOBERNAR
ES HACER**

INFORME DE GESTION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

En el presente informe se resume los principales avances que la Secretaria de Infraestructura ha generado en el segundo trimestre del año, en el cual ha contrato, ejecutado y realizado las gestiones pertinentes para el control del avance de las diferentes obras que ejecuta la Secretaria, así mismo contiene la información correspondiente a las acciones adelantadas en los diferentes programas de la Secretaría de Infraestructura con los indicadores de cumplimiento de las metas asignadas en el Plan de Desarrollo “Bucaramanga una Ciudad de Oportunidades” para el segundo trimestre de la vigencia 2023, presentando el avance de cumplimiento como su ejecución presupuestal.

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL

El presupuesto definitivo a 30 de junio de 2023 de la Secretaria de Infraestructura, asciende a \$ 321.110.461.959,78 y ha tenido apropiaciones y compromisos por valor de \$ 191.890.254.976,66, equivalente al **59,76%** de ejecución.

| PROGRAMA | DISTRIBUCION POR PROGRAMA | % PROGRAMA | COMPROMISO | % EJECUCION |
|--|------------------------------|----------------|------------------------------|---------------|
| Gobernanza Del Agua, Nuestra Agua, Nuestra Vida | \$ 1.899.370.856,24 | 0,59% | \$ 1.899.370.856,24 | 0,59% |
| Estudios Y Diseños De La Infraestructura | \$ 300.000.000,00 | 0,09% | \$ - | 0,0% |
| Desarrollo Del Campo | \$ 2.928.335.427,76 | 0,91% | \$ 2.928.335.427,76 | 0,91% |
| Mejoramiento Y Mantenimiento De Parques Y Zonas Verdes | \$ 7.888.233.615,50 | 2,46% | \$ 5.716.895.793,65 | 1,78% |
| Equipamiento Comunitario | \$ 102.267.891.105,15 | 31,85% | \$ 48.408.276.552,98 | 15,08% |
| Infraestructura De Transporte | \$ 23.086.608.815,75 | 7,19% | \$ 7.998.629.009,58 | 2,49% |
| Alumbrado Público Urbano Y Rural | \$ 79.477.276.068,93 | 24,75% | \$ 35.896.222.586,14 | 11,18% |
| Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer | \$ 23.593.754.457,45 | 7,35% | \$ 9.373.533.132,31 | 2,92% |
| Cobertura Y Equidad De La Educación Preescolar, Básica Y Media | \$ 79.668.991.613,00 | 24,81% | \$ 79.668.991.613,00 | 24,81% |
| TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA 2023 | \$ 321.110.461.959,78 | 100,00% | \$ 191.890.254.971,66 | 59,76% |

A continuación, se detalla la gestión que ha realizado la Secretaria de Infraestructura en las líneas estratégicas y programas en el segundo trimestre de 2023

LINEA ESTRATEGICA 1. BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR

COMPONENTE: EDUCACIÓN DE CALIDAD, GARANTÍA DE UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES

PROGRAMA: COBERTURA Y EQUIDAD DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA

| INDICADOR | META Programada 2023 | Meta Ejecutada 2023 | AVANCE | RECURSOS PROGRAMADOS | RECURSOS COMPROMETIDOS |
|---|----------------------|---------------------|--------|----------------------|------------------------|
| Número de intervenciones realizadas a colegios públicos de Bucaramanga. | 3 | 3 | 100% | \$ 79.668.991.613,00 | \$ 79.668.991.613,00 |

En este programa se adelantaron las gestiones pertinentes para lograr adelantar el contrato interadministrativo con FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER y el Municipio de Bucaramanga

1.CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 166 de 2023: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VALOR FISCAL INICIAL : \$ 79.668.991.613,00
 PLAZO INICIAL : VEINTE (20) MESES
 FECHA DE INICIO : LEGALIZACION

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO

COMPONENTE: BUCARAMANGA UNA ECO-CIUDAD

PROGRAMA: GOBERNANZA DEL AGUA, NUESTRA AGUA, NUESTRA VIDA

| INDICADOR | META Programada 2023 | Meta Ejecutada 2023 | AVANCE | RECURSOS PROGRAMADOS | RECURSOS COMPROMETIDOS |
|---|----------------------|---------------------|--------|----------------------|------------------------|
| Porcentaje de avance en la repotenciación del alcantarillado sanitario y pluvial. | 100% | 10% | 10% | \$1.899.370.856,24 | \$1.899.370.856,24 |

En este programa se adelantaron las gestiones para poder firmar convenio Interadministrativo con el Acueducto de Bucaramanga y el Municipio de Bucaramanga.

1.CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 171 de 2023: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, INTERVENTORÍA, GERENCIA Y SUPERVISIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO LA FORTUNA; Y LIMPIEZA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, GERENCIA Y SUPERVISIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS PUNTOS ESPECÍFICOS DEFINIDOS.

VALOR FISCAL INICIAL : \$ 1.899.370.856,24
 PLAZO INICIAL : CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS
 FECHA DE INICIO : LEGALIZACION

**LÍNEA ESTRATÉGICA 3. BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA:
EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES**

COMPONENTE: CONECTIVIDAD PARA COMPETITIVIDAD Y LA INTERNACIONALIZACIÓN

PROGRAMA: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA INFRAESTRUCTURA

| INDICADOR | META Programada 2023 | Meta Ejecutada 2023 | AVANCE | RECURSOS PROGRAMADOS | RECURSOS COMPROMETIDOS |
|--|----------------------|---------------------|--------|----------------------|------------------------|
| Porcentaje de estudios y/o diseños requeridos realizados para el desarrollo de proyectos de infraestructura. | 100% | 0% | 0% | \$ 300.000.000,00 | \$ 0 |

En este programa se adelantaron las gestiones para poder firmar convenio Interadministrativo No. 3985-2023, celebrado entre el Ministerio de Cultura y el Municipio de Bucaramanga, cuyo objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA RECUPERACIÓN DEL COLISEO PERALTA – BIEN DE INTERES CULTURAL DE AMBITO NACIONAL – DECRETO 292 DEL 24 DE FEBRERO DE 1975, EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. Los valores totales de los aportes del Convenio son:

APORTE MINISTERIO DE CULTURA: \$ 500.000.000,00
 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA: \$ 300.000.000,00
TOTAL: \$ 800.000.000,00

De conformidad con lo anterior y para la recuperación integral del Coliseo se requiere la elaboración de los estudios técnicos y el proyecto de intervención necesario como base para las futuras obras de intervención.

Así mismo se continúa ejecutando los diferentes proyectos dentro de este programa, los cuales se detallan a continuación.

1. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 331 de 2021: “REALIZAR LA REVISION Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA SOLUCION VIAL DE LA CALLE 53-54. CONEXIÓN ORIENTE-OCCIDENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE, LA INCORPORACION DE ELEMENTOS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SU ARTICULACIÓN CON LAS INTERVENCIONES URBANAS EN EL CORREDOR”.

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| VALOR FISCAL INICIAL: | \$ 2.885.000.000,00 |
| VALOR FISCAL ADICIONAL: | N.A |
| VALOR FISCAL TOTAL: | \$ 2.885.000.000,00 |
| PLAZO INICIAL: | DIEZ (10) MESES |
| PLAZO ADICIONAL: | CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS |
| PLAZO INICIAL + ADICIONAL: | (10) MESES Y (45) DÍAS |
| FECHA DE INICIO: | 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 |
| PORCENTAJE AVANCE: | 100% |

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato interadministrativo se encuentra finalizado y firmada el acta de recibo final, finalmente se encuentra en proceso de liquidación, a continuación, se enumeran las actividades adelantadas.

Componente 1. Conceptualización y modelado para la integración de elementos de movilidad sostenible e identificación de intervenciones urbanas en el corredor oriente – occidente.

Componente 2. Alcances de la actualización de los diseños para la construcción del Tramo 1. Calle 53-54 entre carreras 17 y 30.

Componente 3. Estudios ambientales requeridos para la intervención.

Componente 4. Alcances de la actualización de los diseños para la construcción del Tramo 2. Calle 53-54-55 entre carreras 9 (Viaducto Provincial) y 17.

Los renders corresponden al tramo 2 del proyecto, componente 4.



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga

**GOBERNAR
ES HACER**



2. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 195 DE 2022 -: ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA “ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS VEREDALES EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.”

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Valor fiscal: | \$ 867.866.417,58 |
| Plazo inicial: | Cuatro (4) meses Quince (15) días |
| Plazo Adicional 1: | Dos (2) meses |
| Plazo Total: | Dos (2) meses |
| Fecha de inicio: | 17 de agosto de 2022 |
| Fecha de terminación: | 29 de diciembre de 2022 |
| Nueva Fecha de Terminación: | 3 de julio de 2023 |
| Porcentaje avance: | 81,26 % |

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra actualmente en ejecución, con diagnostico la de los tres acueductos (Santa Rita, Capilla Baja y San Ignacio-La Sabana

PROGRAMA: DESARROLLO DEL CAMPO

| INDICADOR | META Programada 2023 | Meta Ejecutada 2023 | AVANCE | RECURSOS PROGRAMADOS | RECURSOS COMPROMETIDOS |
|--|----------------------|---------------------|--------|----------------------|------------------------|
| Porcentaje de avance en la construcción del acueducto veredal. | 100% | 10% | 10% | \$ 2.928.335.427,76 | \$ 2.928.335.427,76 |

En este programa se adelantaron las gestiones para poder firmar convenio Interadministrativo con el Acueducto de Bucaramanga y el Municipio de Bucaramanga.

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 171 de 2023: PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, INTERVENTORÍA, GERENCIA Y SUPERVISIÓN DEL ACUEDUCTO Y UNIDADES DE SANEAMIENTO BÁSICO [INDIVIDUALES] DE LA VEREDA SANTA RITA Y VEREDA CAPILLA BAJA 1 ETAPA

| | | |
|----------------------|---|-------------------------------------|
| VALOR FISCAL INICIAL | : | \$ 2.928.335.427,76 |
| PLAZO INICIAL | : | CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS |
| FECHA DE INICIO | : | LEGALIZACION |

2.CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 170 de 2023: “SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA GARANTIZAR LA COBERTURA DEL MINIMO VITAL DE AGUA A LOS SECTORES DE LOS CORREGIMIENTOS 1,2 Y 3, EN VIRTUD DE LAS ACCIONES JUDICIALES EXISTENTES EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”.

| | |
|---------------|------------------|
| Valor fiscal: | \$ 155.875.613,0 |
|---------------|------------------|

Plazo inicial: Seis (6) meses, hasta el 30 de diciembre de 2023 o hasta agotar el presupuesto (lo primero que ocurra)

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en legalización.

**LÍNEA ESTRATÉGICA 4. BUCARAMANGA CIUDAD VITAL:
LA VIDA ES SAGRADA**

COMPONENTE: CONECTIVIDAD PARA COMPETITIVIDAD Y LA INTERNACIONALIZACIÓN

PROGRAMA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES

| INDICADOR | META Programada 2023 | Meta Ejecutada 2023 | AVANCE | RECURSOS PROGRAMADOS | RECURSOS EJECUTADO |
|--|----------------------|---------------------|--------|----------------------|---------------------|
| Mantener el 100% de los parques, zonas verdes y su mobiliario. | 100% | 100% | 100% | \$7.888.233.615,50 | \$ 5.716.895.793,65 |

Dentro de este programa se vienen adelantando proyectos para el mantenimiento y conservación en los diferentes parques y zonas verdes del Municipio así:

1. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 144 de 2023: ACTIVIDADES DE TALA Y MANEJO INTEGRAL DEL COMPONENTE ARBOREO UBICADOS EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

VALOR FISCAL : \$ 659.773.955,15
 PLAZO INICIAL : SEIS (06) MESES Y NUEVE (09) DIAS
 FECHA INICIO : 23 DE JUNIO DE 2023
 FECHA TERMINACION : 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 % EJECUCION : 0%

Actividades: garantizar la atención de las talas o el manejo integral que requieren los árboles ubicados en el espacio público y cuentan con autorización de la CDMB para su intervención, esta actividad se desarrollara bajo programación entregada por la secretaria de infraestructura de acuerdo a las autorizaciones expedidas por la autoridad ambiental.

Así mismo se continúa ejecutando los diferentes proyectos dentro de este programa, los cuales se detallan a continuación.

2. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 313 DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022:

Se suscribió un convenio Interadministrativo con el AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA el día 11 de noviembre del 2022, cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y EMBELLECIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

Se firmó acta de inicio el día 12 de diciembre del 2022 con una duración en tiempo de ocho meses para garantizar el mantenimiento diario y permanente de los parques y áreas verdes de la ciudad.

Durante la ejecución del convenio se ha realizado la atención de 225 parques, 140 zonas verdes, 23 separadores, 13 Glorietas y 7 Ciclorrutas, todas estas áreas cuentan con cobertura vegetal que requieren el corte de césped o maleza. De igual manera se cuenta con 80 parqueros permanentes en los diferentes parques de la ciudad, ubicados en las 17 comunas y en la vereda de vijagual.

De igual manera durante este año se ha realizado la siembra de 600 árboles forestales y de dos mil plantas ornamentales.

| Resumen financiero del Convenio Interadministrativo 313 del 2022 | |
|---|---------------------|
| Valor presupuesto oficial | \$ 4.212.665.314,47 |
| Aportes Municipio | \$ 3.948.051.805,00 |
| Aportes Área Metropolitana | \$ 264.613.509,47 |
| Valor Desembolso Anticipado 1 | \$ 592.208.617,00 |
| Valor Desembolso 2 | \$ 195.207.300,00 |
| Valor Desembolso 3 | \$ 235.453.278,60 |
| Valor Desembolso 4 | \$ 343.135.770,00 |
| Valor Desembolso 5 | \$ 411.856.218,00 |
| Valor Desembolso 6 | \$ 483.468.835,56 |





PROGRAMA: EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

| INDICADOR | META Programada 2023 | Meta Ejecutada 2023 | AVANCE | RECURSOS PROGRAMADOS | RECURSOS EJECUTADO |
|---|----------------------|---------------------|--------|-----------------------|----------------------|
| Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad construido y/o mejorado. | 0 | 43.317 | 100% | \$ 102.267.891.105,15 | \$ 48.408.276.552,98 |

Dentro de este programa se han venido realizando las gestiones necesarias para la contratación de los siguientes proyectos.

1. CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BORDE SUR LA VICTORIA EN EL BARRIO LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. Adjudicado
2. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ESPACIO PÚBLICO, ADYACENTE A LA INSTITUCION EDUCATIVA CAMACHO CARREÑO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. Observación al informe de evaluación.
3. Se adelantó convenio Interadministrativo No. 165 de 2023, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P PARA LA IMPLEMENTACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO 2023 EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA". **Por valor de \$ 3.300.673.603,00**

APORTE DEL MUNICIPIO: \$ 1.800.000.000,00

FIGURAS MUNICIPIO: \$ 786.478.354,00

APORTE ESSA \$ 714.195.249,00

Así mismo se continúa ejecutando los diferentes proyectos dentro de este programa, los cuales se detallan a continuación.

1. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 448 DE FECHA 30 de diciembre de 2022: “CONSTRUCCIÓN CENTRO VIDA Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS ANTONIA SANTOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.”

VALOR INICIAL: \$ 9.097.194.874,05
 VALOR TOTAL ACTUAL: \$ 9.097.194.874,05
 VALOR ANTICIPO INICIAL: \$ 2.620.556.313,30
 TOTAL ANTICIPOS: \$ 2.620.556.313,30
 PLAZO INICIAL 10 MESES
 PLAZO TOTAL 10 MESES
 FECHA DE INICIO: 13 de febrero de 2023
 FECHA DE TERMINACIÓN: 12 de diciembre de 2023
 % EJECUCION: 14,17%

ESTADO DEL CONTRATO : EN EJECUCION: El contrato se encuentra en proceso de ejecución con un avance del 14,17%, en este momento se están realizando los izados de la estructura metálica para los módulos A y B, junto con el armado del acero del tanque de almacenamiento y la conformación de los rellenos de las zonas de urbanismo.

Se han culminado en su totalidad el capítulo de preliminares y se ha avanzado en la excavación e instalación de redes.

| MODULO A | MODULO B |
|------------------------|-----------|
| RECEPCION | LUDOTECA |
| BODEGA | AUDITORIO |
| PELUQUERIA | |
| TERAPIA OCUPACIONAL | |
| TRABAJO SOCIAL | |
| PSICOLOGIA | |
| COORDINACION | |
| BAÑOS Y CUARTO DE ASEO | |

Dentro del proyecto se cuenta con valla informativa, cerramiento perimetral y estructura para lavado de llantas, además se realizó construcción provisional de vestier, comedor, zona de lavado de manos y zona para fraguado de cilindros

Izado de estructura metalica, modulo A y B



Acero estructural, tanque de almacenamiento



Acero estructural, viga de cerramiento



**2.CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 388 DE FECHA 19 de diciembre de 2022:
“ADECUACIÓN DE LOS SALONES COMUNALES DE LOS BARRIOS LAS CONCORDIA
Y SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”**

FRENTE 1: SALON LA CONCORDIA

| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| VALOR INICIAL | : | \$1.982.750.130,00 |
| VALOR FRENTE 1 | : | \$935.344.963,98 |
| VALOR ANTICIPO | : | \$571.369.406,40 (30% VR AJUSTADO / PLIEGOS) |
| PLAZO INICIAL | : | 4 MESES |
| FECHA DE INICIO | : | 06 de febrero de 2023 |
| FECHA TERM. INICIAL. | : | 05 de junio de 2023 |
| NUEVA FECHA DE TERM. | : | No Aplica |
| ESTADO DEL CONTRATO: | : | SUSPENDIDO |
| PORCENTAJE AVANCE | : | 11.67% |
| PORCENTAJE AVANCE TOTAL CONSOLIDADO: | : | 18.12% |

ESTADO DEL CONTRATO: Siguiendo los diseños establecidos, se realizaron actividades del capítulo de preliminares, como corte y demolición de muros en mampostería junto al cargue, retiro y disposición final. Así mismo, se ejecutaron actividades, como acabados de pared, excavación manual en zanja, escalera y/o gradería sobre terreno en concreto. En este periodo de tiempo se realizó el suministro e instalación de acero de refuerzo figurado, malla electrosoldada y la instalación de redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas.



ANTES: Relleno para estructuras con Subbase granular, compactación mecánica con apisonador.



ACTUAL: Friso liso pared con mortero 1:4 e=2 cm, incluye filos y dilataciones.



ANTES: Muro en mampostería H-10 ladrillo cocido.



ACTUAL: Acero de refuerzo figurado.



RENDER SALON LA CONCORDIA

3.CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 388 DE FECHA 19 de diciembre de 2022:
“ADECUACIÓN DE LOS SALONES COMUNALES DE LOS BARRIOS LAS CONCORDIA
Y SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”

FRENTE 2: SALON SAN LUIS

| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| VALOR INICIAL | : | \$1.982.750.130,00 |
| VALOR FRENTE 2 | : | \$1.047.405.166,02 |
| VALOR ANTICIPO | : | \$571.369.406,40 (30% VR AJUSTADO / PLIEGOS) |
| PLAZO INICIAL | : | 4 MESES |
| FECHA DE INICIO | : | 06 de febrero de 2023 |
| FECHA TERM. INICIAL. | : | 05 de junio de 2023 |
| NUEVA FECHA DE TERM. | : | No Aplica |
| ESTADO DEL CONTRATO: | | SUSPENDIDO |
| PORCENTAJE AVANCE | : | 23.88% |
| PORCENTAJE AVANCE TOTAL CONSOLIDADO: | | 18.12% |

ESTADO DEL CONTRATO: Siguiendo los diseños establecidos, se realizaron actividades del capítulo de demoliciones, como lo fueron las columnas y vigas en concreto existentes. Así mismo, se ejecutaron excavaciones manuales y en máquina junto a su retiro y disposición final. En este periodo de tiempo se realizó el suministro e instalación de muros divisorios, acero de refuerzo figurado, malla electrosoldada, zapata en concreto mezclado en sitio, viga de cimentación, escalera y/o gradería sobre terreno mezclado, viga aérea en concreto, placa aérea maciza en concreto junto a la instalación de redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas.





ACTUAL: Zapata en concreto 3000 PSI mezclada con arena y grava en el sitio.



ACTUAL: Vigas de cimentación en concreto de 3000 PSI.



RENDER SALON SAN LUIS

4. CONTRATO DE OBRA 432 DE 2022- CONSORCIO EDIFICACIONES “CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS AL BIEN DE INTERÉS CULTURAL TEATRO COLISEO PERALTA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Valor inicial: | \$ 203.550.545,00 |
| Plazo Inicial: | Quince (15) días |
| Plazo adicional 1: | Un (1) mes |
| Plazo adicional 2: | Un (1) mes |
| Plazo adicional 3: | Veinte (20) días |
| Plazo total: | Tres (3) meses y Cinco (5) días |
| Fecha de Inicio: | 30 de diciembre de 2022 |
| Fecha de terminación: | Contrato suspendido |

Porcentaje avance: 80%


ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra suspendido



5. CONTRATO DE OBRA No. 387 DE 2022: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA “CENTRO CAMINABLE” EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.”

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| VALOR FISCAL INICIAL: | \$ 9.072.944.903,00 |
| VALOR FISCAL ADICIONAL: | N.A. |
| VALOR FISCAL TOTAL: | \$ 9.072.944.903,00 |
| PLAZO INICIAL: | DIEZ (10) MESES |
| PLAZO ADICIONAL: | N.A. |
| FECHA DE INICIO: | 21 DE FEBRERO DE 2023 |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 20 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| PORCENTAJE AVANCE: | 0 % |

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en ejecución con un avance del 0 %, hasta el momento se han adelantado actividades como el reajuste de diseños, replanteo topográfico al detalle y trabajo social:

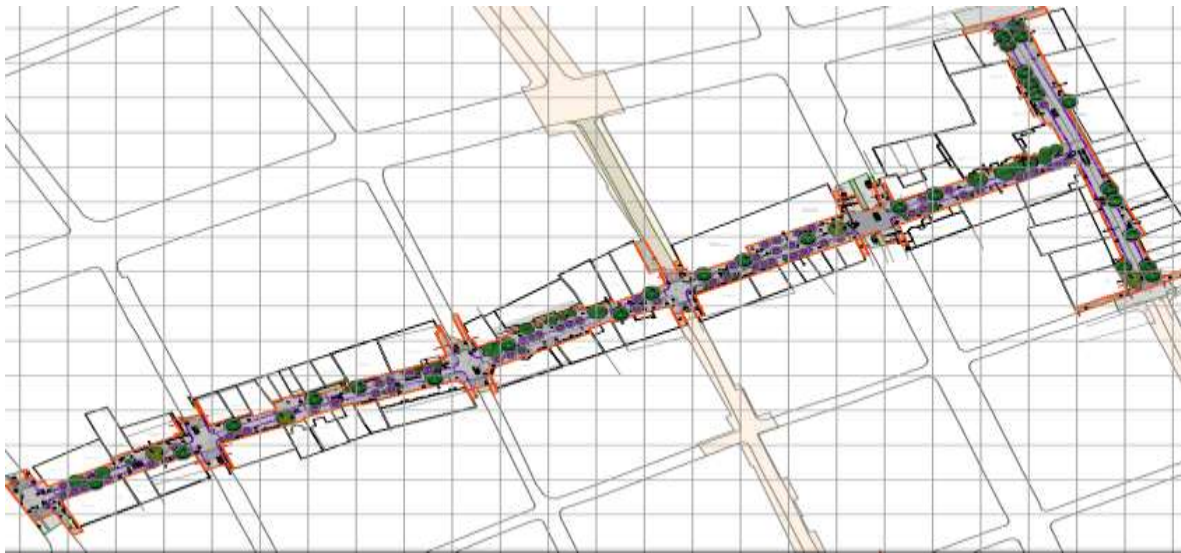

6. CONTRATO DE OBRA No. 396 DE 2022: “MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN LA PLAZOLETA LUIS CARLOS GALÁN Y PARQUE GARCIA ROVIRA ENMARCADOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA PLAN CENTRO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.”

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| VALOR FISCAL INICIAL: | \$ 10.995.207.368,00 |
| VALOR FISCAL ADICIONAL: | N.A. |
| VALOR FISCAL TOTAL: | \$ 10.995.207.368,00 |
| PLAZO INICIAL: | OCHO (8) MESES |
| PLAZO ADICIONAL: | N.A. |
| FECHA DE INICIO: | 06 DE MARZO DE 2023 |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 05 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| PORCENTAJE AVANCE: | 12 % |

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en ejecución con un avance del 12 %, hasta el momento se han adelantado actividades como demoliciones, desmontes, instalación de sardineles, excavaciones iniciales, corte de pavimento y demolición, entre otros, se adjunta imágenes:

PLAZOLETA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO





Corte y demolición de pavimento asfáltico con compresor diésel y martillo, incluye cargue y retiro de material.



Instalación de losetas de piso en piedra Barichara existente – incluye bases en morteros de pega 1:3 de espesor 6 cm

PARQUE GARCIA ROVIRA



Suministro, transporte e instalación de Banco de ducto 3x1-1/2" PVC tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación.



Demolición placa de piso en general con compresor Diesel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final (Incluye pisos, rampas de concreto, adoquín, losa, tableta y cualquier otro tipo de acabado).

7. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 408 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 - ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER. GRUPO 1.

CONTRATISTA : CONSORCIO ADECUACIONES JGV 2022
 INTERVENTOR : CONSORCIO INTERSANTANDER
 SUPERVISOR : WILSON MOTTA RODRIGUEZ
 VALOR INICIAL : \$ 7.031.227.735,05
 VALOR ANTICIPO : \$ 2.109.368.320,52
 PLAZO INICIAL : SEIS (6) MESES
 FECHA DE INICIO : 27 DE FEBRERO DE 2023
 FECHA FINAL : 26 DE AGOSTO DE 2023
 ESTADO DEL CONTRATO : EN EJECUCION.
 PORCENTAJE AVANCE : 70%

ALCANCE DEL CONTRATO

| FRENTE DE OBRA | AVANCE FISICO PROGRAMADO |
|----------------------|----------------------------|
| LAS HAMACAS | \$ 919.625.600,29 |
| NORTE BAJO | \$ 380.963.697,50 |
| SANTANDER | \$ 401.870.758,95 |
| VILLAS DEL PRADO | \$ 321.734.666,44 |
| LOS LEONES | \$ 551.131.635,12 |
| TOTAL GENERAL | \$ 2.575.326.358,30 |



MURO Y GRADERIAS EL ESCENARIO DEPORTIVO NORTE BAJO



ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO HAMACAS- CONSTRUCCION CANCHA Y CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL

8. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 409 DE FECHA 2022 - ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS SECTORES BRISAS DEL MUTIS, PLAZUELA REAL, CIUDADELA REAL DE MINAS, LA SALLE y LA FLORESTA, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

CONTRATISTA : CONSORCIO DEPORTIVOS SM
 INTERVENTOR : CONSORCIO KALROY BUCARAMANGA 13
 SUPERVISOR : WILSON MOTTA RODRIGUEZ
 VALOR INICIAL : \$6.255.943.671,35
 VALOR ANTICIPO : \$1.876.783.101,41
 PLAZO INICIAL : SEIS (6) MESES
 FECHA DE INICIO : 10 DE ABRIL DE 2023
 FECHA FINAL : 09 DE OCTUBRE DE 2023
 ESTADO DEL CONTRATO : EN EJECUCION.
 PORCENTAJE AVANCE : 30%
 ESTADO DEL CONTRATO:

| ESCENARIO DEPORTIVO | VALOR POR PARQUE INCLUIDO (AU) | % REAL | VALOR EJECUTADO | % EJECUTADO |
|--|--------------------------------|-------------|--------------------------|--------------|
| 2.1. EQUIPAMIENTO URBANO BRISAS DEL MUTIS | \$ 1.105.476.603,00 | 18% | \$ 32.278.183 | 0,54% |
| 2.2. ESCENARIO DEPORTIVO PLAZUELA REAL | \$ 732.584.847,00 | 12% | \$ 34.168.140,54 | 0,57% |
| 2.3. GIMNASIOS CIUDAD BOLIVAR | \$ 518.150.693,00 | 9% | \$ 2.671.369,18 | 0,04% |
| 2.4. ESCENARIO DEPORTIVO LA SALLE | \$ 2.555.029.922,00 | 43% | \$ 93.058.469,00 | 1,55% |
| 2.5. EQUIPAMIENTO URBANO FLORESTA | \$ 1.099.589.469,00 | 18% | \$ 9.260.766,00 | 0,15% |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO SIN FONDO DE | \$ 6.010.831.534,00 | 100% | \$ 171.436.927,72 | 2,85% |



PARQUE BRISAS DEL MUTIS



PARQUE BARRIO PLAZUELA REAL- CONSTRUCCION CANCHA Y GIMNASIO



MEJORAMIENTO DEL GIMNASIO EXISTENTE E INSTALACION DE GIMNASIO GRECCO



CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL, GRADERIA CON CUBIERTA, CANCHA MULTIPLE Y SENDEROS PEATONALES



PARQUE BARRIO LA FLORESTA- CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL

**9. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 410 DE FECHA 26 DICIEMBRE 2022:
ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO
DE BUCARAMANGA, SANTANDER LOTE 3**

CONTRATISTA : CONSORCIO PARQUES URBANISTICOS
 INTERVENTOR : CONSORCIO INTERVIAS RS
 SUPERVISOR : WILSON MOTTA RODRIGUEZ
 VALOR INICIAL : \$6.417.027.743,27
 VALOR ANTICIPO : \$1.925.108.322,98
 PLAZO INICIAL : SEIS (6) MESES
 FECHA DE INICIO : 27 DE FEBRERO DE 2023
 FECHA FINAL : 26 DE AGOSTO DE 2023
 ESTADO DEL CONTRATO : EN EJECUCION.
 PORCENTAJE AVANCE : 70%

| | VR X PARQUE | VALOR PROGRAMADO | % PROGR. | VALOR EJECUTADO | % VR EJECUTADO |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|----------------|
| ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA DIAMANTE 1 | \$ 636.584.396,00 | \$ 203.134.080,76 | 31,91% | \$ 56.656.650,71 | 8,90% |
| ESCENARIO DEPORTIVO PROVENZA | \$ 2.715.914.674,00 | \$ 948.668.995,63 | 34,93% | \$ 325.518.718,20 | 11,99% |
| PATINODROMO PROVENZA | \$ 2.828.063.806,00 | \$ 1.149.890.743,52 | 40,66% | \$ 700.492.082,81 | 24,77% |
| TOTAL CONTRATO | \$ 6.180.562.876,00 | | | | |
| REAJUSTE | \$ 236.464.867,00 | | | | |
| TOTAL PROYECTO | \$ 6.417.027.743,00 | \$ 2.301.693.819,91 | 37,24% | \$ 1.082.667.451,72 | 17,52% |
| VR ANTICIPO | \$ 1.854.168.862,80 | | | | |
| VR GIRADO | \$ 940.003.298,00 | | | | |
| SALDO DISPONIBLE | \$ 914.165.564,80 | | | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO | \$ 53.725.450,50 | | | | |
| SALDO X AMORTIZAR | \$ 1.800.443.412,30 | | | | |





10. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 426 DE FECHA 28 de diciembre del 2022: “ADECUACIÓN Y REFORMAS LOCATIVAS A LAS PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-SANTANDER” – LOTE 1

FRENTE 1: PLAZA SAN FRANCISCO

| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| VALOR FRENTE 1 | : | \$7.185.094.791,00 |
| VALOR ANTICIPO | : | \$2.071.308.457,66 (30% VR AJUSTADO / PLIEGOS) |
| PLAZO INICIAL | : | 8 MESES |
| FECHA DE INICIO | : | 01 de junio de 2023 |
| FECHA TERM. INICIAL. | : | 30 de enero de 2024 |
| NUEVA FECHA DE TERM. | : | No Aplica |
| ESTADO DEL CONTRATO: | : | EN EJECUCIÓN |
| PORCENTAJE AVANCE | : | 0% |
| PORCENTAJE AVANCE TOTAL CONSOLIDADO: | : | 0% |

ESTADO DEL CONTRATO: Se firmó acta de inicio de los contratos de obra e interventoría el 1 de junio del 2023 (01/06/2023). De igual manera, se aprobaron los profesionales de obra del contrato 426-2022 Plaza San Francisco. Además, se vienen adelantando actividades de alistamiento, socialización del objeto y alcance del proyecto con la comunidad, levantamiento de actas de vecindad, alistamiento y actividades preliminares a la ejecución de los contratos de obra (campamento, oficina física, revisión de diseños).

REGISTRO FOTOGRAFICO



ACTUAL: Entrega de Volantes para socialización del proyecto.



ACTUAL: Socialización alcance del proyecto.



ACTUAL: Levantamiento de actas de vecindad.



ACTUAL: Almacenamiento de material para el cambio de cubierta.



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga

GOBERNAR
HACER



RENDER FUTURA PLAZA SAN FRANCISCOS

11. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 445 DE FECHA 30 de diciembre del 2022:
“ADECUACIÓN Y REFORMAS LOCATIVAS A LAS PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-SANTANDER” – LOTE 2

FRENTE 2: PLAZA GUARIN

| | | |
|---|---|--|
| VALOR FRENTE 1 | : | \$4.212.966.188,00 |
| VALOR ANTICIPO | : | \$1.214.051.365,10 (30% VR AJUSTADO / PLIEGOS) |
| PLAZO INICIAL | : | 6 MESES |
| FECHA DE INICIO | : | 01 de junio de 2023 |
| FECHA TERM. INICIAL. | : | 30 de noviembre de 2023 |
| NUEVA FECHA DE TERM. | : | No Aplica |
| ESTADO DEL CONTRATO: | : | EN EJECUCIÓN |
| PORCENTAJE AVANCE | : | 0% |
| PORCENTAJE AVANCE TOTAL CONSOLIDADO: 0% | | |

ESTADO DEL CONTRATO: Se firmó acta de inicio de los contratos de obra e interventoría el 1 de junio del 2023 (01/06/2023). De igual manera, se aprobaron los profesionales de obra del contrato 445-2022 Plaza Guarín. Además, se vienen adelantando actividades de alistamiento, socialización del objeto y alcance del proyecto con la comunidad, levantamiento de actas de vecindad y actividades preliminares a la ejecución de los contratos de obra (campamento, oficina física, revisión de diseños).



ACTUAL: Localización y replanteo de Columnas existentes.



ACTUAL: Socialización alcance del proyecto.



ACTUAL: Trabajadores asistentes a socialización.



ACTUAL: Visita profesionales equipo de apoyo a la secretaria de infraestructura.



RENDER FUTURA PLAZA GUARIN

**12. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 17 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2023
“MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN
PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANA”- Grupo 1**

VALOR INICIAL : \$ 540.581.574,00
 VALOR ANTICIPO TOTAL : \$ 162.174.472,20
 FECHA DE INICIO : 03 de marzo 2023
 PLAZO INICIAL : 5 Meses.
 FECHA DE TERM INICIAL : 02 de agosto de 2023
 % EJECUCION : 48,85%
 ESTADO DEL CONTRATO : EJECUCIÓN

El porcentaje de avance del parque es del 48,85%, el presente proyecto tiene como finalidad la recuperación del equipamiento urbano en parques, escenarios deportivos y espacio público del municipio de Bucaramanga, contando con 5 frentes simultáneos, interviniendo en el Barrio Bavaria 2, Villa Helena, Olas.



13. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 18 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2023 “MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANA”- Grupo 2

| | | |
|-----------------------|---|----------------------|
| VALOR INICIAL | : | \$ 545.621.902,00 |
| VALOR ANTICIPO TOTAL | : | \$ 163.686.570,60 |
| FECHA DE INICIO | : | 03 de marzo 2023 |
| PLAZO INICIAL | : | 5 Meses. |
| FECHA DE TERM INICIAL | : | 02 de agosto de 2023 |
| % EJECCION | : | 63,80% |
| ESTADO DEL CONTRATO | : | EJECCUCIÓN |

El porcentaje de avance del parque es del 63,80%, el presente proyecto tiene como finalidad la recuperación del equipamiento urbano en parques, escenarios deportivos y espacio público del municipio de Bucaramanga, contando con 5 frentes simultáneos, interviniendo en bosque encantado, parque del barrio Los Alvares, canchas del parque San Pio, Parque del barrio Manzanares y cristal alto.



14. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 022 DE FECHA 2023- ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GR1

VALOR INICIAL : \$ 1.961.400.000,00
 VALOR ANTICIPOS : \$ 588.420.000,00
 PLAZO INICIAL : CUATRO (04) MESES
 FECHA DE INICIO : 16 DE MARZO DE 2023
 NUEVA FECHA DE TERM. : 15 DE JULIO DE 2023
 % EJECUCION : 40%
 ESTADO DEL CONTRATO : EN EJECUCION



15. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 28 DE FECHA 02 DE MARZO DE 2023: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2.

VALOR INICIAL : \$ 1.933.580.689,00
 VALOR ANTICIPOS : \$ 580.074.207 (inicial)

PLAZO INICIAL : CUATRO (4) MESES
 FECHA DE INICIO : 16 DE MARZO DE 2023
 NUEVA FECHA DE TERM. : 15 DE JULIO DE 2023
 % EJECUCION : 40 %
 ESTADO DEL CONTRATO : EN EJECUCIÓN



16. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 417 DE FECHA 2022 - ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER LOTE 3

VALOR INICIAL : \$ 1.949.858.621
 VALOR ANTICIPOS : \$ 584.957.586,36
 PLAZO INICIAL : 4 MESES
 FECHA DE INICIO : 16 DE MARZO DE 2023
 NUEVA FECHA DE TERM. : 15 DE JULIO DE 2023
 % EJECUCION : 40 %
 ESTADO DEL CONTRATO : EN EJECUCION



17. CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 23 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO DÁMASO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.

| | |
|-----------------|--|
| CONTRATISTA | : CONSORCIO PARQUES BUCARAMANGA |
| INTERVENTOR | : GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
| SUPERVISOR | : WILSON MOTTA RODRIGUEZ |
| VALOR INICIAL | : \$5.379.338.082,00 |
| VALOR ANTICIPO | : \$1.613.801.424,60 |
| PLAZO INICIAL | : SIETE (7) MESES |
| FECHA DE INICIO | : 29 DE MAYO DE 2023 |
| FECHA FINAL | : 28 DE DICIEMBRE DE 2023 |

ESTADO DEL CONTRATO : EN EJECUCION.
 PORCENTAJE AVANCE : 20%



18. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 27 DE FECHA 18 de febrero de 2022: “ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 4.”

| | | |
|------------------------|---|------------------------------|
| VALOR INICIAL | : | \$ 5.049.581.350 |
| VALOR ADICIONAL No. 1 | : | \$ 539.318.859,00 |
| VALOR TOTAL ACTUAL | : | \$ 5.588.900.209,00 |
| VALOR ANTICIPO INICIAL | : | \$ 1.514.874.405 |
| TOTAL ANTICIPOS | : | \$ 1.514.874.405 |
| PLAZO INICIAL | : | 7 MESES |
| PRÓRROGA No. 1 | : | 54 DÍAS |
| PRÓRROGA No. 2 | : | 26 DÍAS |
| PLAZO TOTAL | : | 7 MESES Y 80 DIAS |
| FECHA DE INICIO | : | 23 de marzo de 2022 |
| SUSPENSIÓN No. 1 | : | 14 días (20/10/22 – 2/11/22) |

SUSPENSIÓN No. 2 : 20 días (27/12/22 – 15/01/23)
AMPL. No.1 SUSP No.2 : 35 días (16/01/2023 – 19/02/2023)
FECHA DE TERM. : 20 de marzo de 2023

ESTADO DEL CONTRATO : TERMINADO CON PENDIENTES POR SUBSANAR

El contrato comprendió la adecuación del equipamiento urbano de tres diferentes frentes en la ciudad los cuales son, parque fontana, parque santa maría y parque bosques del cacique.

Se han ejecutado el 100% de las actividades contractuales, sin embargo, el contratista de obra debe subsanar algunas actividades que no han sido recibidas a satisfacción ni por la interventoría ni por la supervisión, el plazo para la subsanación se cumplirá el siguiente 20 de abril de 2023.

Al momento el contratista ha amortizado un 83% del anticipo mediante el cobro de 5 actas parciales durante la ejecución del contrato, para la liquidación del mismo se dejará pendiente un saldo del 10% el cual corresponde al valor de \$ 558.890.020,90.

REGISTRO FOTOGRAFICO





ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga

**GOBERNAR
ES HACER**



PARQUE FONTANA- ANTES



PARQUE FONTANA- DESPUÉS



SANTA MARIA - ANTES



SANTA MARIA - DESPUÉS

**19. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 29 DE FECHA 23 de febrero 2022
“ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS
DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – Grupo 1” –
Parque Ferrocarriles**

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| VALOR INICIAL | : | \$ 7.620.834.131,00 |
| VALOR ANTICIPO TOTAL | : | \$ 2.286.250.239,00 |
| ADICIONAL VALOR. 1 | : | \$ 158.054.823,33 |
| ADICIONAL VALOR. 2 | : | \$ 592.288.738,17 |
| FECHA DE INICIO | : | 28 marzo de 2022 |
| PLAZO INICIAL | : | 10 Meses. |
| FECHA DE TERM INICIAL | : | 27 de enero 2023 |
| FECHA NUEVA TERMINA | : | 01 de septiembre 2023 |

% EJECUCION : 65,65%
ESTADO DEL CONTRATO : EJECUCIÓN

El porcentaje de avance del parque es del 65,66%, ya gran parte de los movimiento de tierra se encuentran finalizados, se está en etapa de construcción del skate, instalación de juegos infantiles, obras de mantenimiento del ferrocarril, etc., con el fin de proceder a la instalación de pisos. Es importante aclarar que, todos los suministros del parque (juegos infantiles, gimnasios al aire libre, luminarias, etc.) ya se encuentran comprados y dispuestos para instalación, esperando obras antecesoras a la misma.



**20. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 30 DE FECHA 23 de febrero 2022
“ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS
DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – Grupo 2” –
Cancha Café Madrid**

VALOR INICIAL : \$ 4.427.144.706,00
VALOR ANTICIPO TOTAL : \$ 1.328.143.411,80

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| VALOR ADICIONAL. | : | \$ 632.046.432,00 |
| FECHA DE INICIO | : | 28 marzo de 2022 |
| PLAZO INICIAL | : | 06 Meses. |
| PLAZO ADICIONAL | : | 03 Meses. |
| FECHA DE TERM INICIAL | : | 27 de septiembre 2022 |
| NUEVA FECHA DE TERMI. | : | 31 de marzo de 2023 |
| % EJECUCION | : | 100% |
| ESTADO DEL CONTRATO | : | EN RECIBO FINAL |

El porcentaje de avance de la cancha del barrio Café Madrid es del 98%, por parte de la interventoría se identificaron pequeños detalles, los cuales están siendo corregidos por parte del contratista, así mismo se está a la espera de la certificación Retie y Retilap con el fin de suscribir acta de recibo final y proceder a iniciar trámites necesarios para el acta de liquidación.



**22. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 34 DE FECHA 28 de febrero 2022
“ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS
DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – Grupo 3” –
Parque La Feria**

| | | |
|-----------------------|---|---------------------|
| VALOR INICIAL | : | \$ 6.249.897.563,00 |
| VALOR ANTICIPO TOTAL | : | \$ 1.874.969.268,9 |
| FECHA DE INICIO | : | 07 de abril de 2022 |
| PLAZO INICIAL | : | 09 Meses. |
| FECHA DE TERM INICIAL | : | 06 de enero de 2023 |
| NUEVA DE TERM | : | 06 de abril de 2023 |
| % EJECUCION | : | 35% |
| ESTADO DEL CONTRATO | : | EJECUCIÓN |

El porcentaje de avance de la cancha del parque Paseo La Feria es del 10,54% se vienen adelantando movimientos de tierra, izaje de estructura de sombrillas, construcción del cerramiento, etc., con el fin de iniciar la instalación de piso en adoquín y obras en la cancha.



**23. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 31 DE FECHA 23 de febrero 2022
“ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS
DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – Grupo 4” –
Parque Canelos**

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| VALOR INICIAL | : | \$ 6.874.999.999,0 |
| VALOR ANTICIPO TOTAL | : | \$ 1.462.499.999,7 |
| ADICIONAL EN VALOR. | : | \$ 501.239.864,00 |
| FECHA DE INICIO | : | 30 de marzo de 2022 |
| PLAZO INICIAL | : | 07 Meses. |
| PLAZO ADICIONAL | : | 03 Meses. |
| FECHA DE TERM INICIAL | : | 29 de octubre de 2022 |
| NUEVA FECHA DE TERMI. | : | 06 de octubre de 2023 |
| % EJECUCION | : | 75% |
| ESTADO DEL CONTRATO | : | EJECUCIÓN |

El porcentaje de avance de la cancha del parque del barrio Canelos es del 75%, se vienen adelantando movimientos de tierra, izaje de estructura de sombrillas, construcción del cerramiento, instalación de gimnasios al aire libre, construcción y pintura del cerramiento y del muro expresión, etc; con el fin de continuar con la instalación del piso en adoquín y de los juegos infantiles.





**24. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 33 DE FECHA 25 de febrero 2022
“ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS
DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – Grupo 5” -
Parque Porvenir**

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| VALOR INICIAL | : | \$ 7.925.167.869,00 |
| VALOR ANTICIPO TOTAL | : | \$ 2.377.550.360,70 |
| ADICIONAL EN VALOR | : | \$ 121.687.807,00 |
| FECHA DE INICIO | : | 30 de marzo de 2022 |
| PLAZO INICIAL | : | 10 Meses. |
| FECHA DE TERM INICIAL | : | 29 de enero de 2023 |
| NUEVA DE TERM INICIAL | : | 06 de octubre de 2023 |
| % EJECUCION | : | 63% |
| ESTADO DEL CONTRATO | : | EJECUCIÓN |

El porcentaje de avance de la cancha del parque del barrio Porvenir es del 63%, aclarando que gran parte del contrato es suministros, se vienen adelantando movimientos de tierra del sector de los escenarios deportivos, fundida de la tribuna, instalación de juegos infantiles, construcción del cerramiento, construcción y pintura del cerramiento, instalación de piso adoquín, etc.



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga

**GOBERNAR
ES HACER**



26. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 167 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2022“ADECUACIÓN DEL PARQUE EL CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| VALOR INICIAL | : | \$ 10.637.401.017,00 |
| VALOR ANTICIPO TOTAL | : | \$ 3.191.220.305,09 |
| VALOR ADICIONAL | : | \$ 366.824.761,23 |
| FECHA DE INICIO | : | 09 de agosto 2022 |
| PLAZO INICIAL | : | 6 Meses. |
| FECHA DE TERM INICIAL | : | 08 de febrero de 2023 |
| FECHA DE TERM INICIAL | : | 14 de julio de 2023 |
| % EJECUCION | : | 48% |

www.bucaramanga.gov.co

ESTADO DEL CONTRATO : EJECUCIÓN

El porcentaje de avance del parque es del 48%, ya gran parte de los movimientos de tierra se encuentran finalizados, se está en la etapa de niveles con el fin de iniciar la instalación de la piedra piso, se instalaron canales, redes eléctricas y se fundieron escaleras, en el momento se está en la construcción de los alcorques y la obra de aislamiento de los árboles.



27.CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 136 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2022“RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”- Grupo 1

VALOR INICIAL : \$ 729.277.245,00
 VALOR ANTICIPO TOTAL : \$ 218.783.173,50
 VALOR ADICIONAL : \$ 323.348.804,66
 FECHA DE INICIO : 01 de agosto 2022
 PLAZO INICIAL : 5 Meses.
 FECHA DE TERM INICIAL : 30 de diciembre de 2022
 NUEVA DE TERM INICIAL : 08 de abril de 2023

www.bucaramanga.gov.co

% EJECUCION : 99%
ESTADO DEL CONTRATO : EJECUCIÓN

El porcentaje de avance del parque es del 99%, el presente proyecto tiene como finalidad LA recuperación del equipamiento urbano en parques, escenarios deportivos y espacio público del municipio de Bucaramanga, en la actualidad se están terminando de ejecutar en 2 ágoras y un parque, con el cual se completa la totalidad de su ejecución.



28. CONTRATO DE OBRA 37 DE 2022 - : ARIETE INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES S.A.S “ADECUACIÓN DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. - GRUPO 2.

| | |
|--------------------|-------------------|
| Valor fiscal: | \$ 406.829.486,00 |
| Valor Adicional 1: | \$ 93.779.508,00 |
| Valor Adicional 2: | \$20.000.000,00 |
| Valor Total: | \$ 520.608.994,00 |
| Plazo inicial: | Dos (2) meses |
| Plazo Adicional 1: | Un (1) mes |
| Plazo Adicional 2: | Tres (3) meses |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Plazo Adicional 3: | Diez (10) días |
| Plazo Adicional 4: | Tres (3) días |
| Plazo Adicional 5: | Veintiocho (28) días |
| Plazo Total: | Siete (7) meses once (11) días |
| Fecha de inicio: | 28 de marzo de 2022 |
| Fecha de terminación: | 27 de mayo de 2022 |
| Nueva Fecha de Terminación: | 12 de abril de 2023 |
| Porcentaje avance: | 40% |

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra suspendido y en trámites de reinicio y adición.



29. CONTRATO DE OBRA 38 DE 2022 - : CONSORCIO PRACI “ADECUACIÓN DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. - GRUPO 1.

| | |
|--------------------|-------------------|
| Valor fiscal: | \$ 479.947.142,00 |
| Valor Adicional 1: | \$ 96.968.284,00 |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Valor Adicional 2: | \$76.591.183,00 |
| Valor Total: | \$ 576.915.426,00 |
| Plazo inicial: | Dos (2) meses |
| Plazo Adicional 1: | Un (1) mes |
| Plazo Adicional 2: | Tres (3) meses |
| Plazo Adicional 3: | Diez (10) días |
| Plazo Adicional 4: | Tres (3) días |
| Plazo Adicional 5: | Veintiocho (28) días |
| Plazo total: | Cuatro (4) meses Once (11) días |
| Fecha de inicio: | 28 de marzo de 2022 |
| Fecha de terminación: | 27 de mayo de 2022 |
| Nueva Fecha de Terminación: | 12 de Abril de 2023 |
| Porcentaje avance: | 38% |

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra suspendido y en trámites de reinicio y adición.

REGISTRO FOTOGRAFICO



31. CONTRATO NO NO. 163 DEL 22/5/2022 “MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ENMARCADO DENTRO DE LA ESTRATEGIA “PLAN REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO CENTRO” EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

CONTRATISTA : CONSORCIO MALLA VIAL INCAL
 INTERVENTOR : EDGAR ALONSO QUESADA OREJARENA
 SUPERVISOR : WILSON MOTTA RODRIGUEZ
 VALOR INICIAL : \$ 31.221.573.233,00
 VALOR ANTICIPO : \$ 9.366.471.969,90
 PLAZO INICIAL : SEIS (6) MESES
 ADICION EN PLAZO : SEIS (6) MESES
 PLAZO TOTAL : DOCE (12) MESES
 FECHA DE INICIO : 30 DE AGOSTO DE 2022
 FECHA TERMINACION : 1 DE MARZO DE 2023
 NUEVA FECHA TERMINAC. : 30 DE AGOSTO DE 2023
 PORCETAJE EJECUCION : 42,62%

ESTADO DEL CONTRATO:



| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| CORREDOR CARRERA 11 | 1. Carrera 11 entre calles 37 y 41 |
| | 2. Carrera 11 entre calles 41 y 42 |
| | 3. Carrera 11 entre calles 42 y 43 |
| | 4. Carrera 11 entre calles 43 y 44 |
| CORREDOR CALLE 37 | 5. Calle 37 entre carreras 11 y 12 |
| | 6. Calle 37 entre carreras 12 y 13 |
| CORREDOR CARRERA 12 | 7. Carrera 12 entre calles 36 y 37 |
| | 8. Carrera 12 entre calles 37 y 41 |
| | 9. Carrera 12 entre calles 41 y 42 |
| CORREDOR CALLE 41 | 10. Calle 41 entre carreras 11 y 12 |



ACTIVIDADES A REALIZAR

- Instalación adoquín vehicular cra 12 entre 36 y 37
- arreglos en sectores específicos del adoquín vehicular y el piso peatonal carrera 11 entre calles 37 y 43 y calle 37 entre carreras 11 y 13
- fundida de secciones en MR42 tapa caja de barrajes calle 41 entre 11 y 12
- instalación adoquín vehicular cra 12 entre 37 y 41
- instalación piso peatonal cra 11 entre 43 y 44
- fundida de contenedores e instalación canal de monoblock calle 41 entre 10 y 11
- fundida muros estructura subestacion de AP calle 41 entre 10 y 11
- instalación ductos eléctricos y piso peatonal calle 41 entre 10 y 11
- continuación en instalación sardineles cra 12 entre 41 y 42

32. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 152 DE FECHA 19 de julio 2021 Objeto: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER” - GRUPO 3, ESPACIO PÚBLICO LAS AMÉRICAS.

GRUPO 3: ESPACIO PÚBLICO LAS AMERICAS

| | | |
|-------------------|---|--------------------|
| VALOR INICIAL | : | \$1.267.985.719,00 |
| VALOR ANTICIPOS | : | \$380.395.715,70 |
| VALOR ADICIONAL 1 | : | \$109.752.727,63 |
| VALOR ADICIONAL 2 | : | \$0,00 |
| PLAZO INICIAL | : | 4 meses y 15 días. |
| PLAZO ADICIONAL 1 | : | 2 meses |
| PLAZO ADICIONAL 2 | : | 1 mes |
| PLAZO ADICIONAL 3 | : | 17 días |
| PLAZO TOTAL | : | 8 meses y 2 días |

FECHA DE INICIO : 27 de agosto 2021
NUEVA FECHA DE TERM. : 4 de agosto de 2022
% EJECUCION : 80,5%
ESTADO DEL CONTRATO : Se encuentra en Terminación de Actividades y Recibo Final


REGISTRO FOTOGRAFICO



33.CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 327 DE 2021 Entre el Municipio de Bucaramanga y la FUNDACION TEATRO SANTANDER, cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL TEATRINO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES (EMA), MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE SONIDO, ILUMINACION, VESTIMENTA TEATRAL, SISTEMA DE TRAMOYA MOTORIZADO, SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE GRADERIAS COMPLEMENTARIOS, ASCENSOR Y OBRAS CIVILES DEL LOBBY DEL TEATRO SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.

| | |
|------------------------------------|---|
| VALOR INICIAL DEL CONVENIO: | \$ 2.600.000.000 |
| DESEMBOLSO No 1 (50%): | \$ 1.300.000.000 |
| DESEMBOLSO No 2 (40%): | \$ 1.040.000.000 |
| FECHA DE INICIO: | 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
| PLAZO INICIAL: | UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: | 31 DE DICIEMBRE DE 2021 |
| SUSPENSION No 1: | 23 DE DICIEMBRE DE 2021 |
| AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION No 1: | 17 DE ENERO DE 2022 |
| REINICIO No 1: | 17 DE FEBRERO DE 2022 |
| ADICIONAL EN PLAZO No 1: | 24 DE FEBRERO DE 2022 |
| ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO No 2: | \$ 1.300.000.000 |
| DESEMBOLSO No 3 (50% ADICIONAL): | \$ 650.000.000 – NOVENTA Y SEIS (96) DIAS |
| SUSPENSION No 1: | 23 DE DICIEMBRE DE 2021 |
| FECHA DE REINICIO: | 16 DE ENERO DE 2022 |
| SUSPENSION No 2: | 13 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| FECHA DE REINICIO: | 11 DE ENERO DE 2023 |
| SUSPENSION No 3: | 27 DE ENERO DE 2023 |
| FECHA DE REINICIO: | 01 DE AGOSTO DE 2023 |
| NUEVA FECHA DE TERMINACION: | 05 DE AGOSTO DE 2023 |
| PORCENTAJE DE EJECUCION: | 88% |

ESTADO DEL CONVENIO: SUSPENDIDO: El convenio se encuentra actualmente suspendido con un porcentaje del 88%, dentro de las actividades que se vienen adelantando se encuentra la instalación de Los sistemas tales como equipos de SONIDO, ILUMINACIÓN, VESTIMENTA TEATRAL, SISTEMA DE TRAMOYA MOTORIZADO, Y SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE GRADERÍAS COMPLEMENTARIOS, los cuales serán implementados en el Teatrino de la escuela municipal de artes (EMA) ubicado en el Edificio de apoyo del Teatro, cuya zona a la fecha se encuentra con el piso y aislamiento acústico terminado y en instalación de tratamiento acústico.

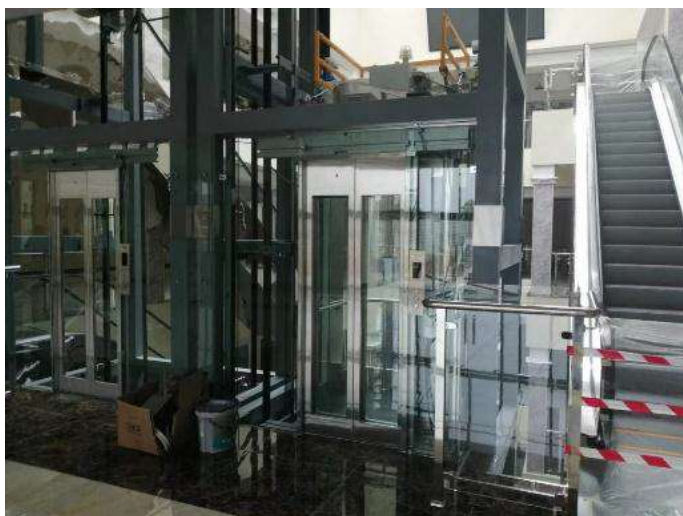

INSTALACION DE ASCENSOR PANORAMICO
PANORAMICO

ANTES




INSTALACION DE ASCENSOR

DESPUES



ACONDICIONAMIENTO DE GRADERIAS ANTES

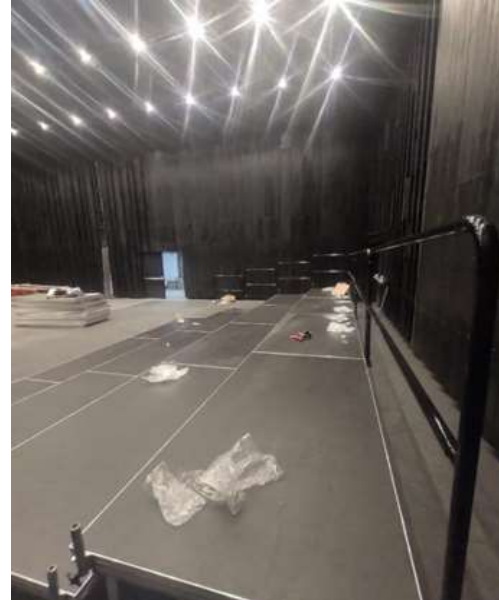

ACONDICIONAMIENTO DE GRADERIAS DESPUES

| | |
|--|--|
| CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | No. 265 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2021 GRUPO 02 |
| | VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S |
| | NIT. 900.173.700,00 |
| OBJETO: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" GRUPO 01 FISCALIA | |
| VALOR INICIAL | \$ 636.173.700,00 |
| VALOR ANTICIPO | \$ 318.086.850,00 |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO | \$ 57.522.300 |
| VALOR TOTAL | \$ 693.696.000 |
| PLAZO INICIAL | 2 MESES Y 15 DIAS |
| PLAZO ADICIONAL N° 1 | 14 DIAS |
| PLAZO ADICIONAL N° 2 | 42 DIAS |
| PLAZO ADICIONAL N° 3 | 15 DIAS |
| PLAZO ADICIONAL N° 4 | 45 DIAS |
| PLAZO TOTAL | 6 MESES Y 11 DIAS |
| FECHA DE INICIO | 03-11-2021 |
| FECHA SUSPENSIÓN N° 1 | 28-01-2022 |
| FECHA REINICIACIÓN N° 1 | 16-02-2022 |
| FECHA SUSPENSIÓN N° 2 | 06-04-2022 |
| FECHA DE REINICIACIÓN N° 2 | 19-12-2022 |
| ULTIMA FECHA DE TERMINACIÓN | 11-02-2023 |
| % EJECUCION | 94% |
| ESTADO DEL CONTRATO | En ejecución |

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Una vez expedida la orden de reinicio de actividades, el Contratista retomó actividades de obra luego de la suspensión de 258 días, el día 19 de diciembre de 2022. A continuación, se relaciona el listado de actividades ejecutadas por el Contratista, entre dicha fecha y el 31 de diciembre de 2022:

UNIDAD DE REACCION INMEDIATA (U.R.I.). (Oficina de inspección a cadáver)

- Instalación de puerta enrejada, localizada entre la oficina de inspección a cadáver y portería.
- Instalación de láminas de fibrocemento para muro divisorio de la oficina de inspección a cadáver.
- Instalación de puerta metálica de acceso a la oficina de inspección a cadáver.
- Instalación de lámina lineal de fibrocemento sobre reja del paramento exterior, parasoporte de aires acondicionados y cielo falso.
- Instalación de cielo falso en fibra mineral.
- Instalación de 10 unidades de luminaria tipo LED 60 X 60 cm para techo de la oficina de inspección a cadáver.
- Instalación de acometida de red eléctrica para equipos de aire acondicionado.
- Instalación de dos equipos de aires acondicionado tipo Minisplit 18.000 BTU.

CELDAS INTERNAS

Instalación de 6 planchuelas de seguridad en las puertas de barrotes de las celdas de detención, en reemplazo de las inicialmente instaladas. Se atienden observaciones de funcionarios de la Fiscalía con respecto al tamaño de las mismas, y se realizan los correctivos correspondientes, sin que esto implique sobrecostos. Se lleva a cabo aplicación de pintura epóxica anticorrosiva

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

| INDICADOR | META Programada 2023 | Meta Ejecutada 2023 | AVANCE | RECURSOS PROGRAMADOS | RECURSOS COMPROMETIDOS |
|---|----------------------|---------------------|--------|----------------------|------------------------|
| Número de m2 de malla vial urbana mantenidos o mejorados. | 0 | 39.865 | 100% | \$ 21.637.644.903,75 | \$ 7.267.881.826,58 |
| Número de metros lineales de placa huella construidos en la zona rural. | 1.350 | 0 | 0% | \$ 1.448.963.912,00 | \$ 730.747.183,00 |

Dentro de este programa se realizaron las gestiones pertinentes para lograr el convenio Interadministrativo No. 157 de 2023, cuyo objeto: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y EL MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL – COMANDO DE INGENIEROS – BATALLON DE INGENIEROS DE COMBATE NO. 05 “CR. FRANCISCO JOSE DE CALDAS” A TRAVES DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE – CENAC DE INGENIEROS, PARA QUE SE EFECTUE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA EN LAS COMUNAS 1 Y 2 DEL



ALCALDIA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, por el valor de \$ 3.646.104.173,51

**GOBERNAR
ES HACER**

APORTE MUNICIPIO: \$ 3.061.685.511
APORTE CENAC: \$ 584.418.662,51
PLAZO: 5 MESES
INICIO: POR INICIAR

Dentro de este programa se continúan ejecutando los proyectos de vigencias futuras 2022 correspondiente a malla vial urbana y contratos de placas huellas así:

1. CONTRATO DE OBRA 418 de 2022 -: CONSORCIO JASC 2022 “MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DE LOS CORREGIMIENTOS 1,2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.

CONTRATISTA : CONSORCIO JASC 2022
INTERVENTOR : COMPAÑÍA PROYECTOS TECNICOS CPT S.A.S
SUPERVISOR : WILSON MOTTA RODRIGUEZ
VALOR INICIAL : \$ 2.130.769.633,10
VALOR ANTICIPO : \$ 639.230.889,90
PLAZO INICIAL : CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO : 14 DE MARZO DE 2023
FECHA FINAL : 13 DE AGOSTO DE 2023
ESTADO DEL CONTRATO : EN EJECUCION.
PORCENTAJE AVANCE : 50 %

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en ejecución, ha habido retrasos por lluvias en el sector rural y que existe obra en ejecución del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, y del Municipio de Bucaramanga, que impiden iniciar la construcción de placa huellas en el sector a intervenir.

CUADRO DE AVANCE GRUPO 1 PLACA HUELLAS

| TRAMO | VEREDA | SECTOR | PLACA HUELLAS (m) | VALOR PROGRAMADO POR TRAMO | | EJECUTADO TOTAL |
|----------------|------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|-----------------|
| | | | | VALOR \$ | % | % |
| 1 | Angelinos | Inicio ramal al tanque | 40 | \$ 54.285.259,08 | 2,65% | 0,03% |
| 2 | Angelinos | Finca La Esperanza | 100 | \$ 135.713.147,46 | 6,63% | 0,09% |
| 3 | Angelinos | Finca Pajitas | 60 | \$ 81.427.888,49 | 3,98% | 0,05% |
| 4 | San Pedro Bajo | Balneario La Vega | 120 | \$ 162.855.776,98 | 7,96% | 7,61% |
| 5 | San Pedro Bajo | Miramar | 100 | \$ 135.713.147,46 | 6,63% | 0,09% |
| 6 | La Sabana | La Y. Finca El Rubí | 100 | \$ 135.713.147,46 | 6,63% | 1,01% |
| 7 | La Sabana | Finca Mi Paraiso | 100 | \$ 135.713.147,46 | 6,63% | 6,85% |
| 8 | La Esmeralda | El Calzo | 148 | \$ 200.855.458,27 | 9,81% | 0,13% |
| 9 | El Aburrido Bajo | La Esperanza | 150 | \$ 203.569.721,23 | 9,95% | 0,11% |
| 10 | San Pedro Bajo | El Arenal | 120 | \$ 162.855.776,98 | 7,96% | 1,07% |
| 11 | San Pedro Bajo | Las Marraneras | 120 | \$ 162.855.776,98 | 7,96% | 1,07% |
| 12 | San Cayetano | Escuela | 100 | \$ 135.713.147,46 | 6,63% | 5,37% |
| 13 | Santa Rita | Capilla Alta- Magüeyes tramo 1 | 100 | \$ 135.713.147,46 | 6,63% | 0,88% |
| 14 | Santa Rita | Capilla Alta- Magüeyes tramo 2 | 150 | \$ 203.569.721,23 | 9,95% | 1,45% |
| TOTALES | | | 1508 | \$ 2.046.554.264 | 100,00% | 25,81% |





2. CONTRATO DE OBRA 419 de 2022- RURAL BUCARAMANGA “MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DE LOS CORREGIMIENTOS 1,2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.

CONTRATISTA : CONSORCIO RURAL BUCARAMANGA 2023
INTERVENTOR : CONSORCIO CDC
SUPERVISOR : WILSON MOTTA RODRIGUEZ
VALOR INICIAL : \$ 1.860.497.004,00
VALOR ANTICIPO : \$ 558.149.101,20
PLAZO INICIAL : CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO : 07 DE MARZO DE 2023

FECHA FINAL : 06 DE AGOSTO DE 2023
ESTADO DEL CONTRATO : EN EJECUCION.
PORCENTAJE AVANCE : 50 %

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en ejecución, ha habido retrasos por lluvias en el sector rural y que existe otras obras en ejecución del Municipio de Bucaramanga, que impiden iniciar la construcción de placa huellas en el sector a intervenir.

| CUADRO DE AVANCE GRUPO 2 PLACA HUELLAS | | | | | | |
|--|-----------------|------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|--------|
| OBRA | CORREGIMIENTO | VEREDA | SECTOR | LONGITUD INICIAL | LONGITUD FINAL | ESTADO |
| 1 | Corregimiento 2 | Capilla baja | Escuela II | 100 | 144 | 80% |
| 2 | Corregimiento 2 | Vereda Capilla baja | Escuela I | 150 | 106 | 7% |
| 3 | Corregimiento 3 | San José | Casa roja – Finca Genaro | 52 | 66 | 80 |
| 4 | Corregimiento 3 | San José | Gruta de la virgen – Casa | 150,00 ml | 105 | 50% |
| 5 | Corregimiento 2 | Capilla alta | Finca el Guarumo– Finca Esquinita | 170 | 170 | |
| 5 | Corregimiento 2 | Bolarqui bajo | Sector el Guayabito MURO | - | | |
| 6 | Corregimiento 3 | El Pedregal | Sector el mango | 190 | 138 | 5% |
| 7 | Corregimiento 3 | El Pedregal | Finca villa Laura Curva 1 y 2 | 37 | 37 | |
| 9 | Corregimiento 2 | Monserate | Sector Embalse la Tona | 200 | 130 | |
| 10 | Corregimiento 3 | Bolarqui bajo | Serctor la loma | - | 60 | |
| 11 | Corregimiento 3 | Vereda Retiro Chiquito | Sector Curva el Miedo | 200 | 67,4 | |
| 12 | Corregimiento 3 | Vereda Retiro Chiquito | Sector Ye la niebla | 100 | 126,78 | |
| 13 | Corregimiento 3 | Vereda Retiro Chiquito | Sector Ye la niebla 2 | - | 57,21 | |



3. CONTRATO DE OBRA 433 de 2022 - CONSORCIO GRAVIRU 2022
“MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DE LOS CORREGIMIENTOS 1,2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.

CONTRATISTA : CONSORCIO GRAVIRU 2022
INTERVENTOR : CONSORCIO AUTOVIAL IMGA
SUPERVISOR : WILSON MOTTA RODRIGUEZ
VALOR INICIAL : \$ 1.176.592.900,00
VALOR ANTICIPO : \$ 352.977.870,00
PLAZO INICIAL : CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO : 11 DE MAYO DE 2023
FECHA FINAL : 10 DE OCTUBRE DE 2023
ESTADO DEL CONTRATO : EN EJECUCION.
PORCENTAJE AVANCE : 40%

ESTADO DEL CONTRATO:

El contrato se encuentra en ejecución, ha habido retrasos por lluvias en el sector rural y que existen obras en ejecución del Municipio de Bucaramanga, que impiden iniciar la construcción de placa huellas en otro sector a intervenir





4. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 146 DE 2022: “MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TRAMOS VIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”.

| | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|
| VALOR FISCAL INICIAL | : | \$ 2.245.556.033 |
| VALOR FISCAL ADICIONAL | : | \$ 1.100.131.989,00 |
| VALOR FISCAL TOTAL | : | \$ 3.345.688.022,00 |
| PLAZO INICIAL + ADICIONALES | : | SEIS (6) MESES Y VEINTIDOS (22) DIAS |
| FECHA DE INICIO | : | 08 DE AGOSTO DE 2022 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | : | 31 DE MAYO DE 2023 |
| PORCENTAJE AVANCE | : | 100% |

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra finalizado con un porcentaje del 100%, e incluye la intervención de las siguientes direcciones en los barrios correspondientes de la ciudad:

| | Frente | Barrio |
|----------|-------------------------|------------------|
| PUNTO 1 | Siete Bocas | Bolivar |
| PUNTO 4 | Glorieta San Francisco | San francisco |
| PUNTO 5 | Glorieta Villa Olimpica | San Alonso |
| PUNTO 7 | Cr 27 - Cll 33 | Mejoras públicas |
| PUNTO 9 | Cr 33 - Cll 34 | Mejoras públicas |
| PUNTO 12 | Cll 45 - Cr 9 | Mutis |

| | Frente | Barrio |
|----------|----------------------------|--------------------|
| PUNTO 29 | Cr 33 - Cll 45 | Cabecera del llano |
| PUNTO 31 | Glorieta mutis | Mutis |
| PUNTO 34 | Cr 3 - Cll 55 | Mutis |
| PUNTO 37 | Bulevar Santander - cll 14 | Alarcón |
| PUNTO 38 | Cll 16 - Cr 28 | San Alonso |
| PUNTO 41 | Cr 27 - Cll 36 | Mejoras públicas |

| | | |
|----------|--------------------|--------------------|
| PUNTO 13 | Glorieta Girardot | Girardot |
| PUNTO 14 | Av Q/seca - Cr 33a | San Alonso |
| PUNTO 15 | Cll 32 - Cr 47 | Alvarez |
| PUNTO 26 | Cr 19 - Av Q/seca | Antonia Santos |
| PUNTO 28 | Cr 33 - Cll 42 | Cabecera del llano |

| | | |
|----------|------------------------------|--------------------|
| PUNTO 42 | Cr 27 - Av rosita | Sotomayor |
| PUNTO 43 | Cr 27 - Cll 45 | Nuevo Sotomayor |
| PUNTO 44 | Cr 27 - cll 48 | Nuevo Sotomayor |
| PUNTO 45 | Cr 27 - Av Gonzales valencia | Nuevo Sotomayor |
| PUNTO 46 | Cr 27 - Cll 56 | Sotomayor |
| PUNTO 47 | Cr 33 - Cl 56 | Cabecera del llano |

REGISTRO FOTOGRAFICO CRA 27 - CALLE 45





ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga

**GOBERNAR
ES HACER**

CRA 9 - CALLE 45



CALLE 36 CON CRA 27





5. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 405 DE 2022: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER –LOTE 1”.

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| VALOR FISCAL TOTAL: | \$ 7.542.347.806 |
| PLAZO INICIAL: | NUEVE (09) MESES |
| FECHA DE INICIO: | 16 DE ENERO DE 2023 |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 15 DE OCTUBRE DE 2023 |
| PORCENTAJE AVANCE: | 60,21% |

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en ejecución con un avance del 60,21%, e incluye la intervención de los siguientes barrios en las comunas 2,3,4,13,14 Y 15 de la ciudad: LA JUVENTUD, SAN FRANCISCO, ALARCÓN, CHAPINERO, COMUNEROS, MUTUALIDAD, GRANADA, BOLIVAR, BUENAVISTA, ALBANIA, CENTRO Y GARCIA ROVIRA





BARRIO SAN FRANCISCO



Dirección: Carrera 21 entre calles 21 y 20

BARRIO ALARCÓN



Dirección: CALLE 28 # 21-41

BARRIO MUTUALIDAD



Dirección: Carrera 21 entre Calle 13 y 12



6. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 406 DE 2022: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER –LOTE 2”.

| | |
|----------------------|-------------------------|
| VALOR FISCAL TOTAL | : \$7.007.204.406,00 |
| PLAZO INICIAL | : NUEVE (09) MESES |
| FECHA DE INICIO | : 16 DE ENERO DE 2023 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | : 15 DE OCTUBRE DE 2023 |
| PORCENTAJE AVANCE | : 65,50% |

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en ejecución con un avance del 65,50%, e incluye la intervención de los siguientes barrios en las comunas 6,8,9,12,16 y 17, LA CONCORDIA, LA SALLE, BUCARAMANGA, LA LIBERTAD, CAMPO HERMOSO, PROVENZA, FONTANA, DIAMANTE II, SOTOMAYOR, CABECERA DEL LLANO, EL TEJAR, LAGOS DEL CACIQUE, BRISAS DEL MUTIS, BALCONCITOS.

Dirección: CR 21 CON CL 49



BARRIO LA CONCORDIA ANTES



BARRIO LA CONCORDIA DESPUES

Dirección: Cra 27 C68A A 69



BARRIO LA SALLE ANTES



BARRIO LA SALLE DESPUES



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Dirección: Cll 68 entre Cra 9 y 10
Municipio de Bucaramanga

**GOBERNAR
ES HACER**



BARRIO BUCARAMANGA ANTES



BARRIO BUCARAMANGA DESPUES

Dirección: Calle 46 #1w-05 La esmeralda



BARRIO CAMPO HERMOSO ANTES



BARRIO GARCÍA CAMPO HERMOSO DESPUES

Dirección: CR 22A CL 99-18



BARRIO FONTANA ANTES



BARRIO FONTANA DESPUES

Dirección: C54 Cra 6W A 5W



BARRIO BALCONCITOS ANTES



BARRIO BALCONCITOS DESPUES

7. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. N° 297 de 2022: “MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”.

VALOR INICIAL : \$763.631.187,00
VALOR ANTICIPO : \$ 229.089.356,10
ADICIONAL 1. : \$ 100.050.000,00
PLAZO INICIAL : DOS (2) MESES
FECHA DE INICIO : 21 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA FINAL : 20 DE ENERO DE 2023
ESTADO DEL CONTRATO : EN EJECUCION.

PORCENTAJE AVANCE : 70%

ESTADO DEL CONTRATO:





PROGRAMA: ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL

Dentro de este programa se vienen adelantando proyectos para el mantenimiento y modernización del alumbrado público del Municipio de Bucaramanga.

| INDICADOR | META Programada 2023 | Meta Ejecutada 2023 | AVANCE | RECURSOS PROGRAMADOS | RECURSOS COMPROMETIDOS |
|---|----------------------|---------------------|--------|----------------------|------------------------|
| Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados. | 1 | 1 | 100% | \$ 38.513.643.967 | \$ 16.683.232.488 |

| INDICADOR | META Programada 2023 | Meta Ejecutada 2023 | AVANCE | RECURSOS PROGRAMADOS | RECURSOS COMPROMETIDOS |
|--|----------------------|---------------------|--------|----------------------|------------------------|
| Porcentaje de luminarias operativas en funcionamiento. | 100% | 71% | 71% | \$ 40.865.632.102 | \$ 19.822.176.072 |

| INDICADOR | META Programada 2023 | Meta Ejecutada 2023 | AVANCE | RECURSOS PROGRAMADOS | RECURSOS COMPROMETIDOS |
|---|----------------------|---------------------|--------|----------------------|------------------------|
| Número de sistemas implementados y mantenidos para adquisición, análisis, procesamiento y visualización de información de la red de alumbrado público inteligente e interoperable con otros sistemas. | 1 | 1 | 100% | \$ 98.000.000,00 | \$ 98.000.000,00 |

1. CONTRATO No. 91 DE 2023: SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE BUCARAMANGA 2023, LOTE 1.

VALOR FISCAL : 2.680.000.000,00
 VALOR ADICIONAL : 1.339.672.871,00
 PLAZO : CUATRO (4) MESES
 PLAZO ADICIONAL : UN (1) MES
 FECHA DE INICIO : 19 DE MAYO DE 2023
 FECHA DE TERMINACIÓN : 18 DE OCTUBRE 2023
 PORCENTAJE DE AVANCE : ENTREGA TOTAL DE LUMINARIAS

ESTADO DEL CONTRATO: En espera de la llegada de las luminarias, que se encuentran en fabricación y estas serán entregadas en número total de las luminarias.



2. CONTRATO No. 92 DE 2023: SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE BUCARAMANGA 2023, LOTE 2.

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| VALOR FISCAL | : 2.625.000.000,00 |
| VALOR ADICIONAL | : 1.312.481.669,00 |
| PLAZO | : CUATRO (4) MESES |
| PLAZO ADICIONAL | : UN (1) MES |
| FECHA DE INICIO | : 19 DE MAYO DE 2023 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | : 18 DE OCTUBRE 2023 |
| PORCENTAJE DE AVANCE | : ENTREGA TOTAL DE LUMINARIAS |

ESTADO DEL CONTRATO: En espera de la llegada de las luminarias, que se encuentran en fabricación y estas serán entregadas en número total de las luminarias.



3. CONTRATO No. 93 DE 2023: SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE BUCARAMANGA 2023, LOTE 3.

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| VALOR FISCAL | : 1.290.080.771,00 |
| VALOR ADICIONAL | : 643.861.152,00 |
| PLAZO | : CUATRO (4) MESES |
| PLAZO ADICIONAL | : UN (1) MES |
| FECHA DE INICIO | : 19 DE MAYO DE 2023 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | : 18 DE OCTUBRE 2023 |
| PORCENTAJE DE AVANCE | : ENTREGA TOTAL DE LUMINARIAS |

ESTADO DEL CONTRATO: En espera de la llegada de las luminarias, que se encuentran en fabricación y estas serán entregadas en número total de las luminarias.



5. CONTRATO No. 138 DE 2023: “MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA– LOTE 1 (Grupo 1)”

- | | |
|------------------------|---|
| - CONTRATISTA | : CONSORCIO CIVING |
| - VALOR FISCAL | : 1.122.746.611,00 |
| - PLAZO | : SIETE (7) MESES |
| - FECHA DE INICIO | : Se encuentra en proceso administrativo para acta de inicio. |
| - FECHA DE TERMINACIÓN | : - |
| - PORCENTAJE DE AVANCE | : 0% |

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en espera de acta de inicio debido a un ajuste realizado en las pólizas de la interventoría (contrato 142 de 2023) quien funge como supervisor del contrato.

6. CONTRATO No. 139 DE 2023: “MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA– LOTE 2 (Grupo 2)”

- CONTRATISTA : CILJSAS
- VALOR FISCAL : 1.140.646.311,00
- PLAZO : SIETE (7) MESES
- FECHA DE INICIO : Se encuentra en proceso administrativo para acta de inicio.
- FECHA DE TERMINACIÓN : -
- PORCENTAJE DE AVANCE : 0%

ESTADO DEL CONTRATO: el contrato se encuentra en espera de acta de inicio debido a un ajuste realizado en las pólizas de la interventoría (contrato 142 de 2023) quien funge como supervisor del contrato.

7. CONTRATO No. 140 DE 2023: “MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA– LOTE 3 (Grupo 3)”

- CONTRATISTA : PROIM INGENIERIA SAS
- VALOR FISCAL : 1.124.731.209,00
- PLAZO : SIETE (7) MESES
- FECHA DE INICIO : Se encuentra en proceso administrativo para acta de inicio.
- FECHA DE TERMINACIÓN : -
- PORCENTAJE DE AVANCE : 0%

ESTADO DEL CONTRATO: el contrato se encuentra en espera de acta de inicio debido a un ajuste realizado en las pólizas de la interventoría (contrato 143 de 2023) quien funge como supervisor del contrato.

8. CONTRATO No. 141 DE 2023: “MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA– LOTE 4 (Grupo 4)”

- CONTRATISTA : SOSDOM S.A.S
- VALOR FISCAL : 1.036.925.512,00
- PLAZO : SIETE (7) MESES
- FECHA DE INICIO : Se encuentra en proceso administrativo para acta de inicio.
- FECHA DE TERMINACIÓN : -
- PORCENTAJE DE AVANCE : 0%

ESTADO DEL CONTRATO: el contrato se encuentra en espera de acta de inicio debido a un ajuste realizado en las pólizas de la interventoría (contrato 143 de 2023) quien funge como supervisor del contrato.

Así mismo se continúa ejecutando los diferentes proyectos dentro de este programa, los cuales se detallan a continuación.

1. CONTRATO No. 413 DE 2022: “MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 3 (Bulevar Santander)”

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| VALOR FISCAL | : 2.165.900.979,00 |
| VALOR ADICIONAL | : 926.864.974,19 (En trámite) |
| PLAZO | : SIETE (7) MESES |
| PLAZO ADICIONAL | : NA |
| FECHA DE INICIO | : 24 DE ENERO DE 2023 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | : 23 DE AGOSTO 2023 |
| PORCENTAJE DE AVANCE | : 44,01% |

ESTADO DEL CONTRATO: Se encuentra en **EJECUCIÓN**, actualmente se encuentra realizando actividades civiles y eléctricas en la Glorieta Estadio, instalación de adoquín y canalización eléctrica, Instalación de Base de canastilla de postes de Cra 21 a Cra 15, Instalación de postes doble propósito de Cra 30 a Cra 21.



2. CONTRATO No. 414 DE 2022: “MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - LOTE 4”. (CALLE 56 FASE 1 – DESDE LA CARRERA 15 HASTA PLAZA MAYOR)

| | | |
|-----------------|---|---------------------|
| VALOR FISCAL | : | \$ 3.374.175.743,00 |
| VALOR ADICIONAL | : | En proceso |

| | | |
|----------------------|---|----------------------|
| PLAZO | : | SIETE (07) MESES |
| PLAZO ADICIONAL | : | En proceso |
| FECHA DE INICIO | : | 24 DE ENERO DE 2023 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | : | 23 DE AGOSTO DE 2023 |
| PORCENTAJE AVANCE | : | 59,95% |

ESTADO DEL CONTRATO: Se encuentra en EJECUCIÓN. Actualmente, se encuentra en la etapa de construcción de banco de ductos para la instalación de las nuevas redes de baja tensión de Alumbrado Público, construcción de cajas, recuperación de zonas duras (concreto, tabletas, adoquín), trabajos con topo misil. Igualmente, se encuentra realizando procesos administrativos para solicitar el adicional en valor de \$1.686.517.997,39 el cual corresponde a un 49,98% del valor fiscal y un plazo adicional de tres (03) meses el cual corresponde al 42,86% del plazo contractual.



3. CONTRATO No. 415 DE 2022: “MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - LOTE 5”.
(CALLE 56 FASE II - DESDE CARRERA 36 HASTA LA CARRERA 15)

| | | |
|----------------------|---|----------------------|
| VALOR FISCAL | : | \$ 1.649.874.261,00 |
| VALOR ADICIONAL | : | En proceso |
| PLAZO | : | SIETE (07) MESES |
| PLAZO ADICIONAL | : | N/A |
| FECHA DE INICIO | : | 24 DE ENERO DE 2023 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | : | 23 DE AGOSTO DE 2023 |
| PORCENTAJE AVANCE | : | 74,13% |

ESTADO DEL CONTRATO: Se encuentra en EJECUCIÓN. Actualmente, se encuentra finalizando la construcción de banco de ductos para la instalación de las nuevas redes de baja tensión de Alumbrado Público, construcción de cajas, recuperación de zonas duras, replanteo de terreno, construcción de bordillos en los parques Jorge Eliecer Gaitan y parque de la Cra 36 con calle 56. Igualmente, se encuentra realizando procesos administrativos para solicitar el adicional en valor de \$348.271.928,03 el cual corresponde a un 21,11% del valor fiscal.



4. CONTRATO No. 416 DE 2022: “MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - LOTE 6”. (PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA)

| | | |
|----------------------|---|---------------------|
| VALOR FISCAL | : | \$ 677.969.822,00 |
| VALOR ADICIONAL | : | N/A |
| PLAZO | : | CINCO (05) MESES |
| PLAZO ADICIONAL | : | N/A |
| FECHA DE INICIO | : | 24 DE ENERO DE 2023 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | : | 23 DE JUNIO DE 2023 |
| PORCENTAJE AVANCE | : | 98% |

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra **TERMINADO**, en proceso de revisión y validación de todos los documentos y entregables, previos a su liquidación final.



PARQUE GABRIEL TURBAY



PARQUE OLAYA HERRERA

5. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 218 DE 2021: “MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. Grupo 1(TRANSFORMADORES).”.

| | | |
|----------------------|---|-------------------------|
| VALOR FISCAL | : | \$ 656.386.943,00 |
| VALOR ADICIONAL | : | N/A |
| PLAZO | : | CUATRO (04) MESES |
| PLAZO ADICIONAL | : | TRES (03) MESES |
| FECHA DE INICIO | : | 04 DE OCTUBRE DEL 2021 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | : | 23 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| PORCENTAJE AVANCE | : | 98,78% |

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra **TERMINADO**, en proceso de revisión y validación de todos los documentos y entregables, previos al acta de entrega y recibo final.



Mantenimiento de transformadores

6. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 244 DE 2021: “MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. Grupo 2 (TABLEROS)”.

| | | |
|----------------------|---|-------------------------|
| VALOR FISCAL | : | \$ 1.015.817.608,00 |
| VALOR ADICIONAL 1 | : | \$ 187.983.529,54 |
| VALOR ADICIONAL 2 | : | \$ 303.805.479,05 |
| VALOR TOTAL | : | \$ 1.507.606.616,59 |
| PLAZO | : | CUATRO (04) MESES |
| PLAZO ADICIONAL | : | TRES (03) MESES |
| FECHA DE INICIO | : | 04 DE OCTUBRE DEL 2021 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | : | 23 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| PORCENTAJE AVANCE | : | 100% |

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra **TERMINADO**, en proceso de revisión y validación de todos los documentos y entregables, previos a su liquidación final.



Mantenimiento de tableros

7. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 219 DE 2021: “MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. Grupo 3 (CRA 15)”.

| | | |
|----------------------|---|-------------------------|
| VALOR FISCAL | : | \$893.418.828,00 |
| VALOR ADICIONAL 1 | : | \$ 269.596.198,31 |
| VALOR ADICIONAL 2 | : | \$ 173.773.229,28 |
| VALOR TOTAL | : | \$ 1.336.788.255,59 |
| PLAZO | : | CUATRO (04) MESES |
| PLAZO ADICIONAL | : | CUATRO (04) MESES |
| FECHA DE INICIO | : | 04 DE OCTUBRE DEL 2021 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | : | 23 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| PORCENTAJE AVANCE | : | 100% |

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra **TERMINADO**, en proceso de revisión y validación de todos los documentos y entregables, previos a su liquidación final.



8. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 85 DE 2022: “MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO No 1”.

| | | |
|----------------------|---|---------------------|
| VALOR FISCAL | : | \$ 813.032.264,00 |
| VALOR ADICIONAL | : | \$ 406.516.132,00 |
| PLAZO | : | OCHO (08) MESES |
| PLAZO ADICIONAL | : | CUATRO (04) MESES |
| FECHA DE INICIO | : | 13 DE MAYO DEL 2022 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | : | 25 DE MAYO DEL 2023 |
| PORCENTAJE AVANCE | : | 100% |

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra **TERMINADO**, en proceso de revisión y validación de todos los documentos y entregables, previos a su liquidación final.



9. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 86 DE 2022: “MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO No 2”.

| | | |
|----------------------|---|---------------------|
| VALOR FISCAL | : | \$ 538.567.888,00 |
| VALOR ADICIONAL | : | \$ 269.283.944,00 |
| PLAZO | : | OCHO (08) MESES |
| PLAZO ADICIONAL | : | CUATRO (04) MESES |
| FECHA DE INICIO | : | 13 DE MAYO DEL 2022 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | : | 25 DE MAYO DEL 2023 |
| PORCENTAJE AVANCE | : | 100% |

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra **TERMINADO**, en proceso de revisión y validación de todos los documentos y entregables, previos a su liquidación final.



10. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 87 DE 2022: “MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO No 3”.

| | | |
|----------------------|---|---------------------|
| VALOR FISCAL | : | \$ 741.517.944,00 |
| VALOR ADICIONAL | : | \$ 370.758.972,00 |
| PLAZO | : | OCHO (08) MESES |
| PLAZO ADICIONAL | : | CUATRO (04) MESES |
| FECHA DE INICIO | : | 13 DE MAYO DEL 2022 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | : | 25 DE MAYO DE 2023 |
| PORCENTAJE AVANCE | : | 100% |



ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra **TERMINADO**, en proceso de revisión y validación de todos los documentos y entregables, previos a su liquidación final.



11.CONTRATO DE COMISION No. 136 DE 2021: “DESARROLLAR LA PRIMERA FASE PARA LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PUNTOS DE GESTIÓN INTELIGENTE Y MEDIDAS PARA LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.

| | | |
|----------------------|---|-------------------------|
| VALOR FISCAL | : | \$ 14.680.441.671,56 |
| VALOR ADICIONAL | : | N/A |
| PLAZO | : | CINCO (05) MESES |
| PLAZO ADICIONAL 1 | : | TRES (03) MESES |
| PLAZO ADICIONAL 2 | : | CINCuenta (50) DIAS |
| PLAZO ADICIONAL 3 | : | TREINTA Y UNO (31) DIAS |
| FECHA DE INICIO | : | 13 DE JULIO DEL 2021 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | : | 24 DE JUNIO DE 2022 |
| PORCENTAJE AVANCE | : | 100% |

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra ejecutado en su parte operativa y funcional. En la actualidad está en etapa de revisión y ajuste previos al recibo final.

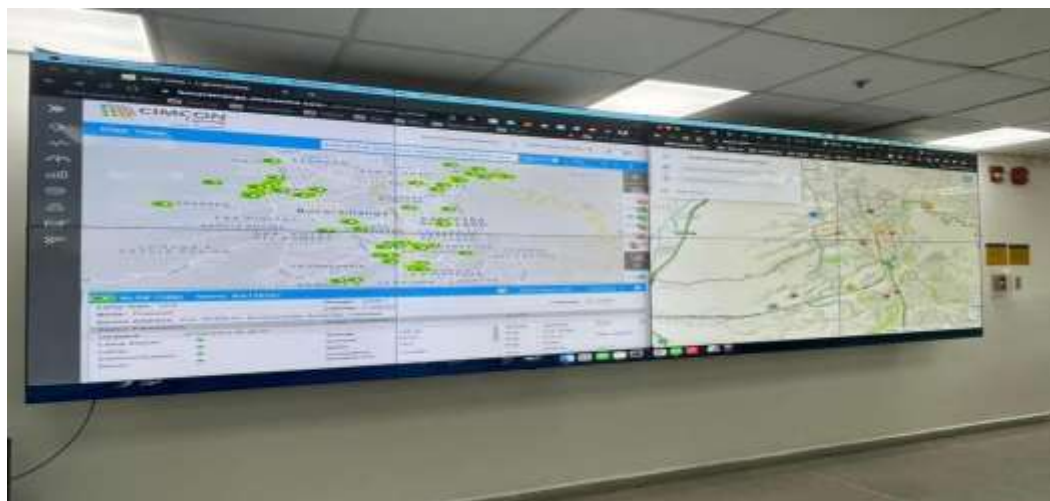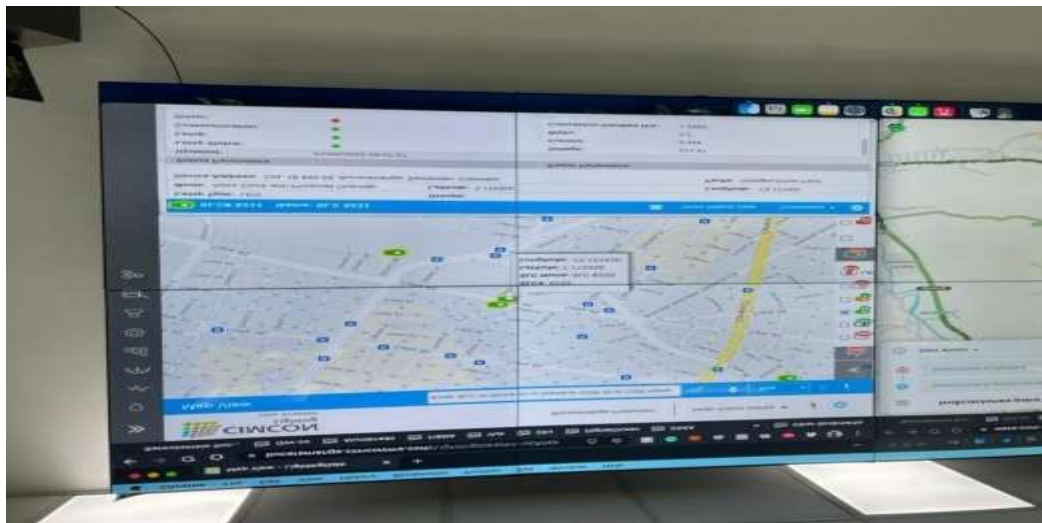

12. CONTRATO No. 165 DE 2022: “MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE LAS CIGARRAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”

| | | |
|----------------------|---|----------------------|
| VALOR FISCAL | : | \$ 1.670.299.115,90 |
| VALOR ADICIONAL | : | \$ 500.000.000,00 |
| VALOR TOTAL | : | \$ 2.170.299.115,90 |
| PLAZO | : | SIETE (07) MESES |
| PLAZO ADICIONAL | : | UN (01) MES |
| FECHA DE INICIO | : | 1 DE AGOSTO DEL 2022 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | : | 8 DE ABRIL DE 2023 |
| PORCENTAJE AVANCE | : | 100% |

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra **RECIBIDO** y surtiendo los trámites administrativos para su LIQUIDACIÓN.



PARQUE LAS CIGARRAS



PARQUE LAS CIGARRAS

**LÍNEA ESTRATÉGICA 5. BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCION:
INSTITUCIONES SÓLIDAS CONFIABLES**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MODERNA E INNOVADORA

PROGRAMA: GOBIERNO FORTALECIDO PARA SER Y HACER

En este programa se encuentra todo el recurso humano que requiere la secretaria para el fortalecimiento a la ejecución de los procesos transversales, así como la planificación de las diferentes obras.

| INDICADOR | META Programada 2023 | Meta Ejecutada 2023 | AVANCE | RECURSOS PROGRAMADOS | RECURSOS COMPROMETIDOS |
|--|----------------------|---------------------|--------|----------------------|------------------------|
| Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos. | 100% | 100% | 100% | \$ 23.593.754.457 | \$ 9.373.533.132 |

| GASTOS DE INVERSION | A 30 DE JUNIO 2023 |
|--|---------------------|
| | VALOR |
| CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION | \$ 5.486.553.333,31 |

Igualmente el pago de los subsidios a las diferentes empresas de servicios públicos hace parte de este programa.

| EMPRESA | VALOR PAGADO |
|-------------------|----------------------------|
| ACUEDUCTO | \$ 1.594.086.678,00 |
| EMPAS | \$ 753.806.792,00 |
| EMAB | \$ 1.318.305.074,00 |
| LIMPIEZA URBANA | \$ 110.852.556,00 |
| METROLIMPIA | \$ 109.928.699,00 |
| VALORTOTAL | \$ 3.886.979.799,00 |

OTROS PROYECTOS CONTRATADOS Y QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.

1. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 311 DE FECHA 10 de NOVIEMBRE de 2021:
“MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO PREVENTIVO (CIP) PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.”

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| VALOR INICIAL | : | \$ 734.243.079,69 |
| VALOR ANTICIPOS | : | \$ 142.272.923,91 |
| PLAZO INICIAL | : | 1.5 MESES |
| FECHA DE INICIO | : | 25 de noviembre de 2021 |
| FECHA DE TERMINACION INICIAL | : | 08 de enero de 2022 |
| SUSPENSION No 1 | : | 23 de diciembre de 2021 |
| REINICIO No 1 | : | 01 de febrero de 2022 |
| SUSPENSION No 2 | : | 16 de febrero de 2022 |
| AMPLIACION 1 A SUSPENSION No 2 | : | 17 de marzo de 2022 |
| AMPLIACION 2 A SUSPENSION No 2 | : | 02 de abril de 2022 |
| AMPLIACION 3 A SUSPENSION No 2 | : | 02 de mayo de 2022 |
| REINICIO No 2 | : | 20 de mayo de 2022 |
| ADICIONAL EN PLAZO No1 | : | 20 de mayo de 2022 - DOS (02) MESES Y DOCE (12) DIAS |
| ADICIONAL EN VALOR No2 | : | \$ 134.000.000 |
| ANTICIPO ADICIONAL | : | \$ 40.200.000 |
| ADICIONAL EN PLAZO No3 | : | 02 de agosto de 2022 – UN (01) MES Y VEINTISEIS (26) DIAS |
| ADICIONAL EN PLAZO No4 | : | 29 de septiembre de 2022 – TREINTA Y UN (31) DIAS |
| ADICIONAL EN PLAZO No5 | : | 31 de octubre de 2022 – VEINTE (20) DIAS |
| ADICIONAL EN PLAZO No6 | : | 18 de noviembre de 2022 – VEINTIDOS (22) DIAS |
| NUEVA FECHA DE TERMINACION | : | 12 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| ACTA DE TERMINACION FINAL | : | 15 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| % EJECUCION | : | 100% |

ESTADO DEL CONTRATO : TERMINADO, Se suscribió Acta de Terminación/Ejecución final con Pendientes el día 15 de diciembre de 2022, el 24 de marzo de 2023 se hace entrega por parte de la Secretaria de Infraestructura a Secretaria del Interior, en donde quedaron algunas observaciones de actividades que el contratista finalmente intervino.

En visita efectuada el día 26 de mayo del presente año, fue verificado en el sitio de intervención los acabados materializados, describiendo a continuación las acciones demandadas:

1. Acción correctiva. La luminaria localizada en el nivel 4, eje de acceso hacia la unidad sanitaria, perdió la conexión de anclaje a la placa de cubierta existente.
2. Acción correctiva. El grifo del lavamanos, unidad sanitaria localizada en el nivel 1, no permite el ingreso del flujo de agua. EL sistema de accionamiento hidromecánico tipo push funciona inadecuadamente.
3. Acción correctiva. Se aprecia un acabado incompleto de la superficie cerámica instalada para la zona de lavaderos, perimetral al grifo número 2. Igualmente, la arista o filo en el muro divisorio que delimita cada área de duchas, unidad sanitaria nivel 1.
4. Acción correctiva. El sanitario para discapacitados y lavamanos en acero inoxidable no desagua eficientemente, ubicación nivel 1.
5. Acción correctiva. Los puntos eléctricos que activan dos (2) ventiladores en la zona de alojamiento número 3, no se encuentran energizados.



2. CONTRATO DE OBRA 142 DE 2022 - : JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR
“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y RECUPERACIÓN VIAL DE LOS SECTORES AFECTADOS EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER” - LOTE 1.

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Valor fiscal: | \$ 1.674.988.080,00 |
| Valor Adicional: | \$ 835.550.000,00 |
| Valor actualizado: | \$ 2.510.538.080,00 |
| Plazo actualizado: | Once (11) meses y Quince (15) días |
| Fecha de Inicio: | 01 de julio de 2022 |
| Fecha de terminación: | 15 de junio 2023 |
| Porcentaje avance: | 93% |

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra suspendido y en trámites de reinicio.



Quebrada La Lomera Vía a el Prado Corregimiento 1 (puente)



Quebrada la Jabonera – Vía al Prado

3.CONTRATO DE OBRA 143 DE 2022 -:: UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO DE BUCARAMANGA “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y RECUPERACIÓN VIAL DE LOS SECTORES AFECTADOS EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER” LOTE 2.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Valor inicial: | \$ 2.426.472.557,51 |
| Valor adicional 1: | \$ 1.150.000.000,00 |
| Valor adicional 2: | \$ 124.052.138,25 |
| Valor actualizado: | \$ 3.700.524.695,76 |
| Plazo Actualizada: | Once (11) meses y nueve (09) días |
| Fecha de Inicio: | 07 de julio de 2022 |
| Fecha de terminación: | 15 de junio de 2023 |
| Porcentaje avance: | 91% |

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra suspendido y en trámites de reinicio y adición.



Puente La Vega



Villa Helena

4. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 262 DE 2022: "MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER".

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| VALOR INICIAL | : \$287.514.037,00 |
| VALOR ADICIONAL | : \$150.084.139,70 |
| VALOR ANTICIPO | : \$ 86.254.211,10 |
| PLAZO INICIAL | : SIETE (7) MESES |
| PRORROGA No 1 | : UN (1) MESES |
| PRORROGA No 2 | : DOS (2) MESES |
| FECHA DE INICIO | : 1 DE NOVIEMBRE DE 2022 |
| SUSPENSION No 1 | : 28 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| FECHA DE REINICIO | : 31 DE ENERO DE 2023 |
| SUSPENSION No 2 | : 28 DE FEBRERO DE 2023 |
| NUEVA FECHA DE TERMINACION: | 3 DE JUNIO DE 2023 |
| ESTADO DEL CONTRATO | : EN EJECUCION. |
| PORCENTAJE AVANCE | : 70% |



**5. CONTRATO DE OBRA 69 de 2023 -: CONSORCIO LA FLORA 2023
“CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCE: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA
PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: A FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.**

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Valor fiscal: | \$ 40.514.056.133,00 |
| Plazo inicial: | Dieciocho (18) meses |
| Fecha de inicio: | 05 de mayo de 2023 |
| Fecha de terminación: | 04 de noviembre de 2024 |
| Porcentaje avance: | 0.7% |

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en ejecución.



6. CONTRATO DE OBRA 41 de 2023 – UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO BUCARAMANGA 2 “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN VIAL PRODUCTO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD ORIGINADA POR LA SEGUNDA TEMPORADA DE LLUVIAS 2022 – FENÓMENO DE LA NIÑA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER”.

Valor fiscal: \$1.509.746.198,00
Plazo inicial: Tres (3) meses
Fecha de inicio: 23 de mayo de 2023
Fecha de terminación: 22 de agosto de 2023
Porcentaje avance: 34 %

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en ejecución.





ANEXO

- PRESUPUESTOS EJECUTADOS (Ejecución presupuestal)
- INFORMES DE INTERVENTORIA (Contratos terminados y en ejecución)
- GASTO (Relación personal)
- GASTOS (Relación de Inversión)

| Rubro | Descripcion Rubro | MODIFICACIONES | | | | | Presupuesto Definitivo | Disponibilidades Acumuladas | Compromisos Acumulados | TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS | | Presupuesto Disponible | Saldo Por Pagar | % Ejecucion | | |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-------------|--------------|------------------|
| | | Presupuesto Inicial | Adicion | Credito | Contracredito | 3 = 1 + 2 | | | | 5,00 | 7,00 | | | | Obligaciones | Pagos Acumulados |
| | | \$ 1,00 | | | | | | | | | | | | | \$ | \$ |
| 2.3.2.02.02.005 .2402114.5321 1.289 | VIA URBANA MEJORADA 289 | \$ 1.479.000.000,00 | \$ - | \$ - | \$ 1.479.000.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0 | | |
| RUBRO | PUNTE PEATONAL CON MANTENIMIENTO PUNTE PEATONAL CON MANTENIMIENTO CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2.02.02.005 .2402120.5321 1.213 | ZONAS VERDES MANTENIDAS 213 | \$ - | \$ 440.000.000,00 | \$ - | \$ - | \$ 440.000.000,00 | \$ 100.050.000,00 | \$ 100.050.000,00 | \$ - | \$ - | \$ 339.950.000,00 | \$ 100.050.000,00 | \$ 100.050.000,00 | 22,73 | | |
| RUBRO | TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL ANDEN DE LA RED URBANA REHABILITADO ANDEN DE LA RED URBANA REHABILITADO SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERA (EXCEPTO CARRETERA ELEVADAS), CALLE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2.02.02.005 .2402127.5421 1.201 | ANDEN DE LA RED URBANA REHABILITADO 201 | \$ - | \$ - | \$ 4.721.796.333,44 | \$ 2.581.800.663,22 | \$ 2.139.995.670,22 | \$ 1.672.805.757,78 | \$ 1.672.805.757,78 | \$ 561.910.089,42 | \$ 561.910.089,42 | \$ 467.189.912,44 | \$ 1.110.895.668,36 | \$ 1.110.895.668,36 | 78,16 | | |
| 2.3.2.02.02.005 .2402127.5421 1.289 | ANDEN DE LA RED URBANA REHABILITADO 289 | \$ - | \$ - | \$ 2.106.626.924,48 | \$ - | \$ 2.106.626.924,48 | \$ 2.106.626.924,48 | \$ 2.106.626.924,48 | \$ 569.832.522,00 | \$ 569.832.522,00 | \$ - | \$ 1.536.794.402,48 | \$ 1.536.794.402,48 | 100 | | |
| RUBRO | TRANSPORTE SEGURIDAD DE TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA SEGURIDAD VIAL INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA SEGURIDAD VIAL CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2.02.02.005 .2409013.5321 1.201 | TRANSPORTE SEGURIDAD DE TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA SEGURIDAD VIAL 201 | \$ - | \$ - | \$ 79.500.000,00 | \$ - | \$ 79.500.000,00 | \$ 79.500.000,00 | \$ 79.500.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 79.500.000,00 | \$ 79.500.000,00 | 100 | | |
| RUBRO | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO ESPACIO PUBLICO ADECUADO ESPACIO PUBLICO ADECUADO EDIFICIOS COMERCIALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2.02.02.005 .4002020.5312 2.557 | ESPACIO PUBLICO ADECUADO 557 | \$ - | \$ 3.727.166.660,00 | \$ - | \$ - | \$ 3.727.166.660,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3.727.166.660,00 | \$ - | \$ - | 0 | | |
| RUBRO | CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2.02.02.005 .4002020.5321 1.201 | ESPACIO PUBLICO ADECUADO 201 | \$ 10.591.133.878,04 | \$ - | \$ 3.906.144.762,21 | \$ - | \$ 14.497.278.640,25 | \$ 14.497.278.639,74 | \$ 12.571.357.176,84 | \$ - | \$ - | \$ 0,51 | \$ 12.571.357.176,84 | \$ 12.571.357.176,84 | 86,71 | | |
| RUBRO | ESPACIO PUBLICO ADECUADO INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2.02.02.005 .4002020.5327 0.201 | ESPACIO PUBLICO ADECUADO 201 | \$ 26.898.178.325,37 | \$ - | \$ - | \$ 8.649.877.215,44 | \$ 18.248.301.109,93 | \$ 17.980.921.894,49 | \$ 4.168.994.307,49 | \$ - | \$ - | \$ 267.379.215,44 | \$ 4.168.994.307,49 | \$ 4.168.994.307,49 | 22,84 | | |
| 2.3.2.02.02.005 .4002020.5327 0.213 | ESPACIO PUBLICO ADECUADO 213 | \$ 3.998.939.014,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3.998.939.014,00 | \$ 3.998.939.014,00 | \$ 3.998.939.014,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3.998.939.014,00 | \$ 3.998.939.014,00 | 100 | | |
| RUBRO | ESPACIO PUBLICO ADECUADO OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2.02.02.005 .4002020.5329 0.245 | ESPACIO PUBLICO ADECUADO 245 | \$ 1.500.000.000,00 | \$ - | \$ - | \$ 141.317.564,18 | \$ 1.358.682.435,82 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.358.682.435,82 | \$ - | \$ - | 0 | | |
| RUBRO | ESPACIO PUBLICO ADECUADO SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2.02.02.005 .4002020.5421 1.201 | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO ESPACIO PUBLICO ADECUADO 201 | \$ - | \$ 1.146.058.149,80 | \$ - | \$ - | \$ 1.146.058.149,80 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.146.058.149,80 | \$ - | \$ - | 0 | | |
| 2.3.2.02.02.005 .4002020.5421 1.289 | ESPACIO PUBLICO ADECUADO 289 | \$ 14.762.325.144,00 | \$ - | \$ - | \$ 14.762.325.144,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0 | | |
| 2.3.2.02.02.005 .4002020.5421 1.588 | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO ESPACIO PUBLICO ADECUADO 588 | \$ - | \$ 12.157.857.302,16 | \$ - | \$ 5.931.374.964,67 | \$ 6.226.482.337,49 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 6.226.482.337,49 | \$ - | \$ - | 0 | | |
| RUBRO | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO ACUEDUCTOS CONSTRUIDOS ACUEDUCTOS CONSTRUIDOS SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2.02.02.005 .4003015.5323 1.213 | ACUEDUCTOS CONSTRUIDOS 213 | \$ 4.577.050.038,00 | \$ - | \$ - | \$ 1.899.370.856,24 | \$ 2.677.679.181,76 | \$ 2.677.679.181,76 | \$ 2.677.679.181,76 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.677.679.181,76 | \$ 2.677.679.181,76 | 100 | | |

| Rubro | Descripcion Rubro | MODIFICACIONES | | | | | | TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS | | | | Presupuesto Disponible | Saldo Por Pagar | % Ejecucion | |
|------------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------|---------|
| | | Presupuesto Inicial | Adicion | Credito | Contracredito | Presupuesto Definitivo | Disponibilidades Acumuladas | Compromisos Acumulados | Obligaciones | Pagos Acumulados | | | | | |
| | | \$ 1,00 | | | | | | | | | 3 = 1 + 2 | | | | \$ 5,00 |
| | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL | | | | | | | | | | | | | | |
| RUBRO | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2.02.02.008.3301094.8332.1.201 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 201 | \$ - | \$ - | \$ 300.000.000,00 | \$ - | \$ 300.000.000,00 | \$ 300.000.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0 |
| | ESPACIO PUBLICO ADECUADO | | | | | | | | | | | | | | |
| RUBRO | ESPACIO PUBLICO ADECUADO SERVICIOS DE ASESORIA EN ARQUITECTURA | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2.02.02.008.4002020.8321.1.245 | ESPACIO PUBLICO ADECUADO 245 | \$ - | \$ - | \$ 141.317.564,18 | \$ - | \$ 141.317.564,18 | \$ 141.317.564,18 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 0 |
| | ESPACIO PUBLICO ADECUADO SERVICIOS DE FABRICACION DE EQUIPO DE ILUMINACION ELECTRICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2.02.02.008.4002020.8875.6.201 | ESPACIO PUBLICO ADECUADO 201 | \$ - | \$ 1.800.000.000,00 | \$ - | \$ - | \$ 1.800.000.000,00 | \$ 1.800.000.000,00 | \$ 1.800.000.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.800.000.000,00 | 100 | |
| | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO ZONAS VERDES MANTENIDAS | | | | | | | | | | | | | | |
| RUBRO | ZONAS VERDES MANTENIDAS OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2.02.02.008.4002026.8399.0.201 | ZONAS VERDES MANTENIDAS 201 | \$ - | \$ - | \$ 119.185.266,00 | \$ - | \$ 119.185.266,00 | \$ 53.900.000,00 | \$ 53.900.000,00 | \$ 29.180.000,00 | \$ 29.180.000,00 | \$ 65.285.266,00 | \$ 24.720.000,00 | \$ 45,22 | | |
| RUBRO | ZONAS VERDES MANTENIDAS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2.02.02.008.4002026.8597.0.201 | ZONAS VERDES MANTENIDAS 201 | \$ 3.690.578.454,00 | \$ - | \$ 78.978.925,50 | \$ 334.735.266,00 | \$ 3.434.822.113,50 | \$ 3.434.822.113,50 | \$ 3.434.822.113,50 | \$ 1.686.430.574,61 | \$ 1.686.430.574,61 | \$ - | \$ 1.748.391.538,89 | 100 | | |
| 2.3.2.02.02.008.4002026.8597.0.213 | ZONAS VERDES MANTENIDAS 213 | \$ - | \$ 1.169.622.519,00 | \$ - | \$ - | \$ 1.169.622.519,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.169.622.519,00 | \$ - | 0 | | |
| 2.3.2.02.02.008.4002026.8597.0.513 | ZONAS VERDES MANTENIDAS 513 | \$ - | \$ 1.452.088.992,00 | \$ - | \$ - | \$ 1.452.088.992,00 | \$ 659.773.955,15 | \$ 659.773.955,15 | \$ - | \$ - | \$ 792.315.036,85 | \$ 659.773.955,15 | 45,43 | | |
| RUBRO | ZONAS VERDES MANTENIDAS OTROS SERVICIOS DE APOYO N.C.P. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2.02.02.008.4002026.8599.9.201 | ZONAS VERDES MANTENIDAS 201 | \$ - | \$ - | \$ 215.550.000,00 | \$ - | \$ 215.550.000,00 | \$ 126.700.000,00 | \$ 126.700.000,00 | \$ 70.265.000,00 | \$ 70.265.000,00 | \$ 88.850.000,00 | \$ 56.435.000,00 | 58,77 | | |
| | PARQUE RECREATIVOS ADECUADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| RUBRO | PARQUE RECREATIVOS ADECUADOS OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2.02.02.008.4301011.8399.0.201 | PARQUE RECREATIVOS ADECUADOS 201 | \$ - | \$ - | \$ 85.470.000,00 | \$ - | \$ 85.470.000,00 | \$ 56.700.000,00 | \$ 56.700.000,00 | \$ 23.760.000,00 | \$ 23.760.000,00 | \$ 28.770.000,00 | \$ 32.940.000,00 | 66,33 | | |
| RUBRO | PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS OTROS SERVICIOS DE APOYO NCP | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2.02.02.008.4301011.8599.9.201 | PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS 201 | \$ - | \$ - | \$ 91.245.000,00 | \$ - | \$ 91.245.000,00 | \$ 64.750.000,00 | \$ 64.750.000,00 | \$ 23.453.333,34 | \$ 23.453.333,34 | \$ 26.495.000,00 | \$ 41.296.666,66 | 70,96 | | |
| | GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| RUBRO | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2.02.02.008.4599031.8212.0.201 | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | \$ 270.000.000,00 | \$ - | \$ 199.000.000,00 | \$ - | \$ 469.000.000,00 | \$ 469.000.000,00 | \$ 455.000.000,00 | \$ 232.900.000,00 | \$ 232.900.000,00 | \$ - | \$ 222.100.000,00 | 97,01 | | |
| 2.3.2.02.02.008.4599031.8212.0.501 | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501 | \$ - | \$ 549.500.000,00 | \$ - | \$ - | \$ 549.500.000,00 | \$ 51.500.000,00 | \$ 31.500.000,00 | \$ - | \$ - | \$ 498.000.000,00 | \$ 31.500.000,00 | 5,73 | | |
| RUBRO | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2.02.02.008.4599031.8321.3.201 | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | \$ 1.200.000.000,00 | \$ - | \$ 152.500.000,00 | \$ 125.000.000,00 | \$ 1.227.500.000,00 | \$ 1.227.499.999,98 | \$ 1.227.499.999,98 | \$ 620.066.666,66 | \$ 601.366.666,66 | \$ 0,02 | \$ 607.433.333,32 | 99,99 | | |
| 2.3.2.02.02.008.4599031.8321.3.501 | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501 | \$ - | \$ 1.346.500.000,00 | \$ - | \$ - | \$ 1.346.500.000,00 | \$ 42.800.000,00 | \$ 27.050.000,00 | \$ - | \$ - | \$ 1.303.700.000,00 | \$ 27.050.000,00 | 2 | | |
| RUBRO | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2.02.02.008.4599031.8332.1.201 | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | \$ 1.000.000.000,00 | \$ - | \$ 591.012.247,60 | \$ - | \$ 1.591.012.247,60 | \$ 1.591.012.247,60 | \$ 1.591.012.247,60 | \$ 943.889.999,66 | \$ 928.336.666,33 | \$ - | \$ 647.122.247,94 | 100 | | |

| Rubro | Descripcion Rubro | MODIFICACIONES | | | | | TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS | | | | | Presupuesto Disponible | Saldo Por Pagar | % Ejecucion |
|------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------|---------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------|-------------|
| | | Presupuesto Inicial | Adicion | Credito | Contracredito | Presupuesto Definitivo | Disponibilidades Acumuladas | Compromisos Acumulados | Obligaciones | Pagos Acumulados | | | | |
| | | \$ 1,00 | | | | | | | | | 3 = 1 + 2 | | | |
| RUBRO | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2.02.02.009.4003047.9112.3.200 | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 200 | \$ 266.529.916,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 266.529.916,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 266.529.916,00 | \$ - | 0 | |
| 2.3.2.02.02.009.4003047.9112.3.201 | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 201 | \$ 3.278.053.024,42 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3.278.053.024,42 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3.278.053.024,42 | \$ - | 0 | |
| 2.3.2.02.02.009.4003047.9112.3.215 | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215 | \$ 6.699.873.458,00 | \$ 1.906.588.092,00 | \$ - | \$ - | \$ 8.606.461.550,00 | \$ 3.886.979.799,00 | \$ 3.886.979.799,00 | \$ 3.886.979.799,00 | \$ 3.886.979.799,00 | \$ 4.719.481.751,00 | \$ - | 45,16 | |
| 2.3.2.02.02.009.4003047.9112.3.260 | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 260 | \$ 5.000.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 5.000.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 5.000.000,00 | \$ - | 0 | |
| 2.3.2.02.02.009.4003047.9112.3.268 | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 268 | \$ 10.000.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 10.000.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 10.000.000,00 | \$ - | 0 | |
| 2.3.2.02.02.009.4003047.9112.3.515 | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 515 | \$ - | \$ 635.052.889,79 | \$ - | \$ - | \$ 635.052.889,79 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 635.052.889,79 | \$ - | 0 | |
| 2.3.2.02.02.009.4003047.9112.3.528 | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 528 | \$ - | \$ 267.049.661,64 | \$ - | \$ - | \$ 267.049.661,64 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 267.049.661,64 | \$ - | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PASIVOS EXIGIBLES | | | | | | | | | | | | | |
| | GASTOS | | | | | | | | | | | | | |
| | INVERSION | | | | | | | | | | | | | |
| | DISMINUCION DE PASIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| | FINANCIACION DE DEFICIT PASIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | |
| | SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | |
| RUBRO | SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO CARTUCHOS PLASTICOS PARA IMPRESORA DE COMPUTADOR | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.7.06.02.459.9002.3699060.626 | SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 626 | \$ - | \$ 37.795.429,09 | \$ - | \$ - | \$ 37.795.429,09 | \$ 37.795.429,09 | \$ 37.795.429,09 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 37.795.429,09 | 100 | |
| RUBRO | SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO CPU | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.7.06.02.459.9002.4523001.626 | SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 626 | \$ - | \$ 16.429.288,75 | \$ - | \$ - | \$ 16.429.288,75 | \$ 16.429.288,75 | \$ 16.429.288,75 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 16.429.288,75 | 100 | |
| RUBRO | SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.7.06.02.459.9002.53129.601 | SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601 | \$ - | \$ 560.399.340,67 | \$ - | \$ - | \$ 560.399.340,67 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 560.399.340,67 | \$ - | 0 | |
| 2.3.7.06.02.459.9002.53129.616 | SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 616 | \$ - | \$ 266.733.201,66 | \$ - | \$ - | \$ 266.733.201,66 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 266.733.201,66 | \$ - | 0 | |
| 2.3.7.06.02.459.9002.53129.667 | SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 667 | \$ - | \$ 6.577.558,00 | \$ - | \$ - | \$ 6.577.558,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 6.577.558,00 | \$ - | 0 | |
| RUBRO | SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.7.06.02.459.9002.53211.601 | SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601 | \$ - | \$ 1.949.170.989,06 | \$ - | \$ - | \$ 1.949.170.989,06 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.949.170.989,06 | \$ - | 0 | |
| 2.3.7.06.02.459.9002.53211.613 | SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 613 | \$ - | \$ 401.767.299,22 | \$ - | \$ - | \$ 401.767.299,22 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 401.767.299,22 | \$ - | 0 | |
| RUBRO | SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AGUA EXCEPTO GASODUCTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.7.06.02.459.9002.53231.601 | SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601 | \$ - | \$ 3.072.194,17 | \$ - | \$ - | \$ 3.072.194,17 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3.072.194,17 | \$ - | 0 | |
| RUBRO | SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.7.06.02.459.9002.53270.601 | SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601 | \$ - | \$ 998.976.837,46 | \$ - | \$ - | \$ 998.976.837,46 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 998.976.837,46 | \$ - | 0 | |
| 2.3.7.06.02.459.9002.53270.673 | SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 673 | \$ - | \$ 1.138.182.590,63 | \$ - | \$ - | \$ 1.138.182.590,63 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.138.182.590,63 | \$ - | 0 | |

| Rubro | Descripcion Rubro | MODIFICACIONES | | | | | Presupuesto Definitivo | Disponibilidades Acumuladas | Compromisos Acumulados | TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS | | Presupuesto Disponible | Saldo Por Pagar | % Ejecucion | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-------------|--------------|------------------|
| | | Presupuesto Inicial | Adicion | Credito | Contracredito | 3 = 1 + 2 | | | | 5,00 | 7,00 | | | | Obligaciones | Pagos Acumulados |
| | | \$ 1,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| RUBRO | SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO OTRAS OBRAS DE INGENIERIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.7.06.02.459 9002.53290.61 3 | SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 613 | \$ - | \$ 19.939.074,00 | \$ - | \$ - | \$ 19.939.074,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 19.939.074,00 | \$ - | 0 | | | |
| RUBRO | SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.7.06.02.459 9002.54129.60 1 | SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601 | \$ - | \$ 730.460.623,66 | \$ - | \$ - | \$ 730.460.623,66 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 730.460.623,66 | \$ - | 0 | | | |
| 2.3.7.06.02.459 9002.54129.62 0 | SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 620 | \$ - | \$ 5.818.648,80 | \$ - | \$ - | \$ 5.818.648,80 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 5.818.648,80 | \$ - | 0 | | | |
| RUBRO | SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.7.06.02.459 9002.54211.60 1 | SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601 | \$ - | \$ 20.599.615,77 | \$ - | \$ - | \$ 20.599.615,77 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 20.599.615,77 | \$ - | 0 | | | |
| RUBRO | SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.7.06.02.459 9002.54270.60 1 | SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601 | \$ - | \$ 1.574.793.211,90 | \$ - | \$ - | \$ 1.574.793.211,90 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.574.793.211,90 | \$ - | 0 | | | |
| RUBRO | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.7.06.02.459 9002.82120.62 6 | SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 626 | \$ - | \$ 18.800.000,00 | \$ - | \$ - | \$ 18.800.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 18.800.000,00 | \$ - | 0 | | | |
| RUBRO | SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO SERVICIOS DE ASESORIA EN ARQUITECTURA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.7.06.02.459 9002.83211.60 1 | SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601 | \$ - | \$ 370.830.776,00 | \$ - | \$ - | \$ 370.830.776,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 370.830.776,00 | \$ - | 0 | | | |
| RUBRO | SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.7.06.02.459 9002.83990.60 1 | SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601 | \$ - | \$ 93.138.623,20 | \$ - | \$ - | \$ 93.138.623,20 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 93.138.623,20 | \$ - | 0 | | | |
| RUBRO | SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.7.06.02.459 9002.84222.60 1 | SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601 | \$ - | \$ 346.307.169,00 | \$ - | \$ - | \$ 346.307.169,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 346.307.169,00 | \$ - | 0 | | | |
| RUBRO | SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.7.06.02.459 9002.85970.60 1 | SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601 | \$ - | \$ 10.386.590,23 | \$ - | \$ - | \$ 10.386.590,23 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 10.386.590,23 | \$ - | 0 | | | |
| 2.3.7.06.02.459 9002.85970.62 6 | SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 626 | \$ - | \$ 15.586.290,27 | \$ - | \$ - | \$ 15.586.290,27 | \$ 15.586.290,27 | \$ 15.586.290,27 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 15.586.290,27 | 100 | | | |
| RUBRO | OTROS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA N C P | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.7.06.02.459 9002.91119.62 6 | SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 626 | \$ - | \$ 1.473.595.524,26 | \$ - | \$ - | \$ 1.473.595.524,26 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.473.595.524,26 | \$ - | 0 | | | |
| 2.3.7.06.02.459 9002.91119.65 3 | SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 653 | \$ - | \$ 416.713.117,16 | \$ - | \$ - | \$ 416.713.117,16 | \$ 413.653.924,60 | \$ 413.653.924,60 | \$ 413.653.924,60 | \$ 413.653.924,60 | \$ 3.059.192,56 | \$ - | 99,26 | | | |
| RUBRO | SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.7.06.02.459 9002.91123.62 6 | SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 626 | \$ - | \$ 3.056.010.949,19 | \$ - | \$ - | \$ 3.056.010.949,19 | \$ 1.399.124.111,37 | \$ 1.399.124.111,37 | \$ 305.805.522,02 | \$ 305.805.522,02 | \$ 1.656.886.837,82 | \$ 1.093.318.589,35 | 45,78 | | | |
| TOTAL INFORME SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | | \$ 162.344.772.467,00 | \$ 169.473.175.089,79 | \$ 33.062.423.121,67 | \$ 43.769.908.718,68 | \$ 321.110.461.959,78 | \$ 213.395.550.187,21 | \$ 191.890.254.971,66 | \$ 23.697.963.291,06 | \$ 23.577.888.390,23 | \$ 107.714.911.772,57 | \$ 168.192.291.680,60 | 59,758317 | | | |

RELACION COMPROMISOS (01 ABRIL - 30 DE JUNIO DE 2023)

| RP Nro. | Fecha RP | Nro. Contrato | Contratista | CDP Nro. | Coordinación | Valor Aprobado RP | Rubro | Objeto |
|---------|------------------|---------------|---|----------|-------------------------------|---------------------|--|--|
| 3992 | 12/04/2023 10:23 | 1848 | MARIA FERNANDA NIÑO GUTIERREZ | 3413 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 31.500.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83213.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE. |
| 4381 | 14/04/2023 14:49 | 65 | UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G | 2799 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 18.049.423,00 | 2.3.2.02.02.008.4599016.85330.226 - SEDES MANTENIDAS 226 | RESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EN LOS DIFERENTES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, JUNTO CON EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS Y LA MAQUINARIA RESPECTIVA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. |
| 4500 | 18/04/2023 07:32 | | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP | 3562 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 1.202.616.389,00 | 2.3.2.02.02.006.4599016.69112.226 - SEDES MANTENIDAS 226 | ENERGIA - ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 SEGÚN FACTURA 205412598 NUMERO DE CUENTA 1075933 -1 |
| 4505 | 18/04/2023 09:43 | 1864 | DIANA PATRICIA CARVAJAL FUENTES | 3522 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 35.000.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.82120.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA APOYAR, ACOMPAÑAR, PROYECTAR, SUSTANCIAR Y REVISAR JURÍDICAMENTE LOS TEMAS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSCONTRACTUALES QUE ESTA ADELANTE. |
| 4506 | 18/04/2023 09:43 | 1865 | GERMAN ORLANDO JOYA SEPULVEDA | 3521 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 31.500.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL APOYANDO LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE HIDRÁULICO, SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |
| 4507 | 18/04/2023 09:48 | 1866 | LUIS MARIO DURAN GONZALEZ | 3520 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 31.500.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL APOYANDO LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE HIDRÁULICO, SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |
| 4561 | 18/04/2023 15:20 | | COMCEL S A | 3566 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 643.340,78 | 2.3.2.02.02.008.4599016.84120.226 - SEDES MANTENIDAS 226 | CONSUMO DE VOZ CORRESPONDIENTE AL 04 DE MARZO 2023 AL 03 DE ABRIL DE 2023 Y AL 04 DE ABRIL 2023 AL 03 DE MAYO DE 2023 ; PLAN DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y SIM CARD DE PRUEBA DE TELEMEDIDA, SEGUN FACTURA E 5676972781 DE CLARO REFERENCIA 8221401343. |
| 4572 | 19/04/2023 11:31 | 1870 | ROBINSON FABIAN FIGUEROA MALDONADO | 3551 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 3.500.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTROMECÁNICO, REALIZANDO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE. |
| 4573 | 19/04/2023 11:32 | 1871 | DIEGO ANDRES BRICEÑO CABALLERO | 3550 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 31.500.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83213.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA. |
| 4590 | 20/04/2023 14:49 | 1878 | JOSE DAVID VALENCIA VASQUEZ | 3549 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 31.500.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83213.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA. |
| 4606 | 21/04/2023 08:41 | | ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA AMB S.A. ESP | 3606 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 279.918.514,00 | 2.3.2.02.02.009.4003047.91123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215 | PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUN FACTURA NO. 05746 \$ 279.918.514,00 VALOR TOTAL \$ 279.918.514,00 -ACUEDUCTO METROPOLITANO |

| RP Nro. | Fecha RP | Nro. Contrato | Contratista | CDP Nro. | Coordinación | Valor Aprobado RP | Rubro | Objeto |
|---------|------------------|---------------|---|----------|-------------------------------|-------------------|--|---|
| 4607 | 21/04/2023 08:49 | | LIMPIEZA URBANA S.A. ESP | 3607 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 19.776.543,00 | 2.3.2.02.02.009.4003047.91123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215 | PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES DE ENERO DE 2023 SEGÚN FACTURA NO. LUSA-2093 \$ 19.776.543,00 VALOR TOTAL \$ 19.776.543,00 -LIMPIEZA URBANA |
| 4608 | 21/04/2023 08:49 | | EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S A E S P | 3608 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 222.338.458,00 | 2.3.2.02.02.009.4003047.91123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215 | PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES DE FEBRERO DE 2023 SEGÚN FACTURA NO. ES262 \$ 222.338.458,00 VALOR TOTAL \$ 222.338.458,00- EMAB |
| 4621 | 21/04/2023 14:10 | 1887 | ELIBERTO SANDOVAL VERGEL | 3567 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 16.100.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4301011.85999.201 - PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS 201 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OFICIAL DE OBRA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |
| 4622 | 21/04/2023 14:10 | 1888 | LAURA JULIANA ARCINIEGAS ENRIQUEZ | 3582 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 24.500.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR (A) SOCIAL PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |
| 4623 | 21/04/2023 14:11 | 1889 | RONALD ANTONIO GONZALEZ ORTIZ | 3575 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 35.000.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.82120.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA APOYAR, ACOMPAÑAR, PROYECTAR, SUSTANCIAR Y REVISAR JURÍDICAMENTE LOS TEMAS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSCONTRACTUALES, QUE ESTA ADELANTE. |
| 4624 | 21/04/2023 14:11 | 1890 | ERIKA JOHANNA MORENO TARAZONA | 3583 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 21.000.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR (A) SOCIAL PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |
| 4625 | 21/04/2023 14:12 | 1891 | NICOLAS GABRIEL GONZALEZ DOMINGUEZ | 3581 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 11.200.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.85999.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO, PRESENTACIÓN Y CARGUE DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES PLATAFORMAS DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL. |
| 4626 | 21/04/2023 14:12 | 1892 | JULIETH ANDREA NUÑEZ BUITRAGO | 3574 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 31.500.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.82120.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA APOYAR, ACOMPAÑAR, PROYECTAR, SUSTANCIAR Y REVISAR JURIDICAMENTE LOS TEMAS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSCONTRACTUALES, QUE ESTA ADELANTE. |
| 4629 | 21/04/2023 15:22 | | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P BIC | 3588 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 4.975.497,00 | 2.3.2.02.02.008.4599016.84120.226 - SEDES MANTENIDAS 226 | "CONSUMO DE TELEFONIA LOCAL - ADSL (FIBRA OPTICA, SERVIDOR) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 , SEGUN FACTURA TBCL- 22641563 DE MOVISTAR (ANTERIORMENTE TELEBUCARAMANGA) CUENTA NO. 498 " |
| 4728 | 26/04/2023 10:26 | 84 | EME INGENIERIA S A | 3224 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 294.487.273,00 | 2.3.2.02.02.008.4599016.83132.226 - SEDES MANTENIDAS 226 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA "GOCMS". SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE REDES "SIDAR". SISTEMA DE GESTIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO "GESTIÓN-EME". SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL "SCADO". PÁGINA WEB. UTILIZADOS POR LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA". |

| RP Nro. | Fecha RP | Nro. Contrato | Contratista | CDP Nro. | Coordinación | Valor Aprobado RP | Rubro | Objeto |
|---------|------------------|---------------|--|----------|-------------------------------|-------------------|--|---|
| 4729 | 26/04/2023 10:53 | 1898 | CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ SOLANO | 3614 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 28.000.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE. |
| 4804 | 27/04/2023 10:57 | | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP | 3739 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 2.134.996,00 | 2.3.2.02.02.006.4599016.69112.253 - SEDES MANTENIDAS253 | CONSUMO DE ENERGÍA DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL 15 DE MARZO DE 2023 AL 14 DE ABRIL DE 2023, SEGÚN FACTURA 206154317 DE LA ESSA - NUMERO DE CUENTA 32675 |
| 4814 | 27/04/2023 11:29 | 82 | DISTRACOM S.A | 2902 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 10.000.000,00 | 2.3.2.02.01.003.4599016.3336103.226 - SEDES MANTENIDAS 226 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM), PARA LOS EQUIPOS, VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y MAQUINARIA PESADA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |
| 4818 | 27/04/2023 11:44 | | EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S A ESP EMPAS S A | 3744 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 132.396.532,00 | 2.3.2.02.02.009.4003047.91123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215 | PAGO DE SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL MES DICIEMBRE DE 2022 SEGÚN FACTURA NO. 03561 \$ 132.396.532,00 VALOR TOTAL \$ 132.396.532,00 - EMPAS |
| 4819 | 27/04/2023 11:45 | | METROLIMPIA S.A.S. E.S.P. | 3743 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 44.479.325,00 | 2.3.2.02.02.009.4003047.91123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215 | PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022 SEGÚN FACTURA NO. ELEC-1078 \$ 44.479.325,00 VALOR TOTAL \$ 44.479.325,00 - METROLIMPIA |
| 4822 | 27/04/2023 12:09 | | SEGURIDAD ATEMPI LTDA | 3103 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 815.135.664,53 | 2.3.2.02.02.008.4599016.85250.226 - SEDES MANTENIDAS 226 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMA, SIN ARMA, MEDIOS TECNOLÓGICOS Y MEDIO CANINO PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS Y CON EL FIN DE SALVAGUARDAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA TENENCIA, POSESIÓN O DOMINIO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y DONDE LA ENTIDAD LOS REQUIERA. |
| 4847 | 28/04/2023 09:41 | 1929 | CLAUDIA PAOLA ALMEIDA QUINTERO | 3664 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 17.500.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR (A) SOCIAL PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |
| 4848 | 28/04/2023 09:41 | 1927 | ERNESTO CALDERON CARRILLO | 3676 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 42.000.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO EN ESTRUCTURAS PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |
| 4853 | 28/04/2023 10:38 | 1931 | OSWALDO ARTURO SOSA PEÑA | 3568 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 56.000.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83213.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO APOYANDO EN LA CORRECTA IMPLEMENTACIÓN Y USO DE LA METODOLOGÍA BIM, PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |
| 4970 | 08/05/2023 11:24 | 1951 | YESENIA SUAREZ PATIÑO | 3740 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 31.500.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.226 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 226 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRONICO EN EL SEGUIMIENTO, CONTROL TÉCNICO Y PROCESOS QUE ADELANTE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. AP-47 |
| 4971 | 08/05/2023 11:24 | 1950 | KAROL JULIANA GALVIS FLOREZ | 3741 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 14.000.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.226 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 226 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRONICO EN EL SEGUIMIENTO, CONTROL TÉCNICO Y PROCESOS QUE ADELANTE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. AP-48 |

| RP Nro. | Fecha RP | Nro. Contrato | Contratista | CDP Nro. | Coordinación | Valor Aprobado RP | Rubro | Objeto |
|---------|------------------|---------------|---|----------|-------------------------------|---------------------|--|---|
| 4972 | 08/05/2023 11:39 | | COMCEL S A | 3789 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 4.870.214,12 | 2.3.2.02.02.008.4599016.84120.226 - SEDES MANTENIDAS 226 | PLAN DE DATOS DE TELEMEDIDA, TELEGESTION Y PLATAFORMA TECNOLOGICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, 20 DE MARZO 2023 AL 19 ABRIL DE 2023 Y 20 ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2023. SEGÚN FACTURA DE CLARO NO.E 5682394805 - REFERENCIA 8221383845 |
| 5006 | 09/05/2023 10:39 | 91 | CONSORCIO DISILUX 2023 | 1006 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 2.680.000.000,00 | 2.3.2.02.02.009.2102011.91123.226 - REDES DE ALUMBRADO PUBLICO CON MANTENIMIENTO 226 | SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE BUCARAMANGA 2023. LOTE 1. |
| 5007 | 09/05/2023 10:39 | 92 | CONSORCIO DISILUX 2023 | 1006 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 2.625.000.000,00 | 2.3.2.02.02.009.2102011.91123.226 - REDES DE ALUMBRADO PUBLICO CON MANTENIMIENTO 226 | SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE BUCARAMANGA 2023. LOTE 2. |
| 5008 | 09/05/2023 10:39 | 93 | CONSORCIO DISILUX 2023 | 1006 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 1.290.080.771,00 | 2.3.2.02.02.009.2102011.91123.226 - REDES DE ALUMBRADO PUBLICO CON MANTENIMIENTO 226 | SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE BUCARAMANGA 2023. LOTE 3. |
| 5011 | 09/05/2023 10:59 | 1965 | JAVIER RICARDO GOMEZ GONZALEZ | 3757 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 38.500.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |
| 5072 | 10/05/2023 16:34 | | ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA AMB S.A. ESP | 3901 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 284.605.150,00 | 2.3.2.02.02.009.4003047.91123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215 | PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL MES DE ENERO DE 2023 SEGÚN FACTURA NO. 05764 \$ 284.605.150,00 VALOR TOTAL \$ 284.605.150,00 -ACUEDUCTO METROPOLITANO |
| 5119 | 12/05/2023 16:01 | 1992 | NATALIA DEL PILAR TORRES FARFAN | 3893 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 8.000.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO (A) AMBIENTAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA BRINDANDO APOYO EN LA PROYECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS QUE SURJAN CON RELACIÓN AL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |
| 5199 | 15/05/2023 16:35 | 1998 | ANIA GALLO REY | 3870 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 21.000.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR (A) SOCIAL PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |
| 5200 | 15/05/2023 16:39 | | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP | 3994 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 1.193.799.203,00 | 2.3.2.02.02.006.4599016.69112.226 - SEDES MANTENIDAS 226 | ENERGIA - ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN FACTURA 206491513 NUMERO DE CUENTA 1075933 -1 |
| 5201 | 15/05/2023 16:39 | | COMCEL S A | 3996 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 321.670,39 | 2.3.2.02.02.008.4599016.84120.226 - SEDES MANTENIDAS 226 | CONSUMO DE VOZ CORRESPONDIENTE AL 04 DE MAYO 2023 AL 03 DE JUNIO DE 2023 ; PLAN DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y SIM CARD DE PRUEBA DE TELEMEDIDA, SEGÚN FACTURA E 5686948066 DE CLARO REFERENCIA 8221401343. |
| 5202 | 15/05/2023 16:41 | | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P BIC | 3995 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 5.218.727,00 | 2.3.2.02.02.008.4599016.84120.226 - SEDES MANTENIDAS 226 | "CONSUMO DE TELEFONIA LOCAL - ADSL (FIBRA OPTICA, SERVIDOR) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 , SEGUN FACTURA TBCL-22717993 DE MOVISTAR (ANTERIORMENTE TELEBUCARAMANGA) CUENTA NO. 498 " |

| RP Nro. | Fecha RP | Nro. Contrato | Contratista | CDP Nro. | Coordinación | Valor Aprobado RP | Rubro | Objeto |
|---------|------------------|---------------|--|----------|-------------------------------|---------------------|--|--|
| 5233 | 16/05/2023 16:05 | 2011 | OLGA GABINA JAIMES PORRAS | 3917 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 10.500.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.85999.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL CONTROL Y DIGITACION DE DATOS INSUMOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |
| 5234 | 16/05/2023 16:06 | 2012 | JUAN CAMILO SANMIGUEL ROMERO | 3922 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 18.000.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83213.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORMAR PARTE DEL JURADO CALIFICADOR DENTRO DEL PROCESO SI-CMA-001-2023, QUE TIENE POR OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MONUMENTO CONMEMORATIVO A LA CELEBRACIÓN 400 AÑOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER, ASI COMO BRINDAR APOYO EN EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL DE LOS CONTRATOS QUE SE LE ASIGNE. |
| 5542 | 25/05/2023 09:13 | | COMCEL S A | 4262 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 2.435.107,06 | 2.3.2.02.02.008.4599016.84120.226 - SEDES MANTENIDAS 226 | PLAN DE DATOS DE TELEMEDIDA, TELEGESTION Y PLATAFORMA TECNOLOGICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, 20 DE MAYO 2023 AL 19 JUNIO DE 2023. SEGÚN FACTURA DE CLARO NO.E 5692261564 - REFERENCIA 8221383845 |
| 5543 | 25/05/2023 09:13 | | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP | 4261 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 2.665.461,00 | 2.3.2.02.02.006.4599016.69112.253 - SEDES MANTENIDAS253 | CONSUMO DE ENERGÍA DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL 15 DE ABRIL DE 2023 AL 15 DE MAYO DE 2023, SEGÚN FACTURA 207233716 DE LA ESSA - NUMERO DE CUENTA 32675 |
| 5558 | 25/05/2023 15:48 | | EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S A E S P | 4273 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 225.943.771,00 | 2.3.2.02.02.009.4003047.91123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215 | PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES DE MARZO DE 2023 SEGÚN FACTURA NO. ES269 \$ 225.943.771,00 VALOR TOTAL \$ 225.943.771,00- EMAB |
| 5559 | 25/05/2023 16:08 | | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP | 4272 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 8.032.863,00 | 2.3.2.02.02.006.4599016.69112.226 - SEDES MANTENIDAS 226 | ENERGÍA - ALUMBRADO PUBLICO URBANO (PARQUE LA CONCORDIA) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 SEGÚN FACTURA 206959973 NUMERO DE CUENTA 1706008-2 |
| 5567 | 25/05/2023 16:46 | 2058 | NATHALYA CAROLAY SUAREZ BERNAL | 4194 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 11.900.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.85999.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE |
| 5592 | 26/05/2023 10:45 | 2067 | CESAR AUGUSTO APARICIO URIBE | 4096 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 17.500.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS ASUNTOS RELACIONADOS DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |
| 5593 | 26/05/2023 10:49 | 416 | CONSORCIO ALUMBRADO EH L6 | 4118 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 270.000.000,00 | 2.3.2.02.02.005.2102013.53270.201 - REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 201 | ADICIONAL EN VALOR NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 416 DE 2022, CUYO OBJETO ES: MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLÍVAR Y SANTANDER CALLE 56 FASE I Y II Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 6 |
| 5620 | 26/05/2023 14:13 | 116 | EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S A E S P | 3790 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 1.016.096.453,74 | 2.3.2.02.02.008.4599016.85970.226 - SEDES MANTENIDAS 226 | ACTIVIDADES DE PODA PARA EL DESPEJE DE LUMINARIAS Y REDES QUE INTERFIEREN CON EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |
| 5984 | 31/05/2023 15:59 | | EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S A ESP EMPAS S A | 4433 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 134.100.405,00 | 2.3.2.02.02.009.4003047.91123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215 | PAGO DE SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL MES ENERO DE 2023 SEGÚN FACTURA NO. 005761 \$ 134.100.405,00 VALOR TOTAL \$ 134.100.405,00 - EMPAS |

| RP Nro. | Fecha RP | Nro. Contrato | Contratista | CDP Nro. | Coordinación | Valor Aprobado RP | Rubro | Objeto |
|---------|------------------|---------------|--|----------|-------------------------------|-------------------|--|--|
| 6059 | 02/06/2023 12:10 | 118 | CONSORCIO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. B.I.C. | 3121 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 847.048.160,22 | 2.3.2.02.01.004.4599016.46939 99.253 - SEDES MANTENIDAS 253 | SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |
| 6452 | 09/06/2023 16:27 | 2340 | ANDERSON EMIRO CONTRERAS BARCENAS | 4805 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 20.250.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83213. 201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR LA GESTION DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |
| 6453 | 09/06/2023 16:27 | 2341 | ARCADIO MUÑOZ | 4806 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 9.900.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.85999. 201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. |
| 6454 | 09/06/2023 16:29 | 2342 | GERMAN LARROTA | 4809 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 10.800.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.85999. 201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. |
| 6455 | 09/06/2023 16:31 | 2343 | GERARDO ANDRES SUAREZ ESCOBAR | 4836 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 13.500.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83321. 201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |
| 6456 | 09/06/2023 16:31 | 2344 | ANDRES CAMILO CORZO LEAL | 4849 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 7.650.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.85999. 501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA BRINDANDO APOYO EN LA PROYECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS QUE SURJAN CON RELACIÓN AL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |
| 6457 | 09/06/2023 16:32 | 2345 | LEIDI KATERINE GARCIA MENESES | 4848 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 11.250.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83321. 201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO (A) CIVIL, PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |
| 6458 | 09/06/2023 16:32 | 2346 | DIEGO FABIAN PATIÑO TRUJILLO | 4807 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 9.900.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.85999. 201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. |
| 6459 | 09/06/2023 16:33 | 2347 | ISAIAS SUAREZ DELGADO | 4808 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 9.900.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.85999. 201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. |
| 6460 | 09/06/2023 16:33 | 2348 | EDGAR GOMEZ CASTAÑEDA | 4810 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 9.900.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.85999. 201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. |
| 6461 | 09/06/2023 16:34 | 2349 | ARMANDO MOGOLLON ROJAS | 4804 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 10.800.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.85999. 201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |
| 6555 | 13/06/2023 17:30 | 2359 | LAURA CAMILA RIOS GOMEZ | 4870 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 27.000.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.82120. 226 - GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 226 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO (A) EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA APOYAR, ACOMPAÑAR, PROYECTAR, SUSTANCIAR Y REVISAR JURÍDICAMENTE LOS TEMAS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, QUE ESTA ADELANTE. AP-49 |

| RP Nro. | Fecha RP | Nro. Contrato | Contratista | CDP Nro. | Coordinación | Valor Aprobado RP | Rubro | Objeto |
|---------|------------------|---------------|---|----------|-------------------------------|-------------------|---|---|
| 6648 | 15/06/2023 09:59 | | SOLUCIONES ELECTRICAS DE COLOMBIA S.A.S | 5012 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 90.275.086,83 | 2.3.7.06.02.4599002.91123.626 - SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 626 | PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 198 DEL 23 DE AGOSTO DE 2021, CUYO OBJETO: INTERVENTORIA A LA MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL PARQUE SAN PIO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER Y MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL PARQUE SANTANDER DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. |
| 6649 | 15/06/2023 09:59 | | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P BIC | 5009 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 5.006.762,00 | 2.3.2.02.02.008.4599016.84120.226 - SEDES MANTENIDAS 226 | CONSUMO DE TELEFONIA LOCAL - ADSL (FIBRA OPTICA, SERVIDOR) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 , SEGUN FACTURA TBCL-22791443 DE MOVISTAR (ANTERIORMENTE TELEBUCARAMANGA) CUENTA NO. 498 |
| 6650 | 15/06/2023 10:00 | | VENEPLAST LTDA | 5010 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 37.795.429,09 | 2.3.7.06.02.4599002.3699060.626 - SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 626 | PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 443 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021, CUYO OBJETO: SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |
| 6651 | 15/06/2023 10:01 | | UNION TEMPORAL OBCON AP | 5011 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 180.591.105,09 | 2.3.7.06.02.4599002.91123.626 - SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 626 | PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 106 DEL 31 DE MAYO DE 2021, CUYO OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL CORREDOR VIAL TRAMO 7 DESDE LA GLORIETA LA CEMENTO HASTA EL BARRIO COLORADOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |
| 6662 | 15/06/2023 11:34 | 2454 | WILFRED EMILIO PALACIO VERANO | 4987 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 18.000.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO MECÁNICO REALIZANDO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE. |
| 6663 | 15/06/2023 11:34 | 2455 | MONICA ORDUZ MANRIQUE | 4989 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 20.250.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA. |
| 6664 | 15/06/2023 11:35 | 2456 | MARTHA YANETH CEPEDA PICO | 4988 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 20.250.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN ASUNTOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE LE SEAN ASIGNADOS. |
| 6665 | 15/06/2023 11:35 | 2458 | JORGE ANDRES MARTINEZ VILLADA | 4952 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 15.750.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE. |
| 6666 | 15/06/2023 11:36 | 2459 | JAVIER ROJAS TAVERA | 4949 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 20.250.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS ASUNTOS RELACIONADOS DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |
| 6667 | 15/06/2023 11:42 | 2460 | OSCAR MAURICIO CRUZ ORELLANA | 4953 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 15.750.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA APOYANDO LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE ELÉCTRICO DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |
| 6668 | 15/06/2023 11:43 | 2461 | VICENTE VARGAS LOZANO | 4950 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 18.000.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE. |

| RP Nro. | Fecha RP | Nro. Contrato | Contratista | CDP Nro. | Coordinación | Valor Aprobado RP | Rubro | Objeto |
|---------|------------------|---------------|---------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------|---|---|
| 6669 | 15/06/2023 11:43 | 2462 | DARIO GUERRERO MANTILLA | 4951 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 27.000.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO EN ESTRUCTURAS PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |
| 6684 | 15/06/2023 13:17 | | COMCEL S A | 5023 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 321.670,39 | 2.3.2.02.02.008.4599016.84120.226 - SEDES MANTENIDAS 226 | CONSUMO DE VOZ CORRESPONDIENTE AL 04 DE JUNIO 2023 AL 03 DE JULIO DE 2023 ; PLAN DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y SIM CARD DE PRUEBA DE TELEMEDIDA, SEGUN FACTURA E 5696797362 DE CLARO REFERENCIA 8221401343. |
| 6685 | 15/06/2023 13:18 | | JASCOM INGENIERIA S.A.S | 5022 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 96.829.798,32 | 2.3.7.06.02.4599002.91123.626 - SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 626 | PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 303 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2020, CUYO OBJETO: AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |
| 6686 | 15/06/2023 13:19 | | HCR INGENIEROS S.A.S. | 5021 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 413.653.924,60 | 2.3.7.06.02.4599002.91119.653 - SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 653 | PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 233 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CUYO OBJETO: INTERVENTORIA PARA DESARROLLAR LA PRIMERA FASE PARA LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PUNTOS DE GESTIÓN INTELIGENTE Y MEDIDAS PARA LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |
| 6774 | 16/06/2023 14:15 | 2504 | EMERSON MIGUEL VELANDIA HERRERA | 4984 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 11.250.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE. |
| 6775 | 16/06/2023 14:22 | 2503 | OSCAR FERNANDO NIÑO CARREÑO | 4985 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 20.250.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |
| 6776 | 16/06/2023 14:23 | 2477 | IVAN DARIO PABON PARRA | 4990 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 8.100.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.85999.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CADENERO DENTRO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |
| 6779 | 16/06/2023 15:13 | | CELSA S.A.S | 5080 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 996.488.791,03 | 2.3.7.06.02.4599002.91123.626 - SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 626 | PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 253 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2021, CUYO OBJETO: SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – FASE IV. |
| 6780 | 16/06/2023 15:13 | | UNION TEMPORAL INTERURRAL 2020 | 5081 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 34.939.330,10 | 2.3.7.06.02.4599002.91123.626 - SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 626 | PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 304 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2020, CUYO OBJETO: INTERVENTORIA DE LA AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |
| 6781 | 16/06/2023 15:14 | | GAM INGENIERIA S.A.S. | 5079 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 15.586.290,27 | 2.3.7.06.02.4599002.85970.626 - SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 626 | PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 254 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021, CUYO OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACTIVIDADES DE PODA PARA EL DESPEJE DE LUMINARIAS Y REDES QUE INTERFIEREN CON EL ALUMBRADO PUBLICO Y TALA DE ARBOLES Y MANEJO INTEGRAL DEL COMPONENTE ARBOREO EN EL ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |
| 6809 | 16/06/2023 16:47 | 2540 | JUAN DAVID PABON ARDILA | 5082 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 25.000.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.226 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 226 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA, EN EL PROCESO Y SUBPROCESO DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD. AP-50 |

| RP Nro. | Fecha RP | Nro. Contrato | Contratista | CDP Nro. | Coordinación | Valor Aprobado RP | Rubro | Objeto |
|---------|------------------|---------------|--|----------|-------------------------------|-------------------|--|---|
| 6810 | 16/06/2023 16:48 | 2541 | JOSE SAUL ARDILA GUZMAN | 5083 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 15.000.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.85999.226 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 226 | PRESTAR SERVICIOS COMO TÉCNICO ELECTRICISTA PARA APOYO EN LA REVISIÓN DE PQR'S, REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE REGISTROS DIARIOS DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO DE LAS CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO, REVISIÓN EN CAMPO DE MATERIALES INSTALADOS Y APOYO AL INGENIERO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. AP-51 |
| 6811 | 16/06/2023 16:54 | 297 | CONSORCIO LA ESPERANZA R | 4992 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 100.050.000,00 | 2.3.2.02.02.005.2402120.53211.213 - ZONAS VERDES MANTENIDAS 213 | ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 2 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 297 DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2022, CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |
| 6819 | 20/06/2023 14:18 | 2536 | ASTRID BARRAGAN CASTAÑEDA | 4982 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 21.000.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.82120.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA ACOMPAÑAR, PROYECTAS, SUSTANCIAR Y REVISAR JURÍDICAMENTE LOS TEMAS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN QUE ESTA ADELANTE |
| 6820 | 20/06/2023 14:19 | 2537 | CHRISTIAN SNEYDER PEÑA ALBARRACIN | 4983 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 11.000.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.85999.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA REALIZANDO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE PROPENDAN POR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA. |
| 6821 | 20/06/2023 14:20 | 2538 | NATHALLY ANDREA HERNANDEZ MORENO | 4986 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 24.750.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83213.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE. |
| 6822 | 20/06/2023 14:20 | 2545 | CARLOS JAVIER RODRIGUEZ JEREZ | 5056 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 20.250.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO INGENIERO CIVIL, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA. |
| 6823 | 20/06/2023 14:21 | 2546 | ROBINSON FABIAN FIGUEROA MALDONADO | 5068 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 11.250.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTROMECÁNICO REALIZANDO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE. |
| 6824 | 20/06/2023 14:21 | 2547 | OSCAR ANDRES TARAZONA FIGUEROA | 5057 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 20.250.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TOPOGRAFO PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |
| 6861 | 21/06/2023 09:58 | | ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA AMB S.A. ESP | 5246 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 268.071.602,00 | 2.3.2.02.02.009.4003047.91123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215 | PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL MES DE FEBRERO DE 2023 SEGUN FACTURA NO. 05795 \$ 268.071.602,00 VALOR TOTAL \$ 268.071.602,00 -ACUEDUCTO METROPOLITANO |
| 6862 | 21/06/2023 09:59 | | METROLIMPIA S.A.S. E.S.P. | 5247 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 42.217.839,00 | 2.3.2.02.02.009.4003047.91123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215 | PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023 SEGÚN FACTURA NO. ELEC-1153 \$ 42.217.839,00 VALOR TOTAL \$ 42.217.839,00 - METROLIMPIA |
| 6863 | 21/06/2023 09:59 | | EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S A ESP EMPAS S A | 5248 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 125.081.438,00 | 2.3.2.02.02.009.4003047.91123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215 | PAGO DE SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL MES FEBRERO DE 2023 SEGÚN FACTURA NO. 06371 \$ 125.081.438,00 VALOR TOTAL \$ 125.081.438,00 - EMPAS |

| RP Nro. | Fecha RP | Nro. Contrato | Contratista | CDP Nro. | Coordinación | Valor Aprobado RP | Rubro | Objeto |
|---------|------------------|---------------|---|----------|-------------------------------|-------------------|--|--|
| 6864 | 21/06/2023 10:00 | | EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S A E S P | 5249 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 227.278.511,00 | 2.3.2.02.02.009.4003047.91123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215 | PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES DE ABRIL DE 2023 SEGÚN FACTURA NO. ES276 \$ 227.278.511,00 VALOR TOTAL \$ 227.278.511,00- EMAB |
| 6865 | 21/06/2023 10:22 | 336 | UNIÓN TEMPORAL ALUMBRADO PÚBLICO 2021 | 5139 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 16.429.288,75 | 2.3.7.06.02.4599002.4523001.626 - SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 626 | PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 336 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021, CUYO OBJETO: SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, LICENCIAS, TONNERES Y TINTAS PARA LA OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |
| 6880 | 21/06/2023 13:46 | 2564 | JAIME ENRIQUE VEGA PEÑA | 5073 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 18.000.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |
| 6881 | 21/06/2023 13:47 | 2565 | GENNY PAOLA ARAQUE VILLAMIZAR | 5072 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 20.250.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA APOYANDO LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE ELÉCTRICO DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |
| 6882 | 21/06/2023 13:47 | 2566 | DIEGO JULIAN ALMEYDA MARTINEZ | 5071 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 11.250.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL, MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE. |
| 6967 | 22/06/2023 11:38 | 2572 | JULIETH ALEXANDRA PEREZ TELLEZ | 5069 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 20.250.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA APOYANDO LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE ELÉCTRICO DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |
| 6968 | 22/06/2023 11:39 | 2576 | EFRAIN ANDRES SERRANO PLATA | 5240 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 24.750.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO INGENIERO CIVIL, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA. |
| 6969 | 22/06/2023 11:41 | 2577 | DIEGO FERNANDO BUTRON MANTILLA | 5137 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 20.250.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83213.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE. |
| 6970 | 22/06/2023 11:42 | 2578 | CAMILO ANDRES GOMEZ GARCIA | 5242 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 10.350.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO EN DIBUJO ARQUITECTÓNICO PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |
| 6971 | 22/06/2023 11:42 | 2581 | GERARDO QUINTERO FLOREZ | 5243 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 11.250.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON APOYO TÉCNICO EN DESARROLLO AL MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL DE LAS ZONAS VERDES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |
| 6972 | 22/06/2023 11:43 | 2582 | LUIS ALBERTO CASTELLANOS VILLABONA | 5136 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 20.250.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83213.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA. |
| 6973 | 22/06/2023 11:45 | 2590 | CLAUDIA XIOMARA SILVA MEDINA | 5182 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 18.000.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83213.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA |

| RP Nro. | Fecha RP | Nro. Contrato | Contratista | CDP Nro. | Coordinación | Valor Aprobado RP | Rubro | Objeto |
|---------|------------------|---------------|--|----------|-------------------------------|---------------------|--|---|
| 6974 | 22/06/2023 11:46 | 2591 | OMAR ANDRES RUEDA RUIZ | 5241 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 9.000.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE. |
| 6994 | 22/06/2023 16:23 | 142 | HCR INGENIEROS S.A.S. | 3278 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 829.105.725,00 | 2.3.2.02.02.008.4599016.8715205.226 - SEDES MANTENIDAS 226 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – LOTE O GRUPO 1. |
| 6995 | 22/06/2023 16:24 | 143 | COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A | 3278 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 829.177.571,00 | 2.3.2.02.02.008.4599016.8715205.226 - SEDES MANTENIDAS 226 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – LOTE O GRUPO 2. |
| 7008 | 22/06/2023 22:23 | 414 | GRUPO J8 S.A.S | 1519 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 2.537.531.905,09 | 2.3.2.02.02.009.2102013.91123.526 - REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 526 | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 4. |
| 7023 | 23/06/2023 11:02 | 144 | EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S A E S P | 4850 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 659.773.955,15 | 2.3.2.02.02.008.4002026.85970.513 - ZONAS VERDES MANTENIDAS 513 | ACTIVIDADES DE TALA Y MANEJO INTEGRAL DEL COMPONENTE ARBÓREO UBICADOS EN EL ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |
| 7025 | 23/06/2023 11:48 | 414 | GRUPO J8 S.A.S | 1056 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 836.643.837,91 | 2.3.2.02.02.009.2102013.91123.226 - REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 226 | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVARBOLÍVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY YOLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 4. |
| 7070 | 23/06/2023 15:27 | 118 | CONSORCIO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. B.I.C. | 5428 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 401.837.444,75 | 2.3.2.02.01.004.4599016.4693999.253 - SEDES MANTENIDAS 253 | ADICIÓN EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 118 DEL 01 DE JUNIO DEL 2023, CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |
| 7081 | 23/06/2023 16:02 | 396 | CONSORCIO PLAN CENTRO FASE II | 1513 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 3.593.383.349,51 | 2.3.2.02.02.005.4002020.53270.501 - ESPACIO PUBLICO ADECUADO 501 | MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO (PLAZOLETA LUIS CARLOS GALÁN Y PARQUE GARCIA ROVIRA) ENMARCADO DENTRO DE LA ESTRATEGIA "PLAN CENTRO" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER |
| 7082 | 23/06/2023 16:03 | 396 | CONSORCIO PLAN CENTRO FASE II | 2543 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 7.318.744.858,49 | 2.3.2.02.02.005.4002020.53270.213 - ESPACIO PUBLICO ADECUADO 213 | MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN LA PLAZOLETA LUIS CARLOS GALÁN Y PARQUE GARCIA ROVIRA ENMARCADOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA "PLAN CENTRO" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO 1. VIGENCIAS FUTURAS, ACUERDO NO. 037 DE 2022 |
| 7085 | 23/06/2023 16:13 | 2688 | BONIFACIO FLOREZ ANTELIZ | 5332 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 18.000.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL, MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE |
| 7086 | 23/06/2023 16:13 | 2687 | EDWIN ALBERTO OMAÑA CESPEDES | 5333 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 13.750.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, BRINDANDO APOYO EN LA CORRECTA IMPLEMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA ARCGIS DE LAS OBRAS ADELANTADAS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |
| 7087 | 23/06/2023 16:14 | 2686 | LIBARDO RUEDA CACERES | 5331 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 11.250.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.85999.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE. |

| RP Nro. | Fecha RP | Nro. Contrato | Contratista | CDP Nro. | Coordinación | Valor Aprobado RP | Rubro | Objeto |
|---------|------------------|---------------|----------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------|--|---|
| 7088 | 23/06/2023 16:14 | 2685 | JOSE FERNANDO CHAVES GOMEZ | 5317 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 31.500.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL, MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE. |
| 7089 | 23/06/2023 16:15 | 2684 | SERGIO ANDRES VESGA FERREIRA | 5181 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 24.750.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO MECÁNICO REALIZANDO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE. |
| 7179 | 24/06/2023 11:55 | 2754 | JAVIER HERNANDO MARTINEZ AYALA | 5341 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 22.500.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LOS ASUNTOS RELACIONADOS DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |
| 7180 | 24/06/2023 11:56 | 2753 | EDUAR FABIAN GALLO BALAGUERA | 5339 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 13.500.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83213.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA |
| 7181 | 24/06/2023 11:58 | 2767 | FREDY ALBERTO PABON PARRA | 5336 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 20.250.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TOPOGRAFO PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |
| 7182 | 24/06/2023 11:59 | 2765 | JUAN CARLOS PLATA NAVARRO | 5334 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 8.100.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.85999.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA REALIZANDO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE PROPENDAN POR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA. |
| 7183 | 24/06/2023 11:59 | 2766 | SANDRA MILENA PEREZ TORRES | 5311 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 11.250.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO VERIFICADOR EN EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ANÁLISIS VIAL EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA Y PLANIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |
| 7184 | 24/06/2023 12:00 | 2760 | ANGIE NATHALIA CARRILLO SUAREZ | 5315 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 8.100.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.85999.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR EN EL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |
| 7185 | 24/06/2023 12:00 | 2761 | JORGE EDUARDO GELVEZ ACOSTA | 5313 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 27.000.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE |
| 7186 | 24/06/2023 12:01 | 2762 | PAOLA ANDREA VARGAS TRIANA | 5272 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 6.750.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA REALIZANDO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE PROPENDAN POR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA. |
| 7187 | 24/06/2023 12:01 | 2763 | CHARO LIZET MANTILLA JARAMILLO | 5309 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 9.000.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO (A) AMBIENTAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO VERIFICADOR EN EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EN DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER |
| 7188 | 24/06/2023 12:02 | 2768 | ANDRES FELIPE LUNA GRISALES | 5312 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 13.750.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO MECÁNICO REALIZANDO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE. |
| 7189 | 24/06/2023 12:03 | 2764 | ANDREA XIOMARA TARAZONA GONZALEZ | 5310 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 15.750.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR (A) SOCIAL PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |

| RP Nro. | Fecha RP | Nro. Contrato | Contratista | CDP Nro. | Coordinación | Valor Aprobado RP | Rubro | Objeto |
|---------|------------------|---------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|--|---|
| 7190 | 24/06/2023 12:03 | 2759 | ANDRES FABIAN SOLANO PEREZ | 5271 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 13.500.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO MECÁNICO REALIZANDO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE |
| 7191 | 24/06/2023 12:04 | 2755 | ANTONIO JOSE GRANADOS VILLAMIZAR | 5338 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 22.500.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL, PARA APOYAR LOS ASUNTOS RELACIONADOS DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |
| 7192 | 24/06/2023 12:05 | 2756 | SERGIO FERNANDO GARCIA LABRADOR | 5337 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 15.750.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |
| 7193 | 24/06/2023 12:06 | 2747 | KAREN ALEXANDRA RIVERA CORZO | 5274 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 18.000.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83213.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA. |
| 7194 | 24/06/2023 12:06 | 2748 | OSCAR IVAN SALCEDO BECERRA | 5275 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 9.000.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE. |
| 7195 | 24/06/2023 12:07 | 2745 | ALEJANDRO CASTAÑEDA ARENAS | 5273 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 13.500.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83213.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA. |
| 7196 | 24/06/2023 12:08 | 2744 | CARLOS HUMBERTO TORRES ALVAREZ | 5277 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 20.250.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83213.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |
| 7197 | 24/06/2023 12:08 | 2746 | LUISA FERNANDA MELGAREJO RAMIREZ | 5276 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 15.750.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83213.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA. |
| 7573 | 27/06/2023 15:15 | 93 | CONSORCIO DISILUX 2023 | 5453 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 643.861.152,00 | 2.3.2.02.02.009.2102011.91123.226 - REDES DE ALUMBRADO PUBLICO CON MANTENIMIENTO 226 | ADICIÓN EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE SUMINISTROS NO. 93 DEL 04 DE MAYO DEL 2023: SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE BUCARAMANGA 2023. LOTE 3. |
| 7574 | 27/06/2023 15:15 | 91 | CONSORCIO DISILUX 2023 | 5452 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 1.339.672.871,00 | 2.3.2.02.02.009.2102011.91123.226 - REDES DE ALUMBRADO PUBLICO CON MANTENIMIENTO 226 | ADICIÓN EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE SUMINISTROS NO. 91 DEL 04 DE MAYO DEL 2023: SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE BUCARAMANGA 2023. LOTE 1. |
| 7575 | 27/06/2023 15:21 | | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP | 5596 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 2.773.690,00 | 2.3.2.02.02.006.4599016.69112.253 - SEDES MANTENIDAS253 | CONSUMO DE ENERGÍA DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL 16 DE MAYO DE 2023 AL 14 DE JUNIO DE 2023. SEGÚN FACTURA 208203455 DE LA ESSA - NUMERO DE CUENTA 32675 |
| 7578 | 27/06/2023 16:39 | 2800 | LUIS ALBERTO PINZON | 5070 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 20.250.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE. |
| 7579 | 27/06/2023 16:43 | 2828 | ASTRITH VIVIANA BARAJAS CACERES | 5470 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 11.250.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.85999.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO(A) CIVIL PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |

| RP Nro. | Fecha RP | Nro. Contrato | Contratista | CDP Nro. | Coordinación | Valor Aprobado RP | Rubro | Objeto |
|---------|------------------|---------------|-------------------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|---|---|
| 7580 | 27/06/2023 16:48 | 2826 | DANIELA CRUZ JIMENEZ | 5471 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 11.000.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83990. 201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO (A) AMBIENTAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO VERIFICADOR EN EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EN DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER |
| 7581 | 27/06/2023 16:51 | 2816 | JUAN FRANCISCO FANDIÑO PUENTES | 5474 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 6.750.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.85999. 501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA REALIZANDO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE PROPENDAN POR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA. |
| 7587 | 27/06/2023 18:18 | 2833 | CRISTIAN DANIEL GUTIERREZ SANABRIA | 5469 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 18.000.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83321. 501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL APOYANDO LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE HIDRÁULICO, SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |
| 7593 | 27/06/2023 18:42 | 2817 | RODRIGO HERNANDEZ CARRILLO | 5314 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 9.900.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.85999. 501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |
| 7594 | 27/06/2023 18:47 | 2818 | JAIME ALBERTO HURTADO SUAREZ | 5316 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 9.900.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.85999. 501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. |
| 7595 | 27/06/2023 18:50 | 2827 | LUISA FERNANDA SANABRIA PARRA | 5472 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 15.750.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83321. 501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE |
| 7596 | 27/06/2023 18:55 | 2829 | ANDRES FELIPE CARRILLO MURILLO | 5475 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 20.250.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83321. 501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL APOYANDO LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE HIDRÁULICO, SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |
| 7598 | 27/06/2023 18:57 | 2830 | CARLOS JULIO RAMIREZ BELLO | 5466 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 26.100.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83321. 501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO APOYANDO LOS ASUNTOS RELACIONADOS DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |
| 7599 | 27/06/2023 18:59 | 2831 | GIOVANNI ENRIQUE MELO ZAPATA | 5468 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 27.900.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83321. 501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO EN TRANSITO Y VÍAS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ANÁLISIS VIAL EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |
| 7600 | 27/06/2023 19:01 | 2832 | FEDERICO ARIAS GARCIA | 5467 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 20.250.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83321. 501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL APOYANDO LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE HIDRÁULICO, SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |
| 7638 | 28/06/2023 09:19 | 92 | CONSORCIO DISILUX 2023 | 5454 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 1.312.481.669,00 | 2.3.2.02.02.009.2102011.91123. 226 - REDES DE ALUMBRADO PUBLICO CON MANTENIMIENTO 226 | ADICIÓN EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE SUMINISTROS NO. 92 DEL 04 DE MAYO DEL 2023: SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE BUCARAMANGA 2023. LOTE 2. |
| 7730 | 28/06/2023 15:32 | 2863 | HUGO ALEXANDER BALLESTEROS CASTILLO | 5574 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 6.750.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.85999. 501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AFORADOR EN EL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |
| 7731 | 28/06/2023 15:33 | 2864 | ARNULFO OROZCO TORRES | 5575 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 9.000.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83213. 501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE. |

| RP Nro. | Fecha RP | Nro. Contrato | Contratista | CDP Nro. | Coordinación | Valor Aprobado RP | Rubro | Objeto |
|---------|------------------|---------------|--|----------|-------------------------------|----------------------|--|---|
| 7732 | 28/06/2023 15:34 | 2865 | RICARDO ANDRES ZARATE CABEZA | 5573 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 18.000.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83213.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA |
| 7733 | 28/06/2023 15:34 | 2866 | DANIEL EDUARDO BAUTISTA JARAMILLO | 5572 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 18.000.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83213.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA |
| 7734 | 28/06/2023 15:35 | 2868 | DANIEL ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ | 5481 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 13.500.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE. |
| 7739 | 28/06/2023 16:25 | 157 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS | 4397 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 398.660.546,36 | 2.3.2.02.02.005.2402114.53211.201 - VIA URBANA MEJORADA 201 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y EL MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL – COMANDO DE INGENIEROS - BATALLÓN DE INGENIEROS DE COMBATE NO. 05 “CR. FRANCISCO JOSE DE CALDAS” A TRAVÉS DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE – CENAC DE INGENIEROS, PARA QUE SE EFECTÚE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REAHABILITACIÓN DE MALLA VIAL URBANA EN LAS COMUNAS 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER |
| 7758 | 28/06/2023 17:10 | 411 | UNION TEMPORAL LOS NARANJOS | 4119 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 353.032.442,32 | 2.3.2.02.02.005.2102013.53270.201 - REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 201 | ADICIÓN EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 411 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2022, CUYO OBJETO ES: MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. - LOTE 1 |
| 7759 | 28/06/2023 17:11 | 411 | UNION TEMPORAL LOS NARANJOS | 4192 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 2.030.959.302,31 | 2.3.2.02.02.009.2102013.91123.226 - REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 226 | ADICIÓN EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 411 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2022, CUYO OBJETO ES: MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. LOTE 1 |
| 7760 | 28/06/2023 17:20 | 421 | CONSORCIO INTERURBANAS | 4193 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 301.284.429,00 | 2.3.2.02.02.009.2102013.91123.226 - REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 226 | ADICIÓN EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 421 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA A LA MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR Y SANTANDER, CALLE 56 FASE I Y II Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 1. |
| 7761 | 28/06/2023 19:09 | 166 | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER | 5636 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 79.668.991.613,00 | 2.3.2.02.02.005.2201052.53129.273 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA 273 | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER |
| 7762 | 28/06/2023 19:21 | 170 | ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA AMB S.A. ESP | 5639 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 155.875.613,00 | 2.3.2.02.02.005.4003015.53231.213 - ACUEDUCTOS CONSTRUIDOS 213 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA GARANTIZAR LA COBERTURA DEL MÍNIMO VITAL DE AGUA A LOS SECTORES DE LOS CORREGIMIENTOS 1, 2 Y 3 EN VIRTUD DE LAS ACCIONES JUDICIALES EXISTENTES EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER |

| RP Nro. | Fecha RP | Nro. Contrato | Contratista | CDP Nro. | Coordinación | Valor Aprobado RP | Rubro | Objeto |
|---------|------------------|---------------|---|----------|-------------------------------|---------------------|--|--|
| 7763 | 28/06/2023 19:30 | 171 | ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA AMB S.A. ESP | 5638 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 4.671.830.671,00 | 2.3.2.02.02.005.4003015.53231.221 - ACUEDUCTOS CONSTRUIDOS 221 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. Y EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, INTERVENTORÍA, GERENCIA Y SUPERVISIÓN DEL ACUEDUCTO Y UNIDADES DE SANEAMIENTO BÁSICO [INDIVIDUALES] DE LA VEREDA SANTA RITA Y VEREDA CAPILLA BAJA 1 ETAPA; CONSTRUCCIÓN, INTERVENTORÍA, GERENCIA Y SUPERVISIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO LA FORTUNA; Y LIMPIEZA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, GERENCIA Y SUPERVISIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS PUNTOS ESPECÍFICOS DEFINIDOS |
| 7764 | 28/06/2023 19:39 | 165 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP | 5637 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 1.800.000.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4002020.88756.201 - ESPACIO PUBLICO ADECUADO 201 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P., PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO 2023 EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. |
| 7881 | 29/06/2023 14:01 | 139 | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS | 3277 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 1.140.646.311,00 | 2.3.2.02.02.008.4599016.87152 05.226 - SEDES MANTENIDAS 226 | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – LOTE 2 |
| 7882 | 29/06/2023 14:05 | 140 | PROIM INGENIERIA S.A.S | 3277 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 1.124.731.209,00 | 2.3.2.02.02.008.4599016.87152 05.226 - SEDES MANTENIDAS 226 | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - LOTE 3 |
| 7883 | 29/06/2023 14:06 | 141 | SOSDOM S.A.S. | 3277 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 1.036.925.512,00 | 2.3.2.02.02.008.4599016.87152 05.226 - SEDES MANTENIDAS 226 | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - LOTE 4 |
| 7910 | 29/06/2023 15:37 | 29 | TITAN INGENIERIA INTELIGENTE SAS | 5642 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 592.288.738,17 | 2.3.2.02.02.005.4301011.54270.201 - PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS 201 | ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 3 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 29 DEL 23 DE FEBRERO DE 2022, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. - GRUPO 1 |
| 7911 | 29/06/2023 15:38 | 39 | GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. | 5645 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 157.978.444,00 | 2.3.2.02.02.005.4301011.54270.501 - PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS 501 | ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 39 DEL 03 DE MARZO DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 1 |
| 7913 | 29/06/2023 16:26 | 2949 | DIEGO ALEXANDER ALBA NIÑO | 5482 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 16.500.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO MECÁNICO REALIZANDO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE. |
| 7914 | 29/06/2023 16:26 | 3002 | ARTURO AURELIO CAPACHO POLO | 5473 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 20.250.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83213.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE |
| 7915 | 29/06/2023 17:03 | 3020 | GAMA SERVICIOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS SAS | 5625 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 31.500.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.82120.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DEL DERECHO PARA EJERCER LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y/O EXTRAJUDICIAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |
| 7916 | 29/06/2023 17:03 | 3031 | OCTAVIO ANDRES SANDOVAL GONZALEZ | 5340 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 22.500.000,00 | 2.3.2.02.02.008.4599031.83321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL APOYANDO LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE HIDRÁULICO, SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |
| 7917 | 29/06/2023 17:25 | 138 | CONSORCIO CIVING | 3277 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 1.122.746.611,00 | 2.3.2.02.02.008.4599016.87152 05.226 - SEDES MANTENIDAS 226 | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - LOTE 1 |

RELACION PERSONAL (01 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023)

| Año | Número Contrato | Tipo Contrato | Estado Contrato | Oficina Ordenadora | Nombre Contratista | Apellidos Contratista | Objeto Contrato | Valor Inicial Contrato | Fecha Contrato | Fecha Inicio Contrato | Fecha Terminación Contrato |
|------|-----------------|---|-----------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|---|------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|
| 2023 | 1848 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | MARIA FERNANDA | NIÑO GUTIERREZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE | \$ 31.500.000,00 | 11/04/2023 | 12/04/2023 | 11/11/2023 |
| 2023 | 1864 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | DIANA PATRICIA | CARVAJAL FUENTES | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA APOYAR, ACOMPAÑAR, PROYECTAR, SUSTANCIAR Y REVISAR JURÍDICAMENTE LOS TEMAS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSCONTRACTUALES QUE ESTA ADELANTE | \$ 35.000.000,00 | 17/04/2023 | 18/04/2023 | 17/11/2023 |
| 2023 | 1865 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | GERMAN ORLANDO | JOYA SEPULVEDA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL APOYANDO LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE HIDRÁULICO, SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | \$ 31.500.000,00 | 17/04/2023 | 18/04/2023 | 17/11/2023 |
| 2023 | 1866 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS MARIO | DURAN GONZALEZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL APOYANDO LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE HIDRÁULICO, SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | \$ 31.500.000,00 | 17/04/2023 | 19/04/2023 | 18/11/2023 |
| 2023 | 1870 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | LIQUIDADADO | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ROBINSON FABIAN | FIGUEROA MALDONADO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTROMECÁNICO REALIZANDO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE | \$ 3.500.000,00 | 18/04/2023 | 19/04/2023 | 29/05/2023 |
| 2023 | 1871 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | DIEGO ANDRES | BRICEÑO CABALLERO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTE ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | \$ 31.500.000,00 | 18/04/2023 | 19/04/2023 | 18/11/2023 |
| 2023 | 1878 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | JOSE DAVID | VALENCIA VASQUEZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTE ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | \$ 31.500.000,00 | 19/04/2023 | 20/04/2023 | 19/11/2023 |
| 2023 | 1887 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ELIBERTO | SANDOVAL VERGEL | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OFICIAL DE OBRA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | \$ 16.100.000,00 | 20/04/2023 | 21/04/2023 | 20/11/2023 |
| 2023 | 1888 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LAURA JULIANA | ARCINIEGAS ENRIQUEZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR (A) SOCIAL PARA APOYAR LA GESTION DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | \$ 24.500.000,00 | 21/04/2023 | 26/04/2023 | 25/11/2023 |
| 2023 | 1889 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | RONALD ANTONIO | GONZALEZ ORTIZ | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA APOYAR, ACOMPAÑAR, PROYECTAR, SUSTANCIAR Y REVISAR JURÍDICAMENTE LOS TEMAS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSCONTRACTUALES, QUE ESTA ADELANTE | \$ 35.000.000,00 | 21/04/2023 | 24/04/2023 | 23/11/2023 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|--------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|--|------------------|------------|------------|------------|
| 2023 | 1890 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ERIKA JOHANNA | MORENO TARAZONA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR (A) SOCIAL PARA APOYAR LA GESTION DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | \$ 21.000.000,00 | 21/04/2023 | 24/04/2023 | 23/11/2023 |
| 2023 | 1891 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | NICOLAS GABRIEL | GONZALEZ DOMINGUEZ | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO, PRESENTACION Y CARGUE DE INFORMACION EN LAS DIFERENTES PLATAFORMAS DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL | \$ 11.200.000,00 | 21/04/2023 | 24/04/2023 | 23/11/2023 |
| 2023 | 1892 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | JULIETH ANDREA | NUÑEZ BUITRAGO | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA APOYAR, ACOMPAÑAR, PROYECTAR, SUSTANCIAR Y REVISAR JURÍDICAMENTE LOS TEMAS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSCONTRACTUALES, QUE ESTA ADELANTE | \$ 31.500.000,00 | 21/04/2023 | 24/04/2023 | 23/11/2023 |
| 2023 | 1898 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | CARLOS ERNESTO | RODRIGUEZ SOLANO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE | \$ 28.000.000,00 | 25/04/2023 | 26/04/2023 | 25/11/2023 |
| 2023 | 1927 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ERNESTO | CALDERON CARRILLO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO EN ESTRUCTURAS PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | \$ 42.000.000,00 | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 27/11/2023 |
| 2023 | 1929 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | CLAUDIA PAOLA | ALMEIDA QUINTERO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR (A) SOCIAL PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | \$ 17.500.000,00 | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 27/11/2023 |
| 2023 | 1931 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | LIQUIDADO | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | OSWALDO ARTURO | SOSA PEÑA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO APOYANDO EN LA CORRECTA IMPLEMENTACIÓN Y USO DE LA METODOLOGÍA BIM, PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | \$ 56.000.000,00 | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 27/11/2023 |
| 2023 | 1950 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | KAROL JULIANA | GALVIS FLOREZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRONICO EN EL SEGUIMIENTO, CONTROL TÉCNICO Y PROCESOS QUE ADELANTE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | \$ 14.000.000,00 | 04/05/2023 | 09/05/2023 | 08/12/2023 |
| 2023 | 1951 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | YESENIA | SUAREZ PATIÑO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRONICO EN EL SEGUIMIENTO, CONTROL TÉCNICO Y PROCESOS QUE ADELANTE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | \$ 31.500.000,00 | 04/05/2023 | 09/05/2023 | 08/12/2023 |
| 2023 | 1965 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | JAVIER RICARDO | GOMEZ GONZALEZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | \$ 38.500.000,00 | 08/05/2023 | 09/05/2023 | 08/12/2023 |
| 2023 | 1992 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | NATALIA DEL PILAR | TORRES FARFAN | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO (A) AMBIENTAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA BRINDANDO APOYO EN LA PROYECCION Y SUPERVISION DE LOS CONTRATOS QUE SURJAN CON RELACION AL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | \$ 8.000.000,00 | 12/05/2023 | 15/05/2023 | 14/09/2023 |
| 2023 | 1998 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ANIA | GALLO REY | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR (A) SOCIAL PARA APOYAR LA GESTION DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | \$ 21.000.000,00 | 12/05/2023 | 15/05/2023 | 14/12/2023 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|--------------|-------------------------------|------------------|--------------------|---|------------------|------------|------------|------------|
| 2023 | 2011 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | OLGA GABINA | JAIMES PORRAS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL CONTROL Y DIGITACIÓN DE DATOS INSUMOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | \$ 10.500.000,00 | 16/05/2023 | 17/05/2023 | 16/12/2023 |
| 2023 | 2012 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | JUAN CAMILO | SANMIGUEL ROMERO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORMAR PARTE DEL JURADO CALIFICADOR DENTRO DEL PROCESO SI-CMA-001-2023 QUE TIENE POR OBJETO "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL MONUMENTO CONMEMORATIVO A LA CELEBRACION 400 AÑOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER", ASI COMO, BRINDAR APOYO EN EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL DE LOS CONTRATOS QUE SE LE ASIGNE | \$ 18.000.000,00 | 16/05/2023 | 17/05/2023 | 16/09/2023 |
| 2023 | 2058 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | NATHALYA CAROLAY | SUAREZ BERNAL | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE | \$ 11.900.000,00 | 24/05/2023 | 25/05/2023 | 24/12/2023 |
| 2023 | 2067 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | CESAR AUGUSTO | APARICIO URIBE | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS ASUNTOS RELACIONADOS DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | \$ 17.500.000,00 | 25/05/2023 | 26/05/2023 | 25/12/2023 |
| 2023 | 2340 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ANDERSON EMIRO | CONTRERAS BARCENAS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | \$ 20.250.000,00 | 09/06/2023 | 10/06/2023 | 24/10/2023 |
| 2023 | 2341 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ARCADIO | MUÑOZ | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 9.900.000,00 | 09/06/2023 | 10/06/2023 | 24/10/2023 |
| 2023 | 2342 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | GERMAN | LARROTA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 10.800.000,00 | 09/06/2023 | 10/06/2023 | 24/10/2023 |
| 2023 | 2343 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | GERARDO ANDRES | SUAREZ ESCOBAR | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | \$ 13.500.000,00 | 09/06/2023 | 10/06/2023 | 24/10/2023 |
| 2023 | 2344 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ANDRES CAMILO | CORZO LEAL | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA BRINDANDO APOYO EN LA PROYECCION Y SUPERVISION DE LOS CONTRATOS QUE SURJAN CON RELACION AL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | \$ 7.650.000,00 | 09/06/2023 | 10/06/2023 | 24/10/2023 |
| 2023 | 2345 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LEIDI KATERINE | GARCIA MENESES | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO(A) CIVIL PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | \$ 11.250.000,00 | 09/06/2023 | 10/06/2023 | 24/10/2023 |
| 2023 | 2346 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | DIEGO FABIAN | PATIÑO TRUJILLO | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 9.900.000,00 | 09/06/2023 | 10/06/2023 | 24/10/2023 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|--------------|-------------------------------|----------------|-------------------|---|------------------|------------|------------|------------|
| 2023 | 2347 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ISAIAS | SUAREZ DELGADO | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 9.900.000,00 | 09/06/2023 | 10/06/2023 | 24/10/2023 |
| 2023 | 2348 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | EDGAR | GOMEZ CASTAÑEDA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 9.900.000,00 | 09/06/2023 | 10/06/2023 | 24/10/2023 |
| 2023 | 2349 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ARMANDO | MOGOLLON ROJAS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 10.800.000,00 | 09/06/2023 | 10/06/2023 | 24/10/2023 |
| 2023 | 2359 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LAURA CAMILA | RIOS GOMEZ | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO (A) EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA APOYAR, ACOMPAÑAR, PROYECTAR, SUSTANCIAR Y REVISAR JURÍDICAMENTE LOS TEMAS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, QUE ESTA ADELANTE | \$ 27.000.000,00 | 09/06/2023 | 13/06/2023 | 12/12/2023 |
| 2023 | 2454 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | WILFRED EMILIO | PALACIO VERANO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO MECANICO REALIZANDO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE | \$ 18.000.000,00 | 14/06/2023 | 15/06/2023 | 29/10/2023 |
| 2023 | 2455 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | MONICA | ORDUZ MANRIQUE | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PARA ADELANTE ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA | \$ 20.250.000,00 | 14/06/2023 | 15/06/2023 | 29/10/2023 |
| 2023 | 2456 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | MARTHA YANETH | CEPEDA PICO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN ASUNTOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE LE SEAN ASIGNADOS | \$ 20.250.000,00 | 14/06/2023 | 15/06/2023 | 29/10/2023 |
| 2023 | 2458 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | JORGE ANDRES | MARTINEZ VILLADA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE | \$ 15.750.000,00 | 14/06/2023 | 15/06/2023 | 29/10/2023 |
| 2023 | 2459 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | JAVIER | ROJAS TAVERA | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS ASUNTOS RELACIONADOS DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | \$ 20.250.000,00 | 14/06/2023 | 15/06/2023 | 29/10/2023 |
| 2023 | 2460 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | OSCAR MAURICIO | CRUZ ORELLANA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA APOYANDO LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE ELÉCTRICO DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | \$ 15.750.000,00 | 14/06/2023 | 15/06/2023 | 29/10/2023 |
| 2023 | 2461 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | VICENTE | VARGAS LOZANO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE | \$ 18.000.000,00 | 14/06/2023 | 15/06/2023 | 29/10/2023 |
| 2023 | 2462 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | DARIO | GUERRERO MANTILLA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO EN ESTRUCTURAS PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | \$ 27.000.000,00 | 14/06/2023 | 15/06/2023 | 29/10/2023 |
| 2023 | 2477 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | IVAN DARIO | PABON PARRA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CADENERO DENTRO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | \$ 8.100.000,00 | 15/06/2023 | 16/06/2023 | 30/10/2023 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|--------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|--|------------------|------------|------------|------------|
| 2023 | 2503 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | OSCAR FERNANDO | NIÑO CARREÑO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | \$ 20.250.000,00 | 15/06/2023 | 16/06/2023 | 30/10/2023 |
| 2023 | 2504 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | EMERSON MIGUEL | VELANDIA HERRERA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE | \$ 11.250.000,00 | 15/06/2023 | 16/06/2023 | 30/10/2023 |
| 2023 | 2536 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ASTRID | BARRAGAN CASTAÑEDA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA ACOMPAÑAR, PROYECTAR, SUSTANCIAR Y REVISAR JURÍDICAMENTE LOS TEMAS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, QUE ESTA ADELANTE | \$ 21.000.000,00 | 16/06/2023 | 20/06/2023 | 19/12/2023 |
| 2023 | 2537 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | CHRISTIAN SNEYDER | PEÑA ALBARRACIN | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA REALIZANDO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE PROPENDAN POR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA | \$ 11.000.000,00 | 16/06/2023 | 20/06/2023 | 04/12/2023 |
| 2023 | 2538 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | NATHALLY ANDREA | HERNANDEZ MORENO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE | \$ 24.750.000,00 | 16/06/2023 | 20/06/2023 | 04/12/2023 |
| 2023 | 2540 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | JUAN DAVID | PABON ARDILA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA, EN EL PROCESO Y SUBPROCESO DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD | \$ 25.000.000,00 | 16/06/2023 | 17/06/2023 | 16/11/2023 |
| 2023 | 2541 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | JOSE SAUL | ARDILA GUZMAN | PRESTAR SERVICIOS COMO TÉCNICO ELECTRICISTA PARA APOYO EN LA REVISIÓN DE PQR'S, REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE REGISTROS DIARIOS DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO DE LAS CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO, REVISIÓN EN CAMPO DE MATERIALES INSTALADOS Y APOYO AL INGENIERO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO | \$ 15.000.000,00 | 16/06/2023 | 17/06/2023 | 16/11/2023 |
| 2023 | 2545 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | CARLOS JAVIER | RODRIGUEZ JEREZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO INGENIERO CIVIL, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA | \$ 20.250.000,00 | 16/06/2023 | 20/06/2023 | 04/11/2023 |
| 2023 | 2546 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ROBINSON FABIAN | FIGUEROA MALDONADO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTROMECAÁNICO REALIZANDO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE | \$ 11.250.000,00 | 16/06/2023 | 20/06/2023 | 04/11/2023 |
| 2023 | 2547 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | OSCAR ANDRES | TARAZONA FIGUEROA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TOPOGRAFO PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | \$ 20.250.000,00 | 16/06/2023 | 20/06/2023 | 04/11/2023 |
| 2023 | 2564 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | JAIME ENRIQUE | VEGA PEÑA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | \$ 18.000.000,00 | 20/06/2023 | 21/06/2023 | 05/11/2023 |
| 2023 | 2565 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | GENNY PAOLA | ARAQUE VILLAMIZAR | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA APOYANDO LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE ELÉCTRICO DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | \$ 20.250.000,00 | 20/06/2023 | 21/06/2023 | 05/11/2023 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|--------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|---|------------------|------------|------------|------------|
| 2023 | 2566 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | DIEGO JULIAN | ALMEYDA MARTINEZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE | \$ 11.250.000,00 | 20/06/2023 | 21/06/2023 | 05/11/2023 |
| 2023 | 2572 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | JULIETH ALEXANDRA | PEREZ TELLEZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA APOYANDO LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE ELÉCTRICO DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | \$ 20.250.000,00 | 21/06/2023 | 22/06/2023 | 06/11/2023 |
| 2023 | 2576 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | EFRAIN ANDRES | SERRANO PLATA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO INGENIERO CIVIL, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA | \$ 24.750.000,00 | 21/06/2023 | 22/06/2023 | 06/11/2023 |
| 2023 | 2577 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | DIEGO FERNANDO | BUTRON MANTILLA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE | \$ 20.250.000,00 | 21/06/2023 | 22/06/2023 | 06/11/2023 |
| 2023 | 2578 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | CAMILO ANDRES | GOMEZ GARCIA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO EN DIBUJO ARQUITECTONICO PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | \$ 10.350.000,00 | 21/06/2023 | 22/06/2023 | 06/11/2023 |
| 2023 | 2581 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | GERARDO | QUINTERO FLOREZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON APOYO TÉCNICO EN DESARROLLO AL MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL DE LAS ZONAS VERDES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | \$ 11.250.000,00 | 21/06/2023 | 22/06/2023 | 06/11/2023 |
| 2023 | 2582 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS ALBERTO | CASTELLANOS VILLABONA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | \$ 20.250.000,00 | 21/06/2023 | 22/06/2023 | 06/11/2023 |
| 2023 | 2590 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | CLAUDIA XIOMARA | SILVA MEDINA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | \$ 18.000.000,00 | 21/06/2023 | 22/06/2023 | 06/11/2023 |
| 2023 | 2591 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | OMAR ANDRES | RUEDA RUIZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE | \$ 9.000.000,00 | 21/06/2023 | 22/06/2023 | 06/11/2023 |
| 2023 | 2684 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | SERGIO ANDRES | VESGA FERREIRA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO MECANICO REALIZANDO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE | \$ 24.750.000,00 | 22/06/2023 | 23/06/2023 | 07/12/2023 |
| 2023 | 2685 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | JOSE FERNANDO | CHAVES GOMEZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE | \$ 31.500.000,00 | 22/06/2023 | 23/06/2023 | 07/11/2023 |
| 2023 | 2686 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LIBARDO | RUEDA CACERES | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE | \$ 11.250.000,00 | 22/06/2023 | 23/06/2023 | 07/11/2023 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|--------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|--|------------------|------------|------------|------------|
| 2023 | 2687 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | EDWIN ALBERTO | OMAÑA CESPEDES | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, BRINDANDO APOYO EN LA CORRECTA IMPLEMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA ARCGIS DE LAS OBRAS ADELANTADAS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | \$ 13.750.000,00 | 22/06/2023 | 23/06/2023 | 07/12/2023 |
| 2023 | 2688 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | BONIFACIO | FLOREZ ANTELIZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE | \$ 18.000.000,00 | 22/06/2023 | 23/06/2023 | 07/11/2023 |
| 2023 | 2744 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | CARLOS HUMBERTO | TORRES ALVAREZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | \$ 20.250.000,00 | 23/06/2023 | 24/06/2023 | 08/11/2023 |
| 2023 | 2745 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ALEJANDRO | CASTAÑEDA ARENAS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | \$ 13.500.000,00 | 23/06/2023 | 24/06/2023 | 08/11/2023 |
| 2023 | 2746 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUISA FERNANDA | MELGAREJO RAMIREZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | \$ 15.750.000,00 | 23/06/2023 | 24/06/2023 | 08/11/2023 |
| 2023 | 2747 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | KAREN ALEXANDRA | RIVERA CORZO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | \$ 18.000.000,00 | 23/06/2023 | 26/06/2023 | 10/11/2023 |
| 2023 | 2748 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | OSCAR IVAN | SALCEDO BECERRA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE | \$ 9.000.000,00 | 23/06/2023 | 26/06/2023 | 10/11/2023 |
| 2023 | 2753 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | EDUAR FABIAN | GALLO BALAGUERA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | \$ 13.500.000,00 | 23/06/2023 | 24/06/2023 | 08/11/2023 |
| 2023 | 2754 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | JAVIER HERNANDO | MARTINEZ AYALA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LOS ASUNTOS RELACIONADOS DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | \$ 22.500.000,00 | 23/06/2023 | 24/06/2023 | 08/11/2023 |
| 2023 | 2755 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ANTONIO JOSE | GRANADOS VILLAMIZAR | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LOS ASUNTOS RELACIONADOS DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | \$ 22.500.000,00 | 23/06/2023 | 24/06/2023 | 08/11/2023 |
| 2023 | 2756 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | SERGIO FERNANDO | GARCIA LABRADOR | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | \$ 15.750.000,00 | 23/06/2023 | 24/06/2023 | 08/11/2023 |
| 2023 | 2759 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ANDRES FABIAN | SOLANO PEREZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO MECANICO REALIZANDO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE | \$ 13.500.000,00 | 23/06/2023 | 24/06/2023 | 08/11/2023 |
| 2023 | 2760 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ANGIE NATHALIA | CARRILLO SUAREZ | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR EN EL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | \$ 8.100.000,00 | 23/06/2023 | 24/06/2023 | 08/11/2023 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|--------------|-------------------------------|----------------|--------------------|---|------------------|------------|------------|------------|
| 2023 | 2761 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | JORGE EDUARDO | GELVEZ ACOSTA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE | \$ 27.000.000,00 | 23/06/2023 | 24/06/2023 | 23/12/2023 |
| 2023 | 2762 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | PAOLA ANDREA | VARGAS TRIANA | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA REALIZANDO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE PROPENDAN POR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA | \$ 6.750.000,00 | 23/06/2023 | 24/06/2023 | 08/11/2023 |
| 2023 | 2763 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | CHARO LIZET | MANTILLA JARAMILLO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO (A) AMBIENTAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA COMO VERIFICADOR EN EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EN DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER | \$ 9.000.000,00 | 23/06/2023 | 27/06/2023 | 11/11/2023 |
| 2023 | 2764 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ANDREA XIOMARA | TARAZONA GONZALEZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR (A) SOCIAL PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | \$ 15.750.000,00 | 23/06/2023 | 24/06/2023 | 08/11/2023 |
| 2023 | 2765 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | JUAN CARLOS | PLATA NAVARRO | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA REALIZANDO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE PROPENDAN POR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA | \$ 8.100.000,00 | 23/06/2023 | 24/06/2023 | 08/11/2023 |
| 2023 | 2766 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | SANDRA MILENA | PEREZ TORRES | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA COMO VERIFICADOR EN EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ANÁLISIS VIAL EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA Y PLANIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | \$ 11.250.000,00 | 23/06/2023 | 24/06/2023 | 08/11/2023 |
| 2023 | 2767 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | FREDY ALBERTO | PABON PARRA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TOPOGRAFO PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | \$ 20.250.000,00 | 23/06/2023 | 24/06/2023 | 08/11/2023 |
| 2023 | 2768 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ANDRES FELIPE | LUNA GRISALES | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO MECANICO REALIZANDO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE | \$ 13.750.000,00 | 23/06/2023 | 24/06/2023 | 08/12/2023 |
| 2023 | 2800 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUIS ALBERTO | PINZON | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE | \$ 20.250.000,00 | 26/06/2023 | 27/06/2023 | 11/11/2023 |
| 2023 | 2816 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | JUAN FRANCISCO | FANDIÑO PUENTES | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA REALIZANDO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE PROPENDAN POR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA | \$ 6.750.000,00 | 26/06/2023 | 27/06/2023 | 11/11/2023 |
| 2023 | 2817 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | RODRIGO | HERNANDEZ CARRILLO | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 9.900.000,00 | 26/06/2023 | 27/06/2023 | 11/11/2023 |
| 2023 | 2818 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | JAIME ALBERTO | HURTADO SUAREZ | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 9.900.000,00 | 26/06/2023 | 27/06/2023 | 11/11/2023 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|---------------|-------------------------------|------------------|----------------------|--|------------------|------------|------------|------------|
| 2023 | 2826 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | DANIELA | CRUZ JIMENEZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO (A) AMBIENTAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA COMO VERIFICADOR EN EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EN DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER | \$ 11.000.000,00 | 26/06/2023 | 27/06/2023 | 11/12/2023 |
| 2023 | 2827 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LUISA FERNANDA | SANABRIA PARRA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE | \$ 15.750.000,00 | 26/06/2023 | 27/06/2023 | 11/11/2023 |
| 2023 | 2828 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | PERFECCIONADO | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ASTRITH VIVIANA | BARAJAS CACERES | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | \$ 11.250.000,00 | 26/06/2023 | | |
| 2023 | 2829 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ANDRES FELIPE | CARRILLO MURILLO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL APOYANDO LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE HIDRÁULICO, SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | \$ 20.250.000,00 | 26/06/2023 | 27/06/2023 | 11/11/2023 |
| 2023 | 2830 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | CARLOS JULIO | RAMIREZ BELLO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO APOYANDO LOS ASUNTOS RELACIONADOS DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | \$ 26.100.000,00 | 26/06/2023 | 27/06/2023 | 11/11/2023 |
| 2023 | 2831 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | GIOVANNI ENRIQUE | MELO ZAPATA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO EN TRÁNSITO Y VÍAS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ANÁLISIS VIAL EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | \$ 27.900.000,00 | 26/06/2023 | 27/06/2023 | 11/11/2023 |
| 2023 | 2832 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | FEDERICO | ARIAS GARCIA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL APOYANDO LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE HIDRÁULICO, SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | \$ 20.250.000,00 | 26/06/2023 | 27/06/2023 | 11/11/2023 |
| 2023 | 2833 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | CRISTIAN DANIEL | GUTIERREZ SANABRIA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL APOYANDO LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE HIDRÁULICO, SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | \$ 18.000.000,00 | 26/06/2023 | 27/06/2023 | 11/11/2023 |
| 2023 | 2863 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HUGO ALEXANDER | BALLESTEROS CASTILLO | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AFORADOR EN EL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | \$ 6.750.000,00 | 27/06/2023 | 28/06/2023 | 12/11/2023 |
| 2023 | 2864 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ARNULFO | OROZCO TORRES | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE | \$ 9.000.000,00 | 27/06/2023 | 28/06/2023 | 12/11/2023 |
| 2023 | 2865 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | RICARDO ANDRES | ZARATE CABEZA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | \$ 18.000.000,00 | 27/06/2023 | 28/06/2023 | 12/11/2023 |
| 2023 | 2866 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | DANIEL EDUARDO | BAUTISTA JARAMILLO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | \$ 18.000.000,00 | 27/06/2023 | 28/06/2023 | 12/11/2023 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|--------------|-------------------------------|------------------|-------------------|---|------------------|------------|------------|------------|
| 2023 | 2868 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | DANIEL ALEJANDRO | MARTINEZ DIAZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE | \$ 13.500.000,00 | 27/06/2023 | 28/06/2023 | 12/11/2023 |
| 2023 | 2949 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | DIEGO ALEXANDER | ALBA NIÑO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO MECANICO REALIZANDO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE | \$ 16.500.000,00 | 28/06/2023 | 29/06/2023 | 13/12/2023 |
| 2023 | 3002 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ARTURO AURELIO | CAPACHO POLO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE | \$ 20.250.000,00 | 28/06/2023 | 29/06/2023 | 13/11/2023 |
| 2023 | 3020 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | | | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DEL DERECHO PARA EJERCER LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y/O EXTRAJUDICIAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | \$ 31.500.000,00 | 28/06/2023 | 04/07/2023 | 18/11/2023 |
| 2023 | 3031 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | OCTAVIO ANDRES | SANDOVAL GONZALEZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL APOYANDO LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE HIDRÁULICO, SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | \$ 22.500.000,00 | 28/06/2023 | 29/06/2023 | 13/11/2023 |
| 2023 | 3109 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | DEISY JOHANNA | ESTEBAN HERNANDEZ | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AFORADOR EN EL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | \$ 6.750.000,00 | 29/06/2023 | 04/07/2023 | 18/11/2023 |
| 2023 | 3110 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | OMAR | BALLESTEROS BUENO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TOPOGRAFO PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | \$ 20.250.000,00 | 29/06/2023 | 04/07/2023 | 18/11/2023 |
| 2023 | 3113 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | JOSE PABLO | PEDRAZA SERRANO | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO APOYANDO LOS ASUNTOS RELACIONADOS DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | \$ 24.750.000,00 | 29/06/2023 | 04/07/2023 | 18/11/2023 |
| 2023 | 3114 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | LIBANIEL | ZARATE LAGOS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE | \$ 9.900.000,00 | 29/06/2023 | 04/07/2023 | 18/11/2023 |
| 2023 | 3115 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | MYRIAM | PEREZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES, BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO EN LA PROYECCIÓN Y SEGUIMIENTO A DERECHOS DE PETICIÓN Y REQUERIMIENTOS ELEVADOS A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, ASI COMO EN EL MANEJO DEL SISTEMA SIF | \$ 13.750.000,00 | 29/06/2023 | 04/07/2023 | 18/12/2023 |
| 2023 | 3116 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | MATEO | BOHORQUEZ MUÑOZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | \$ 15.750.000,00 | 29/06/2023 | 04/07/2023 | 18/11/2023 |
| 2023 | 3117 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | DIEGO ENRIQUE | GOMEZ VERA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PARA ASESORAR, APOYAR, ACOMPAÑAR, PROYECTAR, SUSTANCIAR Y REVISAR JURÍDICAMENTE LOS TEMAS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSCONTRACTUALES QUE ESTA ADELANTE | \$ 20.250.000,00 | 29/06/2023 | 04/07/2023 | 18/11/2023 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|--------------|-------------------------------|-----------------|----------------|--|------------------|------------|------------|------------|
| 2023 | 3148 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | EN EJECUCION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | SERGIO MAURICIO | CORREA RAMIREZ | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN REALIZANDO ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE SE ADELANTEN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 18.000.000,00 | 30/06/2023 | 04/07/2023 | 03/11/2023 |
|------|------|---|--------------|-------------------------------|-----------------|----------------|--|------------------|------------|------------|------------|
