



**JAIME ANDRÉS
BELTRÁN MARTÍNEZ**
ALCALDE 2024 - 2027

INFORME DE GESTIÓN

IV TRIMESTRE
2023

**SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA**

INFORME DE GESTION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

En el presente informe se resume los principales avances que la Secretaria de Infraestructura ha generado en el cuarto trimestre del año, en el cual ha contratado, ejecutado y realizado las gestiones pertinentes para el control del avance de las diferentes obras que ejecuta la Secretaria, así mismo contiene la información correspondiente a las acciones adelantadas en los diferentes programas de la Secretaría de Infraestructura con los indicadores de cumplimiento de las metas asignadas en el Plan de Desarrollo “Bucaramanga una Ciudad de Oportunidades” para el cuarto trimestre de la vigencia 2023, presentando el avance de cumplimiento como su ejecución presupuestal.

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL

El presupuesto definitivo a 31 de Diciembre de 2023 de la Secretaria de Infraestructura, ascendió a \$ 329.160.106.939,73 y se realizaron apropiaciones y compromisos por valor de \$ 280.903.737.620,18, equivalente al **85,34%** de ejecución.

PROGRAMA	DISTRIBUCION POR PROGRAMA	% PROGRAMA	COMPROMISO	% EJECUCION
Gobernanza Del Agua, Nuestra Agua, Nuestra Vida	\$ 1.899.370.856,24	0,58%	\$ 1.899.370.856,24	0,58%
Estudios Y Diseños De La Infraestructura	\$ 1.067.379.215,44	0,32%	\$ 1.066.806.329,00	0,32%
Desarrollo Del Campo	\$ 2.928.335.427,76	0,89%	\$ 2.928.335.427,76	0,89%
Mejoramiento Y Mantenimiento De Parques Y Zonas Verdes	\$ 8.500.061.053,73	2,58%	\$ 8.406.387.249,48	2,55%
Equipamiento Comunitario	\$ 101.461.302.604,05	30,82%	\$ 80.822.294.017,94	24,55%
Infraestructura De Transporte	\$ 31.227.474.474,17	9,49%	\$ 18.920.666.286,66	5,75%
Alumbrado Público Urbano Y Rural	\$ 79.477.276.069,24	24,15%	\$ 66.096.118.074,77	20,08%
Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer	\$ 17.834.324.018,10	5,42%	\$ 15.999.176.157,33	4,86%
Cobertura Y Equidad De La Educación Preescolar, Básica Y Media	\$ 84.764.583.221,00	25,75%	\$ 84.764.583.221,00	25,75%
TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA 2023	\$ 329.160.106.939,73	100,00%	\$ 280.903.737.620,18	85,34%

A continuación, se detalla la gestión que ha realizado la Secretaria de Infraestructura en las líneas estratégicas y programas en el cuatro trimestre de 2023

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. BUCARAMANGA EQUITATIVA E INCLUYENTE: UNA CIUDAD DE BIENESTAR

COMPONENTE: EDUCACIÓN DE CALIDAD, GARANTÍA DE UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES

PROGRAMA: COBERTURA Y EQUIDAD DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA

INDICADOR	META Programada 2023	Meta Ejecutada 2023	AVANCE	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS COMPROMETIDOS
Número de intervenciones realizadas a colegios públicos de Bucaramanga.	3	3	100%	\$ 84.764.583.221,00	\$ 84.764.583.221,00

En este programa se adelantaron las gestiones pertinentes para lograr adelantar el contrato interadministrativo con FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER y el Municipio de Bucaramanga

1.CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 166 de 2023: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VALOR FISCAL INICIAL : \$ 79.668.991.613,00
 VALORES ADICIONALES : \$ 5.095.591.608,00
 VALOR TOTAL : \$ 84.764.583.221,00
 PLAZO INICIAL : VEINTE (20) MESES
 FECHA DE INICIO : 12 DE JULIO DE 2023

A la fecha el contratista (FINDETER) se encuentra estructurando los procesos de contratación objeto del mismo. Así mismo el Municipio de Bucaramanga, realizo desembolso de los recursos del crédito al contratista.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. BUCARAMANGA SOSTENIBLE: UNA REGIÓN CON FUTURO

COMPONENTE: BUCARAMANGA UNA ECO-CIUDAD

PROGRAMA: GOBERNANZA DEL AGUA, NUESTRA AGUA, NUESTRA VIDA

INDICADOR	META Programada 2023	Meta Ejecutada 2023	AVANCE	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS COMPROMETIDOS
Porcentaje de avance en la repotenciación del alcantarillado sanitario y pluvial.	100%	10%	10%	\$1.899.370.856,24	\$1.899.370.856,24

En este programa se adelantaron las gestiones para poder firmar convenio Interadministrativo con el Acueducto de Bucaramanga y el Municipio de Bucaramanga.

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 171 de 2023: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, INTERVENTORÍA, GERENCIA Y SUPERVISIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO LA FORTUNA; Y LIMPIEZA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, GERENCIA Y SUPERVISIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS PUNTOS ESPECÍFICOS DEFINIDOS.

Valor fiscal: \$ 1.899.370.856,24
 Plazo inicial: Cinco (5) meses y Quince (15) días
 Fecha de inicio: 22 de agosto de 2023
 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2023
 Porcentaje ejecución: 5%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra suspendido

**LÍNEA ESTRATÉGICA 3. BUCARAMANGA PRODUCTIVA Y COMPETITIVA:
EMPRESAS INNOVADORAS, RESPONSABLES Y CONSCIENTES**

COMPONENTE: CONECTIVIDAD PARA COMPETITIVIDAD Y LA INTERNACIONALIZACIÓN

PROGRAMA: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA INFRAESTRUCTURA

INDICADOR	META Programada 2023	Meta Ejecutada 2023	AVANCE	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS COMPROMETIDOS
Porcentaje de estudios y/o diseños requeridos realizados para el desarrollo de proyectos de infraestructura.	100%	100%	100%	\$ 1.067.379.215,44	\$ 1.066.806.329,00

En este programa se adelantaron las gestiones para poder firmar convenio Interadministrativo No. 3985-2023, celebrado entre el Ministerio de Cultura y el Municipio de Bucaramanga, cuyo objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA RECUPERACIÓN DEL COLISEO PERALTA – BIEN DE INTERES CULTURAL DE AMBITO NACIONAL – DECRETO 292 DEL 24 DE FEBRERO DE 1975, EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. Los valores totales de los aportes del Convenio son:



APORTE MINISTERIO DE CULTURA:	\$ 500.000.000,00
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA:	\$ 300.000.000,00
TOTAL:	\$ 800.000.000,00

De conformidad con lo anterior y para la recuperación integral del Coliseo se requiere la elaboración de los estudios técnicos y el proyecto de intervención necesario como base para las futuras obras de intervención.

Derivado del convenio se adjudica la consultoría de los Estudios y diseños para el proyecto de restauración del coliseo peralta así:

**1. CONTRATO DE OBRA No. 253 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
“ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PROYECTO DE RESTAURACION DEL COLISEO
PERALRA INMUEBLE DECLARADO BIEN DE INTERES CULTURAL DEL AMBITO
NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”**



VALOR INICIAL	:	\$ 625.069.999,00
FECHA DE INICIO	:	23 de octubre de 2023
PLAZO INICIAL	:	3 meses
FECHA DE TERM INICIAL	:	22 de enero de 2024
% EJECUCION	:	15%
ESTADO DEL CONTRATO	:	SUSPENDIDO

El porcentaje de avance del parque es del 15%, el proyecto se encuentra suspendido, debido a que se encuentra en espera la respuesta de entidades a las cuales de radico el proyecto, esperando permisos y/o viabilidades del mismo.

**2. CONTRATO DE CONSULTORIA No. 280 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023
“ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE MITIGACION EN EL BARRIO ALTOS DEL
KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”**

VALOR INICIAL	:	\$ 267.377.530,00
VALOR ANTICIPO TOTAL	:	\$ 66.844.382,50
FECHA DE INICIO	:	08 de agosto de 2023
PLAZO INICIAL	:	45 días.
FECHA DE TERM INICIAL	:	31 de diciembre de 2023
% EJECUCION	:	80%
ESTADO DEL CONTRATO	:	SUSPENDIDO

El porcentaje de avance del contrato es de 80%, se están realizando actividades propias de los diseños.

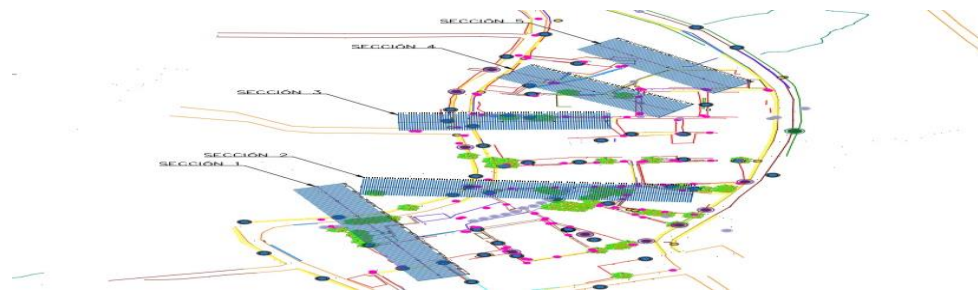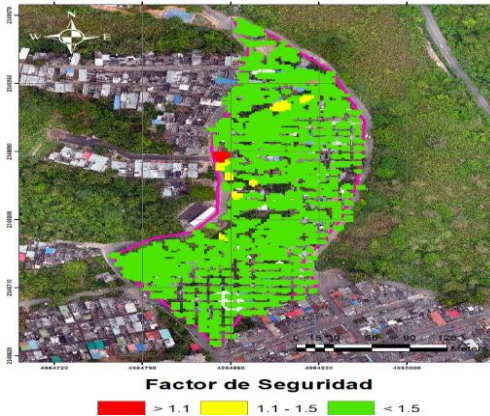

PROGRAMA: DESARROLLO DEL CAMPO

INDICADOR	META Programada 2023	Meta Ejecutada 2023	AVANCE	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS COMPROMETIDOS
Porcentaje de avance en la construcción del acueducto veredal.	100%	10%	10%	\$ 2.928.335.427,76	\$ 2.928.335.427,76

En este programa se adelantaron las gestiones para poder firmar convenio Interadministrativo con el Acueducto de Bucaramanga y el Municipio de Bucaramanga.

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 171 de 2023: PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, INTERVENTORÍA, GERENCIA Y SUPERVISIÓN DEL ACUEDUCTO Y UNIDADES DE SANEAMIENTO BÁSICO [INDIVIDUALES] DE LA VEREDA SANTA RITA Y VEREDA CAPILLA BAJA 1 ETAPA

VALOR FISCAL INICIAL : \$ 2.928.335.427,76
 Plazo inicial: Cinco (5) meses y Quince (15) días
 Fecha de inicio: 22 de agosto de 2023
 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2023
 Porcentaje avance: 5%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra suspendido

2.CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 170 de 2023: “SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA GARANTIZAR LA COBERTURA DEL MINIMO VITAL DE AGUA A LOS SECTORES DE LOS CORREGIMIENTOS 1,2 Y 3, EN VIRTUD DE LAS ACCIONES JUDICIALES EXISTENTES EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”.

Valor fiscal:	\$ 155.875.613,0
Plazo inicial:	Seis (6) meses, hasta el 30 de diciembre de 2023 o hasta agotar el presupuesto (lo primero que ocurra)
Fecha de inicio:	25 de julio de 2023
Fecha de terminación:	30 de diciembre de 2023
Porcentaje avance:	90%

ESTADO DEL CONTRATO: ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra suspendido.



**LÍNEA ESTRATÉGICA 4. BUCARAMANGA CIUDAD VITAL:
LA VIDA ES SAGRADA**

COMPONENTE: CONECTIVIDAD PARA COMPETITIVIDAD Y LA INTERNACIONALIZACIÓN

PROGRAMA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES

INDICADOR	META Programada 2023	Meta Ejecutada 2023	AVANCE	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADO
Mantener el 100% de los parques, zonas verdes y su mobiliario.	100%	100%	100%	\$8.500.061.053,73	\$ 8.406.387.249,48

Dentro de este programa se vienen adelantando proyectos para el mantenimiento y conservación en los diferentes parques y zonas verdes del Municipio así:

1. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 144 de 2023: ACTIVIDADES DE TALA Y MANEJO INTEGRAL DEL COMPONENTE ARBOREO UBICADOS EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

VALOR FISCAL : \$ 659.773.955,15
 PLAZO INICIAL : SEIS (06) MESES Y NUEVE (09) DIAS
 FECHA INICIO : 23 DE JUNIO DE 2023
 FECHA TERMINACION : 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 % EJECUCION : 70% -SUSPENDIDO

Actividades: Garantizar la atención de las talas o el manejo integral que requieren los árboles ubicados en el espacio público y cuentan con autorización de la CDMB para su intervención, esta actividad se desarrollara bajo programación entregada por la secretaria de infraestructura de acuerdo a las autorizaciones expedidas por la autoridad ambiental.

Resumen financiero del Contrato Interadministrativo 144 del 2023	
Valor presupuesto oficial	\$ 659.773.955,15
Acta de Pago 1	\$ 43.724.601,76
Acta de Pago 2	\$ 77.554.594,50
Acta de pago 3	\$ 77.554.594,50



2. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 313 DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022:

Se suscribió un convenio Interadministrativo con el AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA el día 11 de noviembre del 2022, cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y EMBELLECIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

Se firmó acta de inicio el día 12 de diciembre del 2022 con una duración en tiempo de ocho meses para garantizar el mantenimiento diario y permanente de los parques y áreas verdes de la ciudad.

Durante la ejecución del convenio se ha realizado la atención de 225 parques, 140 zonas verdes, 23 separadores, 13 Glorietas y 7 Ciclorrutas, todas estas áreas cuentan con cobertura vegetal que requieren el corte de césped o maleza. De igual manera se cuenta con 80 parqueros permanentes en los diferentes parques de la ciudad, ubicados en las 17 comunas y en la vereda de vijagual.

De igual manera durante este año se ha realizado la siembra de 900 árboles forestales y de dos mil plantas ornamentales.

Resumen financiero del Convenio Interadministrativo 313 del 2022	
Valor presupuesto oficial	\$ 4.212.665.314,47
Aportes Municipio	\$ 3.948.051.805,00
Aportes Área Metropolitana	\$ 264.613.509,47
Valor Desembolso Anticipado 1	\$ 592.208.617,00

Valor Desembolso 2	\$ 195.207.300,00
Valor Desembolso 3	\$ 235.453.278,60
Valor Desembolso 4	\$ 343.135.770,00
Valor Desembolso 5	\$ 411.856.218,00
Valor Desembolso 6	\$ 483.468.835,56
Valor Desembolso 7	\$ 454.309.735,6
Valor Desembolso Adicional	\$ 970.496.175,46
Valor Desembolso 9	\$ 154.133.331,60
Valor Desembolso 10	\$ 310.039.766,00
Valor Desembolso 11	\$ 453.413.956,14
Valor Desembolso Anticipado	\$ 1.285.321.172,00

Se firmó otro si del adicional el día 10 de agosto del 2023 correspondiente al valor fiscal y en plazo, para continuar realizando las actividades correspondientes al mantenimiento de los parques y conservación de la cobertura vegetal.

El valor del adicional es de **MIL NOVECIENTOS CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (1.940.992.350,93).**

NUEVO VALOR FISCAL: SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS (\$ 6.221.038.332,27)

NUEVO PLAZO: 12 MESES.

De acuerdo al balance del convenio se realizó prorroga en plazo por 3 meses cubriendo los meses de enero, febrero y parte de Marzo del año 2024



PROGRAMA: EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

INDICADOR	META Programada 2023	Meta Ejecutada 2023	AVANCE	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADO
Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad construido y/o mejorado.	0	67.284	100%	\$ 101.461.302.604,05	\$ 80.822.294.017,94

Dentro de este programa se han venido realizando las gestiones necesarias para la contratación de los siguientes proyectos.

1. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 184 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2023
“CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BORDE SUR LA VICTORIA EN EL BARRIO LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER”

VALOR INICIAL : \$ 12.918.441.253,19
 VALOR ANTICIPO TOTAL : \$ 3.875.532.375,96
 FECHA DE INICIO : 08 de agosto de 2023
 PLAZO INICIAL : 4 Meses.
 FECHA DE TERM INICIAL : 07 de febrero de 2024
 % EJECUCION : 7%
 ESTADO DEL CONTRATO : EJECUCIÓN

El porcentaje de avance del contrato es de 7%, se está realizando ejecución de instalación de espacio público.






**2. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 198 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2023
“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ESPACIO PUBLICO, ADYACENTE
A LA INSTITUCION EDUCATIVA CAMACHO CARREÑO DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA”**

VALOR INICIAL : \$ 1.718.692.491,00
VALOR ANTICIPO TOTAL : \$ 515.607.747,30
FECHA DE INICIO : 16 de agosto de 2023
PLAZO INICIAL : 4 Meses.
FECHA DE TERM INICIAL : 01 de enero de 2024
% EJECUCION : 90%
ESTADO DEL CONTRATO : SUSPENDIDO

El porcentaje de avance del contrato es de 90%, queda pendiente tema de acometidas, zoterranizacion y entrega e instalación del tablero.

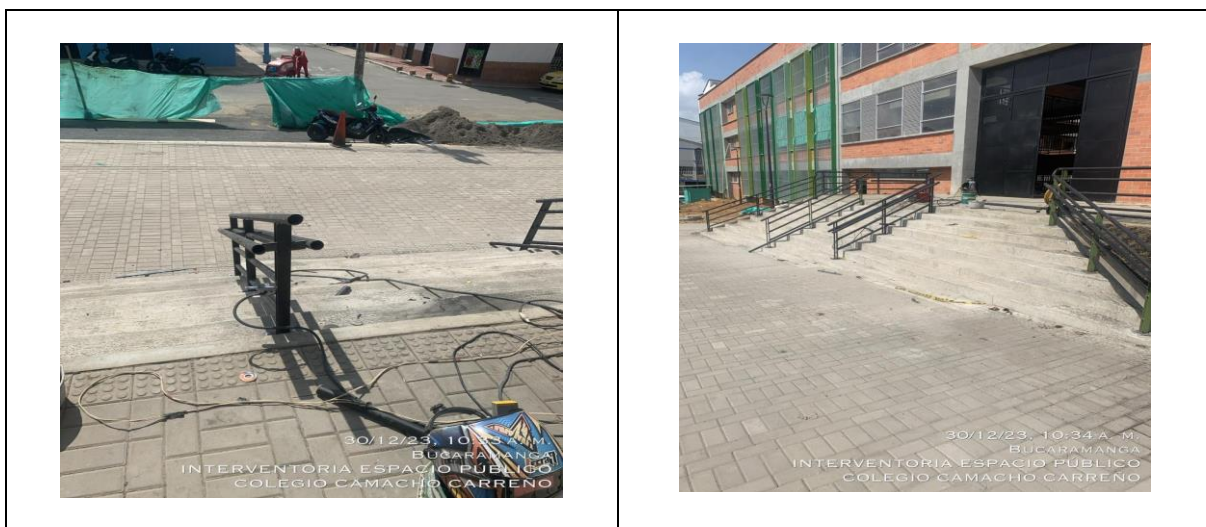



**3. CONTRATO DE OBRA No. 273 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2023
“ADECUACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTO RECREAR DEL NORTE Y CNACHA
SINTETICA DEL KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”**

VALOR INICIAL	:	\$ 816.866.155,00
VALOR ANTICIPO TOTAL	:	\$ 245.059.846,00
FECHA DE INICIO	:	03 de noviembre de 2023
PLAZO INICIAL	:	45 días.
FECHA DE TERM INICIAL	:	24 de diciembre de 2023
% EJECUCION	:	100%
ESTADO DEL CONTRATO	:	LIQUIDADO

El porcentaje de avance del parque es del 100%, el proyecto ya se encuentra liquidado.



**4. CONTRATO DE OBRA No. 333 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023
“ADECUACION DEL SALON COMUNAL RINCON DE LA PAZ DE LA COMUNA NO. 5
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.”**



VALOR INICIAL : \$ 368.226.958,00
ANTICIPO : \$ 110.468.087,40
FECHA DE INICIO : 14 de diciembre de 2023
PLAZO INICIAL : 45 días.
FECHA DE TERM INICIAL : 28 de enero de 2024
% EJECUCION : 0%
ESTADO DEL CONTRATO : SUSPENDIDO

El porcentaje de avance del parque es del 0%, la única actuación una vez iniciado el contrato fue la socialización del inicio de actividades, el contrato se suspendió debido a que por época decembrina y de fiestas, se contaba con escasez de materiales y de mano de obra.

5. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 292 DE 2023 cuyo objeto es ADECUACIÓN DEL PARQUE DIAMANTE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

CONTRATISTA : 7G7 S.A.S
INTERVENTOR : DAROHES S.A.S
SUPERVISOR : WILSON MOTTA RODRIGUEZ
VALOR INICIAL : \$ 2.193.042.076,00
PLAZO INICIAL : CUARENTA Y CINCO DIAS
FECHA DE INICIO : 5 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA FINAL : 19 DE FEBRERO DE 2024
PORCENTAJE AVANCE : 5%
ESTADO DEL CONTRATO : El contrato se encuentra en suspensión en espera de aprobación adicional en plazo.

6. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 310 DE 2023 cuyo objeto es CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIO PUBLICO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BOSCONIA SEDE B VEREDA SANTA RITA

CONTRATISTA : IMCCA S.A.S
SUPERVISOR : WILSON MOTTA RODRIGUEZ
VALOR INICIAL : \$ 866.841.849,00
PLAZO INICIAL : CUARENTA Y CINCO DIAS
FECHA DE INICIO : 4 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA FINAL : 18 DE FEBRERO DE 2024
PORCENTAJE AVANCE : 5%
ESTADO DEL CONTRATO : El contrato se encuentra en suspensión en espera de aprobación adicional en plazo.



7.CONTRATO No. 316 DE 2023, cuyo objeto es: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA DIAGONAL 15 AVENIDA QUEBRADASECA HASTA LA CALLE 33 DENTRO DE LA ESTRATEGIA CORREDOR AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

CONTRATISTA:	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS
VALOR CONTRATADO:	\$ 380.844.085,18
PLAZO INICIAL:	1 mes y 15 días
SUPERVISOR DE OBRA:	ING. EDGAR BAYONA FLOREZ – Prof. Universitario
VALOR ANTICIPO (30%)	\$ 114.253.225,55 (PENDIENTE TRAMITE)
FECHA DE INICIACION:	26 DE DICIEMBRE DE 2023
AVANCE FISICO	0,00 %
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	10 DE FEBRERO DE 2024
FECHA SUSPENSIÓN No 1	27 DE DICIEMBRE DE 2023

ESTADO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato, fue suspendido transcurridos un (1) día de haberse fijado el inicio.

Descripción del proyecto:

El proyecto consta de la intervención urbana del corredor ambiental de la Carrera 15 Fase 1 (Av. Quebrada Seca hasta la Calle 33), dicho proyecto surge de renovar las zonas verdes y aportar al confort térmico de la Carrera 15 por medio de un proyecto paisajístico sobre el separador de la vía, por eso mismo desde la Quebrada Seca hasta la Calle 33 se harán ciertas reparaciones en los andenes y se repotenciará la franja de amueblamiento con mobiliario urbano, a su vez se reharán los vados peatonales que contarán con bolardos metálicos, y en el separador de la vía se planteará una propuesta de paisajismo con especies de la región que ayuden a incentivar la proliferación de la fauna y la flora del lugar.

El Barrio Centro es uno de los primeros asentamientos que se conformaron en la ciudad de Bucaramanga por estar cerca de su iglesia y parque principal, sin embargo, con el tiempo el centro histórico se le fue dando un gran uso comercial hasta convertirse en uno de los puntos más concurridos de la ciudad, la Fase 1 del proyecto cuenta con un área de intervención total de 8.020 metros cuadrados (m²) de uso público. Las mejoras en el espacio público se han reprogramado, con la recuperación del espacio residual, incluyendo actividades físicas y sociales para el goce y disfrute de los ciudadanos. El aprovechamiento de estas actividades en él se realiza en concordancia con los postulados del Plan de Desarrollo.


Así mismo se continúa ejecutando los diferentes proyectos dentro de este programa, los cuales se detallan a continuación.

4. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 448 DE FECHA 30 de diciembre de 2022:
“CONSTRUCCIÓN CENTRO VIDA Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS ANTONIA SANTOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.”

VALOR INICIAL	:	\$ 9.097.194.874,05
VALOR TOTAL ACTUAL	:	\$ 9.626.601.087,03
VALOR ANTICIPO INICIAL	:	\$ 2.620.556.313,30
PLAZO INICIAL	:	10 MESES
PLAZO TOTAL	:	10 MESES Y (19) DIECINUEVE DIAS
CALENDARIO		
FECHA DE INICIO	:	13 de febrero de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	:	30 de diciembre de 2023
% EJECUCION	:	62,93%
ESTADO DEL CONTRATO	:	SUSPENDIDO:

ESTADO DEL CONTRATO : Se han culminado en su totalidad el capítulo de preliminares y se ha avanzado en la intervención de los senderos peatonales exteriores, donde se instaló el adoquín peatonal. Las últimas actividades realizadas fueron las siguientes:

- Instalación de adoquín en plazoleta central.
- Continuación de acabado de la estructura metálica.
- Pintura del cerramiento perimetral.
- Instalación de piso deck en pino y la aplicación de pintura en modulo A.

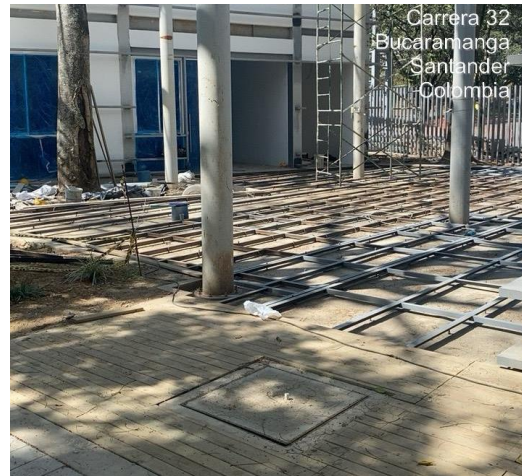

Instalación de piso en pino



**5.CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 388 DE FECHA 19 de diciembre de 2022:
“ADECUACIÓN DE LOS SALONES COMUNALES DE LOS BARRIOS LAS CONCORDIA
Y SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”**

FRENTE 1: SALON LA CONCORDIA

VALOR INICIAL	:	\$1.982.750.130,00
VALOR FRENTE 1	:	\$935.344.963,98
VALOR ANTICIPO	:	\$571.369.406,40 (30% VR AJUSTADO / PLIEGOS)
PLAZO INICIAL	:	4 MESES
FECHA DE INICIO	:	06 de febrero de 2023
FECHA TERM. INICIAL.	:	15 de noviembre de 2023
ESTADO DEL CONTRATO:	:	Terminado
PORCENTAJE AVANCE	:	100%

ESTADO DEL CONTRATO: Siguiendo los diseños establecidos, se realizaron todas las actividades asociadas al contrato.

Se encuentra en proceso administrativo de firma de acta de recibo final ya que se encuentra pendiente las legalizaciones ante las entidades de servicios públicos.

	
<p>ACTUAL: Adecuacion interna del salon comunal</p>	<p>ACTUAL: Adecuacion interna del salon comunal</p>

6.CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 388 DE FECHA 19 de diciembre de 2022:
“ADECUACIÓN DE LOS SALONES COMUNALES DE LOS BARRIOS LAS CONCORDIA Y SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”

FRENTE 2: SALON SAN LUIS

VALOR INICIAL	:	\$1.982.750.130,00
VALOR FRENTE 2	:	\$1.047.405.166,02
VALOR ANTICIPO	:	\$571.369.406,40 (30% VR AJUSTADO / PLIEGOS)
PLAZO INICIAL	:	4 MESES
FECHA DE INICIO	:	06 de febrero de 2023
FECHA TERM. INICIAL.	:	15 de noviembre de 2023
ESTADO DEL CONTRATO:	:	Terminado
PORCENTAJE AVANCE	:	100%

ESTADO DEL CONTRATO: Siguiendo los diseños establecidos, se realizaron todas las actividades asociadas al contrato.


Se encuentra en proceso administrativo de firma de acta de recibo final ya que se encuentra pendiente las legalizaciones ante las entidades de servicios públicos.

	
<p>Adecuacion del espacio Publico acceso Salon Comunal.</p>	<p>Intervención interna del salón comunal</p>

**7. CONTRATO DE OBRA 432 DE 2022- CONSORCIO EDIFICACIONES
“CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS AL BIEN DE INTERÉS
CULTURAL TEATRO COLISEO PERALTA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,
SANTANDER”**

Valor inicial:	\$ 203.550.545,00
Plazo Inicial:	Quince (15) días
Plazo adicional 1:	Un (1) mes
Plazo adicional 2:	Un (1) mes
Plazo adicional 3:	Veinte (20) días
Plazo adicional 4:	Quince (15) días
Plazo total:	(3) meses y Veinte (20) días
Fecha de Inicio:	30 de diciembre de 2022
Fecha de terminación:	30 de julio del 2023
Porcentaje avance:	99 %

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra suspendido

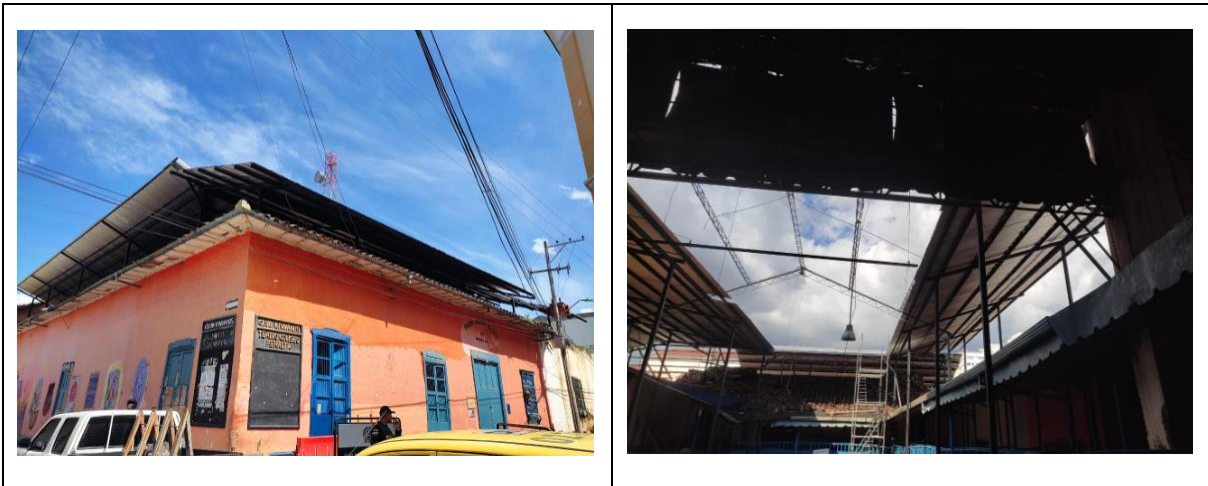

8. CONTRATO DE OBRA No. 387 DE 2022: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA “CENTRO CAMINABLE” EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.”

VALOR FISCAL INICIAL:	\$ 9.702.944.903,00
VALOR FISCAL ADICIONAL:	N.A.
VALOR FISCAL TOTAL:	\$ 9.702.944.903,00
PLAZO INICIAL:	DIEZ (10) MESES
PLAZO ADICIONAL:	N.A.
FECHA DE INICIO:	21 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	20 DE DICIEMBRE DE 2023
PORCENTAJE AVANCE:	18.57%
ESTADO CONTRATO:	SUSPENDIDO

ESTADO DEL CONTRATO: ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en ejecución con un avance del 18.57%, (adjunto registro fotográfico).

TRAMO CRA 26 ENTRE CALLES 32 A LA 33



TRAMO CRA 26 ENTRE CALLES 33 A LA 34



TRAMO CARRERA 26 ENTRE CALLES 34 A LA 35



TRAMO CARRERA 26 ENTRE CALLES 35 A LA 36



9. CONTRATO DE OBRA No. 396 DE 2022: “MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN LA PLAZOLETA LUIS CARLOS GALÁN Y PARQUE GARCIA ROVIRA ENMARCADOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA PLAN CENTRO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.”

VALOR FISCAL INICIAL:	\$ 10.995.207.368
VALOR FISCAL ADICIONAL No. 1:	\$ 1.817.357.764
VALOR FISCAL TOTAL:	\$ 12.812.565.132
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES
PLAZO ADICIONAL:	NUEVE (9) meses + 25 días

FECHA DE INICIO:	06 de MARZO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de DICIEMBRE DE 2023
PORCENTAJE AVANCE:	52%
ESTADO CONTRATO:	SUSPENDIDO

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en ejecución con un avance del 52%, hasta el momento se han adelantado actividades como (adjunto registro fotográfico).



Excavaciones para instalación de ductos carrera 11 entre calles 36 y 37



Corte para dilataciones de losas concreto MR-42 carrera 11 con calle 36



Instalación de acero y malla electro soldada para bancas



**Demolición placa de piso y excavación en zanja para instalación de sardineles
carrera 12 con calle 35**



Lavado de piedra Barichara para instalación de brechado



Instalación de concreto MR-42 calle 36 entre carreras 11 y 12



Estampado de concreto MR-42



Refuerzo escalera calle 36 plazoleta.

**10. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 408 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 -
ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER. GRUPO 1.**

CONTRATISTA : CONSORCIO ADECUACIONES JGV 2022
INTERVENTOR : CONSORCIO INTERSANTANDER
SUPERVISOR : WILSON MOTTA RODRIGUEZ
VALOR INICIAL : \$ 7.031.227.735,05
VALOR ANTICIPO : \$ 2.109.368.320,52
PLAZO INICIAL : SEIS (6) MESES Y VEINTE (20) DIAS
FECHA DE INICIO : 27 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACION : 26 DE AGOSTO DE 2023
ADICION EN PLAZO : 20 DIAS
NUEVA FECHA TERMINACION: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION : 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023
F. REINICIO : 5 DE ENERO 2024
F. FINALIZACION : 6 DE ENERO DE 2024
PORCENTAJE AVANCE : 100%

ESTADO DEL CONTRATO : El contrato se encuentra en ejecución



CANCHA BARRIO HAMACAS



CANCHA BARRIO NORTE BAJO



PARQUE LEONES

PARQUE BARRIO SANTANDER



CONSTRUCCION CERRAMIENTO- SENDEROS PEATONALES

11. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 409 DE FECHA 2022 - ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS SECTORES BRISAS DEL MUTIS, PLAZUELA REAL, CIUADELA REAL DE MINAS, LA SALLE y LA FLORESTA, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

CONTRATISTA : CONSORCIO DEPORTIVOS SM
INTERVENTOR : CONSORCIO KALROY BUCARAMANGA 13
SUPERVISOR : WILSON MOTTA RODRIGUEZ
VALOR INICIAL : \$6.255.943.671,35
VALOR ANTICIPO : \$1.876.783.101,41
PLAZO INICIAL : SEIS (6) MESES
PLAZO ADICIONAL : DOS (2) MESES
FECHA DE INICIO : 10 DE ABRIL DE 2023
FECHA FINAL : 26 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA SUSPENSION : 22 DE DICIEMBRE DE 2023
PORCENTAJE AVANCE : 40%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en suspensión



PARQUE BARRIO PLAZUELA REAL



GIMNASIO CIUDAD BOLIVAR	PARQUE BARRIO LA FLORESTA
 <p>Dec 22, 2023 at 8:49:11 AM Calle 64E-152-1-3A Bucaramanga Santander Colombia Gimnasio ciudad bolivar</p>	 <p>22/12/2023 7:45:15 a.m. Calle 65 49-1-49-99 Bucaramanga Santander Colombia</p>
<p>GIMANSIOS DE ALTO RENDIMIENTO, SENDEROS PEATONALES, ALUMBRADO PÚBLICO</p>	<p>PARQUE INFANTIL, SENDEROS PEATONALES, ZONAS VERDES</p>

12. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 410 DE FECHA 26 DICIEMBRE 2022: ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER LOTE 3

CONTRATISTA : CONSORCIO PARQUES URBANISTICOS
 INTERVENTOR : CONSORCIO INTERVIAS RS
 SUPERVISOR : WILSON MOTTA RODRIGUEZ
 VALOR INICIAL : \$6.417.027.743,27
 VALOR ADICIONAL : \$ 1.340.000.000
 PLAZO INICIAL : SEIS (6) MESES
 PLAZO ADICIONAL : DOS MESES Y MEDIO
 FECHA DE INICIO : 27 DE FEBRERO DE 2023
 FECHA FINAL : 5 DE FEBRERO DE 2024
 PORCENTAJE AVANCE : 70%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra EJECUCION



ESCENARIO DEPORTIVO PATINODROMO PROVENZA



MEJORAMIENTO DEL SUELO DEL PATINODROMO, CANCHA Y PARQUE

13. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 426 DE FECHA 28 de diciembre del 2022:
“ADECUACIÓN Y REFORMAS LOCATIVAS A LAS PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-SANTANDER” – LOTE 1

FRENTE 1: PLAZA SAN FRANCISCO

VALOR FRENTE 1	:	\$7.185.094.791,00
VALOR ANTICIPO	:	\$2.071.308.457,66 (30% VR AJUSTADO / PLIEGOS)
PLAZO INICIAL	:	8 MESES

FECHA DE INICIO : 01 de junio de 2023
 FECHA TERM. INICIAL. : 30 de enero de 2024
 NUEVA FECHA DE TERM. : No Aplica
 ESTADO DEL CONTRATO: EN EJECUCIÓN
 PORCENTAJE AVANCE : 36,60%

ESTADO DEL CONTRATO: Siguiendo los diseños establecidos, se realizaron las siguientes actividades:

Frentes de estuco en carrera 22 con una cuadrilla y aplicación de friso en fachada por calle 12 con una cuadrilla

Se realizaron excavaciones para redes hidrosanitarias en zona de restaurante, coló para redes eléctricas.

Se realizaron actividades de reforzamiento estructural en cerchas de cubierta y mantenimiento de las mismas


se inició de cableado eléctrico en pabellón de carnes y verduras




ACTUAL: Fachada carrera 22 zona de carnes



ACTUAL: Fachada acceso calle 13

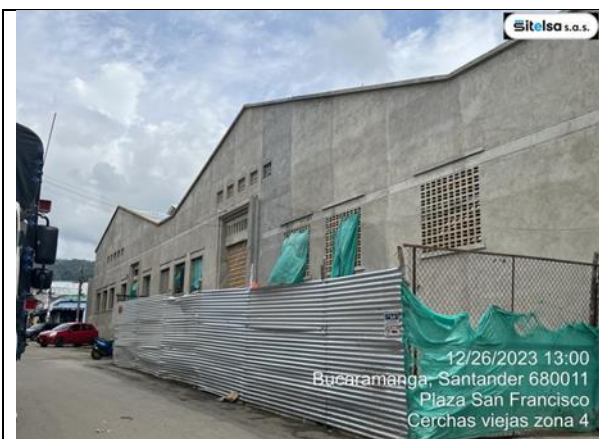

ACTUAL: Friso calle 12

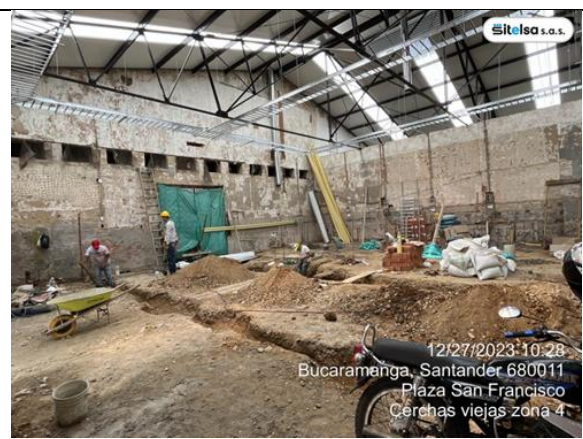

ACTUAL: Zona de restaurante



14. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 445 DE FECHA 30 de diciembre del 2022:
“ADECUACIÓN Y REFORMAS LOCATIVAS A LAS PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-SANTANDER” – LOTE 2

FRENTE 2: PLAZA GUARIN

VALOR FRENTE 1	:	\$4.212.966.188,00
VALOR ANTICIPO	:	\$1.214.051.365,10 (30% VR AJUSTADO / PLIEGOS)
PLAZO INICIAL	:	6 MESES
FECHA DE INICIO	:	01 de junio de 2023
FECHA TERM. INICIAL.	:	30 de noviembre de 2023
NUEVA FECHA DE TERM.	:	30 de enero 2024
ESTADO DEL CONTRATO:	:	EN EJECUCIÓN
PORCENTAJE AVANCE	:	35.66%

ESTADO DEL CONTRATO: Siguiendo los diseños establecidos, se realizaron actividades asociadas a izaje de estructura metálica que comprende, vigas ipe, cerchas, columnas, sobre las carreras 33 y 33^a, terminación de muros en mampostería sobre las carreras 33 y 33^a, realización de locales comerciales intervenidos la demolición,



ACTUAL: izajes estructura metalica sobre la carrera 33



ACTUAL: izajes estructura metalica sobra la carrera 33a



ACTUAL: terminación de muro mampostería 33





ACTUAL: frizado de locales intervenidos.

15. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 17 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2023 “MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANA”- Grupo 1

VALOR INICIAL	:	\$ 540.581.574,00
VALOR ANTICIPO TOTAL	:	\$ 162.174.472,20
VALOR ADICIONAL	:	\$ 234.285.506,00
FECHA DE INICIO	:	03 de marzo 2023
PLAZO INICIAL	:	5 Meses.
FECHA DE TERM INICIAL	:	30 de octubre de 2023
% EJECUCION	:	100%
ESTADO DEL CONTRATO	:	LIQUIDADO

El porcentaje de avance del parque es del 100%, el proyecto ya se encuentra liquidado.

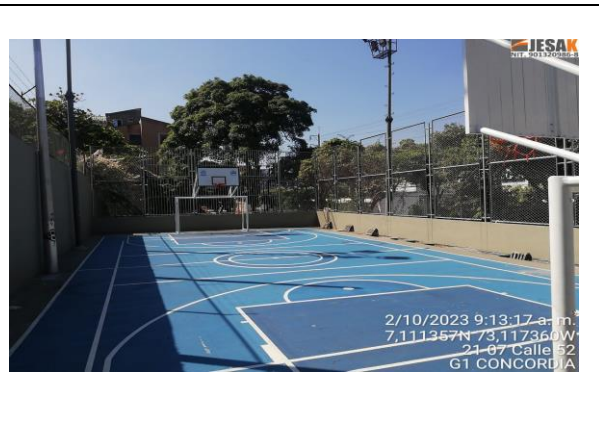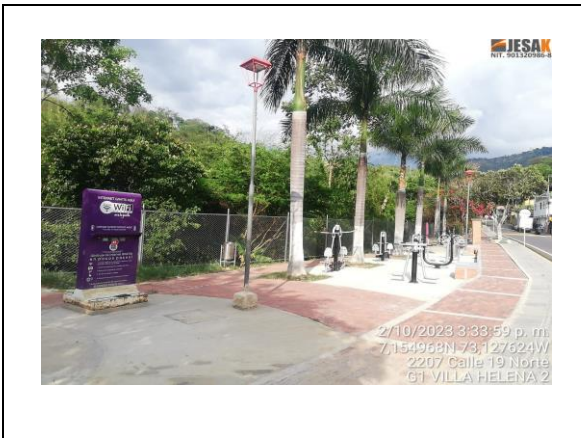



16. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 18 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2023
“MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANA”- Grupo 2

VALOR INICIAL	:	\$ 545.621.902,00
VALOR ANTICIPO TOTAL	:	\$ 163.686.570,60
VALOR ADICIONAL	:	\$ 272.810.952,00
FECHA DE INICIO	:	03 de marzo 2023
PLAZO INICIAL	:	5 Meses.
FECHA DE TERM INICIAL	:	30 de octubre de 2023
% EJECUCION	:	100%
ESTADO DEL CONTRATO	:	LIQUIDADO

El porcentaje de avance del parque es del 100%, el proyecto ya se encuentra liquidado.





17. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 022 DE FECHA 2023- ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GR1

VALOR INICIAL	: \$ 1.961.400.000,00.
VALOR ADICIONAL	: \$ 558.603.751,00.
VALOR TOTAL	: \$ 2.520.003.751,00.
PLAZO INICIAL	: Cuatro (4) meses.
PLAZO ADICIONAL 1	: Cuatro (4) meses.
PLAZO ADICIONAL 2	: VEINTICINCO (25) DIAS
PLAZO ADICIONAL 3	: VEINTICINCO (25) DIAS
PLAZO TOTAL	: OCHO (8) MESES Y CINCUENTA (50) DIAS
FECHA DE INICIO	: 16 de marzo de 2023.
FECHA DE SUSPENSIÓN	: 14 de julio de 2023.
FECHA SUSPENSIÓN n° 2	: 23 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO	: 24 de julio de 2023.
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE ENERO DE 2024
AVANCE FISICO	: 83,53%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato actualmente se encuentra suspendido desde el 23 de diciembre de 2023, con un avance físico del 83,53%. Con respecto a la programación y plazo actual, se puede apreciar un retraso del 13%, quedando veintitrés (23) días para finalizar el contrato. La fecha estimada de reinicio es el 9 de enero de 2023. Los retrasos se han presentado debido a los siguientes precedentes:

-La imposibilidad de intervención del frente limoncito. Para la intervención del frente de obra del barrio Limoncito se requiere la aprobación por parte de la dirección de tránsito de Bucaramanga de un PMT específico, el cual fue presentado el 27 de octubre de 2023 (versión 1) y fue devuelto con observaciones el 28 de noviembre de 2023, radicándose nuevamente (versión 2) el 20 de diciembre de 2023 y hasta la fecha no se ha obtenido la aprobación, dejando constancia que una vez la dirección de tránsito apruebe dicho PMT, se debe remitir al INVIAS para que emita una resolución que autoriza la intervención de la obra a ejecutar.

El valor estimado de ejecución para este frente es de 253.800.000 correspondiente al 10% del valor del contrato

-Los bajos rendimientos presentados durante la construcción del pavimento MR 38 del barrio Albania, debido a la dificultad para ingresar de los camiones mezcladores de concreto.

-Por retrasos debidos a hechos imputables al contratista, este asumió el costo de la interventoría para la prorroga No 3 por veinticinco (25) días, mediante cesión parcial de derechos económicos, autorizado mediante resolución 210 del 15 diciembre de 2023.

Durante este periodo se intervinieron 6 frentes de trabajo: Barrios Albania, El rosal, Campo Madrid, La Juventud Independencia y chapinero, donde se han realizado diferentes actividades así:

Barrio Albania, Cra 51 desde la Casa N° 18-61 hasta la Casa N° 20-67:

- Localización y replanteo manual
- Demolición de varias en concreto, incluye cargue, retiro y disposición final
- Excavación manual en material común y/o conglomerado, incluye cargue, retiro y disposición final
- Franja de ajuste al predio
- Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera
- Realce cajas de servicios públicos
- Realce pozos EMPAS
- Corte de pavimento hasta 3 cm
- Malla electrosoldada 7 mm hueco de 15 *15 cm
- Refuerzo PDR 60
- Base granular
- Pavimento en concreto MR 38
- Aseo y limpieza general

Barrio el Rosal

Costado Occidente de la Cra 20 desde la CII 54N hasta la CII 56N

Costado Oriente de la Cra 20 desde la CII 56N hasta la CII 58N

- Localización y replanteo manual
- Demolición de varias en concreto, incluye cargue, retiro y disposición final
- Excavación manual en material común y/o conglomerado, incluye cargue, retiro y disposición final.
- Relleno compactado con material de sub-base granular

- Construcción de espacio público según MEPB incluye mortero losetas prefabricadas UC-L21; UC-L11; UC-L32 (incluye mortero de pega)
- Suministro e instalación de sardinel prefabricado UC-S10
- Construcción de vados y/o rampas peatonales según MEPB
- Construcción de vados y/o rampas vehiculares según MEPB
- Franja de ajuste al predio
- Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera
- Realce cajas de servicios públicos
- Realce pozos EMPAS
- Corte de pavimento hasta 3 cm
- Relleno manual compactado con material de excavación
- Bordillo en concreto simple de 3000 psi de 10*30 cm fundido en sitio.
- Aseo y limpieza general

Barrió la Independencia

Cra 24A entre calles 3A, 3B Y 4

Cra 24B entre calles 3B y 4

- Localización y replanteo manual
- Demolición de varias en concreto, incluye cargue, retiro y disposición final
- Excavación manual en material común y/o conglomerado, incluye cargue, retiro y disposición final.
- Relleno compactado con material de sub-base granular
- Escalera y/o gradería sobre terreno en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera.
- Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera
- Baranda de protección Metálica 4 Tubos de 2" Horizontales y 1 tubo de 2" vertical cada 2m anclada al piso
- Refuerzo PDR 60
- Aseo y limpieza general

Barrio Chapinero

Costado sur de la calle 4 entre cra 16 y 17

Costado occidental de la carrera 17 entre calle 4 y 5

- Localización y replanteo manual
- Demolición de varias en concreto, incluye cargue, retiro y disposición final
- Excavación manual en material común y/o conglomerado, incluye cargue, retiro y disposición final.
- Relleno compactado con material de sub-base granular
- Construcción de espacio público según MEPB incluye mortero losetas prefabricadas UC-L21; UC-L11; UC-L32 (incluye mortero de pega)
- Suministro e instalación de sardinel prefabricado UC-S10
- Construcción de vados y/o rampas peatonales según MEPB
- Construcción de vados y/o rampas vehiculares según MEPB
- Franja de ajuste al predio
- Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera
- Realce cajas de servicios públicos
- Realce pozos EMPAS
- Corte de pavimento hasta 3 cm
- Relleno manual compactado con material de excavación

- Bordillo en concreto simple de 3000 psi de 10*30 cm fundido en sitio.
- Aseo y limpieza general

La Juventud

Calle 1N entre carreras 21BB hasta la carrera 20 A

Carrera 20A entre calles 1 y calle 1N

Carrera 20C enter calle 1AN y calle 2N

Calle 3N entre carrera 21 y carrera 21^a

Calle 7N entre carrera 20 y 19

Calle 5N entre carrera 18 y 19

- Localización y replanteo manual
- Demolición de varias en concreto, incluye cargue, retiro y disposición final
- Excavación manual en material común y/o conglomerado, incluye cargue, retiro y disposición final.
- Relleno compactado con material de sub-base granular
- Construcción de espacio público según MEPB incluye mortero losetas prefabricadas UC-L21; UC-L11; UC-L32 (incluye mortero de pega)
- Suministro e instalación de sardinel prefabricado UC-S10
- Construcción de vados y/o rampas peatonales según MEPB
- Construcción de vados y/o rampas vehiculares según MEPB
- Franja de ajuste al predio
- Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera
- Realce cajas de servicios públicos
- Realce pozos EMPAS
- Corte de pavimento hasta 3 cm
- Relleno manual compactado con material de excavación
- Bordillo en concreto simple de 3000 psi de 10*30 cm fundido en sitio.
- Aseo y limpieza general

Barrió Campo Madrid:

- Localización y replanteo manual
- Baranda de protección Metálica 4 Tubos de 2" Horizontales y 1 tubo de 2" vertical cada 2m anclada al piso

REGISTRO FOTOGRÁFICO





La independencia

La independencia



SAN ALONSO CLL 20 adicional

SAN ALONSO CLL 20 adicional

18. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 28 DE FECHA 02 DE MARZO DE 2023: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2.

CONTRATISTA:	CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER NIT: 901677404-6
FECHA DEL CONTRATO:	02 DE MARZO DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$1.933.580.689,00
VALOR ADICIONAL	\$467.586.244,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$2.401.166.933,00
VALOR DEL ANTICIPO (30%):	\$561.910.089,42
ANTICIPO ACUMULADO AMORTIZADO:	\$561.910.089,42
FECHA INICIO:	16 DE MARZO DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1	14 DE JULIO DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 1	24 DE JULIO DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	23 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA ESTIMADA DE REINICIO	9 DE ENERO DE 2023
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES



PRORROGA 1:	CUATRO (4) MESES
PRORROGA 2:	VEINTICINCO (25) DÍAS
PRORROGA 3:	VEINTE (20) DÍAS
PLAZO FINAL	OCHO (8) MESES Y VEINTE (20) DÍAS
ULTIMA FECHA DE TERMINACIÓN:	26 DE ENERO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2	23 DE DICIEMBRE DE 2023

AVANCE FISICO: 90%:

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato actualmente se encuentra suspendido, con un avance físico del 90% con respecto a la programación y plazo actual. Durante la ejecución del contrato se presentaron atrasos imputables al contratista. El contratista solicitó dos (2) prórrogas por 25 días y por 20 días, asumiendo el 50% de los costos de interventoría durante los primeros 25 días y el 100% de los costos de interventoría para la última prórroga por 20 días, lo cual fue aprobado por la secretaria de infraestructura mediante resoluciones 192 del 28/nov/2023 y 211 del 15/dic/2023 de autorización de la cesión parcial de derechos económicos. Los motivos que generaron la suspensión del contrato fueron:

1. La circular N° 70 del 14/11/2023 emitida por la SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL, dirigida a entidades prestadoras de servicios y a la comunidad en general, contempla que no se debe realizar ningún tipo de intervenciones 1 en el espacio público durante el periodo comprendido entre el 18/12/2023 y el 12/01/2023; así mismo recomienda que en los sitios donde se estén realizado labores, se debe recuperar provisionalmente la zona, para evitar obstrucciones y afectaciones negativas en la movilidad.
2. Que actualmente se están desarrollando obras de mejoramiento (intervención) del espacio público en algunos sectores de los barrios Mejoras Públicas, La Feria, El Prado, Sotomayor y Nuevo Sotomayor, las cuales afectarían negativamente la movilidad, tanto peatonal como vehicular, si se le dan continuidad durante la época señalada en la circular mencionada anteriormente.
3. Los principales proveedores de materiales del contratista, los cuales son necesarios para la continuidad de los trabajos objeto del contrato, presentan comunicados del 21 de diciembre de 2023 (PREFATEC SAS - anexo) y del 21 de diciembre de 2023 (FERRETERIA VBC - anexo) , donde manifiestan que para temporada navideña y año nuevo, cierran actividades de despachos desde el 23 de diciembre de 2023, hasta el 9 de enero de 2023 ; situación de fuerza mayor, que interrumpe el normal desarrollo de las actividades faltantes por ejecutar

Durante el 4to trimestre se intervinieron 7 frentes de trabajo: Barrio El Prado, Barrio Sotomayor, Barrio Las Ferias, Barrio Aurora, Mejoras Publicas, Barrio Bolívar y Barrio nuevo Sotomayor donde se han realizado diferentes actividades así:

Barrio El Prado

Costado Occidental carrera 36 entre calle 36 y 35

Costado Norte Calle 35 entre carrea 36 y 37

Costado Oriente de la carrera 35 entre calle 36 y 37

Costado Oriente de la carrera 35 entre calle 37 y 38

- Localización y replanteo manual
- Demolición de varias en concreto, incluye cargue, retiro y disposición final
- Excavación manual en material común y/o conglomerado, incluye cargue, retiro y disposición final.
- Relleno compactado con material de sub-base granular
- Construcción de espacio público según MEPB incluye mortero losetas prefabricadas UC-L21; UC-L11; UC-L32 (incluye mortero de pega)
- Suministro e instalación de sardinel prefabricado UC-S10
- Construcción de vados y/o rampas peatonales según MEPB
- Construcción de vados y/o rampas vehiculares según MEPB
- Franja de ajuste al predio
- Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera
- Realce cajas de servicios públicos
- Realce pozos EMPAS
- Corte de pavimento
- Reubicación de tubería de agua potable de 1/2"
- Suministro e instalación de caja en concreto con marco y tapa en hierro ductil para acometida de domiciliaria de 1/2" con medidor en piso según norma AMB
- Franja de ajuste o resanes viales con sardinel, anchos menores a 5 cm
- Relleno manual compactado con material de excavación
- Bordillo de contención y confinamiento fundido en sitio (30x10 cm).
- Suministro e instalación de gramoquin incluye instalación de pasto japones (No incluye mantenimiento)
- Aseo y limpieza general

Barrio Sotomayor

Costado sur de la calle 44 desde la carrera 28 hasta la carrera 29

Costado norte de la calle 45 desde la carrera 27a hasta la carrera 28

Costado oriente de la carrera 27a desde la calle 44 hasta la calle 45.

- Localización y replanteo manual
- Demolición de varias en concreto, incluye cargue, retiro y disposición final
- Excavación manual en material común y/o conglomerado, incluye cargue, retiro y disposición final.
- Relleno compactado con material de sub-base granular
- Construcción de espacio público según MEPB incluye mortero losetas prefabricadas UC-L21; UC-L11; UC-L32 (incluye mortero de pega)
- Suministro e instalación de sardinel prefabricado UC-S10
- Construcción de vados y/o rampas peatonales según MEPB
- Construcción de vados y/o rampas vehiculares según MEPB

- Franja de ajuste al predio

- Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera
- Realce cajas de servicios públicos
- Realce pozos EMPAS
- Corte de pavimento
- Reubicación de tubería de agua potable de 1/2"
- Suministro e instalación de caja en concreto con marco y tapa en hierro ductil para acometida de domiciliaria de 1/2" con medidor en piso según norma AMB
- Franja de ajuste o resanes viales con sardinel, anchos menores a 5 cm
- Relleno manual compactado con material de excavación
- Bordillo de contención y confinamiento fundido en sitio (30x10 cm).
- Suministro e instalación de gramoquin incluye instalación de pasto japones (No incluye mantenimiento)
- Aseo y limpieza general

Barrió Las Ferias

Calles 27 y 28 entre carreras 1 y 2 costado norte

- Localización y replanteo manual
- Demolición de varias en concreto, incluye cargue, retiro y disposición final
- Excavación manual en material común y/o conglomerado, incluye cargue, retiro y disposición final.
- Relleno compactado con material de sub-base granular
- Construcción de espacio público según MEPB incluye mortero losetas prefabricadas UC-L21; UC-L11; UC-L32 (incluye mortero de pega)
- Suministro e instalación de sardinel prefabricado UC-S10
- Construcción de vados y/o rampas peatonales según MEPB
- Construcción de vados y/o rampas vehiculares según MEPB
- Franja de ajuste al predio
- Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera
- Realce cajas de servicios públicos
- Realce pozos EMPAS
- Reubicación de tubería de agua potable de 1/2"
- Suministro e instalación de caja en concreto con marco y tapa en hierro ductil para acometida de domiciliaria de 1/2" con medidor en piso según norma AMB
- Franja de ajuste o resanes viales con sardinel, anchos menores a 5 cm
- Relleno manual compactado con material de excavación
- Bordillo de contención y confinamiento fundido en sitio (30x10 cm).
- Suministro e instalación de gramoquin incluye instalación de pasto japones
- Aseo y limpieza general

Barrio Aurora

Calle 32 entre carrera 29 y 30 franja Norte.

Calle 32 entre carrera 28 y 29 franja Sur.

Calle 32 entre carrera 28 y 29 franja Norte

- Localización y replanteo manual
- Demolición de varias en concreto, incluye cargue, retiro y disposición final
- Excavación manual en material común y/o conglomerado, incluye cargue, retiro y disposición final.
- Relleno compactado con material de sub-base granular

- Construcción de espacio público según MEPB incluye mortero losetas prefabricadas UC-L21; UC-L11; UC-L32 (incluye mortero de pega)
- Suministro e instalación de sardinel prefabricado UC-S10
- Construcción de vados y/o rampas peatonales según MEPB
- Construcción de vados y/o rampas vehiculares según MEPB
- Franja de ajuste al predio
- Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera
- Realce cajas de servicios públicos
- Realce pozos EMPAS
- Corte de pavimento
- Reubicación de tubería de agua potable de 1/2"
- Suministro e instalación de caja en concreto con marco y tapa en hierro ductil para acometida de domiciliaria de 1/2" con medidor en piso según norma AMB
- Franja de ajuste o resanes viales con sardinel, anchos menores a 5 cm
- Relleno manual compactado con material de excavación
- Bordillo de contención y confinamiento fundido en sitio (30x10 cm).
- Suministro e instalación de gramoquin incluye instalación de pasto japones
- Aseo y limpieza general

Barrio Mejoras publicas

Costado Norte CII 34 entre Cra 33 y 32

- Localización y replanteo manual
- Demolición de varias en concreto, incluye cargue, retiro y disposición final
- Excavación manual en material común y/o conglomerado, incluye cargue, retiro y disposición final.
- Relleno compactado con material de sub-base granular
- Construcción de espacio público según MEPB incluye mortero losetas prefabricadas UC-L21; UC-L11; UC-L32 (incluye mortero de pega)
- Suministro e instalación de sardinel prefabricado UC-S10
- Construcción de vados y/o rampas peatonales según MEPB
- Construcción de vados y/o rampas vehiculares según MEPB
- Franja de ajuste al predio
- Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera
- Realce cajas de servicios públicos
- Realce pozos EMPAS
- Reubicación de tubería de agua potable de 1/2"
- Suministro e instalación de caja en concreto con marco y tapa en hierro ductil para acometida de domiciliaria de 1/2" con medidor en piso según norma AMB
- Franja de ajuste o resanes viales con sardinel, anchos menores a 5 cm
- Relleno manual compactado con material de excavación
- Bordillo de contención y confinamiento fundido en sitio (30x10 cm).
- Suministro e instalación de gramoquin incluye instalación de pasto japones
- Aseo y limpieza general

Barrió bolívar

Calle 37 entre carreras 24 y 25-Norte

- Localización y replanteo manual
- Demolición de varias en concreto, incluye cargue, retiro y disposición final

- Excavación manual en material común y/o conglomerado, incluye cargue, retiro y disposición final.
- Relleno compactado con material de sub-base granular
- Construcción de espacio público según MEPB incluye mortero losetas prefabricadas UC-L21; UC-L11; UC-L32 (incluye mortero de pega)
- Suministro e instalación de sardinel prefabricado UC-S10
- Construcción de vados y/o rampas peatonales según MEPB
- Construcción de vados y/o rampas vehiculares según MEPB
- Franja de ajuste al predio
- Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera
- Realce cajas de servicios públicos
- Realce pozos EMPAS
- Reubicación de tubería de agua potable de 1/2"
- Suministro e instalación de caja en concreto con marco y tapa en hierro ductil para acometida de domiciliaria de 1/2" con medidor en piso según norma AMB
- Franja de ajuste o resanes viales con sardinel, anchos menores a 5 cm
- Relleno manual compactado con material de excavación
- Bordillo de contención y confinamiento fundido en sitio (30x10 cm).
- Aseo y limpieza general

Barrió Nuevo Sotomayor

Calle 50 desde avenida Gonzales Valencia hasta carrea 23. (Costado Norte)

- Localización y replanteo manual
- Demolición de varas en concreto, incluye cargue, retiro y disposición final
- Excavación manual en material común y/o conglomerado, incluye cargue, retiro y disposición final.
- Relleno compactado con material de sub-base granular
- Construcción de espacio público según MEPB incluye mortero losetas prefabricadas UC-L21; UC-L11; UC-L32 (incluye mortero de pega)
- Suministro e instalación de sardinel prefabricado UC-S10
- Construcción de vados y/o rampas peatonales según MEPB
- Construcción de vados y/o rampas vehiculares según MEPB
- Franja de ajuste al predio
- Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera
- Realce cajas de servicios públicos
- Realce pozos EMPAS
- Reubicación de tubería de agua potable de 1/2"
- Suministro e instalación de caja en concreto con marco y tapa en hierro ductil para acometida de domiciliaria de 1/2" con medidor en piso según norma AMB
- Franja de ajuste o resanes viales con sardinel, anchos menores a 5 cm
- Relleno manual compactado con material de excavación
- Bordillo de contención y confinamiento fundido en sitio (30x10 cm).
- Aseo y limpieza general

REGISTRO FOTOGRÁFICO



EL PRADO CALLE 35 ENTRE 36 Y 37



EL PRADO CALLE 35 ENTRE 36 Y 37



CALLE 32 ENTRE 28 Y 29 COST SUR



CALLE 32 ENTRE 28 Y 29 COSTADO SUR



Calle 50 entre Av. Gonzalez y Carrera 23 - Norte
Nuevo Sotomayor, Comuna 12



Calle 50 entre Av. Gonzalez y Carrera 23 - Norte
Nuevo Sotomayor, Comuna 12



19. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 417 DE FECHA 2022 - ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER LOTE 3

VALOR INICIAL	: \$ 1.949.858.621,00.
PLAZO ADICIONAL	: \$ 1.047.596.063,00.
VALOR TOTAL	: \$ 2.997.454.684,00.
VALOR ANTICIPO	: \$ 868.032.075,00
PLAZO INICIAL	: Cuatro (4) meses.
PLAZO ADICIONAL 2	: Cuatro (4) meses.
PLAZO ADICIONAL 3	: VEINTICINCO (25) DIAS
PLAZO TOTAL	: OCHO (8) MESES Y VEINTICINCO DIAS
FECHA DE INICIO	: 16 de marzo de 2023.
FECHA DE SUSPENSIÓN	: 14 de julio de 2023.
FECHA DE REINICIO	: 24 de julio de 2023.
FECHA DE TERMINACIÓN:	20 de diciembre de 2023.
AVANCE FÍSICO	: 96,75%
ESTADO	: El contrato terminó el 20 de diciembre de 2023.

Durante el 4to trimestre se intervinieron 8 frentes de trabajo: Real de minas, Cordoncillos, Nueva granada, La libertad, Diamante 1, san Luis, villa Alicia y mutis donde se han realizado diferentes actividades así:

Barrió Real de minas

Pompeyanos en ambos costados de la cra 8 entre calles 61 y 64 (san remo 1 y 2 y metrópolis I)

- Localización y replanteo manual
- Demolición de varias en concreto, incluye cargue, retiro y disposición final
- Excavación manual en material común y/o conglomerado, incluye cargue, retiro y disposición final.

- Relleno compactado con material de sub-base granular
- Suministro e instalación de sardinel prefabricado UC-S10
- suministro y demarcación de marca vial de pintura en base solvente, incluye microesfera y antideslizante
- concreto hidráulico de fraguado rápido mr 41 (fast track) para resalto vehicular trapezoidal (pompeyano)
- Corte de pavimento
- Aseo y limpieza general

Barrió cordoncillos II

CII 65 C N° 2C-31.

- Localización y replanteo manual
- Mantenimiento de barandas
- Aseo y limpieza general

Barrió nueva granada

Cra 19 con calle 70, esquina costado sur - Nueva Granada. (al lado del predio cra 19No 70-03)

- Localización y replanteo manual
- Demolición de varias en concreto, incluye cargue, retiro y disposición final
- Excavación manual en material común y/o conglomerado, incluye cargue, retiro y disposición final.
- Relleno compactado con material de sub-base granular
- Construcción de espacio público según MEPB incluye mortero losetas prefabricadas UC-L21; UC-L11; UC-L32 (incluye mortero de pega)
- Suministro e instalación de sardinel prefabricado UC-S10
- Construcción de vados y/o rampas peatonales según MEPB
- Construcción de vados y/o rampas vehiculares según MEPB
- Franja de ajuste al predio
- concreto de 3000 psi mezclado en sitio para estructuras.
- suministro e instalación de empedrado en franja ambiental para talud de filtro frances, incluye tierra negra y arena
- relleno con material granular de diámetro 1" a 2" para conformación de filtro frances, incluye transporte
- suministro e instalación de tubería perforada de 6" para filtro frances, incluye transporte
- construcción de pozo filtro con h = 2.0 m, incluye estructura y transporte de materiales
- suministro e instalación de geotextil para filtro frances, incluye transporte
- suministro e instalación de geodren planar, h ≤ 2,0 mts, con tubería perforada de 4", incluye transporte
- Aseo y limpieza general

Barrió La Libertad

Mejoramiento de peatonales ubicado en el Costado Norte de la CII 100 entre cra 33 y cra 32.

Mejoramiento de peatonales ubicado en el Costado Sur de la CII 98 entre cra 33 y cra 32.

- Localización y replanteo manual

- Demolición de varias en concreto, incluye cargue, retiro y disposición final
- Excavación manual en material común y/o conglomerado, incluye cargue, retiro y disposición final.
- Relleno compactado con material de sub-base granular
- Construcción de espacio público según MEPB incluye mortero losetas prefabricadas UC-L21; UC-L11; UC-L32 (incluye mortero de pega)
- Suministro e instalación de sardinel prefabricado UC-S10
- Construcción de vados y/o rampas peatonales según MEPB
- Construcción de vados y/o rampas vehiculares según MEPB
- Franja de ajuste al predio
- Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera
- Realce cajas de servicios públicos
- Realce pozos EMPAS
- Corte de pavimento
- Reubicación de tubería de agua potable de 1/2"
- Suministro e instalación de caja en concreto con marco y tapa en hierro ductil para acometida de domiciliaria de 1/2" con medidor en piso según norma AMB
- Franja de ajuste o resanes viales con sardinel, anchos menores a 5 cm
- Relleno manual compactado con material de excavación
- Bordillo de contención y confinamiento fundido en sitio (30x10 cm).
- Suministro e instalación de gramoquin incluye instalación de pasto japones
- Aseo y limpieza general

Barrio Diamante 1.

Carrera 33 con calle 105 diag 105

- Localización y replanteo manual
- Demolición de varias en concreto, incluye cargue, retiro y disposición final
- Excavación manual en material común y/o conglomerado, incluye cargue, retiro y disposición final.
- Relleno compactado con material de sub-base granular
- Construcción de espacio público según MEPB incluye mortero losetas prefabricadas UC-L21; UC-L11; UC-L32 (incluye mortero de pega)
- Suministro e instalación de sardinel prefabricado UC-S10
- Construcción de vados y/o rampas peatonales según MEPB
- concreto de 3000 psi mezclado en sitio para estructuras.
- Aseo y limpieza general

Barrio San luis

Cra 17D desde la CII 90 hasta la CII 90^a

Cra 17D desde la CII 89B hasta la CII 90

Cra 17E desde la CII 89A hasta la CII 89B

- Localización y replanteo manual
- Demolición de varias en concreto, incluye cargue, retiro y disposición final
- Excavación manual en material común y/o conglomerado, incluye cargue, retiro y disposición final.
- Relleno compactado con material de sub-base granular
- Construcción de espacio público según MEPB incluye mortero losetas prefabricadas UC-L21; UC-L11; UC-L32 (incluye mortero de pega)

- Suministro e instalación de sardinel prefabricado UC-S10
- Construcción de vados y/o rampas peatonales según MEPB
- Construcción de vados y/o rampas vehiculares según MEPB
- Franja de ajuste al predio
- Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera
- Realce cajas de servicios públicos
- Realce pozos EMPAS
- Reubicación de tubería de agua potable de 1/2"
- Suministro e instalación de caja en concreto con marco y tapa en hierro ductil para acometida de domiciliaria de 1/2" con medidor en piso según norma AMB
- Franja de ajuste o resanes viales con sardinel, anchos menores a 5 cm
- Relleno manual compactado con material de excavación
- Bordillo de contención y confinamiento fundido en sitio (30x10 cm).
- Suministro e instalación de gramoquin incluye instalación de pasto japonés
- Aseo y limpieza general

Barrio villa Alicia

Cra 16A desde CII 103C hasta CII 104

CII 104 desde Cra 16A hasta Cra 16

CII 103 C desde Cra 16 hasta Cra 16^a

- Localización y replanteo manual
- Demolición de varias en concreto, incluye cargue, retiro y disposición final
- Excavación manual en material común y/o conglomerado, incluye cargue, retiro y disposición final.
- Relleno compactado con material de sub-base granular
- Construcción de espacio público según MEPB incluye mortero losetas prefabricadas UC-L21; UC-L11; UC-L32 (incluye mortero de pega)
- Suministro e instalación de sardinel prefabricado UC-S10
- Construcción de vados y/o rampas peatonales según MEPB
- Construcción de vados y/o rampas vehiculares según MEPB
- Franja de ajuste al predio
- Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera
- Realce cajas de servicios públicos
- Realce pozos EMPAS
- Reubicación de tubería de agua potable de 1/2"
- Suministro e instalación de caja en concreto con marco y tapa en hierro ductil para acometida de domiciliaria de 1/2" con medidor en piso según norma AMB
- Franja de ajuste o resanes viales con sardinel, anchos menores a 5 cm
- Relleno manual compactado con material de excavación
- Bordillo de contención y confinamiento fundido en sitio (30x10 cm).
- Aseo y limpieza general

Barrio mutis

Cra 1W con CII 57 ambos costados

- Localización y replanteo manual
- Demolición de varias en concreto, incluye cargue, retiro y disposición final
- Excavación manual en material común y/o conglomerado, incluye cargue, retiro y disposición final.
- Relleno compactado con material de sub-base granular

- Construcción de espacio público según MEPB incluye mortero losetas prefabricadas UC-L21; UC-L11; UC-L32 (incluye mortero de pega)
- Suministro e instalación de sardinel prefabricado UC-S10
- Construcción de vados y/o rampas peatonales según MEPB
- Construcción de vados y/o rampas vehiculares según MEPB
- Franja de ajuste al predio
- Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera
- Realce cajas de servicios públicos
- Realce pozos EMPAS
- Reubicación de tubería de agua potable de 1/2"
- Suministro e instalación de caja en concreto con marco y tapa en hierro ductil para acometida de domiciliaria de 1/2" con medidor en piso según norma AMB
- Franja de ajuste o resanes viales con sardinel, anchos menores a 5 cm
- Relleno manual compactado con material de excavación
- Bordillo de contención y confinamiento fundido en sitio (30x10 cm).
- Aseo y limpieza general

REGISTRO FOTOGRÁFICO



	
<p>Intervención del espacio público en el frente de la libertad calle 98 cra 32</p>	<p>Intervención del espacio público en el frente de la libertad calle 98 cra 32</p>

20. CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 23 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO DÁMASO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.

CONTRATISTA : CONSORCIO PARQUES BUCARAMANGA
 INTERVENTOR : GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
 SUPERVISOR : WILSON MOTTA RODRIGUEZ
 VALOR INICIAL : \$5.379.338.082,00
 VALOR ANTICIPO : \$1.613.801.424,60
 PLAZO INICIAL : SIETE (7) MESES
 FECHA DE INICIO : 29 DE MAYO DE 2023
 FECHA FINAL : 28 DE DICIEMBRE DE 2023
 PORCENTAJE AVANCE : 45%
ESTADO DEL CONTRATO : El contrato se encuentra en ejecución

 <p>16/9/2023 9:18 a. m. 7.13811395N 73.11785228W</p>	 <p>14/9/2023 7:49 a. m. 7.13770419N 73.11785416W 10-12 Carrera 30 Bucaramanga Santander</p>
<p>APLICACION BASE GRANUKLAR SOBRE LA CARRERA 30</p>	<p>INSTALACION REDES DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO Y BOLARDOS</p>

**21. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 29 DE FECHA 23 de febrero 2022
“ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS
DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – Grupo 1” –
Parque Ferrocarriles**

VALOR INICIAL	:	\$ 7.620.834.131,00
VALOR ANTICIPO TOTAL	:	\$ 2.286.250.239,00
ADICIONAL VALOR. 1	:	\$ 158.054.823,33
ADICIONAL VALOR. 2	:	\$ 592.288.738,17
FECHA DE INICIO	:	28 marzo de 2022
PLAZO INICIAL	:	10 Meses.
FECHA DE TERM INICIAL	:	27 de enero 2023
FECHA NUEVA TERMINA	:	04 de octubre 2023
% EJECUCION	:	100%
ESTADO DEL CONTRATO	:	LIQUIDADO



**22. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 30 DE FECHA 23 de febrero 2022
“ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS
DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – Grupo 2” –
Cancha Café Madrid**

VALOR INICIAL	:	\$ 4.427.144.706,00
VALOR ANTICIPO TOTAL	:	\$ 1.328.143.411,80
VALOR ADICIONAL.	:	\$ 632.046.432,00
FECHA DE INICIO	:	28 marzo de 2022
PLAZO INICIAL	:	06 Meses.
PLAZO ADICIONAL	:	03 Meses.
FECHA DE TERM INICIAL	:	27 de septiembre 2022
NUEVA FECHA DE TERMI.	:	31 de marzo de 2023
% EJECUCION	:	100%
ESTADO DEL CONTRATO	:	LIQUIDADO



**23. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 34 DE FECHA 28 de febrero 2022
“ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS
DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – Grupo 3” –
Parque La Feria**

VALOR INICIAL	:	\$ 6.249.897.563,00
VALOR ANTICIPO TOTAL	:	\$ 1.874.969.268,9
FECHA DE INICIO	:	07 de abril de 2022
VALOR ADICIONAL.	:	\$ 814.633.963,00
PLAZO INICIAL	:	09 Meses.
FECHA DE TERM INICIAL	:	06 de enero de 2023
NUEVA DE TERM	:	31 de octubre de 2023
% EJECUCION	:	97%
ESTADO DEL CONTRATO	:	EN RECIBO FINAL


El porcentaje de avance de la cancha del parque Paseo La Feria es del 97% se está en ajuste de obras del escenario deportivo e iluminación.



**24. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 31 DE FECHA 23 de febrero 2022
“ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS
DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – Grupo 4” –
Parque Canelos**

VALOR INICIAL	:	\$ 6.874.999.999,0
VALOR ANTICIPO TOTAL	:	\$ 1.462.499.999,7
ADICIONAL EN VALOR.	:	\$ 501.239.864,00
FECHA DE INICIO	:	30 de marzo de 2022
PLAZO INICIAL	:	07 Meses.
PLAZO ADICIONAL	:	03 Meses.
FECHA DE TERM INICIAL	:	29 de octubre de 2022
NUEVA FECHA DE TERMI.	:	25 de noviembre de 2023
% EJECUCION	:	98%
ESTADO DEL CONTRATO	:	EN RECIBO FINAL


El porcentaje de avance de la cancha del parque del barrio Canelos es del 98%, se están realizando ajustes a detalles observados por parte de la interventoría.

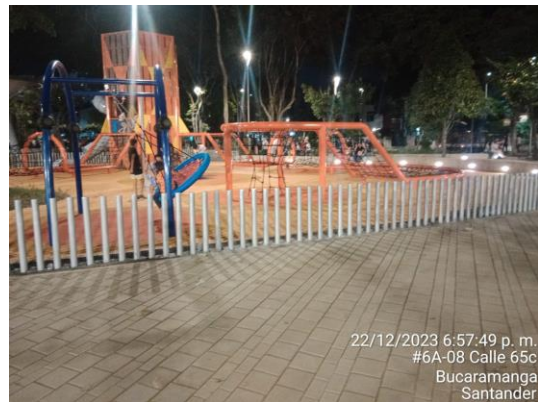

**25. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 33 DE FECHA 25 de febrero 2022
“ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS
DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – Grupo 5” -
Parque Porvenir**

VALOR INICIAL	:	\$ 7.925.167.869,00
VALOR ANTICIPO TOTAL	:	\$ 2.377.550.360,70
ADICIONAL EN VALOR	:	\$ 121.687.807,00
FECHA DE INICIO	:	30 de marzo de 2022
PLAZO INICIAL	:	10 Meses.
FECHA DE TERM INICIAL	:	29 de enero de 2023
NUEVA DE TERM INICIAL	:	25 de noviembre de 2023
% EJECUCION	:	98%
ESTADO DEL CONTRATO	:	EN RECIBO FINAL

El porcentaje de avance de la cancha del parque del barrio Porvenir es del 98%, se están realizando ajustes a detalles observados por parte de la interventoría.

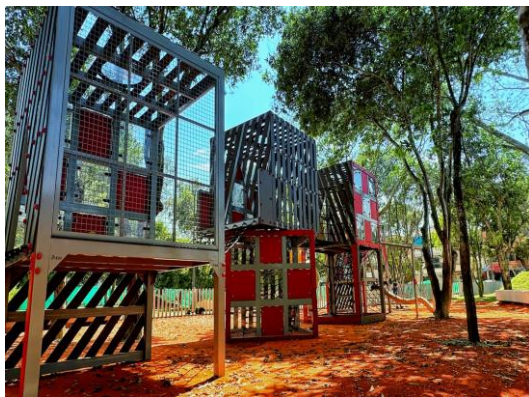

26. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 167 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2022“ADECUACIÓN DEL PARQUE EL CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.

VALOR INICIAL	:	\$ 10.637.401.017,00
VALOR ANTICIPO TOTAL	:	\$ 3.191.220.305,09
VALOR ADICIONAL	:	\$ 366.824.761,23
VALOR ADICIONAL 2	:	\$ 293.996.434,57
FECHA DE INICIO	:	09 de agosto 2022
PLAZO INICIAL	:	6 Meses.
FECHA DE TERM INICIAL	:	08 de febrero de 2023
FECHA DE TERM INICIAL	:	30 de diciembre de 2023
% EJECUCION	:	97%
ESTADO DEL CONTRATO	:	EN RECIBO FINAL

El porcentaje de avance del parque es del 97%, queda pendiente detalles, específicamente de la zona del CAI.



27. CONTRATO DE OBRA 37 DE 2022 -: ARIETE INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES S.A.S “ADECUACIÓN DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. - GRUPO 2.

Valor fiscal:	\$ 406.829.486,00
Valor Adicional 1:	\$ 93.779.508,00
Valor Adicional 2:	\$20.000.000,00
Valor Total:	\$ 520.608.994,00
Plazo inicial:	Dos (2) meses
Plazo Adicional 1:	Un (1) mes
Plazo Adicional 2:	Tres (3) meses
Plazo Adicional 3:	Diez (10) días
Plazo Adicional 4:	Tres (3) días
Plazo Adicional 5:	Veintiocho (28) días
Plazo Adicional 6:	Cuarenta y cinco (45) días
Plazo Total:	Ocho (8) meses y veintiseis (26) días
Fecha de inicio:	28 de marzo de 2022
Fecha de terminación:	27 de mayo de 2022
Nueva Fecha de Terminación:	26 de diciembre de 2023
Porcentaje avance:	100%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra finalizado y en trámites de liquidación

REGISTRO FOTOGRAFICO






28. CONTRATO DE OBRA 38 DE 2022 -: CONSORCIO PRACI “ADECUACIÓN DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. - GRUPO 1.

Valor fiscal:	\$ 479.947.142,00
Valor Adicional 1:	\$ 96.968.284,00
Valor Adicional 2:	\$ 76.591.183,00
Valor Total:	\$ 653.506.609,00
Plazo inicial:	Dos (2) meses
Plazo Adicional 1:	Un (1) mes
Plazo Adicional 2:	Tres (3) meses
Plazo Adicional 3:	Diez (10) días
Plazo Adicional 4:	Tres (3) días
Plazo Adicional 5:	Veintiocho (28) días
Plazo Adicional 6:	Tres (3) meses
Plazo total:	Diez (10) meses Once (11) días
Fecha de inicio:	28 de marzo de 2022
Fecha de terminación:	27 de mayo de 2022
Nueva Fecha de Terminación:	26 de diciembre de 2023
Porcentaje avance:	48%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra Suspendido.

REGISTRO FOTOGRAFICO

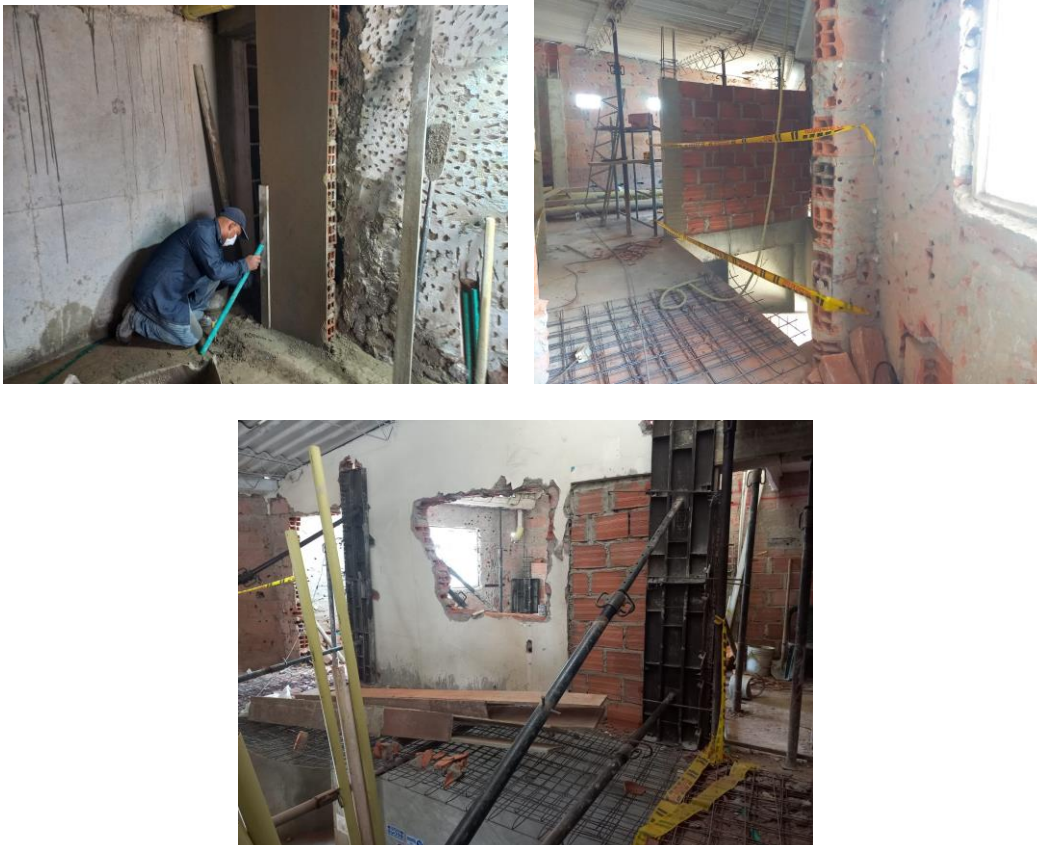

29. CONTRATO No. 163 DEL 22/5/2022 “MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ENMARCADO DENTRO DE LA ESTRATEGIA “PLAN REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO CENTRO” EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

CONTRATISTA : CONSORCIO MALLA VIAL INCAL
INTERVENTOR : EDGAR ALONSO QUESADA OREJARENA
VALOR INICIAL : \$ 31.221.573.233,00
VALOR ANTICIPO : \$ 9.366.471.969,90
PLAZO INICIAL : SEIS (6) MESES
ADICION EN PLAZO : SEIS (6) MESES
ADICION EN PLAZO No. 2 : TRES (03) MESES
ADICION EN PLAZO No. 3 : CINCO (05) MESES
PLAZO TOTAL : VEINTE (20) MESES
FECHA DE INICIO : 30 DE AGOSTO DE 2022
NUEVA FECHA TERMINAC. : 29 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE SUSPENSION : 21 DE DICIEMBRE DE 2023
PORCETAJE EJECUCION : 77,76%

ESTADO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato fue necesario suspenderlo a partir del día 21/12/2023, con un avance físico del 77,76% con respecto a la programación y plazo actual, no se presenta retraso acorde porcentaje programado (70,29%) quedando 4 meses de plazo para finalizar el contrato, una vez sea reiniciado.

En el presente informe se han tenido las siguientes observaciones:

Redes eléctricas: debido a que el proyecto plantea la necesidad de soterrar la mayoría de tramos de redes eléctricas de media tensión, baja tensión y alumbrado público, en terreno se han ido encontrando obstáculos que no han permitido un avance eficiente, es tema de redes de acueducto y alcantarillado los cuales se han ido cruzando con los diseños estipulados, por lo que se ha tenido que programar visitas a campo y reuniones con personal de la ESSA, de la alcaldía y especialistas eléctricos tanto del contratista como de la interventoría, con el fin de ir liberando tramos e ir avanzando en el soterrado de las redes. Estas actividades hacen parte de la ruta crítica debido a que se deben dejar instalados los ductos para poder conformar rasante y rematar con los acabados según diseños. A la fecha se han logrado subsanar varios inconvenientes, sobre todo en la coordinación con la empresa de acueducto quienes han venido realizando las actividades restitución de redes principales.

El factor social es un componente muy importante en la ejecución de cualquier proyecto, a la fecha y acorde al alcance vigente se tiene proyectada la intervención de la carrera 10 entre calles 37 a 44, y la calle 42 entre carreras 10 y 12, sin embargo en estos tramos aún no se han iniciado las obras teniendo en cuenta que existen parqueaderos públicos que se verán afectados en las intervenciones, por lo que se hace necesario evaluar la manera de reducir el impacto y generar un plan acertado que permita la operatividad de estos parqueaderos y/o llegar a acuerdo concretos con los propietarios.

Después de los inconvenientes presentados y a medida que se han ido liberando actividades, en el último mes de la vigencia 2023, se incrementó la ejecución de actividades teniendo en cuenta los imprevistos que se puedan presentar y dando solución mediante mesas de trabajo concertadas entre las partes (contratista, interventoría y alcaldía). Al 21/12/2023 (suspensión) ocho (8) frentes ya se encuentran con acabados en piedra travertino vehicular y peatonal, los cuales son la carrera 11 entre calles 37 y 41, carrera 11 entre calles 41 y 42, carrera 11 entre calles 42 y 43, calle 37 entre carreras 11 y 12, calle 37 entre carreras 12 y 13, carrera 12 entre calles 36 y 37, carrera 12 entre calles 37 y 41 y calle 41 entre carreras 11 y 12; 8 tramos abiertos, donde se han realizado diferentes actividades así:

CARRERA 10 ENTRE CALLES 37 Y 41



Instalación tubería del acueducto



Estructura para monoblock



Fundida losas pavimento MR-42



Instalación tramo de monoblock

CARRERA 10 ENTRE CALLES 42 y 43



Instalación geodren vial



Instalación tubería eléctrica



Instalación tubería eléctrica



Excavaciones para sardinel

CARRERA 11 ENTRE CALLES 43 Y 44



Fundida tramo calzada en concreto liso



Instalación piso peatonal sobre la calle 44



Fundida franja de ajuste



Instalación piso peatonal en travertino

CARRERA 12 ENTRE CALLES 37 y 41



Adecuación desagüe bajantes



Fundida franja de ajuste



Amarre y figurado de acero parrillas de refuerzo lozas sobre calzada vehicular



Conformación capa de rasante calzada vehicular en intersección con calle 41

CARRERA 12 ENTRE CALLES 41 Y 42



Instalación piso peatonal en travertino



Adecuación cajas eléctricas



Extendida capa de sub -base e instalación piso peatonal en travertino

CALLE 37 ENTRE CARRERAS 11 Y 12



Pruebas de limpieza canales de monoblock

CALLE 41 ENTRE CARRERAS 9 y 10



Demolición tramo placa de andén



Atraque en concreto tubería eléctrica



Excavaciones tubería eléctrica



Instalaciones cometida de acueductos

CALLE 41 ENTRE CARRERAS 10 Y 11



Demolición plaza zona del deck



Instalación piso peatonal en travertino



Piso peatona en travertino costado norte



Construcción caja de alumbrado publico

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INDICADOR	META Programada 2023	Meta Ejecutada 2023	AVANCE	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS COMPROMETIDOS
Número de m2 de malla vial urbana mantenidos o mejorados.	0	65.942	100%	\$ 27.794.266.678,17	\$ 15.487.472.173,66
Número de metros lineales de placa huella construidos en la zona rural.	1.350	798	59%	\$ 3.433.207.796,00	\$ 3.433.194.113,00

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 157 de 2023: BUCARAMANGA Y EL MINISTERIO DE DEFENSA EJERCITO NACIONAL COMANDO DE INGENIEROS BATALLON DE INGENIEROS DE COMBATE No. 05 CR. FRANCISCO JOSE DE CALDAS A TRAVES DE LA CENTRAL ADMISNITRATIVA Y CONTABLE CENAC DE INGENIEROS, PARA QUE SE EFECTUE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA EN LAS COMUNAS 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

VALOR FISCAL INICIAL: \$ 3.061.685.511
 VALOR FISCAL ADICIONAL: N.A
 VALOR FISCAL TOTAL: \$ 3.061.685.511
 PLAZO INICIAL: CINCO (5) MESES
 PLAZO ADICIONAL: CINCO (5) MESES
 PLAZO INICIAL + ADICIONAL: N.A
 FECHA DE INICIO: 01/08/2023
 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de Mayo de 2024
 PORCENTAJE AVANCE: 8 %

ESTADO DEL CONTRATO: El convenio interadministrativo se encuentra en ejecución, con un avance físico del 8%, se han realizado actividades como: construcción en losas de concreto, actividades de socialización y actas de vecindad – Comuna 1 y 2. Barrios Colorados, Café Madrid, Portal de los ángeles, Kennedy, Esperanza III.



LOSAS DE CONCRETO – BARRIO ESPERANZA 3

LOSAS DE CONCRETO – BARRIO ESPERANZA 3

 <p>25/10/2023 16:15:34 7°10'27.621"N -73°8'1.497"W 264° W Corregimiento: Los Colorados Bucaramanga Santander #Convenio N° 157 Alc. Brmanga/EJC-BICAL5</p>	
<p>PAVIMENTO FLEXIBLE- BARRIO PORTAL DE LOS ANGELES</p>	<p>PAVIMENTO FLEXIBLE- BARRIO PORTAL DE LOS ANGELES</p>

1.1) CONTRATO DE SUMINISTRO No. 215 DE 2023: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS Y COMBUSTIBLES EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 157 DEL 28 DE JUNIO DEL 2023, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA Y EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA EN LAS COMUNAS 1 Y 2, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - LOTE 2

VALOR FISCAL INICIAL:	\$ 103.793.736,92
VALOR FISCAL ADICIONAL:	N.A.
VALOR FISCAL TOTAL:	\$ 103.793.736,92
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES
PLAZO ADICIONAL:	N.A.
FECHA DE INICIO:	30/08/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	29/12/2023
PORCENTAJE AVANCE:	100 %
ESTADO CONTRATO:	ETAPA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN.

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en ejecución con un avance en tiempo del 100%, hasta el momento se han adelantado actividades como la entrega parcial de insumos.

1.2) CONTRATO DE SUMINISTRO No. 216 DE 2023: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS Y COMBUSTIBLES EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 157 DEL 28 DE JUNIO DEL 2023, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA Y EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA EN LAS COMUNAS 1 Y 2, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE No. 3



VALOR FISCAL INICIAL:	\$ 497.646.161
VALOR FISCAL ADICIONAL:	N.A.
VALOR FISCAL TOTAL:	\$ 497.646.161
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES
PLAZO ADICIONAL:	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO:	29/08/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE MAYO DE 2024
PORCENTAJE AVANCE:	15 %

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en ejecución con un avance Físico del 15%, hasta el momento se han adelantado actividades como la entrega parcial de insumos.

1.3) CONTRATO DE SUMINISTRO No. 230 DE 2023: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS Y COMBUSTIBLES EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 157 DEL 28 DE JUNIO DEL 2023, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA Y EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA EN LAS COMUNAS 1 Y 2, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - LOTE 1

VALOR FISCAL INICIAL:	\$ 2.119.924.300
VALOR FISCAL ADICIONAL:	N.A.
VALOR FISCAL TOTAL:	\$ 2.119.924.300
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES
PLAZO ADICIONAL:	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO:	18/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE MAYO DE 2024
PORCENTAJE AVANCE EN TIEMPO	6.75 %

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en ejecución con un avance en tiempo del 6,75%, hasta el momento se han adelantado actividades como la entrega parcial de insumos.

2. CONTRATO DE OBRA 418 de 2022 -: CONSORCIO JASC 2022 “MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DE LOS CORREGIMIENTOS 1,2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.

CONTRATISTA	: CONSORCIO JASC 2022
INTERVENTOR	: COMPAÑÍA PROYECTOS TECNICOS CPT S.A.S
SUPERVISOR	: WILSON MOTTA RODRIGUEZ
VALOR INICIAL	: \$ 2.130.769.633,10
VALOR ADICIONAL	: \$ 901.028.598,00
PLAZO INICIAL	: CINCO (5) MESES
PLAZO ADICIONAL	: 2 MESES 20 DIAS
FECHA DE INICIO	: 14 DE MARZO DE 2023

FECHA FINAL : 15 DE ENERO DEL 2024.
PORCENTAJE AVANCE : 81 %

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra Suspendido.



PLACA HUELLA VEREDA ANGELINOS



PLACA HUELLA VEREDA SAN PEDRO BAJO



PLACA HUELLA VEREDA LA SABANA



PLACA HUELLA VEREDA SAN CAYETANO

3. CONTRATO DE OBRA 419 de 2022- RURAL BUCARAMANGA "MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DE LOS CORREGIMIENTOS 1,2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA".

CONTRATISTA : CONSORCIO RURAL BUCARAMANGA 2023
INTERVENTOR : CONSORCIO CDC
SUPERVISOR : WILSON MOTTA RODRIGUEZ
VALOR INICIAL : \$ 1.860.497.004,00
VALOR ADICIONAL : \$ 725.657.760,00

PLAZO INICIAL : CINCO (5) MESES
 PLAZO ADICIONAL : DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS
 FECHA DE INICIO : 07 DE MARZO DE 2023
 FECHA FINAL : 14 DE ENERO DE 2024
 PORCENTAJE AVANCE : 70 %

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra EN EJECUCION.

GRUPO 2 - C2 - PLACAS HUELLAS							
No.	CORREGIMIENTO	VEREDA	SECTOR	OBRA A REALIZAR	LONG. FINAL.	% AVANCE	ESTADO
1	Corregimiento 2	Capilla alta	Finca El Guarumo - Finca Esquinita	Placa huella L=170 M	170	0%	POR INICIRA
2	Corregimiento 2	Vereda Capilla baja	Sector Escuela	Placa huella L=150 M	106	100%	TERMINADO
3	Corregimiento 2	Vereda Capilla baja	Sector Escuela II	Placa huella L=100 M	144	100%	TERMINADO
4	Corregimiento 2	Vereda Monserrate	Sector El Embalse Tona	Placa huella L=200 M	140	70%	EN EJECUCION
5	Corregimiento 2	Vereda Bolarqui Bajo		Tramo Adicional	60	100%	TERMINADO
GRUPO 2 - C2 - OBRAS DE ARTE							
	CORREGIMIENTO	VEREDA	SECTOR	OBRA A REALIZAR	Cantidad	% AVANCE	ESTADO
6	Corregimiento 2	Bolarqui Bajo	Sector el guayabito	Muro de estabilización.	1	100%	TERMINADO
GRUPO 2 - C3 - PLACAS HUELLAS							
No.	CORREGIMIENTO	VEREDA	SECTOR	OBRA A REALIZAR	LONG. FINAL.	% AVANCE	ESTADO
7	Corregimiento 3	San José	Gruta de la virgen casa No.50	Placa huella L=150 M	106	100%	TERMINADO
8	Corregimiento 3	San José	Sector casa roja - finca Genaro	Placa huella L=52 M	66	100%	TERMINADO
9	Corregimiento 3	El Pedregal	Sector El mango	Placa huella L=190 M	138	100%	TERMINADO
10	Corregimiento 3	El Pedregal	Finca Villa Laura curva 1 y 2	Placa huella L=37 M	37	0%	POR INICIAR
11	Corregimiento 3	Vereda Retiro chiquito	Sector Curva el miedo	Placa huella L=200 M	80	50%	EN EJECUCION
12	Corregimiento 3	Vereda Retiro chiquito	Sector La Yee la niebla Tramo 1.	Placa huella L=100 M	126	100%	TERMINADO
13	Corregimiento 3	Vereda Retiro chiquito	Sector La Yee la niebla Tramo 2.	Tramo Adicional	80	100%	TERMINADO
14	Corregimiento 3	Galilo alto	Km 12 - La Niebla Tramo No.1.	Tramo Adicional	70	0%	POR INICIAR
15	Corregimiento 3	Galilo alto	Km 12 - La Niebla Tramo No.2.	Tramo Adicional	70	0%	POR INICIAR
16	Corregimiento 3	Gualilo.	La Malaña.	Tramo Adicional	70	0%	POR INICIAR
17	Corregimiento 3	SANTA BARBARA	La Udes.	Tramo Adicional	80	20%	EN EJECUCION
18	Corregimiento 3	SANTA BARBARA	La Antena.	Tramo Adicional	80	20%	EN EJECUCION
LONGITUD TOTAL					1.623,00		



4. CONTRATO DE OBRA 433 de 2022 - CONSORCIO GRAVIRU 2022
 “MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DE LOS CORREGIMIENTOS 1,2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.

CONTRATISTA	: CONSORCIO GRAVIRU 2022
INTERVENTOR	: CONSORCIO AUTOVIAL IMGA
SUPERVISOR	: WILSON MOTTA RODRIGUEZ
VALOR INICIAL	: \$ 1.176.592.900,00
VALOR ADICIONAL	: \$ 549.684.264,00
PLAZO INICIAL	: CINCO (5) MESES
PLAZO ADICIONAL	: DOS (2) MESES

FECHA DE INICIO : 11 DE MAYO DE 2023
FECHA FINAL : 26 DE DICIEMBRE DE 2023
PORCENTAJE AVANCE : 100%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra Proceso de liquidación

 <p>CORREGIMIENTO 1 - SANTA RITA - PUNTO 29 11/24/2023 02:17:09 p. m.</p>	 <p>punto 65 vereda bolarqui corregimiento 2 #7 21 nov. 2023 14:17:23</p>
<p>Muro de contención vereda Santa Rita</p>	<p>Placa huella vereda Bolarqui alto</p>

 <p>28 oct. 2023 12:39:36 p. m. Bucaramanga Santander Corregimiento 2 Los Santos Punto 21 Aplicación de pintura alcantarilla existente</p>	 <p>15/9/2023 2:39 p. m. Bucaramanga Santander Corregimiento 1 Santa Rita Punto 27 Demolicion roca cuneta</p>
<p>Muro de contención vereda Santa Rita</p>	<p>Placa huella vereda Bolarqui alto</p>

5. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 146 DE 2022: “MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TRAMOS VIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”.

VALOR FISCAL INICIAL : \$ 2.245.556.033
VALOR FISCAL ADICIONAL : \$ 1.100.131.989,00
VALOR FISCAL TOTAL : \$ 3.345.688.022,00







PLAZO INICIAL + ADICIONALES : SEIS (6) MESES Y VEINTIDOS (22) DIAS
FECHA DE INICIO : 08 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN : 31 DE MAYO DE 2023
PORCENTAJE AVANCE : 100%
ESTADO CONTRATO: En etapa de recibo y Liquidación.

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra finalizado con un porcentaje del 100%, e incluye la intervención de las siguientes direcciones en los barrios correspondientes de la ciudad:



	Frente	Barrio
PUNTO 1	Siete Bocas	Bolivar
PUNTO 4	Glorieta San Francisco	San francisco
PUNTO 5	Glorieta Villa Olímpica	San Alonso
PUNTO 7	Cr 27 - Cll 33	Mejoras públicas
PUNTO 9	Cr 33 - Cll 34	Mejoras públicas
PUNTO 12	Cll 45 - Cr 9	Mutis
PUNTO 13	Glorieta Girardot	Girardot
PUNTO 14	Av Q/seca - Cr 33a	San Alonso
PUNTO 15	Cll 32 - Cr 47	Alvarez
PUNTO 26	Cr 19 - Av Q/seca	Antonia Santos
PUNTO 28	Cr 33 - Cll 42	Cabecera del llano


	Frente	Barrio
PUNTO 29	Cr 33 - Cll 45	Cabecera del llano
PUNTO 31	Glorieta mutis	Mutis
PUNTO 34	Cr 3 - Cll 55	Mutis
PUNTO 37	Bulevar Santander - cll 14	Alarcón
PUNTO 38	Cll 16 - Cr 28	San Alonso
PUNTO 41	Cr 27 - Cll 36	Mejoras públicas
PUNTO 42	Cr 27 - Av rosita	Sotomayor
PUNTO 43	Cr 27 - Cll 45	Nuevo Sotomayor
PUNTO 44	Cr 27 - cll 48	Nuevo Sotomayor
PUNTO 45	Cr 27 - Av Gonzales valencia	Nuevo Sotomayor
PUNTO 46	Cr 27 - Cll 56	Sotomayor
PUNTO 47	Cr 33 - Cl 56	Cabecera del llano

REGISTRO FOTOGRAFICO CRA 27 - CALLE 45

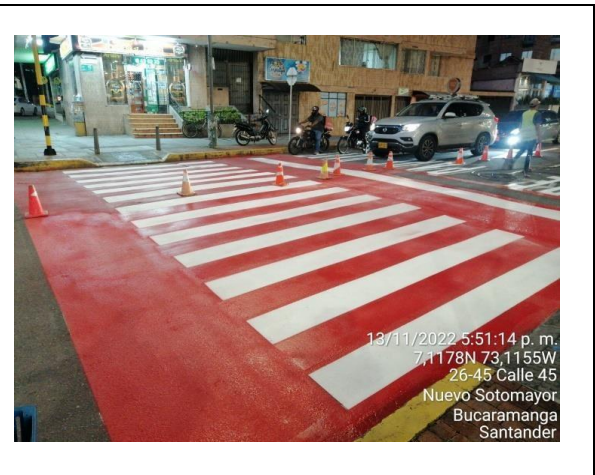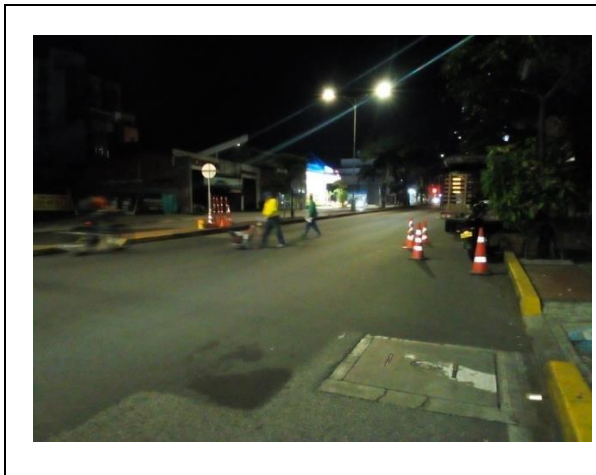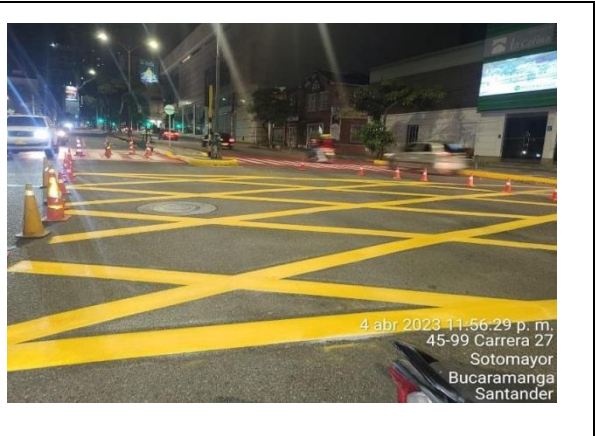
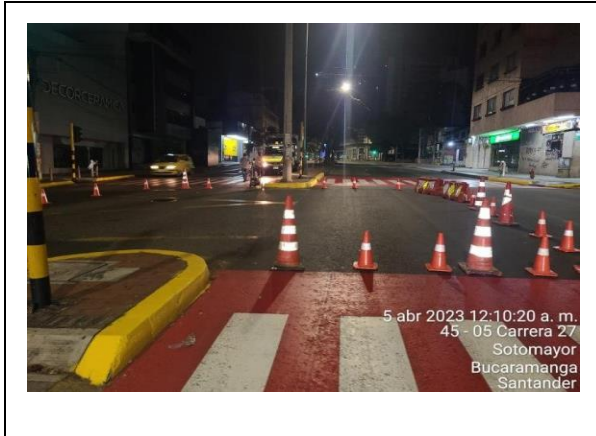


CRA 9 - CALLE 45

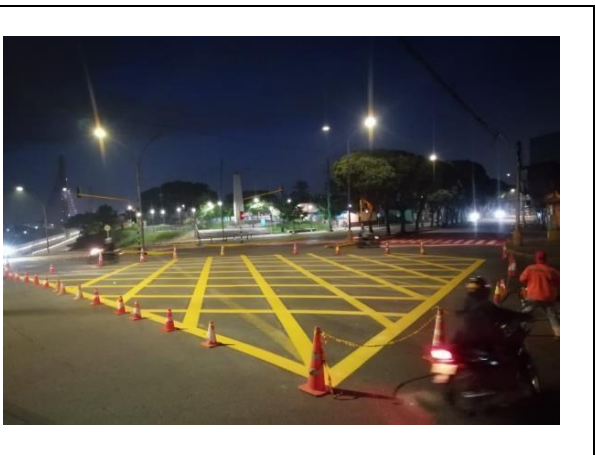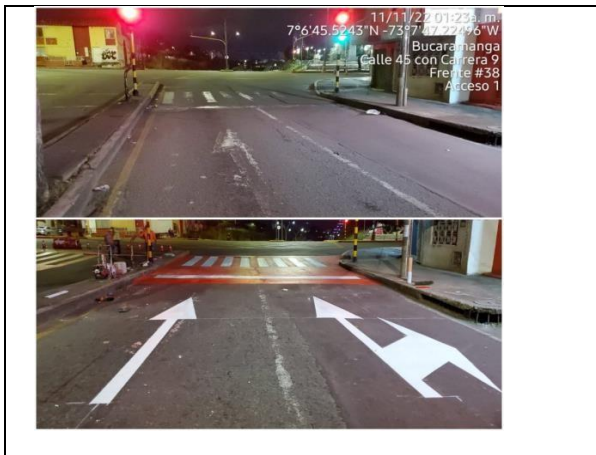

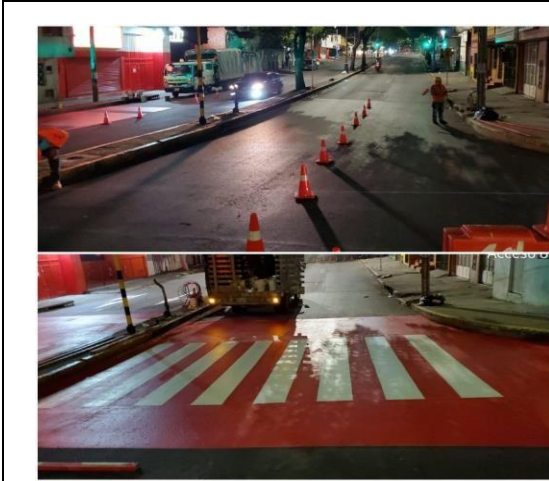

CALLE 36 CON CRA 27

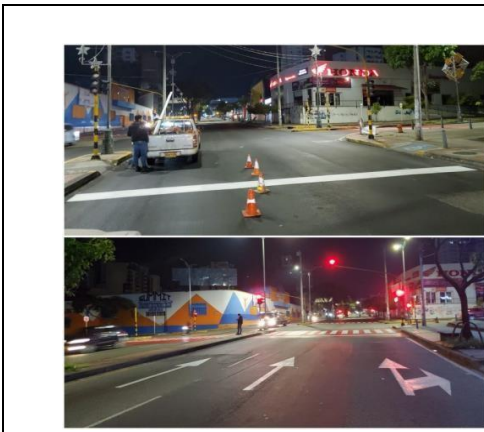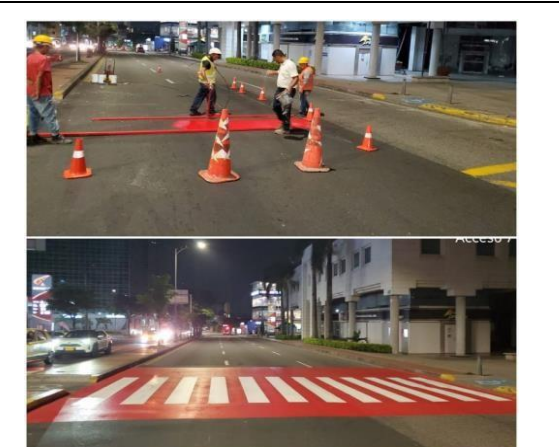

6. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 405 DE 2022: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER –LOTE 1”.

VALOR INICIAL:	\$ 7.542.347.806
VALOR ADICIONAL:	\$ 2.992.039.448
VALOR TOTAL:	\$ 10.534.387.254
PLAZO INICIAL:	NUEVE (09) MESES
PLAZO ADICIONAL:	DOS (2) MESES
PLAZO TOTAL:	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO:	16 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2023
PORCENTAJE AVANCE:	89.82%
ESTADO CONTRATO:	SUSPENDIDO

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra suspendido con un avance del 89.82%, e incluye la intervención de los siguientes barrios en las comunas 1,2,3,4,13,14 Y 15 de la ciudad: Barrios Venado de Oro, Deprimido mesón de los Búcaros, Buenos Aires, María Paz, Centro, Vegas de Morrórico, El Diviso, La Aurora, Villa Alegría.

BARRIO VILLA ALEGRIA I

Barrio: Villa Alegría I	
Dirección: Calle 28A norte desde la carrera 11 hasta la carrera 9	Participativo
	
Descripción: Imprimación CRL-40	

Barrio: Villa Alegría I	
Dirección: Calle 28A norte desde la carrera 11 hasta la carrera 9	Participativo
 <p>7/06/23, 15:16 7° 9' 26.548" N, 73° 8' 14.483" W Calle 28 Norte 10-26-10-62 Bucaramanga CONSORCIO PROVENZA Barrio Villa Alegría I</p>	 <p>17 nov, 2023 9:31:41 a. m. 7°9'27"N -73°8'17"W 10-26 Calle 28A Bucaramanga consorcio Provenza lote 1</p>
Foto Antes	Foto Después

Barrio: María Paz	
Dirección: Calle 15A norte desde la carrera 2A (Pavimento existente), hasta la carrera 1	Participativo
 <p>18 nov, 2023 9:22:40 a. m. 7°8'51" N -73°8'27" W QN-09 Carrera 1b Bucaramanga consorcio Provenza lote 1</p>	 <p>18 nov, 2023 9:14:39 a. m. 7°8'51"N -73°8'27"W Bucaramanga Bucaramanga consorcio Provenza lote 1</p>
Descripción: Instalación y excavación de sardineles	

Barrio: María Paz	
Dirección: Calle 15A norte desde la carrera 2A (Pavimento existente), hasta la carrera 1	Participativo
 <p>20 nov. 2023 8:41:47 a. m. 7°8'51"N -73°8'27"W Bucaramanga Bucaramanga consorcio Provenza lote 1</p>	 <p>20 nov. 2023 8:41:14 a. m. 7°8'51"N -73°8'27"W Bucaramanga Bucaramanga consorcio Provenza lote 1</p>
Descripción: Instalación y excavación de sardineles	

Barrio: Altos del Progreso	
Dirección: Carrera 17A Calle 17N	Participativo
 <p>#Altos del progreso #Lote 1 #Bucaramanga 24/11/2023 4:03:16 p. m. 7°9'13"N -73°7'58"W</p>	 <p>#Altos del progreso #Lote 1 #Bucaramanga 23/11/2023 3:39:46 p. m. 7°9'12"N -73°7'58"W</p>
Descripción: Excavación manual.	

Barrio: Altos del Progreso	
Dirección: Carrera 17A Calle 17N	Participativo
 <p>#Altosdelprogreso #Lote 1 #Bucaramanga 25/11/2023 10:35:30 a.m. 7°9'12"N - 73°7'59"W</p>	 <p>#Altos del progreso #Lote 1 #Bucaramanga 25/11/2023 11:01:10 a.m. 7°9'11"N - 73°7'59"W</p>
Descripción: Excavación manual.	

7. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 406 DE 2022: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER –LOTE 2”.

VALOR FISCAL TOTAL	: \$7.007.204.406,00
VALOR ADICIONAL	: \$1.603.540.991
VALOR TOTAL + ADICIONAL	: \$8.610.745.397
PLAZO INICIAL	: NUEVE (09) MESES
PLAZO ADICIONAL	: DOS (02) MESES
PLAZO ACUMULADO	: ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO	: 16 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	: 15 DE DICIEMBRE DE 2023

PORCENTAJE AVANCE	: 90%
ESTADO CONTRATO	: SUSPENDIDO

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en ejecución con un avance del 90%, e incluye la intervención de los siguientes barrios en las comunas 5,6,8,10,11,12 y 17- Barrio Altos de Terrazas, Cristal Alto, Campo Hermoso, Alfonso López, Mutis, Monterredondo, Provenza, Concordia, Cristal Bajo, Real de Minas.

Barrio: CRISTAL BAJO	
Dirección: Carrera 15 entre sector 3 y sector 4	PARTICIPATIVO
 <p>7 dic 2023 12:00:56 p. m.</p>	 <p>7 dic 2023 5:42:12 p. m. Bucaramanga Santander</p>
Descripción: Intervención de vía participativa	

Barrio: LAS DELICIAS	
Dirección: CR 15 CL 103D a 104A	FRESADO
 <p>jue, oct 5, 2023 22:05p. m. 7°56'N -73°721'W Las Delicias, Lote 2/ Bga Cj # 770-A5 CR 15 CL103D a 104A</p>	 <p>vie., oct. 6, 2023 03:40a. m. 7°56'N -73°721'W Las Delicias, Lote2/ Bga Cj # 770-A5 CR 15 CL 103D a 104A</p>
Descripción: Intervención con actividades de fresado, riego de imprimación y suministro e instalación de mezcla MDC 19 para bacheo.	

Barrio: CRISTAL ALTO	
Dirección: Diag 19 bis entre calle 127 y 128	PARTICIPATIVO
 <p>06/10/2023 14:17:5 7°4'27"N - 73°7'15"W Barrio Cristal Alto Lote 2</p>	 <p>6/10/2023, 3:38:20 p.m. N 7° 4' 27", W 73° 7' 15" Cristal Alto</p>
Descripción: Intervención DE VÍA PARTICIPATIVA	

8. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. N° 297 de 2022: “MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”.

VALOR DEL CONTRATO INICIAL	: \$763.631.137,00.
VALOR ADICIONAL:	\$100.050.000,00.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	: \$863.681.187,00.
ANTICIPO NO. 1	: \$229.089.356,10.
ANTICIPO NO. 2	: \$30.050.000,00.
ANTICIPO TOTAL	: \$259.139.356,10.
PLAZO INICIAL:	Dos (2) meses.
PLAZO ADICIONAL NO. 1	: Un (1) mes.
PLAZO ADICIONAL NO. 2	: Dos (2) meses y quince (15) días.
PLAZO ADICIONAL NO. 3	: Un (1) mes.
PLAZO ADICIONAL No. 4	: Un (1) mes
PLAZO ADICIONAL No. 5	: Un (1) mes
PLAZO TOTAL	: Ocho (8) meses y quince (15) días.
FECHA DE INICIO	: Noviembre 21 de 2022.
FECHA DE SUSPENSIÓN NO. 1	: Diciembre 28 de 2022.
FECHA DE REINICIO NO. 1	: Enero 15 de 2023.
FECHA DE SUSPENSIÓN NO. 2	: Marzo 6 de 2023.
FECHA DE REINICIO NO. 2	: Junio 16 de 2023.
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3	: Octubre 27 de 2023
FECHA DE REINICIO No. 3	: Noviembre 08 de 2023
FECHA NUEVA DE TERMINACIÓN	: Diciembre 09 de 2023.
AVANCE FÍSICO	: 100%
ESTADO DEL CONTRATO:	Ejecutado, en etapa de liquidación.

REGISTRO FOTOGRAFICO

1. Puente peatonal de la carrera 15 con calle 35, barrió el Centro.




ANTES



DESPUES



2. Puente peatonal de la carrera 15 con calle 37, barrió el Centro.

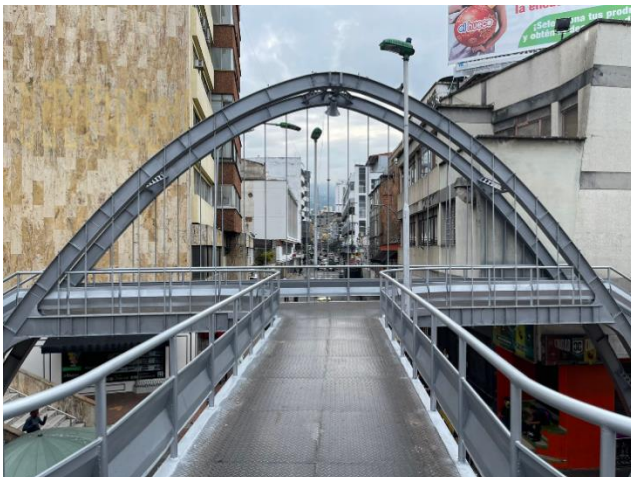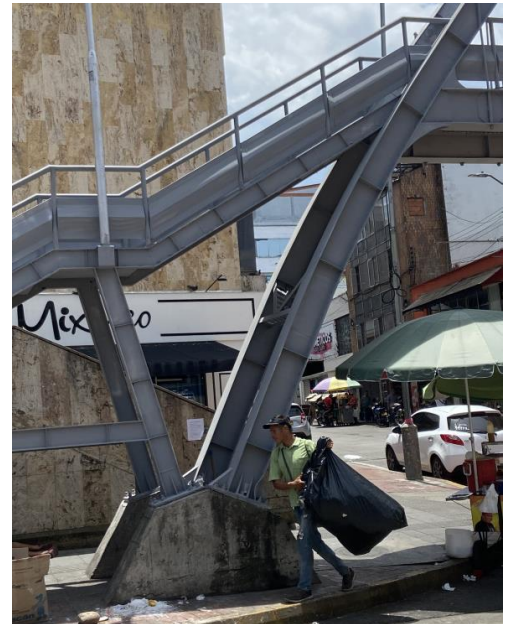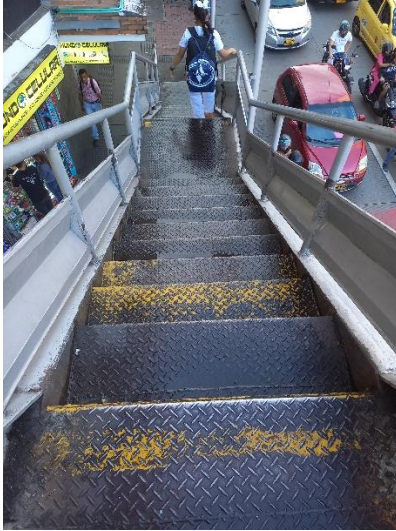



3. Puente peatonal de la diagonal 15 entre calles 51 y 52, barrió la Concordia.

ANTES



DESPUES

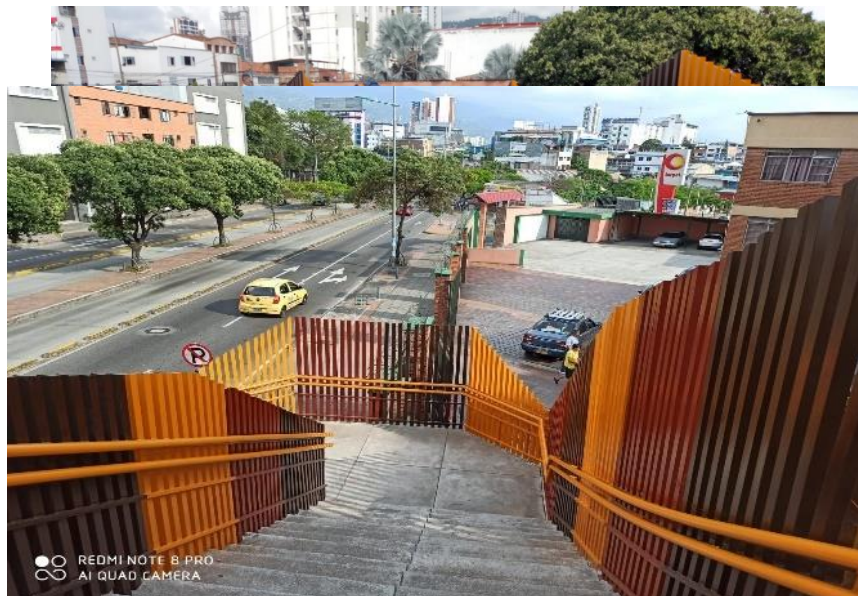

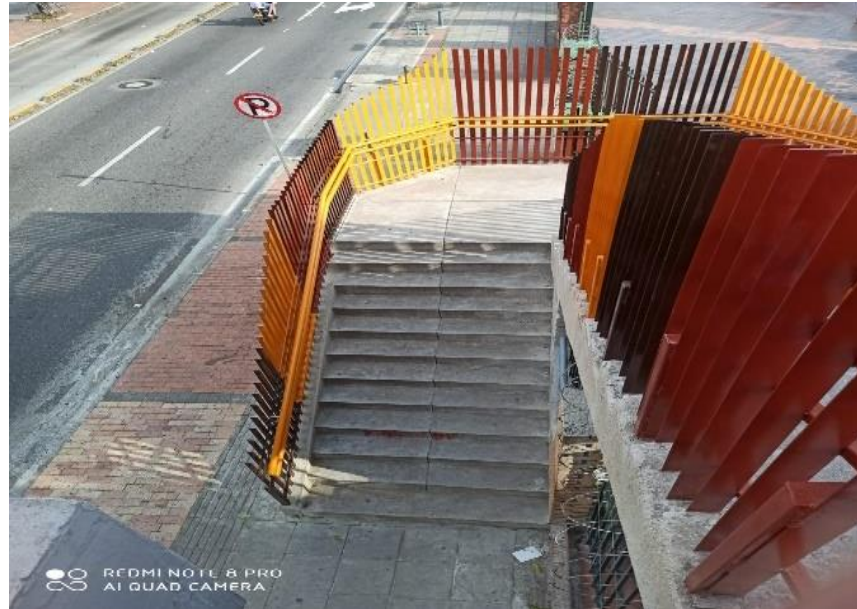


4. Puente peatonal de la carrera 17 con calle 52, barrio San Miguel.

ANTES



DESPUES

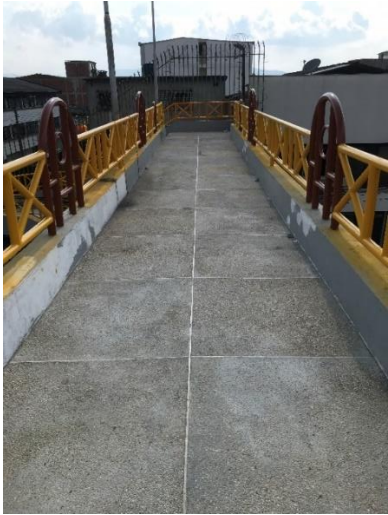

5. Puente de la carrera 15 con calle 61, barrio Ricaurte.

ANTES



DESPUES



6. Puente peatonal corregimiento Vijagual, sobre Quebrada La Jabonera.

ANTES



DESPUES



7. Puente peatonal de la carrera 15 con calle 1, barrio San Rafael.

ANTES



DESPUES



PROGRAMA: ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL

Dentro de este programa se vienen adelantando proyectos para el mantenimiento y modernización del alumbrado público del Municipio de Bucaramanga.

INDICADOR	META Programada 2023	Meta Ejecutada 2023	AVANCE	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS COMPROMETIDOS
Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados.	1	1	100%	\$ 40.509.473.531,76	\$ 21.671.522.164

INDICADOR	META Programada 2023	Meta Ejecutada 2023	AVANCE	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS COMPROMETIDOS
Porcentaje de luminarias operativas en funcionamiento.	100%	71%	71%	\$ 38.967.802.537,17	\$ 24.983.986.970

1. CONTRATO No. 411 DE 2022: “MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 1 (NARANJOS Y CENTAUROS)” **-LOS NARANJOS Y CENTAUROS**

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL LOS NARANJOS

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERURBANAS

VALOR INICIAL: \$ 7.121.453.216,00

VALOR ADICIONAL: \$ 3.596.834.651,54

PLAZO INICIAL: 6 meses

PLAZO ADICIONAL: 4 meses y 12 días.

FECHA DE INICIO: 24 de enero de 2023.

FECHA FINAL: 31 de diciembre de 2023

PORCENTAJE EJECUTADO: 90.09%

ESTADO DEL CONTRATO: SUSPENSIÓN. De acuerdo a los rendimientos observados en obra.



2. CONTRATO No. 412 DE 2022: “MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - LOTE 2”. (BULEVAR BOLÍVAR Y GLORIETA SAN FRANCISCO) - **BULEVAR BOLIVAR Y GLORIETA SAN FRANCISCO**

CONTRATISTA:	CONSORCIO ALUMBRADO PBFAO
INTERVENTOR:	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.
VALOR INICIAL:	\$ 3.173.961.189,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.586.967.843,69
PLAZO INICIAL:	7 meses
PLAZO ADICIONAL:	4 meses y 8 días.
FECHA DE INICIO:	24 de enero de 2023.
FECHA FINAL:	31 de diciembre de 2023
PORCENTAJE EJECUTADO:	68,82%

ESTADO DEL CONTRATO: SUSPENSIÓN. Atraso actual, según lo presentado la fecha el contratista no ha actualizado el cronograma de acuerdo al balance del contrato, el % de ejecución se está evaluando respecto a las cantidades originales, por lo cual este porcentaje de atraso podría ser menor.



4. CONTRATO No. 414 DE 2022: MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLÍVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 4. - CALLE 56 - DE LA CRA 15 HASTA REAL DE MINAS

CONTRATISTA: ESTE CONTRATO REALIZO UNA CESIÓN EL 16 DE MAYO DE 2023 DE LA EMPRESA CIVILEX A GRUPO J8

INTERVENTOR: SOLUCIONES ELÉCTRICAS DE COLOMBIA SAS

VALOR INICIAL: \$ 3.374.175.743

VALOR ADICIONAL: \$ 1.883.664.180,10

PLAZO INICIAL: 7 meses

PLAZO ADICIONAL: 4 meses.

FECHA DE INICIO: 24 de enero de 2023.

FECHA FINAL: 31 de diciembre de 2023

PORCENTAJE EJECUTADO: 91,49%

ESTADO DEL CONTRATO: SUSPENSIÓN. Está pendiente trámites de la ESSA (Aprobación de planos, visita de interventoría ESSA, visita técnica, conexión), Instalación de elementos de MT, siembra de prado, retiro de infraestructura existente, acabados civiles de zonas intervenidas.



5. Contrato de obra No. 285 del 03 de noviembre del 2023: MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 - FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 1 -Carrera 27 Calle 9- Calle 34

CONTRATISTA: UT MODERNIZACION FASE 1 BGA

INTERVENTOR: EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS

VALOR INICIAL: \$ 1.542.848.948

PLAZO INICIAL: 80 días.

PLAZO ADICIONAL: N/A

FECHA DE INICIO: 29 de noviembre de 2023.

FECHA FINAL: 18 de febrero de 2024

PORCENTAJE EJECUTADO: 5%

ESTADO DEL CONTRATO: SUSPENSIÓN.



6. Contrato de obra No. 286 del 03 de noviembre del 2023: MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 - FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 2 - **Carrera 27 Calle 34- Puerta del sol**

CONTRATISTA: CONSORCIO ILUMINAR BGA
INTERVENTOR: EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS
VALOR INICIAL: \$ 1.522.075.669,89
PLAZO INICIAL: 80 días.
PLAZO ADICIONAL: N/A
FECHA DE INICIO: 29 de noviembre de 2023.
FECHA FINAL: 18 de febrero de 2024
PORCENTAJE EJECUTADO: 5%
ESTADO DEL CONTRATO: SUSPENSIÓN

7. Contrato de obra No. 287 del 03 de noviembre del 2023: MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 - FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3 – **Carrera 36**

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL MODERNIZACIÓN BUCARAMANGA
INTERVENTOR: EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS
VALOR INICIAL: \$ 1.498.472.490,53
PLAZO INICIAL: 80 días.
PLAZO ADICIONAL: N/A
FECHA DE INICIO: 29 de noviembre de 2023.
FECHA FINAL: 18 de febrero de 2024
PORCENTAJE EJECUTADO: 5%
ESTADO DEL CONTRATO: SUSPENSIÓN

8. Contrato de obra No. 291 del 03 de noviembre del 2023: MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 - FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 4 – **Carrera 15**

CONTRATISTA: CONSORCIO ELECTRICAL
INTERVENTOR: ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP S.A.S
VALOR INICIAL: \$ 1.444.130.820
PLAZO INICIAL: 80 días.
PLAZO ADICIONAL: N/A
FECHA DE INICIO: 28 de noviembre de 2023.
FECHA FINAL: 17 de febrero de 2024
PORCENTAJE EJECUTADO: 5%
ESTADO DEL CONTRATO: SUSPENSIÓN



9. Contrato de obra No. 288 del 03 de noviembre del 2023: MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 - FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 5 – Avenida Quebrada Seca

CONTRATISTA: CONSORCIO ALUMBRADO BUCARAMANGA
INTERVENTOR: ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP S.A.S
VALOR INICIAL: \$ 1.209.155.465
PLAZO INICIAL: 80 días.
PLAZO ADICIONAL: N/A
FECHA DE INICIO: 28 de noviembre de 2023.
FECHA FINAL: 17 de febrero de 2024
PORCENTAJE EJECUTADO: 5%
ESTADO DEL CONTRATO: SUSPENSIÓN

10. Contrato de obra No. 289 del 03 de noviembre del 2023: MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 - FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 6 – Avenida González Valencia

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUELECTRICOS
INTERVENTOR: CONSORCIO ALUMBRADO NLC
VALOR INICIAL: \$ 836.362.735
PLAZO INICIAL: 80 días.
PLAZO ADICIONAL: N/A
FECHA DE INICIO: 28 de noviembre de 2023.
FECHA FINAL: 17 de febrero de 2024
PORCENTAJE EJECUTADO: 5%
ESTADO DEL CONTRATO: SUSPENSIÓN

11. Contrato de obra No. 290 del 03 de noviembre del 2023: MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 - FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 7 – Avenida la Rosita

CONTRATISTA: CONSORCIO AP 2023
INTERVENTOR: CONSORCIO ALUMBRADO NLC
VALOR INICIAL: \$ 897.152.256
PLAZO INICIAL: 80 días.
PLAZO ADICIONAL: N/A
FECHA DE INICIO: 28 de noviembre de 2023.
FECHA FINAL: 17 de febrero de 2024
PORCENTAJE EJECUTADO: 5%
ESTADO DEL CONTRATO: SUSPENSIÓN

12. Contrato de obra No. 254 del 29 de septiembre del 2023: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS CAJAS DE INSPECCIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

CONTRATISTA:	APIANTICA SAS
SUPERVISOR:	John Fernando Larrotta Peñaloza
VALOR INICIAL:	\$ 464.512.724,71
PLAZO INICIAL:	2 meses y 28 días
PLAZO ADICIONAL:	N/A
FECHA DE INICIO:	04 de octubre del 2023
FECHA FINAL:	31 de diciembre del 2023
PORCENTAJE EJECUTADO:	20%
ESTADO DEL CONTRATO:	SUSPENSIÓN



13. Contrato de obra No. 138 del 26 de junio del 2023: MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE BUCARAMANGA – GRUPO 1

CONTRATISTA:	CONSORCIO CIVING
INTERVENTOR:	HCR INGENIEROS S.A.S
VALOR INICIAL:	\$ 1.122.746.611,00
PLAZO INICIAL:	7 meses
PLAZO ADICIONAL:	N/A
FECHA DE INICIO:	24 de julio de 2023.
FECHA FINAL:	14 de marzo de 2024
PORCENTAJE EJECUTADO:	74%
ESTADO DEL CONTRATO:	SUSPENSIÓN



14. Contrato de obra No. 139 del 26 de junio del 2023: MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE BUCARAMANGA – GRUPO 2

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
INTERVENTOR: HCR INGENIEROS S.A.S
VALOR INICIAL: \$ 1.140.646.311,00
PLAZO INICIAL: 7 meses
PLAZO ADICIONAL: N/A
FECHA DE INICIO: 24 de julio de 2023.
FECHA FINAL: 14 de marzo de 2024
PORCENTAJE EJECUTADO: 74%
ESTADO DEL CONTRATO: SUSPENSIÓN

15. Contrato de obra No. 140 del 26 de junio del 2023: MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE BUCARAMANGA – GRUPO 3

CONTRATISTA: CONSORCIO CIVING
INTERVENTOR: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A
VALOR INICIAL: \$ 1.124.731.209,00
PLAZO INICIAL: 7 meses
PLAZO ADICIONAL: N/A
FECHA DE INICIO: 24 de julio de 2023.
FECHA FINAL: 14 de marzo de 2024
PORCENTAJE EJECUTADO: 74%
ESTADO DEL CONTRATO: SUSPENSIÓN

16. Contrato de obra No. 141 del 26 de junio del 2023: MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE BUCARAMANGA – GRUPO 4

CONTRATISTA: SOSDOM SAS
INTERVENTOR: COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A
VALOR INICIAL: \$ 1.036.925.512,00
PLAZO INICIAL: 7 meses
PLAZO ADICIONAL: N/A
FECHA DE INICIO: 24 de julio de 2023.
FECHA FINAL: 14 de marzo de 2024
PORCENTAJE EJECUTADO: 74%
ESTADO DEL CONTRATO: SUSPENSIÓN



17. Contrato de obra No. 116 del 26 de mayo del 2023: ACTIVIDADES DE PODA PARA EL DESPEJE DE LUMINARIAS Y REDES QUE INTERFIEREN CON EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

CONTRATISTA:	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB
SUPERVISOR:	John Fernando Larrotta Peñaloza
VALOR INICIAL:	\$ 1.016.096.453,74
PLAZO INICIAL:	7 meses y 13 días
PLAZO ADICIONAL:	N/A
FECHA DE INICIO:	08 de JUNIO de 2023.
FECHA FINAL:	31 de diciembre
PORCENTAJE EJECUTADO:	53,70%

ESTADO DEL CONTRATO: SUSPENDIDO 22 DE DICIEMBRE DE 2023.
PROGRAMADO REINICIO 15 DE ENERO DE 2024

18. Convenio Interadministrativo No. 165 de 2023: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P PARA LA IMPLEMENTACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO 2023 EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.

CONVENIDO:	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP
PLAZO INICIAL:	2 meses y 29 días
PLAZO ADICIONAL:	N/A
FECHA DE INICIO:	02 de OCTUBRE de 2023.
FECHA FINAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%
VALOR INICIAL:	\$ 3.300.673.603,00165
APORTE MUNICIPIO (EN DINERO):	\$ 1.800.000.000,00
APORTE MUNICIPIO, EN ESPECIE (FIGURAS):	\$ 786.478.354,00
APORTE ESSA, EN ESPECIE (FIGURAS):	\$ 714.195.249,00



**LÍNEA ESTRATÉGICA 5. BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCION:
INSTITUCIONES SÓLIDAS CONFIABLES**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MODERNA E INNOVADORA

PROGRAMA: GOBIERNO FORTALECIDO PARA SER Y HACER

En este programa se encuentra todo el recurso humano que requiere la secretaria para el fortalecimiento a la ejecución de los procesos transversales, así como la planificación de las diferentes obras.

INDICADOR	META Programada 2023	Meta Ejecutada 2023	AVANCE	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS COMPROMETIDOS
Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos.	100%	100%	100%	\$ 17.834.324.018,10	\$ 15.999.176.157,33

GASTOS DE INVERSION	A 31 DE DICIEMBRE 2023
	VALOR
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION	\$ 7.836.158.149,33

Igualmente el pago de los subsidios a las diferentes empresas de servicios públicos hace parte de este programa.


EMPRESA	VALOR PAGADO
ACUEDUCTO	\$ 3.299.784.192,00
EMPAS	\$ 1.602.314.072,00
EMAB	\$ 2.724.555.134,00
LIMPIEZA URBANA	\$ 270.127.342,00
METROLIMPIA	\$ 266.237.268,00
VALORTOTAL	\$ 8.163.018.008,00

**OTROS PROYECTOS CONTRATADOS Y QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION
POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.**

**1. CONTRATO DE OBRA No. 307 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023
“MEJORAMIENTO D ELA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, LOTE 1.”**

VALOR INICIAL : \$ 1.047.230.005,00
ANTICIPO : \$ 314.169.001,50
FECHA DE INICIO : 17 de noviembre de 2023
PLAZO INICIAL : 45 días.
FECHA DE TERM INICIAL : 01 de enero de 2024
FECHA DE TERM FINAL : 16 de febrero de 2024
% EJECUCION : 35%
ESTADO DEL CONTRATO : EJECUCION.

El porcentaje de avance del parque es del 35%, se viene avanzando en las obras de las diferentes sedes educativas del presente grupo.

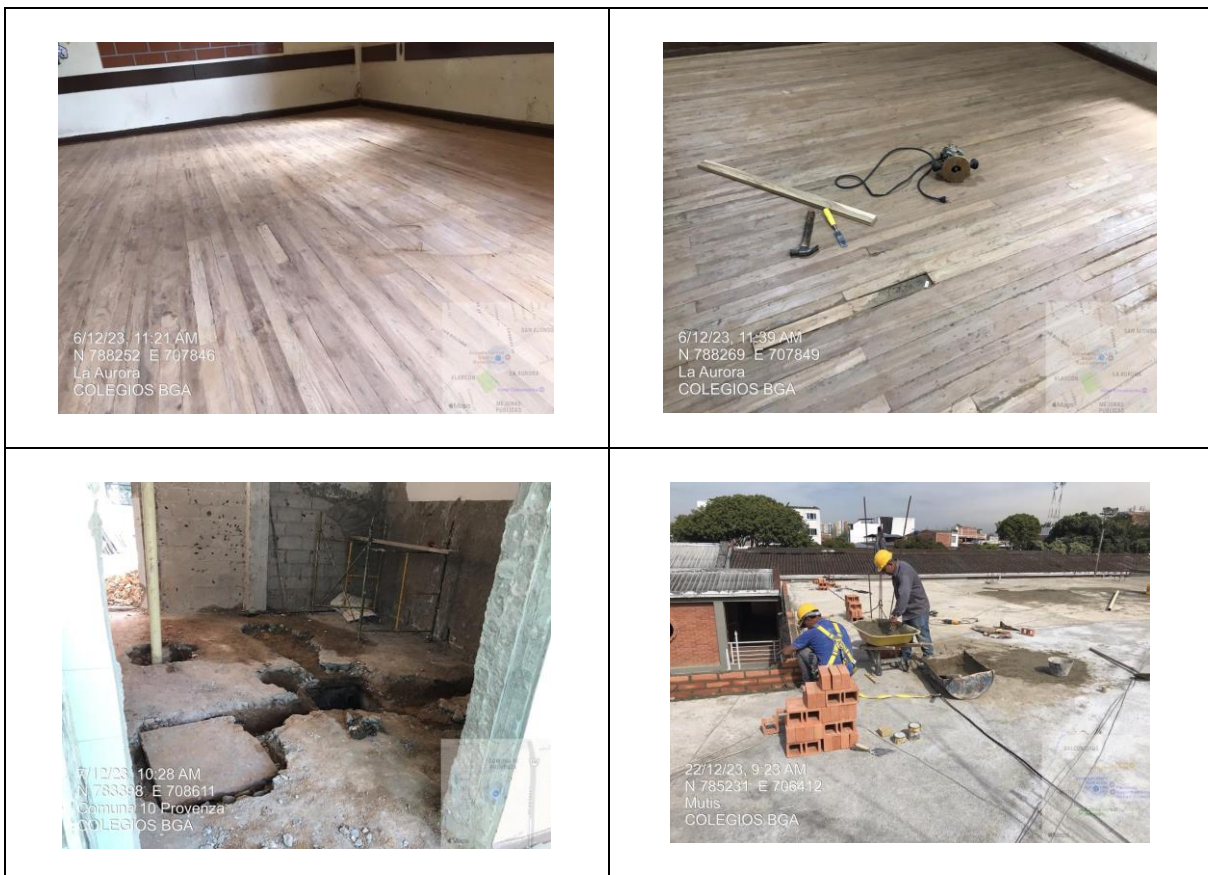

**2. CONTRATO DE OBRA No. 308 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, LOTE 2.”**

VALOR INICIAL : \$ 1.419.087.074,00
ANTICIPO : \$ 425.726.122,20
FECHA DE INICIO : 17 de noviembre de 2023
PLAZO INICIAL : 45 días.

FECHA DE TERM INICIAL : 01 de enero de 2024
FECHA DE TERM FINAL : 16 de febrero de 2024
% EJECUCION : 20%
ESTADO DEL CONTRATO : EJECUCION.

El porcentaje de avance del parque es del 20%, se viene avanzando en las obras de las diferentes sedes educativas del presente grupo.



**3. CONTRATO DE OBRA 142 DE 2022 -: JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR
“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y RECUPERACIÓN VIAL DE LOS
SECTORES AFECTADOS EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD
PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER” - LOTE 1.**

Valor fiscal:	\$ 1.674.988.080,00
Valor Adicional:	\$ 835.550.000,00
Valor actualizado:	\$ 2.510.538.080,00
Plazo Inicial	Seis (6) meses.
Plazo Adicionado:	Cinco (5) meses y Quince (15) días.
Plazo actualizado:	Once (11) meses y Quince (15) días
Fecha de Inicio:	01 de julio de 2022
Fecha de terminación:	15 de junio 2023
Nueva Fecha de Terminación:	30 de diciembre 2023
Porcentaje avance:	100%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra finalizado y en proceso de liquidación.



6. CONTRATO DE OBRA 69 de 2023 -: CONSORCIO LA FLORA 2023
“CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCE: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA
PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: A FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.

Valor fiscal:	\$ 40.514.056.133,00
Plazo inicial:	Dieciocho (18) meses
Fecha de inicio:	05 de mayo de 2023
Fecha de terminación:	04 de noviembre de 2024
Porcentaje avance:	15,33 %

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en ejecución.



7. CONTRATO DE OBRA 41 de 2023 – UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO BUCARAMANGA 2 “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN VIAL PRODUCTO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD ORIGINADA POR LA SEGUNDA TEMPORADA DE LLUVIAS 2022 – FENÓMENO DE LA NIÑA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER”.

Valor fiscal:	\$1.509.746.198,00
Plazo inicial:	Tres (3) meses
Plazo Total	Ocho (08) meses y Veinte (20) días
Fecha de inicio:	23 de mayo de 2023
Fecha de terminación:	22 de agosto de 2023
Nueva Fecha de terminación:	29 de febrero de 2024
Porcentaje avance:	80%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en ejecución.





**8. CONTRATO DE OBRA No. 284 de 2023 (03 DE NOVIEMBRE DE 2023)
“MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (SEGUNDA FASE) A LAS
INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS
VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.**

VALOR FISCAL INICIAL:	\$283.178.271,00.
VALOR FISCAL ADICIONAL:	N.A
VALOR FISCAL TOTAL:	\$283.178.271,00.
PLAZO INICIAL:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS.
PLAZO ADICIONAL:	TREINTA DÍAS CALENDARIO
PLAZO INICIAL + ADICIONAL:	SETENTA Y CINCO (75) DIAS
FECHA DE INICIO:	14/11/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	28/01/2024
PORCENTAJE AVANCE FÍSICO:	50 %
PORCENTAJE AVANCE FINANCIERO:	0 %

ESTADO DEL CONTRATO: El proyecto contempla el mantenimiento de las instalaciones del Centro de Atención Integral a Víctimas del conflicto interno – CAIV, el cual incluye la intervención de 175,24 m2 para la adecuación de las unidades sanitarias, el mejoramiento sala de juntas, ampliación zona de archivo y cafetería. Incluye desmonte de puertas, ventanas, incrustaciones, aparatos sanitarios, cielo raso, estructura en aluminio, muros divisorios en mampostería, luminarias, aparatos eléctricos, demolición de pisos y enchapes en cerámica, subsanación filtración de aguas lluvias en cubiertas y canales, acceso salón de capacitaciones, acabados generales en pintura, divisiones metálicas, incrustaciones metálicas, piso en cerámica, cielo raso, en lámina de yeso entre otras. Actualmente el proyecto se encuentra en un avance físico del 50% de la adecuación, donde ya se realizó la adecuación de la sala de juntas, la pintura e impermeabilización de la cubierta y demoliciones y fundición de placa de contrapiso.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Demolición y construcción de placa de piso y frisos.



Impermeabilización Cubierta CAIV



Adecuación Pisos, pintura y cielo raso sala de Juntas incluidas luminarias y puntos eléctricos CAIV



Demolición de enchapes de piso y muros para la adecuación de puntos hidrosanitarios de Baños CAIV



ANEXO

- PRESUPUESTOS EJECUTADOS (Ejecución presupuestal)
- INFORMES DE INTERVENTORIA (Contratos terminados y en ejecución)
- GASTO (Relación personal)
- GASTOS (Relación de Inversión)

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES				Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Pagar	% Ejecucion
		Presupuesto Inicial	Adicion	Credito	Contracredito				Obligaciones	Pagos Acumulados			
		\$ 1,00							\$ 3 = 1 + 2	\$ 5,00			
2.3.2.02.02.005 .2402113.5321 1.230	VIA URBANA CONSTRUIDA 230	\$ 3.247.005.368,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.247.005.368,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.247.005.368,00	\$ -	0
2.3.2.02.02.005 .2402113.5321 1.255	VIA URBANA CONSTRUIDA 255	\$ 271.318.965,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 271.318.965,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 271.318.965,00	\$ -	0
2.3.2.02.02.005 .2402113.5321 1.530	VIA URBANA CONSTRUIDA 530	\$ -	\$ 7.688.387.779,53	\$ -	\$ -	\$ 7.688.387.779,53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.688.387.779,53	\$ -	0
	TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL VIA URBANA MEJORADA												
RUBRO	VIA URBANA MEJORADA CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES												
2.3.2.02.02.005 .2402114.5321 1.201	VIA URBANA MEJORADA 201	\$ 7.206.004.473,22	\$ 500.000.000,00	\$ 5.032.234.690,23	\$ 336.783.193,00	\$ 12.401.455.970,45	\$ 11.449.925.037,50	\$ 11.449.925.037,50	\$ 8.251.506.628,13	\$ 8.251.506.628,13	\$ 951.530.932,95	\$ 3.198.418.409,37	92,32
2.3.2.02.02.005 .2402114.5321 1.213	VIA URBANA MEJORADA 213	\$ 248.171.667,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 248.171.667,00	\$ 248.171.667,00	\$ 248.171.667,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 248.171.667,00	100
2.3.2.02.02.005 .2402114.5321 1.289	VIA URBANA MEJORADA 289	\$ 1.479.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 1.479.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
2.3.2.02.02.005 .2402114.5321 1.501	VIA URBANA MEJORADA 501	\$ -	\$ -	\$ 148.551.458,19	\$ -	\$ 148.551.458,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 148.551.458,19	\$ -	0
2.3.2.02.02.005 .2402114.5321 1.588	VIA URBANA MEJORADA 588	\$ -	\$ -	\$ 3.789.375.468,56	\$ -	\$ 3.789.375.468,56	\$ 3.789.375.468,00	\$ 3.789.375.468,00	\$ 2.272.066.568,89	\$ 2.272.066.568,89	\$ 0,56	\$ 1.517.308.899,11	99,99
	PUENTE PEATONAL CON MANTENIMIENTO												
RUBRO	PUENTE PEATONAL CON MANTENIMIENTO CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES												
2.3.2.02.02.005 .2402120.5321 1.213	ZONAS VERDES MANTENIDAS 213	\$ -	\$ 440.000.000,00	\$ -	\$ 339.950.000,00	\$ 100.050.000,00	\$ 100.050.000,00	\$ 100.050.000,00	\$ 100.050.000,00	\$ 100.050.000,00	\$ -	\$ -	100
	TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL ANDEN DE LA RED URBANA REHABILITADO												
RUBRO	ANDEN DE LA RED URBANA REHABILITADO SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERA (EXCEPTO CARRETERA ELEVADAS). CALLE												
2.3.2.02.02.005 .2402127.5421 1.201	ANDEN DE LA RED URBANA REHABILITADO 201	\$ -	\$ -	\$ 4.721.796.333,44	\$ 3.048.990.575,66	\$ 1.672.805.757,78	\$ 1.672.805.757,78	\$ 1.672.805.757,78	\$ 1.599.407.924,96	\$ 1.599.407.924,96	\$ -	\$ 73.397.832,82	100
2.3.2.02.02.005 .2402127.5421 1.289	ANDEN DE LA RED URBANA REHABILITADO 289	\$ -	\$ -	\$ 2.106.626.924,48	\$ -	\$ 2.106.626.924,48	\$ 2.106.626.924,48	\$ 2.106.626.924,48	\$ 2.106.626.924,48	\$ 2.106.626.924,48	\$ -	\$ -	100
2.3.2.02.02.005 .2402127.5421 1.588	ANDEN DE LA RED URBANA REHABILITADO 588	\$ -	\$ -	\$ 499.204.000,00	\$ -	\$ 499.204.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 499.204.000,00	\$ -	0
	TRANSPORTE SEGURIDAD DE TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA SEGURIDAD VIAL												
RUBRO	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA SEGURIDAD VIAL CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES												
2.3.2.02.02.005 .2409013.5321 1.201	TRANSPORTE SEGURIDAD DE TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA SEGURIDAD VIAL 201	\$ -	\$ -	\$ 79.500.000,00	\$ -	\$ 79.500.000,00	\$ 79.500.000,00	\$ 79.500.000,00	\$ 57.609.327,60	\$ 57.609.327,60	\$ -	\$ 21.890.672,40	100
	TEATROS ADECUADOS												
RUBRO	TEATROS ADECUADOS OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES												
2.3.2.02.02.005 .3301038.5312 9.201	CULTURA PROMOCION Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTISTICOS TEATROS ADECUADOS 201	\$ -	\$ -	\$ 33.096.883,76	\$ -	\$ 33.096.883,76	\$ 33.096.883,76	\$ 33.096.883,76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.096.883,76	100
	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO ESPACIO PUBLICO ADECUADO												
RUBRO	ESPACIO PUBLICO ADECUADO EDIFICIOS COMERCIALES												
2.3.2.02.02.005 .4002020.5312 2.557	ESPACIO PUBLICO ADECUADO 557	\$ -	\$ 3.727.166.660,00	\$ -	\$ -	\$ 3.727.166.660,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.727.166.660,00	\$ -	0
RUBRO	CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES												
2.3.2.02.02.005 .4002020.5321 1.201	ESPACIO PUBLICO ADECUADO 201	\$ 10.591.133.878,04	\$ -	\$ 5.052.374.071,21	\$ 86.034.612,41	\$ 15.557.473.336,84	\$ 15.450.454.691,84	\$ 15.450.454.691,84	\$ 5.107.270.139,99	\$ 5.107.270.139,99	\$ 107.018.645,00	\$ 10.343.184.551,85	99,31

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES				Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Pagar	% Ejecucion			
		Presupuesto Inicial	Adicion	Credito	Contracredito				Obligaciones	Pagos Acumulados				10 = 3 - 5	12 = 7 - 9	13 = 7 / 3
		\$ 1,00							\$ 5,00	\$ 7,00				\$ 9,00	10 = 3 - 5	12 = 7 - 9
2.3.2.02.02.005.4002020.5327.1.501	ESPACIO PUBLICO ADECUADO 501	\$ -	\$ -	\$ 559.545.844,40	\$ -	\$ 559.545.844,40	\$ 555.402.992,26	\$ 555.402.992,26	\$ 98.453.564,26	\$ 98.453.564,26	\$ 4.142.852,14	\$ 456.949.428,00	99,25			
RUBRO	ESPACIO PUBLICO ADECUADO INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO															
2.3.2.02.02.005.4002020.5327.0.201	ESPACIO PUBLICO ADECUADO 201	\$ 26.898.178.325,37	\$ -	\$ 642.934.195,00	\$ 9.632.534.691,69	\$ 17.908.577.828,68	\$ 17.908.577.828,68	\$ 17.908.577.828,68	\$ 5.130.282.566,14	\$ 5.130.282.566,14	\$ -	\$ 12.778.295.262,54	100			
2.3.2.02.02.005.4002020.5327.0.213	ESPACIO PUBLICO ADECUADO 213	\$ 3.998.939.014,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.998.939.014,00	\$ 3.998.939.014,00	\$ 3.998.939.014,00	\$ 2.177.610.893,59	\$ 2.177.610.893,59	\$ -	\$ 1.821.328.120,41	100			
2.3.2.02.02.005.4002020.5327.0.501	ESPACIO PUBLICO ADECUADO 501	\$ -	\$ -	\$ 178.766.916,96	\$ -	\$ 178.766.916,96	\$ 178.766.916,96	\$ 178.766.916,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 178.766.916,96	100			
RUBRO	ESPACIO PUBLICO ADECUADO OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL															
2.3.2.02.02.005.4002020.5329.0.245	ESPACIO PUBLICO ADECUADO 245	\$ 1.500.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 141.317.564,18	\$ 1.358.682.435,82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.358.682.435,82	\$ -	0			
RUBRO	ESPACIO PUBLICO ADECUADO SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS), CALLES															
2.3.2.02.02.005.4002020.5421.1.201	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO ESPACIO PUBLICO ADECUADO 201	\$ -	\$ 1.146.058.149,80	\$ -	\$ 1.146.058.149,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0			
2.3.2.02.02.005.4002020.5421.1.289	ESPACIO PUBLICO ADECUADO 289	\$ 14.762.325.144,00	\$ -	\$ -	\$ 14.762.325.144,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0			
2.3.2.02.02.005.4002020.5421.1.588	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO ESPACIO PUBLICO ADECUADO 588	\$ -	\$ 12.157.857.302,16	\$ -	\$ 10.854.024.219,58	\$ 1.303.833.082,58	\$ 380.844.085,18	\$ 380.844.085,18	\$ -	\$ -	\$ 922.988.997,40	\$ 380.844.085,18	29,2			
RUBRO	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO ACUEDUCTOS CONSTRUIDOS															
RUBRO	ACUEDUCTOS CONSTRUIDOS SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO															
2.3.2.02.02.005.4003015.5323.1.213	ACUEDUCTOS CONSTRUIDOS 213	\$ 4.577.050.038,00	\$ -	\$ -	\$ 1.899.370.856,24	\$ 2.677.679.181,76	\$ 2.677.679.181,76	\$ 2.677.679.181,76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.677.679.181,76	100			
2.3.2.02.02.005.4003015.5323.1.221	ACUEDUCTOS CONSTRUIDOS 221	\$ 50.656.246,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.656.246,00	\$ 50.656.246,00	\$ 50.656.246,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.656.246,00	100			
2.3.2.02.02.005.4003015.5323.1.267	ACUEDUCTOS CONSTRUIDOS 267	\$ 200.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.000.000,00	\$ 200.000.000,00	\$ 200.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.000.000,00	100			
RUBRO	ALCANTARILLADOS OPTIMIZADOS ALCANTARILLADOS OPTIMIZADOS ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA															
2.3.2.02.02.005.4003020.5325.3.213	ALCANTARILLADOS OPTIMIZADOS 213	\$ -	\$ -	\$ 1.899.370.856,24	\$ -	\$ 1.899.370.856,24	\$ 1.899.370.856,24	\$ 1.899.370.856,24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.899.370.856,24	100			
RUBRO	CENTROS DE PROTECCION SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR CONSTRUIDOS Y DOTADOS OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES															
2.3.2.02.02.005.4104001.5312.9.201	CENTROS DE PROTECCION SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR CONSTRUIDOS Y DOTADOS 201	\$ 7.246.113.637,15	\$ -	\$ -	\$ 406.298.821,10	\$ 6.839.814.816,05	\$ 6.839.814.816,05	\$ 6.839.814.816,05	\$ 4.271.934.050,33	\$ 4.271.934.050,33	\$ -	\$ 2.567.880.765,72	100			
2.3.2.02.02.005.4104001.5312.9.501	CENTROS DE PROTECCION SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR CONSTRUIDOS Y DOTADOS 501	\$ -	\$ -	\$ 553.500.735,98	\$ -	\$ 553.500.735,98	\$ 553.500.735,98	\$ 553.500.735,98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 553.500.735,98	100			
RUBRO	DEPORTE Y RECREACION FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA															
RUBRO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO															
2.3.2.02.02.005.4301004.5327.0.201	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 201	\$ 10.789.776.795,36	\$ -	\$ 469.611.191,00	\$ 1.278.574.017,69	\$ 9.980.813.968,67	\$ 9.980.813.968,67	\$ 9.980.813.968,67	\$ 7.668.804.091,26	\$ 7.668.804.091,26	\$ -	\$ 2.312.009.877,41	100			
2.3.2.02.02.005.4301004.5327.0.588	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 588	\$ -	\$ -	\$ 4.264.067.279,48	\$ -	\$ 4.264.067.279,48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.264.067.279,48	\$ -	0			

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES				Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Pagar	% Ejecucion
		Presupuesto Inicial	Adicion	Credito	Contracredito				Obligaciones	Pagos Acumulados			
		1,00							3 = 1 + 2	5,00			
2.3.2.02.02.008.4599031.8399.0.226	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 226	\$ 1.327.920.000,00	\$ -	\$ 206.662.856,41	\$ -	\$ 1.534.582.856,41	\$ 1.098.939.999,35	\$ 1.098.939.999,35	\$ 1.098.939.999,35	\$ 1.095.789.999,35	\$ 435.642.857,06	\$ -	71,61
2.3.2.02.02.008.4599031.8399.0.526	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 526	\$ -	\$ -	\$ 800.000.000,00	\$ -	\$ 800.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.000.000,00	\$ -	0
RUBRO	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA OTROS SERVICIOS DE APOYO N.C.P.												
2.3.2.02.02.008.4599031.8599.9.226	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 226	\$ 365.640.000,00	\$ -	\$ -	\$ 134.496.189,74	\$ 231.143.810,26	\$ 211.593.333,34	\$ 211.593.333,34	\$ 211.510.000,01	\$ 211.510.000,01	\$ 19.550.476,92	\$ 83.333,33	91,54
	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES												
	MINAS Y ENERGIA CONSOLIDACION PRODUCTIVA DEL SECTOR DE ENERGIA ELECTRICA REDES DE ALUMBRADO PUBLICO AMPLIADAS												
RUBRO	REDES DE ALUMBRADO PUBLICO AMPLIADAS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS												
2.3.2.02.02.009.2102010.9112.3.226	REDES DE ALUMBRADO PUBLICO AMPLIADAS 226	\$ 3.000.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 1.157.146.144,14	\$ 1.842.853.855,86	\$ 1.741.151.017,00	\$ 1.741.151.017,00	\$ -	\$ -	\$ 101.702.838,86	\$ 1.741.151.017,00	94,48
	MINAS Y ENERGIA CONSOLIDACION PRODUCTIVA DEL SECTOR DE ENERGIA ELECTRICA REDES DE ALUMBRADO PUBLICO CON MANTENIMIENTO												
RUBRO	REDES DE ALUMBRADO PUBLICO CON MANTENIMIENTO SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS												
2.3.2.02.02.009.2102011.9112.3.226	REDES DE ALUMBRADO PUBLICO CON MANTENIMIENTO 226	\$ 10.500.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 79.150.396,86	\$ 10.420.849.603,14	\$ 10.355.609.188,00	\$ 10.355.609.188,00	\$ 6.734.434.587,34	\$ 6.734.434.587,34	\$ 65.240.415,14	\$ 3.621.174.600,66	99,37
2.3.2.02.02.009.2102011.9112.3.526	SEDES MANTENIDAS 526	\$ -	\$ 800.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 800.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.000.000,00	\$ -	0
	MINAS Y ENERGIA CONSOLIDACION PRODUCTIVA DEL SECTOR DE ENERGIA ELECTRICA REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS												
RUBRO	REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS												
2.3.2.02.02.009.2102013.9112.3.226	REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 226	\$ 9.399.135.365,00	\$ -	\$ 736.296.541,00	\$ -	\$ 10.135.431.906,00	\$ 10.135.431.546,00	\$ 10.135.431.546,00	\$ 7.624.340.339,73	\$ 6.643.277.767,98	\$ 360,00	\$ 2.511.091.206,27	99,99
2.3.2.02.02.009.2102013.9112.3.526	REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 526	\$ -	\$ 10.279.578.003,21	\$ 778.469.638,12	\$ -	\$ 11.058.047.641,33	\$ 10.887.029.605,18	\$ 10.887.029.605,18	\$ 1.558.771.742,59	\$ 1.063.197.207,16	\$ 171.018.036,15	\$ 9.328.257.862,59	98,45
	ESPACIO PUBLICO ADECUADO												
RUBRO	ESPACIO PUBLICO ADECUADO SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS												
2.3.2.02.02.009.4002020.9112.3.526	ESPACIO PUBLICO ADECUADO 526	\$ -	\$ -	\$ 1.305.970.934,82	\$ -	\$ 1.305.970.934,82	\$ 1.290.490.902,90	\$ 1.290.490.902,90	\$ 545.207.329,20	\$ -	\$ 15.480.031,92	\$ 745.283.573,70	98,81
	FONDO PARA EL ESPACIO PUBLICO												
	GASTOS												
	INVERSION												
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS												
	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS												
	ADQUISICION DE SERVICIOS												
	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION												
	TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL ANDEN DE LA RED URBANA REHABILITADO												
RUBRO	ANDEN DE LA RED URBANA REHABILITADO SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS), CALLES												
2.3.2.02.02.005.2402127.5421.1.232	ANDEN DE LA RED URBANA REHABILITADO 232	\$ 54.473.808,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54.473.808,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54.473.808,00	\$ -	0

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES				Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Pagar	% Ejecucion
		Presupuesto Inicial	Adicion	Credito	Contracredito				Obligaciones	Pagos Acumulados			
		\$ 1,00							\$ 3 = 1 + 2	\$ 5,00			
2.3.2.02.02.005.2402127.5421.1.282	ANDEN DE LA RED URBANA REHABILITADO 282	\$ 1.137.897.659,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.137.897.659,00	\$ 756.856.842,23	\$ 756.856.842,23	\$ 299.106.341,65	\$ 299.106.341,65	\$ 381.040.816,77	\$ 457.750.500,58	66,51
2.3.2.02.02.005.2402127.5421.1.806	ANDEN DE LA RED URBANA REHABILITADO 806	\$ -	\$ 2.089.927.397,51	\$ -	\$ -	\$ 2.089.927.397,51	\$ 2.089.927.397,51	\$ 2.089.927.397,51	\$ 1.148.482.278,26	\$ 1.148.482.278,26	\$ -	\$ 941.445.119,25	100
	FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA												
	GASTOS												
	INVERSION												
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS												
	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS												
	ADQUISICION DE SERVICIOS												
	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES												
	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS												
RUBRO	SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS												
2.3.2.02.02.009.4003047.9112.3.200	SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 200	\$ 266.529.916,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 266.529.916,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 266.529.916,00	\$ -	0
2.3.2.02.02.009.4003047.9112.3.201	SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 201	\$ 3.278.053.024,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.278.053.024,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
2.3.2.02.02.009.4003047.9112.3.215	SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	\$ 6.699.873.458,00	\$ 1.906.588.092,00	\$ -	\$ -	\$ 8.606.461.550,00	\$ 7.899.739.926,00	\$ 7.899.739.926,00	\$ 7.899.739.926,00	\$ 7.899.739.926,00	\$ 706.721.624,00	\$ -	91,78
2.3.2.02.02.009.4003047.9112.3.260	SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 260	\$ 5.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ -	0
2.3.2.02.02.009.4003047.9112.3.268	SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 268	\$ 10.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000,00	\$ -	0
2.3.2.02.02.009.4003047.9112.3.515	SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 515	\$ -	\$ 635.052.889,79	\$ -	\$ -	\$ 635.052.889,79	\$ 263.278.082,00	\$ 263.278.082,00	\$ 263.278.082,00	\$ 263.278.082,00	\$ 371.774.807,79	\$ -	41,45
2.3.2.02.02.009.4003047.9112.3.528	SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 528	\$ -	\$ 267.049.661,64	\$ -	\$ -	\$ 267.049.661,64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 267.049.661,64	\$ -	0
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PASIVOS EXIGIBLES												
	GASTOS												
	INVERSION												
	DISMINUCION DE PASIVOS												
	FINANCIACION DE DEFICIT PASIVOS												
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS												
	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO												
RUBRO	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO CARTUCHOS PLASTICOS PARA IMPRESORA DE COMPUTADOR												
2.3.7.06.02.459.9002.3699060.626	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 626	\$ -	\$ 37.795.429,09	\$ -	\$ -	\$ 37.795.429,09	\$ 37.795.429,09	\$ 37.795.429,09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.795.429,09	100
RUBRO	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO CPU												
2.3.7.06.02.459.9002.4523001.626	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 626	\$ -	\$ 16.429.288,75	\$ -	\$ -	\$ 16.429.288,75	\$ 16.429.288,75	\$ 16.429.288,75	\$ 16.429.288,75	\$ 16.429.288,75	\$ -	\$ -	100
RUBRO	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES												
2.3.7.06.02.459.9002.53129.601	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601	\$ -	\$ 560.399.340,67	\$ -	\$ -	\$ 560.399.340,67	\$ 134.971.855,74	\$ 134.971.855,74	\$ 47.779.129,00	\$ -	\$ 425.427.484,93	\$ 87.192.726,74	24,08
2.3.7.06.02.459.9002.53129.616	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 616	\$ -	\$ 266.733.201,66	\$ -	\$ -	\$ 266.733.201,66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 266.733.201,66	\$ -	0
2.3.7.06.02.459.9002.53129.667	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 667	\$ -	\$ 6.577.558,00	\$ -	\$ -	\$ 6.577.558,00	\$ 6.577.558,00	\$ 6.577.558,00	\$ 6.577.558,00	\$ 6.577.558,00	\$ -	\$ -	100

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES				Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Pagar	% Ejecucion
		Presupuesto Inicial	Adicion	Credito	Contracredito				Obligaciones	Pagos Acumulados			
		\$ 1,00							\$ 3 = 1 + 2	\$ 5,00			
RUBRO	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES												
2.3.7.06.02.459 9002.53211.60 1	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601	\$ -	\$ 1.949.170.989,06	\$ -	\$ -	\$ 1.949.170.989,06	\$ 62.841.946,60	\$ 62.841.946,60	\$ 62.841.946,60	\$ 62.841.946,60	\$ 1.886.329.042,46	\$ -	3,22
2.3.7.06.02.459 9002.53211.61 3	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 613	\$ -	\$ 401.767.299,22	\$ -	\$ -	\$ 401.767.299,22	\$ 401.767.299,22	\$ 401.767.299,22	\$ 401.767.299,22	\$ 401.767.299,22	\$ -	\$ -	100
RUBRO	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AGUA EXCEPTO GASODUCTOS												
2.3.7.06.02.459 9002.53231.60 1	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601	\$ -	\$ 3.072.194,17	\$ -	\$ -	\$ 3.072.194,17	\$ 3.037.190,32	\$ 3.037.190,32	\$ -	\$ -	\$ 35.003,85	\$ 3.037.190,32	98,86
RUBRO	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO												
2.3.7.06.02.459 9002.53270.60 1	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601	\$ -	\$ 998.976.837,46	\$ -	\$ -	\$ 998.976.837,46	\$ 187.156.583,14	\$ 187.156.583,14	\$ 162.519.453,00	\$ 162.519.453,00	\$ 811.820.254,32	\$ 24.637.130,14	18,73
2.3.7.06.02.459 9002.53270.67 3	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 673	\$ -	\$ 1.138.182.590,63	\$ -	\$ -	\$ 1.138.182.590,63	\$ 619.533.908,80	\$ 619.533.908,80	\$ 269.389.189,94	\$ 269.389.189,94	\$ 518.648.681,83	\$ 350.144.718,86	54,43
RUBRO	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL												
2.3.7.06.02.459 9002.53290.61 3	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 613	\$ -	\$ 19.939.074,00	\$ -	\$ -	\$ 19.939.074,00	\$ 19.663.757,00	\$ 19.663.757,00	\$ 19.663.757,00	\$ 19.663.757,00	\$ 275.317,00	\$ -	98,61
RUBRO	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES												
2.3.7.06.02.459 9002.54129.60 1	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601	\$ -	\$ 730.460.623,66	\$ -	\$ -	\$ 730.460.623,66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 730.460.623,66	\$ -	0
2.3.7.06.02.459 9002.54129.62 0	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 620	\$ -	\$ 5.818.648,80	\$ -	\$ -	\$ 5.818.648,80	\$ 5.818.648,80	\$ 5.818.648,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.818.648,80	100
RUBRO	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES												
2.3.7.06.02.459 9002.54211.60 1	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601	\$ -	\$ 20.599.615,77	\$ -	\$ -	\$ 20.599.615,77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.599.615,77	\$ -	0
RUBRO	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO												
2.3.7.06.02.459 9002.54270.60 1	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601	\$ -	\$ 1.574.793.211,90	\$ -	\$ -	\$ 1.574.793.211,90	\$ 283.222.572,86	\$ 283.222.572,86	\$ 283.222.572,86	\$ 283.222.572,86	\$ 1.291.570.639,04	\$ -	17,98
RUBRO	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO												
2.3.7.06.02.459 9002.82120.62 6	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 626	\$ -	\$ 18.800.000,00	\$ -	\$ -	\$ 18.800.000,00	\$ 18.800.000,00	\$ 18.800.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.800.000,00	100
RUBRO	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO SERVICIOS DE ASESORIA EN ARQUITECTURA												
2.3.7.06.02.459 9002.83211.60 1	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601	\$ -	\$ 370.830.776,00	\$ -	\$ -	\$ 370.830.776,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 370.830.776,00	\$ -	0
RUBRO	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P												
2.3.7.06.02.459 9002.83990.60 1	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601	\$ -	\$ 93.138.623,20	\$ -	\$ -	\$ 93.138.623,20	\$ 11.550.000,00	\$ 11.550.000,00	\$ -	\$ -	\$ 81.588.623,20	\$ 11.550.000,00	12,4
RUBRO	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA												
2.3.7.06.02.459 9002.84222.60 1	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601	\$ -	\$ 346.307.169,00	\$ -	\$ -	\$ 346.307.169,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 346.307.169,00	\$ -	0
RUBRO	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE												
2.3.7.06.02.459 9002.85970.60 1	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601	\$ -	\$ 10.386.590,23	\$ -	\$ -	\$ 10.386.590,23	\$ 10.386.590,23	\$ 10.386.590,23	\$ 10.386.590,23	\$ 10.386.590,23	\$ -	\$ -	100

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES				Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Pagar	% Ejecucion
		Presupuesto Inicial	Adicion	Credito	Contracredito				Obligaciones	Pagos Acumulados			
		\$ 1,00							\$ 3 = 1 + 2	\$ 5,00			
2.3.7.06.02.459 9002.85970.62 6	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 626	\$ -	\$ 15.586.290,27	\$ -	\$ -	\$ 15.586.290,27	\$ 15.586.290,27	\$ 15.586.290,27	\$ 15.586.290,27	\$ 15.586.290,27	\$ -	\$ -	100
RUBRO	OTROS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA N C P												
2.3.7.06.02.459 9002.91119.62 6	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 626	\$ -	\$ 1.473.595.524,26	\$ -	\$ -	\$ 1.473.595.524,26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.473.595.524,26	\$ -	0
2.3.7.06.02.459 9002.91119.65 3	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 653	\$ -	\$ 416.713.117,16	\$ -	\$ -	\$ 416.713.117,16	\$ 413.653.924,60	\$ 413.653.924,60	\$ 413.653.924,60	\$ 413.653.924,60	\$ 3.059.192,56	\$ -	99,26
RUBRO	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS												
2.3.7.06.02.459 9002.91123.62 6	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 626	\$ -	\$ 3.056.010.949,19	\$ -	\$ -	\$ 3.056.010.949,19	\$ 1.713.729.161,09	\$ 1.713.729.161,09	\$ 1.713.729.161,09	\$ 1.713.729.161,09	\$ 1.342.281.788,10	\$ -	56,07
TOTAL INFORME SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		\$ 162.344.772.467,00	\$ 170.803.789.278,79	\$ 57.707.169.181,14	\$ 61.695.623.987,20	\$ 329.160.106.939,73	\$ 280.903.737.620,18	\$ 280.903.737.620,18	\$ 203.593.241.275,05	\$ 198.247.267.987,49	\$ 48.256.369.319,55	\$ 77.310.496.345,13	85,33955

RELACION COMPROMISOS (01 OCTUBRE - 31 DE DICIEMBRE DE 2023)

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
12084	02/10/2023 16:36	1686	JOSE WLADIMIR SIZA LOAIZA	7546	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 6.056.666,67	2.3.2.02.02.008.4301011.8 5999.201 - PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS 201	\$ 6.056.666,67	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL GESTIÓN NO. 1686 DEL 2 DE MARZO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OFICIAL DE OBRA EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
12085	02/10/2023 16:36	1687	VLADIMIR JAIMES CACERES	7547	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 7.505.000,00	2.3.2.02.02.008.4301011.8 3990.201 - PARQUE RECREATIVOS ADECUADOS 201	\$ 7.505.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NO. 1687 DEL 2 DE MARZO DE 2023, SEGUN OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO SOLDADOR EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
12086	02/10/2023 16:38	1688	BENEDICTO PINZON OROZCO	7548	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 7.505.000,00	2.3.2.02.02.008.4301011.8 3990.201 - PARQUE RECREATIVOS ADECUADOS 201	\$ 7.505.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NO. 1688 DEL 02 DE MARZO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO SOLDADOR EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
12087	02/10/2023 16:38	1689	DANIEL EDUARDO JAIMES RUIZ	7549	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 7.900.000,00	2.3.2.02.02.008.4301011.8 5999.201 - PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS 201	\$ 7.900.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 1689 DEL 02 DE MARZO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SOPORTE EN INVENTARIO EN DESARROLLO DEL PROYECTO, MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
12088	02/10/2023 16:39	1690	LUIS FERNANDO OJEDA BALAGUERA	7550	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 6.320.000,00	2.3.2.02.02.008.4301011.8 3990.201 - PARQUE RECREATIVOS ADECUADOS 201	\$ 6.320.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NO. 1690 DEL 02 DE MARZO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSPECTOR DE OBRA EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
12089	02/10/2023 16:39	1691	ELIAS PARDO BAUTISTA	7551	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.345.000,00	2.3.2.02.02.008.4301011.8 5999.201 - PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS 201	\$ 4.345.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NO. 1691 DEL 02 DE MARZO DE 2023, PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AYUDANTE DE OBRA EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
12090	02/10/2023 16:39	1705	JORGE MAURICIO DUARTE ARDILA	7516	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 12.500.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3213.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 12.500.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 1705 DEL 06 DE MARZO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE
12097	03/10/2023 11:44	3663	DANIEL TARAZONA PIMIENTO	7599	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 11.200.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3213.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 11.200.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.
12098	03/10/2023 13:44	3669	LISETH MALAGON PEREIRA	7658	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 7.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3990.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 7.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, BRINDANDO APOYO EN LA CORRECTA IMPLEMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA ARCGIS DE LAS OBRAS ADELANTADAS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
12136	03/10/2023 16:35	3668	RICARDO VANEGAS ANAYA	7657	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 11.200.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3990.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 11.200.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA APOYANDO LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE ELÉCTRICO DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
12213	05/10/2023 10:03	3671	EDGAR BERNARDO VARGAS DIAZ	7674	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 13.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 13.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL APOYANDO LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE HIDRÁULICO, SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
12220	05/10/2023 15:28	253	ING INGENIERIA SAS	6209	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 625.069.999,00	2.3.2.02.02.008.3301094.8 3321.201 - ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 201	\$ 125.069.999,00	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL COLISEO PERALTA INMUEBLE DECLARADO BIEN DE INTERES CULTURAL DEL AMBITO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
12220	05/10/2023 15:28	253	ING INGENIERIA SAS	6209	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	2.3.2.02.02.008.3301094.8 3321.306 - ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 306	\$ 500.000.000,00	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL COLISEO PERALTA INMUEBLE DECLARADO BIEN DE INTERES CULTURAL DEL AMBITO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
12221	05/10/2023 15:31	252	CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S	6208	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 174.358.800,00	2.3.2.02.02.008.3301094.8 3321.201 - ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 201	\$ 174.358.800,00	INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL COLISEO PERALTA INMUEBLE DECLARADO BIEN DE INTERES CULTURAL DEL AMBITO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
12260	06/10/2023 10:59	3673	JUAN BAUTISTA MEDINA MONTOYA	7643	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 6.013.333,33	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 6.013.333,33	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE.
12293	07/10/2023 00:37		COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P BIC	7728	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.049.554,00	2.3.2.02.02.008.4599016.8 4120.526 - SEDES MANTENIDAS 526	\$ 5.049.554,00	"CONSUMO DE TELEFONIA LOCAL - ADSL (FIBRA OPTICA, SERVIDOR) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 , SEGUN FACTURA TBCL- 23069620 DE MOVISTAR (ANTERIORMENTE TELEBUCARAMANGA) CUENTA NO. 498 "
12313	09/10/2023 09:15	3677	ANGIE JUDITH SANCHEZ BARAJAS	7710	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.760.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 5999.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 4.760.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE ELÉCTRICO DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
12327	09/10/2023 11:02	3676	JUAN SEBASTIAN RAMIREZ DIAZ	7662	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 7.900.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3990.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 7.900.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TOPOGRAFO PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
12328	09/10/2023 11:03	3678	ANDRES FELIPE MARTINEZ MOSQUERA	7711	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 7.600.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3213.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 7.600.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.
12361	10/10/2023 13:55		LIMPIEZA URBANA S.A. ESP	7763	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 78.145.534,00	2.3.2.02.02.009.4003047.9 1123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	\$ 78.145.534,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES DE ABRIL DE 2023 SEGÚN FACTURA NO. LUSA-2628 \$ 19.692.921,00, MAYO DE 2023 SEGÚN FACTURA NO. LUSA-2629 \$ 19,689,784,00 JUNIO DE 2023 SEGÚN FACTURA NO. LUSA-2630 \$ 19,571,945,00 Y JULIO DE 2023 SEGÚN FACTURA NO. LUSA-2631 \$ 19,190,884,00 VALOR TOTAL \$ 78.145.534,00-LIMPIEZA URBANA
12362	10/10/2023 13:55		ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA AMB S.A. ESP	7762	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 269.098.750,00	2.3.2.02.02.009.4003047.9 1123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	\$ 269.098.750,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN FACTURA NO. 05858 \$ 269.098.750,00 VALOR TOTAL \$ 269.098.750,00 -ACUEDUCTO METROPOLITANO
12363	10/10/2023 13:56		EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S A E S P	7761	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 233.541.842,00	2.3.2.02.02.009.4003047.9 1123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	\$ 233.541.842,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGÚN FACTURA NO. ES299 \$ 233.541.842,00 VALOR TOTAL \$ 233.541.842,00- EMAB
12367	10/10/2023 17:15		ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	7787	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.211.055.886,00	2.3.2.02.02.006.4599016.6 9112.526 - GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 526	\$ 1.211.055.886,00	ENERGIA - ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN FACTURA 212041012 NUMERO DE CUENTA 1075933 -1
12386	11/10/2023 15:18	3689	JUAN CAMILO SANMIGUEL ROMERO	7744	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 14.400.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3213.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 14.400.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.
12392	11/10/2023 15:44	3691	DAYANA CRISTINA ARENAS BAYONA	7780	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.206.666,67	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 5.206.666,67	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE.
12423	12/10/2023 07:18	3692	JUAN PABLO PEÑALOZA LEMUS	7784	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 10.650.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 10.650.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
12469	13/10/2023 15:59		COMCEL S A	7834	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 222.632,40	2.3.2.02.02.008.4599016.6 4120.526 - SEDES MANTENIDAS 526	\$ 222.632,40	CONSUMO DE VOZ CORRESPONDIENTE AL 04 DE OCTUBRE 2023 AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 ; PLAN DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y SIM CARD DE PRUEBA DE TELEMEDIDA, SEGUN FACTURA E 5737125307 DE CLARO REFERENCIA 8221401343.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
12499	18/10/2023 10:26	2341	ARCADIO MUÑOZ	7771	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.180.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 5999.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 4.180.000,00	ADICIÓN EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NO. 2341 DEL 09 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
12500	18/10/2023 10:27	2348	EDGAR GOMEZ CASTAÑEDA	7777	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.180.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 5999.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 4.180.000,00	ADICIÓN EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NO. 2348 DEL 09 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
12501	18/10/2023 10:27	2342	GERMAN LARROTA	7772	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.560.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 5999.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 4.560.000,00	ADICIÓN EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NO. 2342 DEL 09 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
12502	18/10/2023 10:28	2340	ANDERSON EMIRO CONTRERAS BARCENAS	7770	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 8.550.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3213.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 8.550.000,00	ADICIÓN EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2340 DEL 09 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
12503	18/10/2023 10:33	2343	GERARDO ANDRES SUAREZ ESCOBAR	7773	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.700.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 5.700.000,00	ADICIÓN EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2343 DEL 09 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
12504	18/10/2023 10:34	2349	ARMANDO MOGOLLON ROJAS	7778	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.560.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 5999.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 4.560.000,00	ADICIÓN EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NO. 2349 DEL 09 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
12505	18/10/2023 10:35	2344	ANDRES CAMILO CORZO LEAL	7774	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.230.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 5999.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 3.230.000,00	ADICIÓN EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2344 DEL 09 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA BRINDANDO APOYO EN LA PROYECCIÓN Y SUPERVISION DE LOS CONTRATOS QUE SURJAN CON RELACIÓN AL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
12506	18/10/2023 10:35	2346	DIEGO FABIAN PATIÑO TRUJILLO	7775	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.180.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 5999.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 4.180.000,00	ADICIÓN EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NO. 2346 DEL 09 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
12507	18/10/2023 10:36	2347	ISAIAS SUAREZ DELGADO	7776	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.180.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 5999.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 4.180.000,00	ADICIÓN EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NO. 2347 DEL 09 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
12510	18/10/2023 14:51	3468	MERLYN YURANY RODRIGUEZ BUENO	7779	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.066.666,67	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3213.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 500.000,00	ADICIÓN EN VALOR NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3468 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
12510	18/10/2023 14:51	3468	MERLYN YURANY RODRIGUEZ BUENO	7841	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3213.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 566.666,67	ADICIÓN EN VALOR NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3468 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
12609	24/10/2023 09:41	2345	LEIDI KATERINE GARCIA MENESES	7921	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.750.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 4.750.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.2345 DEL 09 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO (A) CIVIL PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
12660	24/10/2023 15:44	3712	SAID HUMBERTO BAENE CARRASCAL	7866	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 7.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3990.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 7.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TOPOGRAFO PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
12672	25/10/2023 15:47		ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	7953	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.788.275,00	2.3.2.02.02.006.4599016.6 9112.526 - GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 526	\$ 3.788.275,00	CONSUMO DE ENERGÍA DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 13 DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN FACTURA 212798030 DE LA ESSA - NUMERO DE CUENTA 32675
12673	25/10/2023 15:52	167	CONSTRUCCIONES DISEÑOS ESTUDIOS S.A.	7902	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 130.000.000,00	2.3.2.02.02.005.4301011.5 4270.501 - PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS 501	\$ 130.000.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 4 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 167 DEL 13 DE JULIO DE 2022, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN DEL PARQUE EL CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
12685	25/10/2023 16:49	168	ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP SAS	7903	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 93.295.230,00	2.3.2.02.02.005.4301011.5 4270.201 - PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS 201	\$ 68.381.641,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 168 DEL 13 DE JULIO DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN DEL PARQUE EL CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
12685	25/10/2023 16:49	168	ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP SAS	7903	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	2.3.2.02.02.005.4301011.5 4270.501 - PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS 501	\$ 24.913.589,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 168 DEL 13 DE JULIO DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN DEL PARQUE EL CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
12710	26/10/2023 13:18	13	CONSORCIO CDC	7910	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 177.487.095,00	2.3.2.02.02.005.2402042.5 3211.201 - PLACA HUELLA CONSTRUIDA 201	\$ 177.487.095,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 13 DEL 16 DE FEBRERO DE 2023, CUYO OBJETO: INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN LOS CORREGIMIENTOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO 2
12711	26/10/2023 13:49	166	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	7785	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.601.319.769,00	2.3.2.02.02.005.2201052.5 3129.201 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA 201	\$ 1.848.032.963,41	ADICIÓN EN VALOR NO. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 166 DEL 28 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
12711	26/10/2023 13:49	166	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	7785	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	2.3.2.02.02.005.2201052.53129.501 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA 501	\$ 753.286.805,59	ADICIÓN EN VALOR NO. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 166 DEL 28 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER
12720	26/10/2023 16:08	12	CONSORCIO KALROY BUCARAMANGA 13	7900	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 180.973.632,00	2.3.2.02.02.005.4301004.53270.201 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 201	\$ 180.973.632,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 12 DEL 14 DE FEBRERO DE 2023, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA LA ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER. GRUPO 2
12744	26/10/2023 17:06	419	CONSORCIO RURAL BUCARAMANGA 2023	7907	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 725.657.760,00	2.3.2.02.02.005.2402042.53211.201 - PLACA HUELLA CONSTRUIDA 201	\$ 179.657.760,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 419 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2022, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN LOS CORREGIMIENTOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. - GRUPO 2
12744	26/10/2023 17:06	419	CONSORCIO RURAL BUCARAMANGA 2023	7907	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	2.3.2.02.02.005.2402042.53211.588 - PLACA HUELLA CONSTRUIDA 588	\$ 546.000.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 419 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2022, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN LOS CORREGIMIENTOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. - GRUPO 2
12747	26/10/2023 17:14	433	CONSORCIO GRAVIRU 2022	7908	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 549.684.264,00	2.3.2.02.02.005.2402042.53211.201 - PLACA HUELLA CONSTRUIDA 201	\$ 549.684.264,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 433 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2022, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN LOS CORREGIMIENTOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. - GRUPO 3
12749	26/10/2023 17:15	418	CONSORCIO JASC 2022	7906	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 901.028.598,00	2.3.2.02.02.005.2402042.53211.201 - PLACA HUELLA CONSTRUIDA 201	\$ 901.028.598,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 418 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2022, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN LOS CORREGIMIENTOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO 1
12758	26/10/2023 17:27	14	CONSORCIO AUTOVIAL IMGA	7911	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 150.309.198,00	2.3.2.02.02.005.2402042.53211.201 - PLACA HUELLA CONSTRUIDA 201	\$ 150.309.198,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 14 DEL 16 DE FEBRERO DE 2023, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN LOS CORREGIMIENTOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO 3
12763	26/10/2023 17:35	444	COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A	7909	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 198.280.015,00	2.3.2.02.02.005.2402042.53211.201 - PLACA HUELLA CONSTRUIDA 201	\$ 198.280.015,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 444 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN LOS CORREGIMIENTOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO 1
13036	27/10/2023 09:41	3727	JAVIER ORTEGA VERA	7955	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.83213.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA ARTICULAR LOS EQUIPOS DE APOYO DEL PROCESO DE PLANIFICACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.
13037	27/10/2023 09:42		COMCEL S A	7979	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.829.012,65	2.3.2.02.02.008.4599016.84120.526 - SEDES MANTENIDAS 526	\$ 1.829.012,65	PLAN DE DATOS DE TELEMEDIDA, TELEGESTION Y PLATAFORMA TECNOLOGICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, 20 DE OCTUBRE 2023 AL 19 NOVIEMBRE DE 2023. SEGÚN FACTURA DE CLARO NO.E 5742616429 - REFERENCIA 8221383845.
13083	27/10/2023 13:29	2504	EMERSON MIGUEL VELANDIA HERRERA	7945	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.250.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.83321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 4.250.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2504 DEL 15 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
13084	27/10/2023 14:23	2462	DARIO GUERRERO MANTILLA	7942	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 10.400.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 10.400.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2462 DEL 14 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO EN ESTRUCTURAS PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
13085	27/10/2023 14:24	2461	VICENTE VARGAS LOZANO	7941	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 6.933.333,33	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3990.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 6.933.333,33	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2461 DEL 14 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE
13086	27/10/2023 14:25	2460	OSCAR MAURICIO CRUZ ORELLANA	7946	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 6.933.333,33	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3990.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 6.933.333,33	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2460 DEL 14 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA APOYANDO LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE ELÉCTRICO DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
13087	27/10/2023 14:26	2459	JAVIER ROJAS TAVERA	7940	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 7.800.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 7.800.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2459 DEL 14 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS ASUNTOS RELACIONADOS DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
13088	27/10/2023 14:27	2456	MARTHA YANETH CEPEDA PICO	7938	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 7.800.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3990.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 7.800.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2456 DEL 14 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN ASUNTOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE LE SEAN ASIGNADOS
13089	27/10/2023 14:27	2455	MONICA ORDUZ MANRIQUE	7937	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 7.800.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3990.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 7.800.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2455 DEL 14 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
13090	27/10/2023 14:29	2454	WILFRED EMILIO PALACIO VERANO	7936	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 6.933.333,33	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3990.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 6.933.333,33	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.2454 DEL 14 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO MECÁNICO REALIZANDO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE
13091	27/10/2023 14:29	2503	OSCAR FERNANDO NIÑO CARREÑO	7944	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 7.650.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 7.650.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2503 DEL 15 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
13137	27/10/2023 19:40	2458	JORGE ANDRES MARTINEZ VILLADA	7939	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 6.066.666,67	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 6.066.666,67	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2458 DEL 14 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE
13153	30/10/2023 12:46		METROLIMPIA S.A.S. E.S.P.	8030	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 50.249.186,00	2.3.2.02.02.009.4003047.9 1123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	\$ 50.249.186,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2023 SEGÚN FACTURA NO. ELEC-1272 \$ 50.249.186,00 VALOR TOTAL \$ 50.249.186,00 - METROLIMPIA
13187	31/10/2023 17:04	3733	LUIS FERNANDO PLATA HERNANDEZ	7978	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.173.333,33	2.3.2.02.02.008.4599031.8 5999.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 3.173.333,33	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CADENERO DENTRO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
13188	31/10/2023 17:05	3735	CAROL YURLEI GRIMALDOS DIAZ	7977	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.173.333,33	2.3.2.02.02.008.4599031.8 5999.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 3.173.333,33	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CADENERO DENTRO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
13189	31/10/2023 17:10	3734	DILBER DUVAN PARRA ESCALANTE	7976	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.600.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3990.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 5.600.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TOPOGRAFO PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
13199	01/11/2023 08:21		UNIÓN TEMPORAL EARR SAS	8075	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.267.154,08	2.3.7.06.02.4599002.53270 .673 - SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 673	\$ 2.267.154,08	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 174 DE 2021, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS ADYACENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" - GRUPO 2
13216	01/11/2023 19:57	2345	LEIDI KATERINE GARCIA MENESES	8087	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 833.333,33	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 833.333,33	ADICIÓN EN VALOR NO. 2 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2345 DEL 09 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO(A) CIVIL PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
13222	02/11/2023 09:00	1689	DANIEL EDUARDO JAIMES RUIZ	7954	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 833.333,33	2.3.2.02.02.008.4301011.8 5999.201 - PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS 201	\$ 833.333,33	ADICIÓN EN VALOR NO. 2 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NO. 1689 DEL 2 DE MARZO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SOPORTE EN INVENTARIO EN DESARROLLO DEL PROYECTO, MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
13223	02/11/2023 09:08	2565	GENNY PAOLA ARAQUE VILLAMIZAR	8068	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 6.900.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3990.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 6.900.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2565 DEL 20 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA APOYANDO LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE ELÉCTRICO DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
13224	02/11/2023 09:09	2576	EFRAIN ANDRES SERRANO PLATA	8089	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 8.250.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 8.250.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2576 DEL 21 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO INGENIERO CIVIL, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
13225	02/11/2023 09:09	3148	SERGIO MAURICIO CORREA RAMIREZ	8071	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 7.200.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3990.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 7.200.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NO.3148 DEL 30 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN REALIZANDO ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE SE ADELANTEN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
13226	02/11/2023 09:10	2545	CARLOS JAVIER RODRIGUEZ JEREZ	8070	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 7.050.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 7.050.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2545 DEL 2+ DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO INGENIERO CIVIL, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
13227	02/11/2023 09:13	3154	ROBERT LEANDRO RODRIGUEZ MORENO	8073	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 6.133.333,33	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 6.133.333,33	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3154 DEL 4 DE JULIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE
13228	02/11/2023 09:14	2564	JAIME ENRIQUE VEGA PEÑA	8067	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 6.133.333,33	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 6.133.333,33	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2564 DEL 20 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
13229	02/11/2023 09:14	2547	OSCAR ANDRES TARAZONA FIGUEROA	8069	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 7.050.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3990.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 7.050.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2547 DEL 16 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TOPOGRAFO PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
13230	02/11/2023 09:15	2546	ROBINSON FABIAN FIGUEROA MALDONADO	8072	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.916.666,67	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3990.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 3.916.666,67	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2546 DEL 16 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTROMECÁNICO REALIZANDO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE
13242	02/11/2023 11:43	273	KABOD EXECUTIVE GROUP SAS	7283	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 816.866.155,00	2.3.2.02.02.005.4301011.5 4270.201 - PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS 201	\$ 816.866.155,00	ADECUACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS RECREAR DEL NORTE Y CANCHA SINTÉTICA DEL KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"
13244	02/11/2023 15:16	2577	DIEGO FERNANDO BUTRON MANTILLA	8090	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 6.750.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3213.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 6.750.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2577 DEL 21 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
13246	02/11/2023 15:37	2572	JULIETH ALEXANDRA PEREZ TELLEZ	8088	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 6.750.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3990.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 6.750.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2572 DEL 21 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA APOYANDO LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE ELÉCTRICO DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
13248	02/11/2023 15:44	280	CONSORCIO KENNEDY	7331	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 267.377.530,00	2.3.2.02.02.008.4503017.8 3321.201 - ESTUDIOS DE RIESGO DE DESASTRES 201	\$ 267.377.530,00	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN EL BARRIO ALTOS DEL KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
13265	03/11/2023 11:44	2566	DIEGO JULIAN ALMEYDA MARTINEZ	8074	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.833.333,33	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 3.833.333,33	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2566 DEL 20 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE
13293	03/11/2023 16:59	11	CONSORCIO PI CENTRO	8174	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 178.766.916,96	2.3.2.02.02.005.4002020.5 3270.501 - ESPACIO PUBLICO ADECUADO 501	\$ 178.766.916,96	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 11 DEL 14 DE FEBRERO DE 2023, CUYO OBJETO ES: LA INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN LA PLAZOLETA LUIS CARLOS GALÁN Y PARQUE GARCIA ROVIRA ENMARCADOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA "PLAN CENTRO" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
13344	03/11/2023 17:57	2578	CAMILO ANDRES GOMEZ GARCIA	8148	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.450.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3990.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 3.450.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NO.2578 DEL 21 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO EN DIBUJO ARQUITECTÓNICO PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
13345	03/11/2023 17:58	2590	CLAUDIA XIOMARA SILVA MEDINA	8151	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 6.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3213.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 6.000.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2590 DEL 21 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
13346	03/11/2023 17:58	2581	GERARDO QUINTERO FLOREZ	8149	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.750.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3990.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 3.750.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.2581 DEL 21 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON APOYO TÉCNICO EN DESARROLLO AL MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL DE LAS ZONAS VERDES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
13347	03/11/2023 17:58	2582	LUIS ALBERTO CASTELLANOS VILLABONA	8150	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 6.750.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3213.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 6.750.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2582 DEL 21 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
13348	03/11/2023 17:59	2591	OMAR ANDRES RUEDA RUIZ	8152	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 3.000.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2591 DEL 21 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
13349	03/11/2023 17:59	2685	JOSE FERNANDO CHAVES GOMEZ	8153	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 10.266.666,67	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 10.266.666,67	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2685 DEL 22 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE
13350	03/11/2023 18:00	2686	LIBARDO RUEDA CACERES	8154	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.666.666,67	2.3.2.02.02.008.4599031.8 5999.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 3.666.666,67	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2686 DEL 22 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE
13351	03/11/2023 18:00	2688	BONIFACIO FLOREZ ANTELIZ	8155	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.866.666,67	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 5.866.666,67	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2688 DEL 22 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE
13384	08/11/2023 15:18	285	UNION TEMPORAL MODERNIZACION FASE 1 BGA.	6536	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.542.848.948,00	2.3.2.02.02.009.2102013.9 1123.526 - REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 526	\$ 1.542.848.948,00	MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 - FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA –LOTE 1
13385	08/11/2023 15:20	286	CONSORCIO ILUMINAR BGA	6536	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.522.075.669,89	2.3.2.02.02.009.2102013.9 1123.526 - REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 526	\$ 1.522.075.669,89	MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 - FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA –LOTE 2
13386	08/11/2023 15:20	287	UNIÓN TEMPORAL MODERNIZACIÓN BUCARAMANGA	6536	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.498.472.490,53	2.3.2.02.02.009.2102013.9 1123.526 - REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 526	\$ 1.498.472.490,53	MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 - FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA –LOTE 3
13387	08/11/2023 15:22	288	CONSORCIO ALUMBRADO BUCARAMANGA	6536	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.209.155.465,00	2.3.2.02.02.009.2102013.9 1123.526 - REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 526	\$ 1.209.155.465,00	MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 - FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA –LOTE 5
13388	08/11/2023 15:35	289	CONSORCIO CONSTRUELECTRICOS	6536	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 836.362.735,00	2.3.2.02.02.009.2102013.9 1123.226 - REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 226	\$ 210.605.114,91	MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 - FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA –LOTE 6
13388	08/11/2023 15:35	289	CONSORCIO CONSTRUELECTRICOS	6536	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	2.3.2.02.02.009.2102013.9 1123.526 - REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 526	\$ 625.757.620,09	MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 - FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA –LOTE 6
13389	08/11/2023 15:36	291	CONSORCIO ELECTRICAL	6536	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.444.130.820,00	2.3.2.02.02.009.2102013.9 1123.526 - REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 526	\$ 1.444.130.820,00	MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 - FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA –LOTE 4
13392	08/11/2023 17:56	2762	PAOLA ANDREA VARGAS TRIANA	8219	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.150.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 2.150.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NO. 2762 DEL 23 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA REALIZANDO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE PROPENDAN POR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
13393	08/11/2023 17:56	2766	SANDRA MILENA PEREZ TORRES	8220	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.583.333,33	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3990.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 3.583.333,33	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.2766 DEL 23 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA COMO VERIFICADOR EN EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ANÁLISIS VIAL EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA Y PLANIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
13394	08/11/2023 17:57	2746	LUISA FERNANDA MELGAREJO RAMIREZ	8215	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.016.666,67	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3213.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 5.016.666,67	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2746 DEL 23 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
13395	08/11/2023 17:58	2767	FREDY ALBERTO PABON PARRA	8214	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 6.450.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3990.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 6.450.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2767 DEL 23 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TOPOGRAFO PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
13396	08/11/2023 17:58	2753	EDUAR FABIAN GALLO BALAGUERA	8218	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.300.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3213.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 4.300.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.2753 DEL 23 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
13397	08/11/2023 17:58	2744	CARLOS HUMBERTO TORRES ALVAREZ	8216	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 6.450.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3213.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 6.450.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2744 DEL 23 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
13398	08/11/2023 17:59	2745	ALEJANDRO CASTAÑEDA ARENAS	8217	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.300.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3213.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 4.300.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2745 DEL 23 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
13401	09/11/2023 10:37		ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA AMB S.A. ESP	8211	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 280.298.156,00	2.3.2.02.02.009.4003047.9 1123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	\$ 280.298.156,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL MES DE JULIO DE 2023 SEGÚN FACTURA NO. 05879 \$ 280.298.156,00 VALOR TOTAL \$ 280.298.156,00 -ACUEDUCTO METROPOLITANO
13402	09/11/2023 10:38		EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S A E S P	8212	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 243.990.842,00	2.3.2.02.02.009.4003047.9 1123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	\$ 243.990.842,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGÚN FACTURA NO. ES306 \$ 243.990.842,00 VALOR TOTAL \$ 243.990.842,00- EMAB

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
13403	09/11/2023 10:39		EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S A ESP EMPAS S A	8213	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 142.294.814,00	2.3.2.02.02.009.4003047.9 1123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	\$ 142.294.814,00	PAGO DE SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL MES JUNIO DE 2023 SEGÚN FACTURA NO. 09724 \$ 142.294.814,00 VALOR TOTAL \$ 142.294.814,00 - EMPAS
13404	09/11/2023 11:34	290	CONSORCIO AP 2023	6536	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 897.152.256,00	2.3.2.02.02.009.2102013.9 1123.526 - REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 526	\$ 897.152.256,00	MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 - FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA –LOTE 7
13405	09/11/2023 11:36		COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P BIC	8210	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.220.340,00	2.3.2.02.02.008.4599016.8 4120.526 - SEDES MANTENIDAS 526	\$ 5.220.340,00	"CONSUMO DE TELEFONIA LOCAL - ADSL (FIBRA OPTICA, SERVIDOR) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 , SEGUN FACTURA TBCL- 23136008 DE MOVISTAR (ANTERIORMENTE TELEBUCARAMANGA) CUENTA NO. 498 "
13412	09/11/2023 14:56	292	7G7 S.A.S	6574	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.193.042.076,00	2.3.2.02.02.005.4301011.5 4270.201 - PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS 201	\$ 1.853.552.720,00	ADECUACIÓN DEL PARQUE DIAMANTE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
13412	09/11/2023 14:56	292	7G7 S.A.S	6574	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	2.3.2.02.02.009.2102013.9 1123.526 - REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 526	\$ 339.489.356,00	ADECUACIÓN DEL PARQUE DIAMANTE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
13476	14/11/2023 11:40	3747	NELLY YULIETH CALDERON GARCIA	8156	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.666.666,67	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 3.666.666,67	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO INGENIERO (A) CIVIL, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA.
13478	14/11/2023 14:10	311	DAROHE SAS	6575	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 87.837.063,00	2.3.2.02.02.005.4301011.5 4270.201 - PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS 201	\$ 87.837.063,00	INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DEL PARQUE DIAMANTE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
13487	14/11/2023 21:16	2831	GIOVANNI ENRIQUE MELO ZAPATA	8292	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 7.646.666,67	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 7.646.666,67	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.2831 DEL 26 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO EN TRÁNSITO Y VÍAS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ANÁLISIS VIAL EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
13488	14/11/2023 21:17	2863	HUGO ALEXANDER BALLESTEROS CASTILLO	8291	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.850.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 5999.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 1.850.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NO. 2863 DEL 27 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AFORADOR EN EL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
13489	14/11/2023 21:17	2868	DANIEL ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ	8287	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.700.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 3.700.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2868 DEL 27 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE
13490	14/11/2023 21:18	2827	LUISA FERNANDA SANABRIA PARRA	8290	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.316.666,67	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 4.316.666,67	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2827 DEL 26 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
13491	14/11/2023 21:18	3031	OCTAVIO ANDRES SANDOVAL GONZALEZ	8286	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 6.166.666,67	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 6.166.666,67	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3031 DEL 28 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL APOYANDO LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE HIDRÁULICO, SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
13492	14/11/2023 21:19	2747	KAREN ALEXANDRA RIVERA CORZO	8289	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.933.333,33	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3213.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 4.933.333,33	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2747 DEL 23 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
13493	14/11/2023 21:19	2818	JAIME ALBERTO HURTADO SUAREZ	8293	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.713.333,33	2.3.2.02.02.008.4599031.8 5999.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 2.713.333,33	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NO. 2818 DEL 26 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
13494	14/11/2023 21:19	2817	RODRIGO HERNANDEZ CARRILLO	8294	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.713.333,33	2.3.2.02.02.008.4599031.8 5999.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 2.713.333,33	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NO. 2817 DEL 26 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
13495	14/11/2023 21:20	2800	LUIS ALBERTO PINZON	8285	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.550.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 5.550.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2800 DEL 26 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE
13496	14/11/2023 21:20	2816	JUAN FRANCISCO FANDIÑO PUENTES	8288	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.850.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 5999.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 1.850.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NO. 2816 DEL 26 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA REALIZANDO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE PROPENDAN POR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA
13545	15/11/2023 11:45	310	IMCCA S.A.S.	7317	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 866.841.849,00	2.3.2.02.02.005.4002020.5 3211.201 - ESPACIO PUBLICO ADECUADO 201	\$ 866.841.849,00	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIO PUBLICO, A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL BOSCONIA SEDE B DE LA VEREDA SANTA RITA, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
13584	16/11/2023 11:38		COMCEL S A	8309	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 222.632,40	2.3.2.02.02.008.4599016.8 4120.526 - SEDES MANTENIDAS 526	\$ 222.632,40	CONSUMO DE VOZ CORRESPONDIENTE AL 04 DE NOVIEMBRE 2023 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2023 ; PLAN DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y SIM CARD DE PRUEBA DE TELEMEDIDA, SEGUN FACTURA E 5747211854 DE CLARO REFERENCIA 8221401343.
13585	16/11/2023 11:38		ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	8308	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.360.406.137,00	2.3.2.02.02.006.4599016.6 9112.526 - GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 526	\$ 1.360.406.137,00	ENERGIA - ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN FACTURA 213177607 NUMERO DE CUENTA 1075933 -1

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
13598	16/11/2023 13:56	156	CONSORCIO PARQUES DE BUCARAMANGA 2021	8345	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 267.122.035,86	2.3.7.06.02.4599002.53270.673 - SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 673	\$ 267.122.035,86	PASIVO EXIGIBLE - CONTRATO NO. 156 DEL 19 DE JULIO DE 2021, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO 2
13606	16/11/2023 14:21	2541	JOSE SAUL ARDILA GUZMAN	8343	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.500.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 5999.226 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 226	\$ 3.500.000,00	ADICIÓN EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2541 DEL 16 DE JUNIO DEL 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS COMO TÉCNICO ELECTRICISTA PARA APOYO EN LA REVISIÓN DE PQR'S, REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE REGISTROS DIARIOS DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO DE LAS CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO, REVISIÓN EN CAMPO DE MATERIALES INSTALADOS Y APOYO AL INGENIERO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. AP-51
13607	16/11/2023 14:22	2540	JUAN DAVID PABON ARDILA	8342	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.833.333,33	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3990.226 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 226	\$ 5.833.333,33	ADICIÓN EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 2540 DEL 16 DE JUNIO DEL 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA, EN EL PROCESO Y SUBPROCESO DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD. AP-50
13623	16/11/2023 16:09	3768	MARCOS ANDRES RODRIGUEZ MANTILLA	8190	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.866.666,67	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3213.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 5.866.666,67	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.
13645	16/11/2023 17:18	1848	MARIA FERNANDA NIÑO GUTIERREZ	8353	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.250.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3213.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 5.250.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 1848 DEL 11 DE ABRIL DE 2023, CUYO OBJETO ES. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE
13648	16/11/2023 17:37	2865	RICARDO ANDRES ZARATE CABEZA	8354	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.666.666,67	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3213.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 4.666.666,67	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2865 DEL 27 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
13659	17/11/2023 10:47	316	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS	7564	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 380.844.085,18	2.3.2.02.02.005.4002020.5 4211.588 - VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO ESPACIO PUBLICO ADECUADO 588	\$ 380.844.085,18	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA DIAGONAL 15 AVENIDA QUEBRADA SECA HASTA LA CALLE 33 DENTRO DE LA ESTRATEGIA CORREDOR AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
13667	17/11/2023 14:28	447	CONSORCIO INTERVIAS RS	8236	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 205.758.423,00	2.3.2.02.02.005.4301004.5 3270.901 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 901	\$ 205.758.423,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 447 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA LA ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER. GRUPO 3
13669	17/11/2023 14:33	410	CONSORCIO PARQUES URBANISTICOS	8235	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.340.000.000,00	2.3.2.02.02.005.4301004.5 3270.901 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 901	\$ 1.340.000.000,00	ADICIONAL EL VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 410 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, CUYO OBJETO ES: ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - GRUPO 3
13670	17/11/2023 14:35	3153	SILVIA JULIANA MONSALVE DIAZ	8352	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.583.333,33	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 2.583.333,33	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3153 DEL 04 DE JULIO DE 2023, CUYO OBJETO ES. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO(A) CIVIL PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
13671	17/11/2023 14:36	3117	DIEGO ENRIQUE GOMEZ VERA	8358	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.950.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 2120.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 4.950.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3117 DEL 29 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PARA ASESORAR, APOYAR, ACOMPAÑAR, PROYECTAR, SUSTANCIAR Y REVISAR JURÍDICAMENTE LOS TEMAS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSCONTRACTUALES QUE ESTA ADELANTE
13672	17/11/2023 14:36	1871	DIEGO ANDRES BRICEÑO CABALLERO	8349	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.950.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3213.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 4.950.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 1871 DEL 18 DE ABRIL DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
13673	17/11/2023 14:37	3116	MATEO BOHORQUEZ MUÑOZ	8357	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.850.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3213.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 3.850.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3116 DEL 29 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
13674	17/11/2023 14:38	1890	ERIKA JOHANNA MORENO TARAZONA	8350	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.800.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3990.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 2.800.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 1890 DEL 21 DE ABRIL DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR (A) SOCIAL PARA APOYAR LA GESTION DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
13675	17/11/2023 14:38	1864	DIANA PATRICIA CARVAJAL FUENTES	8348	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.666.666,67	2.3.2.02.02.008.4599031.8 2120.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 5.666.666,67	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 1864 DEL 17 DE ABRIL DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PARA APOYAR, ACOMPAÑAR, PROYECTAR, SUSTANCIAR Y REVISAR JURIDICAMENTE LOS TEMAS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSCONTRACTUALES QUE ESTA ADELANTE.
13676	17/11/2023 14:39	1887	ELIBERTO SANDOVAL VERGEL	8371	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.376.666,67	2.3.2.02.02.008.4301011.8 5999.201 - PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS 201	\$ 2.376.666,67	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NO. 1887 DEL 20 DE ABRIL DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OFICIAL DE OBRA EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
13677	17/11/2023 14:39	3020	GAMA SERVICIOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS SAS	8351	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 7.700.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 2120.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 7.700.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3020 DEL 28 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DEL DERECHO PARA EJERCER LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y/O EXTRAJUDICIAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
13687	17/11/2023 16:14	411	UNION TEMPORAL LOS NARANJOS	8381	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 963.386.049,91	2.3.2.02.02.009.2102013.9 1123.226 - REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 226	\$ 532.467.991,20	ADICIÓN EN VALOR Y PLAZO NO. 2 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 411 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2022, CUYO OBJETO ES: MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. LOTE 1

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
13687	17/11/2023 16:14	411	UNION TEMPORAL LOS NARANJOS	8381	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	2.3.2.02.02.009.2102013.9 1123.526 - REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 526	\$ 430.918.058,71	ADICIÓN EN VALOR Y PLAZO NO. 2 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 411 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2022, CUYO OBJETO ES: MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. LOTE 1
13688	17/11/2023 16:26	421	CONSORCIO INTERURBANAS	8382	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 203.828.549,80	2.3.2.02.02.009.2102013.9 1123.226 - REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 226	\$ 203.828.549,80	ADICIÓN EN VALOR Y PLAZO NO. 2 AL CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 421 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA A LA MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR Y SANTANDER, CALLE 56 FASE I Y II Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 1.
13718	20/11/2023 15:49	320	EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS	6537	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 471.665.824,00	2.3.2.02.02.009.2102013.9 1123.526 - REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 526	\$ 471.665.824,00	INTERVENTORIA A LA MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 - FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. LOTE 1
13765	21/11/2023 10:45	3777	KER INGENIERIA S.A.S BIC	8330	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 6.166.666,67	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 6.166.666,67	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE LA INGENIERÍA CIVIL -ESPECIALIDAD GEOTECNIA PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
13804	21/11/2023 14:58	3256	LUZ STELLA MARTINEZ	8418	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.400.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3990.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 2.400.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3256 DEL 27 DE JULIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA APOYAR LA REALIZACION DE ACTIVIDADES INHERENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y LOS PLANES DE MEJORAMIENTO; ASÍ COMO EL REGISTRO DE INFORMACION REQUERIDA EN EL SISTEMA INTEGRAL FINANCIERO Y SIA OBSERVA, EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE ESTA ADELANTE.
13805	21/11/2023 14:59	3245	JUAN DAVID ARIZA RODRIGUEZ	8417	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.586.666,67	2.3.2.02.02.008.4599031.8 5999.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 1.586.666,67	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 3245 DEL 19 DE JULIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE
13806	21/11/2023 15:00	1891	NICOLAS GABRIEL GONZALEZ DOMINGUEZ	8416	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.493.333,33	2.3.2.02.02.008.4599031.8 5999.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 1.493.333,33	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 1891 DEL 21 DE ABRIL DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO, PRESENTACION Y CARGUE DE INFORMACION EN LAS DIFERENTES PLATAFORMAS DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL
13809	21/11/2023 16:09	324	ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP SAS	6537	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 329.640.962,00	2.3.2.02.02.009.2102013.9 1123.526 - REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 526	\$ 329.640.962,00	INTERVENTORIA A LA MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 - FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. LOTE 2
13814	21/11/2023 16:27	323	CONSORCIO ALUMBRADO NLC	6537	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 329.654.130,00	2.3.2.02.02.009.2102013.9 1123.526 - REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 526	\$ 329.654.130,00	INTERVENTORIA A LA MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 - FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. LOTE 3.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
13883	22/11/2023 09:25		SEGURIDAD ATEMPI LTDA	6088	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 507.956.014,00	2.3.2.02.02.008.4599016.8 5250.526 - SEDES MANTENIDAS 526	\$ 507.956.014,00	ADICIÓN EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 60 DEL 10 DE ABRIL DEL 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMA, SIN ARMA, MEDIOS TECNOLÓGICOS Y MEDIO CANINO PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS Y CON EL FIN DE SALVAGUARDAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA TENENCIA, POSESIÓN O DOMINIO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y DONDE LA ENTIDAD LOS REQUIERA.
13892	22/11/2023 13:53	166	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	8191	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.494.271.839,00	2.3.2.02.02.005.2201052.5 3129.901 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA 901	\$ 2.494.271.839,00	ADICIÓN EN VALOR NO. 2 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 166 DEL 28 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER
13956	22/11/2023 16:58	3787	MARIA NATALIA FORERO RODRIGUEZ	8419	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.000.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3213.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 4.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTA, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.
14133	23/11/2023 13:52		ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	8504	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.542.928,00	2.3.2.02.02.006.4599016.6 9112.526 - GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 526	\$ 3.542.928,00	CONSUMO DE ENERGÍA DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL 14 DE OCTUBRE DE 2023 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN FACTURA 212798030 DE LA ESSA - NUMERO DE CUENTA 32675
14140	23/11/2023 15:54	332	CONSORCIO ILUMINAR BGA R	6246	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.659.990.756,00	2.3.2.02.02.009.2102010.9 1123.226 - REDES DE ALUMBRADO PUBLICO AMPLIADAS 226	\$ 1.659.990.756,00	AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONA RURAL - FASE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
14146	23/11/2023 16:49	1892	JULIETH ANDREA NUÑEZ BUITRAGO	8524	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.200.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3990.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 4.200.000,00	ADICIONAL 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 1892 DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA APOYAR, ACOMPAÑAR, PROYECTAR, SUSTANCIAR Y REVISAR JURÍDICAMENTE LOS TEMAS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSCONTRACTUALES, QUE ESTA ADELANTE
14172	24/11/2023 15:38	333	CONSORCIO RINCON DE LA PAZ 2023	6391	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 368.226.958,00	2.3.2.02.02.005.4502003.5 3129.588 - SALÓN COMUNAL ADECUADO 588	\$ 368.226.958,00	ADECUACIÓN DEL SALÓN COMUNAL RINCÓN DE LA PAZ EN LA COMUNA NO.5 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER
14178	24/11/2023 17:20	429	JESAK SAS	8503	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 87.058.554,00	2.3.2.02.02.005.2402127.5 4211.282 - ANDEN DE LA RED URBANA REHABILITADO 282	\$ 87.058.554,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 429 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER.
14241	27/11/2023 15:56	3262	ORLANDO ORTIZ MANTILLA	8598	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.450.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3990.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 3.450.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO NO. 3262 DEL 28 DE JULIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS COMO TECNOLOGO EN TOPOGRAFIA PARA APOYAR LA GESTION DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
14256	28/11/2023 11:47		COMCEL S A	8624	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.829.012,65	2.3.2.02.02.008.4599016.8 4120.526 - SEDES MANTENIDAS 526	\$ 1.829.012,65	PLAN DE DATOS DE TELEMEDIDA, TELEGESTION Y PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, 20 DE NOVIEMBRE 2023 AL 19 DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN FACTURA DE CLARO NO.E 5752685132 - REFERENCIA 8221383845.
14279	28/11/2023 15:40		EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S A ESP EMPAS S A	8608	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 143.581.042,00	2.3.2.02.02.009.4003047.9 1123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 215	\$ 143.581.042,00	PAGO DE SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL MES JULIO DE 2023 SEGÚN FACTURA NO. 010168 \$ 143.581.042,00 VALOR TOTAL \$ 143.581.042,00 - EMPAS
14280	28/11/2023 15:41		LIMPIEZA URBANA S.A. ESP	8607	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.185.243,00	2.3.2.02.02.009.4003047.9 1123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 215	\$ 2.185.243,00	AJUSTE AL PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES DE ABRIL DE 2023 SEGÚN FACTURA NO. LUSA-2628 \$ 19.692.921,00, LBUC-50 \$ 20.661.306,00 DIF: 968.385, MAYO DE 2023 SEGÚN FACTURA NO. LUSA-2629 \$ 19,689,784,00, LBUC-51 \$ 20.032.475,00 DIF: 342.691, JUNIO DE 2023 SEGÚN FACTURA NO. LUSA-2630 \$ 19,571,945,00, LBUC-52 \$ 19.827.797,00 DIF: 255.852 Y JULIO DE 2023 SEGÚN FACTURA NO. LUSA-2631 \$ 19,190,884,00, LBUC-53 \$ 19.809.199,00 DIF: 618.315 VALOR AJUSTE \$ 2.185.243,00 -LIMPIEZA URBANA
14329	28/11/2023 17:32	187	WILMAN MORALES REY PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S A S	8432	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.201.407,63	2.3.2.02.02.008.4599016.8 3132.526 - SEDES MANTENIDAS 526	\$ 20.201.407,63	ADICIÓN EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 187 DEL 14 DE JULIO DEL 2023, CUYO OBJETO ES: SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO-SGAP Y EL HARDWARE DE CONTROL EN LOS DIFERENTES SITIOS CON TELEMEDIDA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
14405	29/11/2023 15:21	432	CONSORCIO EDIFICACIONES	8208	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 33.096.883,76	2.3.2.02.02.005.3301038.5 3129.201 - CULTURA PROMOCION Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTISTICOS TEATROS ADECUADOS 201	\$ 33.096.883,76	ADICIONAL EN VALOR NO. 5 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 432 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2022, CUYO OBJETO ES: CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS AL BIEN DE INTERÉS CULTURAL TEATRO COLISEO PERALTA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
14428	30/11/2023 15:39		NESTOR FERNANDO MARTINEZ PEREIRA	8712	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 11.550.000,00	2.3.7.06.02.4599002.83990 .601 - SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601	\$ 11.550.000,00	PASIVO EXIGIBLE DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 1406 DE 2021, A NOMBRE DE: MARTINEZ PEREIRA NESTOR FERNANDO, CUENTA OCTUBRE \$ 4.500.000, NOVIEMBRE \$ 4.500.000 Y DICIEMBRE \$ 2.550.000, VALOR TOTAL \$ 11.550.000
14436	01/12/2023 15:53	341	HCR INGENIEROS S.A.S.	7477	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 81.160.261,00	2.3.2.02.02.009.2102010.9 1123.226 - REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO AMPLIADAS 226	\$ 81.160.261,00	INTERVENTORÍA A LA AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONA RURAL - FASE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
14437	01/12/2023 15:56	414	GRUPO J8 S.A.S	8700	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 197.146.182,71	2.3.2.02.02.009.2102013.9 1123.526 - REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO MEJORADAS 526	\$ 197.146.182,71	ADICIÓN EN VALOR Y PLAZO NO. 2 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 414 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2022, CUYO OBJETO ES: MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 4.
14438	01/12/2023 15:58	424	SOLUCIONES ELECTRICAS DE COLOMBIA S.A.S	8699	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 48.921.822,25	2.3.2.02.02.009.2102013.9 1123.526 - REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO MEJORADAS 526	\$ 48.921.822,25	ADICIÓN EN VALOR Y PLAZO NO. 2 AL CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 424 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA A LA MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR Y SANTANDER, CALLE 56 FASE I Y II Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 3.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
14575	04/12/2023 16:32		ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA AMB S.A. ESP	8758	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 284.303.647,00	2.3.2.02.02.009.4003047.9 1123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	\$ 284.303.647,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGÚN FACTURA NO. 05891 \$ 284.303.647,00 VALOR TOTAL \$ 284.303.647,00 -ACUEDUCTO METROPOLITANO
14576	04/12/2023 16:32		EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S A E S P	8757	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 241.907.813,00	2.3.2.02.02.009.4003047.9 1123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	\$ 241.907.813,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGÚN FACTURA NO. ES310 \$ 241.907.813,00 VALOR TOTAL \$ 241.907.813,00- EMAB
14646	06/12/2023 17:19		COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P BIC	8846	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.171.257,00	2.3.2.02.02.008.4599016.8 4120.526 - SEDES MANTENIDAS 526	\$ 5.171.257,00	"CONSUMO DE TELEFONIA LOCAL - ADSL (FIBRA OPTICA, SERVIDOR) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 , SEGUN FACTURA TBCL- 23200359 DE MOVISTAR (ANTERIORMENTE TELEBUCARAMANGA) CUENTA NO. 498 "
14667	07/12/2023 09:30	1951	YESENIA SUAREZ PATIÑO	8838	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.950.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3990.226 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 226	\$ 1.950.000,00	ADICIÓN EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 1951 DEL 04 DE MAYO DEL 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRONICO EN EL SEGUIMIENTO, CONTROL TÉCNICO Y PROCESOS QUE ADELANTE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. AP-47
14668	07/12/2023 09:30	1950	KAROL JULIANA GALVIS FLOREZ	8837	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 866.666,67	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3990.226 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 226	\$ 866.666,67	"ADICIÓN EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 1950 DEL 04 DE MAYO DEL 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRONICO EN EL SEGUIMIENTO, CONTROL TÉCNICO Y PROCESOS QUE ADELANTE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. AP-48 "
14669	07/12/2023 09:31	3292	ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CARDENAS	8839	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.650.000,00	2.3.2.02.02.008.4599031.8 3990.226 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 226	\$ 1.650.000,00	ADICIÓN EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 3292 DEL 09 DE AGOSTO DEL 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRONICO EN LOS PROCESOS DE TELEMEDIDA Y TELEGESTION EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – ALUMBRADO PUBLICO. AP-54 "
14671	07/12/2023 09:38		ASOINGENIERIA DEL ORIENTE S.A.S.	8870	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 19.663.757,00	2.3.7.06.02.4599002.53290 .613 - SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 613	\$ 19.663.757,00	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 341 DE 2019, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO DE LOS BARRIOS MIRAFLORES PARTE ALTA, ALBANIA Y CORDONCILLOS I DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
14673	07/12/2023 09:49	3287	KEVIN ANDRES BENITEZ OTERO	8850	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 566.666,67	2.3.2.02.02.008.4599031.8 5999.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 566.666,67	ADICIÓN EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NO. 3287 DEL 09 DE AGOSTO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
14674	07/12/2023 10:55	349	SERVICIOS Y SOLUCIONES ENERGETICAS S.A.S	8513	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.022.200,00	2.3.2.02.02.008.4599016.8 715204.226 - SEDES MANTENIDAS 226	\$ 4.022.200,00	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA UPS DE 6 KVA MARCA TOSHIBA INCLUYENDO PARTES Y REPUESTOS ORIGINALES DE FÁBRICA PARA LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
14746	12/12/2023 15:06		LIMPIEZA URBANA S.A. ESP	8910	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 38.696.273,00	2.3.2.02.02.009.4003047.9 1123.515 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 515	\$ 38.696.273,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGÚN FACTURA NO. LBUC NO.54 \$ 19.527.250,00 Y SEPTIEMBRE DE 2023 SEGÚN FACTURA LBUC NO. 55 \$ 19.169.026,00 VALOR TOTAL \$ 38.696.273,00-LIMPIEZA URBANA
14747	12/12/2023 15:06		METROLIMPIA S.A.S. E.S.P.	8909	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 50.410.926,00	2.3.2.02.02.009.4003047.9 1123.515 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 515	\$ 50.410.926,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2023 SEGÚN FACTURA NO. ELEC-1327 \$ 50.410.926,00 VALOR TOTAL \$ 50.410.926,00 - METROLIMPIA
14787	13/12/2023 08:13		ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	8928	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.379.718.531,00	2.3.2.02.02.006.4599016.6 9112.526 - GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 526	\$ 1.379.718.531,00	ENERGIA - ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN FACTURA 214316943 NUMERO DE CUENTA 1075933 -1
14800	13/12/2023 15:15		GUSTAVO ADOLFO CALA ARDILA	8940	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.800.000,00	2.3.7.06.02.4599002.82120 .626 - SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 626	\$ 18.800.000,00	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 249 DEL 19 DE ENERO DE 2021, CUYO OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN TELECOMUNICACIONES PARA ASESORAR Y APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LA PLANIFICACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
14847	14/12/2023 15:14	351	SUESCUN COMPANY S.A.S.	8433	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.996.886,00	2.3.2.02.01.003.4599016.3 212801.526 - SEDES MANTENIDAS 526	\$ 5.996.886,00	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
14848	14/12/2023 15:16		COMCEL S A	8948	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 222.632,40	2.3.2.02.02.008.4599016.8 4120.526 - SEDES MANTENIDAS 526	\$ 222.632,40	CONSUMO DE VOZ CORRESPONDIENTE AL 04 DE DICIEMBRE 2023 AL 03 DE ENERO DE 2024 ; PLAN DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y SIM CARD DE PRUEBA DE TELEMEDIDA, SEGUN FACTURA E 5747211854 DE CLARO REFERENCIA 8221401343.
14857	14/12/2023 17:21	396	CONSORCIO PLAN CENTRO FASE II	8947	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.817.357.764,00	2.3.2.02.02.005.4002020.5 3270.201 - ESPACIO PUBLICO ADECUADO 201	\$ 642.934.195,00	ADICIONAL EN VALOR NO. 2 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 396 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2022, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN LA PLAZOLETA LUIS CARLOS GALÁN Y PARQUE GARCIA ROVIRA ENMARCADOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA "PLAN CENTRO" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
14857	14/12/2023 17:21	396	CONSORCIO PLAN CENTRO FASE II	8947	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	2.3.2.02.02.009.4002020.9 1123.526 - ESPACIO PUBLICO ADECUADO 526	\$ 1.174.423.569,00	ADICIONAL EN VALOR NO. 2 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 396 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2022, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN LA PLAZOLETA LUIS CARLOS GALÁN Y PARQUE GARCIA ROVIRA ENMARCADOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA "PLAN CENTRO" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
14923	15/12/2023 08:20	167	CONSTRUCCIONES DISEÑOS ESTUDIOS S.A.	8941	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 116.067.333,90	2.3.2.02.02.009.4002020.91123.526 - ESPACIO PUBLICO ADECUADO 526	\$ 116.067.333,90	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 5 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 167 DEL DE JULIO DE 2022, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN DEL PARQUE EL CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
14974	15/12/2023 11:29	273	KABOD EXECUTIVE GROUP SAS	8942	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 169.133.845,00	2.3.2.02.02.005.4301011.54270.201 - PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS 201	\$ 169.133.845,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 273 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2023, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS RECREAR. DEL NORTE Y CANCHA SINTÉTICA DEL KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
14976	15/12/2023 11:37	198	COASCON SAS	8946	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 98.453.564,26	2.3.2.02.02.005.4002020.53211.501 - ESPACIO PUBLICO ADECUADO 501	\$ 98.453.564,26	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 198 DEL 28 DE JULIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ESPACIO PUBLICO, ADYACENTE A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMACHO CARREÑO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
14985	15/12/2023 14:01	448	CONSORCIO UNIDO	8988	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 529.406.212,98	2.3.2.02.02.005.4104001.53129.501 - CENTROS DE PROTECCION SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR CONSTRUIDOS Y DOTADOS 501	\$ 529.406.212,98	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 448 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION CENTRO VIDA Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS ANTONIA SANTOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
14986	15/12/2023 14:02	449	CONSORCIO INTER-ANDINO	9003	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 24.094.523,00	2.3.2.02.02.005.4104001.53129.501 - CENTROS DE PROTECCION SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR CONSTRUIDOS Y DOTADOS 501	\$ 24.094.523,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 449 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION CENTRO VIDA Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS ANTONIA SANTOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
15022	15/12/2023 17:17	427	SITELSA SAS	8944	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 164.897.407,50	2.3.2.02.02.005.1709078.53122.901 - PLAZA DE MERCADO ADECUADAS 901	\$ 164.897.407,50	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 427 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA A LA ADECUACION Y REFORMAS LOCATIVAS A LAS PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
15439	18/12/2023 17:25	23	CONSORCIO PARQUES BUCARAMANGA	9015	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 520.679.049,00	2.3.2.02.02.005.4002020.53211.201 - ESPACIO PUBLICO ADECUADO 201	\$ 172.368.815,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 23 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO DÁMASO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
15439	18/12/2023 17:25	23	CONSORCIO PARQUES BUCARAMANGA	9015	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	2.3.2.02.02.005.4002020.53211.501 - ESPACIO PUBLICO ADECUADO 501	\$ 348.310.234,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 23 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO DÁMASO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
15764	19/12/2023 14:31	411	UNION TEMPORAL LOS NARANJOS	8989	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 249.456.857,00	2.3.2.02.02.005.2102013.53270.501 - REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 501	\$ 249.456.857,00	ADICIÓN EN VALOR NO. 3 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 411 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2022, CUYO OBJETO ES: MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. LOTE 1
15803	19/12/2023 16:59	397	GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	9014	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 108.639.194,00	2.3.2.02.02.005.4002020.53211.501 - ESPACIO PUBLICO ADECUADO 501	\$ 108.639.194,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 397 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO DÁMASO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
15861	21/12/2023 08:31		CONSORCIO ESTORAQUE	9098	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 374.781.849,00	2.3.7.06.02.4599002.53270.673 - SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 673	\$ 350.144.718,86	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO 151 DE 2021, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO 1
15861	21/12/2023 08:31		CONSORCIO ESTORAQUE	9098	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	2.3.7.06.02.4599002.53270.601 - SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601	\$ 24.637.130,14	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO 151 DE 2021, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO 1

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Contratista	CDP Nro.	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
15863	21/12/2023 10:00		EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S A ESP EMPAS S A	9101	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 132.818.517,00	2.3.2.02.02.009.4003047.91123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	\$ 132.818.517,00	PAGO DE SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL MES AGOSTO DE 2023 SEGÚN FACTURA NO. 011350 \$ 132.818.517,00 VALOR TOTAL \$ 132.818.517,00 - EMPAS
15927	21/12/2023 11:46		ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA AMB S.A. ESP	9104	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.037.190,32	2.3.7.06.02.4599002.53231.601 - SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601	\$ 3.037.190,32	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 332 DE 2021, CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA GARANTIZAR LA COBERTURA DEL MÍNIMO VITAL DE AGUA A LOS SECTORES DE LOS CORREGIMIENTOS 1, 2, Y 3, EN VIRTUD DE LAS ACCIONES JUDICIALES EXISTENTES EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
15973	21/12/2023 17:27		ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	9117	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.900.723,00	2.3.2.02.02.006.4599016.69112.526 - GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL SEDES MANTENIDAS 526	\$ 3.900.723,00	CONSUMO DE ENERGÍA DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN FACTURA 215104707 DE LA ESSA - NUMERO DE CUENTA 32675
15985	22/12/2023 08:06	38	CONSORCIO PRACI	9087	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 66.414.104,00	2.3.2.02.02.005.4502003.54129.501 - SALON COMUNAL ADECUADO 501	\$ 66.414.104,00	ADICIONAL NO. 8 EN VALOR AL CONTRATO DE OBRA NO 038 DE 2022 QUE TIENE POR OBJETO LA "ADECUACIÓN DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER GRUPO 1
16046	26/12/2023 15:56		COMCEL S A	9136	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.028.839,36	2.3.2.02.02.008.4599016.84120.526 - SEDES MANTENIDAS 526	\$ 2.028.839,36	PLAN DE DATOS DE TELEMEDIDA, TELEGESTION Y PLATAFORMA TECNOLOGICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, 20 DE DICIEMBRE 2023 AL 19 ENERO DE 2024. SEGÚN FACTURA DE CLARO NO.E 5762786938 - REFERENCIA 8221383845.

RELACION PERSONAL (01 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023)

Año	Número Contrato	Tipo Contrato	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato	Fecha Liquidación Contrato
2023	1686	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE WLADIMIR	SIZA LOAIZA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OFICIAL DE OBRA EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 6.056.666,67	02/10/2023	03/10/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	1687	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	VLADIMIR	JAIMES CACERES	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO SOLDADOR EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 7.505.000,00	02/10/2023	03/10/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	1688	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	BENEDICTO	PINZON OROZCO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 7.505.000,00	02/10/2023	03/10/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	1689	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DANIEL EDUARDO	JAIMES RUIZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SOPORTE EN INVENTARIO EN DESARROLLO DEL PROYECTO, MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 7.900.000,00	02/10/2023	03/10/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	1689	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DANIEL EDUARDO	JAIMES RUIZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SOPORTE EN INVENTARIO EN DESARROLLO DEL PROYECTO, MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 833.333,33	02/11/2023	03/10/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	1690	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUIS FERNANDO	OJEDA BALAGUERA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSPECTOR DE OBRA EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 6.320.000,00	02/10/2023	03/10/2023	21/12/2023	21/12/2023

Año	Número Contrato	Tipo Contrato	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato	Fecha Liquidación Contrato
2023	1691	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ELIAS	PARDO BAUTISTA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AYUDANTE DE OBRA EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 4.345.000,00	02/10/2023	03/10/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	1705	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JORGE MAURICIO	DUARTE ARDILA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE	\$ 12.500.000,00	02/10/2023	07/10/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	1848	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA FERNANDA	NIÑO GUTIERREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE	\$ 5.250.000,00	16/11/2023	17/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	1864	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIANA PATRICIA	CARVAJAL FUENTES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PARA APOYAR, ACOMPAÑAR, PROYECTAR, SUSTANCIAR Y REVISAR JURÍDICAMENTE LOS TEMAS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSCONTRACTUALES QUE ESTA ADELANTE	\$ 5.666.666,67	16/11/2023	18/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	1871	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIEGO ANDRES	BRICEÑO CABALLERO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 4.950.000,00	16/11/2023	19/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	1887	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ELIBERTO	SANDOVAL VERGEL	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OFICIAL DE OBRA EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 2.376.666,67	16/11/2023	21/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	1890	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ERIKA JOHANNA	MORENO TARAZONA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR (A) SOCIAL PARA APOYAR LA GESTION DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 2.800.000,00	16/11/2023	24/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	1891	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	NICOLAS GABRIEL	GONZALEZ DOMINGUEZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO, PRESENTACION Y CARGUE DE INFORMACION EN LAS DIFERENTES PLATAFORMAS DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL	\$ 1.493.333,33	21/11/2023	24/11/2023	21/12/2023	21/12/2023

Año	Número Contrato	Tipo Contrato	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato	Fecha Liquidación Contrato
2023	1892	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JULIETH ANDREA	NUÑEZ BUITRAGO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA APOYAR, ACOMPAÑAR, PROYECTAR, SUSTANCIAR Y REVISAR JURÍDICAMENTE LOS TEMAS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSCONTRACTUALES, QUE ESTA ADELANTE	\$ 4.200.000,00	23/11/2023	24/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	1950	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	KAROL JULIANA	GALVIS FLOREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRONICO EN EL SEGUIMIENTO, CONTROL TÉCNICO Y PROCESOS QUE ADELANTE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 866.666,67	06/12/2023	09/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	1951	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	YESENIA	SUAREZ PATIÑO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRONICO EN EL SEGUIMIENTO, CONTROL TÉCNICO Y PROCESOS QUE ADELANTE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.950.000,00	06/12/2023	09/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	2340	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANDERSON EMIRO	CONTRERAS BARCENAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 8.550.000,00	10/10/2023	25/10/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	2341	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ARCADIO	MUÑOZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.180.000,00	10/10/2023	25/10/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	2342	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	GERMAN	LARROTA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.560.000,00	10/10/2023	25/10/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	2343	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	GERARDO ANDRES	SUAREZ ESCOBAR	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 5.700.000,00	10/10/2023	25/10/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	2344	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANDRES CAMILO	CORZO LEAL	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA BRINDANDO APOYO EN LA PROYECCION Y SUPERVISION DE LOS CONTRATOS QUE SURJAN CON RELACION AL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 3.230.000,00	10/10/2023	25/10/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	2345	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LEIDI KATERINE	GARCIA MENESES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO(A) CIVIL PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 4.750.000,00	23/10/2023	25/10/2023	21/12/2023	20/12/2023
2023	2345	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LEIDI KATERINE	GARCIA MENESES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO(A) CIVIL PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 833.333,33	01/11/2023	25/10/2023	21/12/2023	20/12/2023

Año	Número Contrato	Tipo Contrato	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato	Fecha Liquidación Contrato
2023	2346	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIEGO FABIAN	PATIÑO TRUJILLO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.180.000,00	11/10/2023	25/10/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	2347	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ISAIAS	SUAREZ DELGADO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.180.000,00	10/10/2023	25/10/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	2348	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EDGAR	GOMEZ CASTAÑEDA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.180.000,00	10/10/2023	25/10/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	2349	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ARMANDO	MOGOLLON ROJAS	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.560.000,00	10/10/2023	25/10/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	2454	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	WILFRED EMILIO	PALACIO VERANO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO MECANICO REALIZANDO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE	\$ 6.933.333,33	24/10/2023	30/10/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	2455	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MONICA	ORDUZ MANRIQUE	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	\$ 7.800.000,00	24/10/2023	30/10/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	2456	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARTHA YANETH	CEPEDA PICO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN ASUNTOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE LE SEAN ASIGNADOS	\$ 7.800.000,00	24/10/2023	30/10/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	2458	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JORGE ANDRES	MARTINEZ VILLADA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE	\$ 6.066.666,67	24/10/2023	30/10/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	2459	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JAVIER	ROJAS TAVERA	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS ASUNTOS RELACIONADOS DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 7.800.000,00	24/10/2023	30/10/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	2460	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OSCAR MAURICIO	CRUZ ORELLANA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA APOYANDO LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE ELÉCTRICO DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 6.933.333,33	24/10/2023	30/10/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	2461	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	VICENTE	VARGAS LOZANO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE	\$ 6.933.333,33	24/10/2023	30/10/2023	21/12/2023	21/12/2023

Año	Número Contrato	Tipo Contrato	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato	Fecha Liquidación Contrato
2023	2462	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DARIO	GUERRERO MANTILLA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO EN ESTRUCTURAS PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 10.400.000,00	24/10/2023	30/10/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	2477	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	IVAN DARIO	PABON PARRA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CADENERO DENTRO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 3.060.000,00	24/10/2023	31/10/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	2503	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OSCAR FERNANDO	NIÑO CARREÑO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 7.650.000,00	24/10/2023	31/10/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	2504	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EMERSON MIGUEL	VELANDIA HERRERA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE	\$ 4.250.000,00	24/10/2023	31/10/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	2540	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN DAVID	PABON ARDILA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA, EN EL PROCESO Y SUBPROCESO DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD	\$ 5.833.333,33	16/11/2023	17/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	2541	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE SAUL	ARDILA GUZMAN	PRESTAR SERVICIOS COMO TÉCNICO ELECTRICISTA PARA APOYO EN LA REVISIÓN DE PQR'S, REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE REGISTROS DIARIOS DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO DE LAS CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO, REVISIÓN EN CAMPO DE MATERIALES INSTALADOS Y APOYO AL INGENIERO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 3.500.000,00	16/11/2023	17/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	2545	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CARLOS JAVIER	RODRIGUEZ JEREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO INGENIERO CIVIL, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	\$ 7.050.000,00	31/10/2023	05/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	2546	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ROBINSON FABIAN	FIGUEROA MALDONADO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTROMECAÁNICO REALIZANDO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE	\$ 3.916.666,67	31/10/2023	05/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	2547	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OSCAR ANDRES	TARAZONA FIGUEROA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TOPOGRAFO PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 7.050.000,00	31/10/2023	05/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	2564	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JAIME ENRIQUE	VEGA PEÑA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 6.133.333,33	31/10/2023	06/11/2023	21/12/2023	21/12/2023

Año	Número Contrato	Tipo Contrato	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato	Fecha Liquidación Contrato
2023	2565	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	GENNY PAOLA	ARAQUE VILLAMIZAR	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA APOYANDO LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE ELÉCTRICO DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 6.900.000,00	31/10/2023	06/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	2566	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIEGO JULIAN	ALMEYDA MARTINEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE	\$ 3.833.333,33	31/10/2023	06/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	2572	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JULIETH ALEXANDRA	PEREZ TELLEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA APOYANDO LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE ELÉCTRICO DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 6.750.000,00	01/11/2023	07/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	2576	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EFRAIN ANDRES	SERRANO PLATA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO INGENIERO CIVIL, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	\$ 8.250.000,00	01/11/2023	07/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	2577	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIEGO FERNANDO	BUTRON MANTILLA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE	\$ 6.750.000,00	01/11/2023	07/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	2578	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CAMILO ANDRES	GOMEZ GARCIA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO EN DIBUJO ARQUITECTONICO PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 3.450.000,00	03/11/2023	07/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	2581	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	GERARDO	QUINTERO FLOREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON APOYO TÉCNICO EN DESARROLLO AL MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL DE LAS ZONAS VERDES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 3.750.000,00	03/11/2023	07/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	2582	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUIS ALBERTO	CASTELLANOS VILLABONA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	\$ 6.750.000,00	03/11/2023	07/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	2590	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CLAUDIA XIOMARA	SILVA MEDINA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	\$ 6.000.000,00	03/11/2023	07/11/2023	21/12/2023	21/12/2023

Año	Número Contrato	Tipo Contrato	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato	Fecha Liquidación Contrato
2023	2591	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OMAR ANDRES	RUEDA RUIZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE	\$ 3.000.000,00	03/11/2023	07/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	2685	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE FERNANDO	CHAVES GOMEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE	\$ 10.266.666,67	03/11/2023	08/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	2686	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LIBARDO	RUEDA CACERES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE	\$ 3.666.666,67	03/11/2023	08/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	2688	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	BONIFACIO	FLOREZ ANTELIZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE	\$ 5.866.666,67	03/11/2023	08/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	2744	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CARLOS HUMBERTO	TORRES ALVAREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 6.450.000,00	08/11/2023	09/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	2745	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ALEJANDRO	CASTAÑEDA ARENAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.300.000,00	08/11/2023	09/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	2746	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUISA FERNANDA	MELGAREJO RAMIREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.016.666,67	08/11/2023	09/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	2747	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	KAREN ALEXANDRA	RIVERA CORZO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.933.333,33	14/11/2023	15/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	2753	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EDUAR FABIAN	GALLO BALAGUERA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.300.000,00	08/11/2023	09/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	2762	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PAOLA ANDREA	VARGAS TRIANA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA REALIZANDO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE PROPENDAN POR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA	\$ 2.150.000,00	08/11/2023	09/11/2023	21/12/2023	21/12/2023

Año	Número Contrato	Tipo Contrato	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato	Fecha Liquidación Contrato
2023	2766	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SANDRA MILENA	PEREZ TORRES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA COMO VERIFICADOR EN EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ANÁLISIS VIAL EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA Y PLANIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 3.583.333,33	08/11/2023	09/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	2767	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FREDY ALBERTO	PABON PARRA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TOPOGRAFO PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 6.450.000,00	08/11/2023	09/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	2800	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUIS ALBERTO	PINZON	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE	\$ 5.550.000,00	14/11/2023	15/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	2816	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN FRANCISCO	FANDIÑO PUENTES	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA REALIZANDO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE PROPENDAN POR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA	\$ 1.850.000,00	14/11/2023	15/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	2817	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	RODRIGO	HERNANDEZ CARRILLO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.713.333,33	14/11/2023	15/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	2818	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JAIME ALBERTO	HURTADO SUAREZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.713.333,33	14/11/2023	15/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	2827	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUISA FERNANDA	SANABRIA PARRA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE	\$ 4.316.666,67	14/11/2023	15/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	2831	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	GIOVANNI ENRIQUE	MELO ZAPATA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO EN TRÁNSITO Y VÍAS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ANÁLISIS VIAL EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 7.646.666,67	14/11/2023	15/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	2863	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HUGO ALEXANDER	BALLESTEROS CASTILLO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AFORADOR EN EL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.850.000,00	14/11/2023	14/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	2865	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	RICARDO ANDRES	ZARATE CABEZA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.666.666,67	16/11/2023	18/11/2023	21/12/2023	21/12/2023

Año	Número Contrato	Tipo Contrato	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato	Fecha Liquidación Contrato
2023	2868	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DANIEL ALEJANDRO	MARTINEZ DIAZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE	\$ 3.700.000,00	14/11/2023	14/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	3020	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DEL DERECHO PARA EJERCER LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y/O EXTRAJUDICIAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 7.700.000,00	16/11/2023	19/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	3031	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OCTAVIO ANDRES	SANDOVAL GONZALEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL APOYANDO LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE HIDRÁULICO, SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 6.166.666,67	14/11/2023	14/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	3116	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MATEO	BOHORQUEZ MUÑOZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.850.000,00	16/11/2023	19/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	3117	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIEGO ENRIQUE	GOMEZ VERA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PARA ASESORAR, APOYAR, ACOMPAÑAR, PROYECTAR, SUSTANCIAR Y REVISAR JURÍDICAMENTE LOS TEMAS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSCONTRACTUALES QUE ESTA ADELANTE	\$ 4.950.000,00	16/11/2023	19/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	3148	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SERGIO MAURICIO	CORREA RAMIREZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN REALIZANDO ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE SE ADELANTEN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 7.200.000,00	31/10/2023	04/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	3153	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SILVIA JULIANA	MONSALVE DIAZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO(A) CIVIL PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 2.583.333,33	16/11/2023	21/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	3154	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ROBERT LEANDRO	RODRIGUEZ MORENO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE	\$ 6.133.333,33	31/10/2023	06/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	3245	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN DAVID	ARIZA RODRIGUEZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE	\$ 1.586.666,67	21/11/2023	24/11/2023	21/12/2023	21/12/2023

Año	Número Contrato	Tipo Contrato	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato	Fecha Liquidación Contrato
2023	3256	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUZ STELLA	MARTINEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA APOYAR LA REALIZACION DE ACTIVIDADES INHERENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y LOS PLANES DE MEJORAMIENTO; ASÍ COMO EL REGISTRO DE INFORMACION REQUERIDA EN EL SISTEMA INTEGRAL FINANCIERO Y SIA OBSERVA, EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE ESTA ADELANTE.	\$ 2.400.000,00	21/11/2023	28/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	3262	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ORLANDO	ORTIZ MANTILLA	PRESTAR SERVICIOS COMO TECNOLOGO EN TOPOGRAFIA PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 3.450.000,00	27/11/2023	29/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	3287	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	KEVIN ANDRES	BENITEZ OTERO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE.	\$ 566.666,67	07/12/2023	10/12/2023	19/12/2023	19/12/2023
2023	3292	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANDERSON ERNESTO	BALLESTEROS CARDENAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRONICO EN LOS PROCESOS DE TELEMEDIDA Y TELEGESTION EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – ALUMBRADO PUBLICO	\$ 1.650.000,00	06/12/2023	11/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	3468	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MERLYN YURANY	RODRIGUEZ BUENO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.066.666,67	18/10/2023	28/08/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	3663	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DANIEL	TARAZONA PIMIENTO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	\$ 11.200.000,00	02/10/2023	03/10/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	3668	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	RICARDO	VANEGAS ANAYA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA APOYANDO LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE ELÉCTRICO DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 11.200.000,00	02/10/2023	03/10/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	3669	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LISETH MALAGON	PEREIRA	PRESTAR SERVICIOS DE PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, BRINDANDO APOYO EN LA CORRECTA IMPLEMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA ARCGIS DE LAS OBRAS ADELANTADAS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 7.000.000,00	02/10/2023	03/10/2023	21/12/2023	21/12/2023

Año	Número Contrato	Tipo Contrato	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato	Fecha Liquidación Contrato
2023	3671	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EDGAR BERNARDO	VARGAS DIAZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL APOYANDO LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE HIDRÁULICO, SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 13.000.000,00	04/10/2023	05/10/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	3673	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN BAUTISTA	MEDINA MONTOYA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE	\$ 6.013.333,33	05/10/2023	06/10/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	3676	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN SEBASTIAN	RAMIREZ DIAZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TOPOGRAFO PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 7.900.000,00	06/10/2023	09/10/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	3677	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANGIE JUDITH	SANCHEZ BARAJAS	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE ELÉCTRICO DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 4.760.000,00	06/10/2023	10/10/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	3678	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANDRES FELIPE	MARTINEZ MOSQUERA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	\$ 7.600.000,00	06/10/2023	09/10/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	3689	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN CAMILO	SANMIGUEL ROMERO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	\$ 14.400.000,00	10/10/2023	11/10/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	3691	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DAYANA CRISTINA	ARENAS BAYONA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO NECESARIO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, EN LAS SUPERVISIONES QUE EJERCE.	\$ 5.206.666,67	11/10/2023	12/10/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	3692	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN PABLO	PEÑALOZA LEMUS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFREESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 10.650.000,00	11/10/2023	12/10/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	3712	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SAID HUMBERTO	BAENE CARRASCAL	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TOPOGRAFO PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 7.000.000,00	23/10/2023	24/10/2023	21/12/2023	21/12/2023

Año	Número Contrato	Tipo Contrato	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato	Fecha Liquidación Contrato
2023	3727	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JAVIER	ORTEGA VERA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA ARTICULAR LOS EQUIPOS DE APOYO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	26/10/2023	27/10/2023	25/12/2023	25/12/2023
2023	3733	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUIS FERNANDO	PLATA HERNANDEZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CADENERO DENTRO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 3.173.333,33	30/10/2023	01/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	3734	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DILBER DUVAN	PARRA ESCALANTE	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TOPOGRAFO PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 5.600.000,00	30/10/2023	01/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	3735	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CAROL YURLEI	GRIMALDOS DIAZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CADENERO DENTRO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 3.173.333,33	30/10/2023	01/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	3747	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	NELLY YULIETH	CALDERON GARCIA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO INGENIERO (A) CIVIL, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	\$ 3.666.666,67	07/11/2023	14/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	3768	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARCOS ANDRES	RODRIGUEZ MANTILLA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.866.666,67	15/11/2023	16/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	3777	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE LA INGENIERÍA CIVIL - ESPECIALIDAD GEOTECNIA PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 6.166.666,67	20/11/2023	21/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
2023	3787	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA NATALIA	FORERO RODRIGUEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTA, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.000.000,00	22/11/2023	23/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
