



ALCALDÍA DE  
BUCARAMANGA

# Informe de Gestión

Segundo Trimestre

SECRETARÍA DE  
INFRAESTRUCTURA



[www.bucaramanga.gov.co](http://www.bucaramanga.gov.co)


   Alcaldía de Bucaramanga

## INFORME DE GESTION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

La Secretaría de Infraestructura de Bucaramanga presenta el informe de gestión correspondiente al segundo trimestre del año 2025, comprendido del 01 de abril de 2025 al 30 de junio de 2025, en el cual ha continuado ejecutando y realizando las gestiones pertinentes para el control y avance de las diferentes obras que actualmente se encuentran en ejecución. Este documento tiene como objetivo proporcionar un resumen detallado de las actividades realizadas en el marco de las líneas estratégicas, programas y alineados con las metas del plan de desarrollo municipal para el periodo 2024-2027. Igualmente, el avance de cumplimiento en su ejecución presupuestal.

### INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL

El presupuesto definitivo a 30 de junio de 2025 de la Secretaria de Infraestructura, ascendió a \$ 220.933.527.463,56 y se realizaron apropiaciones y compromisos por valor de \$ 77.060.248.497,68 equivalente al **34,88%** de ejecución.

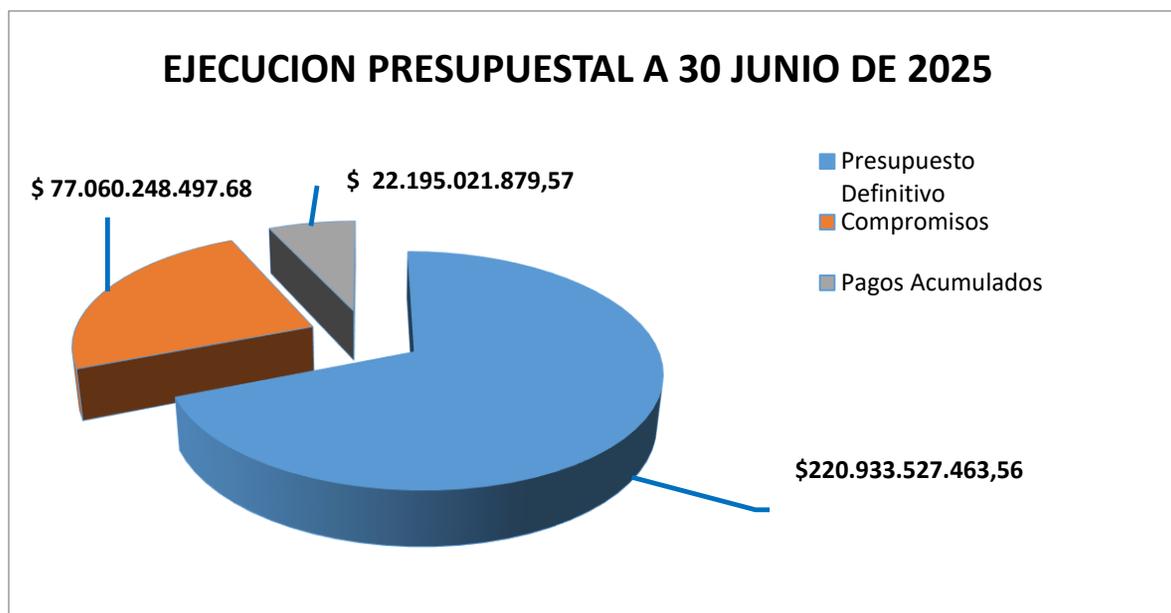

Durante el segundo trimestre de 2025 de acuerdo a las diferentes necesidades se debieron realizar diferentes movimientos presupuestales de créditos y contracreditos, igualmente fueron adicionados unos recursos mediante las siguientes actos administrativos así: RESOLUCION No 4R -202504-00002012 DEL 04 ABRIL 2025, DECRETO 0250 SE LIQUIDA EL ACUERDO 005 DE ABRIL 24 DE 2025 ADICIONA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS, Resolución 4-R-202505-00002487 DEL 02 MAYO 2025, DECRETO 0285 DEL 23 MAYO DEL 2025, RESOLUCION 4R-202505-00003330 DEL 20 MAYO DEL 2025, Resolución N° 4R 202506-00012412 DEL 25 JUN DE 2025, quedando como presupuesto definitivo el valor de \$ 220.933.527.463,56

A continuación, se detalla la inversión por las diferentes líneas estratégicas, sector, programas, metas e indicadores del Plan de Desarrollo:

## 1. LINEA ESTRATEGICA. TERRITORIO SEGURO QUE INTEGRA

**SECTOR:** Cultura

**PROGRAMA:** Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano

**META E INDICADOR DE PRODUCTO:** Brindar 2 servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble de bienes de patrimonio cultural en el municipio de Bucaramanga

Indicador	Meta 2025	Logro 2025	% Avance 2025	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble	1	0	0%	\$ 0	\$ 0	0%

### Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Construcción de obras de primeros auxilios en el bien de interés cultural plaza san mateo del municipio de Bucaramanga	2023680010066	\$ 492.488.281,38	\$ 492.488.281,38

### Descripción de actividades desarrolladas

**Contrato 232 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PROVISIONALES Y DE PROTECCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS DEL BIEN INTERÉS CULTURAL PLAZA SAN MATEO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANAGA, SANTANDER:**

Mediante el Número del proceso SI-SI-SAMC-001-2024 se adelantó la Manifestación de interés de selección por Menor Cuantía para “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PROVISIONALES Y DE PROTECCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS DEL BIEN DE INTERÉS CULTURAL PLAZA SAN MATEO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER” una vez realizado el sorteo fue seleccionado el contratista CONSORCIO CULTURA BGA 2024 bajo la adjudicación del contrato No 232 -2024.

El contrato comenzó mediante el **Acta de Inicio** el 6 de Diciembre del 2024, con una duración inicial de 22 días, debido a escases por parte de los proveedores para los insumos requeridos fue necesario la realización del **Acta de suspensión No.1** el día 26 de diciembre del 2024 por 30 días, que se extendió 38 días adicionales por la **Prórroga de Suspensión No1**, concluyendo la pausa con el **Acta de reinicio** el día 4 de marzo del 2025, dicho tiempo permitió evaluar las nuevas necesidades que surgieron en el proyecto lo que generó una modificación por medio del **Acta de modificación No.1** por el mismo valor inicial del contrato pero con la inclusión de ítems no previstos, que se desarrolló junto con una prórroga el día 6 de Marzo del 2025 sumando 2 meses generando una nueva fecha de terminación para el 7 de Mayo del 2025, así mismo con el avance pertinente. Justificado y evidenciado se realizó el **Acta Parcial No.1**

Con el desarrollo de las actividades planificadas, se suscribió el Acta Parcial No. 1 el 18 de abril de 2025, que da cuenta del avance físico alcanzado hasta esa fecha. Posteriormente, el 5 de mayo de 2025 se elaboró el Acta Parcial No. 2, evidenciando un avance acumulado del 90 % en la ejecución del contrato.

No obstante, el desarrollo de la obra se vio afectado por la presencia de descargas de aguas provenientes de predios colindantes, a través de bajantes y tejas en lámina de zinc que desembocan directamente dentro del área de intervención. Esta situación fue reportada al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) mediante el oficio 2-S-SdIB-202504-00031429 el 29 de abril y motivó la suspensión de actividades a partir del 6 de mayo de 2025 (Acta de Suspensión No. 2), con el fin de preservar la integridad de las obras ejecutadas y dar trámite a la problemática identificada. Cabe señalar que dicha descarga impide la instalación completa de la cubierta en teja de zinc, ya que la fuerza de caída del agua podría generar fracturas en el material. Además, las canaletas y bajantes instaladas en el marco del proyecto de primeros auxilios no están diseñadas para recibir volúmenes adicionales de agua de origen externo, lo cual compromete tanto la funcionalidad como la durabilidad de la solución constructiva implementada.

Este informe abarca el seguimiento realizado entre el 6 de diciembre de 2024 y el 7 de mayo de 2025, periodo durante el cual se consolidó el avance mencionado bajo la supervisión directa de la Secretaría de Infraestructura Municipal, con la consideración que se encuentra actualmente **SUSPENDIDO** con posible fecha de reinicio del 15 de Julio del 2025 dependiendo si se logra superar las causales de suspensión previamente mencionado.

Así mismo, se incluyen registros fotográficos, estados actualizados del contrato con las actividades ejecutadas así con sus respectivas descripciones, proporcionando evidencia visual del desarrollo de las actividades en campo. La información contenida en este documento servirá como base para la consolidación del informe final que será remitido al **Concejo Municipal**.

Valor Inicial:	\$ 492.488.281,38
Valores adicionales:	NA
Valor Total	\$ 492.488.281,38
Plazo Inicial:	VEINTIDOS (22) DIAS
Fecha Inicial:	01 DE OCTUBRE DE 2024
Suspensión 1:	Del 26 de diciembre del 2024 al 04 de marzo del 2025
Reinicio 1:	04 de marzo del 2025
Fecha Final:	15 de Julio dl 2025
Plazo Final:	DOS (2) MESES Y VEINTIDOS (22) DIAS
Estado del Contrato:	En ejecución
Porcentaje de Avance:	90%

INFORMACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO							
<b>Contrato</b>	<b>232</b>		<b>Convenio</b>			<b>N/a</b>	
<b>Fecha de Suscripción:</b>	<b>Día</b>	6	<b>Mes</b>	12	<b>Año</b>	2024	
<b>Fecha de Inicio:</b>	<b>Día</b>	10	<b>Mes</b>	12	<b>Año</b>	2024	
<b>Fecha de terminación</b>	<b>Día</b>	15	<b>Mes</b>	07	<b>Año</b>	2025	
<b>Objeto del contrato</b>	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PROVISIONALES Y DE PROTECCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS DEL BIEN INTERÉS CULTURAL PLAZA SAN MATEO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANAGA, SANTANDER						
<b>Garantía única de cumplimiento</b>	No. 400-47-994000104188						
<b>Código BPIN</b>	<b>2023680010066</b>						
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA							
<b>Razón Social</b>	x	<b>Nombre</b>	CONSORCIO CULTURA BGA 2024				
<b>NIT</b>	x	<b>C.C.</b>	901894936-2				
<b>Integrantes de UT o Consorcio</b> (si aplica)	GEPROING S.A.S.						
	901358138	Nº	% Participación	90%			
	ANDINA HOLDING S.A.S.						
	900704440	Nº	% Participación	10%			
<b>Fecha de Constitución Consorcio</b>	20/11/2024						

<b>Representante Legal</b>	YULIE VANESA VISCAYA
<b>Nº de Identificación C.C. – C. E</b>	1102375579
<b>IDENTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR</b>	
<b>Nombre</b>	JULIO CESAR TORRES CAMARGO (A partir 26 de febrero de 2025)
<b>Cargo</b>	SUPERVISOR
<b>Dependencia</b>	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

<b>MODIFICACIÓN DEL CONTRATO</b>	
Suspensión	VENTISÉIS (26) DE DICIEMBRE DE 2024 - 30 DIAS
Prorroga de suspensión	VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE 2025 - 38 DIAS
Reinicio	CUATRO (04) DE MARZO DE 2025
Adición	(No aplica)
Acta De Modificación No.1	CINCO (05) DE MARZO DE 2025
Acta De Prorroga No. 1	SEIS (06) DE MARZO DE 2025
Acta Parcial No.1	DIECIOCHO (18) DE MARZO DE 2025
Acta Parcial No. 2	CINCO (05) DE MAYO DEL 2025
Acta de Suspensión No. 2	SEIS (06) DE MAYO DEL 2025



*Figura 1- Rehabilitación de impermeabilización mediante sistema BUR de mediacañas, sobre manto asfáltico con el uso de membrana líquida acrílica. Incluye puente de anclaje de impermeabilización existente, limpieza y acondicionamiento de superficie, reparación de dilataciones y zonas deterioradas e instalación completa de impermeabilización*

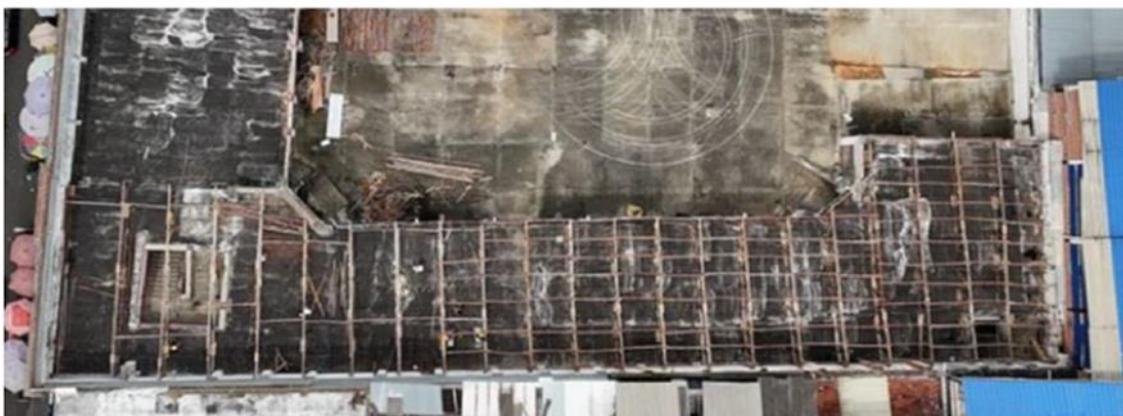

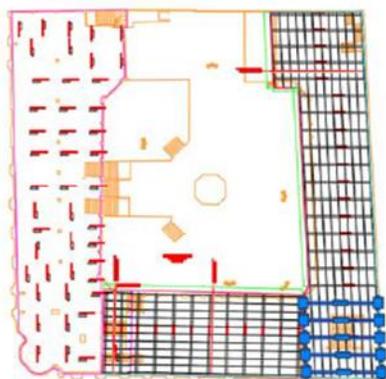


Figura 2- Suministro e instalación de cercha y correas tipo 4 para cubierta en madera rolliza inmunizada  $\phi=10$  cm

## 2. LINEA ESTRATEGICA. TERRITORIO SEGURO QUE PROGRESA

**SECTOR:** Transporte

**PROGRAMA:** Infraestructura red vial regional

**META E INDICADOR DE PRODUCTO:** Realizar 4 Estudios de pre inversión para la red vial regional

Indicador	Meta 2025	Logro 2025	% Avance 2025	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuesta I
Estudios de preinversión para la red vial regional	2	0	0%	\$ 1.500.000.000	\$ 0	0%

### Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA TRONCAL METROPOLITANA NORTE SUR TRAMO 3A INTERSECCIÓN VIAL CARRERA 9NA CON CALLE 45 DEL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	2024680010007	\$1.282.056.389,00	\$1.282.056.389,00

## Descripción de actividades desarrolladas

### **Contrato 140-2024 – ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA TRONCAL METROPOLITANA NORTE SUR TRAMO 3A INTERSECCIÓN VIAL CARRERA 9NA CON CALLE 45 DEL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA:**

Mediante el proceso No SI-SI-CMA-001-2024, se Adelantó el concurso de méritos abiertos del proceso “ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA TRONCAL METROPOLITANA NORTE SUR TRAMO 3A INTERSECCIÓN VIAL CARRERA 9NA CON CALLE 45 DEL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”, una vez realizada la evaluación de las propuestas recibidas, por parte del comité evaluador fue seleccionado el proponente el contratista NOGAALL S.A.S identificado con NIT: NOGAALL S.A.S, bajo la adjudicación de adelanto el contrato No. 140-2024; el cual implica la actualización y desarrollo de los estudios técnicos y diseños definitivos (FASE III) para la construcción del Tramo 3a de la Troncal Norte Sur, específicamente en la intersección de la Carrera 9 con Calle 45 en Bucaramanga. El consultor se encarga de recopilar y analizar soluciones previas y diseños de consultorías anteriores, así como de realizar un análisis exhaustivo de la intersección vial y su área circundante, considerando proyectos viales, de espacio público, renovación urbana, infraestructura de servicios, entre otros aspectos. Este análisis permitirá desarrollar un esquema de posibles intervenciones viales y urbanas integradas en la intersección en estudio, conforme a las especificaciones anexas al proyecto. Los entregables incluirán estudios topográficos, de tránsito, de capacidad y niveles de servicio de la vía, diseño geométrico del trazado vial, estudios de geología, geomorfología y suelos, análisis de estabilidad de taludes, estudios geotécnicos y diseño de pavimentos, estudios hidráulicos y de hidrología, diseño de estructuras, urbanismo y paisajismo, diseño eléctrico, iluminación y telecomunicaciones, evaluación de impacto ambiental, gestión predial, sostenibilidad, estudio técnico BIM, análisis de costos y proceso constructivo, así como un plan de manejo de tráfico.

**Valor del contrato inicial:** \$1.254.631.530,45

**Valor del Adicional 1:** NA

**Valor total:** \$1.254.631.530,45

Avance físico ejecutado 90% - Fecha de finalización, 29 de mayo del 2025 (El proyecto cuenta con acta de terminación, se encuentra en proceso de recibo final y liquidación).

A continuación, se relaciona la trazabilidad de los hitos contractuales del contrato:

El 23/12/2024 se genera suspensión del contrato de Consultoría.

El día 21/02/2025 se da reinicio al contrato de Consultoría No. 140-2024

El día 28/02/2024, se genera modificación tipo prórroga No. 1 por un periodo equivalente a 30 días calendario

El 28/03/2025, se genera modificación tipo suspensión del contrato.

El 28/05/2025 se lleva a cabo el reinicio del contrato de consultoría

El 29/05/2025, se suscribe el acta de terminación entre las partes, describiendo el estado en el cual cierra el contrato al finalizar su tiempo contractual

**Ubicación:** El proyecto se encuentra localizado en la comuna 15 y comuna 5, barrios Chorreras de Don Juan, Alfonso López, García Rovira y campo Hermoso.

**Impacto:** Este importante proyecto tiene un impacto significativo en la seguridad vial del municipio, el cual mediante la mejora en las condiciones de la movilidad en la intersección vial urbana Carrera 9A con calle 45, La Carrera 9A y la Calle 45, disminuirá los tiempos de viajes, reducirá los accidentes y mejorará las condiciones del entorno, el impacto directo corresponde a los barrios Chorreras de Don Juan, Alfonso López, García Rovira y campo Hermoso y teniendo en cuenta que el proyecto es de tipo metropolitano el impacto se amplía al caso urbano de Bucaramanga y su área metropolitana

## Beneficios:

**Sociales:** Mejora significativa de la calidad de vida al reducir el estrés y la frustración de los conductores.

Aumento de la seguridad vial al disminuir el riesgo de accidentes y lesiones.

Mayor inclusión social al facilitar el acceso a servicios esenciales para comunidades marginadas.

**Económicos:** Mejora de la infraestructura vial para aumentar la eficiencia del transporte.

Reducción de los costos operativos para empresas y ciudadanos al disminuir los tiempos de viaje.

Generación de empleo local durante la fase de construcción, contribuyendo al crecimiento económico.

**Ambientales:** El proyecto una vez construido generará los siguientes beneficios:

Reducción de la congestión vehicular y las emisiones de gases contaminantes.

Implementación de medidas de diseño sostenible para minimizar el impacto ambiental.

Promoción de un transporte más eficiente que fomenta el uso de medios menos contaminantes.

A continuación, se relaciona el registro fotográfico de las principales actividades ejecutadas en el presente trimestre:



Figura 1 Socialización final con la comunidad en general



Figura 2 Mesa de trabajo con la SSI y SSA



Figura 3 Socialización comunidad Villas del Romero



Figura 4 Socialización con propietarios de los predios

**META E INDICADOR DE PRODUCTO:** Mejorar 20 Km de Vías urbanas del municipio

Indicador	Meta 2025	Logro 2025	% Avance 2025	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuesta
Vía urbana mejorada	7,37	1,04	14,11%	\$ 21.906.587.548	\$ 21.893.196.371	99,93%

**Descripción del Proyecto**

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Mejoramiento de la malla vial y espacio público enmarcado dentro de la estrategia "plan revitalización del espacio público centro" en el Municipio de Bucaramanga, Santander	202500000016144	\$1.004.295.290,00	\$1.004.295.290,00

**Descripción de actividades desarrolladas**

Dentro de este programa se continúa ejecutando el Contrato No. 163 del 05 de Julio de 2022, cuyo objeto es: MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ENMARCADO DENTRO DE LA ESTRATEGIA "PLAN REVITALIZACION DEL ESPACIO PUBLICO CENTRO" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER.

<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO MALLA INCAL NIT: 901606477-1 EDGAR ALONSO QUESADA OREJARENA
<b>VALOR INICIAL:</b>	\$31.221.573.233,00
<b>ANTICIPO (30%):</b>	\$ 9.366.471.969,90
<b>VALOR ADICIONAL:</b>	\$ 11.900.862.783,12
<b>VALOR ACUMULADO:</b>	\$ 43.122.436.016,12
<b>PLAZO INICIAL:</b>	6 MESES
<b>PRORROGA No. 1:</b>	6 MESES
<b>PRORROGA No. 2:</b>	3 MESES
<b>PRORROGA No. 3:</b>	5 MESES
<b>PRORROGA No. 4:</b>	14 DÍAS
<b>PRORROGA No. 5:</b>	7 DÍAS
<b>PRORROGA No. 6:</b>	5 MESES Y 16 DÍAS
<b>PRORROGA No. 7:</b>	7 MESES
<b>PLAZO TOTAL:</b>	33 MESES Y 7 DÍAS
<b>INTERVENTORÍA:</b>	SOLIUN INGENIERÍA S.A.S. NIT: 901114547-5
<b>FECHA DE INICIO:</b>	30 DE AGOSTO DE 2022
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN 1:</b>	21 DE DICIEMBRE DE 2023
<b>FECHA DE REINICIO 1:</b>	12 DE FEBRERO DE 2024
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN 2:</b>	23 DE DICIEMBRE DE 2024
<b>FECHA DE REINICIO 2:</b>	10 DE MARZO DE 2025
<b>ESTADO DEL CONTRATO:</b>	EN EJECUCIÓN
<b>FECHA TERMINACIÓN FINAL:</b>	14 DE OCTUBRE 2025
<b>PORCENTAJE AVANCE FÍSICO:</b>	83,28 %
<b>AVANCE FINANCIERO:</b>	80,82%
<b>PERIODO INFORME:</b>	2do TRIMESTRE DE 2025 (ABRIL A JUNIO)

**ESTADO DEL CONTRATO:** A la fecha y con la aprobación del contrato adicional se tienen dentro del alcance 24 frentes de obra en total, de los cuales 19 frentes ya se encuentran con acabados en piedra travertino vehicular, pavimento rígido en MR42 y travertino peatonal, con sus respectivas obras complementarias (optimización de redes de acueducto, alcantarillado e instalación e tubería para soterrado de red eléctrica); 5 frentes se encuentran en ejecución con la instalación de tubería eléctrica, redes sanitarias, redes de acueducto, piso en piedra natural sinu beta en senderos peatonales, pavimento rígido en calzada vehicular y demás actividades preliminares.

19 frentes con terminados en piedra natural y calzada vehicular

- Carrera 10 entre calles 37 y 41
- Carrera 10 entre calles 41 y 42
- Carrera 10 entre calles 42 y 43
- Carrera 10 entre calles 43 y 44
- Carrera 11 entre calles 37 y 41
- Carrera 11 entre calles 41 y 42
- Carrera 11 entre calles 42 y 43
- Carrera 11 entre calles 43 y 44
- Calle 37 entre carreras 11 y 12
- Calle 37 entre carreras 12 y 13
- Carrera 12 entre calles 36 y 37
- Carrera 12 entre calles 37 y 41
- Carrera 12 entre calles 41 y 42
- Calle 41 entre carreras 9 y 10
- Calle 41 entre carreras 10 y 11
- Calle 41 entre carreras 11 y 12
- Calle 41 entre carreras 12 y 13
- Calle 42 entre carreras 10 y 11
- Calle 43 entre carreras 10 y 11

5 frentes en intervención con actividades preliminares y ejecución de acabados.

- Calle 42 entre carreras 9 y 10
- Calle 42 entre carreras 11 y 12
- Calle 42 entre carreras 12 y 13
- Carrera 12 entre calles 42 y 43

Carrera 12 entre calles 43 y 44

**Generalidades contractuales en el periodo del presente informe:** los contratos de obra e interventoría estuvieron suspendidos desde el día 23 de diciembre de 2024 hasta el día 10 de marzo de 2025 en el cual se suscribió el acta de reinicio. A la fecha del presente informe, el contrato se encuentra en ejecución.

A continuación, se enuncian las principales actividades ejecutadas en el periodo del presente informe para cada frente de obra que hace parte del alcance actual del contrato.

- **Calle 42 entre carreras 9 y 10:** Se realizaron actividades con la intervención del sendero peatonal del costado norte y costado sur, se realizaron las excavaciones para la instalación de tubería para soterrado de red eléctrica de alumbrado público, baja tensión y redes de comunicaciones, construcción de cajas eléctricas para alumbrado público y baja tensión. Se intervino el segundo tramo de la calle con la fundida de pavimento rígido en concreto sobre la calzada principal y accesos vehiculares de viviendas, se realizaron terminados en piedra sinu veta sobre senderos peatonales y fundida de franja de ajuste, se está realizando la intervención del tramo final en empalme con la carrera 9 con la adecuación de redes eléctricas, de acueducto y sanitaria, instalación de canal de monoblock y excavaciones para construcción de cajas eléctricas incluida una caja de barrajes para red de media tensión.
- **Calle 42 entre carreras 10 y 11:** Se terminó con las actividades de adecuación y conformación de área de sendero peatonal costado sur con la instalación de tubería de acueducto y domiciliarias, terminados en piedra sinu veta de ambos costados,

construcción de cajas de alumbrado público e instalación de postes de luminarias, fundida de franja de ajuste y adecuación de fachadas en ambos costados. Se intervino el segundo tramo de la calle con la fundida de pavimento rígido en concreto sobre la calzada principal y accesos vehiculares de viviendas. A la fecha esta calle se habilitó para tráfico vehicular, queda pendiente realizar la intervención del tramo de la intersección de la calle 42 con carrera 10 obras que se iniciaran en el mes de julio del presente año.

- **Calle 42 entre carreras 11 y 12:** Se realizaron las obras de fundida de franjas de ajuste en ambos costados, terminados en piedra sinu beta, adecuación con bordillo de contenedores de raíces, construcción tapas de cajas de alumbrado público, estas actividades se realizaron en la media cuadra que está en intervención desde el año pasado. Adicional se realizó la intervención de la otra media cuadra con actividades sobre sendero peatonal del costado norte, donde se realizó excavación e instalación de sardinel prefabricado, instalación de bolardos, instalación tubería de alumbrado público, instalación de postes para luminarias, instalación de piso peatonal en piedra sinu beta y fundida en concreto de franja de ajuste contra fachada. Se tiene programado iniciar la intervención del segundo tramo con calzada vehicular y sendero peatonal costado sur en el mes de julio del presente año.
- **Calle 42 entre carreras 12 y 13:** se realizaron actividades de fundida de franja de ajuste contra paramento en ambos costados, adecuación de contenedor de raíces, instalación de piedra natural en tramo peatonal. Adecuación y resane de fachadas, adecuación cajas de telecomunicaciones existentes, instalación de postes para luminarias. Estas actividades se realizaron en la media cuadra que está en intervención desde el año pasado. Se tiene programado iniciar la intervención del segundo tramo con calzada vehicular y senderos peatonales de ambos costados en el mes de julio del presente año.
- **Carrera 12 entre calles 42 y 43:** se iniciaron actividades de intervención en la primera mitad de la calle, comenzando con la reposición de la tubería sanitaria red principal en 10 pulgadas y acometidas domiciliarias, se realizó la instalación de tubería para redes eléctricas de baja y media tensión, alumbrado público en ambos costados y redes de telecomunicaciones, reposición de tubería red de acueducto y domiciliarias, instalación de sardineles y bolardos en ambos costados, construcción de pozo de inspección, adecuación de sendero peatonal costado oriental con la instalación de piedra sinu veta, fundida en pavimento rígido de bahía de carga frente a compresores y acceso vehicular. En la calzada se realizó instalación y compactación de base granular.
- **Carrera 12 entre calles 43 y 44:** Se iniciaron actividades de intervención en la primera mitad de la calle, comenzando con la reposición de la tubería sanitaria red principal en 20 pulgadas y acometidas domiciliarias, se realizó la instalación de tubería para redes eléctricas de baja y media tensión, alumbrado público en ambos costados y redes de telecomunicaciones, reposición de tubería red de acueducto y domiciliarias, instalación de sardineles y bolardos en ambos costados, instalación de canal de monoblock para desagüe de aguas, adecuación de sendero peatonal en ambos costados con la instalación de piedra sinu veta, fundida en pavimento rígido de accesos vehiculares. En la calzada se realizó fundida en concreto MR42 losas de pavimento rígido en media calle. Adicional se realizó la intervención de la otra media cuadra con actividades sobre sendero peatonal del costado oriental, donde se realizó excavación e instalación de sardinel prefabricado, instalación de bolardos, instalación tubería de alumbrado público, instalación de piso peatonal en piedra sinu beta y fundida en concreto de franja de ajuste contra fachada.
- **Otros frentes:** Carrera 10 entre calles 41 y 43 se realizaron actividades de instalación de cableado para red de alumbrado público.  
Se realizo una jornada de limpieza de canales de monoblock en todas las calles intervenidas, abarcando la cra 11 entre 37 y 44, cra 12 entre 36 y 42, calle 41 entre 9 y 13 y carrera 10 entre 37 y 44.  
Se realizaron actividades de instalación de cable para usuarios no regulados de media tensión (Procuraduría, edificio centro empresarial García Rovira y migración) y alistamiento de puntas para conexión aprovechando el corte de energía realizado por la ESSA.

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

### CALLE 42 ENTRE CARRERAS 9 y 10



*Excavaciones e instalación de tubería para redes eléctricas de alumbrado público y baja tensión*

*Fundida de losas de concreto MR42 en calzada vehicular*

### CALLE 42 ENTRE CARRERAS 10 y 11



*Instalación de monoblock transversal*

*Fundida de losa de concreto acceso vehicular costado sur*

### CALLE 42 ENTRE CARRERAS 11 y 12



*Adecuación de tapas en cajas eléctricas de AP costado sur*

### CALLE 42 ENTRE CARRERAS 12 y 13



Adecuación de bordillo para contenedor

Adecuación de caja para telemáticos

### CARRERA 12 ENTRE CALLES 42 Y 43



instalación tubería de 10" red de alcantarillado

Replanteo área de carga y descargue coimpresores

### CARRERA 12 ENTRE CALLES 43 Y 44



instalación de piso peatonal en sinu beta

Fundida de concreto MR42 losas calzada vehicular primer tramo

## OTROS FRENTES



20/06/2025, 11:11:50 a.m.  
Calle 41 10-1-10-9  
Bucaramanga  
Interventor

*Instalación de cableado en tubería para red de alumbrado público costado occidental Cra 10 entre calles 41 y 42*

24 de mayo de 2025 10:08:02  
11:03:02  
Interventoría 3011  
Plan Centro Bucaramanga

*limpieza y mantenimiento de canales de monoblock calle 41 entre carreras 9 y 11*



22 de junio de 2025 10:02:32 a. m.  
Interventoría Solución Ing  
Plan Centro Bucaramanga

*Instalación de cableado red de media tensión de usuarios no regulados cra 11 con calle 41*

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER	2024680010051	\$ 20,888,901,107.33	\$ 20,888,901,107.33

### Descripción de actividades desarrolladas

**CONTRATO DE OBRA (SI-SI-LP-002-2024) ADJUDICADO: CONSORCIO GENPRO GROUP “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER”.**

Valor del contrato:	\$ 19.362.317.851,33
Valor Anticipo:	N/A
Plazo inicial:	A monto agotable o hasta el 31 de diciembre de 2025
Fecha de inicio:	23/05/2025
Fecha de terminación:	Vigencia 2025
Estado del Contrato:	En ejecución
Porcentaje avance:	5%

**Ubicación:** El proyecto se desarrollará en todas las comunas del Municipio de Bucaramanga.

**Impacto:** Comprende la ejecución de trabajos de mejoramiento y mantenimiento en las vías urbanas de Bucaramanga, mediante obras de bacheo y rehabilitación, en pavimento rígido o flexible buscando así la realizar actividades que mejoran la circulación vial y disminuyen el riesgo de accidentes.

Igualmente, la construcción de reductores de velocidad en diferentes puntos críticos de la ciudad avalados por la Dirección de tránsito de Bucaramanga – DTB, mediante la resolución 328 del 18 de junio de 2024.

- 1.COMUNA 1 - NORTE
- 2.COMUNA 2 - NORORIENTAL
- 3.COMUNA 3 - SAN FRANCISCO
- 4.COMUNA 4 - OCCIDENTAL
- 5.COMUNA 5 - GARCÍA ROVIRA
- 6.COMUNA 6 - LA CORNCORDIA
- 7.COMUNA 7 - CIUDADELA
- 8.COMUNA 8 - SUR OCCIDENTE
- 9.COMUNA 9 - LA PEDREGOSA
- 10.COMUNA 10 - PROVENZA
- 11.COMUNA 11 - SUR
- 12.COMUNA 12 - CABECERA DEL LLANO
- 13.COMUNA 13 - ORIENTAL
- 14.COMUNA 14 - MORRORICO
- 15.COMUNA 15 - CENTRO
- 15.COMUNA 16 - LAGOS DEL CACIQUE
- 15.COMUNA 17 - MUTIS

Este proyecto contribuye al mejoramiento del flujo vehicular en la ciudad, y la disminución de accidentes por ende el mejoramiento en los índices de seguridad vial.

**Beneficios para la Comunidad:**

- **Mejoramiento en el flujo vehicular:** Al contar con vías en buen estado mejora la circulación de los vehículos y los tiempos de circulación.
- **Menor Impacto a daños:** Se disminuye el riesgo de accidentes y daños en el parte automotor y sus componentes mecánicos.
- **Aumento de la Seguridad vial:** Se tiende a baja en la tasa de mortalidad por accidentes y el mejoramiento de las condiciones de los actores viales.



**Calle 64 entre carrera 6 y 5 – Ciudad Bolívar**



**Carrera 17B entre calle 52 y 53 – La Concordia**

Se han realizado trabajos de mantenimiento y rehabilitación de la malla vial en diferentes comunas y barrios de la ciudad enfocados en el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo – Vía urbana mejorada, con un avance de 1.04 km hasta el momento.

- Concordia – calle 53 entre carrera 15 y 17
- Concordia – calle 52 entre carrera 17 y 17b
- Concordia – calle 17b entre calle 52 y 54
- Concordia – calle 54 entre carrera 15 y 17
- Ciudad Bolívar – Avenida guayacanes entre transversal metropolitana y carrera 1
- Ciudad Bolívar – Calle 64c entre carrera 1 y carrera 6ª
- Ciudad Bolívar – Calle 64 entre carrera 6ª y carrera 5
- Ciudad Bolívar – Carrera 6ª entre calle 63 y 64
- Naranjos – Carrera 3 entre calles 55 y 63ª
- Ciudadela Real de minas - Diagonal 13 entre calle 60 y avenida Samanes
- Ciudadela Real de minas – Carrera 7 sector plaza mayor
- Centro - Carrera 15 entre avenida rosita y carrera 16ª
- Delicias Altas – Calle 105 entre transversal metropolitana y carrera 15d

**META E INDICADOR DE PRODUCTO:** Realizar el mantenimiento periódico o rutinario a 110 Km de Vías terciarias de la malla vial rural de la ciudad por año.

Indicador	Meta 2025	Logro 2025	% Avance 2025	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuesta
Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario km	110	52,5	48%	\$ 3.000.000.000	\$ 3.000.000.000	100%

### Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Mantenimiento periódico de la red vial rural del Municipio de Bucaramanga Santander	2024680010043	\$ 3.000.000.000	\$ 4.620.379.446

### Descripción de actividades desarrolladas

Dentro de este proyecto la secretaria realizo contratacion mediante el contrato No. 114 del 16 de junio de 2025, cuyo objeto es: ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, VOLQUETAS Y VEHÍCULOS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA RED VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.

Valor Inicial: \$ 2.818.077.627,00  
 Plazo: Hasta el 30 de diciembre de 2025 o hasta agotar el monto.  
 Fecha inicio: 24 de junio de 2025  
 Estado del Contrato: En ejecucion  
 Avance: 1%



Corregimiento 1 vereda el Pablon



Corregimiento 2 Vereda Magueyes



Corregimiento 3 Vereda Retiro chiquito

**RESUMEN DE INTERVENCIÓN EN ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DESPEJE DE VIAS POR OBSTRUCCIÓN, POR LLUVIAS SOBRE LAS VÍAS RURALES Y ZONAS URBANAS AFECTADAS. (ABRIL - JUNIO DE 2025) CON MAQUINARIA PROPIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**

FECHA	Vereda-Barrio	Tramo Intervenido	Corregimiento Urbano	Horas Máquina Invertida	CANTIDAD m3	Km Intervendidos	Actividades Realizadas
<b>Abril 2025</b>							
abril 2 2025	Santa Rita - ramal Angelinos Bosconia	Ramal IE Santa Rita - Angelinos Bosconia Tanques amb Placa Huellas Angelinos	C1	5	25	0,2	Despeje de Derrumbes múltiples, cargue de material que obstruye el tránsito sobre la vía, se habilita paso para circulación vehicular de la comunidad
abril 3 2025	Vijagual Entrada a La Vega - Vía Al Aburrido	Entrada a la Vega - Vía al Aburrido	C1	1,5	63	0,3	Despeje de Carril de la vía obstruida por deslizamiento de talud, cargue de material
abril 4 2025	San Pedro Bajo	Vía Ye La Vega - San Pedro bajo	C1	4,7	35	0,2	Cargue y Despeje de Derrumbes en Puntos Críticos que obstruyen la vía en Placa Huella
abril 7 2025	San Pedro Bajo	Vía Ye La Vega - San Pedro bajo	C1	8,1	21	0,15	Cargue y Despeje de Derrumbes en Puntos Críticos que obstruyen la vía en Placa Huella
abril 8 2025	San Pedro Bajo - Ramal Miramar	San Pedro Bajo - Ramal Miramar	C1	2,6	18	0,25	Despeje de Derrumbes en puntos críticos por deslizamiento y escorrentías de lluvias, excavación de talud con criticidad por pérdida de banca, se habilita paso para circulación vehicular de la comunidad

<b>abril 9 2025</b>	San Cayetano - Vijagual	Ramal IE San Cayetano - IE Vijagual	C1	6,4	90	0,3	Despeje de derrumbes sobre la vía, relleno de cárcavas, cargue de material sobrante, transporte de relleno para replanteo y nivelación
<b>abril 10 2025</b>	San Cayetano - Vijagual	Ramal IE San Cayetano - IE Vijagual	C1	3,6	50	0,2	
<b>abril 11 2025</b>	San Cayetano - Vijagual	Ramal IE San Cayetano - IE Vijagual	C1	3,2	50	0,2	
<b>abril 11 2025</b>	Café Madrid	Lote Café Madrid	Urbano	3	0	0	Mantenimiento Preventivo Retroexcavadora Case 570ST
<b>abril 12 2025</b>	Café Madrid	Lote Café Madrid	Urbano	5,9	140	0	Movimiento y acopio de material y escombros Lote contiguo a Ludoteca Estación Café Madrid
<b>abril 14 2025</b>	Café Madrid	Lote Café Madrid	Urbano	0,1	0	0	Mantenimiento Preventivo aceites y Filtros Minicargador Case SR175B
<b>abril 15 2025</b>	Café Madrid	Lote Café Madrid	Urbano	4,3	175	0	Movimiento y acopio de material y escombros Lote contiguo a Centro Vive Digital Estación Café Madrid
<b>abril 22 2025</b>	Café Madrid	Lote Café Madrid	Urbano	4,4	7	0	Cargue y transporte a disposición en Carrasco Municipal de escombros
<b>abril 22 2025</b>	Parque Mesón de Los Búcaros	Parque Mesón de Los Búcaros	Urbano	0	7	0	Cargue y transporte a disposición en Carrasco Municipal de material vegetal
<b>abril 23 2025</b>	Café Madrid	Lote Café Madrid	Urbano	4,8	27	0	Movimiento y acopio de material y escombros Lote contiguo a parqueadero Estación Café Madrid, cargue de 7m3 y transporte a disposición en Carrasco Municipal de escombros
<b>abril 23 2025</b>	Angelinos Santa Rita	Travesía Yee Santa Rita Yee San Cayetano	C1	2,1	21	0,3	Cargue material recebo en Angelinos, Despeje de derrumbes en Tramo Travesía Sta. Rita San Cayetano, habilitado paso a Transporte Escolar
<b>abril 24 2025</b>	Vijagual Entrada a La Vega - Vía Al Aburrido	Vijagual Entrada a La Vega - Vía Al Aburrido	C1	0	0	0	Mantenimiento y reemplazo de Filtros de combustible Retroexcavadora case 570ST
<b>abril 25 2025</b>	San Cayetano - San Pedro	Travesía San Cayetano - San Pedro	C1	2,9	7	0,4	Despeje de derrumbes y relleno de cárcavas en Tramo Travesía Yee San Cayetano Yee San Pedro, vía habilitada paso a Transporte Escolar

<b>abril 28 2025</b>	Vijagual Entrada a La Vega - Via Al Aburrido	Vijagual Entrada a La Vega - Via Al Aburrido	C1	0	0	0	Mantenimiento y encendido Retroexcavadora case 570ST
<b>abril 29 2025</b>	San Cayetano - San Pedro	Travesía San Cayetano - San Pedro	C1	2,5	44	0,4	Despeje de derrumbes y relleno de cárcavas en Tramo Travesía Ye San Cayetano Ye San Pedro, vía habilitada paso a Transporte Escolar
<b>abril 30 2025</b>	San Pedro bajo	Ye San Pedro Bajo - IE San Pedro	C1	1,8	0	0,2	Despeje de derrumbes y relleno de cárcavas en Tramo Ye San Pedro Bajo - IE San Pedro Bajo, vía habilitada paso a Transporte Escolar.
				0			
				<b>66,9</b>	<b>780</b>	<b>3,1</b>	
				<b>TOTAL HORAS DE INTERVENCIÓN</b>	<b>TOTAL m3</b>	<b>TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS</b>	



FECHA	Vereda-Barrio	Tramo Intervenido	Corregimiento Urbano	Horas Máquina Invertida	CANTIDAD m3	Km Intervenido	Actividades Realizadas
<b>Mayo de 2025</b>							
<b>mayo 02 2025</b>	San Pedro Bajo	IE San Pedro Bajo - Ye San Pedro Travesía	C1	2,5	28	0,7	Despeje de derrumbes, cargue y extendido de material, relleno de cárcavas
<b>mayo 03 2025</b>	San Pedro - Travesías - Ye Capilla Alta - Magueyes	San Pedro Bajo Travesía San Cayetano, Sta. Rita, Capilla Alta - Magueyes	C1 -C2	9,6	70	1,5	Retiro de material de derrumbe (19) y árboles fracturados, en los tramos Travesía san Cayetano Santa Rita, IE Santa Rita, Ye Capilla Alta Zona KZ Las Marías, Vía a Maqueyes Sector la Gallera y Ye Ramal Buena Vista.
<b>mayo 04 2025</b>	Ye Capilla Alta - Magueyes	Capilla Alta - Magueyes	C2	5	28	0,5	Retiro de material de derrumbe, en los tramos Ye Capilla Alta Zona KZ Las Marías, Vía a Maqueyes Sector la Gallera y Ye Ramal Buena Vista.
<b>mayo 05 2025</b>	Ye Capilla Alta - Magueyes	Capilla Alta - Magueyes	C2	4	21	0,3	Retiro de material de derrumbe, en los sectores Capilla Alta Zona KZ Las Marías, Vía a Maqueyes Sector la Gallera
<b>mayo 06 2026</b>	Yee Capilla Alta - Magueyes	Capilla Alta - Magueyes	C2	5,1	28	0,3	Retiro de material de derrumbe, en los sectores de los ramales de Capilla Alta Zona KZ Las Marías, Vía a Maqueyes
<b>mayo 06 2027</b>	Ye Capilla Alta - Capilla Baja	Capilla Alta - Capilla Baja	C2	4,9	21	0,1	Retiro de material de derrumbe, en la Vía Principal de Capilla Alta Capilla Baja
<b>Mayo 08 2025</b>	Capilla Alta	Ramal José Caballero	C2	8	56	0,4	Retiro de material de derrumbe, habilitado paso en quebrada y despeje de (8) derrumbes
<b>Mayo 09 2026</b>	Capilla Alta	Ramal José Caballero	C2	2	18	0,5	Retiro de material de derrumbe, despeje de derrumbe en la Ramal José Caballero y replanteo de puntos críticos
<b>Mayo 09 2027</b>	Capilla Alta - Magueyes	Ramal Magueyes IE - Conexión Vía a Matanza	C2	2,4	7	0,1	Retiro de material de derrumbe, despeje de derrumbe en la Ramal Magueyes IE - Conexión Vía a

							Matanza de puntos críticos
mayo 14 2025	Magueyes	Ramal Magueyes IE - Conexión Vía a Matanza	C2	1,6	0	0,8	Despeje de derrumbe en la Ramal Magueyes IE - Conexión Vía a Matanza de puntos críticos, relleno de cárcavas y replanteo de Vía.
mayo 15 2026	Magueyes	Ramal Magueyes IE - Conexión Vía a Matanza	C2	3,8	35	2	Despeje de derrumbes en la Ramal Magueyes IE - Conexión Vía a Matanza de puntos críticos, relleno de cárcavas y replanteo de Vía, se habilita paso sobre derrumbe crítico.
mayo 20 2025	Rosa Blanca Vía a Bucaramanga - Matanza	Rosa Blanca Vía a Bucaramanga - Matanza	C2 - Urbano	4,9	56	0,5	Despeje de derrumbes en Vía Bucaramanga a Matanza de puntos críticos, relleno de cárcavas y replanteo de Vía, se habilita paso sobre derrumbe crítico.
mayo 22 2025	Recrear Norte	Recrear Norte	Urbano	0	14	0	Trasporte de material vegetal Parque Recrear Norte – El Carrasco Municipal
mayo 26 2025	Travesía Santa Rita San Cayetano	Santa Rita San Cayetano	C1	9,2	62	0,3	Despeje de derrumbe crítico se habilita paso parcialmente luego de atacar el derrumbe por los dos costados
mayo 29 2025	San Cayetano San Pedro	Travesía San Cayetano San Pedro	C1	6,2	42	0,6	Despeje de derrumbes, cargue y extendido de material sobre puntos críticos, relleno de charcos y cárcavas
				<b>69,2</b>	<b>486</b>	<b>8,6</b>	
				<b>TOTAL HORAS DE INTERVENCIÓN</b>	<b>TOTAL m3</b>	<b>TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS</b>	




FECHA	Vereda-Barrio	Tramo Intervenido	Corregimiento - Urbano	Horas Máquina Invertida	CANTIDAD m3	Km Intervenido	Actividades Realizadas
<b>Junio 2025</b>							
junio 04 2025	Capilla Alta - Magueyes	Ramal Magueyes IE - Conexión Vía a Matanza	C2	3	28	0,7	Despeje de derrumbes, cargue y extendido de material, relleno de cárcavas.
junio 05 2025	Travesía San Cayetano-Santa Rita	San Cayetano-Santa Rita	C1	2,7	21	1	Replanteo y se hacen cunetas de desagüe.
junio 06 2025	Capilla Alta - Magueyes	Ramal Magueyes IE - Conexión Vía a Matanza	C2	2	21	0,5	Despeje de derrumbes, cargue y extendido de material, relleno de cárcavas.
junio 12 2026	Capilla Alta - Magueyes	Ramal Magueyes IE - Conexión Vía a Matanza	C2	3,6	35	0,9	Despeje de derrumbes, cargue y extendido de material, relleno de cárcavas.

<b>junio 13 2025</b>	Travesía San Santa Rita-Magueyes	Santa Rita - Magueyes	C2	6,6	49	1,5	Despeje de derrumbes, cargue y extendido de material, relleno de cárcavas y drenaje de Charcos, vía santa Rita. Ramal Magueyes IE - Conexión Vía a Matanza de puntos críticos, relleno de cárcavas y replanteo de Vía.
<b>junio 16 2025</b>	Capilla Alta - Magueyes	Ramal Magueyes IE - Conexión Vía a Matanza	C2	4,8	21	0,5	Despeje de derrumbes, cargue y extendido de material, relleno de cárcavas.
<b>junio 17 2025</b>	Capilla Alta - Magueyes	Ramal Magueyes IE - Conexión Vía a Matanza	C2	2,9	14	0,4	Despeje de derrumbes, cargue y extendido de material, relleno de cárcavas.
<b>junio 17 2025</b>	Capilla Alta - Magueyes	Ramal Magueyes IE - Conexión Vía a Matanza	C2	3,7	28	0,4	Despeje de derrumbes, cargue y extendido de material, relleno de cárcavas.
<b>junio 18 2025</b>	Capilla Alta - Magueyes	Ramal Magueyes IE - Conexión Vía a Matanza	C2	4	35	0,6	Despeje de derrumbes, cargue y extendido de material, relleno de cárcavas, replanteo parte superior.
<b>junio 19 2025</b>	Regadero Norte	Regadero Norte	urbano	0	14	0	Trasporte de material de escombros Regaderos Norte - Carrasco Municipal
<b>junio 20 2025</b>	Capilla Alta - Magueyes	Ramal Magueyes IE - Conexión Vía a Matanza	C2	1,7	14	0,3	Despeje de derrumbes, cargue y extendido de material, relleno de cárcavas, replanteo parte superior.
<b>junio 24 2025</b>	Angelino - Santa Rita	santa Rita-Angelinos	urbano	0	0	0	Acompañamiento para traslado de motoniveladora komasut GD535-5 A instalaciones del taller de mantenimiento de consorcio BGA 2025.
<b>Junio 26 2025</b>	Gaitán	Taller de mantenimiento Kazu	Urbano	0	0	0	Prueba de Ruta Volqueta 868 y tecnico mecánico en las instalaciones de transito de Bucaramanga.

Junio 26 2026	Capilla Alta - Magueyes	Ramal Magueyes IE - Conexión Vía a Matanza	C2	0	0	0	Reposición del balde de mini cargador case 635, cambio balde y cuchilla nueva.
Junio 27 2027	Capilla Alta	Capilla Alta-Capilla Baja	C2	4,8	20	0,8	Despeje de derrumbes, cargue y extendido de material sobre puntos críticos, relleno de charcos y cárcavas
				39,8	300	7,6	
				<b>TOTAL HORAS DE INTERVENCIÓN</b>	<b>TOTAL m3</b>	<b>TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS</b>	



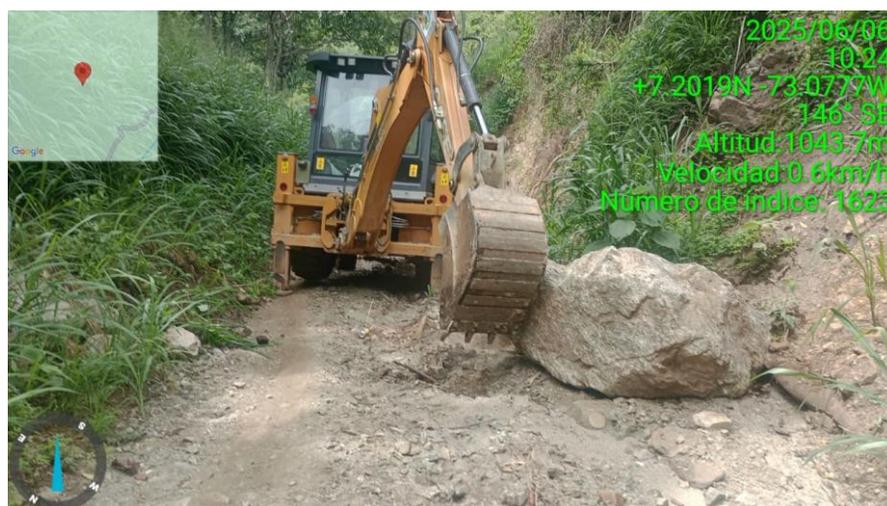

### MAQUINARIA AMARILLA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

2025	Horas Máquina Invertidas	CANTIDAD m3	Km Intervencionados	Observaciones
ABRIL	66,9	780	3,1	MAQUINARIA MUNICIPIO
MAYO	69,2	486	8,6	MAQUINARIA MUNICIPIO
JUNIO	39,8	300	7,6	MAQUINARIA MUNICIPIO
<b>TOTAL</b>	<b>175.9</b>	<b>1566</b>	<b>19.3</b>	<b>MAQUINARIA MUNICIPIO</b>
	<b>Horas Máquina</b>	<b>m3</b>	<b>km</b>	

**META E INDICADOR DE PRODUCTO:** Construir 5.000 metros lineales de placa huella en la zona rural

Indicador	Meta 2025	Logro 2025	% Avance 2025	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuesta I
Placa huella construida	3.000	200	7%	\$ 9.522.592.280	\$ 2.050.000.727	21,53%

### Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES A TRAVES DE PLACA HUELLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	2024680016253	\$ 9.522.592.280	\$ 9.522.592.280

### Descripción de actividades desarrolladas

**Contrato 068 del 09 de mayo de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS:** Mediante el proceso SI-SI-CDCS-001-2025 con el objetivo de “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **SAN CAYETANO Y SANTA RITA**, DEL CORREGIMIENTO UNO (1) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER”

**Valor del contrato:** \$410.000.727,00

**Valor del Anticipo:** N/A

**Plazo inicial:** 4 meses

**Fecha de Inicio:** 20 de mayo de 2025

**Fecha de terminación:** 19 de septiembre de 2025

**Estado del contrato:** Finalizada la etapa de alistamiento, iniciando la etapa de ejecución

**Porcentaje Avance físico ejecutado:** 10%

**Ubicación:** El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda San Cayetano, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 1 del municipio Bucaramanga.

**Impacto:** Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de la vereda San Cayetano y veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.



*Placa Huella en la Vereda San Cayetano y Santa Rita*

**Contrato 070 del 09 de mayo de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS:** Mediante el proceso SI-SI-CDCS-004-2025 con el objetivo de “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **LOS ANGELINOS SECTOR LA CEMENTO** DEL CORREGIMIENTO UNO (1), DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER”

**Valor del contrato:** \$410.000.000,00

**Valor del Anticipo:** N/A

**Plazo inicial:** 4 meses

**Fecha de Inicio:** 20 de mayo de 2025

**Fecha de terminación:** 19 de septiembre de 2025


**Estado del contrato:** Finalizada la etapa de alistamiento, iniciando la etapa de ejecución

**Porcentaje Avance físico ejecutado:** 0%

**Ubicación:** El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Los Angelinos Sector La Cemento, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 1 del municipio Bucaramanga.

**Impacto:** Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de la vereda Los Angelinos Sector La Cemento y veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.

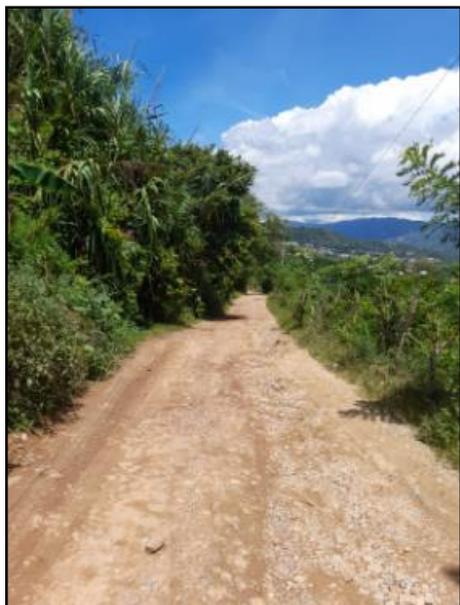

*Placa Huella en la Vereda Los Angelinos Sector La Cemento*

**Contrato 071 del 09 de mayo de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS:** Mediante el proceso SI-SI-CDCS-002-2025 con el objetivo de “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA BARBARA SECTOR BAJO LA UDES SAN JOAQUÍN, DEL CORREGIMIENTO TRES (3) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias a través de la construcción de Placa Huellas y Alcantarillas en el Sector Rural del Municipio de Bucaramanga, Santander”

**Valor del convenio:** \$415.110000,00

**Valor del Anticipo / Único desembolso:** \$410.000.000,00

**Plazo inicial:** Cuatro (04) meses.

**Plazo Prórroga:** N/A

**Plazo Total:** Cuatro (04) meses.

**Fecha de Inicio:** 20 de mayo de 2025

**Fecha de terminación:** 19 de septiembre de 2025

**Estado del contrato:** En ejecución.

**Porcentaje Avance físico ejecutado:** 10%

**Ubicación:** El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Santa Barbara, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 3 del municipio Bucaramanga.

**Impacto:** Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de la vereda Capilla Baja y veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.



*Placa Huella en la Vereda Santa Barbara – Corregimiento 3*

**Contrato 072 del 09 de mayo de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS:** Mediante el proceso SI-SI-CDCS-003-2025 con el objetivo de “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA CAPILLA DEL CORREGIMIENTO DOS (2) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias A TRAVÉS DE LA”

**Valor del convenio:** \$415.110.000,00

**Valor del Anticipo / Único desembolso:** \$410.000.000,00

**Plazo inicial:** Cuatro (04) meses.

**Plazo Prórroga:** N/A

**Plazo Total:** Cuatro (04) meses.

**Fecha de Inicio:** 20 de mayo de 2025

**Fecha de terminación:** 19 de septiembre de 2025


**Estado del contrato:** En ejecución.

**Porcentaje Avance físico ejecutado:** 10%

**Ubicación:** El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda La Capilla, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 2 del municipio Bucaramanga.

**Impacto:** Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de la vereda Capilla Baja y veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.

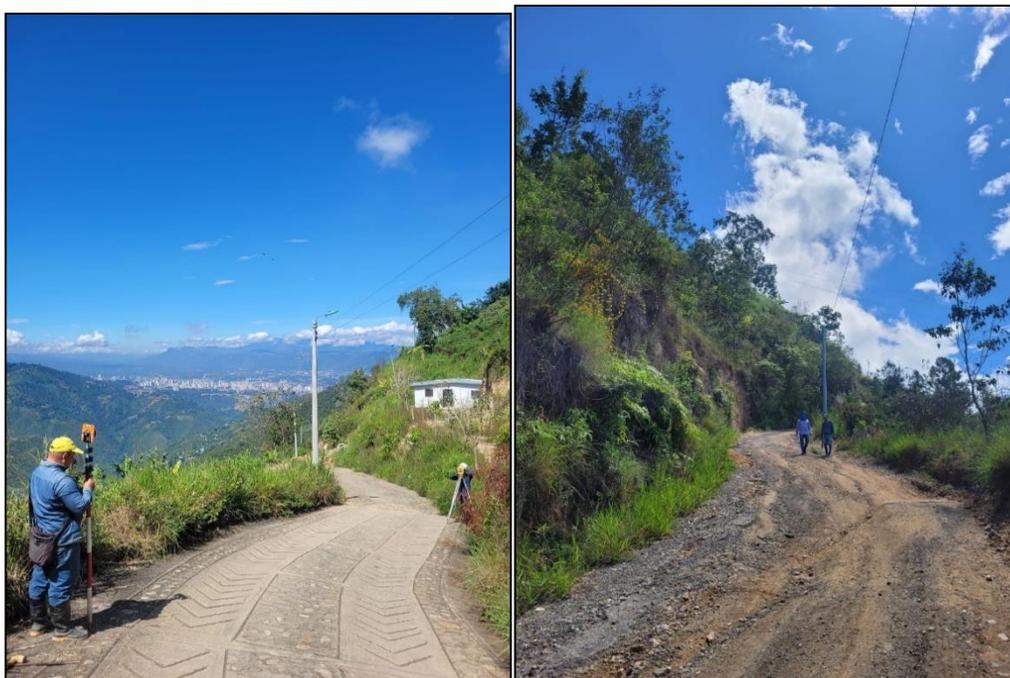

*Placa Huella en la Vereda La Capilla*

**Contrato 069 del 26 de mayo de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS:** Mediante el proceso SI-SI-CDCS-005-2025 con el objetivo de “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONSERRATE Y RETIRO GRANDE DEL CORREGIMIENTO DOS (2) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS”

**Valor del convenio:** \$415.110.000,00

**Valor del Anticipo / Único desembolso:** \$410.000.000,00

**Plazo inicial:** Cuatro (04) meses.

**Plazo Prórroga:** N/A

**Plazo Total:** Cuatro (04) meses.

**Fecha de Inicio:** 26 de mayo de 2025

**Fecha de terminación:** 25 de septiembre de 2025

**Estado del contrato:** En ejecución.

**Porcentaje Avance físico ejecutado:** 10%

**Ubicación:** El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Monserrate, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 2 del municipio Bucaramanga.

**Impacto:** Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de la vereda Monserrate y veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.



*Placa Huella en la Vereda Monserrate*

**SECTOR:** Vivienda Ciudad y Territorio

**PROGRAMA:** Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico

**META E INDICADOR DE PRODUCTO:** Beneficiar a 289.645 usuarios con subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en los estratos 1, 2 y 3.

Indicador	Meta 2025	Logro 2025	% Avance 2025	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuesta I
Usuarios beneficiados con subsidios al consumo	289.645	289.645	100%	\$ 11.341.999.592	\$ 4.325.866.794	38,14%

### Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Subsidios a los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a la población de estratos 1, 2 y 3 del Municipio de Bucaramanga.	2024680010048	\$ 11.341.999.592	\$ 37.914.658.856

### Descripción de actividades desarrolladas

Durante el segundo trimestre de la presente vigencia la Secretaria de Infraestructura continúa realizando el pago de los subsidios a las diferentes empresas de servicios públicos, facturación enviada por la Unidad Técnica de Servicios Públicos detalle acumulado por empresas así:

EMPRESA	VALOR PAGADO
ACUEDUCTO	\$ 1.604.098.521
EMPAS	\$ 493.307.919
EMAB	\$ 2.059.869.916
LIMPIEZA URBANA	\$ 142.565.640
VEOLIA	\$ 26.024.798
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 4.325.866.794</b>

**META E INDICADOR DE PRODUCTO:** Transportar y entregar 18.000 metros cúbicos de Agua potable en carrotaques para garantizar el mínimo vital de agua en zonas sin cobertura del municipio.

Indicador	Meta 2025	Logro 2025	% Avance 2025	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuesta I
Agua transportada y entregada	2400	2497	100%	\$ 200.000.000	\$ 0	0%

### Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Suministro de agua potable para garantizar la cobertura del mínimo vital de agua a los sectores de los corregimientos 1, 2, y 3 del Municipio de Bucaramanga, Santander	2024680010053	\$ 188.055.514	\$ 188.055.514

### Descripción de actividades desarrolladas

Dentro de este programa se continua ejecutando el **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 134 DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 “SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA GARANTIZAR LA COBERTURA DEL MINIMO VITAL DE AGUA A LOS SECTORES DE LOS CORREGIMIENTOS 1, 2, 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.**

<b>NÚMERO DEL CONVENIO:</b>	134
<b>FECHA DEL CONTRATO:</b>	20/09/2024
<b>TIPOLOGÍA DEL CONTRATO O CONVENIO:</b>	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
<b>MODALIDAD DE SELECCIÓN DE CONTRATO:</b>	CONTRATACIÓN DIRECTA
<b>OBJETO:</b>	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA GARANTIZAR LA COBERTURA DEL MINIMO VITAL DE AGUA A LOS SECTORES DE LOS CORREGIMIENTO 1,2,3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
<b>PLAZO EJECUCIÓN:</b>	3 MESES Y QUINCE (15) DÍAS O HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL 2024
<b>VALOR INICIAL:</b>	\$188.055.514

<b>CONTRATISTA O ASOCIADO:</b>	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. ESP
<b>FECHA DE INICIO</b>	16 DE OCTUBRE DEL 2024
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:</b>	31 DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE DEL 2024
<b>FECHA SUSPENSIÓN N°. 01</b>	20 DE DICIEMBRE DEL 2024
<b>FECHA DE REINICIO No 1</b>	17 DE FEBRERO DE 2025
<b>PRORROGA NO 1</b>	17 DE FEBRERO DE 2025
<b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</b>	18 DE COTUBRE DE 2025
<b>Estado del Contrato</b>	: EJECUCIÓN
<b>Porcentaje avance</b>	: 40%

**Ubicación:**

- Vereda Chiltota.
- Asentamiento Villa Carmelo
- El porvenir, Los cuadros.
- Vereda San Ignacio.

**Impacto:** Este proyecto impacta a 682 familias del sector rural del Municipio de Bucaramanga

**Beneficios para la Comunidad:**

El artículo 2 de la constitución Política de Colombia, establece que son fines esenciales del estado; servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitución; facilita la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia política y la vigilancia de un orden justo(...)



**Imagen No 1.** Suministro de agua potable Villa Carmelo



**Imagen No 2.** Vereda los santos bajos



**Imagen No 3. Vereda Chitota**



**Imagen No 4. Vereda Los Cuadros**



**Imagen No 5. Estacion Carabineros**

### 3. LINEA ESTRATEGICA. TERRITORIO SEGURO Y SOSTENIBLE

**SECTOR:** Vivienda Ciudad y Territorio

**PROGRAMA:** Ordenamiento Territorial y Desarrollo urbano

**META E INDICADOR DE PRODUCTO:** Adecuar 300,000 metros cuadrados de espacio público.

Indicador	Meta 2025	Logro 2025	% Avance 2025	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuesta I
Espacio público adecuado	95.006	906,67	1%	\$ 28.701.017.614	\$ 19.058.122.453	66,40%

#### Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Mejoramiento del espacio público (plazoleta Luis Carlos Galán y parque García Rovira) enmarcado dentro de la estrategia "plan centro" en el municipio de Bucaramanga, Santander (fase 2)	2022680010049	\$ 0	\$ 14.765.777.919,79

#### Descripción de actividades desarrolladas

Contrato 396 – 2022 “MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN LA PLAZOLETA LUIS CARLOS GALÁN Y PARQUE GARCÍA ROVIRA ENMARCADOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA "PLAN CENTRO" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.”

Valor Inicial:	\$10.995.207.368
Valores adicionales:	\$ 3.770.570.551,79
Valor Total	\$ 14.765.777.919,79
Plazo Inicial:	OCHO (08) MESES
Fecha Inicial:	06 de marzo de 2023
Fecha Final:	17 de enero de 2025
Plazo Final:	Veinte (20) Meses y un (01) día
Estado del Contrato:	En proceso de recibo y liquidación
Porcentaje de Avance:	100%

**ESTADO DEL CONTRATO:** El proyecto contempló la intervención de:

Plazoleta: Entrega de Bancas en concreto, materas en concreto, pasamanos, luminaria nueva, mantenimiento de la piedra Barichara.

Parque: Entrega de bancas con espaldar en madera, polígonos de zonas verdes reformados, mantenimiento a losas en concreto. Siembra de especies nativas y mantenimiento de zonas verdes.

Vías :Entregamos la calle 37 desde la carrera 9 hasta la carrera 11 en concreto rígido (esquina de la iglesia San Laureano), entregamos calle 36 entre carrera 10 y 12 en concreto rígido con separador en zona verde, bolardos en el perímetro de la vía, entregamos calle 35 desde la carrera 9 hasta la 11 en concreto rígido (esquina parqueadero subterráneo), entregamos la carrera 10 entre las calles 34 a la 37, entregamos la carrera 11 entre las calles 37 a la 34 en concreto rígido, entregamos la carrera 12 entre las calles 34 a la 36 en concreto rígido.

Andenes: Se entregan todos los andenes aledaños a estas vías y esta zona en piedra sinu veta.

Actividades complementarias: Cambio de redes de alcantarillado a tubería estructural corrugada. Construcción de cajas eléctricas para la soterranización de redes. Mejoramiento de la señalización vial (Horizontal, vertical)



**Estado final del Parque García Rovira**



Estado final de la Plazoleta Luis Carlos Galán

### Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Mejoramiento de la infraestructura urbana y calidad ambiental dentro de la estrategia "CENTRO CAMINABLE" en el Municipio de Bucaramanga, Santander	202500000019302	\$ 2.740.728.019,29	\$ 2.740.728.019,29

### Descripción de actividades desarrolladas

<b>CONTRATISTA:</b>	COINOBRAS S.A.S. NIT. 804.000.152-8 MILTON VILLARREAL MURILLO
<b>VALOR INICIAL:</b>	\$9.072.944.903,00
<b>ANTICIPO (30%):</b>	N/A
<b>VALOR ADICIONAL:</b>	\$2.075.728.019,29
<b>VALOR ACUMULADO:</b>	\$11.148.672.710,47
<b>PLAZO INICIAL:</b>	10 MESES
<b>PRORROGA No. 1:</b>	5 MESES
<b>PRORROGA No. 2:</b>	30 DÍAS
<b>PRORROGA No. 3:</b>	7 MESES
<b>PLAZO TOTAL:</b>	23 MESES
<b>INTERVENTORÍA:</b>	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER NIT: 890.201.213-4
<b>FECHA DE INICIO:</b>	01 DE AGOSTO DE 2024
<b>SUSPENSIÓN 1:</b>	SUSPENDER POR EL TÉRMINO DE (01) UN MES Y (02) DOS DÍAS DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 28 DE ENERO DE 2025 Y/O CUANDO SE SUPEREN LAS CAUSAS DE LA SUSPENSIÓN.

<b>AMPLIACION A LA SUSPENSIÓN No. 1</b>	SUSPENDER POR EL TÉRMINO DE (15) QUINCE DIAS DEL 29 DE ENERO DE 2025 AL 12 DE FEBRERO DE 2025 Y/O CUANDO SE SUPEREN LAS CAUSAS DE LA SUSPENSION.
<b>AMPLIACIÓN No.2 A LA SUSPENSIÓN N°1</b>	SUSPENDER POR EL TÉRMINO DE (14) CATORCE DIAS DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 AL 26 DE FEBRERO DE 2025 Y/O CUANDO SE SUPEREN LAS CAUSAS DE LA SUSPENSION.
<b>AMPLIACIÓN No.3 A LA SUSPENSIÓN N°1</b>	SUSPENDER POR EL TÉRMINO DE (05) DIAS DEL 27 DE FEBRERO DE 2025 AL 03 DE MARZO DE 2025 Y/O CUANDO SE SUPEREN LAS CAUSAS DE LA SUSPENSION.
<b>REINICIO N°1</b>	SE REINICIÓ EL CONTRATO EL DIA 04 DE MARZO DE 2025 Y EN CONSECUENCIA LA FINALIZACIÓN ES EL DIA 13 DE MARZO DE 2025.
<b>PRORROGA No. 1</b>	PRÓRROGA DE (15) QUINCE DIAS APARTIR DE 14 DE MARZO DE 2025 AL 28 DE MARZO DE 2025
<b>PRORROGA No. 2</b>	PRÓRROGA DE (15) QUINCE DIAS APARTIR DE 29 DE MARZO DE 2025 AL 12 DE ABRIL DE 2025
<b>PRORROGA No. 3</b>	PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 11 DE 2024 EN SIETE (07) MESES
<b>ESTADO DEL CONTRATO:</b>	ACTIVO
<b>PORCENTAJE AVANCE FÍSICO:</b>	43,10 %
<b>AVANCE FINANCIERO:</b>	35,58%
<b>PERIODO INFORME:</b>	SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025 (ABRIL A JUNIO)

**ESTADO DEL CONTRATO:** A la fecha y con la aprobación del contrato adicional se tienen dentro del alcance 6 frentes de obra en total, de los cuales 4 frentes ya se encuentran con acabados en piedra royal beta vehicular y peatonal, pavimento rígido en MR42, 2 frentes se encuentran en ejecución con la instalación de tubería eléctrica, redes sanitaria principal sobre vía, y está pendiente por iniciar el frente de trabajo que realizara todo lo de siembra de especies arbóreas y ornamentales del proyecto y el frente de trabajo de las actividades que corresponden a la calle 37 entre carreras 26 y 27.

4 frentes con terminados en loseta royal beta y concreto MR-42 para vías.

- Carrera 26 entre calles 32 y 33
- Carrera 26 entre calles 33 y 34
- Carrera 26 entre calles 34 y 35
- Carrera 26 entre calles 35 y 36

2 frentes en intervención con actividades preliminares y ejecución de acabados.

- Carrera 27 entre calles 36 y 37
- Calle 37 entre carreras 26 y 27

1 frente por iniciar

- Calle 37 entre carreras 25 y 26

A continuación, se enuncian las principales actividades ejecutadas en el periodo del presente informe para cada frente de obra que hace parte del alcance actual del contrato, se realizaron actividades en 6 frentes.

- **Carrera 26 entre calles 32 y 33:** se realizó la instalación de piso peatonal en loseta en concreto en andén costado nororiental junto al parque de los niños.
- **Carrera 26 entre calles 33 y 34:** Se realizó la intervención de andenes en costado suroriental y nororiental con la instalación de loseta royal beta y loseta en concreto, instalación de toperol e instalación de bolardos, instalación de concreto MR-42 para tapas de cajas de media tensión y tapas de caja de barraje.
- **Carrera 26 entre calles 34 y 35:** Se realizó la intervención de andenes en costado suroriental, suroccidental, nororiental con la instalación de loseta royal beta y loseta en concreto, instalación de toperol e instalación de bolardos en zona de intersección,

instalación de toperol andén costado occidental, se realizó DNA para caja de barraje existente ubicada en andén costado oriental, construcción de caja de barraje en concreto de 4000 psi sobre la vía frente a edificio Akary, replanteo y conformación de calzada e instalación de concreto MR-42 para losas frente al edificio Akary, construcción de 2 cajas de paso sobre la vía frente a edificio Akary.

- **Carrera 26 entre calles 35 y 36:** Se realizó la intervención de andenes en costado suroriental, suroccidental y nororiental con la instalación de loseta royal beta y loseta en concreto, instalación de toperol e instalación de bolardos en zona de intersección, intervención de vía en intersección con replanteo e instalación de base granular, cambio de red matriz sanitaria aguas arriba y aguas abajo, construcción de pozo de inspección, construcción de caja de barraje sobre vía área de intersección, construcción de sumidero lateral en monoblock y rejilla inspeccionable en vía costado oriental, construcción de sumidero transversal tipo EMPAS aguas arriba de la intersección de la calle 35, reposición de carpeta asfáltica costado occidente y costado oriente de la intersección de la calle 35.
- **Carrera 26 entre calles 36 y 37:** Se realizó la intervención de andenes en costado noroccidente, nororiental y suroriental con la instalación de loseta royal beta y loseta en concreto, instalación de toperol, instalación de sardinel en concreto e instalación de bolardos en zona de intersección, demolición de pavimento asfáltico en intersección cll 36 carriles internos, instalación de ductilería eléctrica y de comunicaciones, intervención de andén costado suroccidental con la construcción de ductilería eléctrica y de comunicaciones, caja de AP, construcción de contenedor de raíces, instalación de sardinel para conformación de la vía, instalación de loseta royal beta para acceso a parqueadero edificio fénix y en acceso 1 drosan, construcción de contenedor de raíces en andén costado oriental, replanteo y conformación de calzada, instalación de base granular e instalación de MR-45 para losas de la 109 a la 112 entre calle 36 y 37 frente a Drosan, sobre el costado occidental se lleva a cabo la intervención con la construcción de ductilería eléctrica y de comunicaciones, replanteo de áreas peatonales para instalación de loseta royal beta e instalación de sardinel para conformación de la vía.
- **Calle 37 entre carreras 26 y 27:** Se realizó la demolición de pavimento medio carril en costado sur, instalación de ductilería eléctrica y de comunicaciones.
- **Otros frentes:** se realizaron actividades de construcción de ductilería para semaforización en la calle 36, construcción de cajas y gabinete de semaforización, instalación de postes de semáforo.

Durante el periodo del presente informe comprendido a partir del 1 de abril de 2025 hasta el 30 de junio de 2025, se han realizado diferentes actividades así:

### CARRERA 26 ENTRE CALLES 32 y 33




Demolición manual de andén en acceso peatonal al parque de los niños en la intersección de la Cra 26 con calle 32.




Instalación de losa gris 40x40 de andén en acceso peatonal al parque de los niños en la intersección de la Cra 26 con calle 32.

**CARRERA 26 ENTRE CALLES 33 Y 34**

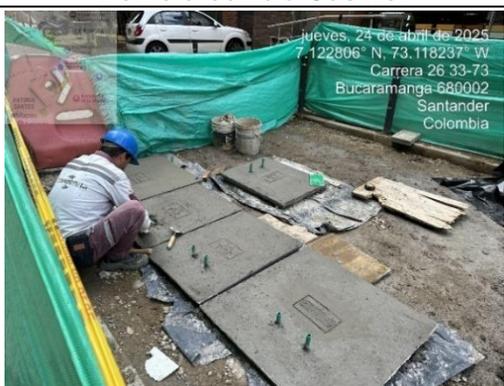
 <p>Jueves, 24 de abril de 2025 7:12:56 a. m. N. 73.118284° W Carrera 26 33-73 Bucaramanga 680002 Santander Colombia</p>	 <p>Jueves, 24 de abril de 2025 7:12:56 a. m. N. 73.118284° W Carrera 26 33-73 Bucaramanga 680002 Santander Colombia</p>
<p>Instalación de acero de refuerzo para tapas de cajas eléctricas en la carrera 26 calle 33 frente a edificio Castilla.</p>	<p>Armado de acero de refuerzo para caja de barraje MT en carrera 26 calle 33 frente a parqueadero España.</p>
 <p>Jueves, 24 de abril de 2025 7:12:56 a. m. N. 73.118237° W Carrera 26 33-73 Bucaramanga 680002 Santander Colombia</p>	 <p>28 abr 2025 9:20:31 a. m. 33-39 Carrera 26 Antonia Santos Bucaramanga Santander</p>
<p>Instalación de concreto MR- de tapas para cajas eléctricas carrera 26 con calle 34.</p>	<p>Instalación de concreto MR-42 para tapas de caja de barraje en carrera 26 # 33 - 39</p>
	
<p>Instalación de loseta royal beta, loseta en concreto, toperol y bolardos en el andén costado suroriental calle 33 carrera 26</p>	<p>Instalación de loseta royal beta, loseta en concreto, toperol y bolardos en el andén costado suroriental calle 33 carrera 26</p>
	
<p>Instalación de tapas para cajas eléctricas y de comunicaciones en carrera 26 con calle 34.</p>	<p>Instalación de concreto MR-42 para tapa de caja de media tensión en carrera 26 # 33 - 35</p>

### CARRERA 26 ENTRE CALLES 34 Y 35

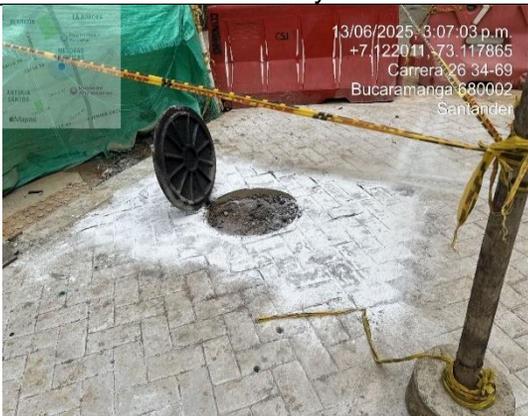 <p>19 jun 2025 7:14:28 a.m. #34-53 Carrera 26 Antonia Santos Bucaramanga Santander</p>	 <p>13/06/2025 7:12:11 a.m. Carrera 26 34-77 Bucaramanga Santander Colombia</p>
<p>DNA en caja de barraje existente en andén oriental frente a panadería.</p>	<p>Instalación de concreto MR-42 para las losas 75 76 y 77.</p>
 <p>Carrera 26 34-77 Bucaramanga 680002 Santander Colombia</p>	 <p>13/06/2025 3:07:03 p.m. +7 122011 73.117865 Carrera 26 34-69 Bucaramanga 680002 Santander</p>
<p>Instalación de loseta royal veta y toperol en andén occidental frente a edificio Akary.</p>	<p>Construcción de caja de barraje en carrera 26 calle 35 al frente de Edificio Akary.</p>
 <p>15 abr 2025 07:34:06 7.1217N 73.1176W # 26-3 Calle 35 Bucaramanga</p>	 <p>14/05/2025 7:41:19 a.m. Carrera 26 34-74 Bucaramanga 680002 Santander Colombia</p>
<p>Instalación de toperol en andén oriental carrera 26 calle 35 frente edificio Akary.</p>	<p>Construcción de cajas eléctricas en carrera 26 calle 35 al frente de Edificio Akary.</p>

### CARRERA 26 ENTRE CALLES 35 Y 36

	
<p>Instalación de loseta royal beta y loseta en concreto, instalación de toperol e instalación de bolardos en zona nororiental intersección calle 35.</p>	<p>Instalación de loseta royal beta y loseta en concreto, instalación de toperol e instalación de bolardos en zona suroriental intersección calle 35.</p>

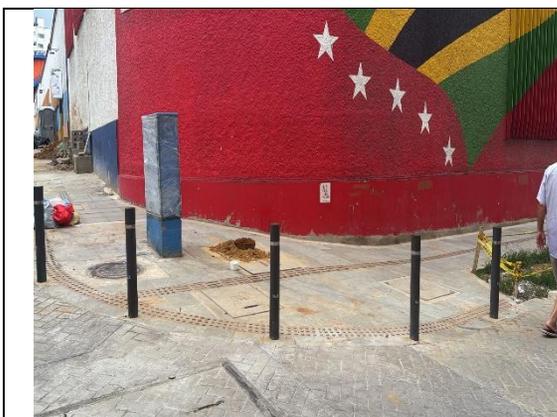

Instalación de loseta royal beta y loseta en concreto, instalación de toperol e instalación de bolardos en zona suroriental intersección calle 35.



Instalación de loseta royal beta y loseta en concreto, instalación de toperol e instalación de bolardos en zona noroccidental intersección calle 35.



Construcción de sumidero lateral en monoblock en intersección calle 35.



Construcción de sumidero transversal intersección calle 35.



Instalación de base conformación vía en intersección calle 35.



Instalación de tubería Novafort de 12" en intersección calle 35.



Construcción de pozo en intersección calle 35.



Construcción de caja de barraje en intersección calle 35.



Reposición de carpeta asfáltica costado occidente de intersección calle 35.



Reposición de carpeta asfáltica costado oriente de intersección calle 35.



Instalación de MR-42 intersección calle 35



Instalación de MR-42 intersección calle 35

**CARRERA 26 ENTRE CALLES 36 Y 37**



Instalación de loseta royal beta y loseta en concreto, instalación de toperol e instalación de bolardos en zona nororiental carrera 26 calle 36.



Instalación de loseta royal beta y loseta en concreto, instalación de toperol e instalación de bolardos en zona noroccidental carrera 26 calle 36.



Instalación de loseta royal beta y loseta en concreto, instalación de toperol e instalación de bolardos en zona suroccidental carrera 26 calle 36.



Demolición de pavimento flexible con fresadora en intersección calle 36.



Instalación de cama de arena para ductería eléctrica y comunicaciones en andén occidental carrera 26 calle 36 al frente de edificio Fénix.



Construcción de caja de telecomunicaciones en andén occidental carrera 26 calle 36 al frente de edificio Fénix.

### CALLE 37 ENTRE CARRERAS 26 Y 27



Demolición de pavimento flexible medio carril en costado sur calle 37 carrera 26.



Instalación de ductería eléctrica y de telecomunicaciones en costado sur calle 37 carrera 26.

### OTROS FRENTE (SEMAFORIZACION CLL 36)



Instalación de ductería para red de semaforización en la calle 36 zona sur.



Construcción de caja de red de semaforización en la calle 36 zona sur

## Descripción del Proyecto


Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
construcción de obras complementarias de espacio público a la institución educativa rural Bosconia Sede B de la vereda Santa Rita del municipio de Bucaramanga, Santander	2023680010054	\$ 1.197.643.395,86	\$ 1.197.643.395,86

## Descripción de actividades desarrolladas


**CONTRATO NO 310 DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2023 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIO PUBLICO, A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL BOSCONIA SEDE B DE LA VEREDA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.**

<b>CONTRATISTA</b>	IMCCA S.A.S
<b>SUPERVISOR</b>	ING. WILSON MOTTA RODRIGUEZ
<b>VALOR INICIAL:</b>	\$ 866.841.849
<b>VALOR ADICIONAL NO 3</b>	\$ 330.801.395,86
<b>VALOR TOTAL</b>	\$ 1.197.643.244,00
<b>PLAZO INICIAL:</b>	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
<b>FECHA INICIO:</b>	CUATRO (04) DE DICIEMBRE 2023
<b>SUSPENSION NO.01:</b>	26 DE DICIEMBRE DE 2023 (45 DIAS)
<b>REINICIO NO.01:</b>	26 DE FEBRERO DE 2024
<b>ADICIONAL NO.01 EN PLAZO:</b>	PRORROGA NO.01: TRES (03) MESES
<b>ADICIONAL NO.02 EN PLAZO:</b>	PRORROGA NO.02: DOS (02) MESES
<b>ADICIONAL NO.03 EN VALOR Y</b>	1 DE NOVIEMBRE DE 2024
<b>PLAZO</b>	ADICIONAL No.03: DOS (02) MESES
<b>PLAZO FINAL:</b>	SEIS (06) MESES Y QUINCE (15) DIAS
<b>FECHA DE TERMINACION</b>	25 DE MARZO DE 2025
<b>ESTADO DEL CONTRATO:</b>	EN PROCESO DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION
<b>PORCENTAJE DE AVANCE:</b>	100%

**ESTADO DEL CONTRATO:** El proyecto contempla la intervención del espacio público adyacente al colegio Bosconia sede B en la vereda Santa Rita. Entre las actividades contempladas esta: excavaciones, movimiento de tierras, desmontes cerramiento existente, demoliciones, construcción de muros de contención costado norte y occidental, cerramientos perimetrales en tubería.

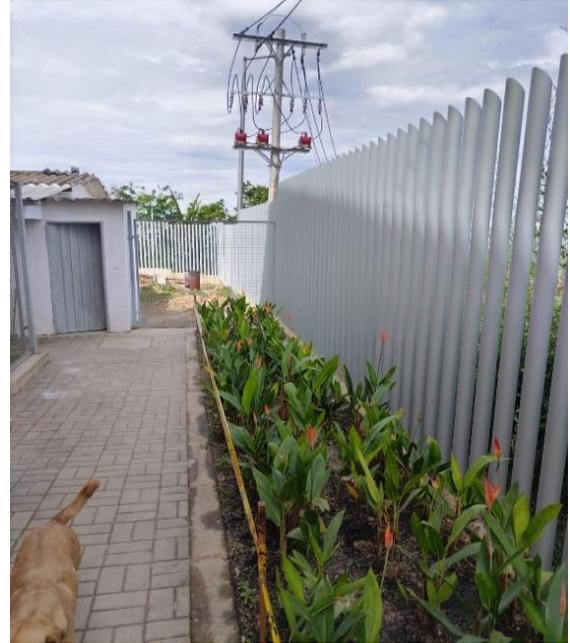

**Imagen No 1: zonas gimnasios biosaludables, minicancha multiple zonas de espacio publico, muro de contencion, zonas verdes, cerramiento, alumbrado publico**

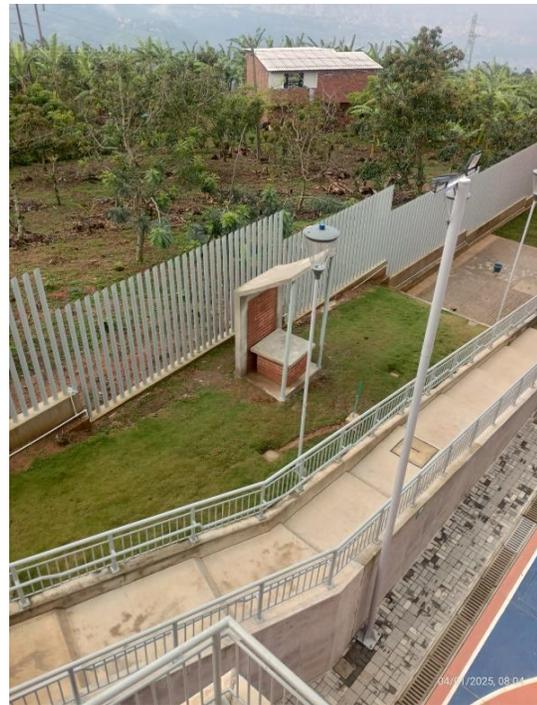

**Imagen No 2: tablero principal alumbrado publico**    **Imagen No 3: cerramiento perimetral tubo**

## Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
APOYO AL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE BORDE SUR LA VICTORIA EN EL BARRIO LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	20250000020181	\$ 785.643.475,00	\$ 785.643.475,00

### Contrato 184-2023: CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BORDE SUR LA VICTORIA EN EL BARRIO LA VICTORIA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.

**Valor del contrato inicial:** \$12.918.441.253,19  
**Fecha de inicio:** 08 de agosto de 2023.  
**Plazo inicial:** 6 meses  
**Suspensión No.1:** 2 meses (06 de febrero de 2024 y hasta el 05 de abril de 2024,)  
**Ampliación 1 a la suspensión No.1:** 1 mes (06 de abril 2024 – 05 de mayo de 2024)  
**Ampliación 2 a la suspensión No.1:** 7 meses (06 de mayo 2024 – 05 de diciembre de 2024)  
**Ampliación 3 a la suspensión No.1:** 4 meses (06 de diciembre de 2024 – 05 de abril de 2025)  
**Ampliación 4 a la suspensión No.1:** 6 meses (06 de abril de 2025 – 05 de octubre de 2025)  
**Avance físico ejecutado:** 3% porcentaje por confirmar por la nueva interventoría, toda vez que a la fecha no existe informe final del contrato 183/2023  
**Avance financiero:** 30%  
**Estado:** Suspendido

Sobre la aprobación de los estudios hidráulicos por parte del Acueducto de Bucaramanga, se informa de manera informal que fue aprobado por el profesional encargado de la gestión, pero se espera documento por el acueducto en firme.

#### Respecto a la nueva interventoría:

**BPIN: 20250000020181:** APOYO AL CONTROL DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BORDE SUR LA VICTORIA EN EL BARRIO LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

**objeto:** Interventoría integral para la construcción del parque borde sur la victoria en el barrio la victoria del municipio de Bucaramanga, Santander.

**Valor inicial:** \$785.643.475,00

**Interventor:** Aun no se ha adjudicado.

Se presentaron 58 proponentes. El área precontractual de la secretaria se encuentra en proceso de evaluación y se informe que a mediados de este mes será indicado.



Foto 1. Zona a intervenir

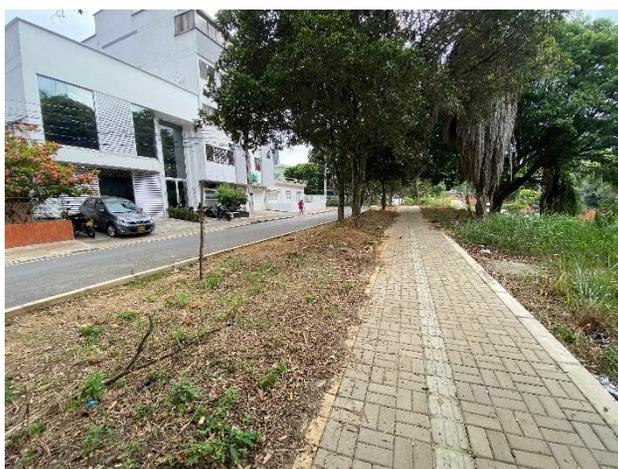


Foto 2. Espacio público intervenido

## PROYECTO EN FORMULACION

**Convenio 333 – 2021:** CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE LA ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P., EL ACUDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P., GASORIENTE S.A.E.S.P. Y EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA; PARA LA CONMEMORACIÓN DE LOS 400 AÑOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ÍCONO DE LA CIUDAD.

**Objeto:** Aunar esfuerzos para conmemorar los 400 años de fundación de la ciudad e Bucaramanga, que tuvo lugar el 22 de diciembre de 1622, permitiendo el posicionamiento de marca de empresas; así como la apropiación de ciudadana territorio; reflejo de identidad y sentido de pertenencia por el patrimonio de la ciudad en favor de sus grupos de interés

**Fecha de inicio:** 12 de noviembre de 2021.  
**Fecha de terminación:** 11 de enero de 2023  
**Prorroga No. 1 en plazo:** 11 meses  
**Prorroga No. 2 en plazo:** 20 días  
**Nueva fecha terminación:** 30 de diciembre de 2023  
**Fecha de suspensión 1:** 22 de diciembre de 2023  
**Valor del convenio:**  
 ACUADUCTO METROPOLITANO: \$500.000.000,00  
 ESSA: \$500.000.000,00  
 GASORIENTE: \$500.000.000,00  
**Total** \$1.500.000.000,00  
**Avance físico ejecutado:** 9.33%  
**Avance financiero:** 9.33%  
**Estado:** Suspendido.

El alcance del convenio incluía la estructuración de las bases e idea del icono arquitectónico, la realización de un concurso arquitectónico para el diseño y posterior proceso para construcción e instalación de un icono arquitectónico, que refleje los servicios públicos domiciliarios de energía, acueducto y gas, que abordan los siguientes temas: agua, energía eléctrica, gas, energías renovables, comunicaciones y participación ciudadana, conciencia ambiental, historia, cultura local y espacio público, y su interacción e influencia, pasada; presente y futura en el municipio de Bucaramanga.

Se desarrolló concurso abierto desde la Sociedad Colombiana de Arquitectos para que organizara concurso de diseño y arquitectura y que actuara como coordinador entre la

Entidad Estatal, en el mes de enero de 2022 la Secretaria de Infraestructura suscribió con la Sociedad Colombiana de Arquitectos contrato de prestación de servicios para que esta Sociedad funja como organismo asesor del Concurso de Méritos Arquitectónico que apertura la Secretaria de Infraestructura para el diseño del icono arquitectónico para la celebración de los 400 años de Bucaramanga.

El Ministerio de Cultura expidió la resolución 1414 de 2024, esto para el mes de noviembre, otorgando la respectiva autorización para la intervención.

El principio de anualidad que rige en materia presupuestal a las entidades públicas y los plazos que se estipularon para la ejecución del proyecto nos impedía que en un mes y medio pudiera iniciarse y realizarse la obra; reiterando que la expedición del acto administrativo que autoriza la intervención se dio por parte del Ministerio de Cultura solo hasta mediados del mes noviembre de 2024, por tal razón debíamos iniciar el respectivo tramite durante la vigencia 2025.

Aunado a lo anterior, para contar con la disposición de los recursos durante la presente anualidad se debía contar con la aprobación de incorporación de recursos del balance al presupuesto

Una vez superadas dichas circunstancias de índole administrativo y presupuestal, se reiniciaría el Convenio para el desarrollo de las etapas faltantes tales como; dar inicio al proceso contratación del contratista de obra para la ejecución del diseño arquitectónico y así mismo la suscripción de la prórroga del convenio para continuar con la ejecución del contrato derivado del mismo



Foto 1. Imagen renderizada



Foto 2. Imagen renderizada



Foto 3. Imagen renderizada

## Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
ADECUACION DE ESPACIO PUBLICO EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	2024680010050	\$ 24.134.607.023	\$ 45.114.109.841,13

Dentro de este proyecto se adelantó contratación mediante Contrato No. 105 del 11 de junio de 2025, cuyo objeto es: ADECUACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.

Valor inicial: \$ 16.317.394.434,13  
 Plazo: Desde acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025  
 Fecha Inicio: Por iniciar  
 Porcentaje Avance: 0%

**META E INDICADOR DE PRODUCTO:** Mantener 100 parques en el municipio

Indicador	Meta 2025	Logro 2025	% Avance 2025	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuesta I
Parques mantenidos	40	0	0%	\$ 3.000.000.000	\$ 0	0%

## Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES, EQUIPAMIENTO Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER.	2024680010045	\$ 3.000.000.000	\$6.853.612.187,14

## Descripción de actividades desarrolladas

Dentro de este programa se continúa ejecutando el **Contrato 244-2024 – SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES DEL MUNICIPIO:**

Se llevó a cabo el proceso de contratación del contrato No. 244-2024, Orden de Compra No. 139109, cuyo objeto es “SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA” en la TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIA, en virtud del Acuerdo Marco de Precios por Colombia Compra Eficiente, mediante el proceso No CCE-255-AMP-2021, una vez realizada la evaluación de las propuestas recibidas, por parte del comité evaluador fue seleccionado el proponente el contratista JAIRO OSORIO CABALLERO identificado con C.C. 91.282.210:, bajo la adjudicación del contrato No. 244-2024; el cual implica el suministro de los materiales de ferretería y herramientas necesarios para ejecutar el mantenimiento periódico de parques, zonas verdes y equipamientos urbanos del municipio de Bucaramanga. La orden de compra tiene por fecha el 13 de diciembre de 2024.

<b>Valor del contrato inicial:</b>	\$616.071.617,60
<b>Valor del Adicional 1:</b>	NA
<b>Valor total:</b>	\$616.071.617,60
<b>Fecha de inicio:</b>	18 de diciembre de 2024.
<b>Suspensión No.1:</b>	22 días calendario. (23 de diciembre de 2024 – 14 de enero de 2025)
<b>Ampliación a la suspensión No.1:</b>	45 días calendario (15 de enero de 2025 – 28 de febrero de 2025)
<b>Reinicio:</b>	1 de marzo de 2025.
<b>Prorroga No.1:</b>	3 meses y 13 días (9 de marzo de 2025 – 23 de junio de 2025)
<b>Prorroga No.2:</b>	4 meses
<b>Fecha de finalización:</b>	22 de octubre de 2025.
<b>Avance físico ejecutado:</b>	11%
<b>Avance financiero:</b>	0%
<b>Estado:</b>	Ejecución

El avance físico ejecutado corresponde al 11%, este está sujeto a las solicitudes de materiales que realice el profesional encargado del personal de obra dispuesto para la ejecución de obras de mantenimiento de los parques del municipio.

El contratista presenta prefactura No. 1 de fecha 19/06/2025 por el valor de \$116.287.121,00 la cual se encuentra en proceso de pago.



Figura 2. Estado actual bodega de materiales

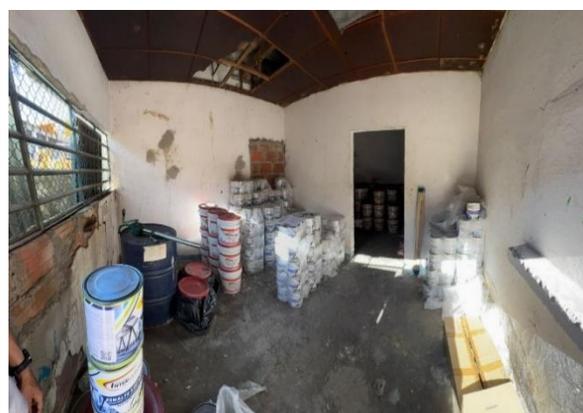


Figura 3. Estado actual bodega de materiales

#### Atención de Parques con mantenimiento

Parque Los Leones	Parque de Cristal Alto
Parque Altos del Cacique	Parque de Cristal Bajo
Parque San Miguel	Parque Corona
Parque Carlos Enrique Virviescas	Parque Las Mojarras
Parque AV González Valencia	Parque La Libertad
Parque Diamante 2	Parque Coaviconsa
Parque Fontana	Parque Los Periodistas
Parque Álvarez	Parque Romero
Parque Antonia Santos	Parque Diamante 1
Parque de Ciudad Bolívar	Parque Nueva Granada
Parque Morrórico	Parque Guacamayo Los Almendros
Parque Los Sarrapios	Parque Estoraques 2
Parque Mesón de los Búcaros	Parque Turbay
Parque Las Palmas	Parque Café Madrid
Parque Dangond	Parque Nacumas
Parque de Bolívar	

**META E INDICADOR DE PRODUCTO:** Mantener 1,605,851 metros cuadrados de zonas verdes

Indicador	Meta 2025	Logro 2025	% Avance 2025	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuesta I
Zonas verdes mantenidas	1605851	2043748	100%	\$ 10.000.000.000	\$ 617.856.243	6,18%

### Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Mantenimiento y manejo integral arbóreo y de zonas verdes en el municipio de Bucaramanga, Santander	2024680010046	\$ 31.813.343.882	\$ 10.000.000.000

### Descripción de actividades desarrolladas

Dentro de este programa se continúa ejecutando el siguiente convenio:

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:** No.126 del 30 de agosto de 2024.

**OBJETO:** “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y EL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES UBICADAS EN EL ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”

**CONVENIADO:** AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

**SUPERVISOR MUNICIPIO DE BUCARAMANGA:** Ing. Henry Merchán Moreno

**PLAZO INICIAL DEL CONVENIO:** 4 meses

**VALOR DEL CONVENIO:** Valor inicial: CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS (\$5.175.742.870) más Contrapartida del AMB de DOS CIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS (\$270.540.918), más adicional de SEIS CIENTOS DIEZ Y SIETE MILLONES OCHO CIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOS CIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS (\$617.856.243), Total: SEIS MIL SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL TREINTA Y UN PESOS (\$6.064'140.031,00) M/CTE.

**FECHA DE INICIO:** 30 de agosto de 2024.

**FECHA DE TERMINACION:** 29 de diciembre de 2024.

**PLAZO PRÓRROGA No.01:** 3 meses

**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN CON PRÓRROGA No.01:** abril 28 de 2025.

**PLAZO PRÓRROGA No.02:** 2 meses.

**NUEVA FECHA DE TERMINACION CON PRÓRROGA No.02:** junio 28 de 2025.

**PLAZO PRÓRROGA No.03:** 1 mes.

**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN CON PRÓRROGA No.03:** Julio 28 de 2025.

**AVANCE:** 58.8%.

El Convenio Interadministrativo **No 126 de 2024** se encuentra aún vigente y su fecha de terminación es el 28 de julio del presente año. Fue suscrito entre el municipio de Bucaramanga y el Área Metropolitana de Bucaramanga y su objeto es: **ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y EL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES UBICADAS EN EL ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.**

Se ha contado con la implementación de un conjunto de actividades encaminadas al mantenimiento y conservación de dichas áreas verdes.

Estas actividades se enmarcan en los objetivos del Convenio y responden a la necesidad de garantizar el adecuado manejo del entorno urbano, mejorar la calidad del paisaje y contribuir a la sostenibilidad ambiental y al bienestar de la ciudadanía. El desarrollo de las labores se ha realizado conforme a los lineamientos técnicos y a las condiciones establecidas, y en coordinación con los actores responsables, asegurando el cumplimiento de los cronogramas previstos.



Se han atendido aproximadamente 2.043.748 m<sup>2</sup>, que corresponde al mantenimiento de parques, zonas verdes, separadores y glorietas, con personal Idóneo en manejo de poda de césped, rocería, riego, limpieza de zonas duras, rastrillado de zona verdes y fertilización y fumigación. Adicionalmente, se está realizando siembra de plantas ornamentales en varias zonas de la ciudad.

#### 4. LINEA ESTRATEGICA. TERRITORIO SEGURO QUE GENERA VALOR

**SECTOR:** Gobierno territorial

**PROGRAMA:** Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

**META E INDICADOR DE PRODUCTO:** Asistir técnicamente a nueve (9) dependencias de la administración municipal para el diseño, seguimiento y ejecución de proyectos estratégicos de la ciudad en el área de infraestructura

Indicador	Meta 2025	Logro 2025	% Avance 2025	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuesta I
Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	9	9	100%	\$ 10.456.397.430	\$ 7.866.113.332	75,22%

#### Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Fortalecimiento institucional a los procesos misiones y de gestión de la secretaría de infraestructura del municipio de Bucaramanga, Santander	2024680010049	\$ 8.458.271.430	\$ 25.285.976.257

#### Descripción de actividades desarrolladas

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2025 la Secretaria de Infraestructura ha continuado realizo la contratación del recurso humano que requiere la secretaria para el fortalecimiento a la ejecución de los procesos transversales, así como la planificación de las diferentes obras.

GASTOS DE INVERSION	A 30 DE JUNIO 2025
	VALOR
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION	\$ 7.866.113.332,65

**META E INDICADOR DE PRODUCTO:** Adecuar cinco (05) sedes de bienes inmuebles que son propiedad municipal para fortalecer los procesos administrativos y promover el desarrollo de capacidades dentro de la administración

Indicador	Meta 2025	Logro 2025	% Avance 2025	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Sedes adecuadas	1,5	0	0%	\$ 41.728.570	\$ 41.000.120	98,25%

## Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
"REPARACION DEL EQUIPAMIENTO COMUNITARIO CASA BUHO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA."	22500000018145	\$ 41.000.120,00	\$ 41.000.120,00

**CONTRATO No 082 DE 2024** "REPARACION DEL EQUIPAMIENTO COMUNITARIO CASA BUHO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

**VALOR FISCAL** : \$41.000.120,00

**PLAZO** : UN (01) MES

**FECHA DE INICIO** : 17 DE JUNIO DE 2025

**FECHA DE TERMINACIÓN** : 16 DE JULIO DE 2025

Estado del Contrato : EJECUCIÓN

Porcentaje avance : 20%

### Ubicación:

Calle 27 con carrera 33 esquina Barrio La Aurora - Bucaramanga

**Impacto:** Este proyecto impacta a 682 familias del sector rural del Municipio de Bucaramanga

### Beneficios para la Comunidad:

La CASA BUHO se encuentra diseñada como una edificación de atención gratuita para el cuidado de la niñez en situación de riesgo de vulneración de sus derechos. Allí se brinda servicios para niños y niñas entre 7 meses y 8 años de edad cuyo padres o representantes, debido a sus condiciones socioeconómicas, no cuente con redes de apoyo familiar para el cuidado y protección general.

Con este programa social se beneficia un total de 130 niños y niñas en las dos jornadas

### ALCANCE:

- reparaciones locativas de la planta física como corrección de humedades tanto de cubierta como de redes sanitaria.
- Impermeabilización de placa de cubierta.
- Reparación de las redes eléctricas, como tablero general y automáticos.
- Pintura general de muros y cielo raso.
- Demolición de muros en DRYWALL y cambio.
- Cambio de luminarias y tomacorrientes



IMAGEN No 1: IMPERMEABILIZACION PLACA DE CUBIERTA



IMAGEN No 2: DEMOLICION CIELO RASO Y REVISION FILTRACIONES

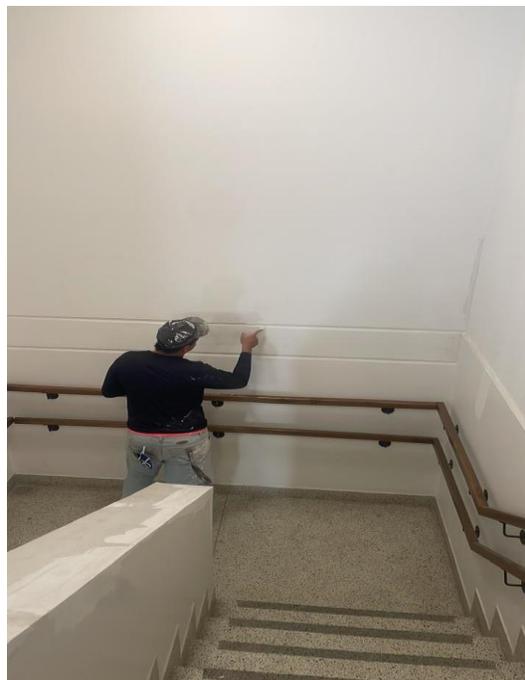


IMAGEN No 3: PINTURA Y REANES MUROS Y CIELO RASO

## 5. LINEA ESTRATEGICA. TERRITORIO SEGURO QUE PROTEGE

**SECTOR:** Minas y Energía

**PROGRAMA:** Consolidación productiva del sector de energía eléctrica

**META E INDICADOR DE PRODUCTO:** Garantizar 51,229 lámparas de alumbrado público para la prestación del servicio de alumbrado público en el Municipio de Bucaramanga.

Indicador	Meta 2025	Logro 2025	% Avance 2025	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Garantizar lámparas de alumbrado público.	51.229	50.843	99%	\$ 86.176.423.403	\$16.032.886.655,85	18,60%

### Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 2020-2023 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	2020680010114	\$ 3.594.944.130,28	\$ 28.025.839.948,32

### Descripción de actividades desarrolladas

Dentro del proyecto de mantenimiento del sistema de alumbrado público 2020-2023 del municipio de Bucaramanga, enfocados en el mismo objeto realizar un mantenimiento preventivo y correctivo del sistema mediante los contratos:

#### Contrato 138 de 2023

**Estado: Terminado en proceso de liquidación**

**Valor inicial \$ 1.122.746.611,00**

**Adicional 1 \$ 320.784.746,00**

**Adicional 2 \$ 240.588.559,50**

**Adicional 3 \$ 64.156.949,20**

**Valor total \$ 1.748.276.865,70**



### Contrato 139 de 2023

Estado: Terminado en proceso de liquidación

Valor inicial \$ 1.140.646.311,00  
Adicional 1 \$ 325.898.946,00  
Adicional 2 \$ 244.424.209,50  
Adicional 3 \$ 65.179.789,20  
Valor total \$ 1.776.149.255,70



### Contrato 140 de 2023

Estado: Terminado en proceso de liquidación

Valor inicial \$ 1.124.731.209,00  
Adicional 1 \$ 321.351.774,00  
Adicional 2 \$ 241.013.830,50  
Adicional 3 \$ 64.270.354,80  
Valor total \$ 1.751.367.168,30



### Contrato 141 de 2023

Estado: Terminado en proceso de liquidación

Valor inicial \$ 1.036.925.512,00  
Adicional 1 \$ 296.264.432,00  
Adicional 2 \$ 222.198.324,00  
Adicional 3 \$ 59.252.886,40  
Valor total \$ 1.614.641.154,40



### Resultados:

- **Mantenimiento Preventivo y Correctivo:** Se ejecutó un programa de mantenimiento preventivo que abarcó el 100% de los puntos de iluminación establecidos en el contrato. Esto incluyó la revisión, modernización y reparación de componentes eléctricos del alumbrado público de Bucaramanga.
- **Optimización de la Red de Alumbrado:** Se redujo el tiempo promedio de respuesta ante fallos a un promedio de 72 horas, gracias a la implementación de gestión de actividades y cierres en tiempo real que permitió identificar problemas de manera proactiva.

### Logros alcanzados:

- **Sustitución de Tecnología:** Se modernizaron un total de 42.716 luminarias convencionales por lámparas LED, lo que representa un 83 % de la infraestructura de alumbrado. Esta transición no solo mejoró la eficiencia energética, sino que también aumentó la luminosidad en las áreas atendidas.

### Localización:

El mantenimiento se realizó en las comunas y corregimientos:

- Comuna 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
- Corregimiento 1,2,3

### Población Beneficiada:

El número de personas beneficiadas con enfoque diferencial es de 605,047 personas en el municipio de Bucaramanga.

### Impacto generado:

- El proyecto de alumbrado público en Bucaramanga ha generado un impacto positivo significativo, mejorando la seguridad, la calidad de vida y la cohesión social. Esta intervención no solo ha transformado el entorno urbano, sino que también ha contribuido al bienestar integral de sus habitantes.
- El contrato de mantenimiento está dirigido a toda la población en general sin discriminación alguna, con el fin de mejorar la percepción de seguridad en el municipio mejorando las condiciones de luminosidad en todos los sectores del área metropolitana de Bucaramanga.
- Los contratos mencionados dieron cumplimiento al 100% de las actividades de las obligaciones asignadas durante la vigencia del contrato.



Imagen N°1 Hincar poste



Imagen N°2 Reemplazo de luminaria

### Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONA RURAL 2024 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	2024680010085	\$1.231.292.530,00	\$1.231.292.530,00

### Descripción de actividades desarrolladas

**Contrato 332 de 2023 – MODERNIZACIÓN RURAL :** Mediante el proceso SI-SI-LP-007-2023 en donde se adelantó la invitación abierta a presentar propuestas por parte del Municipio de Bucaramanga; para el objeto "AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS RURALES – FASE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"; una vez realizada la evaluación de las propuestas recibidas, por parte del comité evaluador fue seleccionado el proponente CONSORCIO ILUMINAR BGA R Se adelantó el contrato 332-2023; con el objeto de realizar la ampliación del alumbrado rural fase II con base en las PQR's presentadas por la comunidad rural, visitando algunas veredas de los dos corregimientos con el apoyo de los respectivos ediles y presidentes de junta de las veredas dentro del alcance del presente contrato.

**Estado: SUSPENDIDO** (En proceso de adición en tiempo y valor)

Ubicación: El proyecto se encuentra en los corregimientos 1 y 2 del Municipio de Bucaramanga.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas, centros de formación técnica y sector Industrial, directamente beneficiando a la población de las siguientes veredas:

- San Pedro Alto y Bajo
- El Aburrido
- San Ignacio
- Sabana
- Vijagual
- La Esmeralda
- Santa Rita
- Angelinos
- Bosconia
- Bolarquí Bajo y Alto
- Capilla Baja y Alta
- Vereda Monserrate
- Santos Bajos y Altos
- Magueyes
- Cuchilla Alta

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región.

### Actividades en Ejecución:

- Localización y replanteo manual de 1000 puntos para el proyecto
- Retiro transporte y entrega de postes metálicos
- Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de luminarias existentes.
- Aplomada de postes existentes.
- Suministro, transporte e instalación de cable Al 2x6 Serie-8000.
- Suministro, transporte e instalación de luminarias led de alumbrado público tipo perfil M4-1.
- Transporte, instalación y suministro de herrajes en poste o torrecilla estructura tipo NC-625.
- Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de conductor de redes aéreas Aluminio
- Poda y limpieza de zonas para instalación de luminarias

INDICADORES DE AVANCE DEL CONTRATO								
Cap.	Descripción	Valor Inicial	% Inicial	Valor Real	% Real	% Prog.	% Ejecutado	% Atrazo
1	RETIRO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	102.702.721,00	8,19%	\$ 158.077.861,68	8,12%	4,749%	6,551%	-1,8023%
2	EQUIPOS DE LUMINACIÓN	1.049.567.925,00	83,23%	\$ -	0,00%	0,000%	0,000%	0,0000%
3	ESTRUCTURAS	136.705.967,00	8,24%	\$ 20.044.337,40	0,78%	0,000%	0,390%	-0,3909%
4	REDES	371.014.130,00	22,35%	\$ 448.224.430,00	17,37%	17,334%	7,234%	10,0983%
5	ACTIVIDADES ADICIONALES NO PREVISTAS	-	0,00%	\$ 1.954.774.079,50	76,73%	76,088%	77,634%	-1,5481%
COSTOS	DIRECTOS CONA U46%	1.859.990.798,00	100%	\$ 2.581.120.709,58	100%	98,170%	91,810%	6,360%
	M/A	0	Diferencia	\$ -		PROG.	EJEC.	DIFERENCIA
	TOTALES	1.859.990.798,00	0	\$ 2.581.120.709,58	VALORES	2.531.892.272,12	2.389.737.734,21	108.972.394,18

(\*) cuadro extraído del último informe semanal entregado a fecha de corte.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PRESENTE PERÍODO						
C.O.D.	DESCRIPCIÓN	A de tanto a traso	Acumuladas Ejecutadas	Acumuladas Programadas	Total	Rendimiento Diario
1.1	Localización y replanteo manual para el proyecto	0,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00
1.2	Retiro transporte y entrega de postes metálicos existentes en bodega de AP. Incluye demolición de base y cimentación en concreto, retiro de escombros y transporte a bodega del municipio	13,00	3,00	16,00	16,00	1,00
1.4	Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de luminarias existentes.	-301,16	804,00	502,84	886,00	4,77
3.2	Aplomada de poste existente. Incluye excavación, cimentación con concreto 3000 psi, relleno y retiro de escombros.	-28,00	28,00	0,00	60,00	2,82
4.1	Suministro, transporte e instalación de cable Al 2x6 Serie-8000. Incluye accesorios de instalación y señalización RETE.	14597,26	10456,50	25053,76	29.125,00	1436,04
5.1	Suministro, transporte e instalación de luminaria led de alumbrado público tipo perfil M4-1. Incluye suministro de fotocontrol electrónico, brazo tipo 3 (1-1/2" x 1,5m) galvanizado en caliente, juego de collarines 3"-4", 4"-5", 5"-6" de una salida, cable encauchetado Cu 2 X14 THHN / PVC TC SR - 600V/90°C, conectores de perforación, sticker de marcación (BAXXX) y demás accesorios de instalación. La luminaria debe cumplir con el cálculo fotométrico requerido para el Perfil M4-1 (incluye rotula de inclinación).	-16,78	877,00	880,22	1.000,00	9,46
5.2	Suministro, transporte e instalación de poste FRFV troncopiramidal en fibra de vidrio corrugado robusto 8 m x 510 Kg). Incluye cimentación en concreto 3000 P.S.I., marcación código de apoyo y demás accesorios de instalación.	22,00	38,00	60,00	60,00	1,69
5.3	Suministro, transporte e instalación de cable No 2x14 encauchetado 75'600V. Incluye accesorios de instalación y señalización RETE.	-2483,71	2825,00	361,29	674,40	-165,43
5.5	Transporte, instalación y suministro de herrajes en poste o torrecilla estructura tipo NC-625. (1 perchas 1 hilo)	13,00	47,00	60,00	60,00	1,00
5.6	Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de conductor de redes aéreas Aluminio, cualquier calibre	-8406,85	12954,00	6547,35	7.811,30	-410,98
5.7	Poda y limpieza de zona para instalación de luminarias de 1 mt hasta 3 mts de ancho. (Incluye disposición final).	-85,03	136,00	70,97	82,50	-5,00

(\*) cuadro extraído del último informe semanal entregado a fecha de corte.

Contratista: CONSORCIO ILUMINAR BGA R  
 Valor Inicial: \$1.659.990.756,00  
 Valor Adicional: \$921.129.953,01  
 Valor Total: \$ 2.581.120.708,58  
 Plazo Inicial: 02 Meses  
 Plazo Adicional: 03 Meses  
 Fecha De Inicio: 15 De abril De 2024  
 fecha De Suspensión No 1: 13 De junio De 2024  
 fecha De Reinicio No 1: 30 De septiembre De 2024  
 Fecha de suspensión No 2. 27 de diciembre de 2024  
 Fecha De Terminación: 31 De diciembre De 2024  
 Avance físico Ejecutado: 82%

Beneficios para la Comunidad:

- **Mayor Eficiencia Energética:** Las nuevas luminarias LED consumen menos energía, lo que se traduce en una reducción de los costos operativos para el municipio y en una menor huella de carbono.
- **Mejor Iluminación:** Las luminarias LED proporcionan una luz más blanca y uniforme, lo que mejora la visibilidad y la seguridad en las vías de acceso.
- **Mayor Durabilidad:** Las tecnologías LED tienen una vida útil significativamente mayor que las luminarias tradicionales, lo que reduce los costos de mantenimiento y reemplazos.
- **Menor Impacto Ambiental:** La reducción en el consumo de energía y la utilización de materiales más amigables con el medio ambiente contribuyen a disminuir la contaminación y a proteger el ecosistema.
- **Aumento de la Seguridad:** Una iluminación adecuada en vías de acceso reduce la criminalidad y accidentalidad, mejorando la percepción de seguridad de los residentes, creando entornos más seguros y cómodos para todos.



### Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 - FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	2023680010042	\$4.090.424.780,64	\$14.773.520.535,58

**Contrato de Obra Pública 285 - 2023 Lote 1:** Se encuentra localizado en la carrera 27 desde la calle 9 hasta la calle 34 del Municipio de Bucaramanga. A su vez, este proyecto impacta directamente sobre el eje vial principal de la ciudad, garantizando la iluminación sobre este corredor con gran presencia de establecimientos comerciales, instituciones educativas (SENA, UIS, UMB, COLEGIO SANTANDER, COLEGIO TECNOLÓGICO, UNIMINUTO), centros hospitalarios Clínica La Merced, Clínica Comuneros y edificaciones residenciales de grandes volúmenes, comprendido entre los barrios La Aurora, San Alonso, San Francisco, La Universidad, Mutualidad y Antonia Santos.

#### Descripción de actividades ejecutadas:

- **Retiro de infraestructura existente:** Porcentaje de avance 100%.
- **Construcción de canalizaciones:** Porcentaje de avance 100%.
- **Instalación de postes:** Porcentaje de avance 100%.
- **Instalación de luminarias:** Porcentaje de avance 100%.

Las actividades de obra se encuentran terminadas, el contratista está realizando gestiones administrativas y documentales ante entes certificadores RETIE Y RETILAP.

El Contratista, igualmente, está realizando actualizaciones del plano récord para la entrega correspondiente de la obra real ejecutada.

**Valor del contrato inicial:** \$ 1.542.848.948,00

**Valor del Adicional 1:** \$ 436.339.159,00

**Valor total:** \$ 1.979.188.107

**Avance físico Ejecutado:** 99% (pendiente actividades administrativas y documentales)

**Tramites de legalización:** El proyecto se encuentra en proceso de certificación RETIE y RETILAP por parte del contratista para dar cumplimiento a las condiciones contractuales y lograr su pronto recibo final, trámite previo para su liquidación.

#### Beneficios para la Comunidad:

- **Mayor Eficiencia Energética:** Las nuevas luminarias LED consumen menos energía, lo que se traduce en una reducción de los costos operativos para el municipio y una menor huella de carbono.
- **Mejor Iluminación:** Las luminarias LED proporcionan una luz más blanca y uniforme, lo que mejora la visibilidad y la seguridad en las vías públicas.
- **Mayor Durabilidad:** La tecnología LED presenta una vida útil considerablemente mayor que la de las luminarias tradicionales, lo que reduce los costos de mantenimiento y reemplazo.
- **Menor Impacto Ambiental:** La disminución en el consumo de energía y el uso de materiales más sostenibles contribuyen a reducir la contaminación y proteger el ecosistema.
- **Estética Urbana:** La nueva infraestructura de alumbrado público ofrece a la ciudad un aspecto más moderno y atractivo.
- **Aumento de la Seguridad Pública:** Una iluminación adecuada en espacios públicos reduce la criminalidad y mejora la percepción de seguridad de los residentes, creando entornos más seguros y cómodos para todos.



**Imagen 1.** Instalación de postes



**Imagen 2.** Instalación de adoquín

**Contrato de Obra Pública 286 -2023 Lote 2:** Se encuentra localizado en la carrera 27 desde la calle 34 hasta la puerta del sol del Municipio de Bucaramanga. A su vez, este proyecto impacta directamente sobre el eje vial principal de la ciudad, garantizando la iluminación sobre este corredor con gran presencia de establecimientos comerciales y edificaciones residenciales de grandes volúmenes, comprendido entre los barrios Mejoras Públicas, Sotomayor, Nuevo Sotomayor, Bolarquí, Concordia.

#### Descripción de actividades ejecutadas:

- **Retiro de infraestructura existente:** Porcentaje de avance 100%.
- **Construcción de canalizaciones:** Porcentaje de avance 100%.
- **Instalación de postes:** Porcentaje de avance 100%.
- **Instalación de luminarias:** Porcentaje de avance 100%.

Las actividades de obra se encuentran terminadas, el contratista está realizando gestiones administrativas y documentales ante entes certificadores RETIE Y RETILAP.

El Contratista, igualmente, está realizando actualizaciones del plano récord para la entrega correspondiente de la obra real ejecutada.

**Valor del contrato inicial:** \$ 1.522.075.669,89

**Valor del Adicional 1:** \$ 287.025.412,00

**Valor del Adicional 2:** \$ 104.224.318,82

**Valor total:** \$ 1.913.325.400,71

**Avance físico Ejecutado:** 99.75% (pendiente actividades administrativas y documentales)

**Tramites de legalización:** El proyecto se encuentra en proceso de certificación RETIE y RETILAP por parte del contratista para dar cumplimiento a las condiciones contractuales y lograr su pronto recibo final, trámite previo para su liquidación

#### Beneficios para la Comunidad:

- **Mayor Eficiencia Energética:** Las nuevas luminarias LED consumen menos energía, lo que se traduce en una reducción de los costos operativos para el municipio y una menor huella de carbono.
- **Mejor Iluminación:** Las luminarias LED proporcionan una luz más blanca y uniforme, lo que mejora la visibilidad y la seguridad en las vías públicas.
- **Mayor Durabilidad:** La tecnología LED presenta una vida útil considerablemente mayor que la de las luminarias tradicionales, lo que reduce los costos de mantenimiento y reemplazo.

- **Menor Impacto Ambiental:** La disminución en el consumo de energía y el uso de materiales más sostenibles contribuyen a reducir la contaminación y proteger el ecosistema.
- **Estética Urbana:** La nueva infraestructura de alumbrado público ofrece a la ciudad un aspecto más moderno y atractivo.
- **Aumento de la Seguridad Pública:** Una iluminación adecuada en espacios públicos reduce la criminalidad y mejora la percepción de seguridad de los residentes, creando entornos más seguros y cómodos para todos.



**Imagen 1.** Instalación de postes



**Imagen 2.** Tendido de redes

**Contrato de Obra Pública 287 - 2023 Lote 3:** Se encuentra localizado en Calle 36 desde la carrera 11 hasta la carrera 27 del Municipio de Bucaramanga. A su vez, este proyecto impacta directamente sobre el sector comercial de la ciudad en la zona centro, zona residencial del barrio la Aurora, Mejoras públicas, Antonia Santos y Centro

**Objetivo del Contrato:** Modernizar el sistema de alumbrado público de la ciudad de Bucaramanga, sustituyendo las antiguas luminarias por nuevas tecnologías LED más eficientes y duraderas. Esta actualización incluye la mejora de los drivers y otros componentes de las luminarias, así como el reemplazo de la ductería para garantizar un funcionamiento óptimo y confiable del sistema.

#### **Descripción de actividades ejecutadas:**

- **Retiro de infraestructura existente:** Porcentaje de avance 100%.
- **Construcción de canalizaciones:** Porcentaje de avance 100%.
- **Instalación de postes:** Porcentaje de avance 100%.
- **Instalación de luminarias:** Porcentaje de avance 100%.

Las actividades de obra se encuentran terminadas, el contratista está realizando gestiones administrativas y documentales ante entes certificadores RETIE Y RETILAP.

El Contratista, igualmente, está realizando actualizaciones del plano récord para la entrega correspondiente de la obra real ejecutada.

**Valor del contrato inicial:** \$ 1.522.075.669,89

**Valor del Adicional 1:** \$ 456.622.700,97

**Valor total:** \$ 1978.698.370,86

**Avance físico Ejecutado:** 99% (pendiente actividades administrativas y documentales)

**Tramites de legalización:** El proyecto se encuentra en proceso de certificación RETIE y RETILAP por parte del contratista para dar cumplimiento a las condiciones contractuales y lograr su pronto recibo final, trámite previo para su liquidación.

### Beneficios para la Comunidad:

- **Mayor Eficiencia Energética:** Las nuevas luminarias LED consumen menos energía, lo que se traduce en una reducción de los costos operativos para el municipio y en una menor huella de carbono.
- **Mejor Iluminación:** Las luminarias LED proporcionan una luz más blanca y uniforme, lo que mejora la visibilidad y la seguridad en las vías públicas.
- **Mayor Durabilidad:** Las tecnologías LED tienen una vida útil significativamente mayor que las luminarias tradicionales, lo que reduce los costos de mantenimiento y reemplazos.
- **Menor Impacto Ambiental:** La reducción en el consumo de energía y la utilización de materiales más amigables con el medio ambiente contribuyen a disminuir la contaminación y a proteger el ecosistema.
- **Estética Urbana:** La nueva infraestructura de alumbrado público le dará a la ciudad un aspecto más moderno y atractivo.
- **Aumento de la Seguridad Pública:** Una iluminación adecuada en espacios públicos reduce la criminalidad y mejora la percepción de seguridad de los residentes, creando entornos más seguros y cómodos para todos.



Imagen 1. Instalación de postes



Imagen 2. Construcción de tablero

**Contrato de Obra Pública 291 -2023 Lote 4:** Se encuentra localizado en la carrera 15, desde la Quebrada Seca hasta el CAI de la Virgen del Municipio de Bucaramanga. A su vez, este proyecto impacta directamente sobre el sector comercial de la ciudad en la zona centro y zona Norte, además que es una de las vías de mayor flujo de población y conexión de unos de los sectores económicos más importantes como lo son, el sector Calzado, textil e industrial de la ciudad, la población beneficiada en percepción de seguridad en su mayor extensión, será la comuna No 15.

**Objetivo del Contrato:** Modernizar el sistema de alumbrado público de la ciudad de Bucaramanga, sustituyendo las antiguas luminarias por nuevas tecnologías LED más eficientes y duraderas. Esta actualización incluye la mejora de los drivers y otros componentes de las luminarias, así como el reemplazo de la ductería obstruida para garantizar un funcionamiento óptimo y confiable del sistema.

### Descripción de actividades ejecutadas:

- **Retiro de infraestructura existente:** Porcentaje de avance 100%.
- **Construcción de canalizaciones:** Porcentaje de avance 100%.
- **Instalación de postes:** Porcentaje de avance 100%.
- **Instalación de luminarias:** Porcentaje de avance 100%.

Las actividades de obra se encuentran terminadas, el contratista está realizando gestiones administrativas y documentales ante entes certificadores RETIE Y RETILAP.

El Contratista, igualmente, está realizando actualizaciones del plano récord para la entrega correspondiente de la obra real ejecutada.

**Valor del contrato inicial:** \$1444.130.820,00

**Valor del Adicional 1:** \$ 358.591.294,45

**Valor del Adicional 2:** \$ 25.690.939,10

**Valor total:** \$ 1.828.413.053,55

**Avance físico Ejecutado:** 99.68% (pendiente actividades administrativas y documentales)

**Tramites de legalización:** El proyecto se encuentra en proceso de certificación RETIE y RETILAP por parte del contratista para dar cumplimiento a las condiciones contractuales y lograr su pronto recibo final, trámite previo para su liquidación.

#### Beneficios para la Comunidad:

- **Mayor Eficiencia Energética:** Las nuevas luminarias LED consumen menos energía, lo que se traduce en una reducción de los costos operativos para el municipio y en una menor huella de carbono.
- **Mejor Iluminación:** Las luminarias LED proporcionan una luz más blanca y uniforme, lo que mejora la visibilidad y la seguridad en las vías públicas.
- **Mayor Durabilidad:** Las tecnologías LED tienen una vida útil significativamente mayor que las luminarias tradicionales, lo que reduce los costos de mantenimiento y reemplazos.
- **Menor Impacto Ambiental:** La reducción en el consumo de energía y la utilización de materiales más amigables con el medio ambiente contribuyen a disminuir la contaminación y a proteger el ecosistema.
- **Estética Urbana:** La nueva infraestructura de alumbrado público le dará a la ciudad un aspecto más moderno y atractivo.
- **Aumento de la Seguridad Pública:** Una iluminación adecuada en espacios públicos reduce la criminalidad y mejora la percepción de seguridad de los residentes, creando entornos más seguros y cómodos para todos.



Imagen No.1. Instalación de postes y luminarias



Imagen No.2. Limpieza de la obra

**Contrato de Obra Pública 288 -2023 Lote 5:** Se encuentra localizado en la Quebrada Seca, desde la Carrera 9 hasta la carrera 34, importante vía de acceso que conecta diferentes áreas de Bucaramanga, facilitando el acceso a lugares relevantes por parte de estudiantes, trabajadores de los distintos sectores económicos, facilitando el flujo de población que ingresa a la ciudad por Morrорico, conectando desde la zona occidente, Centro y Oriente de la ciudad.

#### Descripción de actividades ejecutadas:

- **Retiro de infraestructura existente:** Porcentaje de avance 100%.
- **Construcción de canalizaciones:** Porcentaje de avance 100%.
- **Instalación de postes:** Porcentaje de avance 100%.
- **Instalación de luminarias:** Porcentaje de avance 100%.

Las actividades de obra se encuentran terminadas, el contratista está realizando gestiones administrativas y documentales ante entes certificadores RETIE Y RETILAP.

El Contratista, igualmente, está realizando actualizaciones del plano récord para la entrega correspondiente de la obra real ejecutada.

**Valor del contrato inicial:** \$ 1.209.155.465,00

**Valor del Adicional 1:** \$ 397.299.666,00

**Valor del Adicional 1:** \$ 55.872.627,00

**Valor total:** \$1.662.327.758,81

**Avance físico Ejecutado:** 99.75% (pendiente actividades administrativas y documentales)

**Tramites de legalización:** El proyecto se encuentra en proceso de certificación RETIE y RETILAP por parte del contratista para dar cumplimiento a las condiciones contractuales y lograr su pronto recibo final, trámite previo para su liquidación.

#### Beneficios para la Comunidad:

- **Mayor Eficiencia Energética:** Las nuevas luminarias LED consumen menos energía, lo que se traduce en una reducción de los costos operativos para el municipio y en una menor huella de carbono.
- **Mejor Iluminación:** Las luminarias LED proporcionan una luz más blanca y uniforme, lo que mejora la visibilidad y la seguridad en las vías públicas.
- **Mayor Durabilidad:** Las tecnologías LED tienen una vida útil significativamente mayor que las luminarias tradicionales, lo que reduce los costos de mantenimiento y reemplazos.
- **Menor Impacto Ambiental:** La reducción en el consumo de energía y la utilización de materiales más amigables con el medio ambiente contribuyen a disminuir la contaminación y a proteger el ecosistema.
- **Estética Urbana:** La nueva infraestructura de alumbrado público le dará a la ciudad un aspecto más moderno y atractivo.
- **Aumento de la Seguridad Pública:** Una iluminación adecuada en espacios públicos reduce la criminalidad y mejora la percepción de seguridad de los residentes, creando entornos más seguros y cómodos para todos.



**Contrato 289 de 2023 - Lote 6:** Se encuentra localizado en la Avenida Gonzales Valencia, desde la del Municipio de Bucaramanga, sirve como un importante corredor que conecta diferentes áreas de Bucaramanga, facilitando el acceso a lugares relevantes por parte de estudiantes, trabajadores de los distintos sectores económicos, desde la zona céntrica, oriental y occidental del municipio. Desde el pasado 20 de noviembre, anterior fecha de terminación del contrato, cuyas causales que habían generado la Suspensión N.º 3 ya fueron superadas y por lo tanto, se establece en común acuerdo el reinicio 3 de las actividades de obra a partir del 13 de Diciembre con fecha de terminación el 31 de Diciembre del 2024

#### Descripción de actividades ejecutadas:

- **Retiro de infraestructura existente:** Porcentaje de avance 100%.
- **Construcción de canalizaciones:** Porcentaje de avance 100%.
- **Instalación de postes:** Porcentaje de avance 100%.
- **Instalación de luminarias:** Porcentaje de avance 100%.

Las actividades de obra se encuentran terminadas, el contratista está realizando gestiones administrativas y documentales ante entes certificadores RETIE Y RETILAP.

El Contratista, igualmente, está realizando actualizaciones del plano récord para la entrega correspondiente de la obra real ejecutada.

**Valor del contrato inicial:** \$ 836'362.735,00

**Valor del Adicional 1:** \$ 405.365.172


**Valor del Adicional 2:** 53.532.331,51. en valor y tiempo

**Valor total:** \$ 1.295'.260.238,51

**Avance físico Ejecutado:** 99% (pendiente actividades administrativas y documentales)

**Tramites de legalización:** El proyecto se encuentra en proceso de certificación RETIE y RETILAP por parte del contratista para dar cumplimiento a las condiciones contractuales y lograr su pronto recibo final, trámite previo para su liquidación.

- **Mayor Eficiencia Energética:** Las nuevas luminarias LED consumen menos energía, lo que se traduce en una reducción de los costos operativos para el municipio y en una menor huella de carbono.
- **Mejor Iluminación:** Las luminarias LED proporcionan una luz más blanca y uniforme, lo que mejora la visibilidad y la seguridad en las vías públicas.
- **Mayor Durabilidad:** Las tecnologías LED tienen una vida útil significativamente mayor que las luminarias tradicionales, lo que reduce los costos de mantenimiento y reemplazos.
- **Menor Impacto Ambiental:** La reducción en el consumo de energía y la utilización de materiales más amigables con el medio ambiente contribuyen a disminuir la contaminación y a proteger el ecosistema.
- **Estética Urbana:** La nueva infraestructura de alumbrado público le dará a la ciudad un aspecto más moderno y atractivo.
- **Aumento de la Seguridad Pública:** Una iluminación adecuada en espacios públicos reduce la criminalidad y mejora la percepción de seguridad de los residentes, creando entornos más seguros y cómodos para todos.

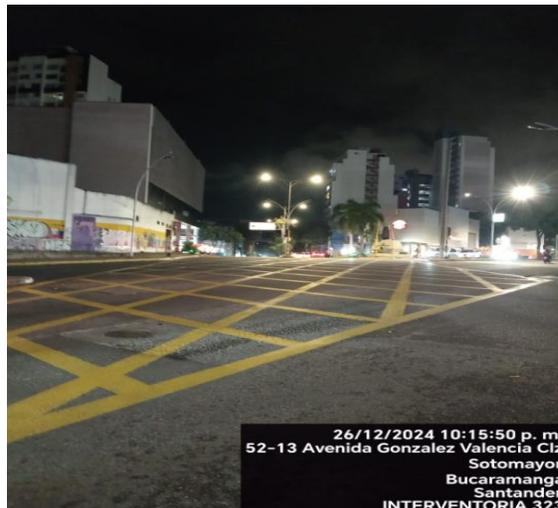

**Contrato 290 de 2023 - Lote 7:** Se encuentra localizado en la Avenida La Rosita, desde la Carrera 17 hasta la Carrera 27 del Municipio de Bucaramanga, sirve como un importante corredor que conecta diferentes áreas de Bucaramanga, facilitando el acceso a lugares relevantes por parte de estudiantes, trabajadores de los distintos sectores económicos, desde la zona céntrica, oriental y occidental del municipio. Desde el pasado 20 de noviembre, anterior fecha de terminación del contrato, cuyas causales que habían generado la Suspensión N.º 3 ya fueron superadas y por lo tanto, se establece en común acuerdo el reinicio 3 de las actividades de obra a partir del 13 de Diciembre con fecha de terminación el 31 de Diciembre del 2024

**Descripción de actividades ejecutadas:**

- **Retiro de infraestructura existente:** Porcentaje de avance 100%.
- **Construcción de canalizaciones:** Porcentaje de avance 100%.
- **Instalación de postes:** Porcentaje de avance 100%.
- **Instalación de luminarias:** Porcentaje de avance 100%.

Las actividades de obra se encuentran terminadas, el contratista está realizando gestiones administrativas y documentales ante entes certificadores RETIE Y RETILAP.

El Contratista, igualmente, está realizando actualizaciones del plano récord para la entrega correspondiente de la obra real ejecutada.

**Valor del contrato inicial:** \$ 897'152.256,00

**Valor del Adicional 1:** \$ 310.247.632,98

**Valor del Adicional 2:** \$ 111.009.116,02 en valor y tiempo

**Valor total:** \$ 1.318'409.005

**Avance físico Ejecutado:** 99% (pendiente actividades administrativas y documentales)

**Tramites de legalización:** El proyecto se encuentra en proceso de certificación RETIE y RETILAP por parte del contratista para dar cumplimiento a las condiciones contractuales y lograr su pronto recibo final, trámite previo para su liquidación.

- **Mayor Eficiencia Energética:** Las nuevas luminarias LED consumen menos energía, lo que se traduce en una reducción de los costos operativos para el municipio y en una menor huella de carbono.
- **Mejor Iluminación:** Las luminarias LED proporcionan una luz más blanca y uniforme, lo que mejora la visibilidad y la seguridad en las vías públicas.
- **Mayor Durabilidad:** Las tecnologías LED tienen una vida útil significativamente mayor que las luminarias tradicionales, lo que reduce los costos de mantenimiento y reemplazos.

- **Menor Impacto Ambiental:** La reducción en el consumo de energía y la utilización de materiales más amigables con el medio ambiente contribuyen a disminuir la contaminación y a proteger el ecosistema.
- **Estética Urbana:** La nueva infraestructura de alumbrado público le dará a la ciudad un aspecto más moderno y atractivo.
- **Aumento de la Seguridad Pública:** Una iluminación adecuada en espacios públicos reduce la criminalidad y mejora la percepción de seguridad de los residentes, creando entornos más seguros y cómodos para todos.

**Contrato de Obra Pública 285 - 2023 Lote 1:** Se encuentra localizado en la carrera 27 desde la calle 9 hasta la calle 34 del Municipio de Bucaramanga. A su vez, este proyecto impacta directamente sobre el eje vial principal de la ciudad, garantizando la iluminación sobre este corredor con gran presencia de establecimientos comerciales, instituciones educativas (SENA, UIS, UMB, COLEGIO SANTANDER, COLEGIO TECNOLÓGICO, UNIMINUTO), centros hospitalarios Clínica La Merced, Clínica Comuneros y edificaciones residenciales de grandes volúmenes, comprendido entre los barrios La Aurora, San Alonso, San Francisco, La Universidad, Mutualidad y Antonia Santos.

#### **Descripción de actividades ejecutadas:**

- **Retiro de infraestructura existente:** Porcentaje de avance 100%.
- **Construcción de canalizaciones:** Porcentaje de avance 100%.
- **Instalación de postes y luminarias:** Porcentaje de avance 100%.
- **Instalación de luminarias:** Porcentaje de avance 100%.

**Valor del contrato inicial:** \$ 1.542.848.948,00

**Valor del Adicional 1:** \$ 436.339.159,00

**Valor total:** \$ 1.979.188.107

**Avance físico Ejecutado:** 100%

**ESTADO ACTUAL:** Terminado, Se encuentra en liquidación

#### **Beneficios para la Comunidad:**

- **Mayor Eficiencia Energética:** Las nuevas luminarias LED consumen menos energía, lo que se traduce en una reducción de los costos operativos para el municipio y una menor huella de carbono.
- **Mejor Iluminación:** Las luminarias LED proporcionan una luz más blanca y uniforme, lo que mejora la visibilidad y la seguridad en las vías públicas.
- **Mayor Durabilidad:** La tecnología LED presenta una vida útil considerablemente mayor que la de las luminarias tradicionales, lo que reduce los costos de mantenimiento y reemplazo.
- **Menor Impacto Ambiental:** La disminución en el consumo de energía y el uso de materiales más sostenibles contribuyen a reducir la contaminación y proteger el ecosistema.
- **Estética Urbana:** La nueva infraestructura de alumbrado público ofrece a la ciudad un aspecto más moderno y atractivo.
- **Aumento de la Seguridad Pública:** Una iluminación adecuada en espacios públicos reduce la criminalidad y mejora la percepción de seguridad de los residentes, creando entornos más seguros y cómodos para todos.



**Imagen 1.** Instalación de postes



**Imagen 2.** Instalación de adoquín

**Contrato de Obra Pública 286 -2023 Lote 2:** Se encuentra localizado en la carrera 27 desde la calle 34 hasta la puerta del sol del Municipio de Bucaramanga. A su vez, este proyecto impacta directamente sobre el eje vial principal de la ciudad, garantizando la iluminación sobre este corredor con gran presencia de establecimientos comerciales y edificaciones residenciales de grandes volúmenes, comprendido entre los barrios Mejoras Públicas, Sotomayor, Nuevo Sotomayor, Bolarquí y Concordia.

#### Actividades en Ejecución:

- **Construcción de cajas de alumbrado:** El porcentaje de avance es del 100%.
- **Instalación de postes y luminarias:** El porcentaje de avance es del 100%.
- **Recuperación del espacio público:** El porcentaje de avance es del 100%.
- **Retiro de infraestructura existente:** El porcentaje de avance es del 100%.

**Valor del contrato inicial:** \$ 1.522.075.669,89

**Valor del Adicional 1:** \$ 287.025.412,00

**Valor del Adicional 2:** \$ 104.224.318,82

**Valor total:** \$ 1.913.325.400,71

**Avance físico Ejecutado:** 100%

**ESTADO ACTUAL:** Terminado, Se encuentra en liquidación

#### Beneficios para la Comunidad:

- **Mayor Eficiencia Energética:** Las nuevas luminarias LED consumen menos energía, lo que se traduce en una reducción de los costos operativos para el municipio y una menor huella de carbono.
- **Mejor Iluminación:** Las luminarias LED proporcionan una luz más blanca y uniforme, lo que mejora la visibilidad y la seguridad en las vías públicas.
- **Mayor Durabilidad:** La tecnología LED presenta una vida útil considerablemente mayor que la de las luminarias tradicionales, lo que reduce los costos de mantenimiento y reemplazo.
- **Menor Impacto Ambiental:** La disminución en el consumo de energía y el uso de materiales más sostenibles contribuyen a reducir la contaminación y proteger el ecosistema.
- **Estética Urbana:** La nueva infraestructura de alumbrado público ofrece a la ciudad un aspecto más moderno y atractivo.
- **Aumento de la Seguridad Pública:** Una iluminación adecuada en espacios públicos reduce la criminalidad y mejora la percepción de seguridad de los residentes, creando entornos más seguros y cómodos para todos.



**Imagen 1.** Instalación de postes

**Imagen 2.** Tendido de redes

**Contrato de Obra Pública 287 - 2023 Lote 3:** Se encuentra localizado en Calle 36 desde la carrera 11 hasta la carrera 27 del Municipio de Bucaramanga. A su vez, este proyecto impacta directamente sobre el sector comercial de la ciudad en la zona centro, zona residencial del barrio Mejoras públicas, Antonia Santos y Centro

**Objetivo del Contrato:** Modernizar el sistema de alumbrado público de la ciudad de Bucaramanga, sustituyendo las antiguas luminarias por nuevas tecnologías LED más eficientes y duraderas. Esta actualización incluyó la mejora de los drivers y otros componentes de las luminarias, así como el reemplazo de la ductería para garantizar un funcionamiento óptimo y confiable del sistema.

#### Actividades en Ejecución:

- **Construcción de canalizaciones:** Porcentaje de avance 100%.
- **Construcción de cajas de alumbrado:** Porcentaje de avance 100%.
- **Instalación de postes y luminarias:** Porcentaje de avance 100%.
- **Recuperación del espacio público:** Porcentaje de avance 100%.

**Valor del contrato inicial:** \$ 1.522.075.669,89

**Valor del Adicional 1:** \$ 456.622.700,97

**Valor total:** \$ 1978.698.370,86

**Avance físico Ejecutado:** 100%

**ESTADO ACTUAL:** Terminado, Se encuentra en liquidación

#### Beneficios para la Comunidad:

- **Mayor Eficiencia Energética:** Las nuevas luminarias LED consumen menos energía, lo que se traduce en una reducción de los costos operativos para el municipio y en una menor huella de carbono.
- **Mejor Iluminación:** Las luminarias LED proporcionan una luz más blanca y uniforme, lo que mejora la visibilidad y la seguridad en las vías públicas.
- **Mayor Durabilidad:** Las tecnologías LED tienen una vida útil significativamente mayor que las luminarias tradicionales, lo que reduce los costos de mantenimiento y reemplazos.
- **Menor Impacto Ambiental:** La reducción en el consumo de energía y la utilización de materiales más amigables con el medio ambiente contribuyen a disminuir la contaminación y a proteger el ecosistema.
- **Estética Urbana:** La nueva infraestructura de alumbrado público le dará a la ciudad un aspecto más moderno y atractivo.

- **Aumento de la Seguridad Pública:** Una iluminación adecuada en espacios públicos reduce la criminalidad y mejora la percepción de seguridad de los residentes, creando entornos más seguros y cómodos para todos.



**Imagen 1.** Instalación de postes



**Imagen 2.** Construcción de tablero

**Contrato 289 de 2023 - Lote 6:** Se encuentra localizado en la Avenida Gonzales Valencia, del Municipio de Bucaramanga, sirve como un importante corredor que conecta diferentes áreas de Bucaramanga, facilitando el acceso a lugares relevantes por parte de estudiantes, trabajadores de los distintos sectores económicos, desde la zona céntrica, oriental y occidental del municipio. Desde el pasado 20 de noviembre, anterior fecha de terminación del contrato, cuyas causales que habían generado la Suspensión N.º 3 ya fueron superadas y por lo tanto, se establece en común acuerdo el reinicio 3 de las actividades de obra a partir del 13 de diciembre con fecha de terminación el 31 de diciembre del 2024

#### Actividades en Ejecución:

- **Demolición y Excavación:** Porcentaje de avance 100%.
- **Construcción de Cajas de Alumbrado:** Porcentaje de avance 100%.
- **Reemplazo de Ductería:** Porcentaje de avance 100%.
- **Postes:** Porcentaje de avance 100%.

**Valor del contrato inicial:** \$ 836'362.735,00

**Valor del Adicional 1:** \$ 405.365.172

**Valor del Adicional 2:** 53.532.331,51. en valor y tiempo

**Valor total:** \$ 1.295'.260.238,51

**AVANCE EJECUTADO:** 100%

**ESTADO ACTUAL:** Terminado, Se encuentra en liquidación

#### Beneficios para la Comunidad:

- **Mayor Eficiencia Energética:** Las nuevas luminarias LED consumen menos energía, lo que se traduce en una reducción de los costos operativos para el municipio y en una menor huella de carbono.
- **Mejor Iluminación:** Las luminarias LED proporcionan una luz más blanca y uniforme, lo que mejora la visibilidad y la seguridad en las vías públicas.
- **Mayor Durabilidad:** Las tecnologías LED tienen una vida útil significativamente mayor que las luminarias tradicionales, lo que reduce los costos de mantenimiento y reemplazos.
- **Menor Impacto Ambiental:** La reducción en el consumo de energía y la utilización de materiales más amigables con el medio ambiente contribuyen a disminuir la contaminación y a proteger el ecosistema.
- **Estética Urbana:** La nueva infraestructura de alumbrado público le dará a la ciudad un aspecto más moderno y atractivo.

- **Aumento de la Seguridad Pública:** Una iluminación adecuada en espacios públicos reduce la criminalidad y mejora la percepción de seguridad de los residentes, creando entornos más seguros y cómodos para todos.



**Contrato 290 de 2023 - Lote 7:** Se encuentra localizado en la Avenida La Rosita, desde la Carrera 17 hasta la Carrera 27 del Municipio de Bucaramanga, sirve como un importante corredor que conecta diferentes áreas de Bucaramanga, facilitando el acceso a lugares relevantes por parte de estudiantes, trabajadores de los distintos sectores económicos, desde la zona céntrica, oriental y occidental del municipio. Desde el pasado 20 de noviembre, anterior fecha de terminación del contrato, cuyas causales que habían generado la Suspensión N.º 3 ya fueron superadas y, por lo tanto, se establece en común acuerdo el reinicio 3 de las actividades de obra a partir del 13 de diciembre con fecha de terminación el 31 de diciembre del 2024

#### Actividades en Ejecución:

- **Demolición y Excavación:** Porcentaje de avance 100%.
- **Construcción de Cajas de Alumbrado:** Porcentaje de avance 100%.
- **Reemplazo de Ductería:** Porcentaje de avance 100%.
- **Postes:** Porcentaje de avance 100%.

**Valor del contrato inicial:** \$ 897'152.256,00

**Valor del Adicional 1:** \$ 310.247.632,98

**Valor del Adicional 2:** \$ 111.009.116,02 en valor y tiempo

**Valor total:** \$ 1.318'409.005

**AVANCE EJECUTADO:** 100%

**ESTADO ACTUAL:** Terminado, Se encuentra en liquidación

#### Beneficios para la Comunidad:

- **Mayor Eficiencia Energética:** Las nuevas luminarias LED consumen menos energía, lo que se traduce en una reducción de los costos operativos para el municipio y en una menor huella de carbono.
- **Mejor Iluminación:** Las luminarias LED proporcionan una luz más blanca y uniforme, lo que mejora la visibilidad y la seguridad en las vías públicas.
- **Mayor Durabilidad:** Las tecnologías LED tienen una vida útil significativamente mayor que las luminarias tradicionales, lo que reduce los costos de mantenimiento y reemplazos.
- **Menor Impacto Ambiental:** La reducción en el consumo de energía y la utilización de materiales más amigables con el medio ambiente contribuyen a disminuir la contaminación y a proteger el ecosistema.

- **Estética Urbana:** La nueva infraestructura de alumbrado público le dará a la ciudad un aspecto más moderno y atractivo.
- **Aumento de la Seguridad Pública:** Una iluminación adecuada en espacios públicos reduce la criminalidad y mejora la percepción de seguridad de los residentes, creando entornos más seguros y cómodos para todos.



### Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	2024680010189	\$ 19.568.000.000	\$ 81.553.013.348,21

### Descripción de actividades desarrolladas

Dentro del proyecto de mantenimiento del sistema de alumbrado público del municipio de Bucaramanga, se encuentran plasmados los siguientes contratos, los cuales se encuentran algunos en procesos de publicación en la plataforma de SECOP II, en estructuración o viabilidad jurídica, pero que a la fecha cuentan con CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal):

**Contrato 188 de 2024 – MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.:** Mediante el proceso SI-SI-LP-001-2024 en donde se adelantó la invitación abierta a presentar propuestas por parte del Municipio de Bucaramanga; para el objeto "MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA."; una vez realizada la evaluación de las propuestas recibidas, por parte del comité evaluador fue seleccionado el proponente OCCIDENTAL DE COLOMBIA .Se adelantó el contrato 188-2024; con el objeto de realizar MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE 2, del municipio de Bucaramanga con base en las PQR'S reportadas por la comunidad del área metropolitana del municipio de Bucaramanga.

Ubicación: El proyecto se encuentra dirigido para el municipio de Bucaramanga.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en el área metropolitana de Bucaramanga, porque permite que el alumbrado público del municipio esté funcionando al 100 % de capacidad, beneficiando a la población y ayudando a reducir lugares oscuros contribuyendo a la seguridad del municipio. El proyecto se dirige a las siguientes ubicaciones:

- Comuna 2
- Comuna 7

- Comuna 13
- Comuna 17
- Corregimiento 1

#### **Actividades en ejecución:**

- Cambio de luminarias en daño
- Instalación de tapas antivandálicas
- Mantenimiento de redes de energía
- Instalación de cableado aéreo y subterráneo por reposición
- Instalación de nuevos puntos de energía
- Mantenimientos de tableros de distribución

**Valor del contrato inicial:** \$ 603.511.578

**Valor total:** \$ 905.267.367

**ESTADO:** En ejecución (Fecha de finalización, 07 de Julio de 2025)

#### **Beneficios para la Comunidad:**

##### **1. Mejora de la seguridad pública**

- Reducción de delitos: Un alumbrado público adecuado reduce la incidencia de delitos al mejorar la visibilidad en las calles, parques y otras áreas públicas, lo que dificulta la comisión de delitos como robos, agresiones o vandalismo.
- Prevención de accidentes: Las calles bien iluminadas disminuyen el riesgo de accidentes de tráfico, especialmente durante la noche, al ofrecer una mejor visibilidad para los conductores y peatones.

##### **2. Fomento de la movilidad y accesibilidad**

- Mayor confianza para transitar: Un buen sistema de alumbrado público proporciona seguridad tanto a peatones como a ciclistas y conductores, fomentando la movilidad nocturna y permitiendo que la comunidad se desplace con mayor tranquilidad.
- Accesibilidad en espacios públicos: Parques, plazas y áreas recreativas iluminadas adecuadamente pueden ser utilizadas por la comunidad en horarios nocturnos, mejorando la accesibilidad a espacios públicos.

##### **3. Aumento de la calidad de vida**

- Bienestar y tranquilidad: Un entorno bien iluminado genera un sentimiento de bienestar y tranquilidad en la comunidad, ya que la luz en espacios públicos ofrece comodidad y facilita la interacción social.
- Promoción de actividades recreativas: La iluminación pública adecuada permite que las personas realicen actividades recreativas, deportivas o sociales durante la noche, lo cual contribuye a la vida comunitaria y el esparcimiento.

##### **4. Sostenibilidad y eficiencia energética**

- Uso de tecnologías eficientes: Los contratos de mantenimiento de alumbrado público suelen incluir la implementación de tecnologías más eficientes, como las luces LED, que reducen el consumo de energía y los costos operativos. Esto contribuye a la sostenibilidad energética de la comunidad.
- Reducción de emisiones de carbono: La implementación de sistemas de iluminación de bajo consumo energético disminuye la huella de carbono de la comunidad, alineándose con los objetivos de sostenibilidad medioambiental.

## 5. Mantenimiento y actualización continua

- Respuestas rápidas a fallos: El contrato de mantenimiento asegura una respuesta rápida ante cualquier falla en el sistema de alumbrado, lo que minimiza los períodos de oscuridad en la vía pública y mantiene la seguridad.
- Mejora continua de la infraestructura: El mantenimiento regular incluye la inspección, reparación y sustitución de las luminarias, lo que garantiza que el sistema de alumbrado público esté siempre en buen estado y funcione de manera óptima.

## 6. Impacto en el desarrollo económico

- Atractivo para inversionistas y turistas: Las zonas bien iluminadas suelen ser más atractivas para los inversionistas, comerciantes y turistas, lo que puede favorecer el crecimiento económico local.
- Fomento del comercio local: Los comercios en áreas bien iluminadas se benefician de un mayor flujo de clientes, lo que contribuye a la actividad económica en la comunidad.

## 7. Mejor calidad visual y ambiental

- Reducción de la contaminación lumínica: Un contrato de mantenimiento bien gestionado puede ayudar a reducir la contaminación lumínica, mediante el uso de tecnología que distribuye la luz de manera eficiente y dirige el brillo solo hacia las áreas necesarias.
- Estética y valorización urbana: La iluminación adecuada también contribuye a la estética de la ciudad, haciendo que las calles y plazas se vean más atractivas, lo que puede mejorar la percepción pública de la zona.

## 8. Fortalecimiento del sentido de comunidad

- Sensación de pertenencia: Las áreas bien iluminadas fomentan una sensación de pertenencia y seguridad entre los residentes, ya que las personas se sienten parte activa de una comunidad bien cuidada.
- Incremento en la participación ciudadana: La inversión en infraestructura pública, como el alumbrado, puede incentivar a los ciudadanos a involucrarse más en asuntos comunitarios, ya que se percibe un esfuerzo conjunto por mejorar la calidad de vida.



**Contrato 189 de 2024 – MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.:** Mediante el proceso SI-SI-LP-001-2024 en donde se adelantó la invitación abierta a presentar propuestas por parte del Municipio de Bucaramanga; para el objeto "MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA."; una vez realizada la evaluación de las propuestas recibidas, por parte del comité evaluador fue seleccionado el proponente SOSDOM SA .Se adelanto el contrato 189-2024; con el objeto de realizar MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE 3,del municipio de Bucaramanga con base en las PQR's reportadas por la comunidad del área metropolitana del municipio de Bucaramanga.

Ubicación: El proyecto se encuentra dirigido para el municipio de Bucaramanga.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en el área metropolitana de Bucaramanga, porque permite que el alumbrado público del municipio esté funcionando al 100 % de capacidad, beneficiando a la población y ayudando a reducir lugares oscuros contribuyendo a la seguridad del municipio. El proyecto se dirige a las siguientes ubicaciones:

- Comuna 3
- Comuna 4
- Comuna 8
- Comuna 14
- Corregimiento 2

**Actividades en ejecución:**

- Cambio de luminarias en daño
- Instalación de tapas antivandálicas
- Mantenimiento de redes de energía
- Instalación de cableado aéreo y subterráneo por reposición
- Instalación de nuevos puntos de energía
- Mantenimientos de tableros de distribución

**Valor del contrato inicial:** \$ 564.666.008

**Valor total:** \$ 846.999.012

**ESTADO:** En ejecución (Fecha de finalización, 05 de Julio de 2025)

**Beneficios para la Comunidad:**

**1. Mejora de la seguridad pública**

- Reducción de delitos: Un alumbrado público adecuado reduce la incidencia de delitos al mejorar la visibilidad en las calles, parques y otras áreas públicas, lo que dificulta la comisión de delitos como robos, agresiones o vandalismo.
- Prevención de accidentes: Las calles bien iluminadas disminuyen el riesgo de accidentes de tráfico, especialmente durante la noche, al ofrecer una mejor visibilidad para los conductores y peatones.

**2. Fomento de la movilidad y accesibilidad**

- Mayor confianza para transitar: Un buen sistema de alumbrado público proporciona seguridad tanto a peatones como a ciclistas y conductores, fomentando la movilidad nocturna y permitiendo que la comunidad se desplace con mayor tranquilidad.
- Accesibilidad en espacios públicos: Parques, plazas y áreas recreativas iluminadas adecuadamente pueden ser utilizadas por la comunidad en horarios nocturnos, mejorando la accesibilidad a espacios públicos.

### **3. Aumento de la calidad de vida**

- Bienestar y tranquilidad: Un entorno bien iluminado genera un sentimiento de bienestar y tranquilidad en la comunidad, ya que la luz en espacios públicos ofrece comodidad y facilita la interacción social.
- Promoción de actividades recreativas: La iluminación pública adecuada permite que las personas realicen actividades recreativas, deportivas o sociales durante la noche, lo cual contribuye a la vida comunitaria y el esparcimiento.

### **4. Sostenibilidad y eficiencia energética**

- Uso de tecnologías eficientes: Los contratos de mantenimiento de alumbrado público suelen incluir la implementación de tecnologías más eficientes, como las luces LED, que reducen el consumo de energía y los costos operativos. Esto contribuye a la sostenibilidad energética de la comunidad.
- Reducción de emisiones de carbono: La implementación de sistemas de iluminación de bajo consumo energético disminuye la huella de carbono de la comunidad, alineándose con los objetivos de sostenibilidad medioambiental.

### **5. Mantenimiento y actualización continua**

- Respuestas rápidas a fallos: El contrato de mantenimiento asegura una respuesta rápida ante cualquier falla en el sistema de alumbrado, lo que minimiza los períodos de oscuridad en la vía pública y mantiene la seguridad.
- Mejora continua de la infraestructura: El mantenimiento regular incluye la inspección, reparación y sustitución de las luminarias, lo que garantiza que el sistema de alumbrado público esté siempre en buen estado y funcione de manera óptima.

### **6. Impacto en el desarrollo económico**

- Atractivo para inversionistas y turistas: Las zonas bien iluminadas suelen ser más atractivas para los inversionistas, comerciantes y turistas, lo que puede favorecer el crecimiento económico local.
- Fomento del comercio local: Los comercios en áreas bien iluminadas se benefician de un mayor flujo de clientes, lo que contribuye a la actividad económica en la comunidad.

### **7. Mejor calidad visual y ambiental**

- Reducción de la contaminación lumínica: Un contrato de mantenimiento bien gestionado puede ayudar a reducir la contaminación lumínica, mediante el uso de tecnología que distribuye la luz de manera eficiente y dirige el brillo solo hacia las áreas necesarias.
- Estética y valorización urbana: La iluminación adecuada también contribuye a la estética de la ciudad, haciendo que las calles y plazas se vean más atractivas, lo que puede mejorar la percepción pública de la zona.

### **8. Fortalecimiento del sentido de comunidad**

- Sensación de pertenencia: Las áreas bien iluminadas fomentan una sensación de pertenencia y seguridad entre los residentes, ya que las personas se sienten parte activa de una comunidad bien cuidada.
- Incremento en la participación ciudadana: La inversión en infraestructura pública, como el alumbrado, puede incentivar a los ciudadanos a involucrarse más en asuntos comunitarios, ya que se percibe un esfuerzo conjunto por mejorar la calidad de vida.



**Contrato 199 de 2024 – MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.:** Mediante el proceso SI-SI-LP-001-2024 en donde se adelantó la invitación abierta a presentar propuestas por parte del Municipio de Bucaramanga; para el objeto "MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA."; una vez realizada la evaluación de las propuestas recibidas, por parte del comité evaluador fue seleccionado el proponente CONSORCIO MANTENIMIENTO DIKARM-2024. Se adelanto el contrato 199-2024; con el objeto de realizar MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE 4, del municipio de Bucaramanga con base en las PQR's reportadas por la comunidad del área metropolitana del municipio de Bucaramanga.

**Ubicación:** El proyecto se encuentra dirigido para el municipio de Bucaramanga.

**Impacto:** Este importante proyecto tiene un impacto significativo en el área metropolitana de Bucaramanga, porque permite que el alumbrado público del municipio este funcionando al 100 % de capacidad, beneficiando a la población y ayudando a reducir lugares oscuros contribuyendo a la seguridad del municipio. El proyecto se dirige a las siguientes ubicaciones:

- Comuna 1
- Comuna 5
- Comuna 9
- Comuna 15
- Corregimiento 3

**Actividades en ejecución:**

- Cambio de luminarias en daño
- Instalación de tapas antivandálicas
- Mantenimiento de redes de energía
- Instalación de cableado aéreo y subterráneo por reposición
- Instalación de nuevos puntos de energía
- Mantenimientos de tableros de distribución

**Valor del contrato inicial:** \$ 619.597.399,45

**Valor total:** \$ 929.396.098,95

**ESTADO:** En ejecución (Fecha de finalización, 05 de Julio de 2025)

**Beneficios para la Comunidad:**

**1. Mejora de la seguridad pública**

- Reducción de delitos: Un alumbrado público adecuado reduce la incidencia de delitos al mejorar la visibilidad en las calles, parques y otras áreas públicas, lo que dificulta la comisión de delitos como robos, agresiones o vandalismo.

- Prevención de accidentes: Las calles bien iluminadas disminuyen el riesgo de accidentes de tráfico, especialmente durante la noche, al ofrecer una mejor visibilidad para los conductores y peatones.

## **2. Fomento de la movilidad y accesibilidad**

- Mayor confianza para transitar: Un buen sistema de alumbrado público proporciona seguridad tanto a peatones como a ciclistas y conductores, fomentando la movilidad nocturna y permitiendo que la comunidad se desplace con mayor tranquilidad.
- Accesibilidad en espacios públicos: Parques, plazas y áreas recreativas iluminadas adecuadamente pueden ser utilizadas por la comunidad en horarios nocturnos, mejorando la accesibilidad a espacios públicos.

## **3. Aumento de la calidad de vida**

- Bienestar y tranquilidad: Un entorno bien iluminado genera un sentimiento de bienestar y tranquilidad en la comunidad, ya que la luz en espacios públicos ofrece comodidad y facilita la interacción social.
- Promoción de actividades recreativas: La iluminación pública adecuada permite que las personas realicen actividades recreativas, deportivas o sociales durante la noche, lo cual contribuye a la vida comunitaria y el esparcimiento.

## **4. Sostenibilidad y eficiencia energética**

- Uso de tecnologías eficientes: Los contratos de mantenimiento de alumbrado público suelen incluir la implementación de tecnologías más eficientes, como las luces LED, que reducen el consumo de energía y los costos operativos. Esto contribuye a la sostenibilidad energética de la comunidad.
- Reducción de emisiones de carbono: La implementación de sistemas de iluminación de bajo consumo energético disminuye la huella de carbono de la comunidad, alineándose con los objetivos de sostenibilidad medioambiental.

## **5. Mantenimiento y actualización continua**

- Respuestas rápidas a fallos: El contrato de mantenimiento asegura una respuesta rápida ante cualquier falla en el sistema de alumbrado, lo que minimiza los períodos de oscuridad en la vía pública y mantiene la seguridad.
- Mejora continua de la infraestructura: El mantenimiento regular incluye la inspección, reparación y sustitución de las luminarias, lo que garantiza que el sistema de alumbrado público esté siempre en buen estado y funcione de manera óptima.

## **6. Impacto en el desarrollo económico**

- Atractivo para inversionistas y turistas: Las zonas bien iluminadas suelen ser más atractivas para los inversionistas, comerciantes y turistas, lo que puede favorecer el crecimiento económico local.
- Fomento del comercio local: Los comercios en áreas bien iluminadas se benefician de un mayor flujo de clientes, lo que contribuye a la actividad económica en la comunidad.

## **7. Mejor calidad visual y ambiental**

- Reducción de la contaminación lumínica: Un contrato de mantenimiento bien gestionado puede ayudar a reducir la contaminación lumínica, mediante el uso de tecnología que distribuye la luz de manera eficiente y dirige el brillo solo hacia las áreas necesarias.

- Estética y valorización urbana: La iluminación adecuada también contribuye a la estética de la ciudad, haciendo que las calles y plazas se vean más atractivas, lo que puede mejorar la percepción pública de la zona.

## 8. Fortalecimiento del sentido de comunidad

- Sensación de pertenencia: Las áreas bien iluminadas fomentan una sensación de pertenencia y seguridad entre los residentes, ya que las personas se sienten parte activa de una comunidad bien cuidada.
- Incremento en la participación ciudadana: La inversión en infraestructura pública, como el alumbrado, puede incentivar a los ciudadanos a involucrarse más en asuntos comunitarios, ya que se percibe un esfuerzo conjunto por mejorar la calidad de vida.



## 6. OTROS PROYECTOS CONTRATADOS Y QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA LA CUAL NO ES ORDENADORA DE GASTO

### Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION EN EL BARRIO GAITAN, ESCARPA NORTE, SECCIONES 1-2-3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	2021680010202	\$ 24.920.133.874,95	\$ 24.920.133.874,95

**CONTRATO DE OBRA 106 de 2023 -:** CONSORCIO GAITAN “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION EN EL BARRIO GAITAN, ESCARPA NORTE, SECCIONES 1-2-3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”

Valor del contrato:	\$ 16.639.364.368,41
Valor adicional:	\$ 8.280.769.506,54
Valor total:	\$ 24.920.133.874,95
Plazo inicial:	Trece (13) meses
Plazo adicional:	Cuatro (04) meses
Plazo total:	Diecisiete (17) meses
Fecha de inicio:	01 de agosto de 2023
Fecha de terminación:	30 de agosto de 2024

Nueva fecha de terminación: 30 de diciembre de 2024  
 Porcentaje avance: 100%

**ESTADO DEL CONTRATO:** El contrato ha finalizado, cuenta con acta de recibo final y actualmente se encuentra en trámite de liquidación.

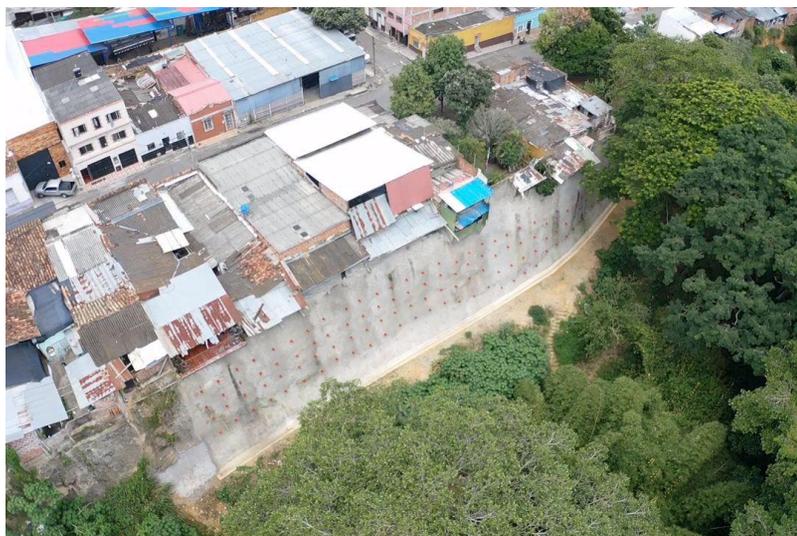


Imagen: Obra Gaitán

#### Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	2021680010201	\$ 97.160.302.596,00	\$ 97.160.302.596,00


**CONTRATO DE OBRA 104 de 2023 -:** CONSORCIO GESA “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”.

Valor del contrato: \$ 64.809.568.908,48  
 Valor adicional: \$ 32.350.733.687,52  
 Valor total: \$ 97.160.302.596,00  
 Plazo inicial: Doce (12) meses  
 Plazo adicional: Cuatro (04) meses  
 Plazo total: Dieciséis (16) meses  
 Fecha de inicio: 29 de agosto de 2023  
 Fecha de terminación: 28 de agosto de 2024  
 Nueva Fecha de terminación: 28 de diciembre de 2024  
 Porcentaje avance: 100 %

**ESTADO DEL CONTRATO:** El contrato ha finalizado, cuenta con acta de recibo final y actualmente se encuentra en trámite de liquidación.



**Imagen: Frente la Gloria**

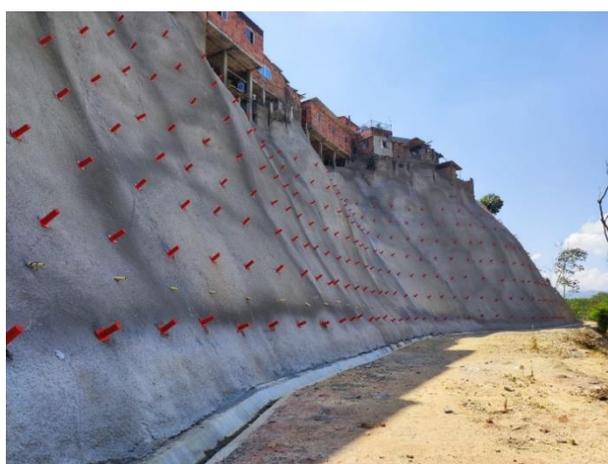

**Imagen: Frente Pablo VI**



**Imagen: Frente Nazareth**

## Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCE: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: A FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	2023680010005	\$ 40.514.056.133,00	\$ 40.514.056.133,00

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE OBRAS ADICIONALES EN LOS CAUSES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	202500000019488	\$ 20.168.495.053	\$ 20.168.495.053

**CONTRATO DE OBRA 69 de 2023 -:** **CONSORCIO LA FLORA 2023** “CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCE: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: A FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.

Valor inicial del contrato:	\$ 40.514.056.133,00
Valor adicional No 1:	\$ 20.168.495.053,00
Valor total:	\$ 60.682.551.186,00
Plazo inicial:	Dieciocho (18) meses
Plazo adicional No 1:	Un (01) mes
Plazo adicional No 2:	Cinco (05) meses
Plazo adicional No 3:	Siete (07) meses
Plazo total:	Treinta y un (31) meses
Suspensión No 1:	04/12/2024
Reinicio No 1:	11/12/2024
Fecha de inicio:	05 de mayo de 2023
Fecha de terminación:	04 de noviembre de 2024
Nueva fecha de terminación:	10 de diciembre de 2025
Porcentaje avance:	64.69%

**ESTADO DEL CONTRATO:** El contrato se encuentra actualmente en ejecución. A la fecha, se han construido 700 metros lineales de box culvert con dimensiones de 3.50 x 3.50 m, y 190 metros lineales adicionales con dimensiones de 3.00 x 3.00 m, ambos en concreto de 4.000 psi.

Se han realizado excavaciones con profundidades que van 0.0 a 2.50 metros a más de 8.0 m de profundidad, alcanzando un volumen total de 68.784 m<sup>3</sup>. Asimismo, se ha instalado una longitud de 610 metros lineales de colector correspondiente al interceptor, y se han ejecutado rellenos en zanja con una cantidad acumulada de 42.394,07 m<sup>3</sup>, tanto en las áreas laterales del nuevo box culvert como sobre la losa superior de la estructura.

Además, se han 12 sumideros: cinco (5) en la carrera 27A, dos (2) sumideros mixtos —uno en la carrera 28 y otro en la carrera 38—, cuatro (4) en la calle 73A y uno (1) en la intersección de la calle 72 con carrera 39. También se inició con la pavimentación en el barrio quebrada la iglesia hacia la carrera 30. Finalmente, se han instalado 1890 metros lineales de filtros en las laterales del box culvert construido.

### REGISTRO FOTOGRAFICO

 <p>Network: 14 feb 2025 16:10:44 GMT-0 7°35'106"N 73°6'88.9 Remark: CANALIZACI</p>	 <p>Network: 13 feb 2025 7:35:57 GMT-0 7°6'4.098"N 73°6'35.14 Bucarama Remark: CANALIZACI</p>
<p><b>Imagen:</b> Instalación tubería PVC sanitaria 18" construcción manija reposición alcantarillado sanitario entre carrera 28ª- carrera 28</p>	<p><b>Imagen:</b> Construcción empalme a estructura de separación no.06 carrera 31 con calle 73 abscisa k4+745</p>
 <p>Network: 10 feb 2025 10:47:14 GMT-05:00 7°55'55"N 73°6'35.75W Bucaramanga Remark: CANALIZACION</p>	 <p>27 Jun, 2025 12:40:44 p. m. 7°30'00"N 73°11'01"W Bucaramanga CANALIZACION-BGA</p>
<p><b>Imagen:</b> Construcción sumidero carrera 27ª barrio san Martín</p>	<p><b>Imagen:</b> Pavimento rígido calle 73 barrio san Martín</p>

#### Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
<p><b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL BARRIO LA FERIA, ASENTAMIENTO CAMILO TORRES Y CUYANITA ETAPA 1. UBICADOS EN LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER</b></p>	<p>2024680010080</p>	<p>\$ 41.077.907.229,00</p>	<p>\$ 41.077.907.229,00</p>

**CONTRATO DE OBRA 226 de 2024 – MANUEL GUILLERMO CAMACHO CARVAJAL**  
**“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL BARRIO LA FERIA, ASENTAMIENTO CAMILO TORRES Y CUYANITA ETAPA 1. UBICADOS EN LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”.**

Valor del contrato:	\$ 27.395.301.404,00
Valor adicional No 1:	\$ 13.682.605.825,00
Valor total:	\$ 41.077.907.229,00
Plazo inicial:	Quince (15) meses
Plazo adicional No 1:	Siete (07) meses
Plazo total:	Veintidós (22) meses
Fecha de inicio:	17 de diciembre de 2024
Fecha de terminación:	16 de marzo de 2026
Nueva fecha de terminación:	16 de octubre de 2026
Porcentaje avance:	15.04%

**ESTADO DEL CONTRATO:** El contrato se encuentra en ejecución. A la fecha, se han desarrollado actividades preliminares como instalación de campamentos, replanteo, desmonte, descapote y cerramiento perimetral, lo que ha permitido adecuar el terreno para las siguientes fases del proyecto.

Se verificó la ejecución de excavaciones a tajo abierto con maquinaria pesada, así como el acarreo y disposición final de escombros. También se realizaron sobreacarreos internos y se avanzó en la instalación del sistema de estabilización, incluyendo anclajes de tipo 3 cables y encamisado de perforaciones horizontales.

Adicionalmente, se ejecutaron perforaciones horizontales para anclajes con longitudes entre 0.00 y 20.00 m, y perforaciones horizontales para anclajes con profundidades mayores a 20.00 m, utilizando equipos adecuados que permitieron cumplir con las exigencias técnicas de alineación, diámetro y profundidad establecidas en el diseño. La interventoría realizó seguimiento técnico en campo, validando procedimientos, volúmenes y condiciones de seguridad, con soporte en registros fotográficos.

	
<p><b>Imagen:</b> Perforación de anclajes</p>	<p><b>Imagen:</b> Movimiento de tierra</p>



**Imagen:** Figurado de acero refuerzo



**Imagen:** Localización y replanteo de nuevos anclajes

### Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION DEL BARRIO LA FERIA, ASENTAMIENTO CAMILO TORRES Y CUYANITA ETAPA 1. UBICADOS EN LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER".	2024680010080	\$ 29.437.439.078,00	\$ 41.798.583.724,00

### Descripción de actividades desarrolladas

**CONTRATO No 286 DE 2024** "CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION DEL BARRIO LA FERIA, ASENTAMIENTO CAMILO TORRES Y CUYANITA ETAPA 1. UBICADOS EN LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER".

<b>CONTRATO:</b>	226
<b>FECHA DEL CONTRATO:</b>	03/12/2024
<b>TIPOLOGÍA DEL CONTRATO O CONVENIO:</b>	CONTRATO DE OBRA
<b>MODALIDAD DE SELECCIÓN DE CONTRATO:</b>	URGENCIA MANIFIESTA
<b>OBJETO:</b>	"CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION DEL BARRIO LA FERIA, ASENTAMIENTO CAMILO TORRES Y CUYANITA ETAPA 1. UBICADOS EN LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
<b>CONTRATISTA</b>	<b>: MANUEL GUILLERMO CAMACHO CARVAJAL</b>
<b>SUPERVISOR</b>	<b>: JM CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.S</b>
<b>VALOR FISCAL</b>	<b>: \$27.395.301.404,00</b>
<b>VALOR ADICIONAL</b>	<b>: \$13.682.605.825,00</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>: \$ 41.077.907.229,00</b>

<b>PLAZO</b>	<b>: QUINCE (15) MESES</b>
<b>PLAZO ADICIONAL</b>	<b>: SIETE (7) MESES</b>
<b>TOTAOL PLAZO</b>	<b>: 22 MESES</b>
<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>: 17 DE DICIEMBRE DE 2024</b>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<b>: 16 DE JULIO DE 2025</b>
<b>NUEVA FECHA DE TERMINACION</b>	<b>: 16 DE COTUBRE DE 2026</b>
Estado del Contrato	: EJECUCIÓN
Porcentaje avance	: 10%

#### **Ubicación:**

La zona en estudio se encuentra localizada en el barrio denominado La Feria del municipio de Bucaramanga, Santander. Este sector, ubicado sobre la escarpa occidental de la ciudad, ha sido objeto de transformaciones significativas debido a las consolidaciones urbanísticas realizadas a lo largo del tiempo. Adicionalmente, el manejo inadecuado de agentes detonantes erosivos, como la lluvia, ha contribuido al deterioro progresivo de la escarpa. Estas condiciones culminaron en un deslizamiento ocurrido en marzo de 2023, que provocó la pérdida de la banca en una vía interna del barrio, situación que requiere la atención técnica y seguimiento adecuado para garantizar la estabilidad del área intervenida.

#### **ALCANCE:**

#### **INICIO DE OBRAS LADERA JUNTO A VIVIENDAS CALLE 25 N 1A BARRIO LA FERIA EN BUCARAMANGA**

##### **1. Condiciones Actuales del Terreno**

- La ladera en el costado norte presenta viviendas construidas en la parte alta.
- No se han registrado movimientos históricos significativos en el terreno.
- Se considera una zona en condición de riesgo, pero estable hasta la fecha.

##### **2. Justificación de la Intervención**

- Las obras buscan mitigar el riesgo de deslizamientos, erosión o colapsos.
- Se trata de una prioridad para la seguridad de viviendas, vías y habitantes del sector.
- Previene posibles emergencias y afectaciones a infraestructura vial.

##### **3. Características del Proyecto**

- Obras pasivas y localizadas: uso de anclajes y elementos de contención.
- No se contemplan cortes significativos ni alteración de la geometría del talud.
- Se basan en estudios geotécnicos que garantizan la estabilidad del terreno.

##### **4. Evaluación de Riesgos**

- Se requiere desalojo preventivo de una vivienda ubicadas en la parte alta.
- El riesgo se mantiene en niveles aceptables si se siguen protocolos de seguridad.
- Se recomienda:
  - Monitoreo constante del talud durante la ejecución de las obras.
  - Cumplimiento estricto de las especificaciones técnicas del diseño.



**IMAGEN No 1 . ELABORACION DE PARRILLAS DE ACERO PARA ANCLAJES**



**IMAGEN No 2 . PERFORACIONES E INSTALACION DE ANCLAJES**

### **RESTAURACIÓN DEL COLISEO PERALTA INMUEBLE DECLARADO BIEN DE INTERESES CULTURales DE ÁMBITO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.**

Para la recuperación integral del Coliseo, fue necesario realizar gestiones para elaborar estudios técnicos y un proyecto de intervención como base para futuras obras. En 2023, el Ministerio de Cultura incluyó en su plan de acción recursos por el orden de quinientos millones de pesos (\$500.000.000) para iniciar la recuperación del BICN. Como contrapartida, la Alcaldía de Bucaramanga aportó trescientos millones de pesos (\$300.000.000) para cofinanciar la elaboración de los estudios técnicos y la interventoría de los mismos. El consultor ya hizo entrega de los productos de la consultoría, pero estos se encuentran en la etapa de aprobación por parte del Ministerio de Cultura.

A la fecha, no se ha producido un pronunciamiento por parte del gobierno Nacional. Por tanto, se ha tenido que prorrogar la suspensión No. 2 del 29 de mayo de 2024 hasta el 28 de agosto de 2025, a la espera del pronunciamiento de viabilidad del proyecto, documento soporte para la expedición de la licencia de construcción del proyecto. Estos dos documentos son hitos de cumplimiento para la finalización de los contratos derivados del convenio 3985 de 2023. La consultoría una vez recibida la documentación legal y culminadas las observaciones del ministerio de Cultura, realizó el cargue del proyecto a la plataforma SIPA el 25 de marzo de 2025, el cargue de la información técnica y jurídica del Teatro Coliseo Peralta, a la plataforma SIPA del Ministerio de Cultura, en respuesta a las observaciones realizadas mediante radicado MC20234E2024 – SIPA, tal como fue

informado a la informado a la interventoría mediante comunicado INGI-50250-021-25. A continuación, la información del convenio y contratos derivados:

### Convenio Interadministrativo No. 3985-2023

<b>Objeto</b>	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la recuperación del Coliseo Peralta – Bien de Interés Cultural de ámbito Nacional – Decreto 292 del 24 de febrero de 1975, en el municipio de Bucaramanga, Santander
<b>Fecha de suscripción</b>	28 de junio de 2023
<b>Valor total</b>	\$ 800.000.000

#### Aportes

<b>Ministerio de Cultura</b>	\$500.000.000
<b>Total aporte Ministerio</b>	\$500.000.000
<b>Municipio de Bucaramanga</b>	\$300.000.000
<b>Total aporte Departamento</b>	\$300.000.000
<b>Plazo de ejecución</b>	
<b>Fecha de inicio</b>	19 de julio de 2023
<b>Término de ejecución</b>	Hasta el 31 de octubre del 2025

#### Supervisión

<b>Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes</b>	Arquitecta Lina María Rosales Suárez. Supervisora convenio.
<b>Municipio de Bucaramanga Secretaría de Infraestructura</b>	Edgar Yamitd Pinto Hernández. Supervisor convenio.

#### Contratos derivados del convenio:

#### DATOS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 253 DE 2023

<b>DEPENDENCIA</b>	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA BUCARAMANGA	
<b>No. DE CONTRATO Y FECHA</b>	253 del 29 de septiembre de 2023	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	CONTRATO DE CONSULTORIA	
<b>CONTRANTE</b>	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0	
<b>OBJETO</b>	ESTUDIO Y DISEÑO PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL COLISEO PERALTA INMUEBLE DECLARADO BIEN DE INTERESES CULTURAL DE ÁMBITO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	
<b>CONTRATISTA</b>	<b>NOMBRE</b>	ING INGENIERIA S.A.S
	<b>C.C/ NIT</b>	890405995
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	<b>NOMBRE</b>	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA
	<b>C.C</b>	73.106127
<b>ORDENADOR DEL GASTO</b>	<b>NOMBRE</b>	JORGE ALEJANDRO GARCÍA HENAO
	<b>CARGO</b>	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
	<b>C.C</b>	79.942.137 DE BOGOTÁ D.C.

<b>INTERVENTOR</b>	<b>NOMBRE</b>	CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCIONES SAS, Representante legal Interventoría: CARLOS GABRIEL CAMACHO OBREGÓN,
	<b>NIT.</b>	900.160.387-5
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$ 625.069.999	APORTE MUNICIPIO: \$125.069.999,00
		APORTE MIN CULTURA: \$500.000.000,00
<b>VALOR ADICIONADO</b>	\$ 0,00	APORTE MUNICIPIO: N/A
		APORTE CONVENIDO: N/A
<b>ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (CONTRATO) O DESEMBOLSO (CONVENIO) (30%)</b>	N.A	
<b>CDP</b>	NÚMERO: 6209	
	FECHA: 03 de marzo de 2023	
<b>RP</b>	NÚMERO: 12220	
	FECHA: 05 de octubre de 2023	
<b>PLAZO DEL CONTRATO</b>	Fecha de Inicio:	23 de octubre de 2023
	Fecha de finalización Inicial:	1 de junio de 2024
	Fecha de suspensión:	29 de Mayo de 2024
	Duración:	Cinco (05) MESES
<b>PORCENTAJE DE AVANCE</b>	<b>DE</b> % FISCO	90%
	% FINANCIERO	0%

### REGISTRO FOTOGRAFICO

	
Estado Fachada Actual	Estado Interior de la edificación.



## 7. ACCIONES POPULARES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

### i. AP 2020-004 "PASEO ESPAÑA"

**Radicado:** 68001333300120200000400

**Título del Caso:** PASEO ESPAÑA

**Resumen Pretensiones:** *ORDENAR AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA realizar la recuperación, mantenimiento y/o reposición de todas y cada una de las 29 bancas ubicadas en el "paseo España" en la carrera 26 entre calles 32 y 37.*

### Registro Fotográfico:





	
<p>Excavación manual para caja de barraje MT en carrera 26 calle 33 frente a parqueadero spa.</p>	<p>Construcción de caja de telecomunicaciones en andén occidental carrera 26 calle 36 al frente de edificio Fénix.</p>
	
<p>Instalación de formaleta de tapa para caja de barraje MT en intersección calle 35 al costado de edificio Akary</p>	<p>Construcción de caja de telecomunicaciones en andén occidental carrera 26 calle 36 al frente de edificio Fénix.</p>
	
<p>Instalación de acero de refuerzo para viga de contenedor de raíces en andén occidental carrera 26 calle 36 – 14 frente a DROSAN.</p>	<p>Construcción de caja de telecomunicaciones en andén occidental carrera 26 calle 36 al frente de edificio Fénix.</p>
	
<p>Armado de acero de refuerzo para caja de barraje MT en carrera 26 calle 33 frente a parqueadero spa.</p>	<p>Instalación de formaleta de tapa para caja de barraje MT en intersección calle 35.</p>

Estado Actual:

**CONTRATO 387-2022**

CONTRATO No.	387-2022
PLAZO INICIAL	DIEZ (10) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
PLAZO ACTUAL	VEINTÍ TRES (23) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
CONTRATISTA	COINOBRAS S.A.S
	NIT. 804.000.152-8 MILTON VILLARREAL MURILLO
INTERVENTOR	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
	NIT. 890.201.213-4
	R.L. HERNÁN PORRAS DÍAZ Administrador delegado UIS. Ing. Miller Humberto Salas Rondón Dir. Interventoría. Ing. Ricardo Andrés Sanz Londoño
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	21 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL:	20 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	12 DE NOVIEMBRE DE 2025

**AVANCE EN EL CRONOGRAMA**

**AVANCE EN EL CRONOGRAMA: (45,87%) / (42,48%), diferencia de 3,39%**

PERIODO DE TIEMPO	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	% PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO
FEBRERO 2023	\$ 1,263,604.65	\$ 1,263,604.65	0.01%	\$ -	\$ -	0.00%
MARZO 2023	\$ 9,384,403.79	\$ 10,648,008.44	0.10%	\$ -	\$ -	0.00%
ABRIL 2023	\$ 726,461.67	\$ 11,374,470.11	0.10%	\$ 20,294,588.37	\$ 20,294,588.37	0.18%
MAYO 2023	\$ 590,175.59	\$ 11,964,645.70	0.11%	\$ 191,690,447.37	\$ 39,464,035.44	0.35%
JUNIO 2023	\$ 571,137.67	\$ 12,535,783.37	0.11%	\$ -	\$ 39,464,035.44	0.35%
JULIO 2023	\$ 590,175.59	\$ 13,125,958.96	0.12%	\$ 3,753,315.44	\$ 43,217,350.88	0.39%
AGOSTO 2023	\$ 22,666,354.53	\$ 35,792,313.49	0.32%	\$ 148,764,091.21	\$ 148,764,091.21	1.33%
SEPTIEMBRE 2023	\$ 190,240,307.01	\$ 226,032,620.50	2.03%	\$ 141,178,581.07	\$ 289,942,672.28	2.60%
OCTUBRE 2023	\$ 219,954,457.15	\$ 445,987,077.65	4.00%	\$ 103,799,895.64	\$ 393,742,672.28	3.53%
NOVIEMBRE 2023	\$ 605,336,214.06	\$ 1,051,323,291.71	9.43%	\$ 1,047,397,760.58	\$ 1,441,140,328.50	12.93%
DICIEMBRE 2023	\$ 644,458,889.44	\$ 1,695,782,181.15	15.21%	\$ 568,727,691.84	\$ 2,009,868,020.34	18.03%
AGOSTO 2024	\$ 104,930,071.34	\$ 1,800,712,252.49	16.15%	\$ 167,292,129.35	\$ 2,177,160,149.69	19.53%
SEPTIEMBRE 2024	\$ 365,735,846.56	\$ 2,166,448,099.05	19.43%	\$ 467,379,288.84	\$ 2,644,539,438.53	23.72%
OCTUBRE 2024	\$ 357,494,698.39	\$ 2,523,942,797.44	22.64%	\$ 404,016,983.33	\$ 3,048,556,421.86	27.34%
NOVIEMBRE 2024	\$ 96,852,549.37	\$ 2,620,795,346.81	23.51%	\$ 210,435,744.09	\$ 3,258,992,165.95	29.23%
DICIEMBRE 2024	\$ 82,978,635.64	\$ 2,703,773,982.45	24.25%	\$ 169,825,512.75	\$ 3,428,817,678.70	30.76%
MARZO 04 DE 2025 A MARZO 13 DE 2025	\$ 41,984,362.72	\$ 2,745,758,345.17	24.63%	\$ 25,641,033.38	\$ 3,454,458,712.08	30.99%
MARZO 14 DE 2025 A ABRIL 12 DE 2025	\$ 477,926,260.07	\$ 3,223,684,605.24	28.92%	\$ 128,920,468.28	\$ 3,583,379,180.36	32.14%
ABRIL 13 DE 2025 A MAYO 12 DE 2025	\$ 917,383,949.01	\$ 4,141,068,554.25	37.14%	\$ 521,893,115.01	\$ 4,105,272,295.37	36.82%
MAYO 13 DE 2025 A JUNIO 12 DE 2025	\$ 973,145,583.38	\$ 5,114,214,137.63	45.87%	\$ 630,237,991.89	\$ 4,735,510,287.26	42.48%

## INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTO

### 10.7.2. Presupuesto programado Vs presupuesto ejecutado

A continuación, se presenta un cuadro de relación de presupuesto programado vs presupuesto ejecutado en base a la programación y cronograma de obra aprobada esta interventoría, la cual va desde febrero de 2023 que corresponde al mes en que inició el contrato y hasta el 12 de junio de 2025.

<b>AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO</b>	\$5.114.214.137,63
<b>AVANCE FINANCIERO EJECUTADO</b>	\$4.735.510.287,26
<b>ATRASO</b>	\$378.703.850,37

**Tabla 20. Avance financiero de la obra a corte de 12 de junio de 2025**

<b>(%) AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO</b>	45,87%
<b>(%) AVANCE FINANCIERO EJECUTADO</b>	42,48%
<b>(%) ATRASO</b>	3,40%

### CONCLUSIONES INTERVENTORÍA

Las condiciones de seguimiento financiero que se tuvieron durante el desarrollo del contrato con fecha de corte del **12 de junio de 2025** son: se tiene un valor ejecutado acumulado igual a \$4.735.510.287,26 pesos moneda corriente, en donde la inversión programada correspondía a un valor igual a \$5.114.214.137,63 moneda corriente, por consiguiente el porcentaje de obra ejecutado reportado es igual a 42,48% contra un 45,87% según programación de obra, dando un indicador de alerta en atraso en el avance de las obras igual a 3,40%.

De acuerdo a los PERFILES VIALES de la CARRERA 26 No. 36-14 y calle 37 No. 26-15", se realizó la revisión en campo con el equipo de topografía del contratista y la interventoría y se constataron los paramentos y las áreas de intervención en lo que corresponde a la Carrera 26 entre Calles 36 y 37 respectivamente.

ii. AP 2018-267 “CANCHA CAFÉ MADRID”

**Radicado:** 68001333300720180026700

**Título del Caso:** ESCENARIOS DEPORTIVOS “CAFÉ MADRID”

**Resumen Pretensiones:** *ORDENAR AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA:*

- Adelante las intervenciones y/o modificaciones constructivas a que haya lugar en el parque del barrio Café Madrid
- Realice una revisión de las afectaciones que existan al interior de las viviendas del sector de la Calle 37 BN peatonal y la Cale 8ª Bis peatonal del barrio Café Madrid, generadas por el ingreso y acumulación de aguas lluvias, así como las adecuaciones tendientes a corregir aquellas que se detecten.
- En coordinación con la Junta de Acción Comunal del Barrio Café Madrid adelante campañas de concientización ciudadana en el uso del escenario deportivo y recreacional- parque Café Madrid”

**Estado actual:**



**Ahora:** El proyecto de intervención del escenario deportivo se encuentra estructurado por parte del equipo técnico de la Secretaría de Infraestructura y actualmente nos encontramos atendiendo unas observaciones de la Secretaria de Planeación para proceder a su radicación y la expedición del correspondiente BPIN.

**Diseño Projectado:**



iii. AP 2018-663 “CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA Y QUEBRADA LA IGLESIA”

**Radicado:** 68001233300020180066300

**Título del Caso:** CANALIZACIÓN QUEBRADA LA FLORA Y QUEBRADA LA IGLESIA

**Resumen Pretensiones:** *ORDENAR AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA ejecución del proyecto “Canalización Quebrada La Flora y Quebrada La Iglesia parte alta, y el Interceptor la Iglesia parte alta, que nace de la confluencia de los Interceptores de la Cascada y la Flora II”.*


**Estado actual:**

<b>CONTRATO DE OBRA No. 69 DEL 14 DE ABRIL DE 2023</b>	
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA FLORA 2023
VALOR INICIAL:	\$ 40.514.056.113
VALOR ADICIONAL:	\$ 20.168.495.053
<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>\$ 60.682.551.186</b>
<b>% DE LA ADICIÓN:</b>	<b>49,78%</b>
FECHA DE INICIO:	05 DE MAYO DE 2023
PLAZO INICIAL:	18 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	04 DE NOVIEMBRE DE 2024
PLAZO ADICIONAL No 1 (01/11/2024):	1 MESES
PLAZO ADICIONAL No 2 (11/12/2024):	5 MESES
PLAZO ADICIONAL No 3 (09/05/2025):	7 MESES
PLAZO TOTAL	31 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN No 1	04 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE REINICIO No 1	11 DE DICIEMBRE DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	10 DE DICIEMBRE DE 2025

<b>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 85 DEL 26 DE ABRIL DE 2023</b>	
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA CANALIZACION BGA
VALOR INICIAL:	\$ 2.485.943.885
VALOR ADICIONAL No 1:	\$ 690,539,968
VALOR ADICIONAL No 2:	\$ 966.755.956
<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>\$ 4.143.239.809</b>
<b>% DE LA ADICIÓN:</b>	<b>66,67%</b>
FECHA DE INICIO:	05 DE MAYO DE 2023
PLAZO INICIAL:	18 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	04 DE NOVIEMBRE DE 2024
PLAZO ADICIONAL No 1 (01/11/2024):	1 MESES
PLAZO ADICIONAL No 2 (11/12/2024):	5 MESES
PLAZO ADICIONAL No 3 (09/05/2025):	7 MESES
PLAZO TOTAL	31 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN No 1	04 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE REINICIO No 1	11 DE DICIEMBRE DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	10 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	% EJECUCIÓN OBRA
05/05/2023	10/12/2025	64.69%

**Registro Fotográfico Estado Actual:**

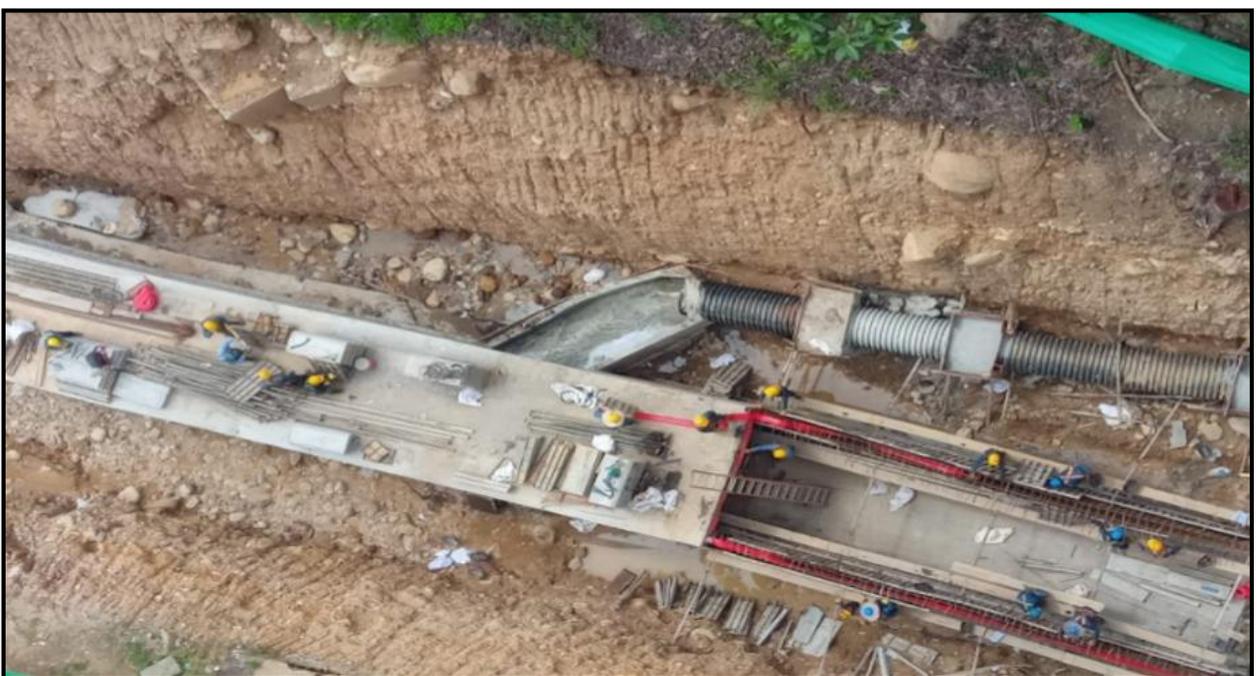



iv. AP 2022-00267 “PUENTE ARTESANAL VILLA HELENA”

**Radicado:** 680013333004202210026700

**Título del Caso:** PUENTE ARTESANAL VILLA HELENA

**Resumen Orden Judicial:** *ORDENAR al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA adopte y ejecute las medidas administrativas y los controles que sean necesarios sobre sobre el puente artesanal ubicado en el barrio Villa Helena (sector calle 19N con carrera 2) que comunica la invasión del costado norte del río Surata y se tomen las decisiones pertinentes respecto de la misma. Si como resultado de dichas medidas y controles, el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA encuentra que la solución más adecuada es retirar el puente artesanal, deberá hacerlo sin mayores dilaciones.*

**Estado actual:**

El día 11 de abril de 2025 se procedió a realizar el desmonte del puente artesanal toda vez que la estructura representaba un peligro para la comunidad que lo usaba.

## Registro Fotográfico:

### Antes:



Puente peatonal artesanal ubicado en el barrio Villa Helena



Puente peatonal artesanal ubicado en el barrio Villa Helena



Puente peatonal artesanal ubicado en el barrio Villa Helena



Puente peatonal artesanal ubicado en el barrio Villa Helena


### Ahora:



Actividades de desmonte de puente peatonal artesanal ubicado en el barrio Villa Helena



Actividades de desmonte de puente peatonal artesanal ubicado en el barrio Villa Helena

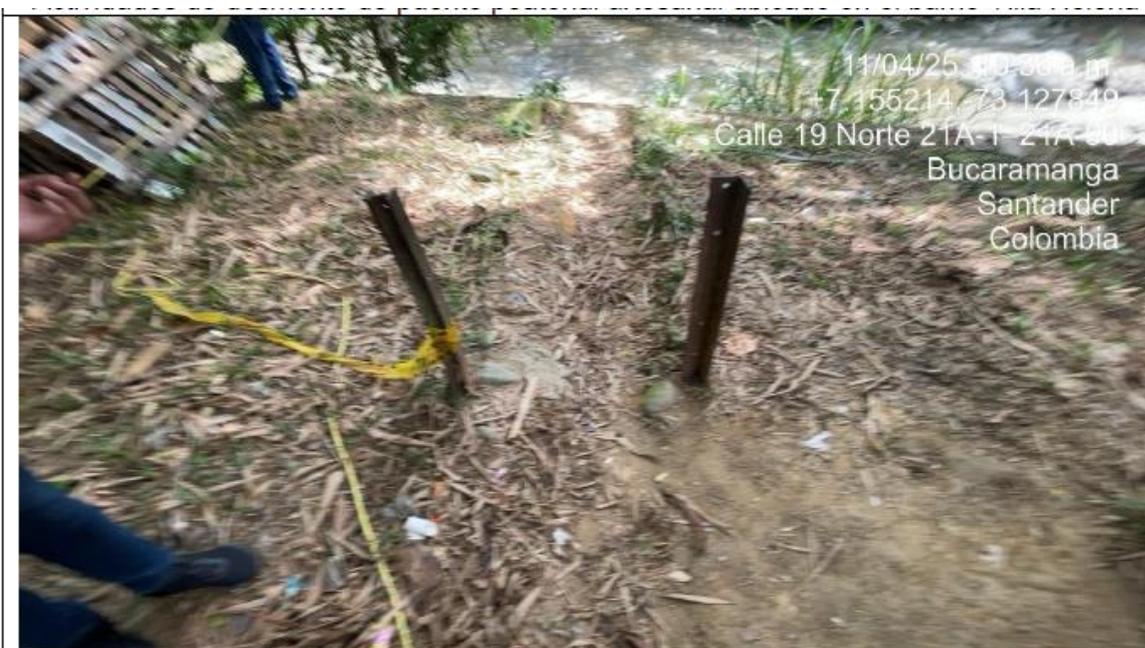

Actividades de desmonte de puente peatonal artesanal ubicado en el barrio Villa Helena

v. AP 2022-00285 “PARQUE TURBAY – PARTE OCCIDENTAL”

**Radicado:** 68001333300920220028500

**Título del Caso:** PUENTE ARTESANAL VILLA HELENA

**Resumen Orden Judicial:** *ORDENASE al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA realizar en la sección occidental del PARQUE TURBAY, ubicado en la carrera 27 entre calles 50 y 51, lo siguiente:*


- *Desinstalar las baldosas de la sección occidental del PARQUE TURBAY de los tramos que presentan ondulaciones.*

- *Realizar la intervención correspondiente para nivelar el terreno y eliminar la causa de la ondulación.*
- *Instalar las losas nuevas, que cumpla con las características técnicas necesarias que permitan el paso seguro de todos los peatones, incluyendo las personas con limitaciones visuales y motrices*

**Estado actual:**

Durante la semana del 26 al 30 de mayo de 2025, se llevaron a cabo labores de renivelación de losetas en los andenes perimetrales del Parque Benjamín Herrera – Parque Turbay – Parte Occidental. Estas intervenciones se enfocaron en corregir los desniveles detectados en diversos tramos, los cuales representaban un potencial riesgo para el tránsito seguro de los peatones, especialmente para personas con movilidad reducida. Adicionalmente, se ejecutaron actividades de mantenimiento general y embellecimiento del área verde, incluyendo el pintado de los bordillos de los andenes internos, con el fin de mejorar la visibilidad para personas con baja visión. Asimismo, se desarrolló una jornada integral de aseo y limpieza en todo el parque



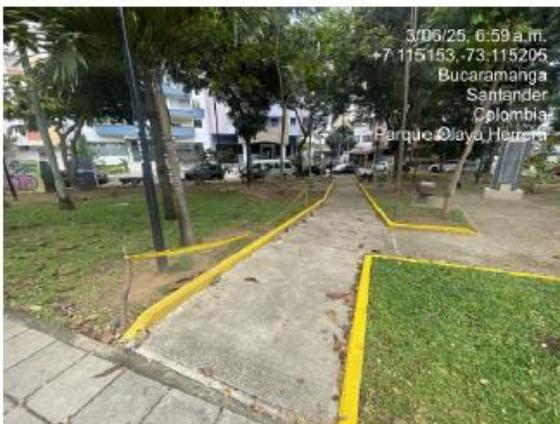



## ANEXO

- PRESUPUESTOS EJECUTADOS (Ejecución presupuestal)
- GASTO (Relación personal)
- GASTOS (Relación de Inversión)





Rubro	Descripción Rubro	MODIFICACIONES						TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Pagar	% Ejecucion		
		Presupuesto Inicial	Adicion	Credito	Contracredito	Modificaciones Acumuladas	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados				Obligaciones	Pagos Acumulados
		1,00				2,00	3 = 1 + 2	5,00	7,00				9,00	10 = 3 - 5
80010049.2.4599031.	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	\$ 2.500.000.000,00	\$ -	\$ 150.800.000,00	\$ -	\$ 150.800.000,00	\$ 2.650.800.000,00	\$ 2.610.516.666,66	\$ 2.580.816.666,66	\$ 1.506.633.333,30	\$ 1.439.733.333,30	\$ 40.283.333,34	\$ 1.074.183.333,36	97,35
80010049.2.4599031.	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501	\$ -	\$ 903.957.000,00	\$ -	\$ -	\$ 903.957.000,00	\$ 903.957.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 903.957.000,00	\$ -	0
<b>RUBRO</b>	<b>OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P</b>													
80010049.2.4599031.	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N C.P. 201	\$ 3.500.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 593.728.570,00	\$ (593.728.570,00)	\$ 2.906.271.430,00	\$ 2.893.271.430,00	\$ 2.869.271.430,00	\$ 1.537.383.332,97	\$ 1.518.883.332,97	\$ 13.000.000,00	\$ 1.331.888.097,03	98,72
80010049.2.4599031.	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501	\$ -	\$ 830.664.000,00	\$ -	\$ -	\$ 830.664.000,00	\$ 830.664.000,00	\$ 56.711.902,99	\$ 5.011.902,99	\$ -	\$ -	\$ 773.952.097,01	\$ 5.011.902,99	0,6
<b>RUBRO</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P</b>													
80010049.2.4599031.	OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 201	\$ 700.000.000,00	\$ -	\$ 107.000.000,00	\$ -	\$ 107.000.000,00	\$ 807.000.000,00	\$ 737.160.000,00	\$ 719.880.000,00	\$ 419.006.666,65	\$ 409.006.666,65	\$ 69.840.000,00	\$ 300.873.333,35	89,2
80010049.2.4599031.	OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 501	\$ -	\$ 219.881.000,00	\$ -	\$ -	\$ 219.881.000,00	\$ 219.881.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 219.881.000,00	\$ -	0
	<b>FONDO PARA EL ESPACIO PUBLICO</b>													
	<b>LINEA 3. TERRITORIO SEGURO Y SOSTENIBLE</b>													
	<b>VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>													
	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>													
	<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>													
	<b>CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION</b>													
<b>RUBRO</b>	<b>CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES</b>													
80010050.2.4002020.	CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 282	\$ 1.224.198.361,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.224.198.361,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.224.198.361,00	\$ -	0
80010076.2.4002020.	CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 232	\$ 1.040.039.097,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.040.039.097,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.040.039.097,00	\$ -	0
	<b>FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRUBUCION DEL INGRESO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA</b>													
	<b>LINEA 2. TERRITORIO SEGURO QUE PROGRESA</b>													
	<b>VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>													
	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>													
	<b>A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS</b>													
	<b>SUBVENCIONES PARA SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO</b>													
<b>RUBRO</b>	<b>SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>													
24680010048.1.40030	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 215	\$ 4.623.355.784,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.623.355.784,00	\$ 1.604.098.521,00	\$ 1.604.098.521,00	\$ 1.604.098.521,00	\$ 1.604.098.521,00	\$ 3.019.257.263,00	\$ -	34,69
24680010048.1.40030	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 228	\$ 40.801.926,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.801.926,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.801.926,00	\$ -	0
<b>RUBRO</b>	<b>SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>													
24680010048.1.40030	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 215	\$ 2.013.361.364,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.013.361.364,00	\$ 493.307.919,00	\$ 493.307.919,00	\$ 414.744.477,00	\$ 414.744.477,00	\$ 1.520.053.445,00	\$ 78.563.442,00	24,5
24680010048.1.40030	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 228	\$ 40.801.926,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.801.926,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.801.926,00	\$ -	0
<b>RUBRO</b>	<b>SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>													
24680010048.1.40030	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 215	\$ 3.633.910.195,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.633.910.195,00	\$ 2.059.869.916,00	\$ 2.059.869.916,00	\$ 1.696.217.677,00	\$ 1.325.231.075,00	\$ 1.574.040.279,00	\$ 363.652.239,00	56,68
24680010048.1.40030	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 228	\$ 40.801.926,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.801.926,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.801.926,00	\$ -	0
	<b>MINIMO VITAL</b>													
	<b>SUBSIDIOS DE ASEO</b>													
<b>RUBRO</b>	<b>SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>													
24680010048.1.40030	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 215	\$ 737.362.620,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 737.362.620,00	\$ 168.590.438,00	\$ 168.590.438,00	\$ 168.590.438,00	\$ 168.590.438,00	\$ 568.772.182,00	\$ -	22,86
24680010048.1.40030	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 228	\$ 81.603.851,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 81.603.851,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 81.603.851,00	\$ -	0
24680010048.1.40030	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 260	\$ 100.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.000.000,00	\$ -	0
24680010048.1.40030	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 268	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ -	0
	<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>													
	<b>LINEA 3. TERRITORIO SEGURO Y SOSTENIBLE</b>													
	<b>MINAS Y ENERGIA</b>													
	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>													
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>													
	<b>PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO</b>													
<b>RUBRO</b>	<b>CUADROS PANELES CONSOLAS ARMARIOS Y DEMAS SOPORTES EQUIPADOS PARA EL CORTE SECCIONAMIENTO PROTECCION DERIVACION EMPALME O CONEXION DE CIRCUITOS ELECTRICOS PARA CONTROL Y DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD DE VOLTAJES NO SUPERIORES A 1000 V</b>													
80010113.2.2102062.4621301.226	CUADROS PANELES CONSOLAS ARMARIOS Y DEMAS SOPORTES EQUIPADOS PARA EL CORTE SECCIONAMIENTO PROTECCION DERIVACION EMPALME O CONEXION DE CIRCUITOS ELECTRICOS PARA CONTROL Y DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD DE VOLTAJES NO SUPERIORES A 1000 V	\$ 3.000.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000.000,00	\$ -	0
	<b>LINEA 5. TERRITORIO SEGURO QUE PROTEGE</b>													
	<b>MINAS Y ENERGIA</b>													
	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>													
	<b>ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS</b>													
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>													
	<b>OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO</b>													
<b>RUBRO</b>	<b>PAPEL BOND</b>													
80010192.2.2102069.	PAPEL PARA IMPRESORA O FOTOCOPIADORA 226	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.000.000,00	\$ -	0



Rubro	Descripción Rubro	MODIFICACIONES						Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS			Presupuesto Disponible	Saldo Por Pagar	% Ejecucion
		Presupuesto Inicial	Adicion	Credito	Contracredito	Modificaciones Acumuladas	Presupuesto Definitivo			Obligaciones	Pagos Acumulados				
		1,00				2,00	3 = 1 + 2			5,00	7,00	9,00			
80010189.2.2102069.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE 226	\$ 2.000.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000.000,00	\$ 1.523.724.189,58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 476.275.810,42	\$ -	0	
<b>RUBRO</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P</b>														
80010192.2.2102069.	OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 226	\$ 370.700.000,00	\$ -	\$ 200.000.000,00	\$ -	\$ 200.000.000,00	\$ 570.700.000,00	\$ 261.150.000,00	\$ 195.750.000,00	\$ 59.613.333,33	\$ 52.263.333,33	\$ 309.550.000,00	\$ 136.136.666,67	34,29	
80010192.2.2102069.	OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 526	\$ -	\$ 300.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 300.000.000,00	\$ 300.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.000.000,00	\$ -	0	
<b>RUBRO</b>	<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES N C P</b>														
80010192.2.2102069.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES N.C.P. 226	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ -	0	
<b>RUBRO</b>	<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BATERIAS Y ACUMULADORES ELECTRICOS.</b>														
80010192.2.2102069.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BATERIAS Y ACUMULADORES ELECTRICOS 226	\$ 10.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000,00	\$ 7.592.200,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.407.800,00	\$ -	0	
<b>RUBRO</b>	<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION.</b>														
80010189.2.2102069.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION 226	\$ 17.568.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.568.000.000,00	\$ 15.899.234.950,46	\$ 2.206.437.052,18	\$ 431.482.214,73	\$ 223.212.983,34	\$ 1.668.765.049,54	\$ 1.774.954.837,45	12,55	
<b>RUBRO</b>	<b>SERVICIOS DE SOPORTE EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TI</b>														
80010205.2.2106033.	SERVICIOS DE SOPORTE EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (TI)	\$ 650.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 650.000.000,00	\$ 595.583.602,32	\$ 277.556.919,00	\$ -	\$ -	\$ 54.416.397,68	\$ 277.556.919,00	42,7	
80010205.2.2106033.	SERVICIOS DE SOPORTE EN TECNOLOGAS DE LA INFORMACION TI 526	\$ -	\$ 300.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 300.000.000,00	\$ 300.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.000.000,00	\$ -	0	
<b>RUBRO</b>	<b>SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES</b>														
<b>RUBRO</b>	<b>SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>														
80010082.2.2102069.	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 226	\$ 1.053.996.388,00	\$ -	\$ -	\$ 1.053.996.388,00	\$ (1.053.996.388,00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	
80010226.2.2102069.	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 226	\$ 22.446.003.612,00	\$ -	\$ -	\$ 22.446.003.612,00	\$ (22.446.003.612,00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	
<b>TOTAL INFORME SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA</b>		<b>\$ 211.437.078.952,00</b>	<b>\$ 15.535.514.774,43</b>	<b>\$ 58.968.445.322,29</b>	<b>\$ 65.007.511.585,16</b>	<b>\$ 9.496.448.511,56</b>	<b>\$ 220.933.527.463,56</b>	<b>\$ 135.482.690.905,39</b>	<b>\$ 77.060.248.497,68</b>	<b>\$ 22.919.944.379,63</b>	<b>\$ 22.195.021.879,57</b>	<b>\$ 85.450.836.558,17</b>	<b>\$ 54.140.304.118,05</b>	<b>34,87938177</b>	

**RELACION GASTOS DE INVERSION A 30 DE JUNIO DE 2025**

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
4266	1/04/2025 15:34	2062	91343327	CARLOS VICENTE PEDRAZA AGUDELO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 10.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.85999.201 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 201	\$ 10.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
4314	3/04/2025 9:26	2100	1098666459	LAURA MARCELA TAVERA VASQUEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 27.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	\$ 27.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
4315	3/04/2025 9:28	2107	1102375681	MATEO BOHORQUEZ MUÑOZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 33.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83213.201 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 201	\$ 33.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
4326	3/04/2025 14:19	2108	1098764318	CRISTIAN FABIAN LOPEZ VEGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 30.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.82120.226 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 226	\$ 30.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN DENTRO DE SUS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
4327	3/04/2025 15:46		890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.301.402,00	2.3.2.02.02.006.2024680010192.1.2102069.69112.226 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD POR CUENTA PROPIA 226	\$ 4.301.402,00	CONSUMO DE ENERGÍA DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL 12 DE FEBRERO DE 2025 AL 12 DE MARZO DE 2025, SEGÚN FACTURA 232351175 DE LA ESSA - NUMERO DE CUENTA 32675.
4329	3/04/2025 16:33	126	890210581	AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 617.856.243,00	2.3.2.02.02.008.2024680010046.2.4002026.85970.201 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE 201	\$ 617.856.243,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 2 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 126 DEL 29 DE AGOSTO DE 2024, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y EL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES UBICADAS EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
4372	4/04/2025 9:52	2116	1095906099	MARIA ANDREA ARENAS SANCHEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 15.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.85999.201 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 201	\$ 15.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TECNICO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
4513	7/04/2025 11:41	2119	37626721	LIANA CELMIRA SOSSA MALAGON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 27.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	\$ 27.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
4540	7/04/2025 17:02	42	901153192	DETECCIÓN SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA - DETECCIÓN LTDA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.018.610.900,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.85250.226 - SERVICIOS DE PROTECCION GUARDAS DE SEGURIDAD 226	\$ 2.018.610.900,00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA SALVAGUARDA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SE ENCUENTREN BAJO LA TENENCIA, POSESIÓN O DOMINIO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADEMÁS DE LA PROTECCION DE LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA DE BUCARAMANGA Y SUS CENTROS EXTERNOS O DONDE LA ENTIDAD LOS REQUIERA.
4541	7/04/2025 17:02	2129	13470333	FREY RAMIREZ RODRIGUEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 39.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	\$ 39.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
4542	7/04/2025 17:09		804006674	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S A E S P	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 327.475.786,00	2.3.3.01.02.004.03.2024680010048.1.4003047.91123.215 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 215	\$ 327.475.786,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES FEBRERO DE 2025 SEGÚN FACTURA NO. ES 377 \$ 327.475.786,00 VALOR TOTAL \$ 327.475.786,00- EMAB

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
4543	7/04/2025 17:09		890200162	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA AMB S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 224.311.383,00	2.3.3.01.02.004.01.2024680010048.1.4003047.91123.215 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 215	\$ 224.311.383,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA NO. 0006240 \$ 224.311.383,00 VALOR TOTAL \$ 224.311.383,00 -ACUEDUCTO METROPOLITANO
4544	7/04/2025 17:09		900115931	EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S A ESP EMPAS S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 82.831.757,00	2.3.3.01.02.004.02.2024680010048.1.4003047.91123.215 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 215	\$ 82.831.757,00	PAGO DE SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL MES NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA NO. 000956 \$ 82.831.757,00 VALOR TOTAL \$ 82.831.757,00 - EMPAS
4627	9/04/2025 9:12	2155	1098682097	DIEGO FERNANDO BETANCURT PINZON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 33.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	\$ 33.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
4628	9/04/2025 9:13	2166	1096954922	MARCELA JULIETH VALERO LOPEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 33.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.82120.201 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 201	\$ 33.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
4668	10/04/2025 14:11	2179	1005565577	ZARETH YULENY MOTTA PABON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 30.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	\$ 30.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
4677	10/04/2025 14:54	2185	52214052	GLORIA YAMILE MUÑOZ SUAREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.500.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	\$ 5.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
4678	10/04/2025 14:55	2188	1014254089	VANESSA CABANZO ARDILA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 33.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	\$ 33.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR PUBLICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
4690	10/04/2025 16:13		890200162	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA AMB S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 237.537.835,00	2.3.3.01.02.004.01.2024680010048.1.4003047.91123.215 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 215	\$ 237.537.835,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA NO. 0006256 \$ 237.537.835,00 VALOR TOTAL \$ 237.537.835,00 -ACUEDUCTO METROPOLITANO
4706	11/04/2025 11:15	508	1007402713	DAYANA CRISTINA ARENAS BAYONA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 11.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	\$ 11.000.000,00	ADICIONAL EN VALOR NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 508 DEL 29 DE ENERO DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
4707	11/04/2025 11:16	193	63486215	NUBIA CONSTANZA VALENCIA PINZON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 12.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	\$ 12.000.000,00	ADICIONAL EN VALOR NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 193 DEL 21 DE ENERO DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA EL MANEJO Y REGISTRO DE INFORMACIÓN EN LOS SISTEMAS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
4708	11/04/2025 11:17	318	1098766174	DANIEL EDUARDO JAIMES RUIZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 12.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	\$ 12.000.000,00	ADICIONAL EN VALOR NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 318 DEL 24 DE ENERO DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
4709	11/04/2025 11:21		830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P BIC	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 8.936.195,88	2.3.2.02.02.008.2024680010192.1.2102069.84120.226 - SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA (ACCESO) 226	\$ 8.936.195,88	CONSUMO DE VOZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04 DE ABRIL DE 2025 AL 03 DE MAYO DE 2025 PLAN DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y SIM CARD DE PRUEBA DE TELEMEDIDA, SEGUN FACTURA E5920535204 DE CLARO REFERENCIA 0001404010
4710	11/04/2025 11:22		800153993	COMCEL S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 368.560,37	2.3.2.02.02.008.2024680010192.1.2102069.84120.226 - SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA (ACCESO) 226	\$ 368.560,37	CONSUMO DE TELEFONIA LOCAL - ADSL (FIBRA OPTICA, SERVIDOR) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, SEGUN FACTURA TBCL DE MOVISTAR (ANTERIORMENTE TELEBUCARAMANGA) CUENTA NO. 498 SEGUN FACTURA NO. TBCL23895855 POR VALOR DE \$3.198.580 ADEMAS SERVICIOS COORPORATIVOS MES DE MARZO DE 2025, SEGUN FACTURA 580831311177 DE MOVISTAR CUENTANO.010 POR VALOR DE \$5.737.615,88 PARA UN TOTAL DE \$ 8.936.195,88
4711	11/04/2025 11:24	190	37863152	ENELDA GOMEZ NIÑO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 12.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	\$ 12.000.000,00	ADICIONAL EN VALOR NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 190 DEL 21 DE ENERO DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA FORTALECER LOS PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
4712	11/04/2025 11:25	197	1098773016	ANDREA JULIANA SUAREZ LEAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 12.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	\$ 12.000.000,00	ADICIONAL EN VALOR NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 197 DEL 21 DE ENERO DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN TODAS SUS ETAPAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
4713	11/04/2025 11:25	196	1098777640	DANIELA ALEJANDRA CELIS QUINTERO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 12.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	\$ 12.000.000,00	ADICIONAL EN VALOR NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 196 DEL 21 DE ENERO DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
4714	11/04/2025 11:26	601	91489166	IVAN DARIO MUÑOZ AYALA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 11.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	\$ 11.000.000,00	ADICIONAL EN VALOR NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 601 DEL 31 DE ENERO DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
4715	11/04/2025 11:31	359	68295591	ALBA MARINA DELGADO LOPEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 14.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	\$ 14.000.000,00	ADICIONAL EN VALOR NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 359 DEL 24 DE ENERO DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO ESPECIALIZADO PARA EL SEGUIMIENTO EN LA EJECUCION Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA Y CONVENIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
4716	11/04/2025 11:38	2200	13511602	FREDDY IRENARCO TORRES SUAREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.82120.201 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 201	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN TODAS LAS ETAPAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
4717	11/04/2025 11:40	2205	91280727	JUAN DIEGO CRUZ LIZCANO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 24.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.82120.201 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 201	\$ 24.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
4718	11/04/2025 13:49	116	890201213	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER UIS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 665.000.000,00	2.3.2.02.02.005.20250000001930.2.2.4002020.53211.251 - ESPACIO PUBLICO ADECUADO 251	\$ 665.000.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 116 DEL 30 DE JULIO DE 2024, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL EN LA CARRERA 26 (PASEO ESPAÑA) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER
4719	11/04/2025 13:50	387	804000152	COINOBRAS S.A.S.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.075.728.019,29	2.3.2.02.02.005.20250000001930.2.2.4002020.53211.251 - ESPACIO PUBLICO ADECUADO 251	\$ 2.075.728.019,29	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 4 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 387 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2022, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA "CENTRO CAMINABLE" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
4731	21/04/2025 9:16	2208	1095949447	EDER FABIAN NIETO LEON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 33.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	\$ 33.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
4740	21/04/2025 11:25	50	804016472	AMERICANA DE SERVICIOS LTDA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 27.717.600,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.85330.226 - SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL 226	\$ 27.717.600,00	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CALENTA EN LOS DIFERENTES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, JUNTO CON EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS Y LA MAQUINARIA RESPECTIVA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
4753	22/04/2025 13:40	2219	1052405562	DANIEL FELIPE ROJAS CASTRO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 30.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	\$ 30.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
4792	22/04/2025 16:01	550	1098756846	CRISTIAN EDUARDO REY PALACIOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 11.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	\$ 11.000.000,00	ADICIONAL EN VALOR NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 550 DEL 30 DE ENERO DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
4793	22/04/2025 16:09		890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.527.545.036,00	2.3.2.02.02.006.2024680010192.1.2102069.69112.226 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD POR CUENTA PROPIA 226	\$ 1.527.545.036,00	ENERGIA - ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 SEGÚN FACTURA 23273983 NUMERO DE CUENTA 1075933 -1
4797	23/04/2025 7:34	2222	1098749339	ROBINSON FABIAN FIGUEROA MALDONADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 27.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	\$ 27.000.000,00	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTROMECANICO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
4798	23/04/2025 7:34	2223	1096950522	JAIME LEONARDO FLOREZ CALDERON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 30.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	\$ 30.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
4972	28/04/2025 15:17	2236	1098808765	JEFFERSSON FERNANDO LEON VILLAMIZAR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 24.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	\$ 24.000.000,00	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTROMECANICO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
4973	28/04/2025 15:20	2233	1098784128	DANIEL ALEXANDER LOPEZ MALDONADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.400.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.85999.226 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 226	\$ 20.400.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ELECTRICISTA DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO ADSCRITO A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
4974	28/04/2025 15:21	2234	1095948947	JOSUE FERNANDO QUIROGA SIERRA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.400.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.85999.226 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 226	\$ 20.400.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ELECTRICISTA DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO ADSCRITO A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
4975	28/04/2025 15:21	2235	1098629229	MAURICIO DE JESUS VELASQUEZ DAZA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 21.600.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.85999.226 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 226	\$ 21.600.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OPERACIÓN DEL CAMIÓN CANASTA GRÚA DE ALUMBRADO PÚBLICO ADSCRITO A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
4977	28/04/2025 16:26		890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.842.990,00	2.3.2.02.02.006.2024680010192.1.2102069.69112.226 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD POR CUENTA PROPIA 226	\$ 4.842.990,00	CONSUMO DE ENERGÍA DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL 13 DE MARZO DE 2025 AL 11 DE ABRIL DE 2025, SEGÚN FACTURA 233504964 DE LA ESSA - NUMERO DE CUENTA 32675.
4978	28/04/2025 16:26		800153993	COMCEL S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.333.494,14	2.3.2.02.02.008.2024680010192.1.2102069.84120.226 - SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA (ACCESO) 226	\$ 3.333.494,14	PLAN DE DATOS DE TELEMEDIDA, TELEGESTION Y PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEL 20 DE ABRIL DE 2025 AL 19 DE MAYO DE 2025 SEGÚN FACTURA DE CLARO NO. E5925989874 REFERENCIA 8221383845.
5010	30/04/2025 9:42	2250	91249193	GERMAN ALBERTO MORENO BREGULLA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 33.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83213.201 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 201	\$ 33.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
5011	30/04/2025 9:43	2245	91260789	JAIRO ESPINOSA MORENO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 10.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.85999.201 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 201	\$ 10.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
5012	30/04/2025 9:46	2244	1234338622	CARLOS HARVEY ROBLES ROMERO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	\$ 18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
5050	2/05/2025 15:59	2254	91267192	EDISSON QUIROZ MENDEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 10.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.85999.201 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 201	\$ 10.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
5128	6/05/2025 11:36		804006674	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S A E S P	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 352.960.507,00	2.3.3.01.02.004.03.2024680010048.1.4003047.91123.215 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 215	\$ 352.960.507,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES MARZO DE 2025 SEGÚN FACTURA NO. ES 378 \$ 352.960.507,00 VALOR TOTAL \$ 352.960.507,00- EMAB
5129	6/05/2025 11:37		900115931	EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S A ESP EMPAS S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 86.109.337,00	2.3.3.01.02.004.02.2024680010048.1.4003047.91123.215 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 215	\$ 86.109.337,00	PAGO DE SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL MES DICIEMBRE DE 2024 SEGÚN FACTURA NO. 0001454 \$ 86.109.337,00 VALOR TOTAL \$ 86.109.337,00 - EMPAS
5158	6/05/2025 14:55	2261	1098723246	DIEGO GUILLERMO VILLAREAL PEÑALOZA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 27.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	\$ 27.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
5159	6/05/2025 14:56	2260	1065850227	ANDRES ALFONSO MURGAS VILORIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 39.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	\$ 39.000.000,00	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
5160	6/05/2025 14:56	2259	1007785016	OLINTO CASTILLO BAEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 15.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.85999.226 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 226	\$ 15.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO
5229	8/05/2025 15:39	2268	1101692561	ALBA RUBY SUAREZ MANTILLA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 30.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	\$ 30.000.000,00	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
5230	8/05/2025 15:40	2271	9395175	GERMAN ENRIQUE CARVAJAL GOMEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 21.600.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.85999.226 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 226	\$ 21.600.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
5344	9/05/2025 18:25	1031	91390597	JOSE SAUL ARDILA GUZMAN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.950.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.85999.226 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 226	\$ 4.950.000,00	ADICIONAL NO.01 CONTRATO 1031-2025 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ELECTRICISTA BRINDADO SOPORTE TÉCNICO RESPECTO A LA INSTALACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS DIFERENTES MÓDULOS DE CONTROL Y MEDIDA DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
5345	12/05/2025 7:36	2275	13746398	HECTOR AUGUSTO ORDUZ MALDONADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 15.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	\$ 15.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
5449	13/05/2025 9:52	2286	37725216	IVONNE ADRIANA PORRAS ALONSO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 26.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049. 2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	\$ 26.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS ETAPAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
5478	13/05/2025 16:23		890200162	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA AMB S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 233.292.362,00	2.3.3.01.02.004.01.20246800100 48.1.4003047.91123.215 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 215	\$ 233.292.362,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL MES DE ENERO DE DE 2025 SEGUN FACTURA NO. 0006289 \$ 233.292.362,00 VALOR TOTAL \$ 233.292.362,00 -ACUEDUCTO METROPOLITANO
5480	14/05/2025 7:37		830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACION ES S.A E.S.P BIC	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 11.067.104,55	2.3.2.02.02.008.2024680010192. 1.2102069.84120.226 - SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA (ACCESO) 226	\$ 11.067.104,55	CONSUMO DE TELEFONIA LOCAL - ADSL (FIBRA OPTICA, SERVIDOR) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN FACTURA TBCL DE MOVISTAR (ANTERIORMENTE TELEBUCARAMANGA) CUENTA NO.498 SEGUN FACTURA NO. TBCL23913587 POR VALOR DE \$3.346.870.00 ADEMÁS SERVICIOS COORPORATIVOS MES DE ABRIL DE 2025, SEGUN FACTURA 580831323043 DE MOVISTAR CUENTANO.010 POR VALOR DE \$7.720.234.55 PARA UN TOTAL DE \$ 11.067.104.55.
5483	14/05/2025 10:03	2292	1007731678	DYDIER ANDREY MORENO CARDENAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 24.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049. 2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	\$ 24.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN TODAS LAS ETAPAS DE CONTRATACION PUBLICA EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
5513	15/05/2025 8:13	2296	1098703713	EXNEYQUER VILLAMIZAR BARAJAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 15.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049. 2.4599031.83213.201 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 201	\$ 15.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
5514	15/05/2025 8:14	2295	1030659325	SHERYL NICKOLL ALVAREZ ROJAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 7.500.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192. 2.2102069.85999.226 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 226	\$ 7.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL Y DE GESTION QUE SE EJECUTAN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
5529	16/05/2025 9:31	2299	1098738647	LESTER ANDRES CACERES MENDEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 51.333.333,33	2.3.2.02.02.008.2024680010049. 2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	\$ 51.333.333,33	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA COORDINAR ASUNTOS JURÍDICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
5532	16/05/2025 15:27	69	901283904	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE MONSERRATE Y RETIRO GRANDE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 410.000.000,00	2.3.2.02.02.005.2024680010253. 2.2402042.53211.201 - CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 201	\$ 410.000.000,00	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONSERRATE Y RETIRO GRANDE DEL CORREGIMIENTO DOS (2) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y ALCANTARILLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
5533	16/05/2025 15:30	70	901838314	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS ANGELINOS SECTOR LA CEMENTO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 410.000.000,00	2.3.2.02.02.005.2024680010253. 2.2402042.53211.201 - CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 201	\$ 410.000.000,00	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS ANGELINOS SECTOR LA CEMENTO DEL CORREGIMIENTO UNO (1) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y ALCANTARILLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
5534	16/05/2025 15:32	72	800009279	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CAPILLA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 410.000.000,00	2.3.2.02.02.005.2024680010253. 2.2402042.53211.201 - CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 201	\$ 410.000.000,00	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA CAPILLA DEL CORREGIMIENTO DOS (2) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y ALCANTARILLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
5535	16/05/2025 15:34	71	901744924	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA BARBARA SECTOR BAJO LA UDES SAN JOAQU	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 410.000.000,00	2.3.2.02.02.005.2024680010253.2.2402042.53211.201 - CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 201	\$ 410.000.000,00	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA BARBARA SECTOR BAJO LA UDES SAN JOAQUÍN, DEL CORREGIMIENTO TRES (3) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y ALCANTARILLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
5536	16/05/2025 15:39	68	800023579	JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN CAYETANO Y SANTA RITA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 410.000.727,00	2.3.2.02.02.005.2024680010253.2.2402042.53211.201 - CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 201	\$ 410.000.727,00	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN CAYETANO Y SANTA RITA, DEL CORREGIMIENTO UNO (1) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y ALCANTARILLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
5570	19/05/2025 17:12	75	900506002	WILMAN MORALES REY PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S A S	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 277.556.919,00	2.3.2.02.02.008.2024680010205.2.2106033.83132.226 - SERVICIOS DE SOPORTE EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (TI)	\$ 277.556.919,00	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO-SGAP Y EL HARDWARE DE CONTROL ASOCIADO EN LOS DIFERENTES SITIOS DE TELEMEDIDA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
5573	20/05/2025 11:31	52	901904407	CONSORCIO GENPRO GROUP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 19.362.317.851,33	2.3.2.02.02.005.2024680010051.2.2402114.53211.213 - VIA URBANA MEJORADA 213	\$ 12.354.998.254,33	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER
5573	20/05/2025 11:31	52	901904407	CONSORCIO GENPRO GROUP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	2.3.2.02.02.005.2024680010051.2.2402114.53211.201 - VIA URBANA MEJORADA 201	\$ 7.007.319.597,00	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER
5574	20/05/2025 11:33	61	829000956	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.526.583.230,00	2.3.2.02.02.005.2024680010051.2.2402114.53211.201 - VIA URBANA MEJORADA 201	\$ 1.526.583.230,00	INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER
5575	20/05/2025 13:51	2305	91072614	JAVIER ROJAS TAVERA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 30.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	\$ 30.000.000,00	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO METALURGICO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
5586	21/05/2025 9:51	190	900602753	HCR INGENIEROS S.A.S.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 191.212.751,56	2.3.2.02.02.008.2024680010189.2.2102069.8715205.226 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION 226	\$ 191.212.751,56	ADICIONAL NO.2 CONTRATO 190-2024 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y DEL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE 1.
5599	21/05/2025 16:33	2308	91491227	JHON FREDYS LINARES AMADOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 39.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	\$ 39.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRÓNICO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
5600	22/05/2025 9:42	2311	1098778906	SILVIA ALEJANDRA JAIMES RUIZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.200.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.85999.226 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 226	\$ 16.200.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTALES Y DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
5603	22/05/2025 10:00	191	900115339	SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 237.478.531,62	2.3.2.02.02.008.2024680010189.2.2102069.8715205.226 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION 226	\$ 237.478.531,62	ADICIONAL NO.2 CONTRATO 191-2024 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y DEL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE 2.
5617	22/05/2025 16:54		890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.392.657.093,00	2.3.2.02.02.006.2024680010192.1.2102069.69112.226 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD POR CUENTA PROPIA 226	\$ 1.392.657.093,00	ENERGIA - ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGÚN FACTURA 233842508 NUMERO DE CUENTA 1075933 -1.
5653	26/05/2025 8:00		900293868	VEOLIA ASEO BUCARAMANGA S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 26.024.798,00	2.3.3.01.04.004.03.2024680010048.1.4003047.91123.215 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 215	\$ 26.024.798,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES MAYO DE 2024 SEGÚN FACTURA NO. OPE58 \$ 4.664.964,00 MES JUNIO DE 2024 SEGÚN FACTURA NO. OPE59 \$ 4.680.584,00 MES JULIO DE 2024 SEGÚN FACTURA NO. OPE60 \$ 4.355.543,00 MES AGOSTO DE 2024 SEGÚN FACTURA NO. OPE61 \$ 3.063.023,00 MES SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA NO. OPE 72 \$ 969.388,00 MES OCTUBRE DE 2024 SEGUN FACTURA NO. OPE73 \$ 3.798.120,00 MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA NO. OPE82 \$ 2.293.869,00 Y DICIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA NO. OPE83 \$ 2.199.307,00 VALOR TOTAL \$ 26.024.798,00 - VEOLIA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
5764	28/05/2025 11:23	82	901921485	PIEDRA ANGULAR CONSTRUCCIONES S.A.S.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 41.000.120,00	2.3.2.02.02.005.20250000001814 5.2.4599011.53129.201 - SEDES ADECUADAS 201	\$ 41.000.120,00	REPARACION DEL EQUIPAMIENTO COMUNITARIO DE CASA BÚHO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
5782	29/05/2025 9:49	2336	1096948502	EDINSON ALEXANDER FERNANDEZ BAUTISTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049. 2.4599031.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	\$ 18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
5788	29/05/2025 10:33	2334	13718676	CHRISTIAN JOSE MORALES LAZARO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.500.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192. 2.2102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	\$ 16.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
5789	29/05/2025 10:47	738	13874347	CRISTHIAN HERNANDO PAREDES CANDELA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 6.400.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049. 2.4599031.85999.201 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 201	\$ 6.400.000,00	ADICIONAL EN VALOR NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 738 DEL 04 DE FEBRERO DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
5790	29/05/2025 10:48	727	91466987	RICARDO BLANCO PEÑA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 6.400.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049. 2.4599031.85999.201 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 201	\$ 6.400.000,00	ADICIONAL EN VALOR NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 727 DEL 04 DE FEBRERO DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
5890	3/06/2025 14:47		890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.312.211,00	2.3.2.02.02.006.2024680010192. 1.2102069.69112.226 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD POR CUENTA PROPIA 226	\$ 4.312.211,00	CONSUMO DE ENERGÍA DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL 12 DE ABRIL DE 2025 AL 12 DE MAYO DE 2025, SEGÚN FACTURA 23463892 DE LA ESSA - NUMERO DE CUENTA 32675.
5891	3/06/2025 14:47		800153993	COMCEL S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.351.791,58	2.3.2.02.02.008.2024680010192. 1.2102069.84120.226 - SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA (ACCESO) 226	\$ 3.351.791,58	PLAN DE DATOS DE TELEMEDIDA, TELEGESTION Y PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEL 20 DE MAYO DE 2025 AL 19 DE JUNIO DE 2025 SEGÚN FACTURA DE CLARO NO. E5936383187 REFERENCIA 8221383845.
5951	4/06/2025 18:34	2357	13719438	DIEGO ALFONSO OREJARENA DIAZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 24.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192. 2.2102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	\$ 24.000.000,00	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
5966	5/06/2025 14:04	2017	1099940164	VIVIANA MARCELA CUADROS VALBUENA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.500.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049. 2.4599031.82120.201 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 201	\$ 16.500.000,00	ADICIONAL EN VALOR NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2017 DEL 26 DE MARZO DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
5967	5/06/2025 14:07	2018	1007193498	LEYNE FERNANDA MARITNEZ JAIMES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.500.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049. 2.4599031.82120.201 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 201	\$ 16.500.000,00	ADICIONAL EN VALOR NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2018 DEL 26 DE MARZO DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
6016	6/06/2025 15:26	2367	1095843401	MARIA LUCIA DURAN AGUIRRE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 25.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049. 2.4599031.82120.201 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 201	\$ 25.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN EL ÁREA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
6145	9/06/2025 18:15	1353	79691759	JAIME ALBERTO RUIZ YEPES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049. 2.4599031.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	\$ 18.000.000,00	ADICIONAL EN VALOR NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 1353 DEL 19 DE FEBRERO DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
6146	9/06/2025 18:26	2155	1098682097	DIEGO FERNANDO BETANCURT PINZON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 13.750.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049. 2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	\$ 13.750.000,00	ADICIONAL EN VALOR NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2155 DEL 08 DE ABRIL DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
6147	9/06/2025 18:51	2019	1090448928	SEIDY JULIETH GARCIA ROZO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	\$ 18.000.000,00	ADICIONAL EN VALOR NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2019 DEL 26 DE MARZO DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
6154	10/06/2025 9:48	2372	13745167	JOSE MANUEL CORZO ALVARADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 52.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	\$ 52.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURIDICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
6155	10/06/2025 9:49	2373	1098821923	IVAN ENRIQUE CASTELLANOS JAIMES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 26.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	\$ 26.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS COMO TECNOLOGO PARA BRINDAR APOYO A LA GESTIÓN EN EL AREA DE CONTRATACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
6156	10/06/2025 9:49	2374	13616548	RAUL FERNANDO FONTECHA PEÑA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 35.750.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	\$ 35.750.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL Y DE GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
6178	10/06/2025 15:53	453	1094272107	LINA MARIA BASTOS MALDONADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.82120.226 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 226	\$ 18.000.000,00	ADICIONAL N° 01 - PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN DENTRO DE SUS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
6179	10/06/2025 15:54	455	1098680923	LUZ DARY MEDINA GOMEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.83321.226 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 226	\$ 18.000.000,00	ADICIONAL N° 01 - PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES TÉCNICAS, FINANCIERAS Y ECONÓMICAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN DENTRO DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
6180	10/06/2025 15:55	439	1102353678	LUIS DUVAN RODRIGUEZ DIAZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.82120.226 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 226	\$ 18.000.000,00	ADICIONAL N° 01 - PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN DENTRO DE SUS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE ELÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
6181	10/06/2025 15:57	454	37841760	MARYELY VERA JACOME	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.82120.226 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 226	\$ 18.000.000,00	ADICIONAL N° 01 - PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN DENTRO DE SUS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
6182	10/06/2025 16:00	469	1099894364	ANDRES EDUARDO ESTUPIÑAN EUGENIO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.83321.226 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 226	\$ 18.000.000,00	ADICIONAL N° 01 - PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES TÉCNICAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN DENTRO DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
6191	10/06/2025 17:00	447	901667665	CONSORCIO INTERVIAS RS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 114.889.016,10	2.3.2.02.02.005.2022680010048.2.4301004.53270.501 - PASIVO EXIGIBLE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 501	\$ 114.889.016,10	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 447 DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA LA ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER. GRUPO 3, CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS RS NIT: 901667665.
6192	10/06/2025 17:03		901664006	CONSORCIO DEPORTIVOS SM	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.569.907.478,33	2.3.2.02.02.005.2022680010048.2.4301004.53270.501 - PASIVO EXIGIBLE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 501	\$ 1.569.907.478,33	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO DE OBRA NO. 409 DE 2022, CUYO OBJETO ES: ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - GRUPO 2, CONTRATISTA: CONSORCIO DEPORTIVOS SM NIT: 901664006

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
6194	10/06/2025 21:40		804006674	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S A E S P	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 370.986.602,00	2.3.3.01.02.004.03.20246800100 48.1.4003047.91123.215 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 215	\$ 370.986.602,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES ABRIL DE 2025 SEGÚN FACTURA NO. ES 379 \$ 370.986.602,00 VALOR TOTAL \$ 370.986.602,00- EMAB
6195	10/06/2025 21:42		890200162	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA AMB S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 224.932.043,00	2.3.3.01.02.004.01.20246800100 48.1.4003047.91123.215 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 215	\$ 224.932.043,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL MES DE FEBRERO DE DE 2025 SEGUN FACTURA NO. 0006318 \$ 224.932.043,00 VALOR TOTAL \$ 224.932.043,00-ACUEDUCTO METROPOLITANO
6197	11/06/2025 10:02	2382	1098667083	INGRID NATALIA MONSALVE ROSALES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 24.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192. 2.2102069.82120.226 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 226	\$ 24.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURIDICAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN DENTRO DE SUS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
6204	11/06/2025 11:19	2380	80039960	JULIAN COLLAZOS LEON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 35.750.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049. 2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	\$ 35.750.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
6205	11/06/2025 11:20	2379	13874784	WILFRED EMILIO PALACIO VERANO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 44.800.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049. 2.4599031.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	\$ 44.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
6206	11/06/2025 12:04	2046	1085097827	LADYS CONSUELO TORRES TORRES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 15.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049. 2.4599031.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	\$ 15.000.000,00	ADICIONAL EN VALOR NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2046 DEL 28 DE MARZO DE 2025, CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
6207	11/06/2025 12:06	2020	63557509	JOHANA ANDREA ORTIZ OLAGO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.500.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049. 2.4599031.82120.201 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 201	\$ 16.500.000,00	ADICIONAL EN VALOR NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2020 DEL 26 DE MARZO DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURIDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
6234	12/06/2025 11:04	2188	1014254089	VANESSA CABANZO ARDILA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 13.750.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049. 2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	\$ 13.750.000,00	ADICIONAL EN VALOR NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2188 DEL 09 DE ABRIL DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR PÚBLICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
6246	12/06/2025 17:54	12	901669773	CONSORCIO KALROY BUCARAMANGA 13	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 212.852.387,00	2.3.2.02.02.005.2022680010048. 2.4301004.53270.251 - INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 251	\$ 212.852.387,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 7 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 12 DEL 14 DE FEBRERO DE 2023, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA LA ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER. GRUPO 2
6314	16/06/2025 15:50	114	900423249	H.C.L. SERVICIOS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.818.077.627,00	2.3.2.02.02.005.2024680010043. 2.2402112.53211.201 - CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 201	\$ 2.818.077.627,00	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, VOLQUETAS Y VEHÍCULOS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA RED VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
6372	17/06/2025 17:12	2396	74379477	JAVIER MAURICIO PARRA RODRIGUEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 33.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049. 2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	\$ 33.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
6373	17/06/2025 17:42	2395	1098654297	LEIDY VIVIANA TORRES RUIZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.800.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.85999.201 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 201	\$ 16.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
6378	18/06/2025 10:29	2403	1098685126	ROLANDO ANDRES RINCON SARAVIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	\$ 18.000.000,00	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
6396	19/06/2025 9:40		830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P BIC	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 10.927.454,81	2.3.2.02.02.008.2024680010192.1.2102069.84120.226 - SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA (ACCESO) 226	\$ 10.927.454,81	CONSUMO DE TELEFONIA LOCAL - ADSL (FIBRA OPTICA, SERVIDOR) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025, SEGUN FACTURA TBCL DE MOVISTAR (ANTERIORMENTE TELEBUCARAMANGA) CUENTA NO.498 SEGUN FACTURA NO. TBCL23930452 POR VALOR DE \$3.207.220,23 ADEMAS SERVICIOS COORPORATIVOS MES DE MAYO DE 2025, SEGUN FACTURA 580831334082 DE MOVISTAR CUENTANO.010 POR VALOR DE \$7.720.234,58 PARA UN TOTAL DE \$ 10.927.454.81
6405	19/06/2025 14:15	105	901941095	CONSORCIO ESPACIOS BGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.317.394.434,13	2.3.2.02.02.005.2024680010050.2.4002020.53211.289 - CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 289	\$ 16.317.394.434,13	ADECUACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
6435	20/06/2025 13:41		890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.345.647.361,00	2.3.2.02.02.006.2024680010192.1.2102069.69112.226 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD POR CUENTA PROPIA 226	\$ 1.345.647.361,00	ENERGIA - ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 SEGÚN FACTURA 2349677928 NUMERO DE CUENTA 1075933.
6441	20/06/2025 15:18	2413	91512695	LINO GERARDO OCHOA ARGUELLO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 50.400.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.82120.226 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 226	\$ 50.400.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN DENTRO DE SUS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
6444	24/06/2025 8:15	2417	1098721390	MAYERLY ALEJANDRA MEDINA CHARRY	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 42.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	\$ 36.988.097,01	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
6444	24/06/2025 8:15	2417	1098721390	MAYERLY ALEJANDRA MEDINA CHARRY	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501	\$ 5.011.902,99	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
6446	24/06/2025 9:26	2416	1098669467	EDWIN FERNANDO AYALA CADENA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 33.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.83990.526 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 526	\$ 33.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA EJECUTAR EL DISEÑO, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS; ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESDE LA OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
6447	24/06/2025 9:29	2419	1094272107	LINA MARIA BASTOS MALDONADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 36.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.82120.526 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 526	\$ 36.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN DENTRO DE SUS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
6448	24/06/2025 9:59	2418	1102353678	LUIS DUVAN RODRIGUEZ DIAZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 36.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.82120.226 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 226	\$ 14.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN DENTRO DE SUS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
6448	24/06/2025 9:59	2418	1102353678	LUIS DUVAN RODRIGUEZ DIAZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	2.3.2.02.02.008.2024680010192. 2.2102069.82120.526 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 526	\$ 22.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN DENTRO DE SUS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
6449	24/06/2025 10:00	2420	37841760	MARYELY VERA JACOME	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 36.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192. 2.2102069.82120.526 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 526	\$ 36.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN DENTRO DE SUS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
6450	24/06/2025 10:01	2423	1098680923	LUZ DARY MEDINA GOMEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 36.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192. 2.2102069.83321.526 - SERVICIO DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 526	\$ 36.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA INDUSTRIAL PARA LLEVAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS LIQUIDACIONES Y RECAUDOS DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, COADYUVANDO EN LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
6564	26/06/2025 10:09	2430	1095835926	MANUELA ESPINOSA RUIZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 33.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049. 2.4599031.82120.201 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 201	\$ 500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS, PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
6564	26/06/2025 10:09	2430	1095835926	MANUELA ESPINOSA RUIZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	2.3.2.02.02.008.2024680010049. 2.4599031.82120.501 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 501	\$ 32.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS, PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
6588	26/06/2025 10:46	2429	1098759024	DIEGO ALEXANDER LOPEZ OSORIO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 39.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192. 2.2102069.83990.526 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 526	\$ 39.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO EN ENERGÍA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES DE ARTICULACIÓN TÉCNICA ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
6589	26/06/2025 10:47	2444	1099894364	ANDRES EDUARDO ESTUPIÑAN EUGENIO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 36.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192. 2.2102069.83321.226 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 226	\$ 34.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES TÉCNICAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN DENTRO DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
6589	26/06/2025 10:47	2444	1099894364	ANDRES EDUARDO ESTUPIÑAN EUGENIO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	2.3.2.02.02.008.2024680010192. 2.2102069.83321.526 - SERVICIO DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 526	\$ 2.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES TÉCNICAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN DENTRO DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
6590	26/06/2025 10:47	2428	1095530313	BRAHIAN SNEYDER OSORIO JAIMES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 33.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192. 2.2102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	\$ 33.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO FINANCIERO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
6598	26/06/2025 11:03	2443	1098672189	EDWIN YANDER VALDERRAMA PICO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 46.400.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049. 2.4599031.82120.501 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 501	\$ 46.400.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
6610	26/06/2025 16:31		800153993	COMCEL S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.333.494,14	2.3.2.02.02.008.2024680010192. 1.2102069.84120.226 - SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA (ACCESO) 226	\$ 3.333.494,14	PLAN DE DATOS DE TELEMEDIDA, TELEGESTION Y PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEL 20 DE MAYO DE 2025 AL 19 DE JUNIO DE 2025 SEGÚN FACTURA DE CLARO NO. E5946544396 REFERENCIA 8221383845

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
6611	26/06/2025 16:37		890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.007.174,00	2.3.2.02.02.006.2024680010192.1.2102069.69112.226 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD POR CUENTA PROPIA 226	\$ 4.007.174,00	CONSUMO DE ENERGÍA DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL 12 DE MAYO DE 2025 AL 12 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN FACTURA DE LA ESSA 64846823, NUMERO DE USUARIO 32675-5
6619	27/06/2025 8:21	2445	1098773241	FABIAN ANDRES ARDILA PABON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 25.500.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.82120.501 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 501	\$ 25.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS, PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
6632	27/06/2025 14:29		804006674	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S A E S P	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 363.652.239,00	2.3.3.01.02.004.03.2024680010048.1.4003047.91123.215 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 215	\$ 363.652.239,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES MAYO DE 2025 SEGÚN FACTURA NO. ES 380 \$ 363.652.239,00 VALOR TOTAL \$ 363.652.239,00- EMAB
6633	27/06/2025 14:32		900115931	EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S A ESP EMPAS S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 78.563.442,00	2.3.3.01.02.004.02.2024680010048.1.4003047.91123.215 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 215	\$ 78.563.442,00	PAGO DE SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL MES ENERO DE 2025 SEGÚN FACTURA NO. 0002036 \$ 78.563.442,00 VALOR TOTAL \$ 78.563.442,00 - EMPAS

**RELACION PERSONAL A 30 DE JUNIO DE 2025**

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato	Fecha Liquidación Contrato
2025	188	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANGELICA MARCELA	HERNANDEZ VELAZCO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO MAGISTER EN GESTIÓN PÚBLICA PARA COORDINAR ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 24.000.000,00	28/04/2025	22/07/2025	21/10/2025	5/05/2025
2025	190	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENELDA	GOMEZ NIÑO	"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA FORTALECER LOS PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA"	\$ 12.000.000,00	9/04/2025	22/05/2025	21/07/2025	
2025	193	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	NUBIA CONSTANZA	VALENCIA PINZON	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA EL MANEJO Y REGISTRO DE INFORMACIÓN EN LOS SISTEMAS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 12.000.000,00	9/04/2025	22/05/2025	21/07/2025	
2025	196	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DANIELA ALEJANDRA	CELIS QUINTERO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 12.000.000,00	9/04/2025	22/05/2025	21/07/2025	
2025	197	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANDREA JULIANA	SUAREZ LEAL	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN TODAS SUS ETAPAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 12.000.000,00	9/04/2025	22/05/2025	21/07/2025	
2025	318	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DANIEL EDUARDO	JAIMES RUIZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 12.000.000,00	10/04/2025	27/05/2025	26/07/2025	
2025	359	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ALBA MARINA	DELGADO LOPEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO ESPECIALIZADO PARA EL SEGUIMIENTO EN LA EJECUCION Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA Y CONVENIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 14.000.000,00	9/04/2025	27/05/2025	26/07/2025	
2025	508	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DAYANA CRISTINA	ARENAS BAYONA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 11.000.000,00	10/04/2025	30/05/2025	29/07/2025	
2025	550	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CRISTIAN EDUARDO	REY PALACIOS	"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA"	\$ 11.000.000,00	10/04/2025	3/06/2025	2/08/2025	
2025	601	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	IVAN DARIO	MUÑOZ AYALA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 11.000.000,00	10/04/2025	3/06/2025	2/08/2025	
2025	727	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	RICARDO	BLANCO PEÑA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 6.400.000,00	28/05/2025	5/06/2025	4/08/2025	
2025	738	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CRISTHIAN HERNANDO	PAREDES CANDELA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 6.400.000,00	28/05/2025	5/06/2025	4/08/2025	
2025	1031	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE SAUL	ARDILA GUZMAN	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ELECTRICISTA BRINDADO SOPORTE TÉCNICO RESPECTO A LA INSTALACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS DIFERENTES MÓDULOS DE CONTROL Y MEDIDA DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.950.000,00	9/05/2025	12/05/2025	26/06/2025	26/06/2025
2025	1353	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JAIME ALBERTO	RUIZ YEPES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 18.000.000,00	6/06/2025	20/08/2025	19/11/2025	

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato	Fecha Liquidación Contrato
2025	2017	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	VIVIANA MARCELA	CUADROS VALBUENA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 16.500.000,00	4/06/2025	27/09/2025	26/12/2025	
2025	2018	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LEYNE FERNANDA	MARITNEZ JAIMES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 16.500.000,00	4/06/2025	27/09/2025	26/12/2025	
2025	2019	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SEIDY JULIETH	GARCIA ROZO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 18.000.000,00	6/06/2025	27/09/2025	26/12/2025	
2025	2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOHANA ANDREA	ORTIZ OLAGO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 16.500.000,00	10/06/2025	27/09/2025	26/12/2025	
2025	2046	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LADYS CONSUELO	TORRES TORRES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 15.000.000,00	10/06/2025	1/10/2025	15/12/2025	
2025	2100	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LAURA MARCELA	TAVERA VASQUEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	\$ 27.000.000,00	2/04/2025	9/04/2025	8/10/2025	
2025	2107	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MATEO	BOHORQUEZ MUÑOZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 33.000.000,00	2/04/2025	3/04/2025	2/10/2025	
2025	2108	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CRISTIAN FABIAN	LOPEZ VEGA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN DENTRO DE SUS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 30.000.000,00	2/04/2025	3/04/2025	2/09/2025	
2025	2116	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA ANDREA	ARENAS SANCHEZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 15.000.000,00	3/04/2025	7/04/2025	6/10/2025	
2025	2119	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LIANA CELMIRA	SOSSA MALAGON	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	\$ 27.000.000,00	4/04/2025	9/04/2025	8/10/2025	
2025	2129	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FREY	RAMIREZ RODRIGUEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 39.000.000,00	4/04/2025	7/04/2025	6/10/2025	
2025	2155	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIEGO FERNANDO	BETANCURT PINZON	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 33.000.000,00	8/04/2025	9/04/2025	23/12/2025	
2025	2155	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIEGO FERNANDO	BETANCURT PINZON	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 13.750.000,00	6/06/2025	9/10/2025	23/12/2025	

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato	Fecha Liquidación Contrato
2025	2166	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARCELA JULIETH	VALERO LOPEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 33.000.000,00	8/04/2025	9/04/2025	8/10/2025	
2025	2179	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ZARETH YULENY	MOTTA PABON	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 30.000.000,00	9/04/2025	10/04/2025	9/10/2025	
2025	2185	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	GLORIA YAMILE	MUÑOZ SUAREZ	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 5.500.000,00	9/04/2025	21/04/2025	20/05/2025	20/05/2025
2025	2188	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	VANESSA	CABANZO ARDILA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR PÚBLICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 33.000.000,00	9/04/2025	10/04/2025	24/12/2025	
2025	2188	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	VANESSA	CABANZO ARDILA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR PÚBLICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 13.750.000,00	10/06/2025	10/10/2025	24/12/2025	
2025	2200	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FREDDY IRENARCO	TORRES SUAREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN TODAS LAS ETAPAS DE CONTRATACION PUBLICA EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 20.000.000,00	10/04/2025	21/04/2025	20/08/2025	
2025	2205	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN DIEGO	CRUZ LIZCANO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURIDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 24.000.000,00	11/04/2025	21/04/2025	20/10/2025	
2025	2208	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EDER FABIAN	NIETO LEON	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 33.000.000,00	11/04/2025	21/04/2025	20/10/2025	
2025	2219	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DANIEL FELIPE	ROJAS CASTRO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 30.000.000,00	21/04/2025	22/04/2025	21/10/2025	
2025	2222	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ROBINSON FABIAN	FIGUEROA MALDONADO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTROMECANICO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 27.000.000,00	22/04/2025	23/04/2025	22/10/2025	
2025	2223	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JAIME LEONARDO	FLOREZ CALDERON	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 30.000.000,00	22/04/2025	23/04/2025	22/10/2025	
2025	2233	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DANIEL ALEXANDER	LOPEZ MALDONADO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ELECTRICISTA DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 20.400.000,00	25/04/2025	28/04/2025	27/10/2025	
2025	2234	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSUE FERNANDO	QUIROGA SIERRA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ELECTRICISTA DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 20.400.000,00	25/04/2025	28/04/2025	27/10/2025	
2025	2235	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MAURICIO DE JESUS	VELASQUEZ DAZA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OPERACIÓN DEL CAMIÓN CANASTA GRÚA DE ALUMBRADO PÚBLICO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 21.600.000,00	25/04/2025	28/04/2025	27/10/2025	

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato	Fecha Liquidación Contrato
2025	2236	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JEFFERSSON FERNANDO	LEON VILLAMIZAR	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTROMECHANICO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 24.000.000,00	25/04/2025	28/04/2025	27/10/2025	
2025	2244	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CARLOS HARVEY	ROBLES ROMERO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 18.000.000,00	28/04/2025	5/05/2025	4/09/2025	
2025	2245	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JAIRO	ESPINOSA MORENO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 10.000.000,00	29/04/2025	30/04/2025	29/08/2025	
2025	2250	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	GERMAN ALBERTO	MORENO BREGULLA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 33.000.000,00	29/04/2025	5/05/2025	4/11/2025	
2025	2254	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EDISSON	QUIROZ MENDEZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 10.000.000,00	30/04/2025	5/05/2025	4/09/2025	
2025	2259	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OLINTO	CASTILLO BAEZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 15.000.000,00	5/05/2025	6/05/2025	5/11/2025	
2025	2260	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANDRES ALFONSO	MURGAS VILORIA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 39.000.000,00	5/05/2025	6/05/2025	5/11/2025	
2025	2261	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIEGO GUILLERMO	VILLAREAL PEÑALOZA	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 27.000.000,00	5/05/2025	6/05/2025	5/11/2025	
2025	2268	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ALBA RUBY	SUAREZ MANTILLA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 30.000.000,00	7/05/2025	8/05/2025	7/11/2025	
2025	2271	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	GERMAN ENRIQUE	CARVAJAL GOMEZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO ADSCRITO A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 21.600.000,00	7/05/2025	8/05/2025	7/11/2025	
2025	2275	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HECTOR AUGUSTO	ORDUZ MALDONADO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 15.000.000,00	8/05/2025	12/05/2025	11/08/2025	
2025	2286	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	IVONNE ADRIANA	PORRAS ALONSO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS ETAPAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 26.000.000,00	12/05/2025	13/05/2025	12/09/2025	

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato	Fecha Liquidación Contrato
2025	2292	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DYDIER ANDREY	MORENO CARDENAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN TODAS LAS ETAPAS DE CONTRATACION PUBLICA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 24.000.000,00	13/05/2025	14/05/2025	13/11/2025	
2025	2295	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SHERYL NICKOLL	ALVAREZ ROJAS	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL Y DE GESTION QUE SE EJECUTAN EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESDE EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	\$ 7.500.000,00	14/05/2025	15/05/2025	14/08/2025	
2025	2296	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EXNEYQUER	VILLAMIZAR BARAJAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 15.000.000,00	14/05/2025	15/05/2025	14/08/2025	
2025	2299	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LESTER ANDRES	CACERES MENDEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA COORDINAR ASUNTOS JURÍDICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 51.333.333,33	15/05/2025	16/05/2025	25/12/2025	
2025	2305	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JAVIER	ROJAS TAVERA	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO METALURGICO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 30.000.000,00	19/05/2025	20/05/2025	19/11/2025	
2025	2308	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JHON FREDYS	LINARES AMADOR	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRÓNICO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 39.000.000,00	20/05/2025	21/05/2025	20/11/2025	
2025	2311	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SILVIA ALEJANDRA	JAIMES RUIZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTALES Y DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 16.200.000,00	21/05/2025	22/05/2025	21/11/2025	
2025	2334	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CHRISTIAN JOSE	MORALES LAZARO	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESDE EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	\$ 16.500.000,00	28/05/2025	29/05/2025	28/08/2025	
2025	2336	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EDINSON ALEXANDER	FERNANDEZ BAUTISTA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 18.000.000,00	28/05/2025	29/05/2025	28/08/2025	
2025	2357	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIEGO ALFONSO	OREJARENA DIAZ	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 24.000.000,00	3/06/2025	4/06/2025	3/12/2025	
2025	2367	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA LUCIA	DURAN AGUIRRE	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURIDICAS EN EL AREA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 25.000.000,00	6/06/2025	9/06/2025	8/11/2025	
2025	2372	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE MANUEL	CORZO ALVARADO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 52.000.000,00	9/06/2025	10/06/2025	24/12/2025	
2025	2373	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	IVAN ENRIQUE	CASTELLANOS JAIMES	PRESTAR SERVICIOS COMO TECNOLOGO PARA BRINDAR APOYO A LA GESTIÓN EN EL AREA DE CONTRATACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 26.000.000,00	9/06/2025	10/06/2025	24/12/2025	

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato	Fecha Liquidación Contrato
2025	2374	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	RAUL FERNANDO	FONTECHA PEÑA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL Y DE GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 35.750.000,00	9/06/2025	10/06/2025	24/12/2025	
2025	2379	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	WILFRED EMILIO	PALACIO VERANO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 44.800.000,00	10/06/2025	11/06/2025	22/12/2025	
2025	2380	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JULIAN	COLLAZOS LEON	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 35.750.000,00	10/06/2025	11/06/2025	25/12/2025	
2025	2382	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	INGRID NATALIA	MONSALVE ROSALES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN DENTRO DE SUS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 24.000.000,00	10/06/2025	11/06/2025	10/10/2025	
2025	2395	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LEIDY VIVIANA	TORRES RUIZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 16.800.000,00	16/06/2025	17/06/2025	16/12/2025	
2025	2396	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JAVIER MAURICIO	PARRA RODRIGUEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 33.000.000,00	16/06/2025	17/06/2025	16/12/2025	
2025	2403	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ROLANDO ANDRES	RINCON SARAVIA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 18.000.000,00	17/06/2025	18/06/2025	17/09/2025	
2025	2413	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LINO GERARDO	OCHOA ARGUELLO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN DENTRO DE SUS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 50.400.000,00	19/06/2025	24/06/2025	31/12/2025	
2025	2416	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EDWIN FERNANDO	AYALA CADENA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELÉCTRICISTA PARA EJECUTAR EL DISEÑO, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS; ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESDE LA OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 33.000.000,00	20/06/2025	24/06/2025	23/12/2025	
2025	2417	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MAYERLY ALEJANDRA	MEDINA CHARRY	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 42.000.000,00	20/06/2025	24/06/2025	23/12/2025	
2025	2418	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUIS DUVAN	RODRIGUEZ DIAZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN DENTRO DE SUS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 36.000.000,00	20/06/2025	24/06/2025	23/12/2025	

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato	Fecha Liquidación Contrato
2025	2419	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LINA MARIA	BASTOS MALDONADO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN DENTRO DE SUS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 36.000.000,00	20/06/2025	24/06/2025	23/12/2025	
2025	2420	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARYELY	VERA JACOME	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN DENTRO DE SUS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 36.000.000,00	20/06/2025	24/06/2025	23/12/2025	
2025	2423	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUZ DARY	MEDINA GOMEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES TÉCNICAS, FINANCIERAS Y ECONÓMICAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN DENTRO DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 36.000.000,00	20/06/2025	24/06/2025	23/12/2025	
2025	2428	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	BRAHIAN SNEYDER	OSORIO JAIMES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO FINANCIERO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 33.000.000,00	25/06/2025	26/06/2025	25/12/2025	
2025	2429	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIEGO ALEXANDER	LOPEZ OSORIO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO EN ENERGÍA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES DE ARTICULACIÓN TÉCNICA ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 39.000.000,00	25/06/2025	26/06/2025	25/12/2025	
2025	2430	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MANUELA	ESPINOSA RUIZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS, PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 33.000.000,00	25/06/2025	26/06/2025	25/12/2025	
2025	2443	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EDWIN YANDER	VALDERRAMA PICO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 46.400.000,00	25/06/2025	26/06/2025	19/12/2025	
2025	2444	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANDRES EDUARDO	ESTUPIÑAN EUGENIO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES TÉCNICAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN DENTRO DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 36.000.000,00	25/06/2025	26/06/2025	25/12/2025	
2025	2445	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FABIAN ANDRES	ARDILA PABON	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS, PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 25.500.000,00	26/06/2025	1/07/2025	20/12/2025	
