ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA

Informe de Gestión

Primer Trimestre

www.bucaramanga.gov.co

Alcaldía de Bucaramanga

INFORME DE GESTION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

La Secretaría de Infraestructura de Bucaramanga presenta el informe de gestión correspondiente al primer trimestre del año 2026, comprendido del 01 de enero de 2026 al 31 de marzo de 2026, en el cual ha continuado ejecutando y realizando las gestiones pertinentes para el control y avance de las diferentes obras que actualmente se encuentran en ejecución. Este documento tiene como objetivo proporcionar un resumen detallado de las actividades realizadas en el marco de las líneas estratégicas, programas y alineados con las metas del plan de desarrollo municipal para el periodo 2024-2027. Igualmente, el avance de cumplimiento en su ejecución presupuestal.

INFORME DE EJECUCION PRESUPESTAL

El presupuesto definitivo a 31 de marzo de 2026 de la Secretaria de Infraestructura, ascendió a $ 338.513.661.807 y se realizaron apropiaciones y compromisos por valor de $ 42.264.955.392,22 equivalente al **12,49%** de ejecución.

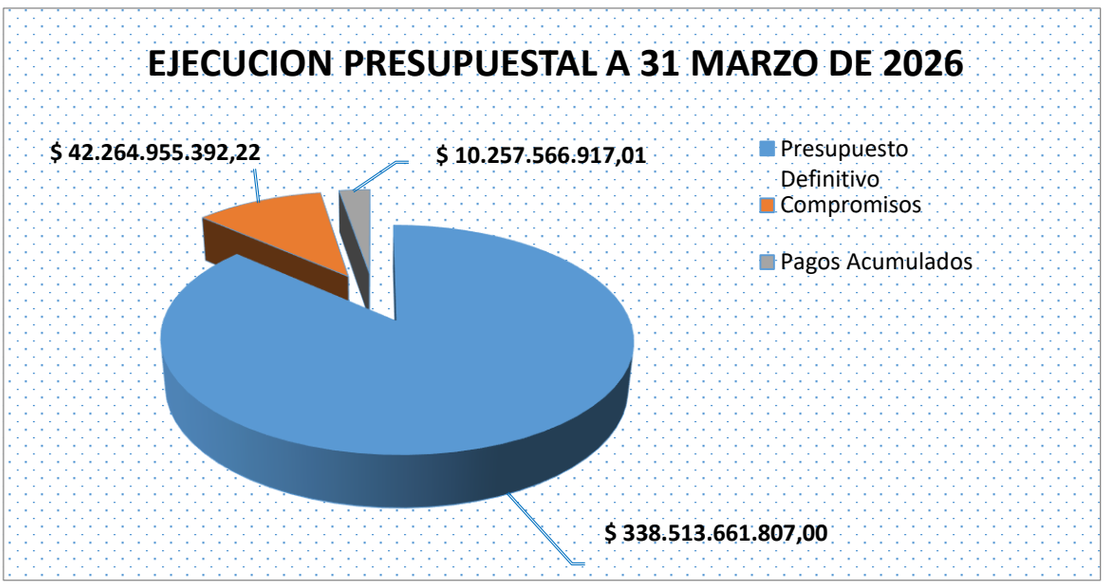

Durante el primer trimestre de 2026 de acuerdo a las diferentes necesidades se debieron realizar diferentes movimientos presupuestales de créditos y contracreditos, mediante los siguientes actos administrativos así: RESOLUCION No 4-R-202601-00000197 DEL 2026 DEL 22 DE ENERO DE 2026, RESOLUCION NO 4-R- 202601-00000541 del 29 enero -2026, RESOLUCION 009_0001-09 FEBRERO DE 2026, RESOLUCION No. 4-r-202602-00001398 DEL 26 FEBRERO, RESOLUCIÓN No. 4-R--202603-00002279 -17 MARZO DE 2026 y RESOLUCION No.4-R--202603-00002545-26 DE MARZO DE 2026, quedando como presupuesto definitivo el valor de $ 338.513.661.807,00

A continuación, se detalla la inversión por las diferentes líneas estratégicas, sector, programas, metas e indicadores del Plan de Desarrollo:

1. LINEA ESTRATEGICA 2. TERRITORIO SEGURO QUE PROGRESA

SECTOR: Transporte

PROGRAMA: Infraestructura red vial regional

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Mejorar 20 Km de Vías urbanas del municipio

Indicador	Meta 2026	Logro 2026	% Avance 2026	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Vía urbana mejorada	0,21	0	0%	$ 2.876.759.236	$ 0	0%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Mejoramiento de la malla vial y espacio público enmarcado dentro de la estrategia "plan revitalización del espacio público centro" en el Municipio de Bucaramanga, Santander	202500000016144	$1.004.295.290,00	$1.004.295.290,00

Descripción de actividades desarrolladas

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 163 DE 2022: "MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ENMARCADO DENTRO DE LA ESTRATEGIA "PLAN REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO CENTRO" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"

CONTRATISTA:	CONSORCIO MALLA INCAL NIT: 901606477-1 EDGAR ALONSO QUESADA OREJARENA
VALOR INICIAL:	$31.221.573.233,00
ANTICIPO (30%):	$ 9.366.471.969,90
VALOR ADICIONAL:	$ 11.900.862.783,12
VALOR ACUMULADO:	$ 43.122.436.016,12
PLAZO INICIAL:	6 MESES
PRORROGA No. 1	6 MESES
PRORROGA No. 2	3 MESES
PRORROGA No. 3	5 MESES
PRORROGA No. 4	14 DÍAS
PRORROGA No. 5	7 DÍAS
PRORROGA No. 6	5 MESES Y 16 DÍAS
PRORROGA No. 7	7 MESES
PRORROGA No. 8	45 DÍAS
PLAZO TOTAL:	34 MESES Y 22 DÍAS
INTERVENTORÍA:	SOLIUN INGENIERÍA S.A.S. NIT: 901114547-5
FECHA DE INICIO:	30 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	21 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO 1:	12 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	23 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE REINICIO 2:	10 DE MARZO DE 2025
ESTADO DEL CONTRATO:	TERMINADO
FECHA TERMINACIÓN FINAL	29 DE NOVIEMBRE 2025
PORCENTAJE AVANCE FÍSICO:	98,56%
AVANCE FINANCIERO:	97,95%
PERIODO INFORME:	1er TRIMESTRE DE 2025 (ENERO A MARZO)

ESTADO DEL CONTRATO: A la fecha y con la aprobación del contrato adicional se tienen dentro del alcance 24 frentes de obra en total, de los cuales 24 frentes ya se encuentran con acabados en piedra travertino vehicular, pavimento rígido en MR42 y travertino peatonal, con sus respectivas obras complementarias (optimización de redes de acueducto, alcantarillado e instalación de tubería para soterrado de red eléctrica);

24 frentes con terminados en piedra natural y calzada vehicular

- Carrera 10 entre calles 37 y 41
- Carrera 10 entre calles 41 y 42
- Carrera 10 entre calles 42 y 43
- Carrera 10 entre calles 43 y 44
- Carrera 11 entre calles 37 y 41
- Carrera 11 entre calles 41 y 42
- Carrera 11 entre calles 42 y 43
- Carrera 11 entre calles 43 y 44
- Calle 37 entre carreras 11 y 12
- Calle 37 entre carreras 12 y 13
- Carrera 12 entre calles 36 y 37
- Carrera 12 entre calles 37 y 41
- Carrera 12 entre calles 41 y 42
- Carrera 12 entre calles 42 y 43
- Carrera 12 entre calles 43 y 44
- Calle 41 entre carreras 9 y 10
- Calle 41 entre carreras 10 y 11
- Calle 41 entre carreras 11 y 12
- Calle 41 entre carreras 12 y 13
- Calle 42 entre carreras 9 y 10
- Calle 42 entre carreras 10 y 11
- Calle 42 entre carreras 11 y 12
- Calle 42 entre carreras 12 y 13
- Calle 43 entre carreras 10 y 11

Últimas Novedades contractuales: se suscribió una prórroga en plazo a los contratos de obra e interventoría, por un tiempo de 45 días y con fecha de terminación final a 29 de noviembre de 2025. A la fecha del presente informe, el contrato se encuentra terminado.
A continuación, se enuncian las principales actividades ejecutadas en el periodo del presente informe para cada frente de obra que hace parte del alcance actual del contrato.

- **Calle 42 entre carreras 12 y 13:**
  Acabados: Se realizaron acabados y adecuación de base se poste de alumbrado público existente en la esquina con cra 12
  Urbanismo: se realizó instalación de algunos bolardos faltantes en esquina con cara 13.

- **Calle 37 con cra 12:**
  - Acompañamiento al contratista para localización de semáforos: El día 10 de febrero, se realizó acompañamiento al contratista para la localización y replanteo de actividades para instalación de semáforos en la calle 37 con cra 12, se redefinieron los puntos para la ubicación de las cajas y utilización de cajas existentes de telemáticos para la interconexión.
  - Se realizó avance en la instalación de postes para los semáforos en la intersección.

- **Resumen en Otros Frentes**

  - **Acompañamiento al contratista y al área de alumbrado público para verificar el tema de las obras para la interconexión de subestaciones.**

Se realizó el acompañamiento al contratista de obra para realizar recorrido junto con el personal de alumbrado público referente al tema de la interconexión de las subestaciones

- Se instaló tablero de subestación pendiente instalación tablero de trasferencia
- Se programará reunión para socializar límites de alimentación de cada subestación
- Se deben renovar los protocolos de medidores y contadores que están vencidos desmontarlos y llevarlos nuevamente, son 4 medidores, se lleva a laboratorios donde se compró para calibrar o contadores la ESSA.
- El contratista está en proceso de elaboración de marquillas para luminarias y postes
- Las luminarias existentes ya se pueden recoger, desmontar y entregar a alumbrado con respectivo formato de entrega.

- **Atención de petición y solicitud de la policía en tema de señalización vertical instalada:** Se realizó acompañamiento a reunión con la policía nacional debido a que las señales verticales de tránsito instaladas en la cuadra de la policía calle 41 entre 11 y 12 (1 señal instalada y 3 más proyectadas) no son viables de instalar para la policía y ellos no autorizan por temas de seguridad del comando, es por esta razón que el contratista enviará comunicado a la alcaldía informando la situación.

- **Reparcheos Nocturnos:** el contratista ha venido realizando actividades de reparcheos nocturnos en los sectores de la calle 37 entre 13 y 15, complementando áreas que no habían sido atendidas y que presentan deterioro.

- **Gestión Ambiental y Social:** Se realizaron jornadas semanales de limpieza, mantenimiento de jardineras y podas. Socialmente, se ha mantenido acercamientos con la comunidad y demás entidades del sector.

Conclusiones Generales

- Progreso Físico: Al cierre de noviembre, el contrato de obra alcanzó un avance ejecutado del 98,56%.
- Estado Financiero: La inversión acumulada en obra corresponde al 97,95%
- Pendientes Finales: Las actividades remanentes se concentran en arreglos de detalles finales, terminación de interconexiones entre subestaciones eléctricas y trámites de actualización de diseños.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CALLE 42 ENTRE CARRERAS 12 y 13

Instalación de bolardos faltantes esquina con cra 13	*Adecuación de base de poste de alumbrado existente*

INTERSECCIÓN CARRERA 12 CON CALLE 37

Acompañamiento al contratista para localización de postes para semáforos

Instalación de postes para los semáforos en la intersección

OTROS FRENTES DE OBRA

Acompañamiento al contratista y al área de alumbrado público para verificar el tema de las obras para la interconexión de subestaciones

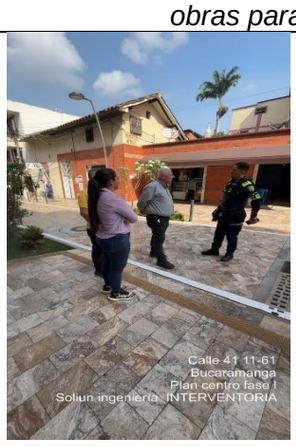

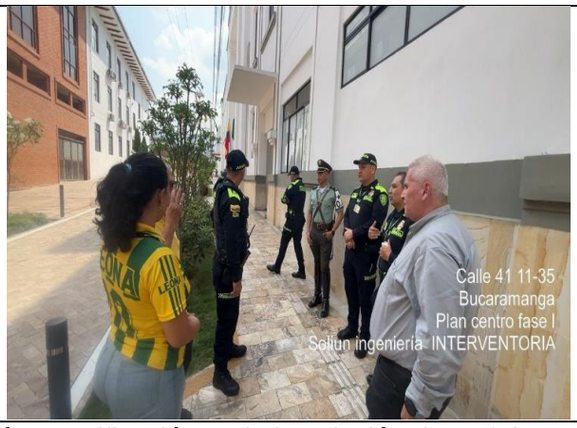

Reunión con personal de la policía para atención y verificación en la instalación de señales verticales en la calle 41 entre 11 y 12

Reparcheos de áreas sobre la calle 37 con cra 13 y cra 12 con cll 44

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER	2024680010051	$30,904,033,662.30	$30,904,033,662.30

Descripción de actividades desarrolladas

CONTRATO DE OBRA 052 DE 21 DE ABRIL DE 2025 (SI-SI-LP-002-2024) CONSORCIO GENPRO GROUP “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER”.

Valor del contrato:	**$ 29.043.476.777**
Valor Anticipo:	N/A
Plazo inicial:	A monto agotable o hasta el 31 de diciembre de 2025
Fecha de inicio:	23/05/2025
Fecha de terminación inicial:	31/12/2025
Fecha de terminación:	19/03/2026
Estado del Contrato:	En liquidación
Porcentaje avance:	100%

Ubicación: El proyecto se desarrolla en todas las comunas del Municipio de Bucaramanga.

Impacto: Comprende la ejecución de trabajos de mejoramiento y mantenimiento en las vías urbanas de Bucaramanga, mediante obras de bacheo y rehabilitación, en pavimento rígido o flexible buscando así la realizar actividades que mejoran la circulación vial y disminuyen el riesgo de accidentes.

Igualmente, la construcción de reductores de velocidad en diferentes puntos críticos de la ciudad avalados por la Dirección de tránsito de Bucaramanga – DTB, mediante la resolución 328 del 18 de junio de 2024.

1.COMUNA 1 - NORTE

2.COMUNA 2 - NORORIENTAL

3.COMUNA 3 - SAN FRANCISCO

4.COMUNA 4 - OCCIDENTAL

5.COMUNA 5 - GARCÍA ROVIRA

6.COMUNA 6 - LA CORNCORDIA

7.COMUNA 7 - CIUDADELA

8.COMUNA 8 - SUR OCCIDENTE

9.COMUNA 9 - LA PEDREGOSA

10.COMUNA 10 - PROVENZA

11.COMUNA 11 - SUR

12.COMUNA 12 - CABECERA DEL LLANO

13.COMUNA 13 - ORIENTAL

14.COMUNA 14 - MORRORICO

15.COMUNA 15 - CENTRO

15.COMUNA 16 - LAGOS DEL CACIQUE

15.COMUNA 17 - MUTIS

Este proyecto contribuye al mejoramiento del flujo vehicular en la ciudad, y la diminución de accidentes por ende el mejoramiento en los índices de seguridad vial.

Beneficios para la Comunidad:

- **Mejoramiento en el flujo vehicular:** Al contar con vías en buen estado mejora la circulación de los vehículos y los tiempos de circulación.
- **Menor Impacto a daños:** Se disminuye el riesgo de accidentes y daños en el parte automotor y sus componentes mecánicos.
- **Aumento de la Seguridad vial:** Se tiende a baja en la tasa de mortalidad por accidentes y el mejoramiento de las condiciones de los actores viales.

Carrera 15 entre calle 55 y Avenida La Rosita

Carrera 36 entre calle 56 y 55 – Cabecera

Se han realizado trabajos de mantenimiento y rehabilitación de la malla vial en diferentes comunas y barrios de la ciudad enfocados en el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo – Vía urbana mejorada, con un avance de 22 km hasta el momento.

- Concordia – calle 53 entre carrera 15 y 17
- Concordia – calle 52 entre carrera 17 y 17b
- Concordia – calle 17b entre calle 52 y 54
- Concordia – calle 54 entre carrera 15 y 17
- Ciudad Bolívar – Avenida guayacanes entre transversal metropolitana y carrera 1
- Ciudad Bolívar – Calle 64c entre carrera 1 y carrera 6ª
- Ciudad Bolívar – Calle 64 entre carrera 6ª y carrera 5
- Ciudad Bolívar – Carrera 6ª entre calle 63 y 64
- Naranjos – Carrera 3 entre calles 55 y 63ª
- Ciudadela Real de minas - Diagonal 13 entre calle 60 y avenida Samanes
- Ciudadela Real de minas – Carrera 7 sector plaza mayor
- Centro - Carrera 15 entre avenida rosita y calle 61ª
- Antonia Santos – Calle 35 entre carrera 25 y 26
- Delicias Altas – Calle 105 entre transversal metropolitana y carrera 15d
- Kennedy – Carrera 14 entre calles 16 y 17
- Kennedy – Carrera 15 entre calles 14 y 16
- Kennedy – Carrera 14 con calle 13
- Villa Rosa – Calle 13 entre Avenida el libertador y carrera 18ª
- Villa Rosa – Calle 15N avenida principal
- Villa Rosa – Carrera 18b
- Villa rosa – Carrera 20N Avenida principal
- Villa Rosa – Carrera 19N curva entrada a Villa Helena
- Provenza – Calle 115 entre carreras 22 y 23
- Provenza – Calle 114 entre carreras 22 y 23
- Provenza – Calle 113 entre carreras 22 y 23
- Provenza – Calle 112 entre carreras 22 y 23
- Provenza – Carrera 23 entre calle 105 y 111
- Provenza – Calle 108 entre calles 23c y 24ª
- Altos del Cacique
- San Expedito
- Transversal oriental
- Coaviconsa – Calle 103 entre transversal metropolitana y carrera 14
- Calle 61
- La Ceiba
- Carrera 36 entre calle 56 a la 52
- Carrera 35a entre calle 53 y 52
- Los Pinos
- La Joya
- Alfonso López
- La Pedregosa
- Monterredondo
- La Victoria
- Viveros de Provenza
- Los Ángeles
- García Rovira
- Porvenir

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Realizar el mantenimiento periódico o rutinario a 110 Km de Vías terciarias de la malla vial rural de la ciudad por año.

Indicador	Meta 2026	Logro 2026	% Avance 2026	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario km	110	200	100%	$ 2.000.000.000	$ 1.400.000.000	70%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Mantenimiento periódico de la red vial rural del Municipio de Bucaramanga Santander	2024680010043	$ 2.000.000.000	$ 6.620.379.446

Descripción de actividades desarrolladas

CONTRATO DE ALQUILER NO. 114 de fecha 16 de junio de 2025 -: HCL SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS “ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”.

Valor del contrato:	$2.818.077.627,00
Valor Anticipo:	N/A
Plazo inicial:	Hasta 30 de diciembre o hasta agotar monto
Fecha de inicio:	24 de junio de 2025
Fecha de terminación:	30 de diciembre de 2025
Estado del Contrato:	EJECUCIÓN
Porcentaje avance:	95,03%
Porcentaje avance financiero:	95,03%

Ubicación:

- Vías Rurales de los corregimientos 1, 2, y 3 del Municipio de Bucaramanga, Santander.

Impacto:

Con la ejecución del contrato se genera un impacto directo en la mejora de la red vial rural del municipio de Bucaramanga, garantizando la disponibilidad de maquinaria amarilla, volquetas y vehículos necesarios para la atención oportuna de actividades de mantenimiento, rehabilitación y contingencias derivadas de fenómenos climáticos en los 3 corregimientos del municipio de Bucaramanga, trabajando de manera simultánea con el fin de atender al en el menor tiempo a toda la población rural

Esta intervención fortalece la conectividad de las comunidades rurales con el casco urbano, reduciendo tiempos de desplazamiento, facilitando el acceso a la educación, la salud y el comercio, y promoviendo la competitividad del sector agrícola al optimizar el transporte de productos hacia los centros de comercialización o los denominados mercadillos de los fines de semana.

De igual forma, contribuye a la seguridad vial realizando la intervención de tramos críticos que representan riesgo de accidentalidad o que se encuentran con posibilidad de derrumbe de manera que con esto se vincule a toda la población rural al gobierno municipal y se fortalece la capacidad institucional de la Secretaría de Infraestructura para cumplir las metas establecidas en el Plan de Desarrollo “Bucaramanga Avanza Segura 2024–2027”

ESTADO DEL CONTRATO:

El contrato es a monto agotable y se ejecuta de acuerdo a las rutas indicadas por la comunidad tal como se puede ver en las siguientes imágenes:

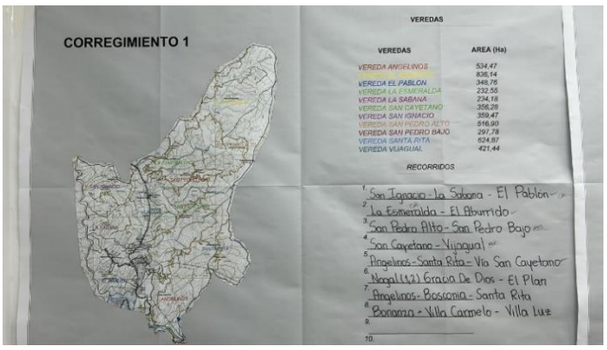

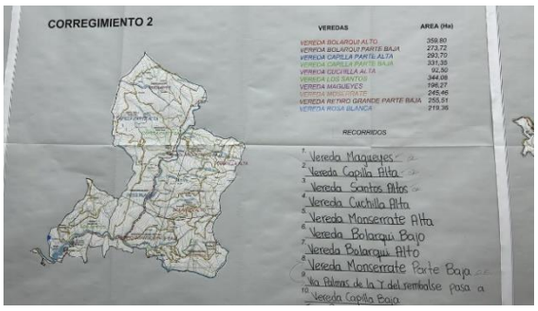

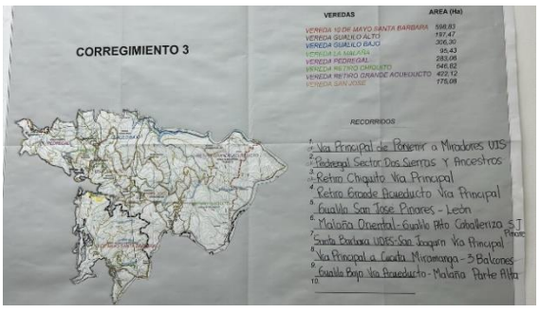

De manera que las labores han sido programadas con el banco de maquinaria conformado de la siguiente manera:
FRENTE DE TRABAJO CORREGIMIENTO UNO (1)

Motoniveladora - potencia 140kw
Retroexcavadora cargadora de llantas 420-potencia 70kw
Vibro compactador autopropulsado de rodillo sencillo 6,6 tn
Vibro compactador de rodillo de 10 t
Vibro compactador de rodillo de3tn
minicargador 242 potencia 55,4kw-con martillo hidráulico compatible
Retroexcavadora 320-potencia 117kw
volqueta de 6m3
camioneta pick up4x4 doble cabina

FRENTE DE TRABAJO CORREGIMIENTO DOS (2)

Motoniveladora - potencia 140kw
Retroexcavadora cargadora de llantas 420-potencia 70kw
Vibro compactador autopropulsado de rodillo sencillo 6,6 tn
Vibro compactador autopropulsado de rodillo de 10 t
Vibro compactador autopropulsado de rodillo de3tn
minicargador 242 potencia 55,4kw-con martillo hidráulico compatible
Retroexcavadora 320-potencia 117kw
volqueta de 6m3
camioneta pick up4x4 doble cabina

FRENTE DE TRABAJO CORREGIMIENTO TRES (03)

Retroexcavadora cargadora de llantas 420-potencia 70kw
Vibro compactador autopropulsado de rodillo sencillo 6,6 tn

Vibro compactador autopropulsado de rodillo de 10 t
Vibro compactador autopropulsado de rodillo de3tn
minicargador 242 potencia 55,4kw-con martillo hidráulico compatible
Retroexcavadora 320-potencia 117kw
volqueta de 6m3
camioneta pick up4x4 doble cabina

En este sentido en la atención inmediata de los corregimientos, la Administración Municipal ha materializado en la disposición de maquinaria amarilla y vehículos especializados, cuyo registro de operación refleja la magnitud del trabajo adelantado.

De manera que a la fecha ya se han atendido los sectores:

CORREGIMIENTO - 1	CORREGIMIENTO - 2	CORREGIMEINTO - 3
EL ABURRIDO	BOLARQUI ALTO	SANTA BARBARA
EL PABLON	BOLARQUI PARTA BAJA	GUALILO ALTO
LA ESMERALDA	CAPILLA PARTE ALTA	GUALILO BAJO
LA SABANA	CAPILLA PARTE BAJA	LA MALAÑA
SAN IGNACIO	CUCHILLA ALTA	PEDREGAL
SAN PEDRO ALTO	LOS SANTOS	RETIRO CHIQUITO
SAN PEDRO BAJO	MAGUEYES	RETIRO GRANDE
	RETIRO GRANDE	SAN JOSE

A continuación, se presentan imágenes de las actividades realizadas

RESUMEN DE INTERVENCIÓN EN ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DESPEJE DE VIAS POR OBSTRUCCIÓN, POR LLUVIAS SOBRE LAS VÍAS RURALES Y ZONAS URBANAS AFECTADAS. (OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2025) CON MAQUINARIA PROPIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

ENERO 2026

FECHA	Vereda-Barrio	Tramo Intervenido	Corregimiento - Urbano	Horas Máquina Invertida	CANTIDAD m3	Km Intervenidos	Actividades Realizadas
ene-26							
enero 26 2026	Parque de la Vida Calle 45 Campo hermoso		Urbano	0	0	0	Alistamiento encendido y pruebas preoperacionales de reinicio de máquinas y volquetas
enero 27 2026	Calle 29 4-38 Girardot		Urbano	0	0	0	Intervención de garantía volqueta OSA 818 sistema eléctrico
enero 28 2026	Parque de la Vida Calle 45 Campo hermoso		Urbano	0,6	0	0	Encendido de Vibrocompactador BW 177D-5
enero 30 2026	San Cayetano C1 - San Pedro Bajo C1	Vía San Cayetano C1 - Vía San Pedro Bajo C1	C1	0	0	0	Recorrido de reinicio Minicargador Case SR175B ubicado en Escuela de San pedro Bajo
			TOTAL MES ENERO 2026	**0,6**	**0**	**0**	
				TOTAL HORAS DE INTERVENCIÓN	**TOTAL m3**	**TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS**	
			ACUM. ENE 2026	**0,6**	**0**	**0**	

FEBRERO 2025

FECHA	Vereda- Barrio	Tramo Intervenido	Corregimiento - Urbano	Horas Máquina Invertida	CANTIDAD m3	Km Intervenidos	Actividades Realizadas
feb-26							
febrero 2 2026	San Pedro Bajo C1	Vía San Pedro Bajo C1 Ramal San Luis	C1	3,9	42	0,05	Recorrido de reinicio Minicargador Case SR175B ubicado en Escuela de San pedro Bajo - Despeje vía ramal San Luis
febrero 4 2026	San Pedro Bajo C1	Vía San Pedro Bajo C1 Vía principal y Ramal San Luis	C1	2,5	21	0,05	Despeje de vía principal de arbustos caídos por las lluvias y continuación despeje de derrumbe en la vía ramal San Luis
febrero 5 2026	San Pedro Bajo C1	Vía San Pedro Bajo C1 Ramal San Luis.	C1	4,5	35	0,15	Continuación despeje de derrumbes en la vía ramal San Luis habilitación de paso vehicular
febrero 9 2026	San Pedro Bajo C1	Vía San Pedro Bajo C1 Vía principal.	C1	1,1	21	0,1	Despeje de derrumbe en vía principal San Pedro Bajo
febrero 10 2026	Parque de la Vida Calle 45 Campo hermoso	Parque de la Vida Calle 45 Campo hermoso	Urbano	1,1	0	0	Encendido Vibrocompactador BW 177D-5 preoperacional activación de sistemas
febrero 10 2026	Parque de la Vida Calle 45 Campo hermoso UBA SSA	Parque de la Vida Calle 45 Campo Hermoso UBA SSA	Urbano	0	7	0	Apoyo de recolección de escombros Secretaría de Salud y Ambiente UBA

febrero 17 2026	San Pedro Alto C1	Vía principal San Pedro Alto Finca La Querencia	C1	0,5	0	0,2	Traslado de Minicargador Case SR175B ubicado en Escuela de San Pedro Bajo hasta Vía a San Pedro Alto para inicio de intervenciones del sector.
febrero 20 2027	Polideportivo Ciudad Bolívar	Polideportivo Ciudad Bolívar	Urbano	0	14	0	Recolección de escombros apoyo a cuadrilla de Parques SI
febrero 26 2027	Calle 37 7-31 Taller Municipal B. Alfonso López	Calle 37 7-31 Taller Municipal B. Alfonso López	Urbano	3,1	14	0	Apoyo actividad de aseo y limpieza de escombros a Sub Secretaría de Bienes y Servicios en Taller Municipal.
			TOTAL MES FEBRERO 2026	**13,6**	**140**	**0,55**	
				TOTAL HORAS DE INTERVENCIÓN	**TOTAL m3**	**TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS**	
			ACUM. FEB. 2026	**14,2**	**140**	**0,55**	

EVIDENCIAS FEBRERO 2026

2 feb 2026 12:56:25 p. m.
7°12'35.226"N 73°6'42.3"W
Altitud:1241.2msnm
Velocidad:1.0km/h

4 feb 2026 10:48:25 a.m.
+7.2109N -73.1125W
286° W
Santander
Altitud:1406.0msnm
Velocidad:0.0km/h
Cristhian Paredes Candela
Número de índice: 992

4 feb 2026 10:58:21 a.m.
+7.2109N -73.1125W
51° NE
Santander
Altitud:1415.0msnm
Velocidad:2.0km/h
Cristhian Paredes Candela
Número de índice: 994

4 feb 2026 10:48:31 a.m.
+7.2109N -73.1125W
290° W
Santander
Altitud:1405.0msnm
Velocidad:1.2km/h
Cristhian Paredes Candela
Número de índice: 993

4 feb. 2026 7:47:13 a. m.
+7.2041N -73.1190W
338° M
Altitud:1200.5msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 2502

9 feb 2026 10:53:21
7,2095N 73,1134W
12° N
Bucaramanga
Santander
Altitud:1377.1msnm
Velocidad:0.7km/h

9 feb 2026 11:01:57
7,2098N 73,1115W
312° NW
Santander
Bucaramanga
Altitud:1372.5msnm
Velocidad:0.9km/h

CASE
SR175B
17 feb 2026 11:42:05
+7.2102N -73.1068W
245° SW
Altitud:1609.2msnm
Velocidad:1.5km/h
Número de índice: 2568

17 feb 2026 2:58:59 p.m.
+7.2118N -73.0982W
285° W
Santander
Altitud:1749.0msnm
Velocidad:0.5km/h
Cristhian Paredes Candela
Número de índice: 1010

20 feb 2026 09:47:01
+7.0996N -73.1258W
332° NW
Cra. 3 #1-49, Girón, Bucaramanga, Santander, Colombia
Altitud:866.4msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 2591

24 feb 2026 07:09:13
+7.1158N -73.1524W
336° NW
Cl. 57 #88, García Rovira, Bucaramanga, Santander, Colombia
Altitud:897.2msnm
Velocidad:0.1km/h
Número de índice: 2599

25 feb 2026 12:58:38
+7.1083N -73.1364W
174° S
2 torre 1 apto 804, García Rovira, Bucaramanga, Santander, Colombia
Altitud:911.8msnm
Velocidad:0.3km/h
Número de índice: 2602

2 torre 1 apto 804, García Rovira, Bucaramanga, Santander, Colombia
Número de índice: 2604

MARZO 2026

FECHA	Vereda-Barrio	Tramo Intervenido	Corregimiento - Urbano	Horas Máquina Invertida	CANTIDAD m3	Km Intervenidos	Actividades Realizadas
mar-26							
marzo 3 2026	San Pedro Alto C1	Vía principal San Pedro Alto Finca La Querencia	C1	0,5	0	0	Encendido y revisión de filtración en sistema de alimentación, Minicargador Case SR175B en Vía a San Pedro Alto para inicio de intervenciones del sector.
marzo 4 2026	San Pedro Alto C1	Vía principal San Pedro Alto - Sector Loma de las Motos	C1	6,2	77	0,5	Remoción y despeje de derrumbe sobre la vía que obstruía la Ruta Escolar, cargue extendido y replanteo de recebo para habilitar paso en el sector.
marzo 5 2026	San Pedro Alto C1	Vía principal San Pedro Alto - Sector Loma de las Motos	C1	3,4	35	0,5	Continuación de remoción y despeje de derrumbe sobre la vía que obstruía la ruta escolar, cargue extendido y replanteo de recebo para habilitar paso en el sector.
marzo 6 2026	Parque de la Vida Calle 45 Campo hermoso	Parque de la Vida Calle 45 Campo hermoso	Urbano	2,9	0	0,13	Rutinas de encendido Vibrocompactador Bomag BW 177D-5 y vibrado de vía interna del Parque.
marzo 9 2026	San Pedro Alto - Ramal El Prado C1	Vía principal San Pedro Alto - Ramal El Prado	C1	3,1	4	0,8	Despeje de Derrumbe, verificación estado de la vía salida de San Pedro Alto - Ramal El Prado - El Aburrido
marzo 10 2026	Jardines del Tejar 2 Norte	Jardines del Tejar 2 Norte Parque del Tejar 2	Urbano	0	14		Apoyo a Bienes y Servicios recolección de escombros de tapete deteriorado del parque.
marzo 11 2026	Cra. 14A 45-131 Chorreras de don Jun	Cra. 14A 45-131 Chorreras de don Jun	Urbano	0	7	0	Apoyo a despeje de material de derrumbe de muro sobre el espacio público y la vía
marzo 12 2026	San Pedro Alto - Ramal El Prado C1	San Pedro Alto - Sector IE San Pedro Alto -	C1	1,7	3	0,1	Despeje, replanteo, cuneteo de vía principal que conduce a IE San Pedro Alto para construcción de placa huella.

		Ramal El Prado C1					
marzo 16 2026	San Pedro Alto - Ramal El Prado C1	San Pedro Alto - Ramal El Prado C1	C1	1,6	10	0,05	Despeje de derrumbe en puntos críticos, nivelación y replanteo.
marzo 16 2026	Jardines del Tejar 2 Norte	Jardines del Tejar 2 Norte Parque del Tejar 2	Urbano	0	21	0	Continuación apoyo a Bienes y Servicios recolección de escombros de tapete deteriorado del parque.
marzo 17 2026	San Pedro Alto - Ramal El Prado C1	San Pedro Alto - Ramal El Prado C1	C1	3,4	80	0,08	Despeje de derrumbe en puntos críticos, nivelación y replanteo.
marzo 19 2026	San Pedro Alto - Ramal El Prado - San Pedro Bajo	San Pedro Alto - Ramal El Prado - San Pedro Bajo	C1	2,5	9	0,6	Replanteo, despeje de derrumbes en puntos críticos en repaso de vía principales que conducen a las IE San Pedro Bajo y San Pedro Alto.
marzo 20 2026	San Pedro Bajo	San pedro Bajo	C1	3,6	21	0,5	Replanteo, despeje de derrumbes en puntos críticos San Pedro Bajo. Trasporte de material de recebo.
marzo 25 2026	Parque de la Vida Calle 45 Campo hermoso	Parque de la Vida Calle 45 Campo hermoso	Urbano	4,6	0	0	Preoperacionales máquinas y revisión de sistemas, niveles y mecanismos. - suministro de combustible.
			TOTAL MES MARZO 2026	**33,5**	**281**	**3,26**	
				TOTAL HORAS DE INTERVENCIÓN	**TOTAL m3**	**TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS**	
			ACUM. MAR. 2026	**47,7**	**421**	**3,81**	

EVIDENCIAS MARZO 2026

CASE
5 mar. 2026 10:25:15 a. m.
7.2105N 73.1004W
135° SE
Altitud:1761.7msnm
Velocidad:1.0km/h
Número de índice: 2644

CASE
5 mar. 2026 10:23:18 a. m.
+7.2106N -73.1004W
204° SW
Altitud:1761.0msnm
Velocidad:1.5km/h
Número de índice: 2643

5 mar 2026 10:00:12
7,2104N 73,1008W
256° W
Bucaramanga
Santander
Altitud:1754.4msnm
Velocidad:0.0km/h
Diego patiño

5 mar 2026 10:08:40
7,2093N 73,1018W
17° N
Altitud:1759.8msnm
Velocidad:0.5km/h
Diego patiño

16 mar. 2026 10:53:37 a. m.
+7.2105N -73.1002W
310° NW
Altitud:1753.6msnm
Velocidad:0.5km/h
Número de índice: 2690

CASE
SR175B
16 mar. 2026 10:54:21 a. m.
+7.2106N -73.1003W
234° SW
Altitud:1756.2msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 2692

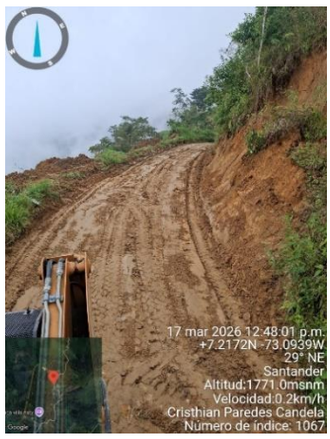

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Construir 5.000 metros lineales de placa huella en la zona rural

Indicador	Meta 2026	Logro 2026	% Avance 2026	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Placa huella construida	310	1182	100%	$ 2.633.963.069	$ 2.192.468.282	83,24%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES A TRAVES DE PLACA HUELLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	202500000035592	$ 2.633.963.069	$ 2.633.963.069

Descripción de actividades desarrolladas

Contrato 024 del 30 de enero de 2026 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-005-2026 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **CAPILLA ALTA** DEL CORREGIMIENTO DOS (02), PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER"

Valor del contrato: $ 394.139.879
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 4 meses
Fecha de Inicio: 23 de febrero de 2026
Fecha de terminación: 22 de junio de 2026
Estado del contrato: Finalizada la etapa de alistamiento e iniciando la ejecución
Porcentaje Avance físico ejecutado: 0%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la Vereda Capilla Alta, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 2 del municipio Bucaramanga.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de la vereda Capilla Alta y veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.

Placa Huella en la Vereda Capilla Alta

Contrato 025 del 30 de enero de 2026 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-002-2026 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **ESMERALDA** DEL CORREGIMIENTO (1) UNO, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER"

Valor del contrato: $ 394.139.879
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 4 meses
Fecha de Inicio: 23 de febrero de 2026
Fecha de terminación: 22 de junio de 2026
Estado del contrato: Finalizada la etapa de alistamiento e iniciando la ejecución
Porcentaje Avance físico ejecutado: 0%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la Vereda La Esmeralda, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 2 del municipio Bucaramanga.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de la vereda La Esmeralda y veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.

Placa Huella en la Vereda La Esmeralda

Contrato 026 del 30 de enero de 2026 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-001-2026 con el objetivo de “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **RETIRO GRANDE SECTOR ACUEDUCTO** DEL CORREGIMIENTO TRES (03), PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER”

Valor del contrato: $ 328.790.410
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 4 meses
Fecha de Inicio: 23 de febrero de 2026
Fecha de terminación: 22 de junio de 2026
Estado del contrato: Finalizada la etapa de alistamiento e iniciando la ejecución
Porcentaje Avance físico ejecutado: 0%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la Vereda Retiro Grande Sector Acueducto, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 2 del municipio Bucaramanga.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de la vereda Retiro Grande Sector Acueducto y veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.

Placa Huella en la Vereda Retiro Grande Sector Acueducto

Contrato 027 del 30 de enero de 2026 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-004-2026 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ABURRIDO PARTE BAJA DEL CORREGIMIENTO UNO (1), DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER"

Valor del contrato: $ 328.790.410
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 4 meses
Fecha de Inicio: 23 de febrero de 2026
Fecha de terminación: 22 de junio de 2026
Estado del contrato: Finalizada la etapa de alistamiento e iniciando la ejecución
Porcentaje Avance físico ejecutado: 0%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la Vereda Aburrido Parte Baja, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 2 del municipio Bucaramanga.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de la vereda Aburrido Parte Baja y veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.

Contrato 028 del 30 de enero de 2026 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-003-2026 con el objetivo de “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL **NOGAL PARTE SUR DE LA VEREDA VIJAGUAL**, CORREGIMIENTO 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y ALCANTARILLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”

Valor del contrato: $ 352.467.825
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 4 meses
Fecha de Inicio: 23 de febrero de 2026
Fecha de terminación: 22 de junio de 2026
Estado del contrato: En ejecución
Porcentaje Avance físico ejecutado: 21%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la Vereda Nogal Parte Sur De La Vereda Vijagual, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 2 del municipio Bucaramanga.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de la vereda Nogal Parte Sur De La Vereda Vijagual y veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.

Placa Huella en la Vereda Nogal Parte Sur De La Vereda Vijagual

Contrato 029 del 30 de enero de 2026 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-006-2026 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **SAN PEDRO BAJO SECTOR NORTE MIRAMAR** DEL CORREGIMIENTO UNO (01), PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER"

Valor del contrato: $ 394.139.879
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 4 meses
Fecha de Inicio: 23 de febrero de 2026
Fecha de terminación: 22 de junio de 2026
Estado del contrato: Finalizada la etapa de alistamiento e iniciando la ejecución
Porcentaje Avance físico ejecutado: 0%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la Vereda San Pedro Bajo Sector Norte Miramar, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 2 del municipio Bucaramanga.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de la vereda San Pedro Bajo Sector Norte Miramar y veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado

actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.

Placa Huella en la Vereda San Pedro Bajo Sector Norte Miramar

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES A TRAVES DE PLACA HUELLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	2024680010253	$ 9.522.592.280	$ 8.512.307.597

Descripción de actividades desarrolladas

Contrato 068 del 09 de mayo de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-001-2025 con el objetivo de “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **SAN CAYETANO Y SANTA RITA,** DEL CORREGIMIENTO UNO (1) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER”

Valor del contrato: $410.000.727,00
Plazo inicial: 4 meses
Fecha de Inicio: 20 de mayo de 2025
Fecha de terminación: 19 de septiembre de 2025
Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación
Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda San Cayetano, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 1 del municipio Bucaramanga.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de la vereda San Cayetano y veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos,

reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.

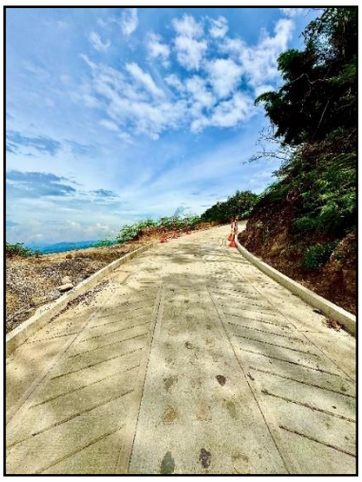

Placa Huella en la Vereda San Cayetano y Santa Rita

Contrato 069 del 09 de mayo de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-005-2025 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **MONSERRATE Y RETIRO GRANDE** DEL CORREGIMIENTO DOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER"

Valor del contrato: $410.000.000,00
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 4 meses
Plazo con prórrogas: 6 meses
Suspensión: 15 días
Fecha de Inicio: 26 de mayo de 2025
Fecha de terminación: 10 de diciembre de 2025
Estado del contrato: En ejecución – En suspensión temporal
Porcentaje Avance físico ejecutado: 70%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Monserrate y Retiro Grande, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 2 del municipio Bucaramanga.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de la vereda Monserrate y Retiro Grande y veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.

Placa Huella en la Vereda Monserrate y Retiro Grande

Contrato 070 del 09 de mayo de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-004-2025 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **LOS ANGELINOS SECTOR LA CEMENTO** DEL CORREGIMIENTO UNO (1), DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER"

Valor del contrato: $410.000.000,00
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 4 meses
Plazo con Prórroga: 5 meses
Fecha de Inicio: 20 de mayo de 2025
Fecha de terminación: 19 de octubre de 2025
Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación
Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Los Angelinos Sector La Cemento, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 1 del municipio Bucaramanga.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de la vereda Los Angelinos Sector La Cemento y veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.

Placa Huella en la Vereda Los Angelinos Sector La Cemento

Contrato 071 del 09 de mayo de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-002-2025 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **SANTA BARBARA SECTOR BAJO LA UDES SAN JOAQUIN**, DEL CORREGIMIENTO TRES (3) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y ALCANTARILLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"

Valor del contrato: $410.000.000,00
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 4 meses
Plazo con Prórroga: 5 meses
Fecha de Inicio: 20 de mayo de 2025
Fecha de terminación: 19 de octubre de 2025
Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación
Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Santa Barbara Sector Bajo La Udes San Joaquin, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 3 del municipio Bucaramanga.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de la vereda Santa Barbara Sector Bajo La Udes San Joaquin y veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.

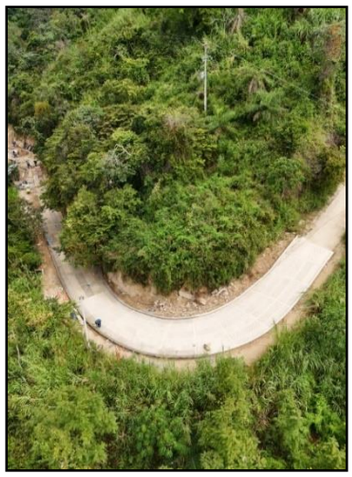

Placa Huella en la Vereda Santa Bárbara Sector Bajo La Udes San Joaquín

Contrato 072 del 09 de mayo de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-003-2025 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **LA CAPILLA** DEL CORREGIMIENTO DOS (2) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y ALCANTARILLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"

Valor del contrato: $410.000.000,00
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 4 meses
Plazo con Prórroga: 5 meses
Fecha de Inicio: 20 de mayo de 2025
Fecha de terminación: 19 de octubre de 2025
Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación
Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda La Capilla, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 2 del municipio Bucaramanga.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de la vereda La Capilla y veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.

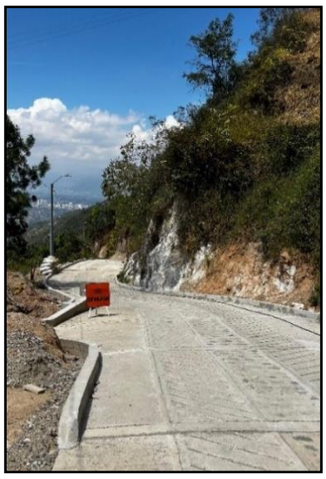
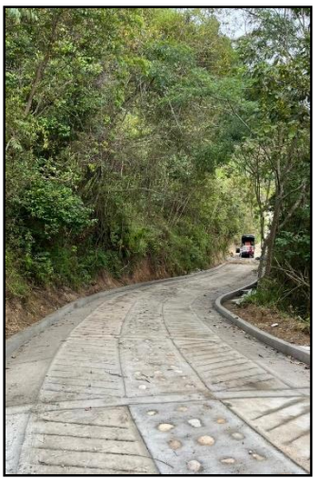

Placa Huella en la Vereda La Capilla

Contrato 109 del 13 de junio de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-009-2025 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **ROSA BLANCA** DEL CORREGIMIENTO DOS (2), MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y ALCANTARILLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER"

Valor del contrato: $410.000.000,00
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 4 meses
Fecha de Inicio: 4 de agosto de 2025
Fecha de terminación: 3 de diciembre de 2025
Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación
Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Rosa Blanca, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 2 del municipio Bucaramanga.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de la vereda Rosa Blanca y veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.

Placa Huella en la Vereda Rosa Blanca

Contrato 110 del 13 de junio de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-008-2025 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **CUCHILLA ALTA** DEL CORREGIMIENTO DOS (2), DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER"

Valor del contrato: $410.000.000,00
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 4 meses
Plazo con Prórroga: 5 meses y 20 días
Fecha de Inicio: 12 de agosto de 2025
Fecha de terminación: 15 de febrero de 2026
Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación
Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Cuchilla Alta, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 2 del municipio Bucaramanga.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de la vereda Cuchilla Alta y veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.

Placa Huella en la Vereda Cuchilla Alta

Contrato 111 del 13 de junio de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-007-2025 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **SANTA RITA SECTOR CEYLAN MONTECRISTO** DEL CORREGIMIENTO UNO (1) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER"

Valor del contrato: $410.000.000,00
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 4 meses
Plazo con Prórroga: 5 meses
Fecha de Inicio: 18 de julio de 2025
Fecha de terminación: 17 de diciembre de 2025
Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación
Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Santa Rita Sector Ceylan Montecristo, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 1 del municipio Bucaramanga.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de la vereda Santa Rita Sector Ceylan Montecristo y veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.

Placa Huella en la Vereda Santa Rita Sector Ceylan Montecristo

Contrato 112 del 13 de junio de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-010-2025 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **VIJAGUAL** DEL CORREGIMIENTO UNO (1), DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER"

Valor del contrato: $410.000.000,00
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 4 meses
Fecha de Inicio: 14 de julio de 2025
Fecha de terminación: 13 de noviembre de 2025
Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación
Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Vijagual, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 1 del municipio Bucaramanga.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de la vereda Vijagual y veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.

Placa Huella en la Vereda Vijagual

Contrato 113 del 13 de junio de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-006-2025 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **MAGUEYES** DEL CORREGIMIENTO DOS, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y ALCANTARILLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER"

Valor del contrato: $410.000.000,00
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 4 meses
Plazo con Prórroga: 5 meses
Fecha de Inicio: 14 de julio de 2025
Fecha de terminación: 13 de diciembre de 2025
Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación
Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Magueyes, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 2 del municipio Bucaramanga.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de la vereda Magueyes y veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.

Placa Huella en la Vereda Magueyes

Contrato 210 del 04 de septiembre de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-011-2025 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **GUALILO PARTE ALTA** DEL CORREGIMIENTO TRES, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y ALCANTARILLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER"

Valor del contrato: $410.000.000,00
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 4 meses y 10 días
Fecha de Inicio: 18 de septiembre de 2025
Fecha de terminación: 16 de febrero de 2026
Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación
Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Gualilo Parte Alta, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 3 del municipio Bucaramanga.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de la vereda Gualilo Parte Alta y veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.

Placa Huella en la Vereda Gualilo Parte Alta

Contrato 211 del 04 de septiembre de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-016-2025 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE **SAN PEDRO ALTO** DEL CORREGIMIENTO UNO (1) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y ALCANTARILLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"

Valor del contrato: $328.790.410
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 5 meses y 15 días
Fecha de Inicio: 18 de septiembre de 2025
Fecha de terminación: 8 de abril de 2026
Estado del contrato: En ejecución
Porcentaje Avance físico ejecutado: 96%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda San Pedro Alto, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 1 del municipio Bucaramanga.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de la vereda San Pedro Alto y veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.

Placa Huella en la Vereda San Pedro Alto

Contrato 212 del 04 de septiembre de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-013-2025 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL **PEDREGAL** DEL CORREGIMIENTO TRES (3) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER"

Valor del contrato: $762.467.825
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 6 meses y 15 días
Fecha de Inicio: 18 de septiembre de 2025
Fecha de terminación: 20 de abril de 2026
Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación
Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Pedregal, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 3 del municipio Bucaramanga.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de la vereda Pedregal y veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.

Placa Huella en la Vereda Pedregal

Contrato 213 del 04 de septiembre de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-012-2025 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **SAN JOSE** DEL CORREGIMIENTO TRES (3) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER"

Valor del contrato: $762.467.825
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 6 meses y 15 días
Fecha de Inicio: 18 de septiembre de 2025
Fecha de terminación: 14 de abril de 2026
Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación
Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda San José, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 3 del municipio Bucaramanga.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de la vereda San José y veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.

Placa Huella en la Vereda San José

Contrato 214 del 04 de septiembre de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-015-2025 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **EL ABURRIDO PARTE ALTA**, DEL CORREGIMIENTO UNO (1) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y ALCANTARILLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"

Valor del contrato: $ 352.467.825
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 6 meses y 15 días
Fecha de Inicio: 22 de septiembre de 2025
Fecha de terminación: 10 de junio de 2026
Estado del contrato: En ejecución
Porcentaje Avance físico ejecutado: 20%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda El Aburrido Parte Alta, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 1 del municipio Bucaramanga.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de la vereda El Aburrido Parte Alta y veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.

Placa Huella en la Vereda El Aburrido Parte Alta

Contrato 220 del 12 de septiembre de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-014-2025 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **LOS SANTOS PARTE ALTA** DEL CORREGIMIENTO DOS (2) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER"

Valor del contrato: $762.467.825
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 7 meses y 15 días
Fecha de Inicio: 23 de septiembre de 2025
Fecha de terminación: 21 de mayo de 2026
Estado del contrato: En ejecución
Porcentaje Avance físico ejecutado: 60%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Los Santos Parte Alta, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 2 del municipio Bucaramanga.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de la vereda Los Santos Parte Alta y veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.

Placa Huella en la Vereda Los Santos Parte Alta

Contrato 269 del 30 de octubre de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-018-2025 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **BOLARQUI BAJO** DEL CORREGIMIENTO DOS (2) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER"

Valor del contrato: $ 273.881.925
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 6 meses
Fecha de Inicio: 19 de noviembre de 2025
Fecha de terminación: 21 de mayo de 2026
Estado del contrato: En ejecución
Porcentaje Avance físico ejecutado: 73%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Bolarqui Bajo, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 2 del municipio Bucaramanga.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de la vereda Bolarqui Bajo y veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.

Placa Huella en la Vereda Bolarqui Bajo

SECTOR: Vivienda Ciudad y Territorio

PROGRAMA: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Beneficiar a 289.645 usuarios con subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en los estratos 1, 2 y 3.

Indicador	Meta 2026	Logro 2026	% Avance 2026	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Usuarios beneficiados con subsidios al consumo	289.645	289.645	100%	$ 49.620.356.570	$ 2.110.448.422	4,25%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Subsidios a los servicios púbicos de acueducto, alcantarillado y aseo a la población de estratos 1, 2 y 3 del Municipio de Bucaramanga.	2024680010048	$ 49.620.356.570	$ 99.240.713.141

Descripción de actividades desarrolladas

Durante el primer trimestre de la presente vigencia la Secretaria de Infraestructura continúa realizado el pago de los subsidios a las diferentes empresas de servicios públicos, facturación enviada por la Unidad Técnica de Servicios Públicos detalle acumulado por empresas así:

EMPRESA	VALOR PAGADO
ACUEDUCTO	$ 993.988.633,00
EMPAS	$ 198.541.069,00
EMAB	$ 804.079.227,00
LIMPIEZA URBANA	$ 99.726.741,00
VEOLIA	$ 14.112.752,00
VALOR TOTAL	**$ 2.110.448.422,00**

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Transportar y entregar 18.000 metros cúbicos de Agua potable en carrotanques para garantizar el mínimo vital de agua en zonas sin cobertura del municipio.

Indicador	Meta 2026	Logro 2026	% Avance 2026	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Agua transportada y entregada	6.000	0	0%	$ 150.000.000	$ 0	0%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Suministro de agua potable para garantizar la cobertura del mínimo vital de agua a los sectores de los corregimientos 1, 2, y 3 del Municipio de Bucaramanga, Santander	2024680010053	$ 150.000.000	$ 538.055.514

Descripción de actividades desarrolladas

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 134 **DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024** "SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA GARANTIZAR LA COBERTURA DEL MINIMO VITAL DE AGUA A LOS SECTORES DE LOS CORREGIMIENTOS 1, 2, 3 DEL MUNCIPIO DE BUCARAMANGA.

NÚMERO DEL CONVENIO:	134
FECHA DEL CONTRATO:	20/09/2024
TIPOLOGÍA DEL CONTRATO O CONVENIO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
MODALIDAD DE SELECCIÓN DE CONTRATO:	CONTRATACIÓN DIRECTA
CONTRATISTA	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. ESP
OBJETO:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA GARANTIZAR LA COVERTURA DEL MINIMO VITAL DE AGUA A LOS SECTORES DE LOS CORREGIMIENTO 1,2,3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
PLAZO EJECUCIÓN:	3 MESES Y QUINCE (15) DÍAS
VALOR INICIAL:	$188.055.514
FECHA DE INICIO	16 DE OCTUBRE DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE DEL 2024
FECHA SUPENSIÓN N°. 01	20 DE DICIEMBRE DEL 2024
FECHA DE REINICIO No 1	17 DE FEBRERO DE 2025

PRORROGA No 1	(DIEZ (10) MESES- 17 DE FEBRERO DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	26 DE DICIEMBRE DE 2025

Estado del Contrato : TERMINADO
Porcentaje avance : 100%

Ubicación:

- Vereda Chiltota.
- Asentamiento Villa Carmelo
- El porvenir, Los cuadros.
- Vereda San Ignacio.

Impacto: Este proyecto impacta a 682 familias del sector rural del Municipio de Bucaramanga

Beneficios para la Comunidad:

El artículo 2 de la constitución Política de Colombia, establece que son fines esenciales del estado; servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitución; facilita la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia política y la vigilancia de un orden justo(…)

Imagen No 1. Suministro de agua potable Villa Carmelo

Imagen No 2. Vereda los santos bajos

Imagen No 3. Vereda Chitota

Imagen No 4. Vereda Los Cuadros

Imagen No 5. Estacion Carabineros

2. LINEA ESTRATEGICA 3. TERRITORIO SEGURO Y SOSTENIBLE

SECTOR: Vivienda Ciudad y Territorio

PROGRAMA: Ordenamiento Territorial y Desarrollo urbano

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Adecuar 300,000 metros cuadrados de espacio púbico.

Indicador	Meta 2026	Logro 2026	% Avance 2026	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Espacio público adecuado	119.276	18.902	16%	$ 47.842.894.837	$ 7.734.153.516	16,16%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL EN LA CARRERA 26 (PASEO ESPAÑA) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER	2022680010054	$ 5.907.177.515,24	$ 9.072.944.903,00
	202500000019302	$ 2.740.728.019,29	$ 2.740.728.019,29

Descripción de actividades desarrolladas

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 387 DE 2022: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA "CENTRO CAMINABLE "EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER

CONTRATISTA:	COINOBRAS S.A.S. NIT. 804.000.152-8 MILTON VILLARREAL MURILLO
VALOR INICIAL:	$9.072.944.903,00
ANTICIPO (30%):	N/A
VALOR ADICIONAL:	$2.075.728.019,29
VALOR ACUMULADO:	$11.148.672.710,47
PLAZO INICIAL:	10 MESES
PRORROGA No. 1:	5 MESES
PRORROGA No. 2	30 DÍAS
PRORROGA No. 3	7 MESES
PRORROGA No.4	45 DIAS
PLAZO TOTAL:	24 MESES Y 15 DIAS
INTERVENTORÍA:	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER NIT: 890.201.213-4
FECHA DE INICIO:	01 DE AGOSTO DE 2024
SUSPENSIÓN 1:	SUSPENDER POR EL TÉRMINO DE (01) UN MES Y (02) DOS DIAS DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 28 DE ENERO DE 2025 Y/O CUANDO SE SUPEREN LAS CAUSAS DE LA SUSPENSION.
AMPLIACION A LA SUSPENSIÓN No. 1	SUSPENDER POR EL TÉRMINO DE (15) QUINCE DIAS DEL 29 DE ENERO DE 2025 AL 12 DE FEBRERO DE 2025 Y/O CUANDO SE SUPEREN LAS CAUSAS DE LA SUSPENSION.
AMPLIACIÓN No.2 A LA SUSPENSIÓN Nº1	SUSPENDER POR EL TÉRMINO DE (14) CATORCE DIAS DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 AL 26 DE FEBRERO DE 2025 Y/O CUANDO SE SUPEREN LAS CAUSAS DE LA SUSPENSION.
AMPLIACIÓN No.3 A LA SUSPENSIÓN Nº1	SUSPENDER POR EL TÉRMINO DE (05) DIAS DEL 27 DE FEBRERO DE 2025 AL 03 DE MARZO DE 2025 Y/O CUANDO SE SUPEREN LAS CAUSAS DE LA SUSPENSION.
REINICIO Nº1	SE REINICIÓ EL CONTRATO EL DIA 04 DE MARZO DE 2025 Y EN CONSECUENCIA LA FINALIZACIÓN ES EL DIA 13 DE MARZO DE 2025.
PRORROGA No. 1	PRÓRROGA DE (15) QUINCE DIAS APARTIR DE 14 DE MARZO DE 2025 AL 28 DE MARZO DE 2025
PRORROGA No. 2	PRÓRROGA DE (15) QUINCE DIAS APARTIR DE 29 DE MARZO DE 2025 AL 12 DE ABRIL DE 2025
PRORROGA No. 3	PRÓRROGA DE (07) MESES APARTIR DE 13 DE ABRIL DE 2025 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025

PRORROGA No. 4	PRÓRROGA DE (45) DIAS APARTIR DE 13 DE ABRIL DE 2025 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025
ESTADO DEL CONTRATO:	FINALIZADO
PORCENTAJE AVANCE FÍSICO:	91,85%

ESTADO DEL CONTRATO: Actualmente se tiene un avance físico de la obra de 91,85% y un avance financiero del 88,17%. Se suscribió Acta de Finalización del Contrato de obra No. 387 de 2022 el día 29 de enero de 2025, con un plazo de ejecución de ajustes y adecuaciones pendientes de obra descritos en la misma acta, se contempló un plazo inicial para que el contratista los ejecutara, hasta el 29 de enero de 2026, ese mismo día, una vez realizada la verificación de avance en la ejecución de las adecuaciones por subsanar por parte del contratista, la interventoría detectó que el contratista acató las directrices impartidas, sin embargo, no había culminado la totalidad de las observaciones dadas a las actividades de obra, así como las mejoras en los elementos intervenidos. Posteriormente el 20 de febrero de 2026, se realizó nuevamente la verificación de avance de las actividades pendientes por subsanar, en donde la interventoría detectó que aún no se había culminado la totalidad de las observaciones dadas, las cuales deben ser atendidas por parte del contratista, para que la obra quede recibida a satisfacción, entre las que se encuentran:

- Reparación y/o reposición de bolardos instalados.
- Instalación de cinta guía amarilla en andenes.
- Instalación de pasamanos y/o barandas donde la norma lo exija.
- Repaso de pintura de señalización horizontal y adecuación de alturas de la vertical.
- Tramites de legalización de los diferentes servicios públicos ante las entidades encargadas (alcantarillado, Retie, Retilap).
- Terminación de la red de alumbrado público, en lo que corresponde: nomenclaturas de la red y finalización del gabinete de control entre otros.
- Adecuación de enchape en piedra Royal Veta y alerta toperol o guías partidas.
- Cierre de PQRS y actas de vecindad.
- Recorrido final con la Dirección de Transito de Bucaramanga para verificación, aprobación y entrega de la señalización horizontal y vertical, semaforización y programación semafórica, actividades que presentan avance en su trámite.

Es de aclarar que se evidencia que el proyecto funciona con normalidad y las actividades pendientes por subsanar no comprometen la integridad de las personas que circulan este corredor. Por otra parte, teniendo en cuenta que contractualmente, el proyecto tiene fecha de liquidación de cuatro (04) meses, se aprobó al contratista de obra ese tiempo para culminar las adecuaciones a que haya lugar, la fecha máxima de entrega a satisfacción es el 27 de abril de 2026.

A continuación, se enuncian las principales actividades ejecutadas en el periodo del presente informe para cada frente de obra que hace parte del alcance actual del contrato, se realizaron actividades en 7 frentes.

- **Carrera 26 entre calles 32 y 33:** se realizó la subsanación de las observaciones dadas por la interventoría a las obras intervenidas tales como: cambio de bolardos defectuosos, ajuste de la señalización horizontal y vertical, adecuación de las losas Royal Veta en accesos a parqueadero, nomenclaturas de la red.
- **Carrera 26 entre calles 33 y 34:** se realizó la subsanación de las observaciones dadas por la interventoría a las obras intervenidas tales como: cambio de bolardos defectuosos, ajuste de la señalización horizontal y vertical, adecuación de las losas Royal Veta en accesos a parqueadero y andenes, nomenclaturas de la red, instalación de carpeta asfáltica sobre calle 33, instalación de pasamanos y baranda, instalación de cinta guía amarilla en andenes.
- **Carrera 26 entre calles 34 y 35:** se realizó la subsanación de las observaciones dadas por la interventoría a las obras intervenidas tales como: cambio de bolardos defectuosos, ajuste de la señalización horizontal y vertical, adecuación de las losas Royal Veta en accesos a parqueadero y andenes, nomenclaturas de la red, instalación de pasamanos y baranda, instalación de cinta guía amarilla en andenes, reparación de toperol en andenes.

- **Carrera 26 entre calles 35 y 36:** se realizó la subsanación de las observaciones dadas por la interventoría a las obras intervenidas tales como: cambio de bolardos defectuosos, ajuste de la señalización horizontal y vertical, adecuación de las losas Royal Veta en accesos a parqueadero y andenes, nomenclaturas de la red, instalación de pasamanos y baranda, instalación de cinta guía amarilla en andenes, reparación de toperol en andenes.
- **Carrera 26 entre calles 36 y 37:** se realizó la subsanación de las observaciones dadas por la interventoría a las obras intervenidas tales como: cambio de bolardos defectuosos, ajuste de la señalización horizontal y vertical, adecuación de las losas Royal Veta en accesos a parqueadero y andenes, nomenclaturas de la red, instalación de pasamanos y baranda, instalación de cinta guía amarilla en andenes, reparación de toperol en andenes, intervención de separador vía.
- **Calle 37 entre carreras 26 y 27:** se realizó la subsanación de las observaciones dadas por la interventoría a las obras intervenidas tales como: cambio de bolardos defectuosos, ajuste de la señalización horizontal y vertical, adecuación de las losas Royal Veta en accesos a parqueadero y andenes, nomenclaturas de la red, instalación de pasamanos y baranda, instalación de cinta guía amarilla en andenes, reparación de toperol en andenes, intervención de separador vía, instalación de carpeta asfáltica para nivelación entre concreto instalado y pavimento existente.
- **Calle 37 entre carreras 26 y 25:** se realizó la subsanación de las observaciones dadas por la interventoría a las obras intervenidas tales como: cambio de bolardos defectuosos, ajuste de la señalización horizontal y vertical, adecuación de las losas Royal Veta en accesos a parqueadero y andenes, nomenclaturas de la red, instalación de pasamanos y baranda, instalación de cinta guía amarilla en andenes, reparación de toperol en andenes, intervención de separador vía, instalación de carpeta asfáltica para nivelación entre concreto instalado y pavimento existente, construcción de caja de barraje.

Durante el periodo del presente informe comprendido a partir del 01 de enero de 2026 hasta el 30 de marzo de 2026, se han realizado diferentes actividades así:

INTERSECCIÓN CALLE 32 CON CARRERA 26

INTERSECCIÓN CARRERA 26 CON CALLE 32 SENTIDO OCCIDENTE

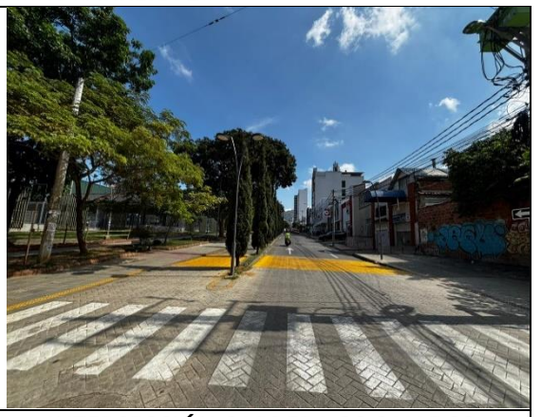

INTERSECCIÓN CARRERA 26 CALLE 32 SENTIDO ORIENTE

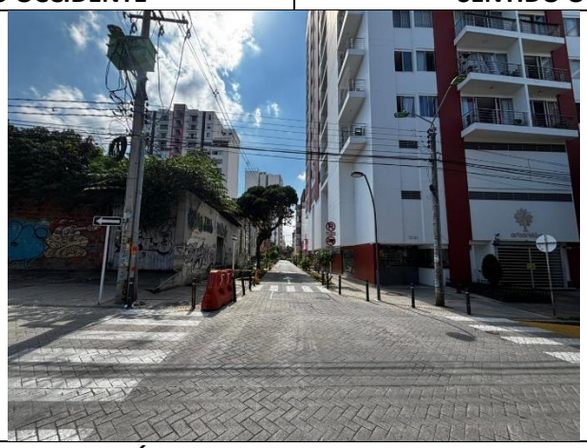

INTERSECCIÓN CARRERA 26 CALLE 32 SENTIDO SUR

CARRERA 26 ENTRE CALLE 32 Y 33

	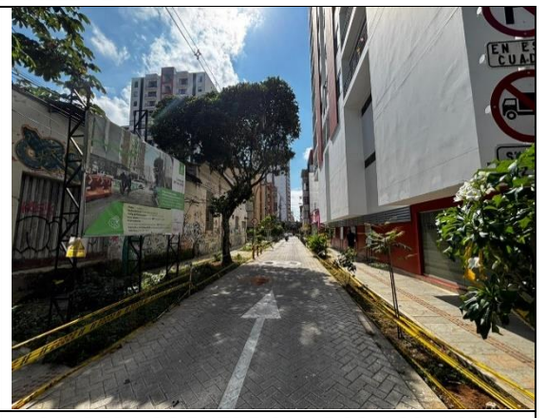
CARRERA 26 ENTRE CALLE 32 Y 33 VISTA NORTE	**CARRERA 26 ENTRE CALLE 32 Y 33 VISTA SUR**

INTERSECCIÓN CALLE 33 CON CARRERA 26

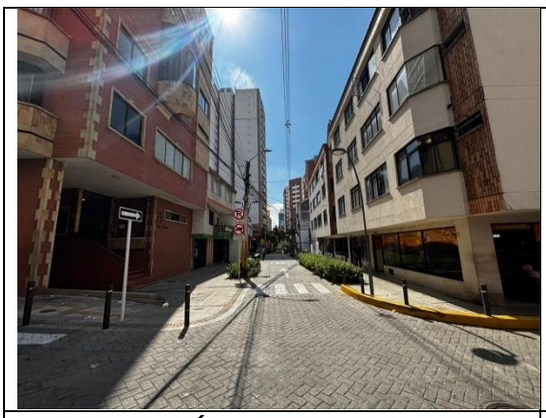	
INTERSECCIÓN CARRERA 26 CALLE 33 SENTIDO SUR	**INTERSECCIÓN CARRERA 26 CALLE 33 SENTIDO OCCIDENTE**
INTERSECCIÓN CARRERA 26 CALLE 33 SENTIDO NORTE	**INTERSECCIÓN CARRERA 26 CALLE 33 SENTIDO ORIENTE**

CARRERA 26 ENTRE CALLE 33 Y 34

CARRERA 26 ENTRE CALLE 33 Y 34 VISTA NORTE	**CARRERA 26 ENTRE CALLE 33 Y 34 VISTA SUR**

INTERSECCIÓN CALLE 34 CON CARRERA 26

	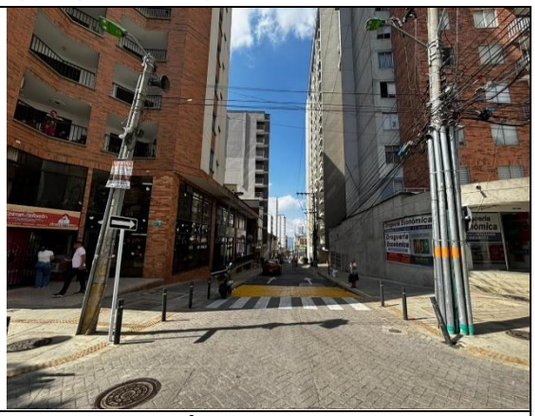
INTERSECCIÓN CARRERA 26 CALLE 34 SENTIDO SUR	**INTERSECCIÓN CARRERA 26 CALLE 34 SENTIDO OCCIDENTE**
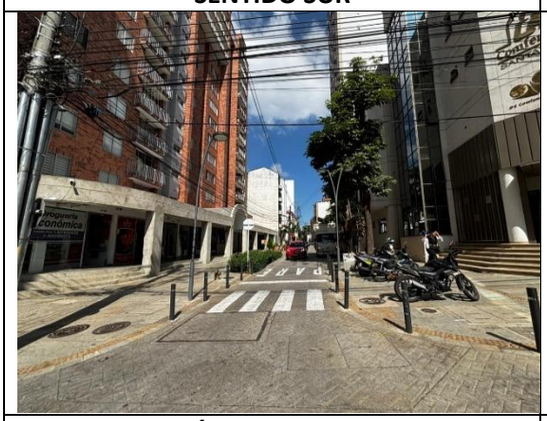	
INTERSECCIÓN CARRERA 26 CALLE 34 SENTIDO NORTE	**INTERSECCIÓN CARRERA 26 CALLE 34 SENTIDO ORIENTE**

CARRERA 26 ENTRE CALLE 34 Y 35

CARRERA 26 ENTRE CALLE 34 Y 35 VISTA NORTE	**CARRERA 26 ENTRE CALLE 34 Y 35 VISTA SUR**

INTERSECCIÓN CALLE 35 CON CARRERA 26

INTERSECCIÓN CARRERA 26 CALLE 35 SENTIDO SUR	**INTERSECCIÓN CARRERA 26 CALLE 35 SENTIDO OCCIDENTE**
	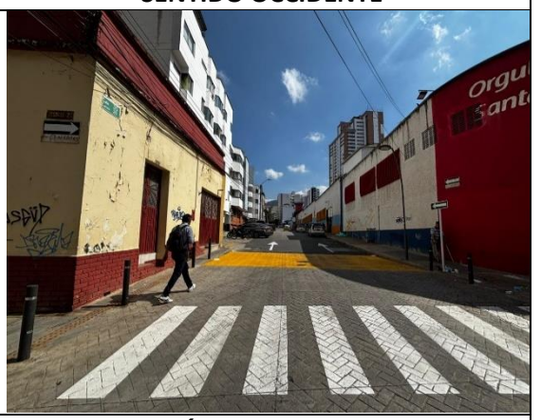
INTERSECCIÓN CARRERA 26 CALLE 35 SENTIDO NORTE	**INTERSECCIÓN CARRERA 26 CALLE 35 SENTIDO ORIENTE**

CARRERA 26 ENTRE CALLE 35 Y 36

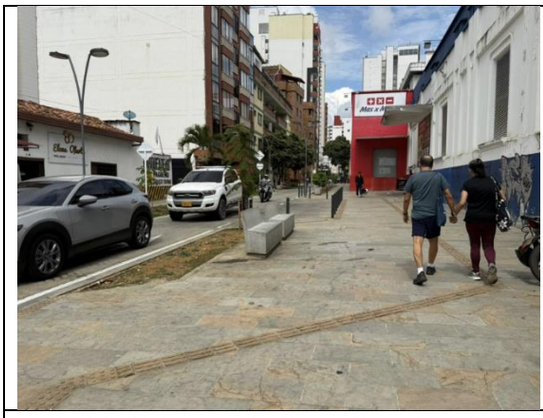	
CARRERA 26 ENTRE CALLE 35 Y 36 VISTA NORTE	**CARRERA 26 ENTRE CALLE 35 Y 36 VISTA SUR**

INTERSECCIÓN CALLE 36 CON CARRERA 26

	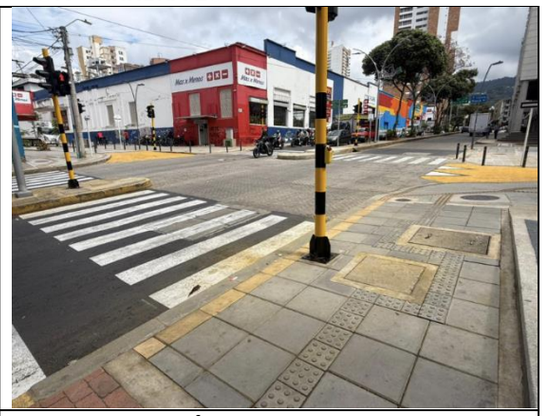
INTERSECCIÓN CARRERA 26 CALLE 36 SENTIDO NORTE	**INTERSECCIÓN CARRERA 26 CALLE 36 SENTIDO ORIENTE**
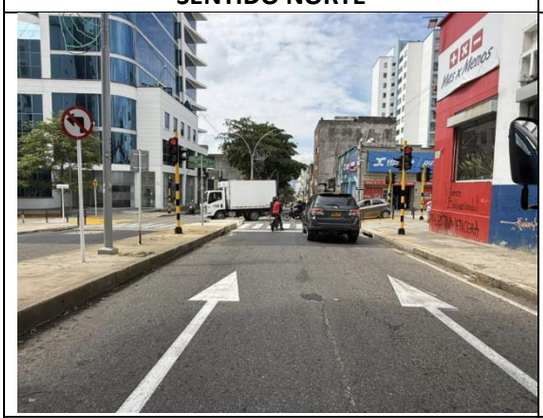	
INTERSECCIÓN CARRERA 26 CALLE 36 SENTIDO OCCIDENTE	**INTERSECCIÓN CARRERA 26 CALLE 36 SENTIDO SUR**

CARRERA 26 ENTRE CALLE 36 Y 37

CARRERA 26 ENTRE CALLE 36 Y 37 VISTA NORTE	**CARRERA 26 ENTRE CALLE 36 Y 37 VISTA SUR**

CALLE 37 ENTRE CARRERA 25 Y 27

CALLE 37 CON CARRERA 26 SENTIDO OCCIDENTE	**CALLE 37 CON CARRERA 26 SENTIDO ORIENTE**
CALLE 37 CON CARRERA 26 SENTIDO NORTE	**CALLE 37 CON CARRERA 25 SENTIDO ORIENTE**

CALLE 37 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 SENTIDO ORIENTE	**CALLE 37 CON CARRERA 27 SENTIDO OCCIDENTE**

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL BORDE SUR LA VICTORIA EN EL BARRIO LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	2023680010007	$9.042.908.877,23	$14.256.691.826,19

CONTRATO No.184 DE 2023: "LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BORDE SUR LA VICTORIA EN EL BARRIO LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"

N° DE RP Y FECHA INICIAL		8336 de 13 de julio de 2023
VALOR		$ 12.918.441.253,19
PLAZO INICIAL		6 MESES
PLAZO ADICIONAL N° 1		6 MESES
PLAZO TOTAL		12 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:		Agosto 08 de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No 1		Febrero 06 de 2024
AMPLIACION No 1 A LA SUSPENSIÓN	No 1	Abril 05 de 2024
AMPLIACION No 2 A LA SUSPENSIÓN	No 1	Mayo 03 de 2024
AMPLIACION No 3 A LA SUSPENSIÓN	No 1	Diciembre 06 de 2024
AMPLIACION No 4 A LA SUSPENSIÓN	No 1	Abril 04 de 2025
FECHA REINICIO No 1		Octubre 06 de 2025
FECHA SUSPENSIÓN No 2		Diciembre 31 de 2025
FECHA REINICIO No 2		Enero 2 de 2026
FECHA TERMINACION		Abril 08 de 2026
PORCENTAJE AVANCE		39% EJECUTADO FISICO

ESTADO DEL CONTRATO:

AVANCE FISICO: A la fecha de corte del presente informe del 29 DE MARZO DE 2026, se tiene los siguientes indicadores frente a la PROGRAMACION DE PROJECT con un acumulado programado del 98% contra un ejecutado acumulado de 39%, presentándose un atraso del 59%.

ACTIVIDADES TECNICAS DE OBRA:

- Acero y concreto de anillos para tramo 4 y 3

- Concreto para vastago de muro, tramo 2
- Concreto vado rampa, tramo 5
- Instalación de adoquín para sendero, tramo 5
- Instalación de adoquín tramo 5
- Instalación de tubería para red pluvial, tramo 5
- Relleno con material seleccionado para muro, tramo 4
- Armado de acero y encofrado para dado de cimentación en concreto para soporte de estructura metálica, tramo 5
- Encofrado de vástago de muro, tramo 2

ÁREA SOCIAL:
Obra todos los tramos**.**

- Recorrido en obra.
- Recorrido y comité de obra.
- Firma de acta de compromiso traslado del contador de gas y entrega de oficio canalización de aguas lluvias a propietaria del predio de la calle 69 #19-13.

Oficina de Interventoría

- Trabajo de oficina.

HSEQ:

Obra todos los tramos.

- Acompañamiento en charla de seguridad diaria.
- Recorrido de obra, se evidencio que la lona de tramo 3 se encuentra caída y con material.
- Reunión de comité técnico y recorrido
- Acompañamiento en charla de seguridad diaria.
- Recomendación de realizar orden y aseo por las diferentes áreas de trabajo.
- Se recomienda después de la actividad de instalación de canasta a los caisson en tramo 3 dejar con el cerramiento preliminar y señalizado

Oficina de Interventoría

- Trabajo de oficina.
- Revisión documental

TOPOGRAFIA

TRAMO II

- Vaciado de concreto muro
- Desencofrado de muro
- Encofrado de muro

TRAMO III y IV

- Vaciado concreto anillos de caisson

TRAMO IV y V

- Chequeo de nivel en empalme de tubería

TRAMO IV

- Relleno con material seleccionado
- Vaciado concreto anillos de caisson

TRAMO V

- Vaciado concreto vado rampa
- Instalación de adoquín
- Instalación red pluvial conexión a pozo
- Chequeo de encofrado de dado

GENERAL

- Recorrido de obra
- Oficina Contratista
- Comité de obra

Niveles de referencia excavación

Vaciado concreto vado rampa

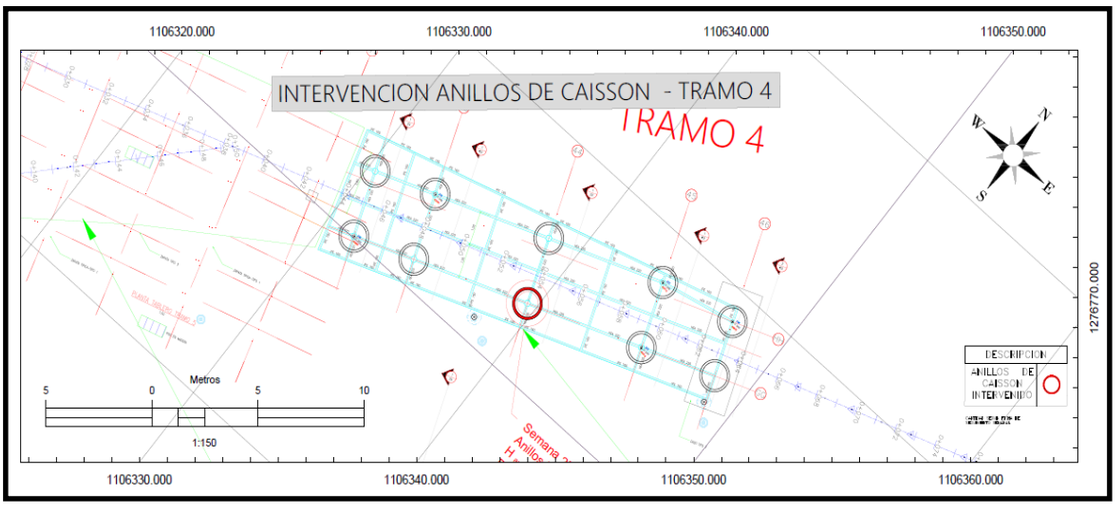

Anillos de caisson intervenidos Tramo 4

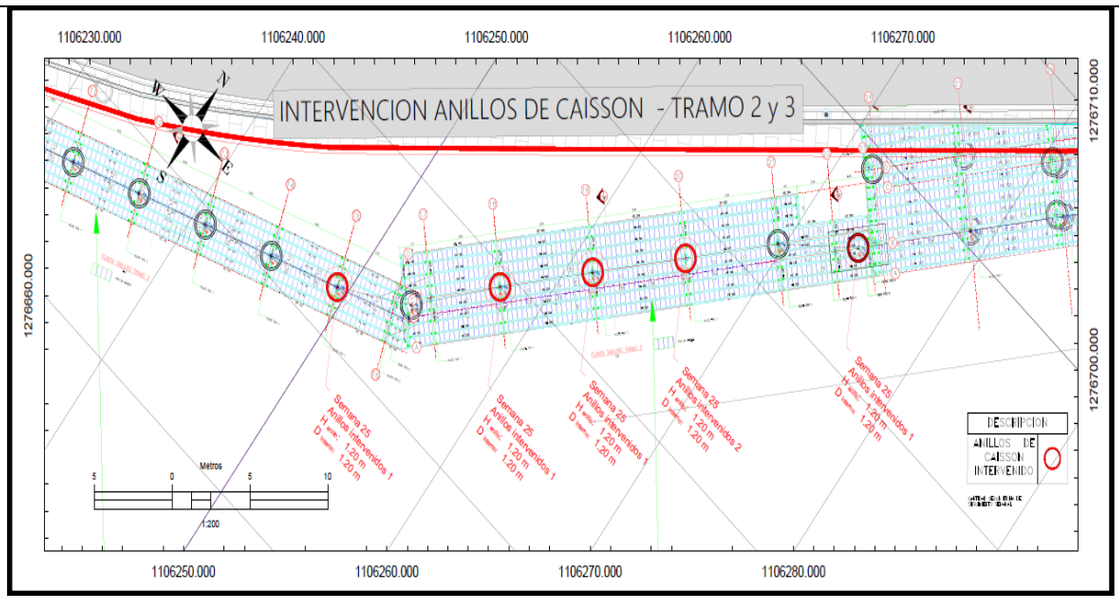

Anillos de caisson intervenidos Tramo 2 y 3

SOCIAL

Firma acta de compromiso.	Recorrido de obra

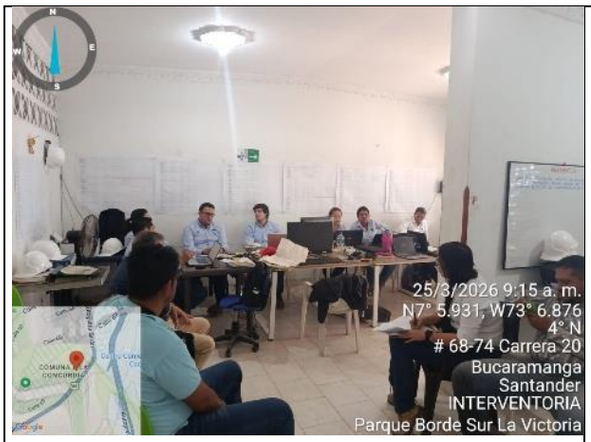	
Comité de obra	Recorrido de obra

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Señalización tramo 5	Protección cajas eléctricas tramo 5
 Charlas de seguridad	 Comité de Obra

Limpieza y barrido de vía tramo 4, 3	Acopio residuos tramo 2

TECNICO

Relleno con material seleccionado, tramo 4	Figurado de acero y encofrado de vastago, tramo 2

Sumidero

Armado tipo 6 tramo VI

Intalacion platinas de apoyo estructura metalica

Construccion sendero peatonal

Concreto para vastago, tramo 2

Convenio 333 – 2021: **CONVENIO** INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE LA ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P., EL ACUDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P., GASORIENTE S.A.E.S.P. Y EL INSTITUO DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA; PARA LA CONMEMORACIÓN DE LOS 400 AÑOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ÍCONO DE LA CIUDAD.

Objeto: Aunar esfuerzos para conmemorar los 400 años de fundación de la ciudad e Bucaramanga, que tuvo lugar el 22 de diciembre de 1622, permitiendo el posicionamiento de marca de empresas; así como la apropiación de ciudadana territorio; reflejo de identidad y sentido de pertenencia por el patrimonio de la ciudad en favor de sus grupos de interés

Fecha de inicio:	12 de noviembre de 2021.
Fecha de terminación:	11 de enero de 2023
Prorroga No. 1 en plazo:	11 meses
Prorroga No. 2 en plazo:	20 días
Nueva fecha terminación:	30 de diciembre de 2023
Fecha de suspensión 1:	22 de diciembre de 2023
Valor del convenio:	
ACUADUCTO METROPOLITANO:	$500.000.000,00
ESSA:	$500.000.000,00
GASORIENTE:	$500.000.000,00
Total	**$1.500.000.000,00**
Avance físico ejecutado:	9.33%
Avance financiero:	9.33%
Estado:	Suspendido.

El alcance del convenio incluía la estructuración del icono arquitectónico, mediante la realización de un concurso arquitectónico para el diseño y posterior proceso para construcción e instalación de un icono arquitectónico, que refleje la interacción de las empresas de servicios públicos domiciliarios que acá participan energía eléctrica, acueducto y gas, que abordan los siguientes temas**: agua, energía eléctrica, gas, energías renovables, comunicaciones y participación ciudadana, conciencia ambiental, historia, cultura local y espacio público, y su interacción e influencia, pasada; presente y futura en el municipio de Bucaramanga**.

Así las cosas, se desarrolló concurso abierto por la Sociedad Colombiana de Arquitectos para que organizara concurso de diseño y arquitectura y que actuara como coordinador entre la Entidad Estatal, en el mes de enero de 2022 la Secretaria de Infraestructura suscribió con la Sociedad Colombiana de Arquitectos contrato de prestación de servicios para que esta Sociedad funja como organismo asesor del Concurso de Méritos Arquitectónico que aperturó la Secretaria de Infraestructura para el diseño del icono arquitectónico para la celebración de los 400 años de Bucaramanga.

El Ministerio de Cultura expidió la resolución 1414 de 2024, esto para el mes de noviembre, otorgando la respectiva autorización para la intervención.

El principio de anualidad que rige en materia presupuestal a las entidades públicas y los plazos que se estipularon para la ejecución del proyecto nos impedía que en un mes y medio pudiera iniciarse y realizarse la obra; reiterando que la expedición del acto administrativo que autoriza la intervención se dio por parte del Ministerio de Cultura solo hasta mediados del mes noviembre de 2024, por tal razón debíamos iniciar el respectivo tramite durante la vigencia 2025.

Aunado a lo anterior, la ESSA cita la cláusula vigésimo octava, para que se den soluciones sobre la continuidad o no del convenio y terminación del mismo, situación que viene desarrollándose desde el primer semestre del 2025; en done se identificaron las malas prácticas que el municipio desarrolló durante las vigencias 2020 a 2023 para con el

convenio y dan razón para que las empresas vinculadas al convenio solicitaran apartarse del mismo. De esta manera el convenio entro en etapa de terminación y posterior liquidación reconociendo las actuaciones y contratos derivados del presente convenio, para que el municipio en un momento posterior a este ejecute el producto derivado del presten convenio, que es la consultoría 200 de 2023.

El convenio se encuentra en proceso de liquidación.

Foto 1. Imagen renderizada

Foto 2. Imagen renderizada

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
ADECUACION DE ESPACIO PUBLICO EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNIICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	2024680010050	$ 24.134.607.023	$ 45.114.109.841,13

Descripción de actividades desarrolladas

CONTRATO DE OBRA 105 de fecha 20 de junio de 2025 -: CONSORCIO ESPACIOS BGA "ADECUACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER".

VALOR TOTAL:	$ 23.237.370.932,13
PORCENTAJE AVANCE:	81.25%
ESTADO CONTRATO:	Vigente
FECHA DE INICIO:	11/08/2025
FECHA DE FINALIZACION:	20/07/2026
CONTRATISTA	Consorcio Espacios BGA
INTERVENTORÍA	Consorcio Inter Urbanismo BGA
SUPERVISOR	María Del Rosario Torres Vargas

La intervención del contrato en el marco de presupuestos participativos abarca un total de 85 barrios, de los cuales 59 ya se encuentran finalizados, 15 están en ejecución y 11 están pendientes por iniciar. Esto representa un avance global aproximado del 81,25%.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Samanes

Mutis

Ciudad Bolívar

	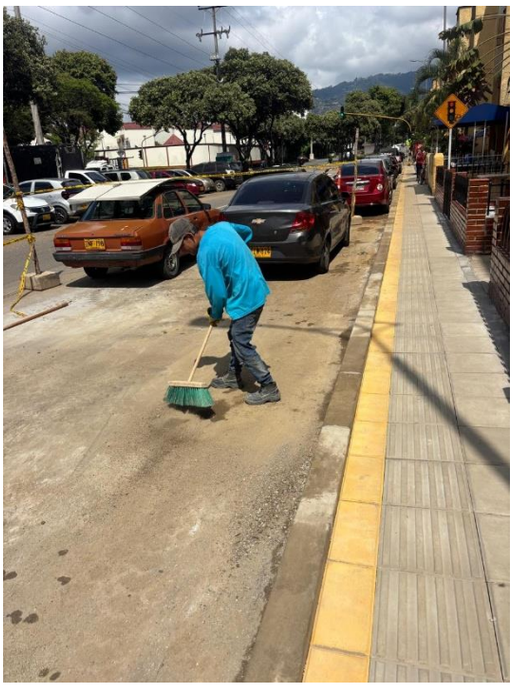

Estoraques II

	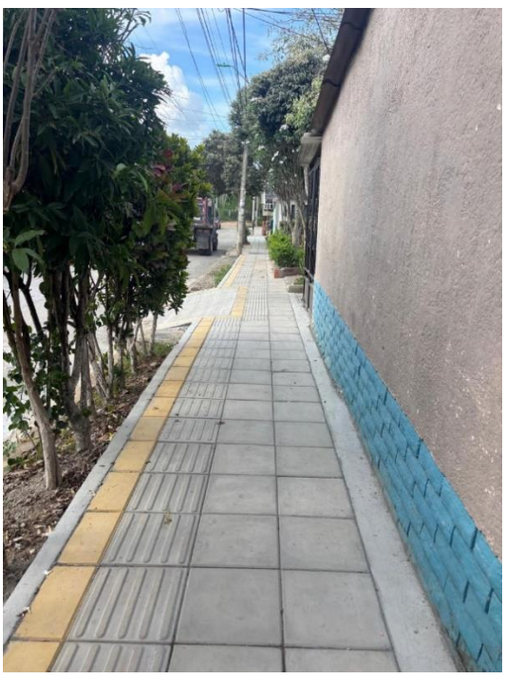

Igsabelar

Viveros de Provenza

Delicias Altas

	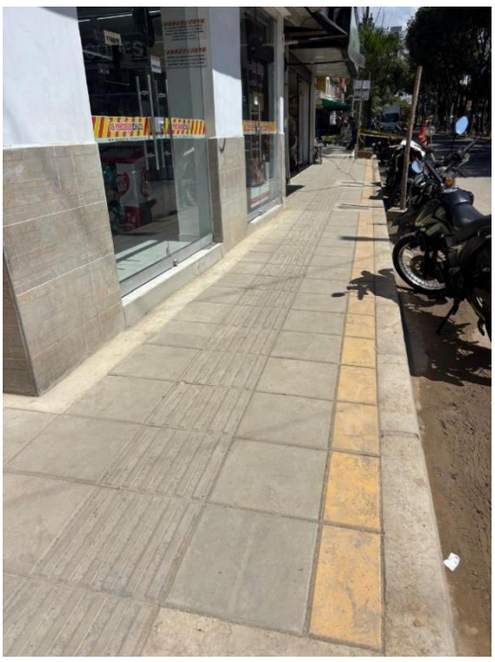

Malpaso

Candado

Provenza

	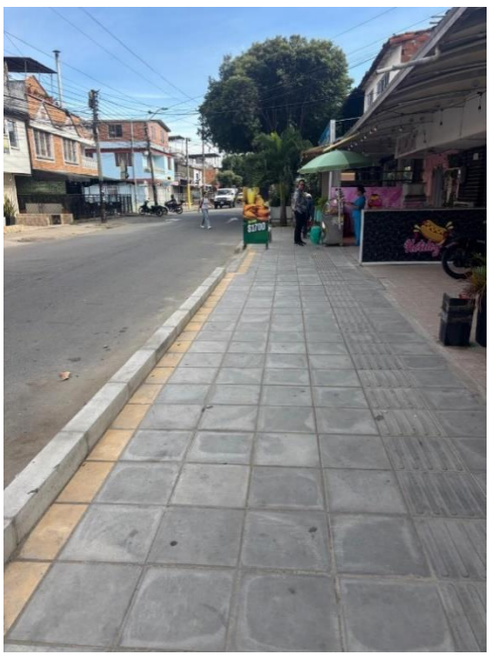

Campo Hermoso

	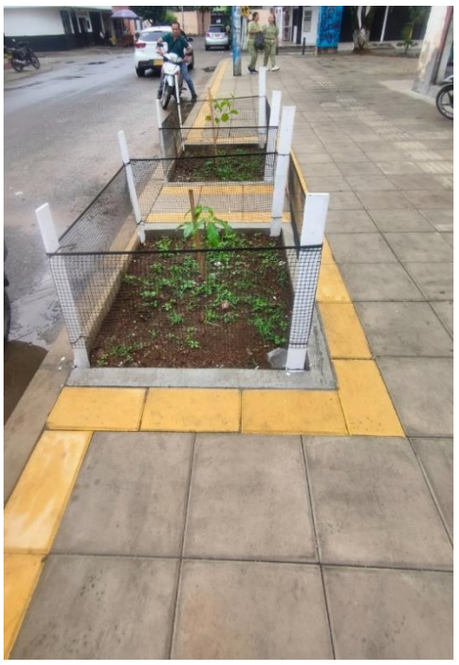

Ricaurte

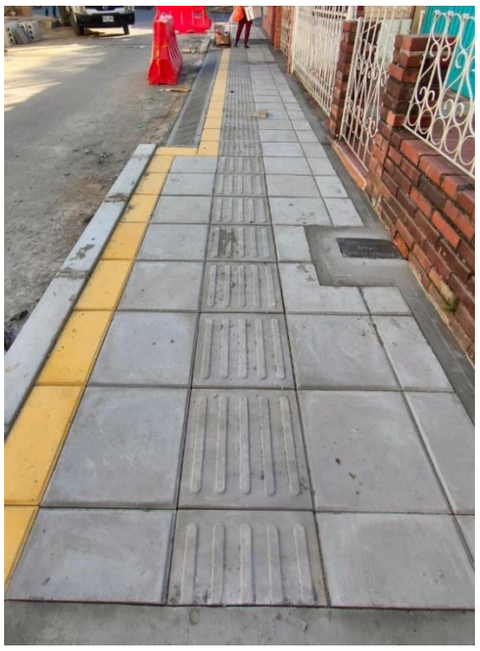	

García Rovira

	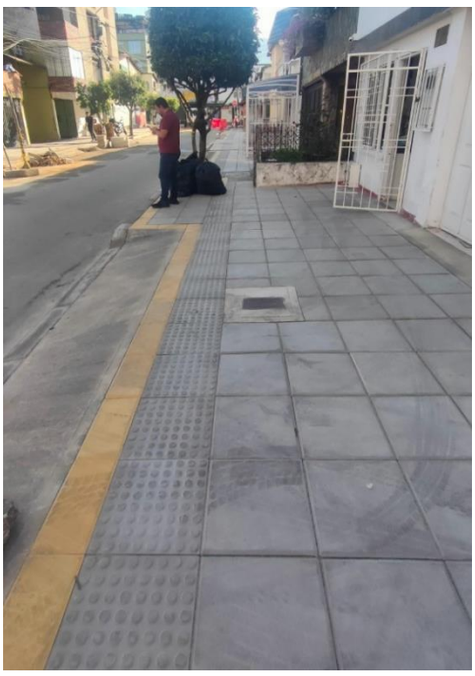

Asturias 2

San Gerardo

Almendros

	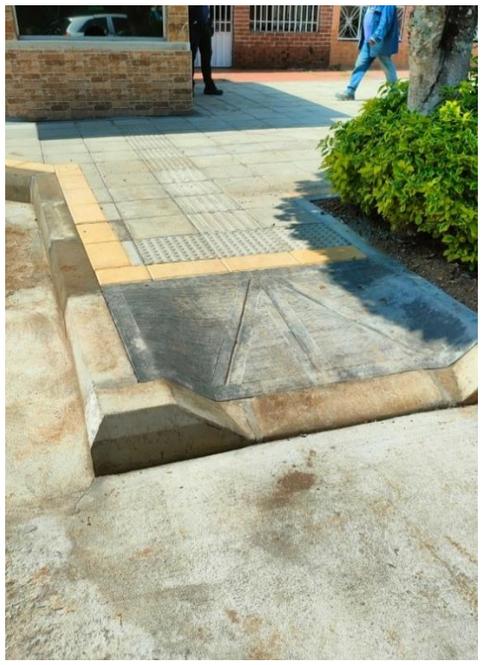

Alfonso López

Mejoras Públicas

Tejaditos

	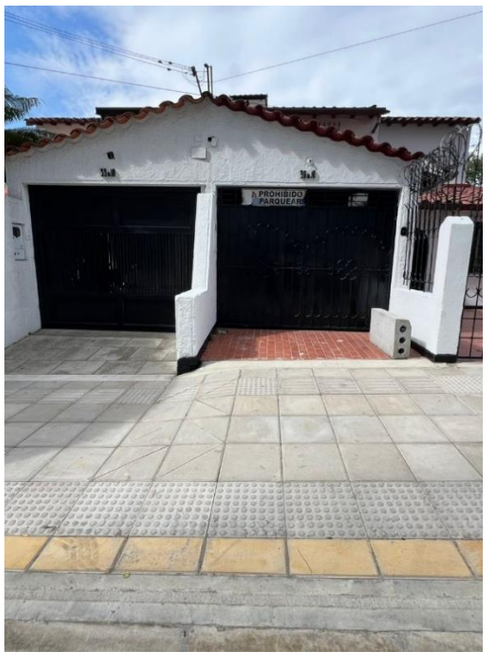

San Francisco

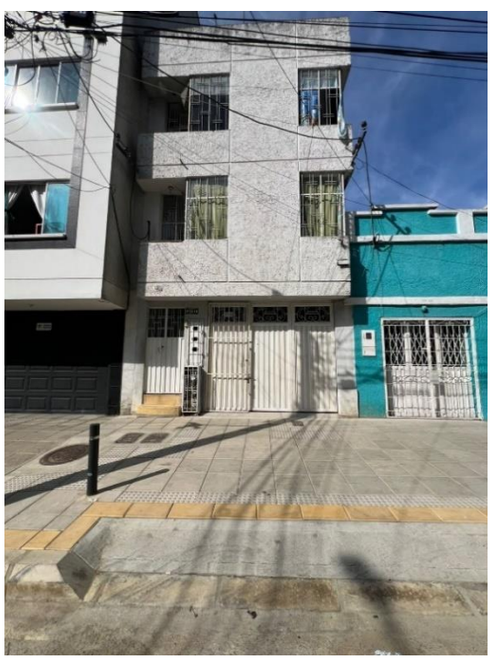	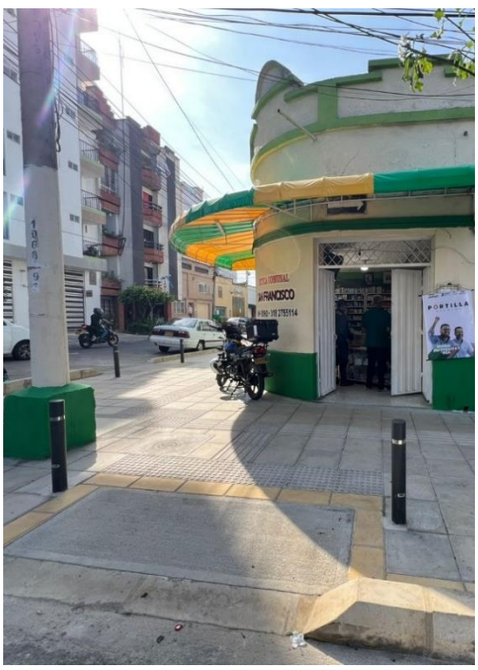

Los Pinos

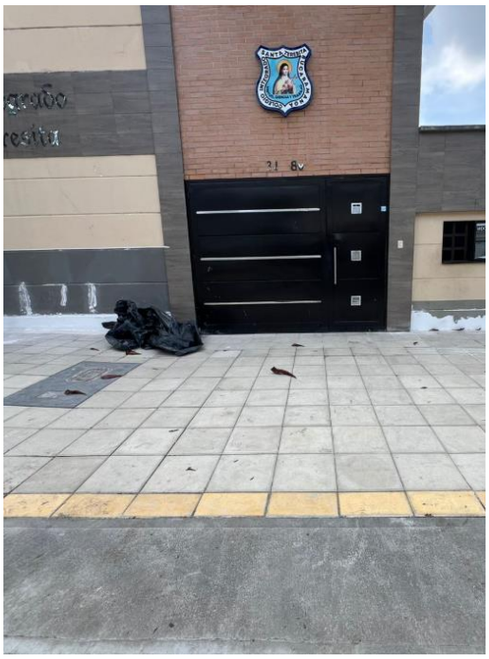

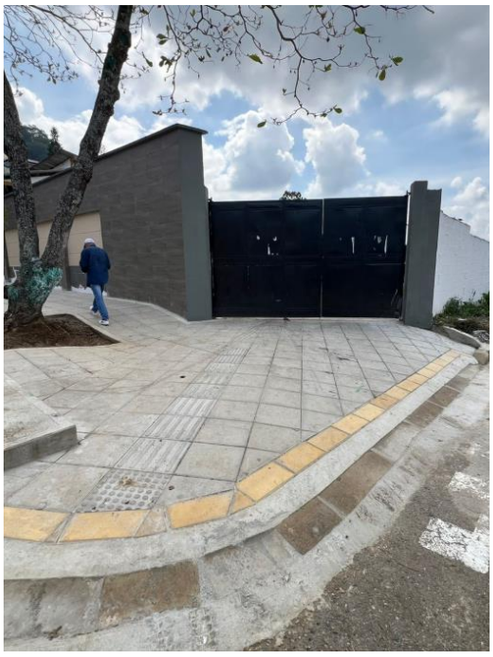

San Alonso

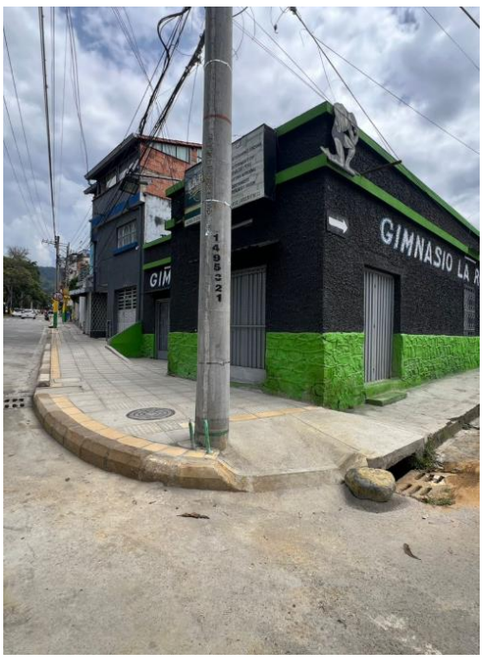

Mutualidad

Balcón del lago

	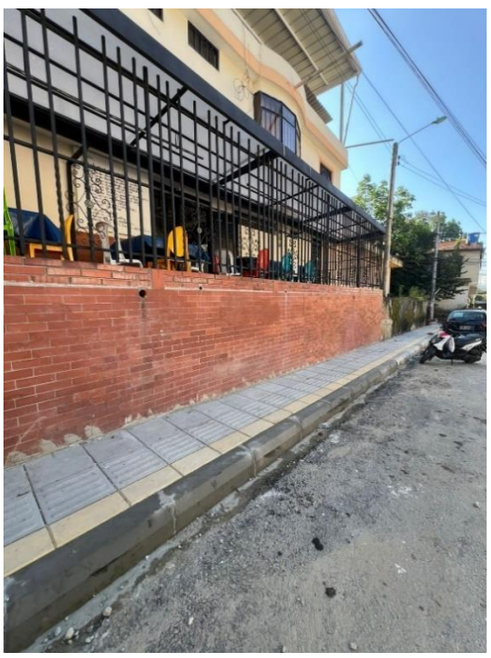

Bolívar

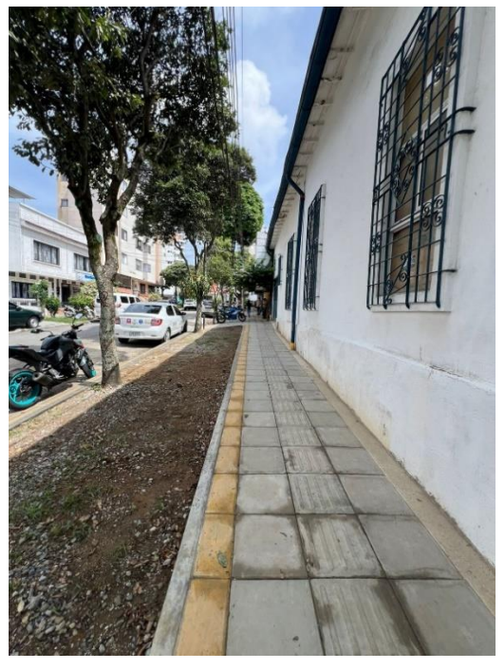

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Mantener 100 parques en el municipio

Indicador	Meta 2026	Logro 2026	% Avance 2026	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Parques mantenidos	30	0	0%	$ 15.251.546.670	$ 0	0%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES, EQUIPAMENTO Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER.	2024680010045	$ 3.000.000.000	$ 3.731.566.923,14

Descripción de actividades desarrolladas

Con este proyecto se ha podido realizar el mantenimiento y embellecimiento de 56 parques de la ciudad trabajo realizado por la cuadrilla del Alcalde.

Contrato 244 – 2024: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES DEL MUNICIPIO:

Se llevó a cabo el proceso de contratación del contrato No. 244-2024, Orden de Compra No. 139109, cuyo objeto es “SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÌA Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA” en la TIENDA VIRTUAL DEL

ESTADO COLOMBIA, en virtud del Acuerdo Marco de Precios por Colombia Compra Eficiente, mediante el proceso No CCE-255-AMP-2021, una vez realizada la evaluación de las propuestas recibidas, por parte del comité evaluador fue seleccionado el proponente el contratista JAIRO OSORIO CABALLERO identificado con C.C. 91.282.210:, bajo la adjudicación del contrato No. 244-2024; el cual implica el suministro de los materiales de ferretería y herramientas necesarios para ejecutar el mantenimiento periódico de parques, zonas verdes y equipamientos urbanos del municipio de Bucaramanga. La orden de compra tiene por fecha el 13 de diciembre de 2024.

Valor del contrato inicial: $616.071.617,60
Valor del Adicional 1: NA
Valor total: $616.071.617,60
Fecha de inicio: 18 de diciembre de 2024.
Suspensión No.1: 22 días calendario. (23 de diciembre de 2024 – 14 de enero de 2025)
Ampliación a la suspensión No.1: 45 días calendario (15 de enero de 205 – 28 de febrero de 2025)
Reinicio: 1 de marzo de 2025.
Prorroga No.1: 3 meses y 13 días (9 de marzo de 2025 – 23 de junio de 2025)
Prorroga No.2: 4 meses
Prorroga No.3: 1 mes y 26 días
Fecha de finalización: 19 de diciembre de 2025.
Avance físico ejecutado: 39.74%
Avance financiero: 39.74%
Estado: Terminado – En proceso de liquidación

El avance físico ejecutado corresponde al 39.74%, este está sujeto a las solicitudes de materiales que realice el profesional encargado del personal de obra dispuesto para la ejecución de obras de mantenimiento de los parques del municipio.
El contratista presentó tres actas de ejecución por el valor de $244.843.471,11 las cuales ya se encuentra pagadas para una ejecución financiera del 39.74%

Estado actual bodega de materiales

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Mantener 1,605,851 metros cuadrados de zonas verdes

Indicador	Meta 2026	Logro 2026	% Avance 2026	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Zonas verdes mantenidas	1605851	387540	24,13%	$ 14.838.630.390	$ 3.597.236.907	24,24%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Mantenimiento y manejo integral arbóreo y de zonas verdes en el municipio de Bucaramanga, Santander	2024680010046	$ 14.838.630.390	$ 36.501.928.636

Descripción de actividades desarrolladas

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 135 DEL 26 DE JUNIO DE 2025 suscrito con: EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA (EMAB) SA ESP con el objeto de “"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA y LA EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA(EMAB)PARADESARROLLAR ACTIVIDADESRELACIONADAS CON LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES UBICADAS EN EL ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER."”.

Valor del convenio:	$6.538.315.836.00
Valor Anticipo:	N/A
Plazo inicial:	4,5 Meses
Fecha de inicio:	29 de agosto de 2025
Fecha de terminación:	Desde la fecha de suscripción del acta de inicio y el 06 de abril de 2026
Estado del Contrato:	En ejecución
Porcentaje avance:	87%

Ubicación:

- Parques y zonas verdes ubicadas en el espacio público del municipio de Bucaramanga, Santander

Impacto: El impacto que genera el convenio 135 en el municipio de Bucaramanga es de alto alcance, la realización de los siete componentes ejecutados a lo largo del municipio ha reflejado un impacto positivo. Entre los aspectos a destacar en el desarrollo del convenio se destacan: La siembra de cobertura vegetal en áreas de gran afluencia como el Parque Santander y el Parque de los niños, Siembra de césped en las zonas secas (áridas) del Parque de los Niños, Riego de cobertura vegetal en áreas como el Mesón de los Búcaros, Parque Turbay, Parque de los Niños, Parque Santander, Puerta del sol y los diferentes separadores viales (separador calle 36 , separador calle 45), recolección y transporte de residuos sólidos ordinarios (residuos bolsa negra) y residuos voluminosos localizados en los parques y zonas verdes del municipio, mantenimiento de coberturas vegetales en el municipio de Bucaramanga de las zonas donde se realiza la siembra, Corte de césped en las áreas verdes del municipio y parqueros encargados de la limpieza en las áreas verdes del municipio.

ESTADO DEL CONTRATO:

El contrato ha logrado un avance de ejecución del 87% de alcance de las 418 áreas establecidas en el contrato.
Al mes de diciembre se ha logrado la intervención de 1.541.078 m2 de áreas del 1.605.851 m2 establecidos en el convenio.

Cabe resaltar que el 1.541.078 m2 es el alcance del total de m2 establecidos en el convenio, aunque el total de m2 intervenidos ha sido mayor. Esto se debe a que las áreas han sido intervenidas en gran cantidad de ocasiones y por diferentes componentes. Es decir, un área como el parque de los niños puede tener intervención de los 7 componentes según lo requiera el componente técnico.

En las intervenciones establecidas en las diferentes áreas se puede destacar el aspecto técnico y la caracterización de cada área ya que para la intervención se debe segregar que tipo de intervención requiere el área para poder ejecutar efectivamente los metros cuadrados establecidos en el convenio.

Las cuadrillas de trabajo de todos los componentes han estado distribuidas a lo largo del municipio de Bucaramanga generando el siguiente resumen de intervenciones:

ZONA	# ÁREAS INTERVENIDAS	METROS CUADRADOS INTERVENIDOS
NORTE	69	237131
OCCIDENTE	84	402694
ORIENTE	67	532119
SUR	111	369134
Total general	331	1541078

A continuación, se mostrará evidencia de los 7 componentes durante la ejecución del convenio:

24/11/25 1:29 P. M.
Lat 7.119506°N
Lon 73.122648°W

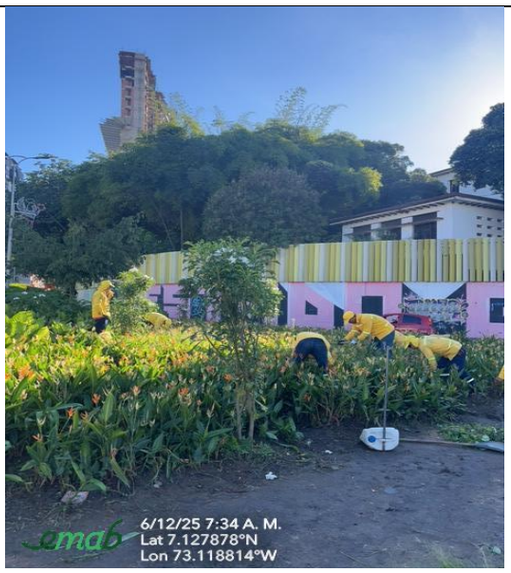
6/12/25 7:34 A. M.
Lat 7.127878°N
Lon 73.118814°W

22/10/25 4:43 P. M.
Lat 7.151588°N
Lon 73.135557°W

19/09/25 8:59 A. M.
Lat 7.109087°N
Lon 73.123234°W

29/09/25 9:42 A. M.
Lat 7.118517°N
Lon 73.109069°W

21/10/25 2:42 P. M.
Lat 7.117478°N
Lon 73.114260°W

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
MANTENIMIENTO Y MANEJO INTEGRAL ARBÓREO DE ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	2024680010046	$ 809.685.217,89	$ 809.685.217,89

Descripción de actividades desarrolladas

CONTRATO DE OBRA 195 DE 27 DE AGOSTO DE 2025 (SI-SI-SAMC-002-2025) CONSORCIO FORESTAL BUCARAMANGA “MANTENIMIENTO Y MANEJO INTEGRAL ARBÓREO DE ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”.

Valor del contrato:	**$ 1.214.500.906,89**
Valor Anticipo:	N/A
Plazo inicial:	A monto agotable o hasta el 31 de diciembre de 2025
Fecha de inicio:	20/10/2025
Fecha de terminación inicial:	31/12/2025
Fecha de terminación:	16/05/2026
Estado del Contrato:	En ejecución
Porcentaje avance:	60%

Ubicación: El proyecto se desarrolla en todas las comunas del Municipio de Bucaramanga.

Impacto: Tiene como objetivo realizar la ejecución de actividades técnicas y especializadas de poda y tala de especies arbóreas que representan amenaza o riesgo en el espacio público urbano del municipio de Bucaramanga, con el fin de garantizar la seguridad de la ciudadanía, la protección de bienes públicos y privados, y la preservación del entorno urbano, de acuerdo con las autorizaciones ambientales emitidas por la autoridad competente, cumpliendo los lineamientos técnicos establecidos por la Secretaria de Infraestructura y la normatividad ambiental vigente.

1.COMUNA 1 - NORTE

2.COMUNA 2 - NORORIENTAL

3.COMUNA 3 - SAN FRANCISCO

4.COMUNA 4 - OCCIDENTAL

5.COMUNA 5 - GARCÍA ROVIRA

6.COMUNA 6 - LA CORNCORDIA

7.COMUNA 7 - CIUDADELA

8.COMUNA 8 - SUR OCCIDENTE

9.COMUNA 9 - LA PEDREGOSA

10.COMUNA 10 - PROVENZA

11.COMUNA 11 - SUR

12.COMUNA 12 - CABECERA DEL LLANO

13.COMUNA 13 - ORIENTAL

14.COMUNA 14 - MORRORICO

15.COMUNA 15 - CENTRO

15.COMUNA 16 - LAGOS DEL CACIQUE

15.COMUNA 17 - MUTIS

Este proyecto contribuye al mejoramiento y disminución de accidentes por caída de árboles o ramas en el espacio público.

Beneficios para la Comunidad:

- **Menor Impacto a daños:** Se disminuye el riesgo de accidentes y daños en el espacio público.
- **Aumento de la Seguridad:** Se tiende a bajar en la tasa por accidentes y se da el mejoramiento de las condiciones del espacio público.

SEGUIMIENTO	
PODA	**PODA**
TALA	**TALA**

Se han realizado trabajos de mantenimiento y manejo integral arbóreo en diferentes comunas y barrios de la ciudad enfocados en el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo – Mantener 1.605.851 metros cuadrados de zonas verdes.

- Comuna 3: San Francisco
- Comuna 7: Real de minas
- Comuna 9: Barrio Pedregosa.
- Comuna 10: Barrios Provenza y Fontana.
- Comuna 12: Parque Ecológico La Flora.
- Comuna 13: Barrios Álvarez y La Aurora.
- Comuna 16: Hacienda San Juan.
- Comuna 17: Barrios Balconcitos y Mutis.
- Comuna 1: Colorados
- Comuna 1: Café Madrid
- Comuna 1: Olas altas
- Comuna 4: Nápoles

• Comuna 10: Diamante 2

• Comuna 12: Parque Ecológico La Flora, Sotomayor

• Comuna 1: Claveriano

• Comuna 12: Cabecera

• Comuna 12: Sotomayor

• Comuna 6: Ricaurte

• Comuna 1: Villa Rosa

3. LINEA ESTRATEGICA 4. TERRITORIO SEGURO QUE GENERA VALOR

SECTOR: Gobierno territorial

PROGRAMA: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Asistir técnicamente a nueve (9) dependencias de la administración municipal para el diseño, seguimiento y ejecución de proyectos estratégicos de la ciudad en el área de infraestructura

Indicador	Meta 2026	Logro 2026	% Avance 2026	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	9	9	100%	$ 11.119.996.023	$ 10.452.320.000	94%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Fortalecimiento institucional a los procesos misiones y de gestión de la secretaría de infraestructura del municipio de Bucaramanga, Santander	2024680010049	$ 11.506.163.086	$ 28.292.139.343

Descripción de actividades desarrolladas

Durante el primer trimestre de la vigencia 2026 la Secretaria de Infraestructura ha continuado realizo la contratación del recurso humano que requiere la dependencia para el fortalecimiento a la ejecución de los procesos transversales, así como la planificación de las diferentes obras.

GASTOS DE INVERSION	A 31 DE MARZO 2026
	VALOR
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION	**$ 10.452.320.000,00**

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Elaborar (04) estudios de preinversión para la realización de documentos en las fases de pre-factibilidad, factibilidad o definitivos para la consolidación de la infraestructura social en el municipio

Indicador	Meta 2026	Logro 2026	% Avance 2026	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Estudios de preinversión elaborados	1	0	0%	$ 126.095.762	$0	0%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RESTAURACIÓN DE LA PLAZA SAN MATEO INMUEBLE DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	2024680010084	$1.542.128.640,00	$1.542.128.640,00

Descripción de actividades desarrolladas

Contrato 197– 2025: ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RESTAURACIÓN DE LA PLAZA SAN MATEO INMUEBLE DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER:

El Contrato de Consultoría No. 197 de 2025, orientado a la actualización de los estudios y diseños para la restauración de la Plaza San Mateo, ha venido avanzando en el desarrollo de sus componentes técnicos, destacándose la culminación de las actividades de campo, tales como toma de muestras, sondeos y apiques, cuyos resultados han sido incorporados en los estudios presentados por el consultor.

Durante el periodo evaluado, se ha realizado la entrega de los tomos I, II, III y IV, los cuales se encuentran en proceso de revisión y validación por parte de la interventoría, en cumplimiento de los estándares técnicos requeridos. Este proceso ha permitido fortalecer la calidad y consistencia de la información, mediante ajustes y mejoras continuas a los productos entregados.

El avance físico del contrato alcanza un 73,03%, evidenciando un desarrollo significativo del proyecto, mientras se continúa trabajando en la consolidación y aprobación final de los entregables. De manera paralela, se han adelantado acciones de seguimiento y acompañamiento técnico que buscan garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales y la adecuada estructuración del proyecto.

En este sentido, la Administración Municipal, a través de la interventoría, mantiene un control permanente sobre la ejecución del contrato, promoviendo la optimización de los tiempos y la calidad de los productos, en aras de lograr una intervención integral y adecuada sobre este bien de interés cultural, el contrato se encuentra en estado de suspensión, medida que se ha adoptado en el marco de la adecuada gestión contractual y con el propósito de consolidar y ajustar los insumos técnicos requeridos para la correcta estructuración del proyecto.

Valor del contrato inicial:	$1.542.128.640
Valor del Adicional 1:	$0
Valor total:	$1.542.128.640
Fecha de inicio:	15 de Septiembre del 2025
Suspensión No.1:	29 de Diciembre de 2025
Ampliación a la suspensión No.1:	13 de Enero del 2026
Ampliación a la suspensión No.2:	11 de Febrero del 2026
Ampliación a la suspensión No.3:	13 de Marzo del 2026
Reinicio:	Pendiente
Prorroga No.1:	N/a
Prorroga No.2:	N/a
Prorroga No.3:	N/a
Fecha de finalización:	Pendiente
Avance físico ejecutado:	73.03%
Avance financiero:	0%
Estado:	Suspendido

ALTERNATIVA 1

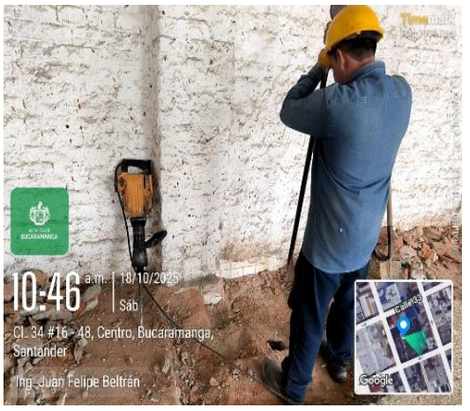

ALTERNATIVA 2

Ilustración 1. Esquema de Nivelación del terreno.

ALTERNATIVA 3

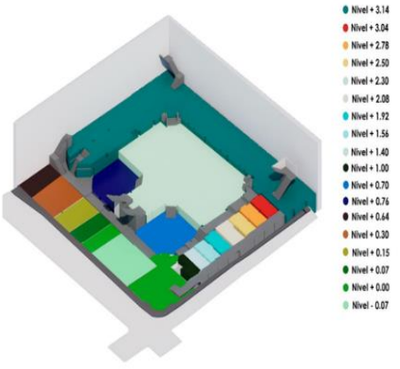

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
PRESTACION DE SERVICIOS DE TOMAS DE MUESTRA Y ELABORACION DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE ESTUDIO DE SUELOS PARA LOS PROYECTOS EN ESTRUCTURACIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	202500000032340	$ 120.489.877,19	$ 120.489.877,19

Descripción de actividades desarrolladas

Contrato 278– 2025: PRESTACION DE SERVICIOS DE TOMAS DE MUESTRA Y ELABORACION DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE ESTUDIO DE SUELOS PARA LOS PROYECTOS EN ESTRUCTURACIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER:

El Contrato No. 278 de 2025, cuyo objeto es la prestación de servicios de toma de muestras y ensayos de laboratorio para estudios de suelos en proyectos en estructuración del municipio de Bucaramanga, fue ejecutado satisfactoriamente, cumpliendo con el alcance técnico, administrativo y contractual establecido.

Durante su desarrollo, el contratista llevó a cabo la campaña de exploración geotécnica en diecinueve (19) sectores estratégicos del municipio, mediante la ejecución de perforaciones, apiques, sondeos, ensayos de campo y laboratorio, así como estudios geofísicos, garantizando la obtención de información confiable para la caracterización del subsuelo.

Como resultado, se consolidaron y entregaron los informes técnicos correspondientes a cada sector, los cuales constituyen un insumo fundamental para la adecuada estructuración de proyectos de infraestructura en el municipio. El contrato alcanzó un avance físico del 100%, con cumplimiento integral de las actividades previstas, asegurando la calidad de los productos entregados.

La supervisión verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales, concluyendo que el contrato se ejecutó en condiciones satisfactorias, contribuyendo de manera efectiva al fortalecimiento de la planeación y toma de decisiones en materia de infraestructura

Valor del contrato inicial:	$ 120.489.877,19
Valor del Adicional 1:	$0
Valor total:	$ 120.489.877,19
Fecha de inicio:	24 de Noviembre 2025
Suspensión No.1:	N/a
Ampliación a la suspensión No.1:	13 de Enero del 2026
Reinicio:	N/a
Prorroga No.1:	N/a
Prorroga No.2:	N/a
Prorroga No.3:	N/a
Fecha de finalización:	31 de Diciembre 2025
Avance físico ejecutado:	100%
Avance financiero:	100%
Estado:	Liquidado

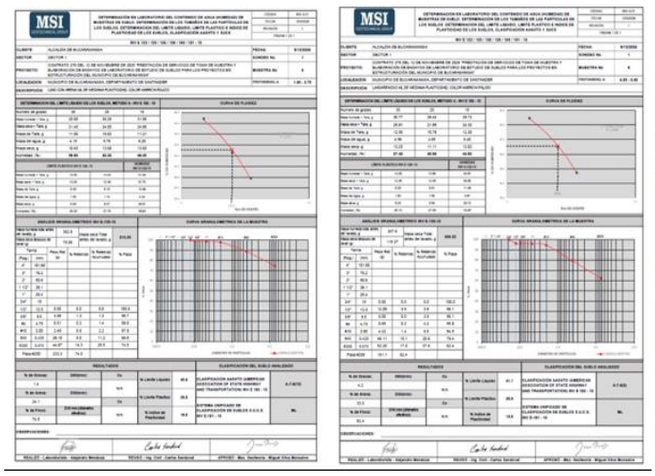

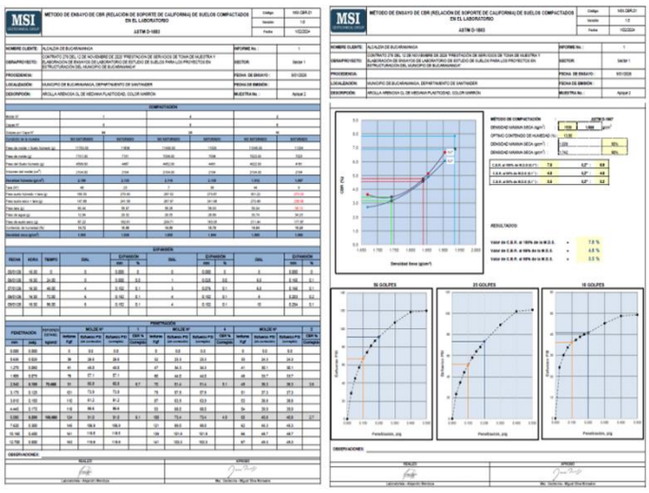

4. LINEA ESTRATEGICA 5. TERRITORIO SEGURO QUE PROTEGE

SECTOR: Minas y Energía

PROGRAMA: Consolidación productiva del sector de energía eléctrica

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Garantizar 51,229 lámparas de alumbrado público para la prestación del servicio de alumbrado público en el Municipio de Bucaramanga.

Indicador	Meta 2026	Logro 2026	% Avance 2026	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Garantizar lámparas de alumbrado público.	51.229	51.131	99,8%	$ 87.729.230.128,00	$14.628.328.265.22	30%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Fortalecimiento DE LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 2024-2027 Bucaramanga	2024680010192	$28.970.000.000,00	$88.769.657.897,08

Resumen del proyecto:

El municipio es responsable de prestar el servicio de alumbrado público consistente en la iluminación de las vías públicas, parques públicos y demás espacios de libre circulación que no se encuentran a cargo de ninguna persona natural o jurídica diferente del municipio.

En cuando a la administración y operación del Alumbrado Público, se hace necesario fortalecer la nómina provisional institucional, dando cumplimiento a lo establecido por el Ministerio de Trabajo y la Comisión Nacional del Servicio Civil — CNSC; así como también contar con insumos, materiales, herramientas e instalaciones adecuadas, necesarias para fortalecer su funcionamiento.

Es importante tener en cuenta, que la prestación del servicio de alumbrado público debe ser constante, lo que crea la necesidad que algunos servidores públicos, generen continuidad y estabilidad en el desarrollo de los compromisos adquiridos; asimismo contar con recurso humano de calidad, con el fin de mantener un desarrollo competente,

Siendo así, que se continúa asignando recursos para la actual vigencia en los diferente programas y actividades que desarrolla la Oficina de Alumbrado Público, con el fin de garantizar una adecuada prestación del servicio y generar el mayor impacto positivo en la comunidad.

Con el fin de mejorar la operación y administración del sistema de alumbrado público, y a su vez ofrecer a la comunidad un servicio de calidad, se hace necesario adquirir insumos de papelería y elementos de oficina, aires acondicionados, impresoras, tableros digitales, elementos de seguridad y licencias de software que fortalezcan el debido cumplimiento de las labores diarias, dado a los usuarios un respuesta oportuna y eficiente, Para esto también se hace necesario Pagar los servicios internos y externos de la oficina que permitan el correcto funcionamiento de la oficina.

BENEFICIOS DEL PROYECTO:

SOCIALES: El proyecto tiene como principal beneficio el fortalecimiento en el desarrollo y ejecución de las actividades de seguimiento y control a procesos de la secretaría de Infraestructura-Alumbrado Público. Así como también ofrecer a la comunidad un ambiente iluminado y seguro, contribuyendo al desarrollo cultural, preservando el lado urbano y rural de la Ciudad.

ECONÓMICOS: Implementado nueva tecnología e instalando luminarias LED, genera disminución en los altos niveles de consumo de energía y en los costos de mantenimiento especialmente en el ahorro en la contratación de cuadrillas de mantenimiento.

AMBIENTALES: Generar un impacto ambiental, disminuyendo los niveles de dióxido de carbono en la ciudad, al construir el sistema de iluminación con nuevas tecnologías y uso de luminarias LED.

INFORMACIÓN AVANCE DE EJECUCIÓN

Se realiza pagos de las CPS y los contratos de arriendo y servicios públicos

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	2024680010189	$35.703.428.981,00	$86.919.084.325,44

Descripción de actividades desarrolladas

Dentro del proyecto de mantenimiento del sistema de alumbrado público 2020-2023 del municipio de Bucaramanga, enfocados en el mismo objeto realizar un mantenimiento preventivo y correctivo del sistema mediante los contratos:

CONTRATO: 341 DEL 2025
OBJETO: MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 6.930.979.159,7
VALOR LOTE 1: 3.362.913.018,85
VALOR LOTE 2: 3.568.066.140,85
FECHA DE INICIO: 16/02/2026
FECHA FIN: 15/07/2026
ESTADO: EN EJECUCION.

Priorización de zonas críticas:

La Secretaría aplica una metodología de priorización basada en criterios técnicos y de impacto social, orientada a garantizar la seguridad, la movilidad y el adecuado uso del espacio público.

En este sentido, la atención de las intervenciones se define considerando los siguientes factores:

- **Nivel de riesgo:** Zonas con deficiencias de iluminación que puedan afectar la seguridad ciudadana o incrementar la probabilidad de incidentes.
- **Impacto en la movilidad:** Corredores viales principales y vías de alto flujo vehicular y peatonal.
- **Entornos sensibles:** Áreas con alta afluencia de población, tales como:
  - Instituciones educativas (colegios)
  - Paraderos de transporte público
  - Parques, zonas recreativas y escenarios deportivos
  - Zonas comerciales
- **Demanda ciudadana:** Número y recurrencia de reportes o PQRs registrados por la comunidad.

Bajo estos criterios, se establece un orden de atención que prioriza inicialmente los sectores de mayor criticidad e impacto (corredores viales principales y espacios públicos de alta concurrencia). Posteriormente, se programan intervenciones en los diferentes barrios del municipio, dando prelación a aquellos con mayor número de reportes ciudadanos.

Esta metodología permite optimizar los recursos disponibles y garantizar una atención oportuna y equitativa a las necesidades de la comunidad.

1. **Contratación, operador y cumplimiento contractual:**

El contratista actual es el CONSORCIO EYC1 2025, cuyo objeto contractual corresponde al mantenimiento del alumbrado público del municipio de Bucaramanga, distribuido por lotes por comunas y corregimientos

Sus obligaciones se enmarcan en la ejecución del mantenimiento correctivo, atención de reportes y garantía de operación del sistema. A la fecha, el contrato se encuentra en ejecución.

2. Calidad de las reparaciones:

Durante los últimos seis (6) meses no se han registrado reparaciones reiteradas a luminarias. La metodología implementada establece que, cuando una luminaria presenta fallas, no se somete a procesos de reparación correctiva reiterativa, sino que se prioriza su reemplazo por una luminaria nueva, garantizando así mayor confiabilidad y vida útil del sistema.

No obstante, previo a definir el reemplazo, se realiza un procedimiento técnico de verificación en campo, con el fin de descartar fallas asociadas a otros componentes del sistema. Este procedimiento incluye:

- **Verificación de presencia de tensión** en los bornes de alimentación de la luminaria.
- **Medición de niveles de voltaje** para confirmar que se encuentran dentro de los rangos operativos.
- **Inspección del estado de las conexiones eléctricas** (cableado, empalmes, borneras).
- **Revisión del sistema de control** (fotocelda, temporizador o sistema de telegestión, si aplica).

- **Evaluación visual del estado de la luminaria** (driver, módulo LED, carcasa, presencia de humedad o daño físico).
- **Verificación de continuidad eléctrica**, en caso de ser necesario.

Una vez realizadas estas pruebas, y si se confirma que la falla corresponde a la luminaria (driver o módulo LED), se procede a su reemplazo inmediato, evitando intervenciones repetitivas y optimizando los tiempos de atención.

Este procedimiento permite asegurar diagnósticos acertados, reducir reprocesos y mejorar la eficiencia operativa del servicio de alumbrado público.

3. **Seguridad eléctrica y riesgos para la ciudadanía:**

Actualmente se registran sesenta y un (61) reportes asociados a diferentes fallas en postes, dentro de los cuales se incluyen casos como: poste a punto de caer, poste caído, poste deteriorado en su base, poste energizado, poste inclinado y solicitudes de retiro de poste.

Adicionalmente, se cuentan con veintiún (21) reportes relacionados con redes eléctricas, que comprenden situaciones como red caída o reventada, reposición de poste, luminaria y red, así como revisión de redes en posible corto circuito, información extraída del SIAP.

En cuanto al plan de mitigación, este se fundamenta en la ejecución de actividades de mantenimiento correctivo orientadas a restablecer oportunamente el servicio en los puntos afectados, así como en la gestión y seguimiento de las denuncias públicas y judiciales relacionadas con eventos de vandalismo y hurto de infraestructura de alumbrado público.

El plan contempla:

- **Atención priorizada de daños reportados**, mediante la programación y ejecución de intervenciones correctivas sobre luminarias, redes y demás componentes afectados.
- **Registro y trazabilidad de incidentes**, permitiendo identificar zonas críticas con alta recurrencia de vandalismo o hurto.
- **Articulación con autoridades competentes** (Policía, Fiscalía y entes territoriales), para la radicación y seguimiento de denuncias formales.
- **Análisis de patrones de afectación**, con el fin de implementar medidas preventivas en sectores vulnerables.
- **Reposición de infraestructura bajo criterios de seguridad**, incluyendo el uso de materiales o configuraciones que reduzcan la exposición al hurto.

Este enfoque integral permite no solo restablecer el servicio de manera eficiente, sino también generar acciones de control y prevención que contribuyen a disminuir la reincidencia de estos eventos.

4. **Relación alumbrado – seguridad (articulación con interior/policía):**

Mediante el programa de seguridad como “El alcalde en mi barrio” se ha logrado articular trabajo entre Alumbrado público, EMAB, Señalización vial, guardianes ambientales, Bomberos, DADEP, Policía nacional, escuadrón de la empatía, ISABU, secretaria del interior, Bienes y servicios, IDERBU e IMCT para llegar de manera integral a diferentes sectores de la ciudad.

Adicionalmente, se han realizado las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes en los casos identificados de hurto y vandalismo sobre la infraestructura de alumbrado público. Estas acciones tienen como finalidad dejar los respectivos precedentes legales, facilitar el seguimiento institucional de los casos y promover la adopción de medidas correctivas y preventivas que contribuyan a mitigar la ocurrencia de estos eventos.

Este proceso se desarrolla en articulación con las entidades de control y seguridad, fortaleciendo la gestión operativa y el control sobre las afectaciones a la infraestructura eléctrica.

5. **Alumbrado en parques, escenarios deportivos y rutas escolares:**

Etiquetas de fila	**Cuenta de Daño**
Cancha Apagada	**19**
ALTOS DEL PROGRESO	1
ANTONIA SANTOS CENTRO	1
BARRIO LOS NARANJOS	1
BOSQUES DEL CACIQUE	1
CAMPO HERMOSO	1
COAVICONSA	2
CONDADO DE GILBRALTAR	1
EL ROCIO	1
GIRARDOT	1
GRANJAS DE JULIO RINCON	1
JOSE MARIA CORDOBA	1
KENNEDY	1
LA ESPERANZA III	1
PROVENZA	1
TOLEDO PLATA	1
VILLA MERCEDES	1
VILLA ROSA	1
VILLAS DE SAN IGNACIO_SAN IGNACIO REAL BAVARIA II	1
Parque Apagado	**21**
ANTONIA SANTOS CENTRO	1
BOLIVAR	1
BRISAS DE PROVENZA	1
CANDILES	1
CIUDADELA REAL DE MINAS	1
COLSEGUROS NORTE	1
DIAMANTE II	1
EL PORVENIR	1
GARCIA ROVIRA	2
GIRARDOT	1

GRANJAS DE JULIO RINCON	1
HACIENDA SAN JUAN	3
LAGOS DEL CACIQUE	1
LOS CANELOS	1
OLAS ALTAS	1
OLAS BAJAS	1
PROVENZA	1
REGADERO NORTE	1
Total general	**40**

Se incluye relación de parques y canchas reportadas con baja iluminación o apagado, en base a los reportes creados se informa que los demás se encuentran en optimo funcionamiento o no han sido reportados.

Estos reportes ya hacen parte de las ordenes de trabajo emitidas a cuadrillas de mantenimiento para su atención.

CONTRATO: 342 DEL 2025
CONTRATISTA: JALGAVI INGENIEROS SAS
OBJETO: PODAS PARA EL DESPEJE DE LUMINARIAS Y REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO
VALOR: $ 1.033.955-610
FECHA DE INICIO: 10/03/2026
FECHA FIN: 10/08/2026
ESTADO: EN EJECUCION

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	202500000015897	$ 2.236.173.074,00	$23.055.801.147

ESTADO: Proyectos adjudicados en proceso de inicio.

PROYECTOS CON RECURSOS POAI

① Modernización Viaducto Alejandro Galvis Ramírez – Carrera Novena (Viaducto Puente La Novena entre Calle 45 y Calle 55 |)

Mes	**Actividad**
Febrero -Marzo	Re-diseño y ajuste de presupuesto a 2026
Marzo – Abril	Banco proyectos (estructuración técnica)
Mayo – Junio	Proceso de contratación
Agosto	Suscripción del contrato

② Modernización Carrera 21, Intercambiador Puente El Bueno, Calle 36 y Av. La Rosita (Intercambiador Puente El Bueno; Calle 36 entre Cra. 27 y Cra. 33; Av. La Rosita entre Cra. 27 y Cra. 32; Cra. 21 entre Diagonal 15 y Calle 18 |)

Mes	**Actividad**
Febrero - Marzo	Re-diseño y ajuste de presupuesto a 2026
Abril - Mayo	Banco proyectos (estructuración técnica)
Junio – Julio	Proceso de contratación
Agosto	Suscripción del contrato

③ Modernización Carrera 9 entre Calle 31 y Calle 44 / Intercambiador Provenza (Carrera 9 entre Calle 31 y Calle 44; Intercambiador Puente de Provenza | $5.332.318.993)

Mes	**Actividad**
Marzo	Re-diseño y ajuste de presupuesto a 2026
Abril - Mayo	Banco proyectos (estructuración técnica)
Junio – Julio	Proceso de contratación
Agosto – Septiembre	Suscripción del contrato

④ Modernización Carrera 33 / Carrera 33A / Calle 14 (Carrera 33 entre Viaducto La Flora y Av. Quebradaseca; Carrera 33A entre Calle 34 y Calle 14; Calle 14 entre Cra. 33A y Glorieta Estadio Américo Montanini |)

Mes	**Actividad**
Marzo	Re-diseño y ajuste de presupuesto a 2026

Abril	Banco proyectos (estructuración técnica)
Junio – Julio	Proceso de contratación
Agosto – Septiembre	Suscripción del contrato

META E INDICADOR DE PRODUCTO

Elaborar 2 Documentos de estudio técnico para mejorar la prestación de servicio de alumbrado público.

Indicador	Meta 2026	Logro 2026	% Avance 2026	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Numero de documentos	0,5	0,25	0%	$ 0	$ 0	0%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO DE REFERENCIA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	202500000028264	$ 0	$ 2.500.000.000,00

Resumen del proyecto: El municipio es responsable de prestar el servicio de alumbrado público consistente en la iluminación de las vías públicas, parques públicos, escenarios deportivos y demás espacios de libre circulación que no se encuentran a cargo de ninguna persona Natural o Jurídica diferente del municipio.

Realizar un estudio técnico diagnóstico del sistema de alumbrado público que permita identificar sus condiciones actuales, deficiencias técnicas y oportunidades de mejora para orientar su planificación y modernización del alumbrado en el municipio.

Realizar un ajuste integral a la prestación del servicio mediante un estudio técnico de referencia, con el fin de satisfacer las necesidades de avanzar en la modernización, renovación y expansión del alumbrado público urbano y rural del Municipio de Bucaramanga, haciendo uso de tecnologías más amigables con el medio ambiente, favoreciendo la seguridad de los ciudadanos, entregando espacios iluminados que brinden la sensación de espacios seguros en la ciudad, tanto en sus zonas urbanas como rurales, encaminando grandes esfuerzos e inversiones, tanto físicas, económicas y de personal.

Objetivo: Mejorar el servicio de Alumbrado Público en la ciudad, mediante el desarrollo de nuevas tecnologías, la optimización del sistema tarifario, el fortalecimiento de la infraestructura, la implementación eficiente de un centro de control y monitoreo, y la autogeneración de energías limpias autosostenibles, con el fin de garantizar un servicio de calidad, eficiente, sostenible y efectivo del sistema de iluminación en espacios públicos, que además propicie seguridad ciudadana, confianza en el uso de espacios públicos y desarrollo económico.

BENEFICIOS DEL PROYECTO:

SOCIALES: El proyecto tiene como principal beneficio el fortalecimiento en el desarrollo y ejecución de las actividades de seguimiento y control a procesos de la secretaría de Infraestructura-Alumbrado Público.

ECONÓMICOS: Implementado nueva tecnología e instalando luminarias LED, genera disminución en los altos niveles de consumo de energía y mantenimiento.

AMBIENTALES: Generar un impacto ambiental, disminuyendo los niveles de dióxido de carbono en la ciudad, al construir el sistema de iluminación con nuevas tecnologías y uso de luminarias LED.

INFORMACIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL DEL PROYECTO

- **CONTRATO**: 176 DEL 2025
- **OBJETO**: Realizar El Estudio Técnico De Referencia De Determinación De Costos, Optimizar La Eficiencia Energética Y Puesta En Marcha Del Esquema De Operación Para El Sistema De Alumbrado Público Del Municipio De Bucaramanga
- **VALOR**: $ 2.500.000.000
- **FECHA DE INICIO**: 25/08/2025
- **FECHA FIN**: 30/12/2025
- **ESTADO**: SUSPENDIDO

INFORMACIÓN AVANCE DE EJECUCIÓN:

- Se revisó y aprobó el plan de trabajo remitido por el contratista.
- Se realizó mesa de trabajo con el líder técnico del proceso de formulación del ETR el 15 de Sept, donde se revisó el plan de trabajo y entregables, se definió avances de forma quincenal con el fin de llevar un seguimiento.
- Se recibió Solicitud de información por parte del contratista, de esta información ya se realizó una primera entrega de información el día 19 de Sept. Para los puntos pendientes por entregar ya se elaboraron los oficios para ser remitidos a la secretaria de Planeación y secretaria de Hacienda y poder consolidar la información solicitada.
- Se dio trámite al primer pago del contrato

INFORMACIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL DEL ESTUDIO TECNICO DE REFERENCIA.

- **CONTRATO**: 176 DEL 2025
- **OBJETO**: REALIZAR EL ESTUDIO TÉCNICO DE REFERENCIA DE DETERMINACION DE COSTOS, OPTIMIZAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y PUESTA EN MARCHA DEL ESQUEMA DE OPERACIÓN PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO
- **VALOR**: $ 2`500.000.000
- **FECHA DE INICIO**: 25/08/2025
- **FECHA FIN**: EN DEFINICIÒN SEGÚN SUSPENSIÒN Y PROXIMA AMPLIACIÒN.
- **ESTADO**: SUSPENDIDO

  El estudio técnico de referencia se encuentra actualmente en la fase de georreferenciación de los activos de alumbrado público, tales como luminarias, ductería, transformadores, tableros, cámaras de inspección, canalizaciones, postes y demás elementos que hacen parte de los activos del sistema.

  Adicionalmente, como parte del proceso de identificación y consolidación de la información, se avanza en la estructuración final y el detalle de los insumos técnicos

necesarios para el desarrollo de las actividades propias del objeto contractual del Contrato No. 176 de 2025.

Ítem	Información requerida	Dependencia / Responsable
1	Polígonos del municipio de Bucaramanga	Secretaría de Planeación Municipal – Dirección de Ordenamiento Territorial / SIG
2	Listado de espacios propiedad del municipio	Secretaría de Planeación / Secretaría de Hacienda – Gestión de Bienes
3	Planos con zonas que cuentan con WM – Tableros	Oficina de Alumbrado Público / ESSA
4	Inventario de la interventoría de los activos del SAP	Oficina de Alumbrado Público / Interventoría SAP
5	Inventario ESSA – Componentes del SAP	ESSA – Área de Alumbrado Público / Distribución
6	Planos de redes subterráneas existentes	ESSA / Secretaría de Planeación – Infraestructura
7	Base de datos de transformadores encapsulados	ESSA
8	Contratos de suministro de energía	Secretaría Jurídica / Secretaría de Hacienda
9	Convenio de facturación y recaudo	Secretaría de Hacienda Municipal
10	Acuerdos municipales últimos 5 años o vigente	Secretaría Jurídica / Concejo Municipal
11	Balances mensuales remitidos por ESSA	Secretaría de Hacienda / Oficina de Alumbrado Público
12	Facturas completas de energía – SAP	Secretaría de Hacienda
13	Históricos de consumos y potencias	ESSA / Secretaría de Hacienda
14	Componentes tarifarios aplicados	ESSA / CREG (referencial)
15	Condiciones comerciales pactadas	Oficina de Alumbrado Público / Contratos con OR
16	Base de datos ICA 2022–2025 armonizada	Secretaría de Hacienda – Dirección de Impuestos

17	Usuarios con actividades de relevancia	Secretaría de Hacienda / Dependencia de Alumbrado / Cámara de Comercio
18	Usuarios especiales (empresas industriales)	Secretaría de Hacienda / Dependencia de Alumbrado
19	Recursos y costos municipales SAP 2021–2024	Secretaría de Hacienda / Oficina de Alumbrado Público
20	Descripción de la población	Secretaría de Planeación / DANE
21	Estudios de iluminación previos (RETILAP 3.3.1.4)	Oficina de Alumbrado Público / Infraestructura
22	Manuales de espacio público y silvicultura	Planeación / Infraestructura / Medio Ambiente / DADEP

1. Imagen donde se observan los elementos cargados en el SIAP y georreferenciados por ETR

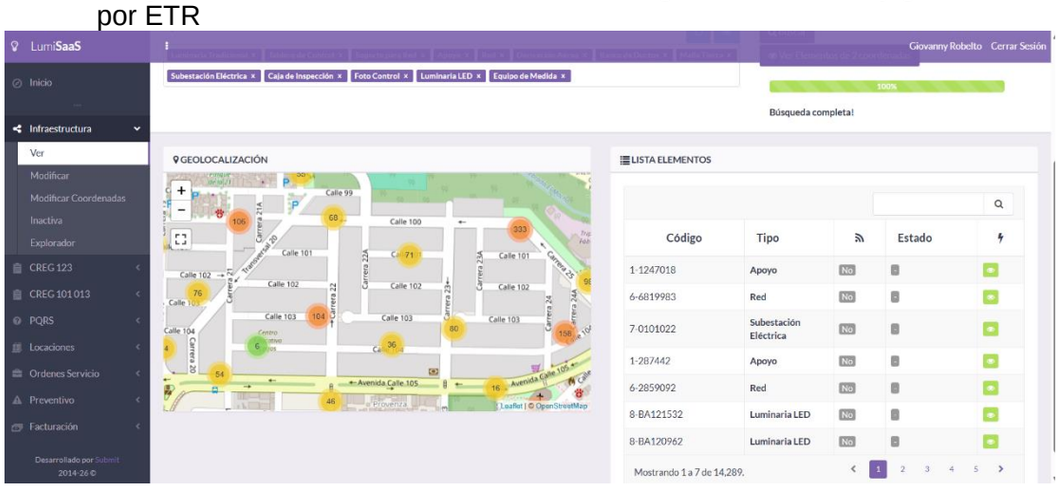

1. Imagen donde se observan redes aéreas y subterraneas en el SIAP

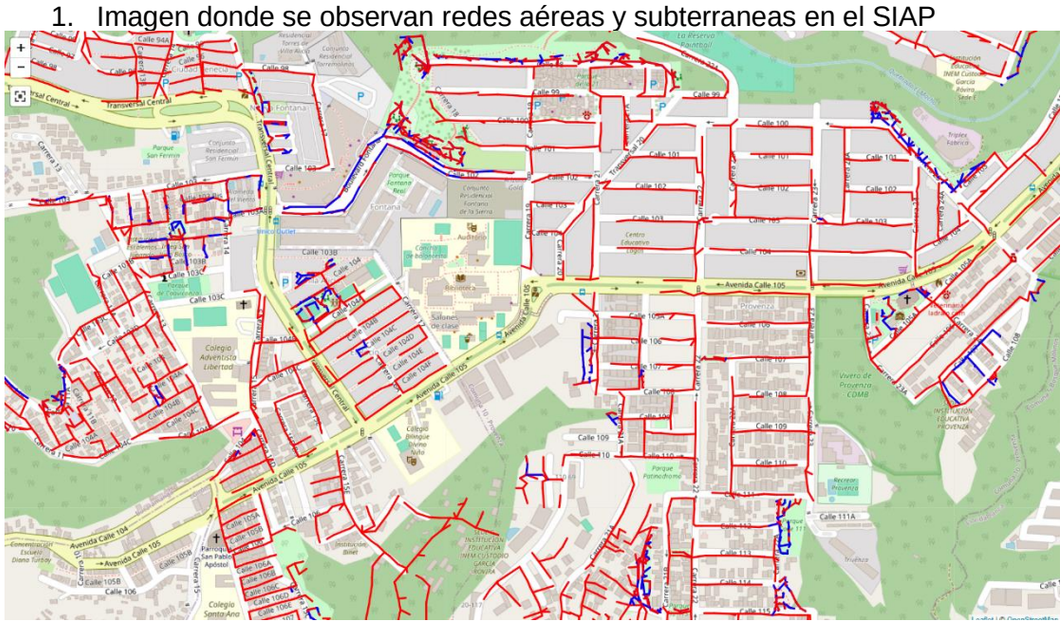

2. Parametrización del SIAP

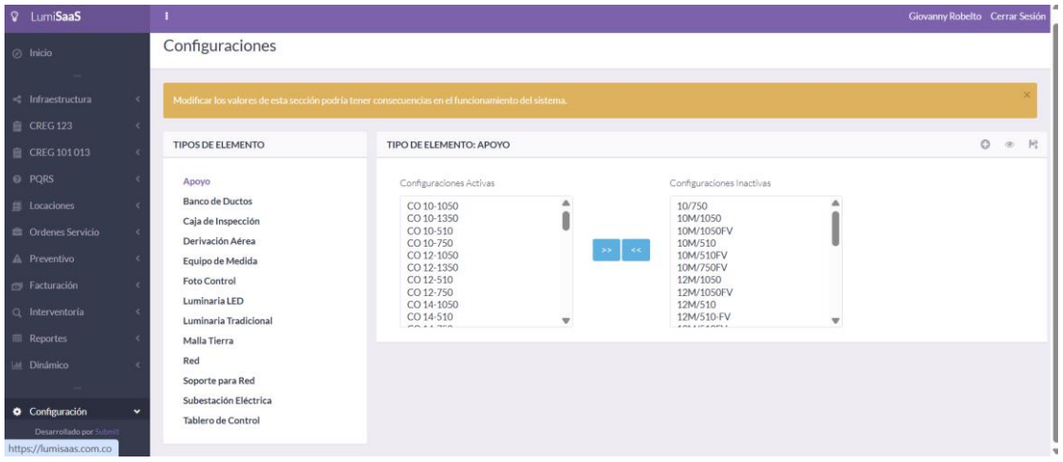

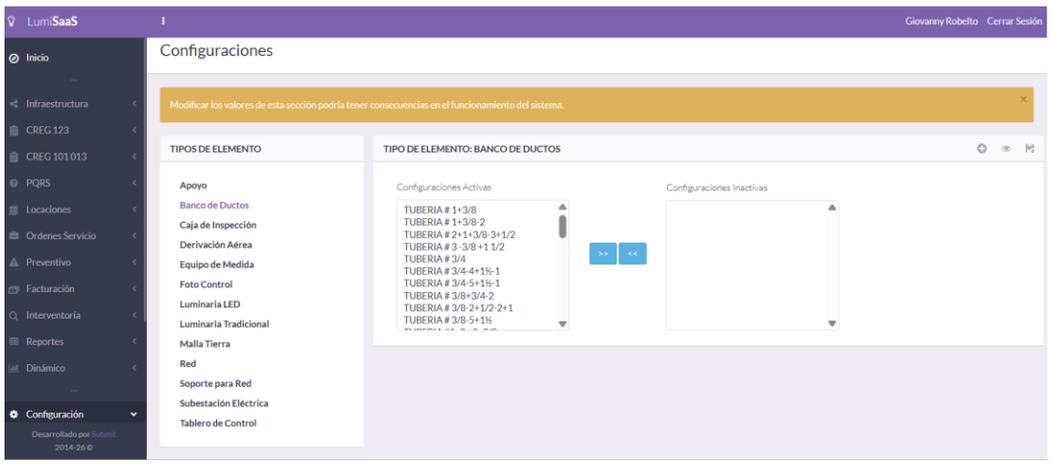

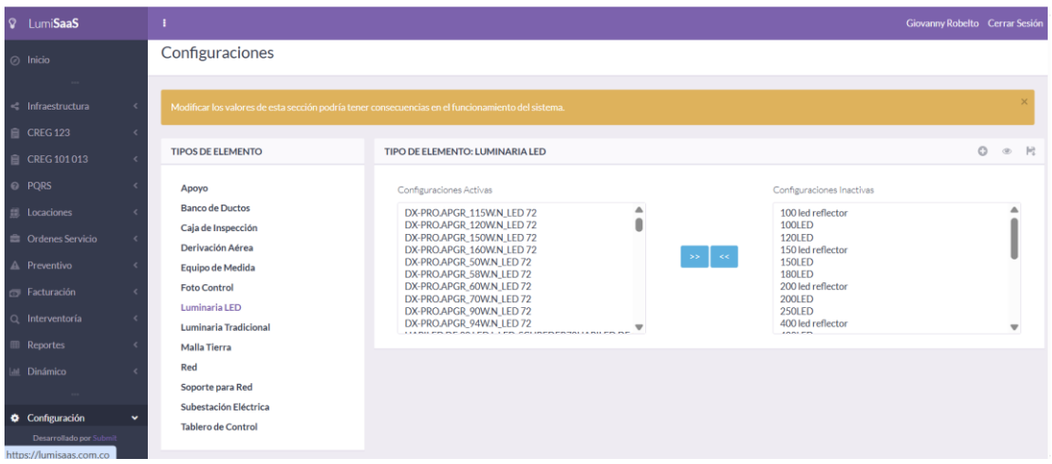

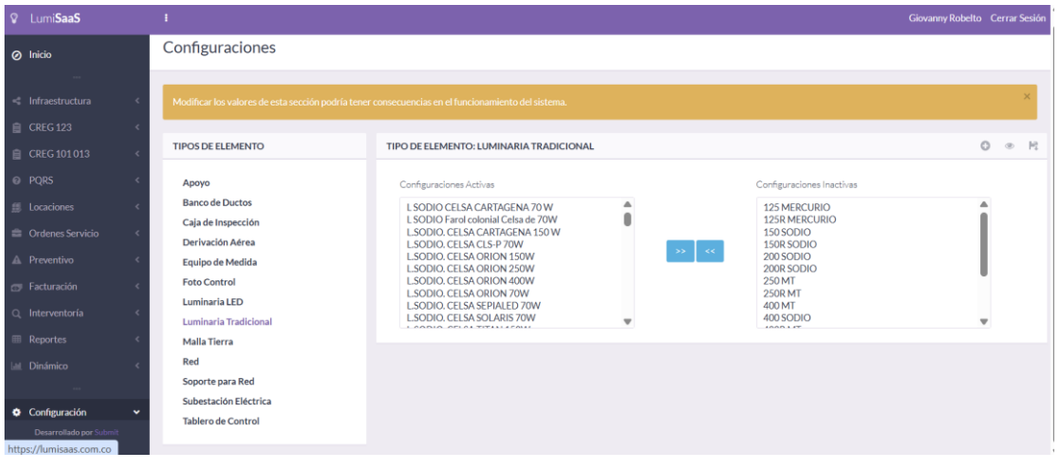

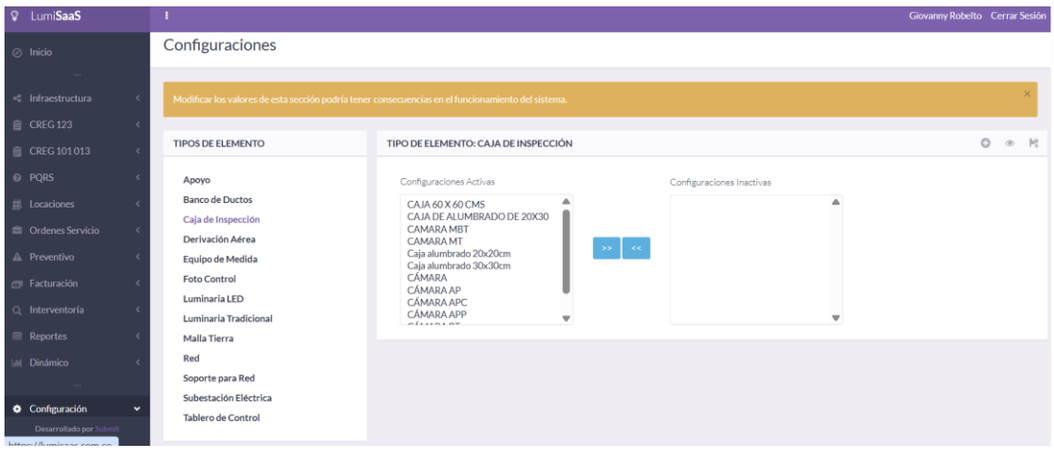
LumiSaaS
Giovanny Robelto
Cerrar Sesión
Inicio
Infraestructura
CREG 123
CREG 101 013
PQRS
Locaciones
Ordenes Servicio
Preventivo
Facturación
Interventoría
Reportes
Dinámico
Configuración
Desarrollado por Submit
Configuraciones
Modificar los valores de esta sección podría tener consecuencias en el funcionamiento del sistema.
TIPOS DE ELEMENTO
Apoyo
Banco de Ductos
Caja de Inspección
Derivación Aérea
Equipo de Medida
Foto Control
Luminaria LED
Luminaria Tradicional
Malla Tierra
Red
Soporte para Red
Subestación Eléctrica
Tablero de Control
TIPO DE ELEMENTO: CAJA DE INSPECCIÓN
Configuraciones Activas
CAJA 60 X 60 CMS
CAJA DE ALUMBRADO DE 20X30
CAMARA MBT
CAMARA MT
Caja alumbrado 20x20cm
Caja alumbrado 30x30cm
CÁMARA
CÁMARA AP
CÁMARA APC
CÁMARA APP
Configuraciones Inactivas
>>
<<

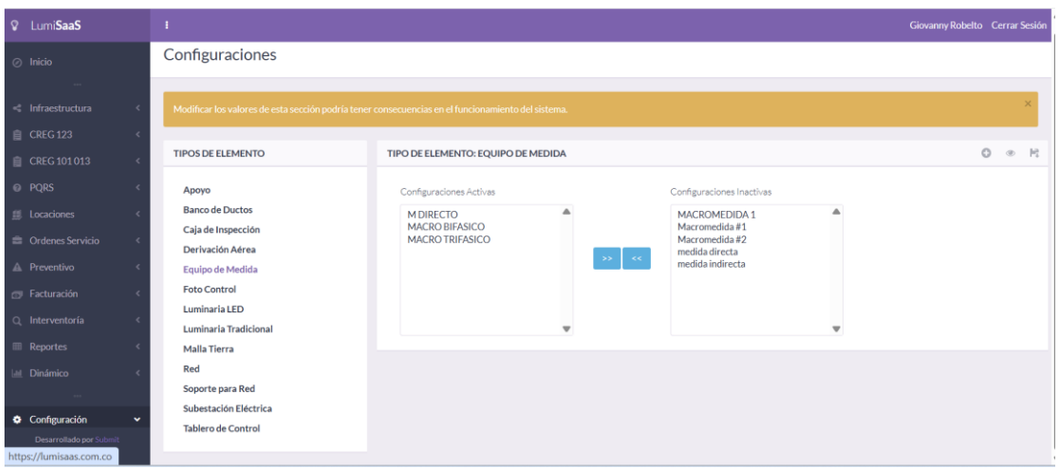
LumiSaaS
Giovanny Robelto
Cerrar Sesión
Inicio
Infraestructura
CREG 123
CREG 101 013
PQRS
Locaciones
Ordenes Servicio
Preventivo
Facturación
Interventoría
Reportes
Dinámico
Configuración
Desarrollado por Submit
https://lumisaas.com.co
Configuraciones
Modificar los valores de esta sección podría tener consecuencias en el funcionamiento del sistema.
TIPOS DE ELEMENTO
Apoyo
Banco de Ductos
Caja de Inspección
Derivación Aérea
Equipo de Medida
Foto Control
Luminaria LED
Luminaria Tradicional
Malla Tierra
Red
Soporte para Red
Subestación Eléctrica
Tablero de Control
TIPO DE ELEMENTO: EQUIPO DE MEDIDA
Configuraciones Activas
M DIRECTO
MACRO BIFASICO
MACRO TRIFASICO
Configuraciones Inactivas
MACROMEDIDA 1
Macromedida #1
Macromedida #2
medida directa
medida indirecta
>>
<<

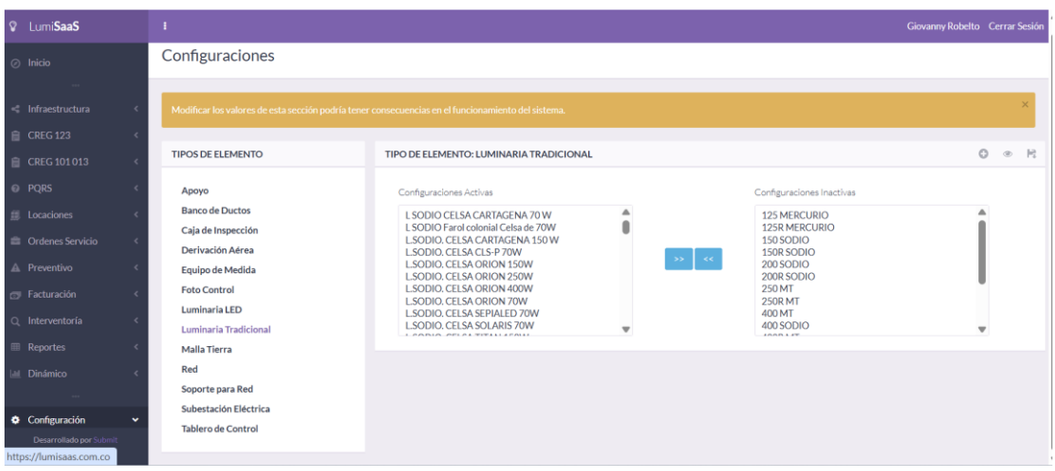
LumiSaaS
Giovanny Robelto
Cerrar Sesión
Inicio
Infraestructura
CREG 123
CREG 101 013
PQRS
Locaciones
Ordenes Servicio
Preventivo
Facturación
Interventoría
Reportes
Dinámico
Configuración
Desarrollado por Submit
https://lumisaas.com.co
Configuraciones
Modificar los valores de esta sección podría tener consecuencias en el funcionamiento del sistema.
TIPOS DE ELEMENTO
Apoyo
Banco de Ductos
Caja de Inspección
Derivación Aérea
Equipo de Medida
Foto Control
Luminaria LED
Luminaria Tradicional
Malla Tierra
Red
Soporte para Red
Subestación Eléctrica
Tablero de Control
TIPO DE ELEMENTO: LUMINARIA TRADICIONAL
Configuraciones Activas
L SODIO CELSA CARTAGENA 70 W
L SODIO Farol colonial Celsa de 70W
L.SODIO. CELSA CARTAGENA 150 W
L.SODIO. CELSA CLS-P 70W
L.SODIO. CELSA ORION 150W
L.SODIO. CELSA ORION 250W
L.SODIO. CELSA ORION 400W
L.SODIO. CELSA ORION 70W
L.SODIO. CELSA SEPIALED 70W
L.SODIO. CELSA SOLARIS 70W
Configuraciones Inactivas
125 MERCURIO
125R MERCURIO
150 SODIO
150R SODIO
200 SODIO
200R SODIO
250 MT
250R MT
400 MT
400 SODIO
>>
<<

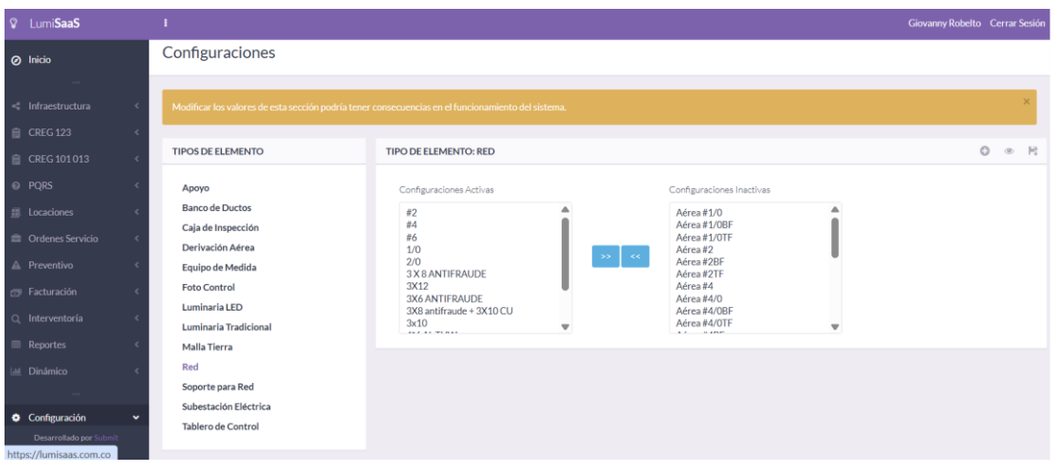
LumiSaaS
Giovanny Robelto
Cerrar Sesión
Inicio
Infraestructura
CREG 123
CREG 101 013
PQRS
Locaciones
Ordenes Servicio
Preventivo
Facturación
Interventoría
Reportes
Dinámico
Configuración
Desarrollado por Submit
https://lumisaas.com.co
Configuraciones
Modificar los valores de esta sección podría tener consecuencias en el funcionamiento del sistema.
TIPOS DE ELEMENTO
Apoyo
Banco de Ductos
Caja de Inspección
Derivación Aérea
Equipo de Medida
Foto Control
Luminaria LED
Luminaria Tradicional
Malla Tierra
Red
Soporte para Red
Subestación Eléctrica
Tablero de Control
TIPO DE ELEMENTO: RED
Configuraciones Activas
#2
#4
#6
1/0
2/0
3 X 8 ANTIFRAUDE
3X12
3X6 ANTIFRAUDE
3X8 antifraude + 3X10 CU
3x10
Configuraciones Inactivas
Aérea #1/0
Aérea #1/0BF
Aérea #1/0TF
Aérea #2
Aérea #2BF
Aérea #2TF
Aérea #4
Aérea #4/0
Aérea #4/0BF
Aérea #4/0TF
>>
<<

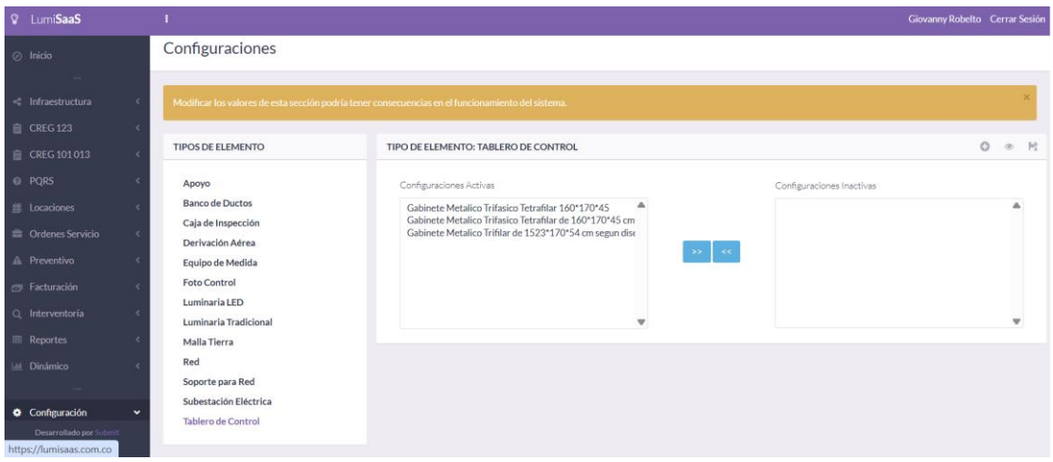

Fuente: Lumisaas fecha 18 de marzo de 2026

A continuación, se enlista las consideraciones que motivaron la suspensión del contrato No 176 de 2025, adicionalmente se anexa el acta de suspensión No 1 del contrato de fecha de 22 de diciembre de 2025, el Informe de actividades y solicitud de suspensión al Contrato Interadministrativo 176 de 2025 y el concepto técnico y jurídico por parte de la supervisión *(ver anexo - Anexo acta de suspensión CTO INTERADTIVO 176-2025 ETR).*

6. Que, en atención a la naturaleza técnica del Estudio Técnico de Referencia y a la necesidad de asegurar que los entregables finales cumplan con los estándares regulatorios exigidos para la toma de decisiones en materia de alumbrado público, se configura la procedencia de la modificación contractual solicitada.

7. Que, el 10 de diciembre de 2025 el contratista PROMOTORA ENERGÉTICA DEL CENTRO S.A.S. E.S.P. mediante oficio S-CO-1400-2025-44 "Informe de actividades y solicitud de suspensión al Contrato Interadministrativo 176 de 2025: "REALIZAR EL ESTUDIO TÉCNICO DE REFERENCIA DE DETERMINACION DE COSTOS, OPTIMIZAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y PUESTA EN MARCHA DEL ESQUEMA DE OPERACIÓN PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.", solicitó la suspensión por treinta (30) días calendario del contrato interadministrativo N° 176 del 4 de agosto de 2025, considerando necesaria la consolidación del total de la información por cada una de las fases que conforman el desarrollo del Estudio Técnico de la Referencia; lo anterior con el fin de dar continuidad a las actividades que permitan el desarrollo del objeto contractual y garantizar la consolidación de información respectiva.

8. Que, el supervisor el 19 de diciembre de 2025 presenta concepto de viabilidad partiendo de la necesidad de la modificación contractual consistente en la suspensión temporal del plazo del Contrato Interadministrativo No. 176 de 2025, y con sujeción a los argumentos técnicos y metodológicos que la motivan, expuestos en el informe de actividades y solicitud presentada por el contratista, así como en el análisis técnico efectuado por la supervisión del contrato, se concluye que dicha modificación persigue una finalidad legítima y se encuentra debidamente justificada desde el punto de vista técnico, jurídico y administrativo.

Las razones que motivaron la suspensión del Contrato Interadministrativo No. 176 de 2025 se fundamentan en la necesidad de garantizar la calidad, integridad y cumplimiento de los estándares técnicos del Estudio Técnico de Referencia (ETR), insumo clave para la toma de decisiones en materia de alumbrado público.

En este sentido, la suspensión fue solicitada por el contratista mediante informe de actividades, en el cual se evidenció la necesidad de **consolidar la totalidad de la información correspondiente a las diferentes fases del estudio**, con el fin de asegurar la coherencia, trazabilidad y calidad de los entregables. Esta solicitud fue avalada por la supervisión del contrato, quien emitió concepto de viabilidad técnica, jurídica y administrativa, considerando que la modificación contractual persigue una finalidad legítima y debidamente justificada.

Adicionalmente, se identificó la necesidad de realizar un análisis técnico detallado de los rendimientos reales en campo, teniendo en cuenta que el volumen de información

recopilada, situaciones imprevistas en campo como cajas soldadas para verificación de los elementos soterrados y la cantidad de activos evaluados han superado las estimaciones iniciales, lo que ha impactado los tiempos de ejecución previstos. Este análisis permitirá ajustar de manera adecuada los tiempos requeridos para la correcta consolidación del estudio.

En cuanto a la disponibilidad del insumo (ETR), este se encuentra actualmente en proceso de consolidación. Su entrega se realizará una vez se complete la validación técnica de la información y se garantice el cumplimiento del alcance esperado del proyecto, en el marco del plazo de suspensión aprobado de treinta (30) días calendario, se debe realizar una ampliación a la suspensión, conforme al acta No. 1.

Lo anterior se encuentra soportado en los documentos anexos: acta de suspensión, informe de actividades y solicitud de suspensión, así como el concepto técnico y jurídico emitido por la supervisión.

META E INDICADOR DE PRODUCTO

Implementar un sistema de gestión y monitoreo de la información del alumbrado público acorde a RETILAP.

Indicador	Meta 2026	Logro 2026	% Avance 2026	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Sistemas de información actualizados	0.3	0	0%	$ 500.000.000	$ 0	0%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE BUCARAMANGA	2024680010205	$ 500.000.000	$ 2.266.800.689,23

Resumen del proyecto: Teniendo en cuenta que el Municipio de Bucaramanga tiene establecido el Impuesto de Alumbrado Público según acuerdo municipal vigente 044 de 2008 y que esta es una renta de destinación específica, es claro y conveniente que se utilice recursos de este rubro para atender todas las necesidades de la prestación del servicio de alumbrado público incluido los gastos administrativos.

Dada la importancia en la prestación del servicio de alumbrado público es necesario realizar la adquisición de la renovación de las licencias OPUS, SGAP, SIAP y otras herramientas tecnológicas, para garantizar el funcionamiento eficaz del área de diseño, garantizando a su vez la administración, operación y mantenimiento y de esta manera prestar el servicio esencial de alumbrado público que no se puede dejar de prestar, por seguridad de todos los habitantes del Municipio.

SOCIALES: El proyecto tiene como principal beneficio el fortalecimiento en el desarrollo y ejecución de las actividades de seguimiento y control a procesos de la secretaría de Infraestructura-Alumbrado Público.

ECONÓMICOS: Implementado nueva tecnología, genera disminución en los altos niveles de consumo de energía y en los costos de mantenimiento especialmente en el ahorro en la contratación de cuadrillas de mantenimiento.

AMBIENTALES: Generar un impacto ambiental, disminuyendo los niveles de dióxido de carbono en la ciudad, al construir el sistema de iluminación con nuevas tecnologías.

PROCESOS CONTRACTUALES RELACIONADOS CON EL PROYECTO Y LA META

INFORMACIÓN DEL PROCESO COTRACTUAL DE SGAP

- **CONTRATO**: 075 DEL 2025
- **OBJETO**: Servicio De Soporte Y Mantenimiento Del Sistema De Gestión De Alumbrado Público-SGAP Y El Hardware De Control Asociado En Los Diferentes Sitios De Telemedida Del Municipio De Bucaramanga.
- **VALOR**: $ 277.556.919
- **FECHA DE INICIO**: 21/05/2025
- **FECHA FIN**: 31/12/2025
- **ESTADO**: EN RECIBO FINAL PARA INICIAR PROCESO DE LIQUIDACIÒN

El software de gestión del Alumbrado Público tiene como objetivo optimizar el control y la operación de las luminarias de la ciudad de Bucaramanga. La plataforma se enfoca en mantener la máxima disponibilidad del servicio, asegurar una alta eficiencia operativa y minimizar los costos asociados a las fallas recurrentes, todo ello a través de una estrategia que va más allá del mantenimiento convencional.

Objetivo del Software: El software busca transformar la gestión del alumbrado público en una plataforma inteligente, trazable y adaptable, asegurando que cada acción técnica esté respaldada por análisis predictivos, indicadores de rendimiento y propuestas de mejora continuas. Esta herramienta facilita una toma de decisiones más ágil y precisa, permitiendo a los gestores anticiparse a posibles riesgos y mejorar la calidad del servicio para los ciudadanos.

Características Claves del Software

1. Monitoreo y Control Remoto: El software permite monitorear el estado de las luminarias en tiempo real, con actualizaciones periódicas sobre la comunicación y el funcionamiento de cada unidad. Esto facilita la identificación de fallas y la implementación de soluciones antes de que se conviertan en problemas mayores.
2. Gestión de Alarmas y Fallas: A través del sistema, se gestionan las alarmas y fallas de forma eficiente, con un proceso automatizado que detecta y notifica incidencias en el menor tiempo posible. Además, el software tiene la capacidad de reducir eventos críticos en más del 95% mediante mantenimiento preventivo, correctivo y un seguimiento remoto constante.
3. Optimización de Mantenimiento Preventivo: El sistema permite la programación de intervenciones periódicas, garantizando que todas las luminarias se mantengan en condiciones óptimas. Las intervenciones incluyen inspecciones regulares, limpieza, revisión de conexiones eléctricas y validación de parámetros técnicos.
4. Gestión de Base de Datos y Respaldos: El software asegura la integridad de los datos mediante la depuración semanal y la verificación de copias de seguridad. De esta manera, se preserva la información histórica y operativa para la toma de decisiones a largo plazo.
5. Análisis de Desempeño y Mejora Continua: El software consolida los indicadores clave de desempeño, trazabilidad de fallas, análisis de costos operativos y propuestas de mejora. Esto permite a los responsables de la gestión del alumbrado público optimizar los recursos, reducir el tiempo de inactividad y mejorar la calidad del servicio prestado a la comunidad.
6. Soporte Técnico Especializado: A través de la plataforma, se proporciona soporte técnico tanto remoto como presencial para resolver incidentes relacionados con el hardware y el software. Esto incluye la atención de fallas en sensores, controladores

y otros componentes esenciales para el funcionamiento del sistema de alumbrado público.

7. Capacitación y Actualización del Personal: El software también incluye módulos para la capacitación continua del personal operativo, asegurando que estén actualizados en el manejo del sistema y la integración de nuevos equipos.

Beneficios para la Gestión del Alumbrado Público. El uso de este software permite una gestión más eficiente y proactiva del alumbrado público de Bucaramanga, con los siguientes beneficios clave:

- Mayor disponibilidad y confiabilidad del servicio, reduciendo significativamente el tiempo de inactividad.
- Mejor control y trazabilidad, lo que permite una mejor planificación y ejecución de las actividades de mantenimiento.
- Reducción de costos operativos, gracias a la optimización de recursos y la prevención de fallas.
- Mayor resiliencia ante incidentes, con una respuesta más rápida y efectiva a las alertas del sistema.

El software de gestión implementado por WM SAS en el Alumbrado Público de Bucaramanga no solo facilita la operación diaria de las luminarias de la ciudad, sino que también transforma la gestión del alumbrado en una plataforma inteligente y adaptable. Con su capacidad de monitoreo en tiempo real, gestión de alarmas, mantenimiento preventivo y análisis de desempeño, el sistema asegura una operación eficiente, confiable y resiliente, elevando la calidad del servicio y optimizando los recursos públicos.

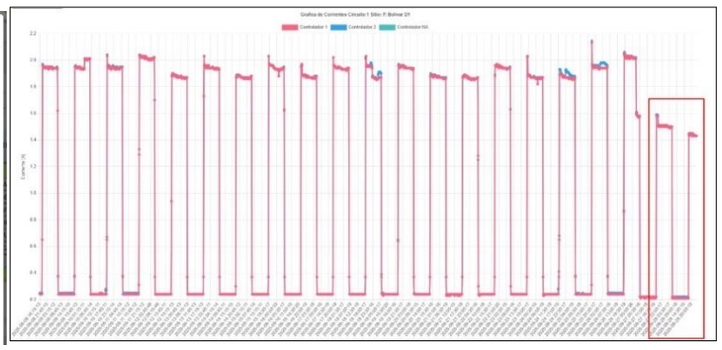

INFORMACIÓN DEL PROCESO COTRACTUAL DE OPUS

- **CONTRATO**: 153 DEL 2025
- **OBJETO**: Renovación De Suscripción De 11 Licencias Del Software Opus 24 Por Dos Años Para Alumbrado Público Del Municipio De Bucaramanga.
- **VALOR**: $ 58.821.460,00
- **FECHA DE INICIO**: 05/08/2025
- **FECHA FIN**: 04/09/2025
- **ESTADO**: EN RECIBO FINAL PARA INICIAR PROCESO DE LIQUIDACIÒN

OPUS está diseñado para optimizar la gestión de presupuestos, su principal objetivo es automatizar, controlar y analizar los presupuestos de manera eficiente, permitiendo una planificación financiera más precisa y un seguimiento en tiempo real de los gastos e ingresos. Con OPUS, la organización puede mejorar la asignación de recursos y garantizar el cumplimiento de los objetivos financieros establecidos.

Características del Software:

- Planificación y Asignación de Presupuestos: OPUS permite la creación de presupuestos detallados por áreas, proyectos o departamentos, con la capacidad de realizar ajustes conforme se desarrollan las actividades financieras.
- Monitoreo en Tiempo Real: Ofrece la capacidad de monitorear los gastos y compararlos con el presupuesto proyectado, alertando sobre desviaciones y facilitando la toma de decisiones correctivas.
- Informes Detallados y Personalizados: Genera informes financieros completos que muestran el estado de los presupuestos, permitiendo un análisis exhaustivo de las variaciones y facilitando la toma de decisiones.
- Integración con Otros Sistemas Financieros: OPUS puede integrarse con sistemas contables y de gestión de recursos, lo que garantiza la consistencia y precisión de los datos financieros a lo largo de la organización.

Beneficios para la Gestión de Presupuestos:

- Optimización de Recursos Financieros: El programa asegura que los recursos se asignen de manera eficiente, evitando sobrecostos y asegurando que cada área se mantenga dentro de su presupuesto.
- Mejor Control y Seguimiento: La capacidad de monitorear el presupuesto en tiempo real permite a los gerentes realizar ajustes inmediatos y evitar desviaciones que afecten los resultados financieros.
- Mayor Precisión en la Planificación: Gracias a las herramientas de análisis y simulación, los presupuestos se planifican con mayor precisión, considerando variables e imprevistos, lo que mejora la exactitud de las previsiones financieras.
- Cumplimiento de Objetivos Financieros: Con OPUS, se facilita el cumplimiento de metas financieras, ya que permite un seguimiento constante y detallado, ayudando a las organizaciones a cumplir con sus objetivos sin exceder los límites presupuestarios.
  La implementación del software OPUS para la gestión de presupuestos permitirá a la organización mejorar significativamente la precisión en la planificación financiera, optimizar los recursos y tener un control exhaustivo sobre los gastos. Esto no solo optimiza el proceso de presupuestación, sino que también contribuye al éxito financiero a largo plazo de la empresa, asegurando que cada área esté alineada con las metas financieras globales.
-

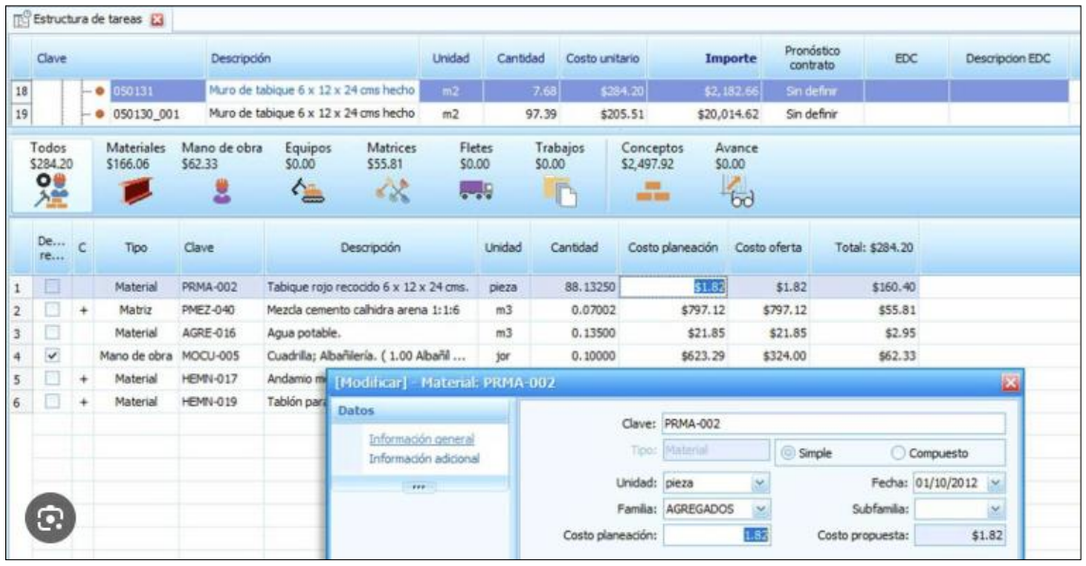

INFORMACIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SIAP

- **CONTRATO**: 175 DEL 2025
- **OBJETO**: Análisis Y Diagnostico De La Situación Actual E Implementación De Un Sistema De Información De Alumbrado Público - SIAP En El Municipio De Bucaramanga
- **VALOR**: $ 259.205.210
- **FECHA DE INICIO**: 25/08/2025
- **FECHA FIN**: 31/12/2025
- **ESTADO**: EN RECIBO FINAL PARA INICIAR PROCESO DE LIQUIDACIÒN

Información Sobre Avance De Ejecución Del Proceso

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN

1.1 Sobre la información base y la fase de diagnóstico

- La supervisión observa que una parte significativa de la información utilizada como insumo para el diagnóstico inicial correspondía a bases de datos desactualizadas y a información incompleta, situación que fue debidamente documentada por el contratista y validada por la supervisión.

- Se deja constancia de que dichas limitaciones no fueron atribuibles al contratista, sino a condiciones preexistentes del sistema de información del Alumbrado Público.
- La supervisión verificó que estas limitaciones fueran explícitamente reconocidas en los informes, permitiendo que las conclusiones y decisiones posteriores se adoptaran con conocimiento de los riesgos asociados.

1.2 Sobre la selección de la alternativa tecnológica

- La supervisión observa que la selección de la alternativa tecnológica se realizó con base en criterios funcionales y normativos alineados con las necesidades identificadas en el diagnóstico.
- No obstante, se deja constancia de que, para efectos de auditoría o control posterior, resulta conveniente fortalecer el expediente con evidencias adicionales que respalden la verificación de cumplimiento de todos los requisitos técnicos y normativos evaluados.
- La supervisión considera que esta observación no afecta la validez de la selección, sino que constituye una recomendación para robustecer la trazabilidad documental.

1.3 Sobre la implementación y puesta en marcha del SIAP

- La supervisión observa que la implementación del SIAP se realizó de manera progresiva y articulada con el Estudio Técnico de Referencia, considerando la decisión institucional de levantar la información desde cero.
- Se deja constancia de que la puesta en marcha corresponde a la **habilitación operativa del sistema**, y no a la culminación del levantamiento total del inventario de alumbrado público, el cual constituye un proceso posterior y continuo.
- La supervisión verificó la instalación del sistema, la creación de usuarios, la instalación de aplicaciones y la ejecución de capacitaciones como requisitos mínimos para la puesta en marcha.

1.4 Sobre la capacitación y apropiación del sistema

- La supervisión observa que las capacitaciones se priorizaron en las áreas críticas para el inicio de la operación del sistema, tales como bodega, almacén y levantamiento en campo.
- Se deja constancia de que, debido a la alta rotación de personal en algunas áreas, la capacitación integral de todos los usuarios finales fue prevista como un proceso progresivo, recomendándose su continuidad para garantizar la apropiación institucional del sistema.
- Esta situación fue conocida, aceptada y gestionada dentro del marco del contrato, sin afectar el cumplimiento de la actividad de implementación.

1.5 Sobre la documentación y versión de los informes

- La supervisión observa que algunos informes se presentan como versiones preliminares, debido a la programación de entrevistas y validaciones pendientes relacionadas con seguridad de la información y privacidad.
- Se recomienda que dichas validaciones sean incorporadas en una versión final consolidada del informe, con el fin de fortalecer el componente de seguridad y gobernanza de la información.
- Esta observación no impide el reconocimiento del cumplimiento de las actividades contractuales, pero sí se registra como un aspecto a cerrar formalmente en el expediente.

1.6 Sobre el ejercicio de la supervisión

- La supervisión deja constancia de que durante la ejecución del contrato se ejerció control permanente mediante revisión documental, seguimiento cronológico, requerimientos formales, mesas técnicas y validación de evidencias.
- Las observaciones realizadas al contratista fueron atendidas oportunamente, sin que se presentaran incumplimientos reiterados ni controversias que afectaran la ejecución del contrato.

2. CONCLUSIONES DE LA SUPERVISIÓN

1. Las actividades contractuales correspondientes a las **Actividades 1.1 (Recopilación), 1.2 (Análisis y Diagnóstico), 1.3 (Selección de Alternativa) y**

Actividad 2 (Implementación y Puesta en Marcha del SIAP) fueron ejecutadas conforme al alcance definido en el Contrato Interadministrativo No. 175 de 2025.

2. El contratista dio cumplimiento a las obligaciones contractuales, entregando los productos esperados y atendiendo los requerimientos realizados por la supervisión durante la ejecución del contrato.
3. La supervisión ejerció de manera efectiva sus funciones de control, seguimiento y verificación, dejando trazabilidad documental y cronológica de las actuaciones realizadas.
4. El Sistema de Información de Alumbrado Público – SIAP fue implementado y puesto en marcha, quedando habilitado para su operación inicial por parte de la Entidad, con usuarios creados, dispositivos configurados y personal capacitado.
5. Las observaciones formuladas por la supervisión se enmarcan en un enfoque preventivo y de mejora continua, y no constituyen incumplimientos contractuales.
6. En consecuencia, y sin perjuicio de las recomendaciones consignadas, la supervisión concluye que el contrato **cumplió con el objeto y las actividades contratadas**, dejando constancia para los fines administrativos, técnicos y de control a que haya lugar

5. OTROS PROYECTOS CONTRATADOS Y QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA MODALIDAD LLAVE EN MANO NO. 150 de fecha 17 de julio de 2025 -: CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA SAS' “OBRA PÚBLICA EN LA MODALIDAD LLAVE EN MANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MUROSDE CERRAMIENTODELA INSTITUCION EDUCATIVAOFICIAL (lEO) DE SANTANDER(SEDEA) DEL MUNICIPIODE I BUCARAMANGA Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OFICIAL (lEO) DÁMASO ZAPATA(SEDEA) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.

Valor del contrato:	$915.778.828,00
Valor Anticipo:	N/A
Plazo inicial:	4 Meses
Fecha de inicio:	30 de julio de 2025
Fecha de terminación:	29 de diciembre de 2025
Estado del Contrato:	EJECUCIÓN
Porcentaje estudios y diseños:	100%
Porcentaje avance de obra:	85%

Ubicación:

- Institución Educativa de Santander sede A ubicada en la Carrera 27 # 9-2
- Institución Educativa Técnico Damaso Zapata ubicada en la Carrera 25 # 8 - 2

Impacto:

Con la reconstrucción del muro colapsado en la Institución Educativa Santander – Sede A y de la Institución Educativa Técnico Damaso Zapata no solo restituye la estabilidad estructural del cerramiento del colegio y la seguridad física del plantel, sino que genera beneficios sociales directos e inmediatos en la comunidad educativa.

De manera que se garantiza un entorno seguro para estudiantes, docentes y personal administrativo, reduciendo la exposición a riesgos de accidentes, evitando que el resto de este muro de cerramiento presenta afectaciones a la normalidad y mejorando la percepción de confianza en las instalaciones.

Adicionalmente, con la recuperación de la infraestructura fortalece el sentido de pertenencia y protección de la comunidad frente a sus instituciones educativas, promoviendo un espacio

digno, seguro y adecuado para el aprendizaje avanzando así en la consolidación de entornos escolares resilientes y para el goce de la comunidad

ESTADO DEL CONTRATO:

El proyecto contempló su ejecución en dos etapas, una etapa inicial correspondiente a los estudios de suelos y ajustes a los diseños de los muros de cerramiento.

En esta etapa se determinó el valor real de las obras requeridas dentro del objeto contractual. Como resultado, el CONTRATISTA elaboró un presupuesto, el cual parte de los ajustes técnicos realizados a los diseños, en especial de la exploración geotécnica realizada, producto de la verificación en campo, los ensayos de laboratorio y las recomendaciones emitidas por los especialistas.

Por lo que, con esto, se ajustaron los demás diseños, obteniendo cantidades de obra y actividades actualizadas de acuerdo con las modificaciones técnicas identificadas para así poder iniciar la segunda etapa

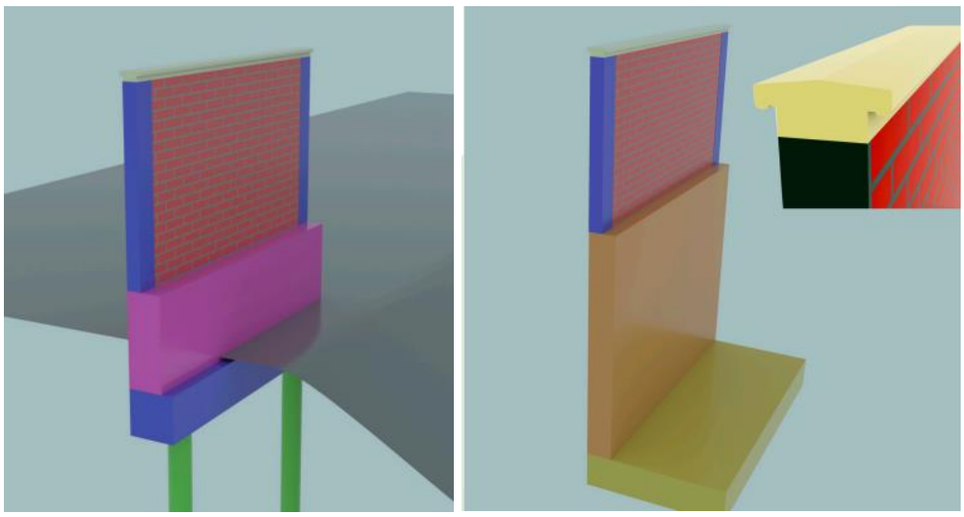

El 29 de septiembre de 2025, con base en los estudios y diseños entregados y aprobados, se dio inicio a la Etapa II de ejecución de obra. Cuyo objeto inicial es la construcción de aproximadamente 100 metros lineales de muro de cerramiento en la Institución Educativa Santander – Sede A, junto con sus respectivas obras de drenaje, así como la construcción de aproximadamente 120 metros lineales de muro de cerramiento en la Institución Educativa Técnico Dámaso Zapata, igualmente con sus obras complementarias de drenaje. Todo ello en cumplimiento de lo estipulado en el contrato de obra bajo la modalidad llave en mano.

Las actividades correspondientes se ejecutarán conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proceso contractual y estarán sujetas a la aprobación del Supervisor designado. En consecuencia, esta fase contempla la construcción integral y funcional de los muros mencionados, asegurando su estabilidad, durabilidad y la adecuada protección perimetral de las instituciones educativas intervenidas.

A continuación, se presentan imágenes de le ejecución:

I.E. SANTANDER

I.E. DAMASO ZAPATA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 166 DEL 2013 con objeto: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Valor del contrato:	$85.373.383.221
Duración del contrato:	38 Meses
Fecha de inicio:	12 de julio de 2023
Fecha de terminación:	11 de septiembre de 2026
Estado del Contrato:	EJECUCIÓN
Porcentaje avance:	0%

Ubicación: Intervención en las siguientes Instituciones Educativas:

- Institución Educativa Tecnológico Dámaso Zapata
- Institución Educativa Custodio García Rovira INEM
- Institución Educativa: Santander

Descripción de actividades desarrolladas

1. **Remisión de información a FINDETER**

Desde la supervisión del municipio de Bucaramanga, se ha remitido a FINDETER la información necesaria para adelantar los respectivos procesos de contratación, en las siguientes fechas:

1. Proyecto Dámaso Zapata: Se envió el alcance del proyecto el **22 de mayo de 2025**, mediante radicado 2-S-SdIB-202505-00040686
2. Proyecto Institución Educativa Santander: Se envió el alcance del proyecto **el 30 de enero de 2025**, mediante radicado S-SdIB-202504-00003567 al cual se le dio alcance el pasado 25 de junio de 2025, a través radicado 2-S-SdIB-202506-00055252 realizando la actualización de precios al segundo semestre del 2025, así como incluyendo el proyecto de estudio de patología en esta institución.
3. Proyecto INEM: Se envió el link con la información que contiene el alcance final del proyecto el 06 de junio de 2025, y la actualización de precios para el segundo semestre el 25 de junio de 2025.

Así mismo, de manera oportuna se ha revisado y enviado las observaciones a los estudios previos remitidos por parte de Findeter.

2. **Estado contractual y financiero del convenio**

El valor del contrato se encuentra distribuido de la siguiente manera:

- VALOR INICIAL CONTRATO de SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($79.668.991.613), correspondientes a los del **empréstito**.

A este convenio posteriormente se le realizaron 4 adiciones con cargo a los recursos del presupuesto de la alcaldía (no de empréstitos), de la siguiente forma:

- VALOR ADICIONAL 1: DOS MIL SEISCIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($2.601.319.769).

- VALOR ADICIONAL 2: DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($2.494.271.839).
- VALOR ADICIONAL 3: CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCT ($ 163.800.000,00)
- VALOR ADICIONAL 4: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCT ($445.000.000,00),

Para un valor total del contrato de OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE. ($ 85.373.383.221,00)

3. Distribución presupuestal por institución educativa

Teniendo en cuenta el valor global del convenio, anteriormente indicado, se aclara que en este se encuentran incluidos todos los costos asociados, tales como: los estudios y diseños, los estudios de patología, la ejecución de las obras, las interventorías, la gerencia del proyecto, así como los correspondientes impuestos y tasas derivados de la suscripción del convenio, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera por Institución educativa:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	VALOR ASIGNADO
Institución Educativa Custodio García Rovira INEM	$ 27.652.155.890
Institución Educativa: Santander	$ 12.041.647.730
Institución Educativa Tecnológico Dámaso Zapata	$ 45.679.579.601

4. Avances en procesos de contratación

De manera que a la fecha FINDETER ha adelantado los procesos de contratación de estudios, diseños y obra https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atbucaramanga-o-052-2025 e interventoría https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atbucaramanga-i-058-2025 para la Institución Educativa Tecnológico Dámaso Zapata

Teniendo en cuenta el link del proceso anteriormente indicado y de acuerdo a los términos de referencia publicados se tienen los siguientes plazos establecidos para la ejecución del proyecto:

ESTADO DEL PROYECTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DÁMASO ZAPATA

CONSTRUCCION

Estado: En proceso de contratación.

Link: https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atbucaramanga-o-052-2025

No de proceso de contratación: PAF-ATBUCARAMANGA-O-052-2025

Objeto: Contratar la “Elaboración de estudios y diseños, construcción y adecuación de edificaciones y espacios en la institución educativa técnico Dámaso Zapata del municipio de Bucaramanga, departamento de Santander”

Valor: $28,004,682,260.00 COP

INTERVENTORIA

Estado: En proceso de contratación.

Link: https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atbucaramanga-i-058-2025

No de proceso de contratación: PAF-ATBUCARAMANGA-I-058-2025

Objeto: CONTRATAR "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO DÁMASO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

Por otra parte FINDETER ha adelantado los procesos de contratación de obra https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atbucaramanga-o-062-2025 e interventoría https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atbucaramanga-i-066-2025 para la Institución Educativa Santander

CONSTRUCCION

Estado: En proceso de contratación.

Link: https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atbucaramanga-o-062-2025

No de proceso de contratación: PAF-ATBUCARAMANGA-O-062-2025

Objeto: CONTRATAR "EL MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTANDER DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.""

INTERVENTORIA

Estado: En proceso de contratación.

Linkhttps://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atbucaramanga-i-066-2025

No de proceso de contratación: PAF-ATBUCARAMANGA-I-066-2025

Objeto: CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) AL MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTANDER DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

Valor: $316,381,250.00

En relación con la institución educativa IE Custodio García Rovira INEM la ALCALDIA DE BUCARAMANGA ha remitido varios oficios a FINDETER en dónde se adelanta el seguimiento a la ejecución del convenio y en especial a la publicación de los procesos tal como se evidencia en las siguientes comunicaciones:

a. 22 de julio de 2025 – Radicado: 2-S-SdIB-202507-00065789 - Asunto: Convenio interadministrativo No. 166 de 2023 – Solicitud de información del estado de los procesos de contratación derivados
b. 11 de agosto de 2025 – Radicado: 2-S-SdIB-202508-00071331- Asunto: Convenio interadministrativo No. 166 de 2023 – Reiteración sobre solicitud de información del estado de los procesos de contratación derivados

c. 22 de agosto de 2025 – Radicado: 2-S-SdIB-202508-00074992- Asunto: Convenio interadministrativo No. 166 de 2023 – Requerimiento por presunto incumplimiento respecto a los procesos de contratación derivados
d. 22 de septiembre de 2025 - Radicado: 2-S-SdIB-202509-00085121- Asunto: Convenio interadministrativo No. 166 de 2023 – Reiteración requerimiento por presunto incumplimiento respecto a los procesos de contratación derivados
e. A la fecha FINDETER no ha publicado el proceso

En este sentido, desde la Supervisión del Municipio de Bucaramanga continuará realizando el seguimiento permanente a la publicación y avance de los procesos contractuales por parte de FINDETER, reiterando la necesidad de que estos se adelanten lo más pronto posible.

Contrato CONVENIO No. 285 del 27 de diciembre de 2024, CUYO OBJETO: AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES ADMINSITRATIVOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A E.S.P. PARA GESTIONAR ANTE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO LA PRESENTACION DEL PROYECTO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMEINTO BASICO “PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR RIO DE ORO PARA LA EXPEDICION DEL CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD

Descripción de la ejecución del contrato.

VALOR INICIAL	: $ 0
VALOR ANTICIPO	: N/A
PLAZO INICIAL	: 6 meses
FECHA DE INICIO	: 07/01/2025
FECHA DE TERMINACION	: 06/07/2025
FECHA PRORROGA No.01	: 04/07/2025
PLAZO PRORROGA No.01	: 5 MESES Y 25 DIAS
FECHA PRORROGA No.02	: 23/12/2025
PLAZO PRORROGA No.02	: DOCE (12) MESES Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBR
E DE 2026 NUEVA FECHA DE TERMINACION	: 31/12/2026
ESTADO DEL CONVENIO	: ACTIVO PORCENTAJE AVANCE
EJECUTADO	: 70%
ESTADO	: EN EJECUCION

Se efectuó la radicación formal del proyecto de construcción de la PTAR Río de Oro ante el Ministerio, posteriormente se atendieron de manera oportuna las subsanaciones requeridas, las cuales fueron remitidas por EMPAS conforme a las directrices impartidas por la entidad.

En la actualidad, el proyecto se encuentra en fase de gestión de los aspectos prediales y financieros, considerados críticos para su viabilidad. En el ámbito predial, se adelantan procesos de adquisición, saneamiento y formalización de la titularidad de los terrenos, en cumplimiento de la normativa civil, urbanística y de ordenamiento territorial.

En el componente financiero, se desarrollan las gestiones necesarias para garantizar la disponibilidad, asignación y trazabilidad de los recursos, conforme a los lineamientos presupuestales, fiscales y de contratación pública.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

Mesa de trabajo convenio 285 -2024 PTAR Rio de Oro, con EMPAS, DADEP, Infraestructura. Fecha 12 de marzo de 2026

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCE: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: A FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	2023680010005	$ 42.999.999.999,00	$ 42.999.999.999,00

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE OBRAS ADICIONALES EN LOS CAUSES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	202500000019488	$ 21.135.251.009,00	$ 21.135.251.009,00

CONTRATO DE OBRA 69 de 2023 -: CONSORCIO LA FLORA 2023 "CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCE: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: A FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA".

Valor inicial del contrato:	$ 40.514.056.133,00
Valor adicional No 1:	$ 20.168.495.053,00
Valor total:	$ 60.682.551.186,00
Plazo inicial:	Dieciocho (18) meses
Plazo adicional No 1:	Un (01) mes
Plazo adicional No 2:	Cinco (05) meses
Plazo adicional No 3:	Siete (07) meses
Plazo adicional No 4:	Veintiún (21) días
Plazo adicional No 5:	Cinco (05) meses
Plazo total:	Treinta y un (36) meses y veintiún (21) días
Suspensión No 1:	04/12/2024
Reinicio No 1:	11/12/2024
Suspensión No 2:	23/12/2024
Reinicio No 2:	13/03/2026

Suspensión No 3:	20/03/2026
Reinicio No 3:	27/03/2026
Fecha de inicio:	05 de mayo de 2023
Fecha de terminación:	04 de noviembre de 2024
Nueva fecha de terminación:	27 de agosto de 2026
Porcentaje avance:	81.35%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra actualmente en ejecución. Se han construido 810 metros lineales de Box Culvert con dimensiones de 3.50 x 3.50 m, y 210 metros lineales adicionales con dimensiones de 3.00 x 3.00 m, ambos en concreto de 4.000 psi y se han construido 14 sumideros.

Se han realizado excavaciones con profundidades que van 0.0 a 2.50 metros a más de 8.0 m de profundidad, alcanzando un volumen total de 85.640,69 m³. Asimismo, se ha instalado una longitud de 943 metros lineales de colector correspondiente al interceptor.

Respecto a los rellenos, se han ejecutado rellenos en zanja por un volumen acumulado de 52.197,76 m³, además de la reparación de pisos y andenes en un área de 670,31 m².

Adicionalmente, dentro de las actividades correspondientes a ítems no previstos, se destacan las siguientes: la instalación de 1.957,49 metros lineales de sardineles, la construcción de 1.709,54 m² de piso en adoquín peatonal, y la ejecución de 7.072,9 m² de pavimento en concreto MR-41, lo que ha permitido la construcción de 910 metros lineales de vía. También se han instalado 1.313,3 m² de prado Remolina, contribuyendo al mejoramiento paisajístico y al embellecimiento del entorno de los senderos peatonales.

Igualmente, se realizó el suministro e instalación de 250,13 metros lineales de tubería PEAD estructurada de Ø1800 mm, así como la ejecución de 2.020 metros lineales de filtros laterales asociados al Box Culvert construido.

Adicionalmente, se dio inicio a las actividades de embellecimiento y endurecimiento de zonas verdes, en las cuales se tiene prevista la instalación de los juegos.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Imagen: Suministro e instalación de tubería PEAD estructurada Ø1800 mm	**Imagen:** Adecuación de los entornos peatonales

Imagen: Piso adoquín peatonal rectangular 20 x 20 x 6 cm en concreto color gris o amarillo sobre mortero 1:4 y malla gallinero.	**Imagen:** Pavimentación Concreto MR41

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL BARRIO LA FERIA, ASENTAMIENTO CAMILO TORRES Y CUYANITA ETAPA 1. UBICADOS EN LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	2024680010080	$ 43.840.721.399,25	$ 43.840.721.399,25

CONTRATO DE OBRA 226 de 2024 – MANUEL GUILLERMO CAMACHO CARVAJAL **“**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL BARRIO LA FERIA, ASENTAMIENTO CAMILO TORRES Y CUYANITA ETAPA 1. UBICADOS EN LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”.

Valor del contrato:	$ 27.395.301.404,00
Valor adicional No 1:	$ 13.682.605.825,00
Valor total:	$ 41.077.907.229,00
Plazo inicial:	Quince (15) meses
Plazo adicional No 1:	Siete (07) meses
Plazo total:	Veintidós (22) meses
Fecha de inicio:	17 de diciembre de 2024
Fecha de terminación:	16 de marzo de 2026
Nueva fecha de terminación:	16 de octubre de 2026
Porcentaje avance:	78.308%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en ejecución. Con avances significativos en varias de las actividades programadas. A continuación, se presenta el detalle de las actividades ejecutadas a la fecha:

Se realizó el suministro y colocación de anclajes conformados por tres (3) cables de Ø 5/8”, alcanzando una longitud total de 14.688 metros lineales, lo que corresponde al 100 % de la actividad. Este valor se distribuye de la siguiente manera: 9.180 metros lineales correspondientes a perforaciones horizontales para anclajes entre 0,00 y 20,00 m, y 5.508 metros lineales correspondientes a perforaciones horizontales para anclajes mayores a 20,00 m.

En cuanto a la perforación y construcción de drenes de penetración con tubería PVC, se ejecutaron 9.180 metros lineales para profundidades entre 0,00 y 20,00 m, y 6.165 metros lineales para profundidades mayores a 20,00 m.

Asimismo, se registró avance en el suministro y colocación de acero de refuerzo fy = 4.200 kg/cm², con un total ejecutado de 20.819,70 kg, equivalente al 28,81 % de la actividad. De igual manera, se ejecutó excavación manual para descolgado de talud y conformación de zapatas por un volumen de 56,38 m³, lo que representa un 56,45 % de avance.

Por otra parte, el suministro e instalación de tubería de alcantarillado NOVAFORT Ø 16” (400 mm), incluyendo excavación, presenta un avance de 98,21 metros lineales, equivalente al 64,35 %.

En relación con la ejecución de micropilotes fundidos en sitio de 25 cm de diámetro, incluyendo concreto de 4.000 psi, se han ejecutado 286 metros lineales, lo que corresponde al 9,03 % de avance. El encamisado para micropilotes registra el mismo avance correspondiente a las perforaciones realizadas. Finalmente, se ejecutó concreto de 4.000 psi por un volumen de 51,39 m³, equivalente al 47,76 % de la actividad.

REGISTRO FOTOGRAFICO

<table>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>Imagen: Construcción de micropilotes para cimentar muro de contención que conformara vía en la parte superior</td><td>Imagen: Retiro de material con volqueta</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>Imagen: Limpieza de Tramos de alcantarillado de tubería Novafort diámetro 16”</td><td>Imagen: Avance en construcción de dados de concreto para posterior tensionamiento</td></tr>
</table>

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN EL SECTOR CLUB GALLINERAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER	202500000004329	$ 1.789.079.800	$ 1.789.079.800

CONTRATO DE OBRA 99 de 2025 – CORPORACIÓN INGESEM IDEAS QUE CONTRUYEN FUTURO "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN EL SECTOR CLUB GALLINERAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER".

Valor del contrato: $ 1.513.937.250,00
Plazo inicial: Cuatro (04) meses
Plazo adicional No 1: Diecisiete (17) días
Fecha de inicio: 28 de julio de 2025
Fecha de terminación: 27 de noviembre de 2025
Nueva fecha de terminación: 14 de diciembre de 2025
Porcentaje avance: 100%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra terminado y en trámite de recibo final y liquidación.

REGISTRO FOTOGRAFICO

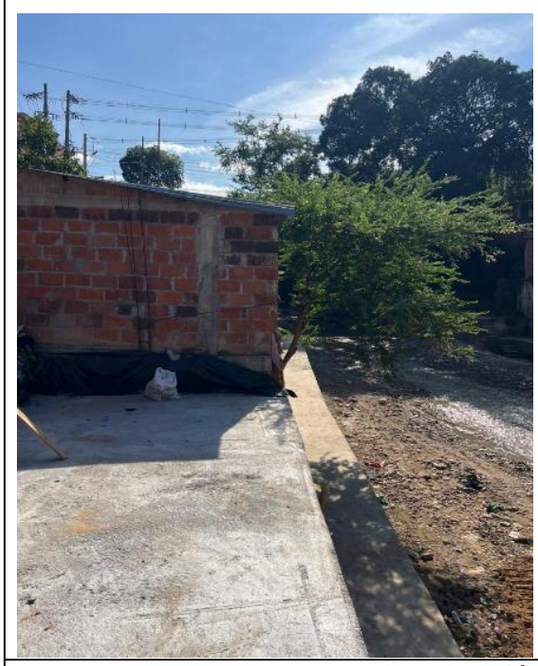

Imagen: Construcción de muro en gavión

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN EL BARRIO CRISTAL BAJO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	202500000007089	$ 5.774.128.850	$ 5.774.128.850

CONTRATO DE OBRA 98 de 2025 – CONSORCIO GAVIONES LEWIS ROJAS "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN EL BARRIO CRISTAL BAJO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER".

Valor del contrato:	$ 5.277.464.143,00
Plazo inicial:	Siete (07) meses
Pazo adicional:	Quince (15) días
Plazo total:	Siete (07) meses y quince (15) días
Fecha de inicio:	28 de julio de 2025
Fecha de terminación:	27 de febrero de 2026
Nueva fecha de terminación:	14 de marzo del 2026
Suspensión No 1:	11/03/2026
Porcentaje avance:	97 %

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra actualmente suspendido. A la fecha, se han desarrollado diversas actividades, entre las cuales se destaca la construcción de gaviones, los cuales permitirán canalizar y manejar las aguas, así como brindar protección y estabilidad a la margen intervenida.

El avance del proyecto se evidencia en la ejecución de las siguientes actividades: excavaciones varias en roca en seco, con un volumen de 1.425,06 m³, cuyo avance pasó del 98 % al 100 %; excavaciones en material granular a cualquier profundidad, con un volumen de 5.700,25 m³, que pasó del 98 % al 100 %; suministro y colocación de acero de refuerzo fy = 4200 MPa, con un total ejecutado de 1.547,75 kg, cuyo avance pasó del 28 % al 40 %; construcción de gaviones con malla de triple torsión C12, con un volumen de 2.243 m³, que pasó del 96 % al 99,60 %; y recubrimiento de gaviones en concreto de 3.000 psi (con espesor mínimo de 12,5 cm), con un volumen de 205,63 m³, cuyo avance es del 99 %.

La ejecución de estas actividades ha permitido avanzar en la mitigación mediante estructuras de gaviones a lo largo de la margen derecha de la quebrada La Cuéllar, en una longitud aproximada de 180 metros.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Imagen: Excavación de cuneta perimetral a la vía

Imagen: Disipador transversal con recubrimiento de concreto de 3000 psi

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN EL SECTOR DE JOSÉ ANTONIO GALÁN, CARLOS PIZARRO Y 5 DE ENERO ETAPA 1, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	202500000004438	$ 9.435.889.561,60	$ 9.435.889.561,60

CONTRATO DE OBRA 97 de 2025 – CONSORCIO ONIX "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN EL SECTOR DE JOSÉ ANTONIO GALÁN, CARLOS PIZARRO Y 5 DE ENERO ETAPA 1, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER".

Valor del contrato:	$ 8.885.552.392,00
Plazo inicial:	Seis (06) meses
Plazo adicional No 1:	Un (01) mes
Plazo adicional No 2:	Un (01) mes
Plazo Total:	Ocho (08) meses
Fecha de inicio:	28 de julio de 2025
Fecha de terminación:	27 de enero de 2026
Nueva fecha de terminación:	28 de marzo de 2026
Suspensión No 1:	26/03/2026
Porcentaje avance:	33%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra actualmente suspendido. No obstante, a la fecha de la suspensión se evidenció avance en actividades representativas, entre las cuales se destaca la construcción de gaviones, con un volumen ejecutado de 1.540,00 m³, equivalente al 22,99 % de esta actividad.

Se realizaron ajustes y nuevos diseños debido a la presencia de tuberías pertenecientes a las empresas de hidrocarburos Cénit y Promioriente, ubicadas en la margen derecha aguas abajo de la quebrada Chimitá. Dichos diseños fueron remitidos a las respectivas empresas para su revisión técnica, encontrándose actualmente pendiente la respuesta y aprobación por parte de estas entidades. Este proceso de revisión ha requerido un tiempo considerable, situación que debe ser tenida en cuenta por las partes para garantizar el adecuado desarrollo y continuidad del contrato.

Actualmente, se adelantan labores de revisión y aprobación por parte de las empresas involucradas y, una vez surtido este proceso, se procederá con la definición e implementación de las obras de mitigación más adecuadas para el sector de la margen derecha de la quebrada Chimitá.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Imagen: Continúa conformación de gaviones-sector 120 m aguas abajo de la desembocadura de la Quebrada Chimita margen derecha Río de Oro	**Imagen:** Conformación de gaviones-sector desembocadura de la Quebrada Chimita margen derecha Río de Oro
Imagen: Depósito de canastilla para elaboración de gaviones	**Imagen:** Conformación estructura de Jarillón

RESTAURACIÓN DEL COLISEO PERALTA INMUEBLE DECLARADO BIEN DE INTERESES CULTURAL DE ÁMBITO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.

Para la recuperación integral del Coliseo, fue necesario realizar gestiones para elaborar estudios técnicos y un proyecto de intervención como base para futuras obras. En 2023, el Ministerio de Cultura incluyó en su plan de acción recursos por el orden de quinientos millones de pesos ($500.000.000) para iniciar la recuperación del BICN. Como contrapartida, la Alcaldía de Bucaramanga aportó trescientos millones de pesos ($300.000.000) para cofinanciar la elaboración de los estudios técnicos y la interventoría de los mismos. El consultor ya hizo entrega de los productos de la consultoría, y se encuentra

actualmente realizando el trámite de licencia de construcción ante la curaduría urbana No 1. Por tanto, se ha tenido que prorrogar la suspensión No. 2 del 29 de mayo de 2024 hasta el 1 de junio de 2025, a la espera de la licencia de construcción, Este documento es un hitos de cumplimiento para la finalización de los contratos derivados del convenio 3985 de 2023. La consultoría una vez recibida la documentación legal y culminadas las observaciones del ministerio de Cultura, el ministerio de Cultura Emite Resolución de aprobación de la intervención del Coliseo peralta estando pendiente la aprobación por parte de licencia de construcción ante la Curaduría urbana No 1 trámite que se realizó según expediente VR25-4867 con fecha de ingreso de 16 de diciembre de 2025. A continuación, la información del convenio y contratos derivados:

Convenio Interadministrativo No. 3985-2023

Objeto	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la recuperación del Coliseo Peralta – Bien de Interés Cultural de ámbito Nacional – Decreto 292 del 24 de febrero de 1975, en el municipio de Bucaramanga, Santander
Fecha de suscripción	28 de junio de 2023
Valor total	$ 800.000.000
Aportes	
Ministerio de Cultura	$500.000.000
Total aporte Ministerio	$500.000.000
Municipio de Bucaramanga	$300.000.000
Total aporte Departamento	$300.000.000
Plazo de ejecución	
Fecha de inicio	19 de julio de 2023
Término de ejecución	Hasta el 31 de marzo del 2026
Supervisión	
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes	Arquitecta Lina María Rosales Suárez. Supervisora convenio.
Municipio de Bucaramanga Secretaría de Infraestructura	Edgar Yamitd Pinto Hernández. Supervisor convenio.
Contratos derivados del convenio:	

OBJETO	INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PROYECTO DE RESTAURACION DEL COLISEO PERALTA INMUBLE DECLARADO BIEN DE INTERES CULTURAL DEL AMBITO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
NÚMERO Y FECHA DEL CONTRATO	252-29/09/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$174.358.800,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$35.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 209.358.800,00
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES
PLAZO ADICIONAL DE EJECUCIÓN	DOS (2) MESES
PLAZO ADICIONAL DE EJECUCIÓN 2	UN (1) MES
PLAZO TOTAL DEL EJECUCIÓN	SEIS (6) MESES
CONTRATISTA	CONSULTORÍA ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCIÓN SAS
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS GABRIEL CAMACHO OBREGÓN
NIT	900160387
SUPERVISOR	EDGAR YAMITD PINTO HERNÁNDEZ
FECHA DE INICIO	23/10/2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	22/01/2024

FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	29/12/2023
FECHA DE AMPLIACIÓN No.1 DE LA SUSPENSIÓN No.1	24/01/2024
FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 DE LA SUSPENSIÓN No.1	18/02/2024
FECHA DE REINICIO	12/03/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	29/05/2024
FECHA DE AMPLIACIÓN No.1 DE LA SUSPENSIÓN No.2	28/08/2024
FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 DE LA SUSPENSIÓN No.2	28/11/2024
FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 DE LA SUSPENSIÓN No.3	23/12/2024
FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 DE LA SUSPENSIÓN No.4	27/02/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 DE LA SUSPENSIÓN No.5	28/04/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 DE LA SUSPENSIÓN No.6	28/06/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 DE LA SUSPENSIÓN No.7	28/08/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 DE LA SUSPENSIÓN No.8	28/09/2025
Suspensión No. 3	05/11/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN No.1 DE LA SUSPENSIÓN No.3	01/12/2025
FECHA DE REINICIO	09/12/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No 4	18/12/2025
FECHA DE TERMINACION	01/06/2026
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS – AC DE SUSPENSIÓN No. 3	20/11/2025
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
POLIZA	11-44-101209020 11-40-101055758
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP CONTRATO ORIGINAL	No 6208 del 2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL – RP CONTRATO ORIGINAL	No 12221 del 2023
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP RESERVA	Reserva No. 604 del 2024
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL – RP RESERVA	Reserva No. 394 del 2024
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP ADICIONAL	70634 de 2025
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – RP ADICIONAL	103591 de 20205
NUEVO CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL – CDP CONTRATO	00008181 de 2025
NUEVO CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL – RP CONTRATO	00011642 de 2025

1	**ESTUDIOS PRELIMINARES**	INT-PERALTA-097-2024	11/03/2024	APROBADO
2	**LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y TOPOGRÁFICO**			
2.1	ENTREGA DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	INT-PERALTA-085-2024	7/02/2024	APROBADO
2.2	LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO	INT-PERALTA-097-2024	11/03/2024	APROBADO
3	**ESTUDIO PATOLÓGICO Y DIAGNOSTICO DEL INMUEBLE**			
	Estudio patológico y diagnóstico del inmueble (Planos y fichas de calificación con fotografías y descripción de los deterioros de acuerdo al sistema constructivo) Incluir información de exploraciones constructivas y de cimentación según se requiera	INT-PERALTA-097-2024	11/03/2024	APROBADO
4	**ESTUDIOS TÉCNICOS**			
4.1	ESTUDIOS TÉCNICOS Y DIAGNÓSTICO DE HUMEDADES	INT-PERALTA-169-2024	5/06/2024	APROBADO
4.2	ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS DE SANIDAD DE MADERAS	INT-PERALTA-189-2024	6/08/2024	APROBADO
4.3	ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS DE REDES ELÉCTRICAS	INT-PERALTA-136-2024	25/04/2024	APROBADO
4.4	ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS DE REDES HIDROSANIATRIAS	INT-PERALTA-092-2024	29/02/2024	APROBADO
4.5	ESTUDIOS HVAC	INT-PERALTA-202-2024	27/09/2024	APROBADO
4.6	ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS GEOTÉCNICOS	INT-PERALTA-242-2024	22/10/2025	APROBADO
4.7	ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA Y EVALUACIÓN ESTRUCTURAL	INT-PERALTA-207-2024	22/10/2024	APROBADO
4.8	CALAS ESTRATIGRÁFICAS	INT-PERALTA-191-2024	20/08/2024	APROBADO
4.9	ARQUEOLOGÍA (PLAN PREVENTIVO DE INVERSIÓN)	INT-PERALTA-119-2024	12/04/2024	APROBADO
5	**PROYECTO DE INTERVENCIÓN**			
FASE I				
5.1.1	PROYECTO ARQUITECTÓNICO	INT-PERALTA-213-2024	7/11/2024	APROBADO CON OBS

5.1.2	PROYECTO ESTRUCTURAL	INT-PERALTA-216-2024	20/11/2024	APROBADO
5.1.3	PROYECTO ELÉCTRICO, VOZ, DATOS Y SONIDO	INT-PERALTA-212-2024	7/11/2024	APROBADO
5.1.4	PROYECTO INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DRENAJES Y RCI	INT-PERALTA-208-2024	22/10/2024	APROBADO
5.1.5	PROYECTO DE SEGURIDAD (ALARMAS, CAMARAS, EVACUACIÓN)	INT-PERALTA-212-2024	7/11/2024	APROBADO
	FASE II			
5.2.1	PROYECTO ARQUITECTÓNICO	INT-PERALTA-213-2024	7/11/2024	APROBADO
5.2.2	PROYECTO ESTRUCTURAL	INT-PERALTA-216-2024	20/11/2024	APROBADO
5.2.3	PROYECTO ELÉCTRICO, VOZ, DATOS Y SONIDO	INT-PERALTA-212-2024	7/11/2024	APROBADO
5.2.4	PROYECTO INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DRENAJES Y RCI	INT-PERALTA-208-2024	22/10/2024	APROBADO
5.2.5	PROYECTO DE SEGURIDAD (ALARMAS, CAMARAS, EVACUACIÓN)	INT-PERALTA-212-2024	7/11/2024	APROBADO
5.2.6	PROYECTO DE SEGURIDAD HUMANA	INT-PERALTA-240-2025	1/02/2025	APROBADO
5.2.7	COORDINACIÓN BIM	INT-PERALTA-300-2025	04/11/2025	APROBADO
6	**PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA**			
6.1	PRESUPUESTO, PROGRAMACIÓN, APUS, CANTIDADES, ESPECIFICACIONES	INT-PERALTA-299-2025	04/11/2025	APROBADO
6.2	RADICACIÓN DEL PROYECTO AL MINISTERIO DE CULTURA	CORREO ELECTRÓNICO	9/10/2025	APROBADO
	ACCESIBILIDAD			APROBADO

REGISTRO FOTOGRAFICO

Estado Fachada Actual

Estado Interior de la edificación.

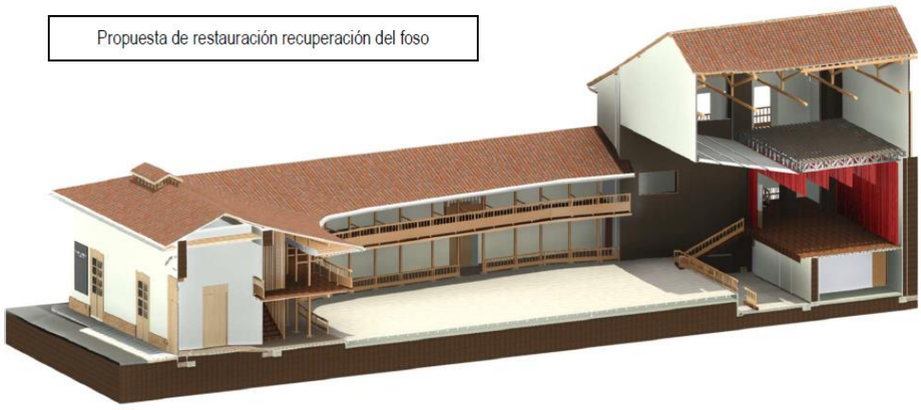

Remder Propuesta de Intervención del Peralta

5. RELACION PROCESOS EN CONTRATACION

OBJETO	VALOR	MODALIDAD	ESTADO DEL PROCESO
MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES, EQUIPAMIENTO Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER	$ 2.735.880.690,00	LICITACIÓN PÚBLICA	ADJUDICADO
INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS EQUIPAMIENTO Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER	$ 277.859.375,00	CONCURSO DE MERITOS ABIERTO	ADJUDICADO
CONSTRUCCIÓN DE LA CONEXIÓN VIAL CARRERA 24 CON ACCESO AL BARRIO DIAMANTE II DE LA ALCALDIA DE BUCARAMANGA, SANTANDER	$ 2.455.460.788,00	LICITACIÓN PÚBLICA	BORRADOR
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	$ 18.573.570.772,00	LICITACIÓN PÚBLICA	EVALUACION INICIAL
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	$ 10.835.829.108,00	LICITACIÓN PÚBLICA	BORRADOR
CONSTRUCCIÓN DE POZOS SEPTICOS PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTAL EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	$ 2.177.591.301,00	LICITACIÓN PÚBLICA	ELBORACION DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 3.566.768.556,00	LICITACIÓN PÚBLICA	ELBORACION DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES

ANEXO

- PRESUPUESTOS EJECUTADOS (Ejecución presupuestal)
- GASTO (Relación personal)
- GASTOS (Relación de Inversión)

ALCALDIA DE BUCARAMANGA
NIT: 890.201.222-0
INFORME DE EJECUCION CONSOLIDADA
A 31 DE MARZO DE 2026

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES							TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	% Ejecucion
		Presupuesto Inicial	Credito	Contracredito	Modificaciones Acumuladas	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	Obligaciones	Pagos Acumulados				
		$ 1,00			$ 2,00	3 = 1 + 2	$ 5,00	$ 7,00		$ 9,00	10 = 3 - 5	11 = 5 - 7	12 = 7 - 9	13 = 7 / 3
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INVERSION													
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA													
	LINEA 1. TERRITORIO SEGURO QUE INTEGRA													
	DEPORTE Y RECREACION													
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS													
	ADQUISICION DE SERVICIOS													
	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION													
	LINEA 2. TERRITORIO SEGURO QUE PROGRESA													
	MINAS Y ENERGA													
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS													
	ADQUISICION DE SERVICIOS													
	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION													
RUBRO	GASODUCTOS LOCALES													
2.3.2.02.02.005.2024680010210.2.2101016.53251.201	GASODUCTOS LOCALES 201	$ 91.082.517,00	$ -	$ -	$ -	$ 91.082.517,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 91.082.517,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2024680010210.2.2101016.53251.221	GASODUCTOS LOCALES 221	$ 38.917.483,00	$ -	$ -	$ -	$ 38.917.483,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 38.917.483,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2024680010210.2.2101016.53251.327	GASODUCTOS LOCALES 327	$ 20.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 20.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.000.000,00	$ -	$ -	0
	TRANSPORTE													
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS													
	ADQUISICION DE SERVICIOS													
	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION													
RUBRO	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS													
2.3.2.02.02.005.2025000035927.2.2401039.53221.201	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS 201	$ 4.244.795.083,00	$ -	$ 4.244.795.083,00	$ (4.244.795.083,00)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2025000036178.2.2401039.53221.201	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS 201	$ 3.990.743.822,00	$ -	$ 3.990.743.822,00	$ (3.990.743.822,00)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0
RUBRO	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES													
2.3.2.02.02.005.2025000035592.2.2402042.53211.289	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 289	$ 1.576.559.594,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.576.559.594,00	$ 1.182.419.637,00	$ 1.182.419.637,00	$ 1.182.419.637,00	$ 1.182.419.637,00	$ 394.139.957,00	$ -	$ -	74,99
2.3.2.02.02.005.2025000035592.2.2402042.53211.588	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 588	$ 1.057.403.475,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.057.403.475,00	$ 1.010.048.645,00	$ 1.010.048.645,00	$ 681.258.235,00	$ 681.258.235,00	$ 47.354.830,00	$ -	$ 328.790.410,00	95,52
RUBRO	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS													
2.3.2.02.02.005.2025000028779.2.2402083.53221.213	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS 213	$ 2.507.682.615,00	$ 421.203.511,00	$ -	$ 421.203.511,00	$ 2.928.886.126,00	$ 2.928.886.126,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.928.886.126,00	$ -	0
RUBRO	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES													
2.3.2.02.02.005.2024680010043.2.2402112.53211.201	CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 201	$ 2.000.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.000.000.000,00	$ 1.400.000.000,00	$ 1.400.000.000,00	$ -	$ -	$ 600.000.000,00	$ -	$ 1.400.000.000,00	70
RUBRO	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES													
2.3.2.02.02.005.2022680010100.2.2402113.53211.230	CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 230	$ 2.453.550.034,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.453.550.034,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.453.550.034,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2022680010100.2.2402113.53211.255	CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 255	$ 350.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 350.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 350.000.000,00	$ -	$ -	0
RUBRO	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES													
2.3.2.02.02.005.2025000027207.2.2402114.53211.213	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 213	$ -	$ 344.097.890,00	$ -	$ 344.097.890,00	$ 344.097.890,00	$ 344.097.890,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 344.097.890,00	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2025000027207.2.2402114.53211.251	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 251	$ 2.532.661.346,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.532.661.346,00	$ 2.111.362.898,00	$ -	$ -	$ -	$ 421.298.448,00	$ 2.111.362.898,00	$ -	0
RUBRO	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES													
2.3.2.02.02.005.2025000036174.2.2402115.53211.201	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 201	$ 9.999.999.996,00	$ 5.101.454.009,00	$ -	$ 5.101.454.009,00	$ 15.101.454.005,00	$ 13.479.663.062,83	$ -	$ -	$ -	$ 1.621.790.942,17	$ 13.479.663.062,83	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2025000036174.2.2402115.53211.213	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 213	$ 243.830.136,00	$ -	$ -	$ -	$ 243.830.136,00	$ 243.830.136,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 243.830.136,00	$ -	0

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES							TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	% Ejecucion
		Presupuesto Inicial	Credito	Contracredito	Modificaciones Acumuladas	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	Obligaciones	Pagos Acumulados				
		$ 1,00			$ 2,00	3 = 1 + 2	$ 5,00	$ 7,00		$ 9,00	10 = 3 - 5	11 = 5 - 7	12 = 7 - 9	13 = 7 / 3
2.3.2.02.02.005.2025000 00036174.2.2402115.532 11.248	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 248	$ 324.358.969,00	$ -	$ -	$ -	$ 324.358.969,00	$ 324.358.969,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 324.358.969,00	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2025000 00036174.2.2402115.532 11.251	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 251	$ 653.493.068,00	$ -	$ -	$ -	$ 653.493.068,00	$ 653.493.068,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 653.493.068,00	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2025000 00036174.2.2402115.532 11.318	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 318	$ 250.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 250.000.000,00	$ 250.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 250.000.000,00	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2025000 00036174.2.2402115.532 11.319	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 319	$ 2.000.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.000.000.000,00	$ 2.000.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.000.000.000,00	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2025000 00036174.2.2402115.532 11.501	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 501	$ 1.622.225.536,17	$ -	$ -	$ -	$ 1.622.225.536,17	$ 1.622.225.536,17	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.622.225.536,17	$ -	0
RUBRO	**PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS**													
2.3.2.02.02.005.2023680 010060.2.2402119.53221 .251	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS 251	$ 5.000.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 5.000.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.000.000.000,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS**													
2.3.2.02.02.005.2025000 00028779.2.2402120.532 21.201	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS 201	$ 935.882.277,00	$ -	$ -	$ -	$ 935.882.277,00	$ 585.585.403,00	$ -	$ -	$ -	$ 350.296.874,00	$ 585.585.403,00	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2025000 00028779.2.2402120.532 21.213	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 213	$ -	$ 52.297.027,00	$ -	$ 52.297.027,00	$ 52.297.027,00	$ 52.297.027,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 52.297.027,00	$ -	0
	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION													
RUBRO	**SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION**													
2.3.2.02.02.008.2025000 00035750.2.2402118.833 21.201	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 536.988.872,00	$ -	$ -	$ -	$ 536.988.872,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 536.988.872,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.008.2025000 00035927.2.2402118.833 21.201	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 140.459.886,00	$ -	$ -	$ -	$ 140.459.886,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 140.459.886,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.008.2025000 00036173.2.2402118.833 21.201	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 2.019.476.878,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.019.476.878,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.019.476.878,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.008.2025000 00036178.2.2402118.833 21.201	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ -	$ 120.344.831,00	$ -	$ 120.344.831,00	$ 120.344.831,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 120.344.831,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.008.2025000 00036180.2.2402118.833 21.201	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 1.908.253.371,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.908.253.371,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.908.253.371,00	$ -	$ -	0
	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO													
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS													
	ADQUISICION DE SERVICIOS													
	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION													
RUBRO	**SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA EXCEPTO A TRAVES DE LA RED A COMISION O POR CONTRATO**													
2.3.2.02.02.008.2024680 010053.1.4003048.86350 .201	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA, EXCEPTO A TRAVES DE LA RED (A COMISION O POR CONTRATO) 201	$ 150.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 150.000.000,00	$ 150.000.000,00	$ 150.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 150.000.000,00	100
	LINEA 3. TERRITORIO SEGURO Y SOSTENIBLE													
	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO													
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS													
	ADQUISICION DE SERVICIOS													
	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION													
RUBRO	**CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES**													
2.3.2.02.02.005.2024680 010050.2.4002020.53211 .588	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 588	$ 7.734.153.516,00	$ -	$ -	$ -	$ 7.734.153.516,00	$ 7.734.153.516,00	$ 7.734.153.516,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.734.153.516,00	100
2.3.2.02.02.005.2025000 00035591.2.4002020.532 11.289	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 289	$ 24.906.234.469,00	$ -	$ -	$ -	$ 24.906.234.469,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 24.906.234.469,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2025000 00035591.2.4002020.532 11.317	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 317	$ 4.000.000.000,00	$ -	$ 4.000.000.000,00	$ (4.000.000.000,00)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2025000 00035591.2.4002020.532 11.324	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 324	$ 6.000.000.000,00	$ -	$ 6.000.000.000,00	$ (6.000.000.000,00)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2025000 00035591.2.4002020.532 11.501	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 501	$ 1.576.608.504,00	$ -	$ 1.576.608.504,00	$ (1.576.608.504,00)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2026000 00009765.2.4002020.532 11.282	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES	$ -	$ 922.917.149,00	$ -	$ 922.917.149,00	$ 922.917.149,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 922.917.149,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2026000 00009765.2.4002020.532 11.317	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES	$ -	$ 4.000.000.000,00	$ -	$ 4.000.000.000,00	$ 4.000.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.000.000.000,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2026000 00009765.2.4002020.532 11.324	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES	$ -	$ 6.000.000.000,00	$ -	$ 6.000.000.000,00	$ 6.000.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.000.000.000,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2026000 00009765.2.4002020.532 11.501	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES	$ -	$ 1.576.608.504,00	$ -	$ 1.576.608.504,00	$ 1.576.608.504,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.576.608.504,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO**													

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES							TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS					
		Presupuesto Inicial	Credito	Contracredito	Modificaciones Acumuladas	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	Obligaciones	Pagos Acumulados	Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	% Ejecucion
		$ 1,00			$ 2,00	3 = 1 + 2	$ 5,00	$ 7,00		$ 9,00	10 = 3 - 5	11 = 5 - 7	12 = 7 - 9	13 = 7 / 3
2.3.2.02.02.005.2025000 00029578.2.4002020.532 70.588	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 588	$ 1.047.152.823,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.047.152.823,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.047.152.823,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE**													
2.3.2.02.02.005.2025000 00030966.2.4002021.859 70.501	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE 501	$ 10.976.815.977,00	$ -	$ 10.518.859.684,00	$ (10.518.859.684,00)	$ 457.956.293,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 457.956.293,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2025000 00035687.2.4002021.859 70.213	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE 213	$ 6.961.570.164,00	$ -	$ 1.381.042.158,00	$ (1.381.042.158,00)	$ 5.580.528.006,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.580.528.006,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2025000 00035687.2.4002021.859 70.251	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE 251	$ 538.300.693,00	$ -	$ -	$ -	$ 538.300.693,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 538.300.693,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE**													
2.3.2.02.02.005.2024680 010045.2.4002022.85970 .201	PARQUES MANTENIDOS 201	$ -	$ 3.013.740.065,00	$ -	$ 3.013.740.065,00	$ 3.013.740.065,00	$ 3.013.740.065,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.013.740.065,00	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2025000 00031111.2.4002022.859 70.213	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE 213	$ 11.977.484.557,00	$ 260.322.048,00	$ -	$ 260.322.048,00	$ 12.237.806.605,00	$ 10.835.829.108,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.401.977.497,00	$ 10.835.829.108,00	$ -	0
RUBRO	**ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AGUA EXCEPTO GASODUCTOS**													
2.3.2.02.02.005.2024680 010249.2.4003015.53231 .215	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AGUA EXCEPTO GASODUCTOS 215	$ 2.426.953.896,17	$ -	$ -	$ -	$ 2.426.953.896,17	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.426.953.896,17	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2024680 010249.2.4003015.53231 .268	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AGUA EXCEPTO GASODUCTOS 268	$ 30.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 30.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.000.000,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2024680 010249.2.4003015.53231 .501	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AGUA EXCEPTO GASODUCTOS 501	$ 9.726.432.633,83	$ -	$ 2.393.138.267,00	$ (2.393.138.267,00)	$ 7.333.294.366,83	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.333.294.366,83	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2025000 00035711.2.4003015.532 31.201	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AGUA EXCEPTO GASODUCTOS 201	$ 2.742.815.006,00	$ -	$ 2.609.008.028,00	$ (2.609.008.028,00)	$ 133.806.978,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 133.806.978,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2025000 00035711.2.4003015.532 31.267	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AGUA EXCEPTO GASODUCTOS 267	$ 600.000.000,00	$ -	$ 600.000.000,00	$ (600.000.000,00)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0
RUBRO	**OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL**													
2.3.2.02.02.005.2024680 010215.2.4003044.53290 .213	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL 213	$ -	$ 184.150.021,00	$ -	$ 184.150.021,00	$ 184.150.021,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 184.150.021,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2024680 010215.2.4003044.53290 .215	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL 215	$ 2.316.613.470,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.316.613.470,00	$ 2.177.591.301,00	$ -	$ -	$ -	$ 139.022.169,00	$ 2.177.591.301,00	$ -	0
	COMERCIO Y DISTRIBUCION ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA													
RUBRO	**COMERCIO AL POR MAYOR EXCEPTO EL REALIZADO A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION O POR CONTRATA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MANUALES**													
2.3.2.02.02.006.2026000 00010465.2.4002020.611 65.501	COMERCIO AL POR MAYOR EXCEPTO EL REALIZADO A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION O POR CONTRATA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MANUALES 501	$ -	$ 793.138.267,00	$ -	$ 793.138.267,00	$ 793.138.267,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 793.138.267,00	$ -	$ -	0
	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION													
RUBRO	**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE**													
2.3.2.02.02.008.2024680 010046.2.4002026.85970 .501	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE 501	$ 14.838.630.390,00	$ -	$ -	$ -	$ 14.838.630.390,00	$ 3.597.236.907,00	$ 3.597.236.907,00	$ -	$ -	$ 11.241.393.483,00	$ -	$ 3.597.236.907,00	24,24
	LINEA 4. TERRITORIO SEGURO QUE GENERA VALOR													
	GOBIERNO TERRITORIAL													
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS													
	ADQUISICION DE SERVICIOS													
	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION													
RUBRO	**OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES**													
2.3.2.02.02.005.2025000 00035596.2.4502003.531 29.251	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 251	$ 2.488.030.658,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.488.030.658,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.488.030.658,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES**													
2.3.2.02.02.005.2025000 00041555.2.4599011.531 29.213	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 213	$ -	$ 118.971.661,00	$ -	$ 118.971.661,00	$ 118.971.661,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 118.971.661,00	$ -	$ -	0
	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION													
RUBRO	**SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION**													

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES							TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	% Ejecucion
		Presupuesto Inicial	Credito	Contracredito	Modificaciones Acumuladas	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	Obligaciones	Pagos Acumulados				
		$ 1,00			$ 2,00	3 = 1 + 2	$ 5,00	$ 7,00		$ 9,00	10 = 3 - 5	11 = 5 - 7	12 = 7 - 9	13 = 7 / 3
2.3.2.02.02.008.2024680010084.2.4599006.83321.267	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 267	$ -	$ 126.095.762,00	$ -	$ 126.095.762,00	$ 126.095.762,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 126.095.762,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO**													
2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.82120.251	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 251	$ 1.200.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.200.000.000,00	$ 1.200.000.000,00	$ 1.198.800.000,00	$ 395.843.333,33	$ 244.543.333,33	$ -	$ 1.200.000,00	$ 802.956.666,67	99,9
RUBRO	**SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES**													
2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83213.201	SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 201	$ 800.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 800.000.000,00	$ 800.000.000,00	$ 770.100.000,00	$ 274.693.333,32	$ 140.109.999,99	$ -	$ 29.900.000,00	$ 495.406.666,68	96,26
RUBRO	**SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION**													
2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83321.201	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 3.400.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.400.000.000,00	$ 3.400.000.000,00	$ 3.367.500.000,00	$ 1.128.483.333,33	$ 663.516.666,66	$ -	$ 32.500.000,00	$ 2.239.016.666,67	99,04
RUBRO	**OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P**													
2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 3.900.000.000,00	$ 521.400.000,00	$ -	$ 521.400.000,00	$ 4.421.400.000,00	$ 4.421.400.000,00	$ 4.271.700.000,00	$ 1.599.563.333,31	$ 827.079.999,97	$ -	$ 149.700.000,00	$ 2.672.136.666,69	96,61
2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.501	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501	$ -	$ 598.596.023,00	$ -	$ 598.596.023,00	$ 598.596.023,00	$ 147.000.000,00	$ 147.000.000,00	$ 57.700.000,00	$ 16.800.000,00	$ 451.596.023,00	$ -	$ 89.300.000,00	24,55
RUBRO	**OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P**													
2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.85999.201	OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 201	$ 700.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 700.000.000,00	$ 700.000.000,00	$ 697.220.000,00	$ 240.256.222,21	$ 141.510.666,65	$ -	$ 2.780.000,00	$ 456.963.777,79	99,6
	FONDO PARA EL ESPACIO PUBLICO													
	LINEA 3. TERRITORIO SEGURO Y SOSTENIBLE													
	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO													
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS													
	ADQUISICION DE SERVICIOS													
	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION													
RUBRO	**CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES**													
2.3.2.02.02.005.2024680010076.2.4002020.53211.232	CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 232	$ 470.741.930,00	$ -	$ -	$ -	$ 470.741.930,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 470.741.930,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2025000000035591.2.4002020.53211.282	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 282	$ 922.917.149,00	$ -	$ 922.917.149,00	$ (922.917.149,00)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0
	FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRUBUCION DEL INGRESO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA													
	LINEA 2. TERRITORIO SEGURO QUE PROGRESA													
	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO													
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
	A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS													
	SUBVENCIONES PARA SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO													
RUBRO	**SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS**													
2.3.3.01.02.004.01.20250000035595.1.4003047.91123.215	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 3.066.183.099,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.066.183.099,00	$ 967.077.149,00	$ 967.077.149,00	$ 967.077.149,00	$ 967.077.149,00	$ 2.099.105.950,00	$ -	$ -	31,54
2.3.3.01.02.004.01.20250000035595.1.4003047.91123.331	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 16.031.457.032,00	$ -	$ -	$ -	$ 16.031.457.032,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16.031.457.032,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS**													
2.3.3.01.02.004.02.20250000035595.1.4003047.91123.215	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 277.955.424,88	$ -	$ -	$ -	$ 277.955.424,88	$ 225.452.553,00	$ 225.452.553,00	$ 225.452.553,00	$ 225.452.553,00	$ 52.502.871,88	$ -	$ -	81,11
2.3.3.01.02.004.02.20250000035595.1.4003047.91123.333	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 9.500.028.621,00	$ -	$ -	$ -	$ 9.500.028.621,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.500.028.621,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS**													
2.3.3.01.02.004.03.20250000035595.1.4003047.91123.215	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 4.501.842.643,90	$ -	$ -	$ -	$ 4.501.842.643,90	$ 804.079.227,00	$ 804.079.227,00	$ 804.079.227,00	$ 804.079.227,00	$ 3.697.763.416,90	$ -	$ -	17,86

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES							TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	% Ejecucion
		Presupuesto Inicial	Credito	Contracredito	Modificaciones Acumuladas	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	Obligaciones	Pagos Acumulados				
		$ 1,00			$ 2,00	3 = 1 + 2	$ 5,00	$ 7,00		$ 9,00	10 = 3 - 5	11 = 5 - 7	12 = 7 - 9	13 = 7 / 3
2.3.3.01.02.004.03.20250 0000035595.1.4003047.9 1123.260	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 30.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 30.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.000.000,00	$ -	$ -	0
2.3.3.01.02.004.03.20250 0000035595.1.4003047.9 1123.332	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 13.620.081.434,65	$ -	$ -	$ -	$ 13.620.081.434,65	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13.620.081.434,65	$ -	$ -	0
	MINIMO VITAL													
	SUBSIDIOS DE ASEO													
RUBRO	**SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS**													
2.3.3.01.04.004.03.20250 0000035595.1.4003047.9 1123.215	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 376.223.024,05	$ -	$ -	$ -	$ 376.223.024,05	$ 113.839.493,00	$ 113.839.493,00	$ 113.839.493,00	$ 113.839.493,00	$ 262.383.531,05	$ -	$ -	30,25
2.3.3.01.04.004.03.20250 0000035595.1.4003047.9 1123.332	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 2.216.585.291,35	$ -	$ -	$ -	$ 2.216.585.291,35	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.216.585.291,35	$ -	$ -	0
	ALUMBRADO PUBLICO													
	LINEA 5. TERRITORIO SEGURO QUE PROTEGE													
	MINAS Y ENERGIA													
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS													
	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS													
	MATERIALES Y SUMINISTROS													
	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO													
RUBRO	**PAPEL BOND**													
2.3.2.02.01.003.2024680 010192.2.2102069.32128 01.226	PAPEL PARA IMPRESORA O FOTOCOPIADORA 226	$ 40.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 40.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 40.000.000,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**DIESEL OIL ACPM FUEL GAS GASOIL MARINE GAS**													
2.3.2.02.01.003.2024680 010192.2.2102069.33361 03.226	DIESEL OIL ACPM FUEL GAS GASOIL MARINE GAS 226	$ 20.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00	$ 3.144.300,00	$ -	$ -	$ -	$ 16.855.700,00	$ 3.144.300,00	15,72
RUBRO	**CARTUCHOS PLASTICOS PARA IMPRESORA DE COMPUTADOR**													
2.3.2.02.01.003.2024680 010192.2.2102069.36990 60.226	CARTUCHOS PLASTICOS PARA IMPRESORA DE COMPUTADOR 226	$ 60.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 60.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 60.000.000,00	$ -	$ -	0
	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO													
RUBRO	**APARATOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE Y CALEFACCION.**													
2.3.2.02.01.004.2024680 010192.2.2102069.43912 01.226	APARATOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE Y CALEFACCION 226	$ 20.000.000,00	$ -	$ 20.000.000,00	$ (20.000.000,00)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0
RUBRO	**HERRAMIENTAS ELECTRICAS DE MANO EXCEPTO SOLDADORES**													
2.3.2.02.01.004.2024680 010192.2.2102069.44232 01.226	HERRAMIENTAS ELECTRICAS DE MANO EXCEPTO SOLDADORES 226	$ 50.000.000,00	$ -	$ 50.000.000,00	$ (50.000.000,00)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0
RUBRO	**ACCESORIOS ELECTRICOS N C P**													
2.3.2.02.01.004.2024680 010189.2.2102069.46939 99.226	ACCESORIOS ELECTRICOS N C P 226	$ 11.618.938.287,00	$ -	$ -	$ -	$ 11.618.938.287,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.618.938.287,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.01.004.2024680 010189.2.2102069.46939 99.253	ACCESORIOS ELECTRICOS N C P 253	$ 4.000.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 4.000.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.000.000.000,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.01.004.2024680 010189.2.2102069.46939 99.526	ACCESORIOS ELECTRICOS N C P 526	$ 4.120.663.768,00	$ -	$ 2.236.173.074,00	$ (2.236.173.074,00)	$ 1.884.490.694,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.884.490.694,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.01.004.2025000 00015897.2.2102069.469 3999.526	ACCESORIOS ELECTRICOS N C P 526	$ -	$ 2.236.173.074,00	$ -	$ 2.236.173.074,00	$ 2.236.173.074,00	$ 2.236.173.074,00	$ 2.236.173.074,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.236.173.074,00	100
	ADQUISICION DE SERVICIOS													
	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION													
RUBRO	**OTROS SERVICIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS**													
2.3.2.02.02.005.2025000 00013584.2.2102069.546 19.226	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 226	$ 12.093.520.514,00	$ -	$ -	$ -	$ 12.093.520.514,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.093.520.514,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2025000 00013584.2.2102069.546 19.526	OTROS SERVICIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS 526	$ 106.364.687,00	$ -	$ -	$ -	$ 106.364.687,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 106.364.687,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2025000 00036192.2.2102069.546 19.526	OTROS SERVICIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS 526	$ 22.665.192.063,00	$ -	$ -	$ -	$ 22.665.192.063,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.665.192.063,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2025000 00036197.2.2102069.546 19.526	OTROS SERVICIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS 526	$ 5.073.567.072,00	$ -	$ -	$ -	$ 5.073.567.072,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.073.567.072,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2025000 00036207.2.2102069.546 19.526	OTROS SERVICIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS 526	$ 12.481.807.434,00	$ -	$ -	$ -	$ 12.481.807.434,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.481.807.434,00	$ -	$ -	0

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES							TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	% Ejecucion
		Presupuesto Inicial	Credito	Contracredito	Modificaciones Acumuladas	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	Obligaciones	Pagos Acumulados				
		$ 1,00			$ 2,00	3 = 1 + 2	$ 5,00	$ 7,00		$ 9,00	10 = 3 - 5	11 = 5 - 7	12 = 7 - 9	13 = 7 / 3
	COMERCIO Y DISTRIBUCION ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA													
RUBRO	**SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD POR CUENTA PROPIA**													
2.3.2.02.02.006.2024680010192.2.2102069.69112.226	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD POR CUENTA PROPIA 226	$ 20.500.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 20.500.000.000,00	$ 3.746.575.998,00	$ 3.746.575.998,00	$ 3.746.575.998,00	$ 3.742.990.100,00	$ 16.753.424.002,00	$ -	$ -	18,27
	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING													
RUBRO	**SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES NO RESIDENCIALES DIFERENTES A VIVIENDA A COMISION O POR CONTRATO**													
2.3.2.02.02.007.2024680010192.2.2102069.72212.226	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES NO RESIDENCIALES DIFERENTES A VIVIENDA A COMISION O POR CONTRATO 226	$ 300.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 300.000.000,00	$ 300.000.000,00	$ 296.928.511,00	$ 30.592.634,47	$ 30.592.634,47	$ -	$ 3.071.489,00	$ 266.335.876,53	98,97
	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION													
RUBRO	**SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO**													
2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.82120.226	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 226	$ 650.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 650.000.000,00	$ 650.000.000,00	$ 467.000.000,00	$ 112.683.333,33	$ 64.183.333,33	$ -	$ 183.000.000,00	$ 354.316.666,67	71,84
RUBRO	**SERVICIOS DE CONSULTORA EN GESTIN ADMINISTRATIVA**													
2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.83115.226	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA 226	$ 90.000.000,00	$ -	$ 90.000.000,00	$ (90.000.000,00)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0
RUBRO	**SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES**													
2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.83213.226	SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 226	$ 250.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 250.000.000,00	$ 250.000.000,00	$ 60.000.000,00	$ 13.000.000,00	$ 7.000.000,00	$ -	$ 190.000.000,00	$ 47.000.000,00	24
RUBRO	**SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION**													
2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.83321.226	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 226	$ 300.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 300.000.000,00	$ 300.000.000,00	$ 150.000.000,00	$ 30.400.000,00	$ 15.400.000,00	$ -	$ 150.000.000,00	$ 119.600.000,00	50
RUBRO	**OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P**													
2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.83990.226	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	$ 2.400.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.400.000.000,00	$ 2.400.000.000,00	$ 1.857.400.000,00	$ 403.766.666,01	$ 217.766.666,01	$ -	$ 542.600.000,00	$ 1.453.633.333,99	77,39
RUBRO	**SERVICIOS DE TELEFONA FIJA (ACCESO)**													
2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.84120.226	SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA ACCESO 226	$ 200.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 200.000.000,00	$ 128.255.505,67	$ 128.255.505,67	$ 128.255.505,67	$ 128.255.505,67	$ 71.744.494,33	$ -	$ -	64,12
RUBRO	**SERVICIOS DE PROTECCION (GUARDAS DE SEGURIDAD)**													
2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.85250.226	SERVICIOS DE PROTECCION GUARDAS DE SEGURIDAD 226	$ 3.100.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.100.000.000,00	$ 3.092.643.344,55	$ 3.092.643.344,55	$ -	$ -	$ 7.356.655,45	$ -	$ 3.092.643.344,55	99,76
RUBRO	**SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL**													
2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.85330.226	SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL 226	$ 50.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 50.000.000,00	$ 50.000.000,00	$ 11.004.828,00	$ 3.501.716,94	$ 3.501.716,94	$ -	$ 38.995.172,00	$ 7.503.111,06	22
RUBRO	**SERVICIOS DE CENTROS DE LLAMADAS TELEFONICAS CALL CENTER**													
2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.85931.226	SERVICIOS DE CENTROS DE LLAMADAS TELEFONICAS CALL CENTER PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 226	$ 350.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 350.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 350.000.000,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE**													
2.3.2.02.02.008.2024680010189.2.2102069.85970.226	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE 226	$ 2.000.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.000.000.000,00	$ 258.781.050,00	$ 251.403.878,00	$ -	$ -	$ 1.741.218.950,00	$ 7.377.172,00	$ 251.403.878,00	12,57
RUBRO	**OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P**													
2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.85999.226	OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 226	$ 500.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 500.000.000,00	$ 500.000.000,00	$ 374.000.000,00	$ 86.489.999,99	$ 40.189.999,99	$ -	$ 126.000.000,00	$ 287.510.000,01	74,8
RUBRO	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES N C P**													
2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.8714199.226	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE VEHICULOS AUTOMOTORES N.C.P.226	$ 80.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 80.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 80.000.000,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE BATERIAS Y ACUMULADORES ELECTRICOS.**													
2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.8715204.226	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BATERIAS Y ACUMULADORES ELECTRICOS 226	$ 10.000.000,00	$ -	$ 10.000.000,00	$ (10.000.000,00)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0
RUBRO	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION.**													
2.3.2.02.02.008.2024680010189.2.2102069.8715205.226	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION 226	$ 16.200.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 16.200.000.000,00	$ 1.953.798.826,00	$ 1.953.798.826,00	$ -	$ -	$ 14.246.201.174,00	$ -	$ 1.953.798.826,00	12,06

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES							TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	% Ejecucion
		Presupuesto Inicial	Credito	Contracredito	Modificaciones Acumuladas	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	Obligaciones	Pagos Acumulados				
		$ 1,00			$ 2,00	3 = 1 + 2	$ 5,00	$ 7,00		$ 9,00	10 = 3 - 5	11 = 5 - 7	12 = 7 - 9	13 = 7 / 3
RUBRO	**SERVICIOS DE SOPORTE EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TI**													
2.3.2.02.02.008.2024680010205.2.2106033.83132.526	SERVICIOS DE SOPORTE EN TECNOLOGAS DE LA INFORMACION TI 526	$ 500.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 500.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 500.000.000,00	$ -	$ -	0
	SECTOR													
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS													
	ADQUISICION DE SERVICIOS													
	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION													
RUBRO	**INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO**													
2.3.2.02.02.005.2025000020181.2.4002020.53270.201	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 201	$ 391.948.179,00	$ -	$ -	$ -	$ 391.948.179,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 391.948.179,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES**													
2.3.2.02.02.005.2025000035597.2.4301011.53129.201	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 201	$ 822.718.839,00	$ -	$ -	$ -	$ 822.718.839,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 822.718.839,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2025000035597.2.4301011.53129.248	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 248	$ 675.641.031,00	$ -	$ -	$ -	$ 675.641.031,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 675.641.031,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS**													
2.3.2.02.02.005.2025000035593.2.2402044.53221.201	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS 201	$ 2.753.698.467,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.753.698.467,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.753.698.467,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2025000035593.2.2402044.53221.501	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS 501	$ 131.761.475,00	$ -	$ -	$ -	$ 131.761.475,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 131.761.475,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2025000035678.2.2402044.53221.251	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS 251	$ 2.587.514.235,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.587.514.235,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.587.514.235,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**OTROS SERVICIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS**													
2.3.2.02.02.005.2025000030966.2.4002021.54619.226	OTROS SERVICIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS 226	$ 3.000.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.000.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000.000.000,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2025000035687.2.4002021.54619.226	OTROS SERVICIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS 226	$ 2.500.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.500.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.500.000.000,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES**													
2.3.2.02.02.005.2025000035821.2.4502007.53129.588	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 588	$ 1.351.924.318,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.351.924.318,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.351.924.318,00	$ -	$ -	0
	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA													
RUBRO	**COMERCIO AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONESTRUCCION Y FERRETERIA, PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO 226**													
2.3.2.02.01.006.2024680010192.2.2102069.62560.226	COMERCIO AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATA 226	$ -	$ 170.000.000,00	$ -	$ 170.000.000,00	$ 170.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 170.000.000,00	$ -	$ -	0
TOTAL INFORME SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		**$ 352.595.437.734,00**	**$ 26.561.509.842,00**	**$ 40.643.285.769,00**	**$ (14.081.775.927,00)**	**$ 338.513.661.807,00**	**$ 84.361.895.515,22**	**$ 42.264.955.392,22**	**$ 12.225.931.703,91**	**$ 10.257.566.917,01**	**$ 254.151.766.291,78**	**$ 42.096.940.123,00**	**$ 30.039.023.688,31**	**$ 12,49**

RELACION GASTOS DE INVERSION A 31 DE MARZO DE 2026

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
229	9/01/2026 8:18	217	63486215	NUBIA CONSTANZA VALENCIA PINZON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 52.800.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 52.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA APOYAR LOS SISTEMAS FINANCIEROS Y DE INFORMACION ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
230	9/01/2026 8:19	195	37863152	ENELDA GOMEZ NIÑO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 52.800.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 52.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO ESPECIALIZADO PARA APOYAR EL AREA PRESUPUESTAL EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
231	9/01/2026 8:19	196	1098773016	ANDREA JULIANA SUAREZ LEAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 52.800.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 52.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
232	9/01/2026 8:20	215	1193235341	ANA MARIA LIZARAZO BECERRA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 40.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.82120.251 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 251	$ 40.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURIDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACION PUBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
233	9/01/2026 8:21	190	1098773241	FABIAN ANDRES ARDILA PABON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.82120.251 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 251	$ 48.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
234	9/01/2026 8:22	221	1098821923	IVAN ENRIQUE CASTELLANOS JAIMES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 35.200.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 35.200.000,00	PRESTAR SERVICIOS COMO TECNOLOGO PARA BRINDAR APOYO ALA GESTION EN EL AREA DE CONTRATACION DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
235	9/01/2026 8:22	204	1005564365	KAREN JULIETH TOLOZA LAMUS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 32.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.85999.201 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 201	$ 32.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER EN EL AREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
236	9/01/2026 8:23	183	1095843401	MARIA LUCIA DURAN AGUIRRE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.82120.251 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 251	$ 48.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
237	9/01/2026 8:23	203	1098711800	FABIO ANDRES BUENO ARAQUE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 48.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
238	9/01/2026 8:24	184	1094948041	MAYCOL ESTIVEN MORALES ARIAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 61.600.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 61.600.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PETROLEOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
406	10/01/2026 11:46	283	1098703713	EXNEYQUER VILLAMIZAR BARAJAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 44.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83213.201 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 201	$ 44.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL AREA DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
407	10/01/2026 11:47	236	1098755560	YEISSON LEANDRO POTES REYES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 52.800.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.82120.251 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 251	$ 52.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
408	10/01/2026 11:48	238	63339406	MARIA PATRICIA MONSALVE MONSALVE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 35.200.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.85999.201 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 201	$ 35.200.000,00	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER EL AREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
409	10/01/2026 11:48	271	1005565577	ZARETH YULENY MOTTA PABON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 44.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 44.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
410	10/01/2026 11:49	270	37549301	JUDITH BUENO LIZARAZO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 56.800.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.82120.251 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 251	$ 56.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN TODAS SUS ETAPAS, PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
411	10/01/2026 11:49	277	1095833106	JOSE TOMAS ZULUAGA FLOREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 48.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL AREA DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL CUMPLIMIENTI DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
412	10/01/2026 11:50	284	91265526	RAFAEL ROJAS PEÑA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 48.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
413	10/01/2026 11:50	264	13744164	JHON JAIRO BARAJAS LIZCANO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 35.200.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 35.200.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CALIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
415	10/01/2026 11:52	266	13510590	ISMAEL ENRIQUE LOPEZ LIZARAZO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 52.800.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.82120.251 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 251	$ 52.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURIDICAS PARA LOS PROYECTOS Y CONVENIOS PARTICIPATIVOS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
416	10/01/2026 11:52	274	1098814504	VALENTINA URIBE PAEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 48.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
417	10/01/2026 11:53	247	1098728508	CATHERIN ROCIO DE ALBA MENDEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 61.600.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 61.600.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTION DOCUMENTAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
418	10/01/2026 11:55	262	1005163503	PAULA ALEJANDRA CELIS VEGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 28.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.85999.201 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 201	$ 28.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
452	10/01/2026 13:51	281	1098719331	JHON FREDDY RAMIREZ JAIMES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 48.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
453	10/01/2026 13:52	297	1095828668	ERWING LEONARDO ARIAS CANO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 61.600.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 61.600.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
454	10/01/2026 13:53	287	1095801656	ERIKA LILIANA VARGAS ROA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 48.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA APOYAR EL DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
455	10/01/2026 13:53	293	91278364	OSCAR ELIECER MARTINEZ ARGUELLO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 48.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
456	10/01/2026 13:53	302	1095841758	JUAN SEBASTIAN ARIAS CANO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 48.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
457	10/01/2026 13:54	272	1098766174	DANIEL EDUARDO JAIMES RUIZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 52.800.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 52.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
458	10/01/2026 13:54	244	1005155868	DIEGO RAUL VILLAVECES SUAREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 76.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 76.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PETROLEOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
459	10/01/2026 13:55	249	1099940164	VIVIANA MARCELA CUADROS VALBUENA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.82120.251 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 251	$ 48.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
460	10/01/2026 13:55	251	1014254089	VANESSA CABANZO ARDILA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 48.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR PUBLICO PARA ELFORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
461	10/01/2026 13:56	290	63513685	ROSALBA GONZALEZ CORZO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 24.800.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.85999.201 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 201	$ 24.800.000,00	PRESTAR SERVICOS DE APOYO A LA GESTION COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
462	10/01/2026 13:57	252	63557509	JOHANA ANDREA ORTIZ OLAGO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.82120.251 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 251	$ 48.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
463	10/01/2026 13:57	241	1093798962	KAREN MARCELA GUTIERREZ BARRAGAN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 40.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 40.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER EL AREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
475	13/01/2026 9:21	336	1098809098	LINA MARCELA ROMERO GUARGUATI	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 40.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 40.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
476	13/01/2026 9:21	349	1098616380	CLAUDIA AZUCENA RODRIGUEZ CAMACHO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 61.600.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.82120.251 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 251	$ 61.600.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REPARTO SEGUIMIENTO Y RESPUESTA OPORTUNA DE LAS PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
477	13/01/2026 9:23	408	63483023	LILIANA VALBUENA RINCON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 24.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.85999.201 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 201	$ 24.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTALES Y DE GESTION QUE SE EJECUTEN EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
478	13/01/2026 9:23	344	1098662774	ANDRES FELIPE DUEÑAS SANCHEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 48.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA APOYAR EL AREA DE BANCO DE PROYECTOS EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
479	13/01/2026 9:23	401	13540886	RAUL ENRIQUE MERLO ARGUELLO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 35.200.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 35.200.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
480	13/01/2026 9:24	347	1096239826	ANGIE LIZETH ARIAS NIETO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 35.200.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 35.200.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
481	13/01/2026 9:24	357	1098767800	LUIS CARLOS BARRERA ANGEL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 44.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 44.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
482	13/01/2026 9:24	358	1102375427	MARIA ALEJANDRA GALAN BARAJAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83213.201 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 201	$ 48.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR LOS PROCESOS DE GESTION DE CALIDAD EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
483	13/01/2026 9:24	345	1005372870	YINETH MELISSA ARIAS BUITRAGO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 24.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.85999.201 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 201	$ 24.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER EL AREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
484	13/01/2026 9:25	354	1098615471	ADRIANA DEL ROSARIO CUENTAS MORENO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 61.600.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.82120.251 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 251	$ 61.600.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS TEMAS DE DEFENSA JUDICIAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
485	13/01/2026 9:25	346	63461587	CLAUDIA INES PACHECO MEZA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 44.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 44.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO Y RESPUESTA OPORTUNA DE LAS PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
486	13/01/2026 9:25	342	1007402713	DAYANA CRISTINA ARENAS BAYONA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 48.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
487	13/01/2026 9:26	343	1098726540	CLAUDIA MILENA SANCHEZ QUIROGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.82120.251 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 251	$ 48.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACION PUBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
488	13/01/2026 9:30	323	1031132756	XIOMARA YULIANI BERNAL CARDENAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 48.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA APOYAR EL DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
489	13/01/2026 9:30	332	51845676	SONIA RODRIGUEZ PEDROZA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 24.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.85999.201 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 201	$ 24.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER EL AREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
490	13/01/2026 9:30	359	1095942578	ANGIE DANIELA FIGUEROA TORRES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 35.200.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 35.200.000,00	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
491	13/01/2026 9:31	390	1098788845	MARIA FERNANDA SUAREZ ESTEBAN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 48.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
492	13/01/2026 9:31	366	63318086	JUDITH ORTIZ CELIS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 48.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA
493	13/01/2026 9:34	362	1098769464	EDSON ALBERTO ACEVEDO BAUTISTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 48.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
494	13/01/2026 9:35	364	63550793	DIANA CAROLINA CARRILLO RIVEROS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 61.600.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83213.201 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 201	$ 61.600.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO ESPECIALIZADO PARA APOYAR LA PLANEACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE GESTION DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
495	13/01/2026 9:35	351	1098764487	IVONNE VANESSA LANDAZABAL VALBUENA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 44.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 44.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
496	13/01/2026 9:36	355	37830644	MARIA ELENA GUTIERREZ DUARTE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 52.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.82120.251 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 251	$ 52.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURIDICAS RELACIONDAS CON LOS TEMAS DE DEFENSA JUDICIAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
537	13/01/2026 13:24	376	1095910863	LINA ANDREA MOSQUERA VARGAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 48.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLO Y EJECUCION DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
538	13/01/2026 13:24	356	1098642406	MARIA DEL PILAR HOYOS MONT	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 48.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA VERIFICACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD (HSEQ) EN DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
539	13/01/2026 13:25	378	88208576	JUAN CARLOS BAUTISTA LOBO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 44.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 44.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
540	13/01/2026 13:25	370	1098700548	JUAN FELIPE RODRIGUEZ ARAMBULA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 52.800.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 52.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
541	13/01/2026 13:26	372	1098742245	JOSE ANTONIO FLOREZ POVEDA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 48.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
542	13/01/2026 13:26	404	63366747	MABEL LUCIA HERRERA AMOROCHO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 48.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
543	13/01/2026 13:27	383	1098649127	JENNY PAOLA RODRIGUEZ PEREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 52.800.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 52.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS ESPECIALIZADO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTUALES EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS
544	13/01/2026 13:27	400	91256968	BONIFACIO FLOREZ ANTELIZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 48.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
545	13/01/2026 13:28	326	1098726661	MARIA PAULA APARICIO GARZON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 52.800.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 52.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
546	13/01/2026 13:34	367	37685339	MARQUEZA GONZALEZ SERENO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.400.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 48.400.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA EL FORTALECIMIENTI DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
601	14/01/2026 9:36	502	1007726234	JENITH KATHERINE DUARTE GALVIS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 35.200.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 35.200.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
602	14/01/2026 9:36	499	1007715085	BRAYAN JESID OVIEDO CASTILLO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 36.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 36.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
603	14/01/2026 9:36	501	1098690894	ANDRES FERNANDO MARTINEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 52.800.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83213.201 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 201	$ 52.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO ESPECIALIZADO PARA APOYAR LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
747	15/01/2026 12:00	516	1092354965	MANUEL JOSE BRICEÑO VERA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 32.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.85999.201 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 201	$ 32.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL AREA DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
748	15/01/2026 12:01	518	91274635	JAIME LUIS PARRA VERGARA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 48.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESINALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA APOYAR EL AREA DE BANHCO DE PROYECTOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
749	15/01/2026 12:03	525	30209795	MABEL NAYIBE RUEDA DELGADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 40.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 40.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER EL AREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
750	15/01/2026 12:03	530	37747602	PAOLA ALEJANDRA GARCIA GALAN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 48.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
751	15/01/2026 12:03	552	1098741571	LIZETH ANDREA RENGIFO CASTRO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 48.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
752	15/01/2026 12:04	566	91508951	FERNANDO MIER MARTINEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 48.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
753	15/01/2026 12:04	582	91512507	CRISTIAN CAMILO GARCIA TRUJILLO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 44.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 44.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PROMOCION Y DIVULGACION EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION TRADICIONALES Y DIGITALES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
754	15/01/2026 12:05	583	91242153	RAUL CARRILLO ZARATE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 48.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA PLANEACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE GESTION DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
755	15/01/2026 12:05	592	63350037	LAURA REGINA LOPEZ PRIETO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 56.800.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 56.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
756	15/01/2026 12:05	608	63515462	GRACIELA RODRIGUEZ PEDROZA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 24.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.85999.201 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 201	$ 24.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER EL AREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
757	15/01/2026 12:23	699	1085097827	LADYS CONSUELO TORRES TORRES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 52.800.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 52.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACION PUBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
758	15/01/2026 12:24	697	79127641	HECTOR ALFONSO RODRIGUEZ GARNICA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.400.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 48.400.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
759	15/01/2026 12:25	696	79710194	CARLOS ALBERTO CARDENAS LOPEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 48.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y LA LIQUIDACION DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS QUE EJECUTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
760	15/01/2026 12:26	705	63505805	LAURA PAOLA AMOROCHO MONTAGUT	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 48.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO FINANCIERO PARA APOYAR EL SGUIMIENTO CONTRACTUAL Y LA LIQUIDACION DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS QUE EJECUTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
761	15/01/2026 12:27	710	1094808518	JOSE DAVID VERA GAMBOA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 48.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
762	15/01/2026 12:27	691	37860468	MARIA FERNANDA SANDOVAL LOPEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 52.400.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.82120.251 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 251	$ 52.400.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACION PUBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
763	15/01/2026 12:27	704	1101687332	WILLIAM JOSE CALA VALBUENA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 40.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 40.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y LA LIQUIDACION DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS QUE EJECUTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE
764	15/01/2026 12:28	648	1098731681	DIEGO FERNANDO RAMIREZ SARMIENTO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 48.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
765	15/01/2026 12:28	707	1090448928	SEIDY JULIETH GARCIA ROZO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 52.800.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 52.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
766	15/01/2026 12:28	656	63540189	LEYDY ANDREA MANTILLA CARDONA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 61.600.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 61.600.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS ESPECIALIZADO PRA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESO DE CALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
772	15/01/2026 13:28	612	13721222	BERNARDO ALVAREZ QUINTERO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 48.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
773	15/01/2026 13:29	671	1098621930	MONICA CONSUELO SUAREZ HERREÑO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 44.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.82120.251 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 251	$ 44.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES JURIDICAS DENTRO DE LOS PROCESOS Y CONVENIOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
774	15/01/2026 13:29	644	37550043	MARLY YOLIMA ARDILA MANTILLA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 48.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA APOBAR EL AREA DE BANCO DE PROYECTOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
775	15/01/2026 13:29	680	1095826586	JULIAN ANDRES BOHORQUEZ CASTELLANOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 28.160.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.85999.201 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 201	$ 28.160.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL AREA DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
776	15/01/2026 13:30	655	91541593	EFRAIN ANDRES SERRANO PLATA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 52.400.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 52.400.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
777	15/01/2026 13:30	685	91298539	RAFAEL ANTONIO CHACON RIOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 52.800.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83213.201 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 201	$ 52.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
907	16/01/2026 10:08	832	1098602362	VICTOR ELIAS MENESES AGRESOTH	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 48.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL AREA DE EQUIPAMENTO URBANO EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
908	16/01/2026 10:08	838	1010246988	CARLOS MAURICIO AREVALO CHINCHILLA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 48.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
909	16/01/2026 10:09	825	63348331	LILIANA CARVAJAL SALAMANCA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 56.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 56.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
910	16/01/2026 10:10	806	1098798882	VANESSA ASHLIE BRIGGITH PLATA VARGAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 40.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 40.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
911	16/01/2026 10:10	827	1098761054	JULIETH ANDREA LEIVA NEIRA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 35.200.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 35.200.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNOLOGO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
912	16/01/2026 10:10	794	1095911046	JAVIER ALEXANDER DURAN VERA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 52.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 52.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL AREA DE BANCO DE PROYECTOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
913	16/01/2026 10:11	791	1098672189	EDWIN YANDER VALDERRAMA PICO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 70.400.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.82120.251 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 251	$ 70.400.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALISTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
914	16/01/2026 10:11	821	1098729140	JUAN DIEGO NORIEGA CACERES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 48.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
915	16/01/2026 10:12	802	13743467	GIOVANI GUALTEROS AGUILLON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 44.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 44.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRETEGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
916	16/01/2026 10:12	824	1098630399	JUAN CARLOS PLATA NAVARRO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 24.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.85999.201 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 201	$ 24.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
917	16/01/2026 10:13	779	1102374007	JOSE ALEJANDRO SANDOVAL MEDINA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 48.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
918	16/01/2026 10:13	826	74379477	JAVIER MAURICIO PARRA RODRIGUEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 48.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
919	16/01/2026 10:14	815	1098772574	RAFAEL ANDRES HINESTROZA MARTINEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 52.800.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 52.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESINALES COMO INGENIERO CIVIL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACION PUBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
927	16/01/2026 11:07	745	1005684787	ROXANA CAROLINA ALVAREZ SALCEDO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 32.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 32.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENERIO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
928	16/01/2026 11:07	740	1098745579	JHON ANDERSON RAMIREZ CORREA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 48.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
929	16/01/2026 11:08	717	1096206095	CHARO LIZET MANTILLA JARAMILLO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 48.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
930	16/01/2026 11:08	798	91106800	WALTER YEZID MARTINEZ VEGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 61.600.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83213.201 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 201	$ 61.600.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
931	16/01/2026 11:09	837	1098682097	DIEGO FERNANDO BETANCURT PINZON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 48.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE CONTRATACION EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
932	16/01/2026 11:09	803	91212669	OMAR BALLESTEROS BUENO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 40.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 40.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNOLOGO EN TOPOGRAFIA PARA APOYAR LA PLANEACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
933	16/01/2026 11:09	820	5685121	ARNULFO OROZCO TORRES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 44.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 44.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
934	16/01/2026 11:10	849	91235541	EDUARDO TORRES QUINTANA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 40.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 40.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNOLOGO EN TOPOGRAFIA PARA APOYAR LA PLANEACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
935	16/01/2026 11:13	753	91251913	MIGUEL ANTONIO HERRERA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 24.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.85999.201 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 201	$ 24.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
1069	17/01/2026 9:52	891	1098723320	MARIA ALEJANDRA CRUZ GONZALEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 48.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
1070	17/01/2026 9:53	943	13717147	NELSON ALBA CONTRERAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 35.200.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 35.200.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNOLOGO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
1071	17/01/2026 9:54	899	1000469358	ANGIE NATALIA GIL MARTINEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 40.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 40.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN LA SECRETARIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
1072	17/01/2026 9:54	898	13874585	JOHN JEFFERSON MORENO RODRIGUEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 35.200.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.85999.201 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 201	$ 35.200.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR APOYO AL SEGUIMIENTO Y RESPUESTA OPORTUNA DE LAS PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMO EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
1073	17/01/2026 9:55	918	1098755013	JERSON JAVIER SERRANO ARANA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 52.800.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 52.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE CONTRATACION EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
1074	17/01/2026 9:56	924	1100962680	KAREN JULIETH GUALDRON CHAPARRO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 48.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA PLANEACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE GESTION DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
1075	17/01/2026 9:57	927	1005260112	JUAN FELIPE BELTRAN NIÑO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 40.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 40.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
1076	17/01/2026 9:57	928	1098722762	OSCAR MAURICIO COTE VALDERRAMA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83213.201 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 201	$ 48.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
1077	17/01/2026 9:58	942	1098667477	GIOVANNY HUMBERTO DURAN ROMERO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 66.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.82120.251 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 251	$ 66.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACION PUBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
1078	17/01/2026 9:59	945	1095831058	JUAN DAVID GOMEZ HERNANDEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 44.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 44.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL PARA LA PUBLICACION, INTERACCION Y PROMOCION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
1079	17/01/2026 10:00	922	1098662562	SILVIA ALEJANDRA PINTO BOHORQUEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 48.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
1080	17/01/2026 10:01	950	63499554	MONICA JOHANNA IGLESIAS ACEVEDO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 52.800.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 52.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
1164	19/01/2026 9:07	1005	91521591	ALVARO JULIAN PRADA CAMACHO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 36.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.82120.251 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 251	$ 36.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURIDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE DEFENSA JUDICIAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
1165	19/01/2026 9:08	1023	1098707994	LADY DIANE MORANTES JAIME	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 48.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
1166	19/01/2026 9:08	1001	1100951529	MARTHA LILIANA CAMACHO ALVAREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 48.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
1167	19/01/2026 9:09	990	1096228039	JHOSIAS MONTESINOS BALLESTEROS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 40.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 40.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
1168	19/01/2026 9:09	1019	1098785392	GIANN KARLO MEJIA NIÑO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 40.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 40.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO TOPOGRAFO PARA APOYAR LA PLANEACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
1169	19/01/2026 9:09	1032	79643218	EDWIN EDUARDO PERILLA SERRANO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 61.600.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 61.600.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
1170	19/01/2026 9:10	1008	13862036	LUIS FERNANDO QUIÑONES FLOREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 61.600.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 61.600.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
1171	19/01/2026 9:11	1000	1102355951	EMILIANO LARROTA CONDE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 24.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.85999.201 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 201	$ 24.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ZONAS RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA
1172	19/01/2026 9:11	986	1098737645	EDGAR GEOVANNY PEREZ MARTINEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 30.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.82120.251 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 251	$ 30.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURIDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE DEFENSA JUDICIAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
1185	19/01/2026 11:00	1045	91356086	GERMAN YESID PEÑA RUEDA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 90.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.82120.226 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 226	$ 90.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LOS DIFERENTES PROCESOS JURIDICOS DEL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
1186	19/01/2026 11:01	1046	63487585	NELVYS GUTIERREZ PINZON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 60.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	$ 60.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS BRINDANDO APOYO EN EL MANEJO Y REGISTRO DE INFORMACION EN LOS SISTEMAS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO
1305	20/01/2026 10:31	1140	1098661124	LUIS CARLOS MONSALVE PULGARIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 52.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83213.201 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 201	$ 52.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
1306	20/01/2026 10:32	1129	1098721130	DAYANA MARCELA VILLAMIZAR GONZALEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 30.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 30.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
1307	20/01/2026 10:32	1121	37750599	YAIR GRICELDA LIZARAZO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 26.400.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.85999.201 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 201	$ 26.400.000,00	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER EL AREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
1308	20/01/2026 10:34	1079	91269849	ABELARDO GOMEZ ESPARZA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 52.800.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 52.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
1309	20/01/2026 10:35	1056	1098669846	ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 40.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 40.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
1310	20/01/2026 10:35	1077	1098741177	WENDY JULIETH SERRANO MORENO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 30.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.82120.251 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 251	$ 30.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACION PUBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
1311	20/01/2026 10:36	1074	1098741881	YULI KATHERINE ALFONSO BECERRA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 30.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.82120.251 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 251	$ 30.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURIDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE DEFENSA JUDICIAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
1312	20/01/2026 10:36	1071	1098613163	JOSE LUIS RODRIGUEZ CALA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 36.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.85999.201 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 201	$ 36.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y CONVENIOS SOLIDARIOS QUE SE EJECUTAN EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
1313	20/01/2026 10:36	1069	91343327	CARLOS VICENTE PEDRAZA AGUDELO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 24.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.85999.201 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 201	$ 24.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO, MANTENIIENTO Y CONSERVACION DE ZONAS RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA
1314	20/01/2026 10:37	1068	91260789	JAIRO ESPINOSA MORENO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.85999.201 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 201	$ 18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ZONAS RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA
1315	20/01/2026 10:37	1067	5605285	FEDERICO ARIAS GARCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 52.800.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 52.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA APOYAR LA PLANEACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE GESTION DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
1316	20/01/2026 10:37	1064	1098651339	JUAN LEONARDO PEÑARANDA MANOSALVA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.82120.251 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 251	$ 48.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES JURIDICAS EN LOS PROYECTOS Y PROCESOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
1332	20/01/2026 13:07	1052	1100949954	YENNY TATIANA JIMENEZ DELGADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 60.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.82120.226 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 226	$ 60.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN DENTRO DE SUS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
1333	20/01/2026 13:08	1060	37901009	LILIANA GUTIERREZ GOMEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 60.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.82120.226 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 226	$ 60.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN DENTRO DE SUS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
1334	20/01/2026 13:09	1054	37901757	CLAUDIA JIMENA RIOS LOZANO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 65.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.82120.226 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 226	$ 65.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
1335	20/01/2026 13:13	1061	63333265	CARMEN ELISA LEON PATIÑO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 55.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.82120.226 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 226	$ 55.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR JURIDICAMENTE LA GESTION DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES (PQR) Y EL SERVICIO AL CIUDADANO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO
1336	20/01/2026 13:14	1106	1098813065	ANGIE PAOLA GOMEZ SEPULVEDA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 45.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	$ 45.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADESENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DEL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
1337	20/01/2026 13:14	1053	1098725811	ELVER DANILO FUQUENE RINCON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 65.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.82120.226 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 226	$ 65.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN DENTRO DE SUS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO
1338	20/01/2026 13:15	1110	1098784128	DANIEL ALEXANDER LOPEZ MALDONADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 45.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.85999.226 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 226	$ 45.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ELECTRICISTA DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
1339	20/01/2026 13:15	1103	91480154	JUAN CARLOS GELVEZ ROJAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 75.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	$ 75.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
1340	20/01/2026 13:16	1113	1098778906	SILVIA ALEJANDRA JAIMES RUIZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 35.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.85999.226 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 226	$ 35.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTALES Y DE GESTIÓN EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
1341	20/01/2026 13:16	1105	13742344	DAVID CAMILO FLOREZ CORDOBA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 70.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	$ 70.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
1363	20/01/2026 14:40	1101	1030659325	SHERYL NICKOLL ALVAREZ ROJAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 35.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.85999.226 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 226	$ 35.000.000,00	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTALES Y DE GESTIÓN QUE SE EJECUTAN EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
1416	21/01/2026 8:38	1198	1098800422	RONALD SMITH MORENO LUGO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 30.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 30.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTROMECANICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIADE INFRAESTRUCTURA
1418	21/01/2026 8:39	1219	1070305488	CAMILO ANDRES MONTES CUBILLOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 33.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 33.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL PARA LA PUBLICACION, INTERACCION Y PROMOCION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
1419	21/01/2026 8:40	1248	901703816	GAMA SERVICIOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS SAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 70.400.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.82120.251 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 251	$ 70.400.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REPRESENTACION JURIDICA Y DE DEFENSA JUDICIAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
1420	21/01/2026 8:41	1212	74374860	MANUEL SAUL JAIMES BARRERA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 22.800.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.85999.201 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 201	$ 22.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO CONDUCTOR DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
1421	21/01/2026 8:41	1298	1098770229	LAURA MELISSA ESPINOSA RAMIREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 24.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 24.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
1422	21/01/2026 8:41	1244	1005109247	VICTOR DANIEL GALLEGO POSSO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 40.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 40.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA DISEÑO, EDICION Y DIVULGACION EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION TRADICIONALES Y DIGITALES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
1434	21/01/2026 8:59	1289	1098624635	DIANA CAROLINA PEINADO TORRES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 27.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 27.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
1435	21/01/2026 9:00	1263	1098692371	JUAN SEBASTIAN REY SUAREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 64.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 64.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON MAESTRIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CALIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
1436	21/01/2026 9:00	1286	1098682046	MARIA FERNANDA QUINTERO PABUENA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 24.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 24.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
1437	21/01/2026 9:00	1288	91466987	RICARDO BLANCO PEÑA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 28.160.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.85999.201 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 201	$ 28.160.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE MAQUINARIA AMARILLA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
1438	21/01/2026 9:01	1227	1065875905	JOSE CAMILO ROCHA GUZMAN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 30.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.82120.251 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 251	$ 30.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO APRA LOS TEMAS DE CONTRATACION PUBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
1439	21/01/2026 9:01	1241	91356684	JONATHAN CAPACHO SILVA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.85999.201 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 201	$ 18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
1440	21/01/2026 9:02	1275	1095834715	MARIA ALEJANDRA CARVAJAL GARCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 40.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83213.201 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 201	$ 40.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
1541	21/01/2026 14:48	1176	1095831642	MARLON NORBERTO ESPARZA LEON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 60.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.210206 9.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	$ 60.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
1542	21/01/2026 14:49	1218	1098735260	BRAYAN FERNEY RIVERA VASQUEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 60.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.210206 9.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	$ 60.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO
1543	21/01/2026 14:49	1221	1098683920	LAURA TATIANA EL FEGHALI CELY	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 60.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.210206 9.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	$ 60.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO
1544	21/01/2026 14:50	1196	1098669467	EDWIN FERNANDO AYALA CADENA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 75.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.210206 9.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	$ 75.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA SENIOR, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
1545	21/01/2026 14:50	1177	1096950522	JAIME LEONARDO FLOREZ CALDERON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 50.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.210206 9.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	$ 50.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO
1546	21/01/2026 14:51	1186	37550830	DOLLYS ORIANA CALDERON ROJAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 55.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.210206 9.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	$ 55.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MEJORA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS BAJO LAS NORMAS ISO; EN LA OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
1547	21/01/2026 14:52	1199	60325872	LAURA PATRICIA ESPINOSA BOHORQUEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 65.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	$ 65.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
1548	21/01/2026 14:52	1258	91390597	JOSE SAUL ARDILA GUZMAN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 45.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.85999.226 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 226	$ 45.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ELECTRICISTA EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO, BRINDANDO SOPORTE TÉCNICO PARA LA INSTALACIÓN, VERIFICACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS MÓDULOS DE CONTROL Y MEDIDA DEL SISTEMA EN EL AREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
1549	21/01/2026 14:53	1250	1098634815	JAVIER BARAJAS CASTRO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 90.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	$ 90.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRÓNICO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
1550	21/01/2026 14:53	1266	1098605320	SILVIA ANDREA FERREIRA BLANCO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 40.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.85999.226 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 226	$ 40.000.000,00	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTALES Y DE GESTIÓN QUE SE EJECUTAN EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
1632	22/01/2026 9:08	1362	1098816293	JORGE LUIS BARAJAS CHANAGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 44.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 44.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
1633	22/01/2026 9:08	1349	1098705821	KAREN DANIELA FUENTES SALAZAR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 30.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.82120.251 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 251	$ 30.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACION PUBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
1634	22/01/2026 9:09	1393	1098793640	JOSE LUIS HERNANDEZ SANDOVAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 27.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 27.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
1635	22/01/2026 9:09	1352	13351098	LUIS ARTURO HERNANDEZ ORTIZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 52.800.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83213.201 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 201	$ 52.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL AREA DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
1636	22/01/2026 9:09	1383	13510493	CRISTIAN LEONARDO CAÑAS MARISCAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 21.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 21.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
1637	22/01/2026 9:10	1398	1096951560	MAIRA ALEJANDRA SANABRIA TARAZONA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 24.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 24.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO FORESTAL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
1638	22/01/2026 9:10	1371	1095826327	PEDRO LUIS GARCIA AYALA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 27.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 27.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA PLANEACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE GESTION DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
1640	22/01/2026 9:42	1396	1005333638	ANA GABRIELA RAMIREZ ZAMBRANO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 21.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.85999.201 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 201	$ 21.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER EL AREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
1641	22/01/2026 9:42	1353	1098725013	DANIEL SANTIAGO SUAREZ CARVAJAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 52.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 52.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRAROS DE OBRA E INTERVENTORIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTUCTURA
1754	22/01/2026 23:05	24	890204851	CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 24.216.000,00	2.3.2.02.02.007.2024680010192.2.2102069.72212.226 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES NO RESIDENCIALES DIFERENTES A VIVIENDA A COMISION O POR CONTRATO 226	$ 24.216.000,00	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 12 NO 33-51 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y BODEGA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
1757	22/01/2026 23:05	187	901606416	BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS S.A.S	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 324.785.115,88	2.3.2.02.02.008.2024680010189.2.2102069.8715205.226 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION 226	$ 324.785.115,88	ADICIONAL N°1 CTO 187-2024 CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE 1.
1758	22/01/2026 23:05	189	829001805	SOSDOM S.A.S.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 41.974.584,71	2.3.2.02.02.008.2024680010189.2.2102069.8715205.226 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION 226	$ 41.974.584,71	ADICIONAL N°1 CTO 189-2024 CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE 3.
1759	22/01/2026 23:05	199	901886845	CONSORCIO MANTENIMIENTO DIKARM 2024	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 37.108.429,46	2.3.2.02.02.008.2024680010189.2.2102069.8715205.226 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION 226	$ 37.108.429,46	ADICIONAL N°1 CTO 199-2024 CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE 4.
1763	22/01/2026 23:05	35	811009788	DISTRACOM S.A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 6.248.035,00	2.3.2.02.01.003.2024680010192.2.2102069.3336103.226 - DIESEL OIL ACPM FUEL GAS GASOIL MARINE GAS 226	$ 6.248.035,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM), PARA LOS EQUIPOS, VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y MAQUINARIA PESADA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
1766	22/01/2026 23:05	126	890210581	AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 617.856.243,00	2.3.2.02.02.008.2024680010046.2.4002026.85970.201 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE 201	$ 617.856.243,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 2 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 126 DEL 29 DE AGOSTO DE 2024, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y EL AREA METROPOLITANA DE BCUARAMANGA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES UBICADAS EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
1770	22/01/2026 23:05	42	901153192	DETECCIÓN SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA - DETECCIÓN LTDA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 295.625.545,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.85250.226 - SERVICIOS DE PROTECCION GUARDAS DE SEGURIDAD 226	$ 295.625.545,00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA SALVAGUARDA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SE ENCUENTREN BAJO LA TENENCIA, POSESIÓN O DOMINIO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADEMAS DE LA PROTECCION DE LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA DE BUCARAMANGA Y SUS CENTROS EXTERNOS O DONDE LA ENTIDAD LOS REQUIERA.
1772	22/01/2026 23:05	116	890201213	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER UIS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 100.805.564,00	2.3.2.02.02.005.202500000019302.2.4002020.53211.251 - ESPACIO PUBLICO ADECUADO 251	$ 100.805.564,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 116 DEL 30 DE JULIO DE 2024, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL EN LA CARRERA 26 (PASEO ESPAÑA) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER
1773	22/01/2026 23:05	50	804016472	AMERICANA DE SERVICIOS LTDA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 533.058,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.85330.226 - SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL 226	$ 533.058,00	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EN LOS DIFERENTES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, JUNTO CON EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS Y LA MAQUINARIA RESPECTIVA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
1781	22/01/2026 23:05	75	900506002	WILMAN MORALES REY PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S A S	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 129.526.562,32	2.3.2.02.02.008.2024680010205.2.2106033.83132.226 - SERVICIOS DE SOPORTE EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (TI)	$ 129.526.562,32	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO-SGAP Y EL HARDWARE DE CONTROL ASOCIADO EN LOS DIFERENTES SITIOS DE TELEMEDIDA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
1782	22/01/2026 23:05	61	829000956	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 191.675.113,02	2.3.2.02.02.005.2024680010051.2.2402114.53211.201 - VIA URBANA MEJORADA 201	$ 191.675.113,02	INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER
1784	22/01/2026 23:05	191	900115339	SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 30.459.177,38	2.3.2.02.02.008.2024680010189.2.2102069.8715205.226 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION 226	$ 30.459.177,38	ADICIONAL NO.2 CONTRATO 191-2024 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y DEL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE 2.
1793	22/01/2026 23:05	12	901669773	CONSORCIO KALROY BUCARAMANGA 13	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 63.762.401,97	2.3.2.02.02.005.2022680010048.2.4301004.53270.251 - INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 251	$ 63.762.401,97	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 7 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 12 DEL 14 DE FEBRERO DE 2023, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA LA ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER. GRUPO 2
1806	22/01/2026 23:05	105	901941095	CONSORCIO ESPACIOS BGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 6.791.812.597,46	2.3.2.02.02.005.2024680010050.2.4002020.53211.289 - CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 289	$ 6.791.812.597,46	ADECUACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
1809	22/01/2026 23:05	2413	91512695	LINO GERARDO OCHOA ARGUELLO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 533.333,33	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.82120.226 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 226	$ 533.333,33	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN DENTRO DE SUS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
1815	22/01/2026 23:05	135	804006674	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S A E S P	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 5.107.873.949,00	2.3.2.02.02.008.2024680010046.2.4002026.85970.201 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE 201	$ 5.107.873.949,00	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA (EMAB) PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES UBICADAS EN EL ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
1883	22/01/2026 23:05	166	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 445.000.000,00	2.3.2.02.02.008.202500000020993.2.4599006.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 445.000.000,00	ADICION EN VALOR NO. 4 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 166 DEL 28 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES: SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE BUCARMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
1897	22/01/2026 23:05	158	901964773	CONSORCIO INTER URBANISMO BGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 804.614.621,34	2.3.2.02.02.005.2024680010050.2.4002020.53211.289 - CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 289	$ 804.614.621,34	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OBRA PÚBLICA DE ADECUACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
1900	22/01/2026 23:05	189	829001805	SOSDOM S.A.S.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 26.373.582,00	2.3.2.02.02.008.2024680010189.2.2102069.8715205.226 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION 226	$ 26.373.582,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO.3 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 189 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024, CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
1901	22/01/2026 23:05	199	901886845	CONSORCIO MANTENIMIENTO DIKARM 2024	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 28.169.083,00	2.3.2.02.02.008.2024680010189.2.2102069.8715205.226 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION 226	$ 28.169.083,00	ADICIONAL NO.2 EN VALOR Y PRORROGA NO.3 EN PLAZO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 199 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2024, CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
1902	22/01/2026 23:05	191	900115339	SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 50.156.787,59	2.3.2.02.02.008.2024680010189.2.2102069.8715205.226 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION 226	$ 50.156.787,59	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 4 AL CONTRATO NO. 191 DE 2024, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y DEL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE 2
1911	22/01/2026 23:05	192	901591686	CONECTAR RL SERVICIOS DE TRANSPORTE S.A.S	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 63.755.142,50	2.3.2.02.02.005.2024680010253.2.2402042.53211.317 - CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 317	$ 63.755.142,50	ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA EL TRANSPORTE EN ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLEN PARA LA SUPERVISION DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS POR EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
1914	22/01/2026 23:05	197	901980756	CONSORCIO RESTAURACIÓN PLAZA DE SAN MATEO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 1.542.128.640,00	2.3.2.02.02.008.2024680010084.2.4599006.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 1.542.128.640,00	ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RESTAURACIÓN DE LA PLAZA SAN MATEO INMUEBLE DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
1915	22/01/2026 23:05	195	901980960	CONSORCIO FORESTAL BGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 81.296.607,89	2.3.2.02.02.008.2024680010046.2.4002026.85970.201 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE 201	$ 81.296.607,89	MANTENIMIENTO Y MANEJO INTEGRAL ARBÓREO DE ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
1917	22/01/2026 23:05	196	901256066	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 479.321.947,00	2.3.2.02.02.005.202500000020181.2.4002020.53270.251 - ESPACIO PUBLICO ADECUADO 251	$ 479.321.947,00	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BORDE SUR LA VICTORIA EN EL BARRIO LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
1929	22/01/2026 23:05	217	901702151	MAAS INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 257.865.599,00	2.3.2.02.02.008.2024680010084.2.4599006.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 257.865.599,00	INTERVENTORIA A LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RESTAURACIÓN DE LA PLAZA SAN MATEO INMUEBLE DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
1930	22/01/2026 23:05	4038	1005235992	BLANCA JAZBLEIDY PINEDA CHACON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 3.266.666,66	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.85999.226 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 226	$ 3.266.666,66	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTALES Y DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
1933	22/01/2026 23:05	2007	1098748864	CRISTHIAN DAVID TATIS RUIZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 9.800.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.85999.226 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 226	$ 9.800.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION #2007 DEL 26 DE MARZO DE 2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER Y COADYUVAR EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO, TÉCNICO Y ECONÓMICO EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN ADELANTADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
1934	22/01/2026 23:05	4186	1193572524	EMELY DAHIANA PINTO CHANTRE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 3.150.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.85999.226 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 226	$ 3.150.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTALES Y DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
1936	22/01/2026 23:05	52	901904407	CONSORCIO GENPRO GROUP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 1.251.807.912,06	2.3.2.02.02.005.2024680010051.2.2402114.53211.289 - CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 289	$ 1.251.807.912,06	ADICIONAL EN VALOR NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 052 DEL 21 DE ABRIL DE 2025, CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
1939	22/01/2026 23:05	61	829000956	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 320.582.478,30	2.3.2.02.02.005.2024680010051.2.2402114.53211.289 - CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 289	$ 320.582.478,30	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 061 DEL 02 DE MAYO DE 2025 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA OBRA PUBLICA DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"
1944	22/01/2026 23:05	2235	1098629229	MAURICIO DE JESUS VELASQUEZ DAZA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 2.880.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.85999.226 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 226	$ 2.880.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION #2235 DEL 25 DE ABRIL DE 2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OPERACIÓN DEL CAMIÓN CANASTA GRÚA DE ALUMBRADO PÚBLICO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
1947	22/01/2026 23:05	42	901153192	DETECCIÓN SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA - DETECCIÓN LTDA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 77.217.049,67	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.85250.526 - SERVICIOS DE PROTECCION GUARDAS DE SEGURIDAD 526	$ 77.217.049,67	ADICIONAL NO 1 EN VALOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA SALVAGUARDA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SE ENCUENTREN BAJO LA TENENCIA, POSESIÓN O DOMINIO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADEMAS DE LA PROTECCION DE LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA DE BUCARAMANGA Y SUS CENTROS EXTERNOS O DONDE LA ENTIDAD LOS REQUIERA
1949	22/01/2026 23:05	341	900602753	HCR INGENIEROS S.A.S.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 42.896.015,68	2.3.2.02.02.008.2025000000031016.2.2102069.8715205.226 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION 226	$ 42.896.015,68	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 341 DE 2023, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA A LA AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONA RURAL - FASE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
1955	22/01/2026 23:05	169	901114547	SOLIUN INGENIERIA S.A.S	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 92.212.715,42	2.3.2.02.02.005.2025000000016144.2.2402114.53211.251 - CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 251	$ 92.212.715,42	ADICIONAL NO. 8 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 169 DEL 15/07/2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ENMARCADO DENTRO DE LA ESTRATEGIA “PLAN REVITALIZACION DEL ESPACIO PUBLICO CENTRO” EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
1956	22/01/2026 23:05	116	890201213	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER UIS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 65.796.297,00	2.3.2.02.02.005.2025000000019302.2.4002020.53211.251 - ESPACIO PUBLICO ADECUADO 251	$ 65.796.297,00	ADICIONAL NO. 04 EN PLAZO Y VALOR AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 116 DEL 30/07/2024, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL EN LA CARRERA 26 (PASEO ESPAÑA) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER
1959	22/01/2026 23:05	240	901993553	CONSORCIO A.P. CVU	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.819.628.073,00	2.3.2.02.02.005.2025000000015897.2.2102069.54619.226 - SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 226	$ 20.819.628.073,00	MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 45 ENTRE EL ANILLO VIAL Y LA CARRERA NOVENA; CALLE 61 ENTRE EL PUENTE EL BUENO Y LA PUERTA DE SOL; ASÍ COMO LA CALLE 105 ENTRE EL PUENTE DE PROVENZA Y EL PUENTE EL BUENO, EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
1960	22/01/2026 23:05		901457091	APPIANTICA S.A.S	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 325.158.907,50	2.3.7.06.02.2025000000029579.1.4599002.91123.526 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 526	$ 325.158.907,50	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 254 DE 2023, CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS CAJAS DE INSPECCIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
1961	22/01/2026 23:05	286	901767961	CONSORCIO ILUMINAR BGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.646.901,20	2.3.7.06.02.2025000000029579.1.4599002.91123.526 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 526	$ 12.646.901,20	PASIVOS EXIGIBLES CONTRATO NO. 286 DE 2023, CUYO OBJETO ES: MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 - FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA –LOTE 2

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
1962	22/01/2026 23:05		900930834	SOLUCIONES ELECTRICAS DE COLOMBIA S.A.S	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 0,01	2.3.7.06.02.2025000000029579.1.4599002.91123.526 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 526	$ 0,01	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 424 DE 2022, CUYO OBJETO ES: ADICIÓN EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 424 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA A LA MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR Y SANTANDER, CALLE 56 FASE I Y II Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 3.
1963	22/01/2026 23:05		901662108	UNIÓN TEMPORAL BUCARAMANGA ALUMBRADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 61.857.894,44	2.3.7.06.02.2025000000029579.1.4599002.91123.526 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 526	$ 61.857.894,44	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 415 DE 2022, CUYO OBJETO ES: MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. LOTE 5
1964	22/01/2026 23:05		901774294	CONSORCIO ILUMINAR BGA R	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 152.417.959,10	2.3.7.06.02.2025000000029579.1.4599002.91123.526 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 526	$ 152.417.959,10	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 332 DE 2023, CUYO OBJETO ES: AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONA RURAL - FASE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
1969	22/01/2026 23:05		810002747	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 205.076.334,35	2.3.7.06.02.2025000000029579.1.4599002.91123.526 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 526	$ 205.076.334,35	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 422 DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA A LA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
1970	22/01/2026 23:05		901666929	CONSORCIO INTERURBANAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 167.263.648,30	2.3.7.06.02.2025000000029579.1.4599002.91123.526 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 526	$ 167.263.648,30	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 421 DE 2022, CUYO OBJETO ES: ADICIÓN EN VALOR Y PLAZO NO. 2 AL CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 421 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA A LA MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR Y SANTANDER, CALLE 56 FASE I Y II Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 1.
1971	22/01/2026 23:05		901661891	CONSORCIO ALUMBRADO PBFAO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 1.607.950.675,27	2.3.7.06.02.2025000000029579.1.4599002.91123.526 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 526	$ 1.187.950.675,27	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 412 DE 2022, CUYO OBJETO ES: MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. LOTE 2
1971	22/01/2026 23:05		901661891	CONSORCIO ALUMBRADO PBFAO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ -	2.3.7.06.02.2025000000029579.1.4599002.53270.501 - INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 501	$ 420.000.000,00	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 412 DE 2022, CUYO OBJETO ES: MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. LOTE 2
1972	22/01/2026 23:05		900948622	SUESCUN COMPANY S.A.S.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 5.996.886,00	2.3.7.06.02.2025000000029579.1.4599002.3212801.526 - PAPEL BOND 526	$ 5.996.886,00	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 351 DE 2023, CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
1973	22/01/2026 23:05		901772778	CONSORCIO ALUMBRADO NLC	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 65.773.277,51	2.3.7.06.02.2025000000029579.1.4599002.91123.526 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 526	$ 65.773.277,51	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 323 DE 2023, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA A LA MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 - FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. LOTE 3.
1974	22/01/2026 23:05		890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 215.719.075,72	2.3.7.06.02.2025000000029579.1.4599002.88756.501 - SERVICIOS DE FABRICACION DE EQUIPO DE ILUMINACION ELECTRICA 501	$ 215.719.075,72	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 253 DE 2022, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P., PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO 2022 EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
1975	22/01/2026 23:05		1098655902	SERGIO PICO RODRIGUEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 83.333,33	2.3.7.06.02.2025000000029579.1.4599002.85999.526 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 526	$ 83.333,33	PASIVO EXGIBLE CONTRATO NO. 248 DE 2023, CUYO OBJETO ES: ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO N° 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 248 DE 16 DE ENERO DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LA ELABORACIÓN, ORGANIZACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE LOS FORMATOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS, QUE PERMITAN TENER CONTROL EN EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. AP-33
1976	22/01/2026 23:05		14204110	ESNORALDO MUÑOZ PATIÑO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 89.780.031,95	2.3.7.06.02.2025000000029579.1.4599002.91123.526 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 526	$ 89.780.031,95	PASIVOS EXIGIBLES CONTRATO NO. 217 DE 2021, CUYO OBJETO ES: ADICION EN VALOR Y PLAZO NO. 2 AL CONTRATO 217 DE 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
1977	22/01/2026 23:05		890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 474.166.091,14	2.3.7.06.02.2025000000029579.1.4599002.88756.501 - SERVICIOS DE FABRICACION DE EQUIPO DE ILUMINACION ELECTRICA 501	$ 474.166.091,14	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 165 DE 2023, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P., PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO 2023 EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
1978	22/01/2026 23:05		805023598	COMISIONISTAS FINANCIEROS AGROPECUARIOS S.A.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 1.473.595.524,26	2.3.7.06.02.2025000000029579.1.4599002.91119.526 - OTROS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA N C P 526	$ 1.473.595.524,26	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 136 DE 2021, CUYO OBJETO ES: DESARROLLAR LA PRIMERA FASE PARA LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PUNTOS DE GESTIÓN INTELIGENTE Y MEDIDAS PARA LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
1979	22/01/2026 23:05		901514835	CONSORCIO COPRINCEL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 204.094.038,66	2.3.7.06.02.2025000000029579.1.4599002.91123.526 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 526	$ 204.094.038,66	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 218 DE 2021, CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO 1
1980	22/01/2026 23:05		900506002	WILMAN MORALES REY PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S A S	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 25.023.612,00	2.3.7.06.02.2025000000029579.1.4599002.83132.526 - SERVICIOS DE SOPORTE EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TI 526	$ 25.023.612,00	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 134 DE 2022, CUYO OBJETO ES: VERIFICAR LAS MEDIDAS DE VARIABLES ELÉCTRICAS QUE REALIZA EL DISPOSITIVO FOTOCONTROL CIMCON ISLC 3100-7P-C… CUYA CARGA SON LAS DISTINTAS LUMINARIAS QUE SE HAN SELECCIONADO PRODUCTO DEL ANÁLISIS Y ESPACIO MUESTRAL DE ACUERDO CON LA NORMA ISO NO. 2859-1:1999 PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO PARA INSPECCION DE ATRIBUTOS
1981	22/01/2026 23:05		860041968	COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 36.720.720,76	2.3.7.06.02.2025000000029579.1.4599002.8715205.526 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION 526	$ 36.720.720,76	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 143 DE 2023, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – LOTE O GRUPO 2.
1984	22/01/2026 23:05	255	811042483	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANETA E.S.P.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 700.000.000,00	2.3.2.02.01.004.2025000000034624.2.2102010.4653201.226 - INSTALACIONES ELECTRICAS NAVIDEÑAS 226	$ 700.000.000,00	DISEÑO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE LA ILUMINACIÓN DECORATIVA PARA EL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
1986	22/01/2026 23:05	114	901953669	HCL CONSTRUCCION COLOMBIA S.A.S.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 140.083.608,44	2.3.2.02.02.005.2024680010043.2.2402112.53211.201 - CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 201	$ 140.083.608,44	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, VOLQUETAS Y VEHÍCULOS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA RED VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
1998	22/01/2026 23:05	52	901904407	CONSORCIO GENPRO GROUP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 1.652.542.117,97	2.3.2.02.02.005.2024680010051.2.2402114.53211.252 - CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 252	$ 1.652.542.117,97	ADICIONAL EN VALOR NO. 2 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 051 DEL 21 DE ABRIL DE 2025, CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
2001	22/01/2026 23:05	278	900494267	MIGUEL SILVA INGENIERIA S.A.S.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 86.561.261,21	2.3.2.02.02.008.2025000000032340.2.4599006.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 86.561.261,21	PRESTACION DE SERVICIOS DE TOMAS DE MUESTRA Y ELABORACION DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE ESTUDIO DE SUELOS PARA LOS PROYECTOS EN ESTRUCTURACIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
2005	22/01/2026 23:05	3368	1098707994	LADY DIANE MORANTES JAIME	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 3.483.333,33	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 3.483.333,33	ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3368 DEL 21/08/2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
2100	22/01/2026 23:06	341	902009210	CONSORCIO EYC1 2025	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 6.930.979.159,70	2.3.2.02.02.008.2024680010189.2.210206 9.8715205.226 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION 226	$ 6.930.979.159,70	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRDO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-LOTE 01 (COMUNAS 1,2,3,4,13,14,15 Y CORREGIMIENTOS 1 Y 2) LOTE 02 (COMUNAS 5,6,7,8,9,10,11,12,16,17 Y CORREGIMIENTO 3)
2101	22/01/2026 23:06	342	900232348	JALGAVI INGENIEROS SAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 1.033.955.610,00	2.3.2.02.02.008.2024680010189.2.210206 9.85970.226 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE 226	$ 1.033.955.610,00	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - LOTE 03 (COMUNAS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 Y CORREGIMIENTOS 1,2,3)
2133	23/01/2026 8:42	1344	1098644199	LAURA JULIANA ARENAS MALDONADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 40.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.210206 9.85999.226 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 226	$ 40.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL TRAMITE INTEGRAL DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES (PQRS) ASOCIADAS AL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
2134	23/01/2026 8:43	1369	1098749339	ROBINSON FABIAN FIGUEROA MALDONADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 45.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.210206 9.85999.226 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 226	$ 45.000.000,00	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN, VERIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, CUSTODIA, ALMACENAMIENTO, DESPACHO Y REGISTRO EN SISTEMAS DE INVENTARIO DE LOS MATERIALES, EQUIPOS Y ACTIVOS DE LAS BODEGAS ADSCRITAS A LA OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
2135	23/01/2026 8:43	1387	91265284	PEDRO FORERO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 60.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.210206 9.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	$ 60.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MEJORA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS BAJO LAS NORMAS ISO, EN LA OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
2136	23/01/2026 8:44	1343	1098685126	ROLANDO ANDRES RINCON SARAVIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 75.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.210206 9.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	$ 75.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA SENIOR, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
2137	23/01/2026 8:46	1345	1095948947	JOSUE FERNANDO QUIROGA SIERRA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 45.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.210206 9.85999.226 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 226	$ 45.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ELECTRICISTA DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
2144	23/01/2026 9:12	1347	1098606485	XIOMARA GARZON ARANZALEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 60.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.210206 9.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	$ 60.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
2166	23/01/2026 10:16	1541	1098753134	SANDRA PAOLA SOLANO FLOREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 33.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 33.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GEÓLOGA ESPECIALIZADA PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
2167	23/01/2026 10:16	1457	1101074788	LIZETH JOHANA VIVIESCAS MARISCAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 24.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.82120.251 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 251	$ 24.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACION PUBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
2168	23/01/2026 10:17	1463	91281345	CARLOS EDUARDO SANCHEZ SANCHEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 33.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 33.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER EN EL AREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
2169	23/01/2026 10:17	1533	1005335946	CAMILA ANDREA PIÑERES SOLANO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 22.500.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 22.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GEÓLOGO PARA APOYAR LA PLANEACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE EJECUTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
2170	23/01/2026 10:23	1527	1095909980	STEVE JOSE VILLABONA BLANCO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURIDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE DEFENSA JUDICIAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
2171	23/01/2026 10:24	1490	91498010	ROBINSON MANTILLA GARCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 36.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 36.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO EN ESTRUCTURAS PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS ORIENTADOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
2172	23/01/2026 10:25	1486	1098609803	LEIDY JOHANA SANCHEZ ORDOÑEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 25.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83213.201 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 201	$ 25.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
2173	23/01/2026 10:25	1479	77194286	GERSON VEGA VARGAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 70.400.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 70.400.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACION PUBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN EL SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
2174	23/01/2026 10:25	1478	1193127272	JESUS DAVID MARTINEZ SEPULVEDA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES TECNICAS DE DISEÑO, PLANOS Y PROYECCIONES EN LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
2175	23/01/2026 10:26	1493	63358587	JACKELINE TOLOSA SALON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA APOYAR LOS PROCESOS DE GESTION DE CALIDAD EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
2179	23/01/2026 10:41	1548	1005107055	DIEGO ANDRES VILLAMIZAR MARTINEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 15.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 15.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
2180	23/01/2026 10:41	1569	63501010	INIRIDA MARCELA GOMEZ ESPARZA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 30.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 30.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA LA PLANEACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
2181	23/01/2026 10:43	1547	1007407057	RICHARD SANTIAGO HERNANDEZ TORRES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 27.500.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 27.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYCTOS ESTRATEGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
2182	23/01/2026 10:44	1559	91488348	HAROLD ANDRES NIÑO VARGAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 25.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 25.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
2183	23/01/2026 10:47	1538	1093785299	CRISTHIAN JAVIER PARADA GARCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 25.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83213.201 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 201	$ 25.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
2184	23/01/2026 10:48	1535	1098805306	NARLY YADIRA BOHORQUEZ DURAN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 30.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 30.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO MECANICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
2185	23/01/2026 10:50	1468	1100964488	MARIA NATALIA RUGELES HORMIGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 33.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 33.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA INDUSTRIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CALIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
2186	23/01/2026 10:50	1456	1098704007	JHON ALEXANDER FIGUEREDO FORERO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 22.500.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 22.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
2187	23/01/2026 10:51	1498	1098694658	DIEGO FABIAN PATIÑO TRUJILLO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 17.500.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.85999.201 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 201	$ 17.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE MAQUINARIA AMARILLA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
2188	23/01/2026 10:52	1481	1098619756	WILMER ARLEY CADENA PATIÑO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 64.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 64.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GEÓLOGO PARA APOYAR LA PLANEACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE EJECUTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
2189	23/01/2026 11:04	1461	28152315	LIZ MONICA LEON SAAVEDRA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.82120.251 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 251	$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACION PUBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
2190	23/01/2026 11:04	1467	1087196962	MARIA FERNANDA CUERO MASIAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.85999.201 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 201	$ 18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER EL AREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIADE INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
2191	23/01/2026 11:05	1472	1098631857	OCTAVIO ANDRES SANDOVAL GONZALEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 16.500.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 16.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO A LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
2192	23/01/2026 11:06	1528	1095792813	SANTIAGO AMAYA MORA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 15.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.85999.201 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 201	$ 15.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
2193	23/01/2026 11:06	1567	1099370458	ANDRES FERNNEY BARAJAS BARAJAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 17.500.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 17.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
2194	23/01/2026 11:07	1540	1095843472	YILBERT FABIAN QUIROGA PASTRANA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 15.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 15.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
2195	23/01/2026 11:07	1464	91214081	JAIME ALBERTO RODRIGUEZ BUITRAGO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 27.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83213.201 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 201	$ 27.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS APRA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
2248	23/01/2026 14:59	1434	63556197	LUZ ANGELA CABALLERO CORZO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 60.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.210206 9.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	$ 60.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA INDUSTRIAL PARA LLEVAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS LIQUIDACIONES Y RECAUDOS DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, COADYUVANDO EN LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
2252	23/01/2026 15:32	1561	1007735177	VALENTINA DIAZ BLANCO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 45.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.210206 9.82120.226 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 226	$ 45.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LAS DIFERENTES ETAPAS CONTRACTUALES EN EL AREA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
2253	23/01/2026 15:32	1348	1007785016	OLINTO CASTILLO BAEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 50.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.210206 9.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	$ 50.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
2254	23/01/2026 15:33	1453	9395175	GERMAN ENRIQUE CARVAJAL GOMEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 44.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.210206 9.85999.226 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 226	$ 44.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR PARA EL TRANSPORTE SEGURO Y OPORTUNO DE PERSONAL, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS REQUERIDAS DESDE EL AREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTEUCTURA, APOYANDO LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y LOGÍSTICAS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO
2291	24/01/2026 9:49	1632	1098711002	HELMER CORDERO REBOLLEDO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 25.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 25.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
2292	24/01/2026 9:50	1645	1101753834	ANA CATALINA GARCIA GORDILLO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 27.500.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 27.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALE COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
2293	24/01/2026 9:51	1579	1095806487	JEFERSON STEVEN MENDOZA MARTINEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACION PUBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
2294	24/01/2026 9:52	1599	64680134	KATY TANIA NAVARRO NAVARRO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 22.500.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83213.201 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 201	$ 22.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
2295	24/01/2026 9:53	1600	1098793938	JORGE ELIECER GOMEZ HERRERA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
2296	24/01/2026 9:53	1603	1099940044	DANIEL RICARDO JEREZ PLATA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 15.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 15.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRÁTEGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
2297	24/01/2026 9:54	1608	1096221052	MONICA MARCELA MENESES BUSTAMANTE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
2298	24/01/2026 9:55	1611	1096065882	KAROL ADRIANA ROJAS CARREÑO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.85999.201 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 201	$ 18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER EN EL AREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
2299	24/01/2026 9:56	1619	63498324	LUZ NEILA GAMBOA FRANCO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 25.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83213.201 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 201	$ 25.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y LA LIQUIDACION DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS QUE EJECUTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
2300	24/01/2026 9:56	1663	13874784	WILFRED EMILIO PALACIO VERANO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 42.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 42.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
2301	24/01/2026 9:57	1665	1005220958	ANDRES FERNANDO MORA NIÑO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ENTODAS LAS ETAPAS DE CONTRATACION PUBLICA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
2302	24/01/2026 10:00	1667	1098695564	ANGELA MARIA CORREA MENDOZA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 22.500.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83213.201 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 201	$ 22.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
2303	24/01/2026 10:01	1668	91249193	GERMAN ALBERTO MORENO BREGULLA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 27.500.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83213.201 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 201	$ 27.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
2304	24/01/2026 10:02	1672	1101175096	ANDRES ORLANDO RODRIGUEZ PINEDA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 22.500.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 22.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA PLANEACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE GESTION DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
2305	24/01/2026 10:02	1676	1098808765	JEFFERSSON FERNANDO LEON VILLAMIZAR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 22.500.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 22.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTROMECÁNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
2306	24/01/2026 10:03	1680	1005042699	JULYETH MARCELA MENDEZ RAMIREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.85999.201 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 201	$ 18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA, DOCUMENTAL Y TECNICA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
2307	24/01/2026 10:04	1692	1099372230	SEBASTIAN RUEDA GODOY	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 22.500.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 22.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
2308	24/01/2026 10:05	1696	1052405562	DANIEL FELIPE ROJAS CASTRO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 25.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 25.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
2309	24/01/2026 10:06	1715	1095906099	MARIA ANDREA ARENAS SANCHEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 15.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 15.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TECNICO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
2310	24/01/2026 10:06	1716	1098633984	JOSE LUIS GONZALEZ CASTRO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83213.201 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 201	$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
2311	24/01/2026 10:07	1725	1095530313	BRAHIAN SNEYDER OSORIO JAIMES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 25.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 25.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO FINANCIERO PARA APOYAR EL AREA DE BANCO DE PROYECTOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
2312	24/01/2026 10:13	1618	1091666950	LEIDY PEÑA FLOREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 30.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 30.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURIDICAS EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
2326	24/01/2026 12:46	1622	91539474	MARCO ANTONIO LOPEZ GARCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 55.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	$ 55.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
2327	24/01/2026 12:47	1602	1098821134	JORGE NICOLAS CIFUENTES AMADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 60.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.83321.226 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 226	$ 60.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
2328	24/01/2026 12:48	1686	79223198	HERNAN DARIO BRICEÑO VILLALOBOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 60.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.83213.226 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 226	$ 60.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA BRINDAR APOYO EN LA FORMULACIÓN, DISEÑO, DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS ASOCIADOS AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, CONTRIBUYENDO A LA PLANEACIÓN URBANA, INTEGRACIÓN ARQUITECTÓNICA, CALIDAD ESPACIAL Y FUNCIONALIDAD DE LOS PROYECTOS, ASÍ COMO AL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS, NORMATIVOS Y ESTÉTICOS DEL AREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
2329	24/01/2026 12:49	1662	37753956	INGRID MILENA CARREÑO FONTECHA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 55.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	$ 55.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO
2435	26/01/2026 10:16	1779	1102361930	DIEGO ESTEBAN SANCHEZ ORTIZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACION EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
2436	26/01/2026 10:16	1753	1094272107	LINA MARIA BASTOS MALDONADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 36.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 36.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA EL CUMPPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
2437	26/01/2026 10:17	1740	1234338622	CARLOS HARVEY ROBLES ROMERO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 22.500.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 22.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
2438	26/01/2026 10:17	1751	1098680923	LUZ DARY MEDINA GOMEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 36.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 36.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
2439	26/01/2026 10:18	1739	91214583	GUSTAVO LANDAZABAL ARIAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 15.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.85999.201 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 201	$ 15.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
2564	27/01/2026 13:46	4	890204851	CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 296.928.511,00	2.3.2.02.02.007.2024680010192.2.2102069.72212.226 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES NO RESIDENCIALES DIFERENTES A VIVIENDA A COMISION O POR CONTRATO 226	$ 296.928.511,00	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 12 NO. 33-51 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
2565	27/01/2026 13:47	1888	1102367764	MARIA ALEJANDRA GONZALEZ CAMACHO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
2566	27/01/2026 13:48	1893	1098785319	ANDRES FELIPE MONTAGUTH DURAN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 27.500.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 27.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
2567	27/01/2026 13:48	1943	1102369209	JULIETH BOLAÑOS BARANDICA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 24.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 24.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA PLANEACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE GESTION DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
2568	27/01/2026 13:49	1857	91225519	GUILLERMO DIAZ SANDOVAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83213.201 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 201	$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COM ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
2569	27/01/2026 13:49	1874	1098782881	YASLIND CAROLINA CASTILLO AVILA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
2570	27/01/2026 13:49	1833	13832172	JOSE CLEMENTE CORREA ALFONSO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 16.500.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 16.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ZONAS RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA
2571	27/01/2026 13:50	1820	91510981	LUIS MARIO DURAN GONZALEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 27.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 27.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO A LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA
2572	27/01/2026 13:50	1964	1102351303	ANDRES JULIAN MEJIA VIVIESCAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 16.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 16.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
2573	27/01/2026 13:51	1963	1098732994	ANDRES MAURICIO MANTILLA RIVERA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 16.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 16.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
2574	27/01/2026 13:51	1806	1007193755	JUREINNY DAYANNA LUNA RUEDA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 27.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 27.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACION PUBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
2575	27/01/2026 13:51	1813	1098752709	CAMILO ANDRES RODRIGUEZ JAIMES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 30.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83213.201 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 201	$ 30.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE EQUIPAMIENTO URBANO EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
2576	27/01/2026 13:52	1941	13959460	OMAR GARCIA GORDILLO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 22.500.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 22.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO TOPÓGRAFO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
2577	27/01/2026 13:52	1878	74369912	GIOVANNI ENRIQUE MELO ZAPATA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 25.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 25.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
2793	28/01/2026 10:15	2084	1098628431	YULI ANDREA SANABRIA PLATA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 80.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.210206 9.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	$ 80.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
2794	28/01/2026 10:15	2163	1014231571	DANIEL STEVEN FLORIAN AVENDAÑO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 90.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.210206 9.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	$ 90.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA LA ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y CONTRATOS ASOCIADOS AL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
2844	28/01/2026 11:58	2107	1005149269	JHON HAIVER ESTEBAN AYALA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 19.200.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 19.200.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
2845	28/01/2026 11:59	2120	1005258890	MARIA JOSE PALACIOS CAMARGO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 24.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 24.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y LA LIQUIDACION DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS QUE EJECUTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
2846	28/01/2026 11:59	2115	91473934	FAVIO ALONSO MORALES SANABRIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 27.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 27.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
2847	28/01/2026 11:59	2122	1098759024	DIEGO ALEXANDER LOPEZ OSORIO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 52.800.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 52.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO EN ENERGIA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACION PUBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
2848	28/01/2026 12:00	2058	1098723761	MARLON ANDRES CASTILLO SALAZAR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
2849	28/01/2026 12:00	2049	1098753238	DAVID HERNANDO JAIMES MUÑOZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA PLANEACION DE LOS PROYECTOS DE GESTION DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
2850	28/01/2026 12:01	2044	91267192	EDISSON QUIROZ MENDEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVCOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
2851	28/01/2026 12:01	2144	1098072768	ANA SOFIA CADENA VILLAMIZAR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 15.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 15.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
2852	28/01/2026 12:02	2051	1102387506	EDWAR JAVIER PEREZ JAIMES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 19.200.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 19.200.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
2860	28/01/2026 13:21	2161	1102368943	EDGAR MAURICIO MARTINEZ URREA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 21.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 21.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNOLOGO EN TOPOGRAFIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
2861	28/01/2026 13:21	2099	91252141	HUGO SUAREZ MANOSALVA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 16.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 16.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ZONAS RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA
2862	28/01/2026 13:22	2180	1098688715	DARIO JOSE URIBE RIOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 27.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 27.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
2863	28/01/2026 13:22	1994	13874347	CRISTHIAN HERNANDO PAREDES CANDELA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 16.500.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 16.500.000,00	PRESTAR SERVICOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE MINICARGADOR Y VIBRO COMPACTADOR EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
2864	28/01/2026 13:22	2171	91264446	HENRY GONZALEZ PEREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE MAQUINARIA AMARILLA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
2865	28/01/2026 13:23	2050	1098667083	INGRID NATALIA MONSALVE ROSALES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 27.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 27.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACION PUBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
2999	29/01/2026 8:28	2350	1095816935	KATHERINE MARTINEZ PAREJO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 16.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 16.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
3000	29/01/2026 8:31	2310	1098644337	SIDNEY ANDREA URIBE DAZA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
3001	29/01/2026 8:31	2338	91489251	SERGIO AUGUSTO HERNANDEZ MORENO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 12.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURIDICAS RELACIONADAS CON LOOS TEMAS DE DEFENSA JUDICIAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
3002	29/01/2026 8:32	2301	63368336	LEDDYS SULAY ARDILA GUERRERO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
3003	29/01/2026 8:32	2352	13511602	FREDDY IRENARCO TORRES SUAREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 22.500.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 22.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACION PUBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
3004	29/01/2026 8:33	2296	1098672614	VILMA ZULAY GARCIA FONTECHA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 24.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 24.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
3005	29/01/2026 8:57	2312	1096948322	SANDRA YENITH RAMIREZ PEÑA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 12.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PETRÓLEOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
3006	29/01/2026 9:07	2260	1090535249	OMAR GILBERTO ABELLO RODRIGUEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 12.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYOA LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTUALES EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
3007	29/01/2026 9:08	2270	1098731880	CRISTIAN JAHIR PORTILLA PITA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 12.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
3008	29/01/2026 9:08	2299	91219565	JAIRO NUNEZ TRUJILLO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
3009	29/01/2026 9:09	2244	13541239	WILFER OMAR VERA JAIMES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
3010	29/01/2026 9:09	2224	91221194	GERARDO ALFONSO ARDILA FRANCO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
3011	29/01/2026 9:10	2269	1005539875	JHONFRETH ARLEY GOMEZ ALMEIDA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 19.200.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 19.200.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
3012	29/01/2026 9:10	2242	91272406	HUGO REINALDO FIGUEROA RAMIREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
3013	29/01/2026 9:11	2226	13746398	HECTOR AUGUSTO ORDUZ MALDONADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 22.500.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 22.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL Y DE SANEAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
3107	29/01/2026 17:37	2223	91274014	JUAN CARLOS NIÑO REY	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 60.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.210206 9.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	$ 60.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE MERCADOS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
3164	30/01/2026 10:23	2510	9092278	FREDY DEL CRISTO GOMEZ DIAZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 25.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 25.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AGRONOMO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
3165	30/01/2026 10:24	2469	91499958	CHRISTIAN ARIEL AMADO GAONA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 12.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
3166	30/01/2026 10:25	2519	63524206	CLAUDIA MILENA PEDRAZA CACERES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 12.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
3167	30/01/2026 10:26	2509	13873753	ANGEL OCTAVIO SANDOVAL PINZON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 12.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
3168	30/01/2026 10:27	2465	91511754	DIEGO FERNANDO BECERRA RAMIREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 12.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
3169	30/01/2026 10:28	2495	1005161299	PAULA ANDREA VILLAMIZAR ARCHILA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 10.500.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 10.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
3170	30/01/2026 10:28	2494	1098745797	LUPITA LARA PEREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 9.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 9.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
3171	30/01/2026 10:29	2477	1098767259	CAMILO ENRIQUE DUEÑAS PUENTES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 12.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
3172	30/01/2026 10:32	2508	1140849453	ALFREDO JOSE GOMEZ FLOREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 30.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 30.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
3196	30/01/2026 11:39	2452	1098684410	YURY BAYONA HERNANDEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 12.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO COMO TECNÓLOGO EN CONTABILIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
3197	30/01/2026 11:39	2437	1098784327	MARIA PAULA HERRERA NUÑEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 12.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
3198	30/01/2026 11:39	2449	91528812	CRISTHIAN EDUARDO PARRA BARRIOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 16.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 16.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
3199	30/01/2026 11:40	2405	1098714857	DANIEL EDICSON GRAJALES AMADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 12.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
3200	30/01/2026 11:40	2314	91288583	JOLMAN LOZANO PICO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 12.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
3201	30/01/2026 11:41	2410	1098675528	LICET MARCELA BOLIVAR SANDOVAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 12.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
3202	30/01/2026 11:42	2381	91498037	JAVIER ENRIQUE GARCIA LIZARAZO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 12.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
3203	30/01/2026 11:42	2357	37896855	MARIA JOSE ARENAS CACERES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 12.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURIDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE DEFENSA JUDICIAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
3204	30/01/2026 11:42	2418	71763171	IVAN DARIO BERNAL VELEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 12.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
3215	30/01/2026 14:14	2392	63553561	ALBA ROCIO MORENO GAMBOA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 12.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTUALES EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
3243	30/01/2026 16:14	2498	91072614	JAVIER ROJAS TAVERA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 60.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.210206 9.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	$ 60.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
3278	30/01/2026 20:47	29	900129186	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN PEDRO BAJO SECTOR NORTE MIRAMAR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 394.139.879,00	2.3.2.02.02.005.2025000000035592.2.2402 042.53211.289 - CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 289	$ 394.139.879,00	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN PEDRO BAJO SECTOR NORTE MIRAMAR DEL CORREGIMIENTO UNO (01), PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER
3279	30/01/2026 20:48	27	901921132	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ABURRIDO PARTE BAJA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 328.790.410,00	2.3.2.02.02.005.2025000000035592.2.2402 042.53211.588 - CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 588	$ 328.790.410,00	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ABURRIDO PARTE BAJA DEL CORREGIMIENTO UNO (1), DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER
3280	30/01/2026 20:48	24	800009279	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CAPILLA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 394.139.879,00	2.3.2.02.02.005.2025000000035592.2.2402 042.53211.289 - CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 289	$ 394.139.879,00	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAPILLA ALTA DEL CORREGIMIENTO DOS (02), PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
3281	30/01/2026 20:49	28	900192545	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL NOGAL PARTE SUR DE LA VEREDA VIJAGUAL CORREGIMIENTO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 352.467.825,00	2.3.2.02.02.005.2025000000035592.2.2402042.53211.588 - CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 588	$ 352.467.825,00	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL NOGAL PARTE SUR DE LA VEREDA VIJAGUAL, CORREGIMIENTO 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y ALCANTARILLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
3282	30/01/2026 20:49	25	902027338	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 394.139.879,00	2.3.2.02.02.005.2025000000035592.2.2402042.53211.289 - CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 289	$ 394.139.879,00	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ESMERALDA DEL CORREGIMIENTO (1) UNO, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER
3283	30/01/2026 20:50	26	901999352	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA RETIRO GRANDE SECTOR ACUEDUCTO DEL CORREGIM	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 328.790.410,00	2.3.2.02.02.005.2025000000035592.2.2402042.53211.588 - CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 588	$ 328.790.410,00	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RETIRO GRANDE SECTOR ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO TRES (03), PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER
3284	30/01/2026 22:39		890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 1.291.134.058,00	2.3.2.02.02.006.2024680010192.2.2102069.69112.226 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD POR CUENTA PROPIA 226	$ 1.291.134.058,00	ENERGIA - ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/12/2025-31/12/2025 SEGÚN FACTURA 243030055 NUMERO DE CUENTA 1075933.
3296	2/02/2026 11:32	2567	63536471	YESENIA SUAREZ PATIÑO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 12.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRÓNICO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
3297	2/02/2026 11:33	2555	91151139	JORGE ELIECER BLANCO VESGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83213.201 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 201	$ 12.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
3298	2/02/2026 11:33	2563	13870340	IVAN FRANCISCO RAMIREZ GALVIS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 12.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRONICO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
3366	2/02/2026 15:42	2603	1098675302	CARMEN LUCIA LOZANO JAUREGUI	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 12.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
3367	2/02/2026 15:42	2574	1193545801	PAULA LIZETH SUAREZ GONZALEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 9.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 9.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
3368	2/02/2026 15:42	2586	1098823907	CAMILA ANDREA ARDILA CEDIEL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 12.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
3369	2/02/2026 15:43	2593	37671172	NURIAN BIBIANA MUNEVAR PEREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
3370	2/02/2026 15:43	2598	1005309562	PAOLA ANDREA MORENO CEPEDA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 12.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURIDICAS PARA LOS PROYECTOS Y CONVENIOS PARTICIPATIVOS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
3371	2/02/2026 15:44	2596	1095840951	SANTIAGO JOSE CAJICA PLATA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 12.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
3372	2/02/2026 15:45	2588	63365736	LEONOR SINUCO ROJAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 12.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
3400	2/02/2026 16:56	2786	1098731124	LINDA KAREM CHIA MACHUCA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 12.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR Y FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS JURIDICOS, ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTUALES QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
3401	2/02/2026 16:56	2722	1096949935	CAROLINA ISABEL LATORRE CORREA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 25.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 25.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA PLANEACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE GESTION DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
3402	2/02/2026 16:57	2706	13873449	MARLON MAURICIO CASTILLO VILLAMIZAR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 12.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
3403	2/02/2026 16:57	2587	1102353678	LUIS DUVAN RODRIGUEZ DIAZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 13.500.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 13.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACION PUBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
3489	3/02/2026 10:11	2676	1101075427	CARLOS ALBERTO JIMENEZ BARON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 45.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.210206 9.83321.226 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 226	$ 45.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
3490	3/02/2026 10:12	2624	1098723246	DIEGO GUILLERMO VILLAREAL PEÑALOZA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 55.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.210206 9.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	$ 55.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
3491	3/02/2026 10:12	2643	87712820	JUAN CARLOS OQUENDO VILLACREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 80.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.210206 9.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	$ 80.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR ESPECIALIZADO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
3492	3/02/2026 10:12	2546	60368629	MARTHA LUCIA BAUTISTA LAGOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 45.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.210206 9.83321.226 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 226	$ 45.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
3493	3/02/2026 10:13	2744	1098747658	JORDY SEBASTIAN BAEZ VILLAMIZAR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 45.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.210206 9.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	$ 45.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
3495	3/02/2026 10:13	2501	1022368971	LEIDY BIBIANA CASTAÑEDA BERNAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 50.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.210206 9.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	$ 50.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL REGISTRO, TRAMITE Y SEGUIMIENTO DE LAS PETICIONES,QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES (PQRS) EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA SECRETRIA DEINFRAESTRUCTURA.
3531	3/02/2026 11:22		890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 6.503.344,00	2.3.2.02.02.006.2024680010192.2.210206 9.69112.226 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD POR CUENTA PROPIA 226	$ 6.503.344,00	CONSUMO DE ENERGÍA DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN FACTURA DE LA ESSA 243847264 POR $3,352,977 Y 16 DE DICIEMBRE 2025 A 15 DE ENERO 2026-FRA 243847264 POR VALOR DE $3,150,367 NUMERO DE CUENTA 32675.
3532	3/02/2026 11:23		800153993	COMCEL S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 3.674.941,52	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.210206 9.84120.226 - SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA ACCESO 226	$ 3.674.941,52	PLAN DE DATOS DE TELEMEDIDA, TELEGESTION Y PLATAFORMA TECNOLOGICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 19 DE ENERO DE 2025 SEGÚN FACTURA DE CLARO NO. E6019888216 REFERENCIA 8221383845. FECHA LIMITE 6 DE FEBRERO 2026
3533	3/02/2026 11:23		800153993	COMCEL S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 401.683,88	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.210206 9.84120.226 - SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA ACCESO 226	$ 401.683,88	CONSUMO DE VOZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 03 DE ENERO DE 2026 PLAN DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y SIM CARD DE PRUEBA DE TELEMEDIDA, SEGÚN FACTURA E6014112397 DE CLARO REFERENCIA 8221401343.
3560	3/02/2026 14:21	2597	1037571244	CIRO ALEXANDER MURILLO BARRIOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 27.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.210206 9.82120.226 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 226	$ 27.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN DENTRO DE SUS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
3575	3/02/2026 15:16	38	890200162	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA AMB S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 150.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010053.1.400304 8.86350.201 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA, EXCEPTO A TRAVES DE LA RED (A COMISION O POR CONTRATO) 201	$ 150.000.000,00	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA GARANTIZAR LA COBERTURA DEL MÍNIMO VITAL DE AGUA A LOS SECTORES DE LOS CORREGIMIENTOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
3597	4/02/2026 7:53	2828	1095833579	GERALDINE MARTINEZ CORREDOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 9.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501	$ 9.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
3598	4/02/2026 10:34	39	890501510	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 2.236.173.074,00	2.3.2.02.01.004.2025000000015897.2.2102069.4693999.526 - ACCESORIOS ELECTRICOS N C P 526	$ 2.236.173.074,00	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE LA MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 45 ENTRE EL ANILLO VIAL Y LA CARRERA NOVENA; CALLE 61 ENTRE EL PUENTE EL BUENO Y LA PUERTA DE SOL; ASÍ COMO LA CALLE 105 ENTRE EL PUENTE DE PROVENZA Y EL PUENTE EL BUENO, EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
3599	4/02/2026 10:34	33	890501510	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 2.205.202.704,00	2.3.2.02.02.008.2024680010189.2.2102069.85970.226 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE 226	$ 251.403.878,00	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. - LOTE I, II Y III
3599	4/02/2026 10:34	33	890501510	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ -	2.3.2.02.02.008.2024680010189.2.2102069.8715205.226 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION 226	$ 1.953.798.826,00	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. - LOTE I, II Y III
3697	6/02/2026 9:24	135	804006674	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S A E S P	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 3.192.421.218,00	2.3.2.02.02.008.2024680010046.2.4002026.85970.501 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE 501	$ 3.192.421.218,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 135 DEL 26 DE JUNIO DE 2025, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA (EMAB) PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES UBICADAS EN EL ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
3714	6/02/2026 18:13	2641	1098702867	DIDIER FABIAN GAMBOA SALGADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 36.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	$ 36.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
3715	6/02/2026 18:16	2620	1098699039	JENNYFER PAOLA VILLAMIL MANTILLA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 24.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	$ 24.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO
3716	6/02/2026 18:17	2454	1098618752	HECTOR DANILO SANABRIA ARANDA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 50.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	$ 50.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL REGISTRO, TRAMITE Y SEGUIMIENTO DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES (PQRS) EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
3946	11/02/2026 15:19		804006674	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S A E S P	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 804.079.227,00	2.3.3.01.02.004.03.202500000035595.1.4003047.91123.215 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 804.079.227,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES NOVIEMBRE DE 2025 SEGÚN FACTURA NO. ES 387 $ 403.071.073,00 Y MES DE DICIEMBRE DE 2025 SEGÚN FACTURA NO. ES 388 $ 401.008.154,00 VALOR TOTAL $ 804.079.227,00 - EMAB
3995	13/02/2026 9:28	2822	91481193	JOSE ALEJANDRO GOMEZ SUAREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 90.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501	$ 90.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO EXPERTO EN PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EN LA GESTION Y EL PLANTEAMIENTO DE LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
3996	13/02/2026 9:30	2805	1098745463	RICARDO ANDRES ZARATE CABEZA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 13.500.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501	$ 13.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
3997	13/02/2026 9:38	2810	1098814453	CAMILA ANDREA VEGA MONTAÑEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501	$ 12.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
3998	13/02/2026 9:39	2803	1098753675	NEL SEBASTIAN OVIEDO MENDEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 9.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501	$ 9.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
3999	13/02/2026 9:40	2788	1098746548	SMITH ALEJANDRA PINTO PIMIENTO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 13.500.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501	$ 13.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
4000	13/02/2026 9:40	2750	1101694395	JORGE ENRIQUE GONZALEZ FORERO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 12.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR Y FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS JURÍDICOS, ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTUALES QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
4001	13/02/2026 9:41	2665	1098758792	SARA ANGELICA MOYANO GOMEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 16.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 16.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA PLANEACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE GESTION DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
4002	13/02/2026 9:42	2671	63279635	LETICIA CASTELLANOS ZAMBRANO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 12.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
4085	17/02/2026 16:08		830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P BIC	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 18.607.942,73	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.84120.226 - SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA ACCESO 226	$ 18.607.942,73	SERVICIO DE TELEFONIA CONSUMO DE BACKUP POR ALMACENAMIENTO CONSUMO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2026
4086	17/02/2026 16:08		830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P BIC	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 29.338.637,45	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.84120.226 - SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA ACCESO 226	$ 29.338.637,45	SERVICIO DE TELEFONIA CONSUMO DE INTERNET-CANAL DE DATOS-PROTECCION DE 3 MULTIDISPOSITIVOS. CONSUMO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025
4087	17/02/2026 16:09		830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P BIC	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 29.014.731,71	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.84120.226 - SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA ACCESO 226	$ 29.014.731,71	CONSUMO DE INTERNET-CANAL DE DATOS-PROTECCION DE 3 MULTIDISPOSITIVOS. CONSUMO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026
4088	17/02/2026 16:09		800153993	COMCEL S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 399.842,69	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.84120.226 - SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA ACCESO 226	$ 399.842,69	CONSUMO DE VOZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2026, PLAN DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y SIM CARD DE PRUEBA DE TELEMEDIDA, SEGÚN FACTURA E6024858718 DE CLARO REFERENCIA 8221401343.
4207	20/02/2026 15:26		890200162	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA AMB S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 639.608.210,00	2.3.3.01.02.004.01.2025000000035595.1.4003047.91123.215 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 639.608.210,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGUN FACTURA NO. 0006513 $ 321.003.182,00 Y MES DE OCTUBRE DE 2025 SEGÚN FACTURA NO. 0006545 $ 318.605.028 VALOR TOTAL $ 639.608.210,00-ACUEDUCTO METROPOLITANO
4208	20/02/2026 15:27		900115931	EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S A ESP EMPAS S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 99.373.324,00	2.3.3.01.02.004.02.2025000000035595.1.4003047.91123.215 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 99.373.324,00	PAGO DE SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL MES SEPTIEMBRE DE 2025 SEGÚN FACTURA NO. 00000193 $ 99.373.324,00 VALOR TOTAL $ 99.373.324,00 - EMPAS
4209	20/02/2026 15:30	114	901953669	HCL CONSTRUCCION COLOMBIA S.A.S.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 1.400.000.000,00	2.3.2.02.02.005.2024680010043.2.2402112.53211.201 - CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 201	$ 1.400.000.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 2 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS # 114 DEL 16 DE JUNIO DE 2025, CUYO OBJETO ES: ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, VOLQUETAS Y VEHÍCULOS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA RED VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
4220	23/02/2026 10:09		890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 1.267.626.182,00	2.3.2.02.02.006.2024680010192.2.2102069.69112.226 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD POR CUENTA PROPIA 226	$ 1.267.626.182,00	ENERGIA - ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/01/2026-31/101/2026 SEGÚN FACTURA 144187094 NUMERO DE CUENTA 1075933
4226	23/02/2026 11:27	42	901153192	DETECCIÓN SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA - DETECCIÓN LTDA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 758.887.650,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.85250.226 - SERVICIOS DE PROTECCION GUARDAS DE SEGURIDAD 226	$ 758.887.650,00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA SALVAGUARDA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SE ENCUENTREN BAJO LA TENENCIA, POSESIÓN O DOMINIO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADEMAS DE LA PROTECCION DE LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA DE BUCARAMANGA Y SUS CENTROS EXTERNOS O DONDE LA ENTIDAD LOS REQUIERA- ADICIONAL N.2 CONTRATO N.42 DEL 2025 SERVICIO DE VIGILANCIA - DETECCIÓN LTDA -VIGENCIAS FUTURAS - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
4227	23/02/2026 11:28	50	804016472	AMERICANA DE SERVICIOS LTDA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 11.004.828,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.85330.226 - SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL 226	$ 11.004.828,00	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACION Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, INCLUYENDO LA DISPOSICIÓN DE INSUMOS, ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA RESPECTIVA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS - ADICIONAL N.1 CONTRATO N.50 DEL 2025 ASEO Y CAFETERIA (POR VALOR DE $11.004.828 VIGENCIAS FUTURAS) SECRETARIA INFRAESTRUCTURA
4228	23/02/2026 11:28		811009788	DISTRACOM S.A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 3.144.300,00	2.3.2.02.01.003.2024680010192.2.2102069.3336103.226 - DIESEL OIL ACPM FUEL GAS GASOIL MARINE GAS 226	$ 3.144.300,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM), PARA LOS EQUIPOS, VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y MAQUINARIA PESADA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - ADICIONAL N.1 CONTRATO N.35 DEL 2025 COMBUSTIBLES - DISTRACOM (POR VALOR DE $3.144.300 VIGENCIAS FUTURAS) SEC. INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
4256	24/02/2026 16:35		900293868	VEOLIA ASEO BUCARAMANGA S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 14.112.752,00	2.3.3.01.04.004.03.202500000035595.1.40 03047.91123.215 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 14.112.752,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 SEGÚN FACTURA No. OPE173 $ 4.963.741,00 MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGÚN FACTURA No. OPE174 $ 4.579.766,00 Y DICIEMBRE DE 2025 SEGÚN FACTURA No. OPE181 $ 4.569.245,00 VALOR TOTAL $ 14.112.752,00 VEOLIA
4257	24/02/2026 17:44		890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 3.956.306,00	2.3.2.02.02.006.2024680010192.2.210206 9.69112.226 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD POR CUENTA PROPIA 226	$ 3.956.306,00	ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO Y RURAL DE LA OFICINA DE A.P CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 16 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO 2026. FACTURA # 244971967
4408	3/03/2026 17:14	105	901941095	CONSORCIO ESPACIOS BGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 6.919.976.498,00	2.3.2.02.02.005.2024680010050.2.400202 0.53211.588 - CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 588	$ 6.919.976.498,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 2 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 105 DEL 11 DE JUNIO DE 2025, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
4409	3/03/2026 17:23	158	901964773	CONSORCIO INTER URBANISMO BGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 814.177.018,00	2.3.2.02.02.005.2024680010050.2.400202 0.53211.588 - CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 588	$ 814.177.018,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 158 DEL 24 DE JULIO DE 2025, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA ADECUACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
4661	10/03/2026 13:10		900028989	LIMPIEZA URBANA S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 99.726.741,00	2.3.3.01.04.004.03.202500000035595.1.40 03047.91123.215 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 99.726.741,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGÚN FACTURA NO.FEVE-345 $ 24.541.279,00, MES DE OCTUBRE DE 2025 SEGÚN FACTURA NO.FEVE-346 $ 25.000.846,00, MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGÚN FACTURA NO.FEVE-347 $ 25.051.550,00 Y DICIEMBRE DE 2025 SEGUN FACTURA NO.FEVE -505 $ 25.133.066,00 VALOR TOTAL $ 99.726.741,00 LIMPIEZA URBANA
4758	13/03/2026 15:02	195	901980960	CONSORCIO FORESTAL BGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 404.815.689,00	2.3.2.02.02.008.2024680010046.2.400202 6.85970.501 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE 501	$ 404.815.689,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 195 DEL 27 DE AGOSTO DE 2025, CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y MANEJO INTEGRAL ARBOREO DE ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
4777	16/03/2026 16:40		890200162	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA AMB S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 327.468.939,00	2.3.3.01.02.004.01.202500000035595.1.40 03047.91123.215 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 327.468.939,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN FACTURA NO. 0006566 $ 327.468.939,00 TOTAL $ 327.468.939,00- ACUEDUCTO METROPOLITANO
4778	16/03/2026 16:41		900115931	EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S A ESP EMPAS S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 99.167.745,00	2.3.3.01.02.004.02.202500000035595.1.40 03047.91123.215 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 99.167.745,00	PAGO DE SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL MES OCTUBRE DE 2025 SEGÚN FACTURA NO. 00000525 $ 99.167.745,00 VALOR TOTAL $ 99.167.745,00 - EMPAS
4815	19/03/2026 10:43		890200162	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA AMB S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 26.911.484,00	2.3.3.01.02.004.02.202500000035595.1.40 03047.91123.215 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 26.911.484,00	RECONOCER Y ORDENAR EL PAGO DE LA SUMA DE VEINTISÉIS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($26.911.484), A FAVOR DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P., IDENTIFICADO CON NIT. NO. 890.200.162-2 POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTES A LOS SUBSIDIOS APLICADOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3, DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2025. ACUEDUCTO METROPOLITANO
4825	20/03/2026 8:50	1237	1098694741	JOSE LUIS SANABRIA GAMBOA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.100.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.459903 1.85999.201 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 201	$ 12.100.000,00	PRESTAR SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DOCUMENTAL Y TECNICA DELA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
4892	25/03/2026 16:52		830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P BIC	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 11.392.617,73	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.210206 9.84120.226 - SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA ACCESO 226	$ 11.392.617,73	SERVICIO DE TELEFONIA CONSUMO DE BACKUP EN DISCO DS-02973567 CONSUMO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2026 CUENTA # 17 REFERENCIA # 181195417
4893	25/03/2026 16:53		830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P BIC	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 28.192.931,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.210206 9.84120.226 - SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA ACCESO 226	$ 28.192.931,00	SERVICIO DE TELEFONIACONSUMO DE INTERNET-PROTECION 3 MULTIDISPOSITIVOS-UCAAS-WEBEX CALLING-RPVIP ACKUP DISCO - CUENTA # 010 PERIODO FACTURADO 01 AL 28 FEBRERO 2026. REFERECIA # 181185077. ESTE RECIBO LLEGO POR VALOR DE $28,754,201,57 SE SOLIITO AJUSTARLO PORQUE NO SE RECONOCEN INTS DE $561,270,43 POR NO ENVIAR LA FACTURA A TIEMPO1173770210
4894	25/03/2026 16:54		890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 1.173.770.210,00	2.3.2.02.02.006.2024680010192.2.210206 9.69112.226 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD POR CUENTA PROPIA 226	$ 1.173.770.210,00	ENERGIA - ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/02/2026- 28/ 02 /2026 SEGÚN FACTURA 245329240 NUMERO DE CUENTA 1075933.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
4895	25/03/2026 16:59		901153192	DETECCIÓN SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA - DETECCIÓN LTDA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 2.333.755.694,55	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.85250.226 - SERVICIOS DE PROTECCION GUARDAS DE SEGURIDAD 226	$ 2.333.755.694,55	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA SALVAGUARDA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SE ENCUENTREN BAJO LA TENENCIA, POSESIÓN O DOMINIO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ADEMAS DE LA PROTECCION DE LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA DE BUCARAMANGA Y SUS CENTROS EXTERNOS O DONDE LA ENTIDAD LOS REQUIERA
4897	25/03/2026 18:46		800153993	COMCEL S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 7.232.176,96	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.84120.226 - SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA ACCESO 226	$ 7.232.176,96	PLAN DE DATOS DE TELEMEDIDA, TELEGESTION Y PLATAFORMA TECNOLOGICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEL 20 DE ENERO DE 2065 AL 19 DE FEBRERO DE 2026 POR VALOR DE $3,570,728,49 SEGÚN FACTURA DE CLARO NO. E6041698294 REFERENCIA 8221383845. FECHA LIMITE 6 DE MARZO 2026 Y EL CONSUMO DEL 20 DE FEBRERO A 19 DE MARZO 2026 POR VALOR DE $3,661,448.47
5012	27/03/2026 13:39	1347	1098722177	LUISA FERNANDA CONTRERAS MATEUS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 47.400.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	$ 47.400.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
5014	27/03/2026 14:10		890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 3.585.898,00	2.3.2.02.02.006.2024680010192.2.2102069.69112.226 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD POR CUENTA PROPIA 226	$ 3.585.898,00	ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO Y RURAL DE LA OFICINA DE A.P CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 14 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO 2026. FACTURA # 246126504

RELACION PERSONAL A 31 DE MARZO DE 2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	73	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	DESPACHO SECRETARIA ADMINISTRATIVA	KERLLY LUCERO	TOLOZA PRADA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES PRESUPUESTALES RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 36.000.000,00	6/01/2026	7/01/2026	6/07/2026
2026	74	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	DESPACHO SECRETARIA ADMINISTRATIVA	LESTER ANDRES	CACERES MENDEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA COORDINAR ASUNTOS JURÍDICOS EN CONTRATACIÓN ESTATAL QUE SE ADELANTE POR COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.”	$ 70.400.000,00	6/01/2026	7/01/2026	6/09/2026
2026	183	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA LUCIA	DURAN AGUIRRE	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 48.000.000,00	8/01/2026	9/01/2026	8/09/2026
2026	184	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MAYCOL ESTIVEN	MORALES ARIAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PETRÓLEOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 61.600.000,00	8/01/2026	9/01/2026	8/09/2026
2026	190	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FABIAN ANDRES	ARDILA PABON	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS, PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 48.000.000,00	8/01/2026	9/01/2026	8/09/2026
2026	195	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENELDA	GOMEZ NIÑO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO ESPECIALIZADO PARA APOYAR EL ÁREA PRESUPUESTAL EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 52.800.000,00	8/01/2026	9/01/2026	8/09/2026
2026	196	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANDREA JULIANA	SUAREZ LEAL	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 52.800.000,00	8/01/2026	9/01/2026	8/09/2026
2026	203	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FABIO ANDRES	BUENO ARAQUE	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	8/01/2026	9/01/2026	8/09/2026
2026	204	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	KAREN JULIETH	TOLOZA LAMUS	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 32.000.000,00	8/01/2026	9/01/2026	8/09/2026
2026	215	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANA MARIA	LIZARAZO BECERRA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 40.000.000,00	8/01/2026	9/01/2026	8/09/2026
2026	217	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	NUBIA CONSTANZA	VALENCIA PINZON	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA APOYAR LOS SISTEMAS FINANCIEROS Y DE INFORMACION ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 52.800.000,00	8/01/2026	9/01/2026	8/09/2026
2026	221	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	IVAN ENRIQUE	CASTELLANOS JAIMES	PRESTAR SERVICIOS COMO TECNOLOGO PARA BRINDAR APOYO A LA GESTIÓN EN EL AREA DE CONTRATACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 35.200.000,00	8/01/2026	9/01/2026	8/09/2026
2026	236	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	YEISSON LEANDRO	POTES REYES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS, PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 52.800.000,00	9/01/2026	10/01/2026	9/09/2026
2026	238	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA PATRICIA	MONSALVE MONSALVE	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER EL AREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 35.200.000,00	9/01/2026	10/01/2026	9/09/2026
2026	241	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	KAREN MARCELA	GUTIERREZ BARRAGAN	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 40.000.000,00	9/01/2026	10/01/2026	9/09/2026
2026	244	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIEGO RAUL	VILLAVECES SUAREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PETRÓLEOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 76.000.000,00	9/01/2026	10/01/2026	9/09/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	247	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CATHERIN ROCIO	DE ALBA MENDEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTION DOCUMENTAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 61.600.000,00	9/01/2026	10/01/2026	9/09/2026
2026	249	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	VIVIANA MARCELA	CUADROS VALBUENA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	9/01/2026	10/01/2026	9/09/2026
2026	251	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	VANESSA	CABANZO ARDILA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR PÚBLICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	9/01/2026	10/01/2026	9/09/2026
2026	252	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOHANA ANDREA	ORTIZ OLAGO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 48.000.000,00	9/01/2026	10/01/2026	9/09/2026
2026	262	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PAULA ALEJANDRA	CELIS VEGA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 28.000.000,00	9/01/2026	10/01/2026	9/09/2026
2026	264	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JHON JAIRO	BARAJAS LIZCANO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CALIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 35.200.000,00	9/01/2026	10/01/2026	9/09/2026
2026	266	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ISMAEL ENRIQUE	LOPEZ LIZARAZO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS PARA LOS PROYECTOS Y CONVENIOS PARTICIPATIVOS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 52.800.000,00	9/01/2026	10/01/2026	9/09/2026
2026	270	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUDITH	BUENO LIZARAZO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN TODAS SUS ETAPAS, PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA	$ 56.800.000,00	9/01/2026	10/01/2026	9/09/2026
2026	271	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ZARETH YULENY	MOTTA PABON	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 44.000.000,00	9/01/2026	10/01/2026	9/09/2026
2026	272	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DANIEL EDUARDO	JAIMES RUIZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 52.800.000,00	9/01/2026	10/01/2026	9/09/2026
2026	274	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	VALENTINA	URIBE PAEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 48.000.000,00	9/01/2026	10/01/2026	9/09/2026
2026	277	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE TOMAS	ZULUAGA FLOREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 48.000.000,00	9/01/2026	10/01/2026	9/09/2026
2026	281	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JHON FREDDY	RAMIREZ JAIMES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 48.000.000,00	9/01/2026	10/01/2026	9/09/2026
2026	283	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EXNEYQUER	VILLAMIZAR BARAJAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE EQUIPAMENTO URBANO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 44.000.000,00	9/01/2026	10/01/2026	9/09/2026
2026	284	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	RAFAEL	ROJAS PEÑA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 48.000.000,00	9/01/2026	10/01/2026	9/09/2026
2026	287	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ERIKA LILIANA	VARGAS ROA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA APOYAR EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA-	$ 48.000.000,00	9/01/2026	10/01/2026	9/09/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	290	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ROSALBA	GONZALEZ CORZO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 24.800.000,00	9/01/2026	13/01/2026	12/09/2026
2026	293	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OSCAR ELIECER	MARTINEZ ARGUELLO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 48.000.000,00	9/01/2026	10/01/2026	9/09/2026
2026	297	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ERWING LEONARDO	ARIAS CANO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 61.600.000,00	9/01/2026	10/01/2026	9/09/2026
2026	302	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN SEBASTIAN	ARIAS CANO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 48.000.000,00	9/01/2026	10/01/2026	9/09/2026
2026	323	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	XIOMARA YULIANI	BERNAL CARDENAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA APOYAR EL DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 48.000.000,00	10/01/2026	13/01/2026	12/09/2026
2026	326	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA PAULA	APARICIO GARZON	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 52.800.000,00	10/01/2026	13/01/2026	12/09/2026
2026	332	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SONIA	RODRIGUEZ PEDROZA	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 24.000.000,00	10/01/2026	13/01/2026	12/09/2026
2026	336	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LINA MARCELA	ROMERO GUARGUATI	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 40.000.000,00	10/01/2026	13/01/2026	12/09/2026
2026	342	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DAYANA CRISTINA	ARENAS BAYONA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 48.000.000,00	10/01/2026	13/01/2026	12/09/2026
2026	343	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CLAUDIA MILENA	SANCHEZ QUIROGA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 48.000.000,00	10/01/2026	13/01/2026	12/09/2026
2026	344	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANDRES FELIPE	DUEÑAS SANCHEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA APOYAR EL AREA DE BANCO DE PROYECTOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	10/01/2026	13/01/2026	12/09/2026
2026	345	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	YINETH MELISSA	ARIAS BUITRAGO	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 24.000.000,00	10/01/2026	13/01/2026	12/09/2026
2026	346	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CLAUDIA INES	PACHECO MEZA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO Y RESPUESTA OPORTUNA DE LAS PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 44.000.000,00	10/01/2026	13/01/2026	12/09/2026
2026	347	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANGIE LIZETH	ARIAS NIETO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 35.200.000,00	10/01/2026	13/01/2026	12/09/2026
2026	349	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CLAUDIA AZUCENA	RODRIGUEZ CAMACHO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REPARTO, SEGUIMIENTO Y RESPUESTA OPORTUNA DE LAS PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 61.600.000,00	10/01/2026	13/01/2026	12/09/2026
2026	351	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	IVONNE VANESSA	LANDAZABAL VALBUENA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 44.000.000,00	10/01/2026	13/01/2026	12/09/2026
2026	354	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ADRIANA DEL ROSARIO	CUENTAS MORENO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS TEMAS DE DEFENSA JUDICIAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA	$ 61.600.000,00	10/01/2026	13/01/2026	12/09/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	355	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA ELENA	GUTIERREZ DUARTE	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE DEFENSA JUDICIAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 52.000.000,00	10/01/2026	13/01/2026	12/09/2026
2026	356	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA DEL PILAR	HOYOS MONT	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA VERIFICACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD (HSEQ) EN DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA,	$ 48.000.000,00	10/01/2026	13/01/2026	12/09/2026
2026	357	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUIS CARLOS	BARRERA ANGEL	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 44.000.000,00	10/01/2026	13/01/2026	12/09/2026
2026	358	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA ALEJANDRA	GALAN BARAJAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR LOS PROCESOS DE GESTION DE CALIDAD EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 48.000.000,00	10/01/2026	13/01/2026	12/09/2026
2026	359	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANGIE DANIELA	FIGUEROA TORRES	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 35.200.000,00	10/01/2026	13/01/2026	12/09/2026
2026	362	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EDSON ALBERTO	ACEVEDO BAUTISTA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 48.000.000,00	10/01/2026	13/01/2026	12/09/2026
2026	364	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIANA CAROLINA	CARRILLO RIVEROS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO ESPECIALIZADO PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 61.600.000,00	10/01/2026	13/01/2026	12/09/2026
2026	366	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUDITH	ORTIZ CELIS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 48.000.000,00	10/01/2026	13/01/2026	12/09/2026
2026	367	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARQUEZA	GONZALEZ SERENO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 48.400.000,00	10/01/2026	13/01/2026	12/09/2026
2026	370	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN FELIPE	RODRIGUEZ ARAMBULA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 52.800.000,00	10/01/2026	13/01/2026	12/09/2026
2026	372	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE ANTONIO	FLOREZ POVEDA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 48.000.000,00	10/01/2026	13/01/2026	12/09/2026
2026	376	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LINA ANDREA	MOSQUERA VARGAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 48.000.000,00	10/01/2026	13/01/2026	12/09/2026
2026	378	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN CARLOS	BAUTISTA LOBO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 44.000.000,00	10/01/2026	13/01/2026	12/09/2026
2026	383	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JENNY PAOLA	RODRIGUEZ PEREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS ESPECIALIZADO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTUALES EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	$ 52.800.000,00	10/01/2026	13/01/2026	12/09/2026
2026	390	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA FERNANDA	SUAREZ ESTEBAN	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 48.000.000,00	10/01/2026	13/01/2026	12/09/2026
2026	400	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	BONIFACIO	FLOREZ ANTELIZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 48.000.000,00	10/01/2026	13/01/2026	12/09/2026
2026	401	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	RAUL ENRIQUE	MERLO ARGUELLO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA .	$ 35.200.000,00	10/01/2026	13/01/2026	12/09/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	404	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MABEL LUCIA	HERRERA AMOROCHO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 48.000.000,00	10/01/2026	14/01/2026	13/09/2026
2026	408	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LILIANA	VALBUENA RINCON	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL Y DE GESTION QUE SE EJECUTAN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 24.000.000,00	10/01/2026	13/01/2026	12/09/2026
2026	499	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	BRAYAN JESID	OVIEDO CASTILLO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 36.000.000,00	13/01/2026	14/01/2026	13/09/2026
2026	501	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANDRES FERNANDO	MARTINEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO ESPECIALIZADO PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 52.800.000,00	13/01/2026	14/01/2026	13/09/2026
2026	502	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JENITH KATHERINE	DUARTE GALVIS	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 35.200.000,00	13/01/2026	14/01/2026	13/09/2026
2026	516	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MANUEL JOSE	BRICEÑO VERA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 32.000.000,00	14/01/2026	15/01/2026	14/09/2026
2026	518	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JAIME LUIS	PARRA VERGARA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA APOYAR EL ÁREA DE BANCO DE PROYECTOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 48.000.000,00	14/01/2026	15/01/2026	14/09/2026
2026	525	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MABEL NAYIBE	RUEDA DELGADO	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER EL AREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 40.000.000,00	14/01/2026	15/01/2026	14/09/2026
2026	530	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PAOLA ALEJANDRA	GARCIA GALAN	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 48.000.000,00	14/01/2026	15/01/2026	14/09/2026
2026	552	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LIZETH ANDREA	RENGIFO CASTRO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	14/01/2026	15/01/2026	14/09/2026
2026	566	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FERNANDO	MIER MARTINEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 48.000.000,00	14/01/2026	15/01/2026	14/09/2026
2026	582	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CRISTIAN CAMILO	GARCIA TRUJILLO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PROMOCION Y DIVULGACION EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN TRADICIONALES Y DIGITALES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 44.000.000,00	14/01/2026	15/01/2026	14/09/2026
2026	583	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	RAUL	CARRILLO ZARATE	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 48.000.000,00	14/01/2026	15/01/2026	14/09/2026
2026	592	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LAURA REGINA	LOPEZ PRIETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 56.800.000,00	14/01/2026	15/01/2026	14/09/2026
2026	608	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	GRACIELA	RODRIGUEZ PEDROZA	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 24.000.000,00	14/01/2026	15/01/2026	14/09/2026
2026	612	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	BERNARDO	ALVAREZ QUINTERO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 48.000.000,00	14/01/2026	15/01/2026	14/09/2026
2026	644	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARLY YOLIMA	ARDILA MANTILLA	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA APOYAR EL AREA DE BANCO DE PROYECTOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 48.000.000,00	14/01/2026	15/01/2026	14/09/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	648	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIEGO FERNANDO	RAMIREZ SARMIENTO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 48.000.000,00	14/01/2026	15/01/2026	14/09/2026
2026	655	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EFRAIN ANDRES	SERRANO PLATA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA	$ 52.400.000,00	14/01/2026	15/01/2026	14/09/2026
2026	656	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LEYDY ANDREA	MANTILLA CARDONA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS ESPECIALIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 61.600.000,00	14/01/2026	15/01/2026	14/09/2026
2026	671	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MONICA CONSUELO	SUAREZ HERREÑO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES JURIDICAS DENTRO DE LOS PROCESOS Y CONVENIOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 44.000.000,00	14/01/2026	15/01/2026	14/09/2026
2026	680	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JULIAN ANDRES	BOHORQUEZ CASTELLANOS	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 28.160.000,00	14/01/2026	15/01/2026	14/09/2026
2026	685	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	RAFAEL ANTONIO	CHACON RIOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 52.800.000,00	14/01/2026	15/01/2026	14/09/2026
2026	691	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA FERNANDA	SANDOVAL LOPEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 52.400.000,00	14/01/2026	15/01/2026	14/09/2026
2026	696	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CARLOS ALBERTO	CARDENAS LOPEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y LA LIQUIDACION DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS QUE EJECUTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 48.000.000,00	14/01/2026	15/01/2026	14/09/2026
2026	697	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HECTOR ALFONSO	RODRIGUEZ GARNICA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 48.400.000,00	14/01/2026	15/01/2026	14/09/2026
2026	699	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LADYS CONSUELO	TORRES TORRES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 52.800.000,00	14/01/2026	15/01/2026	14/09/2026
2026	704	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	WILLIAM JOSE	CALA VALBUENA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS QUE EJECUTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 40.000.000,00	14/01/2026	15/01/2026	14/09/2026
2026	705	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LAURA PAOLA	AMOROCHO MONTAGUT	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO FINANCIERO PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y LA LIQUIDACION DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS QUE EJECUTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 48.000.000,00	14/01/2026	15/01/2026	14/09/2026
2026	707	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SEIDY JULIETH	GARCIA ROZO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 52.800.000,00	14/01/2026	15/01/2026	14/09/2026
2026	710	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE DAVID	VERA GAMBOA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 48.000.000,00	14/01/2026	15/01/2026	14/09/2026
2026	717	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CHARO LIZET	MANTILLA JARAMILLO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 48.000.000,00	15/01/2026	16/01/2026	15/09/2026
2026	740	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JHON ANDERSON	RAMIREZ CORREA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 48.000.000,00	15/01/2026	16/01/2026	15/09/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	745	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ROXANA CAROLINA	ALVAREZ SALCEDO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 32.000.000,00	15/01/2026	16/01/2026	15/09/2026
2026	753	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MIGUEL ANTONIO	HERRERA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 24.000.000,00	15/01/2026	16/01/2026	15/09/2026
2026	779	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE ALEJANDRO	SANDOVAL MEDINA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 48.000.000,00	15/01/2026	16/01/2026	15/09/2026
2026	791	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EDWIN YANDER	VALDERRAMA PICO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACION PUBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 70.400.000,00	15/01/2026	16/01/2026	15/09/2026
2026	794	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JAVIER ALEXANDER	DURAN VERA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL ÁREA DE BANCO DE PROYECTOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 52.000.000,00	15/01/2026	16/01/2026	15/09/2026
2026	798	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	WALTER YEZID	MARTINEZ VEGA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 61.600.000,00	15/01/2026	16/01/2026	15/09/2026
2026	802	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	GIOVANI	GUALTEROS AGUILLON	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 44.000.000,00	15/01/2026	16/01/2026	15/09/2026
2026	803	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OMAR	BALLESTEROS BUENO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNOLOGO EN TOPOGRAFIA PARA APOYAR LA PLANEACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 40.000.000,00	15/01/2026	16/01/2026	15/09/2026
2026	806	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	VANESSA ASHLIE BRIGGITH	PLATA VARGAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 40.000.000,00	15/01/2026	16/01/2026	15/09/2026
2026	815	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	RAFAEL ANDRES	HINESTROZA MARTINEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 52.800.000,00	15/01/2026	16/01/2026	15/09/2026
2026	820	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ARNULFO	OROZCO TORRES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 44.000.000,00	15/01/2026	16/01/2026	15/09/2026
2026	821	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN DIEGO	NORIEGA CACERES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 48.000.000,00	15/01/2026	16/01/2026	15/09/2026
2026	824	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN CARLOS	PLATA NAVARRO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 24.000.000,00	15/01/2026	16/01/2026	15/09/2026
2026	825	CONTRATACIÓN DIRECTA	SUSPENDIDO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LILIANA	CARVAJAL SALAMANCA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 56.000.000,00	15/01/2026	16/01/2026	20/09/2026
2026	826	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JAVIER MAURICIO	PARRA RODRIGUEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 48.000.000,00	15/01/2026	16/01/2026	15/09/2026
2026	827	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JULIETH ANDREA	LEIVA NEIRA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNÓLOGO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 35.200.000,00	15/01/2026	16/01/2026	15/09/2026
2026	832	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	VICTOR ELIAS	MENESES AGRESOTH	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE EQUIPAME URBANO EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 48.000.000,00	15/01/2026	16/01/2026	15/09/2026
2026	837	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIEGO FERNANDO	BETANCURT PINZON	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 48.000.000,00	15/01/2026	16/01/2026	15/09/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	838	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CARLOS MAURICIO	AREVALO CHINCHILLA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 48.000.000,00	15/01/2026	16/01/2026	15/09/2026
2026	849	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EDUARDO	TORRES QUINTANA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNOLOGO EN TOPOGRAFIA PARA APOYAR LA PLANEACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 40.000.000,00	15/01/2026	16/01/2026	15/09/2026
2026	891	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA ALEJANDRA	CRUZ GONZALEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 48.000.000,00	16/01/2026	17/01/2026	16/09/2026
2026	898	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOHN JEFFERSON	MORENO RODRIGUEZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR APOYO AL SEGUIMIENTO Y RESPUESTA OPORTUNA DE LAS PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 35.200.000,00	16/01/2026	17/01/2026	16/09/2026
2026	899	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANGIE NATALIA	GIL MARTINEZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 40.000.000,00	16/01/2026	17/01/2026	16/09/2026
2026	918	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JERSON JAVIER	SERRANO ARANA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 52.800.000,00	16/01/2026	17/01/2026	16/09/2026
2026	922	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SILVIA ALEJANDRA	PINTO BOHORQUEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 48.000.000,00	16/01/2026	17/01/2026	16/09/2026
2026	924	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	KAREN JULIETH	GUALDRON CHAPARRO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 48.000.000,00	16/01/2026	17/01/2026	16/09/2026
2026	927	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN FELIPE	BELTRAN NIÑO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 40.000.000,00	16/01/2026	17/01/2026	16/09/2026
2026	928	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OSCAR MAURICIO	COTE VALDERRAMA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 48.000.000,00	16/01/2026	17/01/2026	16/09/2026
2026	942	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	GIOVANNY HUMBERTO	DURAN ROMERO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 66.000.000,00	16/01/2026	19/01/2026	18/09/2026
2026	943	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	NELSON	ALBA CONTRERAS	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNÓLOGO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 35.200.000,00	16/01/2026	17/01/2026	16/09/2026
2026	945	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN DAVID	GOMEZ HERNANDEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL PARA LA PUBLICACIÓN, INTERACCIÓN Y PROMOCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 44.000.000,00	16/01/2026	17/01/2026	16/09/2026
2026	950	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MONICA JOHANNA	IGLESIAS ACEVEDO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 52.800.000,00	16/01/2026	17/01/2026	16/09/2026
2026	986	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EDGAR GEOVANNY	PEREZ MARTINEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE DEFENSA JUDICIAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 30.000.000,00	17/01/2026	19/01/2026	18/07/2026
2026	990	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JHOSIAS	MONTESINOS BALLESTEROS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 40.000.000,00	17/01/2026	20/01/2026	19/09/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	1000	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EMILIANO	LARROTA CONDE	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.	$ 24.000.000,00	17/01/2026	19/01/2026	18/09/2026
2026	1001	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARTHA LILIANA	CAMACHO ALVAREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 48.000.000,00	17/01/2026	19/01/2026	18/09/2026
2026	1005	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ALVARO JULIAN	PRADA CAMACHO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE DEFENSA JUDICIAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 36.000.000,00	17/01/2026	19/01/2026	18/07/2026
2026	1008	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUIS FERNANDO	QUIÑONES FLOREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 61.600.000,00	17/01/2026	19/01/2026	18/09/2026
2026	1019	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	GIANN KARLO	MEJIA NIÑO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CÓMO INGENIERO TOPOGRAFO PARA PARA APOYAR LA PLANEACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 40.000.000,00	17/01/2026	19/01/2026	18/09/2026
2026	1023	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LADY DIANE	MORANTES JAIME	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 48.000.000,00	17/01/2026	19/01/2026	18/09/2026
2026	1032	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EDWIN EDUARDO	PERILLA SERRANO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 61.600.000,00	17/01/2026	19/01/2026	18/09/2026
2026	1045	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	GERMAN YESID	PEÑA RUEDA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LOS DIFERENTES PROCESOS JURIDICOS DEL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 90.000.000,00	17/01/2026	19/01/2026	18/11/2026
2026	1046	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	NELVYS	GUTIERREZ PINZON	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS BRINDANDO APOYO EN EL MANEJO Y REGISTRO DE INFORMACION EN LOS SISTEMAS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	$ 60.000.000,00	17/01/2026	19/01/2026	18/11/2026
2026	1052	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	YENNY TATIANA	JIMENEZ DELGADO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN DENTRO DE SUS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 60.000.000,00	19/01/2026	20/01/2026	19/11/2026
2026	1053	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ELVER DANILO	FUQUENE RINCON	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN DENTRO DE SUS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	$ 65.000.000,00	19/01/2026	20/01/2026	19/11/2026
2026	1054	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CLAUDIA JIMENA	RIOS LOZANO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 65.000.000,00	19/01/2026	20/01/2026	19/11/2026
2026	1056	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ABNER ALEXEY	RINCON SUAREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 40.000.000,00	19/01/2026	20/01/2026	19/09/2026
2026	1060	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LILIANA	GUTIERREZ GOMEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN DENTRO DE SUS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 60.000.000,00	19/01/2026	20/01/2026	19/11/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	1061	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CARMEN ELISA	LEON PATIÑO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR JURIDICAMENTE LA GESTION DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES (PQR) Y EL SERVICIO AL CIUDADANO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO	$ 55.000.000,00	19/01/2026	20/01/2026	19/11/2026
2026	1064	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN LEONARDO	PEÑARANDA MANOSALVA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES JURIDICAS EN LOS PROYECTOS Y PROCESOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 48.000.000,00	19/01/2026	20/01/2026	19/09/2026
2026	1067	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FEDERICO	ARIAS GARCIA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 52.800.000,00	19/01/2026	20/01/2026	19/09/2026
2026	1068	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JAIRO	ESPINOSA MORENO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA”	$ 18.000.000,00	19/01/2026	20/01/2026	19/07/2026
2026	1069	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CARLOS VICENTE	PEDRAZA AGUDELO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA	$ 24.000.000,00	19/01/2026	20/01/2026	19/09/2026
2026	1071	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE LUIS	RODRIGUEZ CALA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y CONVENIOS SOLIDARIOS QUE SE EJECUTAN EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 36.000.000,00	19/01/2026	20/01/2026	19/09/2026
2026	1074	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	YULI KATHERINE	ALFONSO BECERRA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE DEFENSA JUDICIAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 30.000.000,00	19/01/2026	20/01/2026	19/07/2026
2026	1077	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	WENDY JULIETH	SERRANO MORENO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 30.000.000,00	19/01/2026	20/01/2026	19/07/2026
2026	1079	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ABELARDO	GOMEZ ESPARZA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 52.800.000,00	19/01/2026	20/01/2026	19/09/2026
2026	1101	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SHERYL NICKOLL	ALVAREZ ROJAS	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTALES Y DE GESTIÓN QUE SE EJECUTAN EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 35.000.000,00	19/01/2026	20/01/2026	19/11/2026
2026	1103	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN CARLOS	GELVEZ ROJAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 75.000.000,00	19/01/2026	20/01/2026	19/11/2026
2026	1105	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DAVID CAMILO	FLOREZ CORDOBA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 70.000.000,00	19/01/2026	20/01/2026	19/11/2026
2026	1106	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANGIE PAOLA	GOMEZ SEPULVEDA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DEL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 45.000.000,00	19/01/2026	20/01/2026	19/11/2026
2026	1110	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DANIEL ALEXANDER	LOPEZ MALDONADO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ELECTRICISTA DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 45.000.000,00	19/01/2026	20/01/2026	19/11/2026
2026	1113	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SILVIA ALEJANDRA	JAIMES RUIZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTALES Y DE GESTIÓN EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 35.000.000,00	19/01/2026	20/01/2026	19/11/2026
2026	1121	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	YAIR GRICELDA	LIZARAZO	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 26.400.000,00	19/01/2026	20/01/2026	19/09/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	1129	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DAYANA MARCELA	VILLAMIZAR GONZALEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 30.000.000,00	19/01/2026	20/01/2026	19/07/2026
2026	1140	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUIS CARLOS	MONSALVE PULGARIN	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 52.000.000,00	19/01/2026	20/01/2026	19/09/2026
2026	1176	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARLON NORBERTO	ESPARZA LEON	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 60.000.000,00	20/01/2026	21/01/2026	20/11/2026
2026	1177	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JAIME LEONARDO	FLOREZ CALDERON	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	$ 50.000.000,00	20/01/2026	21/01/2026	20/11/2026
2026	1186	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DOLLYS ORIANA	CALDERON ROJAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MEJORA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS BAJO LAS NORMAS ISO; EN LA OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA".	$ 55.000.000,00	20/01/2026	21/01/2026	20/11/2026
2026	1196	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EDWIN FERNANDO	AYALA CADENA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA SENIOR, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 75.000.000,00	20/01/2026	21/01/2026	20/11/2026
2026	1198	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	RONALD SMITH	MORENO LUGO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTROMECÁNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 30.000.000,00	20/01/2026	21/01/2026	20/07/2026
2026	1199	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LAURA PATRICIA	ESPINOSA BOHORQUEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 65.000.000,00	20/01/2026	21/01/2026	20/11/2026
2026	1212	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MANUEL SAUL	JAIMES BARRERA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 22.800.000,00	20/01/2026	21/01/2026	20/07/2026
2026	1218	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	BRAYAN FERNEY	RIVERA VASQUEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	$ 60.000.000,00	20/01/2026	21/01/2026	20/11/2026
2026	1219	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CAMILO ANDRES	MONTES CUBILLOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL PARA LA PUBLICACIÓN, INTERACCIÓN Y PROMOCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 33.000.000,00	20/01/2026	21/01/2026	20/07/2026
2026	1221	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LAURA TATIANA	EL FEGHALI CELY	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	$ 60.000.000,00	20/01/2026	21/01/2026	20/11/2026
2026	1227	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE CAMILO	ROCHA GUZMAN	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 30.000.000,00	20/01/2026	21/01/2026	20/07/2026
2026	1237	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE LUIS	SANABRIA GAMBOA	PRESTAR SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA, DOCUMENTAL Y TECNICA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 18.000.000,00	20/01/2026	21/01/2026	20/07/2026
2026	1241	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JONATHAN	CAPACHO SILVA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 18.000.000,00	20/01/2026	21/01/2026	20/07/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	1244	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	VICTOR DANIEL	GALLEGO POSSO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA DISEÑO, EDICIÓN Y DIVULGACIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN TRADICIONALES Y DIGITALES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 40.000.000,00	20/01/2026	21/01/2026	20/09/2026
2026	1248	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REPRESENTACION JURIDICA Y DE DEFENSA JUDICIAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 70.400.000,00	20/01/2026	21/01/2026	20/09/2026
2026	1250	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JAVIER	BARAJAS CASTRO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRÓNICO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 90.000.000,00	20/01/2026	21/01/2026	20/11/2026
2026	1258	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE SAUL	ARDILA GUZMAN	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ELECTRICISTA EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO, BRINDANDO SOPORTE TÉCNICO PARA LA INSTALACIÓN, VERIFICACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS MÓDULOS DE CONTROL Y MEDIDA DEL SISTEMA EN EL AREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 45.000.000,00	20/01/2026	21/01/2026	20/11/2026
2026	1263	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN SEBASTIAN	REY SUAREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON MAESTRIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CALIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 64.000.000,00	20/01/2026	21/01/2026	20/09/2026
2026	1266	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SILVIA ANDREA	FERREIRA BLANCO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTALES Y DE GESTIÓN QUE SE EJECUTAN EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 40.000.000,00	20/01/2026	21/01/2026	20/11/2026
2026	1275	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA ALEJANDRA	CARVAJAL GARCIA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 40.000.000,00	20/01/2026	21/01/2026	20/09/2026
2026	1286	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA FERNANDA	QUINTERO PABUENA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 24.000.000,00	20/01/2026	21/01/2026	20/07/2026
2026	1288	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	RICARDO	BLANCO PEÑA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE MAQUINARIA AMARILLA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 28.160.000,00	20/01/2026	21/01/2026	20/09/2026
2026	1289	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIANA CAROLINA	PEINADO TORRES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 27.000.000,00	20/01/2026	21/01/2026	20/07/2026
2026	1298	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LAURA MELISSA	ESPINOSA RAMIREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 24.000.000,00	20/01/2026	21/01/2026	20/07/2026
2026	1343	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ROLANDO ANDRES	RINCON SARAVIA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA SENIOR, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 75.000.000,00	21/01/2026	23/01/2026	22/11/2026
2026	1344	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LAURA JULIANA	ARENAS MALDONADO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL TRAMITE INTEGRAL DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES (PQRS) ASOCIADAS AL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 40.000.000,00	21/01/2026	23/01/2026	22/11/2026
2026	1345	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSUE FERNANDO	QUIROGA SIERRA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ELECTRICISTA DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 45.000.000,00	21/01/2026	23/01/2026	22/11/2026
2026	1347	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUISA FERNANDA	CONTRERAS MATEUS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 60.000.000,00	21/01/2026	23/01/2026	22/11/2026
2026	1348	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OLINTO	CASTILLO BAEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 50.000.000,00	21/01/2026	23/01/2026	22/11/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	1349	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	KAREN DANIELA	FUENTES SALAZAR	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 30.000.000,00	21/01/2026	22/01/2026	21/07/2026
2026	1352	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUIS ARTURO	HERNANDEZ ORTIZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE EQUIPAMENTO URBANO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 52.800.000,00	21/01/2026	22/01/2026	21/09/2026
2026	1353	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DANIEL SANTIAGO	SUAREZ CARVAJAL	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 52.000.000,00	21/01/2026	22/01/2026	21/09/2026
2026	1362	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LUIS	BARAJAS CHANAGA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 44.000.000,00	21/01/2026	22/01/2026	21/09/2026
2026	1369	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ROBINSON FABIAN	FIGUEROA MALDONADO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN, VERIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, CUSTODIA, ALMACENAMIENTO, DESPACHO Y REGISTRO EN SISTEMAS DE INVENTARIO DE LOS MATERIALES, EQUIPOS Y ACTIVOS DE LAS BODEGAS ADSCRITAS A LA OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 45.000.000,00	21/01/2026	23/01/2026	22/11/2026
2026	1371	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PEDRO LUIS	GARCIA AYALA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA PLANEACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE GESTION DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 27.000.000,00	21/01/2026	22/01/2026	21/07/2026
2026	1383	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CRISTIAN LEONARDO	CAÑAS MARISCAL	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 21.000.000,00	21/01/2026	22/01/2026	21/07/2026
2026	1387	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PEDRO	FORERO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MEJORA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS BAJO LAS NORMAS ISO, EN LA OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 60.000.000,00	21/01/2026	23/01/2026	22/11/2026
2026	1393	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE LUIS	HERNANDEZ SANDOVAL	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 27.000.000,00	21/01/2026	22/01/2026	21/07/2026
2026	1396	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANA GABRIELA	RAMIREZ ZAMBRANO	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 21.000.000,00	21/01/2026	22/01/2026	21/07/2026
2026	1398	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MAIRA ALEJANDRA	SANABRIA TARAZONA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO FORESTAL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 24.000.000,00	21/01/2026	22/01/2026	21/07/2026
2026	1434	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUZ ANGELA	CABALLERO CORZO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA INDUSTRIAL PARA APOYAR EL CONTROL, FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS LIQUIDACIONES Y RECAUDO DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 60.000.000,00	21/01/2026	23/01/2026	22/11/2026
2026	1453	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	GERMAN ENRIQUE	CARVAJAL GOMEZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR PARA EL TRANSPORTE SEGURO Y OPORTUNO DE PERSONAL, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS REQUERIDAS DESDE EL AREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTEUCTURA, APOYANDO LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y LOGÍSTICAS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	$ 44.000.000,00	22/01/2026	23/01/2026	22/11/2026
2026	1456	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JHON ALEXANDER	FIGUEREDO FORERO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 22.500.000,00	22/01/2026	23/01/2026	22/06/2026
2026	1457	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LIZETH JOHANA	VIVIESCAS MARISCAL	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 24.000.000,00	22/01/2026	23/01/2026	22/07/2026
2026	1461	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LIZ MONICA	LEON SAAVEDRA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 20.000.000,00	22/01/2026	23/01/2026	22/06/2026
2026	1463	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CARLOS EDUARDO	SANCHEZ SANCHEZ	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 33.000.000,00	22/01/2026	23/01/2026	22/07/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	1464	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JAIME ALBERTO	RODRIGUEZ BUITRAGO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 27.000.000,00	22/01/2026	23/01/2026	22/07/2026
2026	1467	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA FERNANDA	CUERO MASIAS	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 18.000.000,00	22/01/2026	23/01/2026	22/07/2026
2026	1468	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA NATALIA	RUGELES HORMIGA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA INDUSTRIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CALIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 33.000.000,00	22/01/2026	23/01/2026	22/07/2026
2026	1472	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OCTAVIO ANDRES	SANDOVAL GONZALEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO A LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 16.500.000,00	22/01/2026	23/01/2026	22/04/2026
2026	1478	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JESUS DAVID	MARTINEZ SEPULVEDA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE DISEÑO, PLANOS Y PROYECCIONES EN LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 18.000.000,00	22/01/2026	23/01/2026	22/07/2026
2026	1479	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	GERSON	VEGA VARGAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACION PUBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 70.400.000,00	22/01/2026	23/01/2026	22/09/2026
2026	1481	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	WILMER ARLEY	CADENA PATIÑO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GEÓLOGO PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE EJECUTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 64.000.000,00	22/01/2026	23/01/2026	22/09/2026
2026	1486	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LEIDY JOHANA	SANCHEZ ORDOÑEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 25.000.000,00	22/01/2026	23/01/2026	22/06/2026
2026	1490	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ROBINSON	MANTILLA GARCIA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL, ESPECIALIZADO EN ESTRUCTURAS, PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS ORIENTADOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 36.000.000,00	22/01/2026	23/01/2026	22/07/2026
2026	1493	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JACKELINE	TOLOSA SALON	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA APOYAR LOS PROCESOS DE GESTION DE CALIDAD EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 20.000.000,00	22/01/2026	23/01/2026	22/06/2026
2026	1498	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIEGO FABIAN	PATIÑO TRUJILLO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE MAQUINARIA AMARILLA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 17.500.000,00	22/01/2026	23/01/2026	22/06/2026
2026	1527	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	STEVE JOSE	VILLABONA BLANCO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE DEFENSA JUDICIAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.000.000,00	22/01/2026	23/01/2026	22/06/2026
2026	1528	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SANTIAGO	AMAYA MORA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 15.000.000,00	22/01/2026	23/01/2026	22/06/2026
2026	1533	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CAMILA ANDREA	PIÑERES SOLANO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GEÓLOGO PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE EJECUTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 22.500.000,00	22/01/2026	23/01/2026	22/06/2026
2026	1535	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	NARLY YADIRA	BOHORQUEZ DURAN	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO MECANICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 30.000.000,00	22/01/2026	23/01/2026	22/07/2026
2026	1538	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CRISTHIAN JAVIER	PARADA GARCIA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 25.000.000,00	22/01/2026	23/01/2026	22/06/2026
2026	1540	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	YILBERT FABIAN	QUIROGA PASTRANA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 15.000.000,00	22/01/2026	23/01/2026	22/06/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	1541	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SANDRA PAOLA	SOLANO FLOREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GEOLOGA ESPECIALISTA PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 33.000.000,00	22/01/2026	23/01/2026	22/07/2026
2026	1547	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	RICHARD SANTIAGO	HERNANDEZ TORRES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA	$ 27.500.000,00	22/01/2026	24/01/2026	23/06/2026
2026	1548	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIEGO ANDRES	VILLAMIZAR MARTINEZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 15.000.000,00	22/01/2026	24/01/2026	23/06/2026
2026	1559	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HAROLD ANDRES	NIÑO VARGAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 25.000.000,00	22/01/2026	24/01/2026	23/06/2026
2026	1561	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	VALENTINA	DIAZ BLANCO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LAS DIFERENTES ETAPAS CONTRACTUALES EN EL AREA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 45.000.000,00	22/01/2026	23/01/2026	22/11/2026
2026	1567	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANDRES FERNNEY	BARAJAS BARAJAS	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 17.500.000,00	22/01/2026	24/01/2026	23/06/2026
2026	1569	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	INIRIDA MARCELA	GOMEZ ESPARZA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 30.000.000,00	22/01/2026	23/01/2026	22/06/2026
2026	1579	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JEFERSON STEVEN	MENDOZA MARTINEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 20.000.000,00	22/01/2026	24/01/2026	23/06/2026
2026	1599	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	KATY TANIA	NAVARRO NAVARRO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 22.500.000,00	23/01/2026	24/01/2026	23/06/2026
2026	1600	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JORGE ELIECER	GOMEZ HERRERA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 20.000.000,00	23/01/2026	24/01/2026	23/06/2026
2026	1602	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JORGE NICOLAS	CIFUENTES AMADO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 60.000.000,00	23/01/2026	26/01/2026	25/11/2026
2026	1603	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DANIEL RICARDO	JEREZ PLATA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 15.000.000,00	23/01/2026	24/01/2026	23/06/2026
2026	1608	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MONICA MARCELA	MENESES BUSTAMANTE	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 20.000.000,00	23/01/2026	24/01/2026	23/06/2026
2026	1611	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	KAROL ADRIANA	ROJAS CARREÑO	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 18.000.000,00	23/01/2026	24/01/2026	23/07/2026
2026	1618	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LEIDY	PEÑA FLOREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA	$ 30.000.000,00	23/01/2026	24/01/2026	23/07/2026
2026	1619	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUZ NEILA	GAMBOA FRANCO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS QUE EJECUTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 25.000.000,00	23/01/2026	24/01/2026	23/06/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	1622	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARCO ANTONIO	LOPEZ GARCIA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 55.000.000,00	23/01/2026	26/01/2026	25/11/2026
2026	1632	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HELMER	CORDERO REBOLLEDO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 25.000.000,00	23/01/2026	24/01/2026	23/06/2026
2026	1645	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANA CATALINA	GARCIA GORDILLO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 27.500.000,00	23/01/2026	24/01/2026	23/06/2026
2026	1662	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	INGRID MILENA	CARREÑO FONTECHA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	$ 55.000.000,00	23/01/2026	26/01/2026	25/11/2026
2026	1663	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	WILFRED EMILIO	PALACIO VERANO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 42.000.000,00	23/01/2026	24/01/2026	23/07/2026
2026	1665	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANDRES FERNANDO	MORA NIÑO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN TODAS LAS ETAPAS DE CONTRATACIÓN PUBLICA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 20.000.000,00	23/01/2026	24/01/2026	23/06/2026
2026	1667	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANGELA MARIA	CORREA MENDOZA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 22.500.000,00	23/01/2026	24/01/2026	23/06/2026
2026	1668	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	GERMAN ALBERTO	MORENO BREGULLA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 27.500.000,00	23/01/2026	24/01/2026	23/06/2026
2026	1672	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANDRES ORLANDO	RODRIGUEZ PINEDA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA PLANEACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE GESTION DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 22.500.000,00	23/01/2026	24/01/2026	23/06/2026
2026	1676	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JEFFERSSON FERNANDO	LEON VILLAMIZAR	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTROMECÁNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 22.500.000,00	23/01/2026	24/01/2026	23/06/2026
2026	1680	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JULYETH MARCELA	MENDEZ RAMIREZ	PRESTAR SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA, DOCUMENTAL Y TECNICA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 18.000.000,00	23/01/2026	24/01/2026	23/07/2026
2026	1686	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HERNAN DARIO	BRICEÑO VILLALOBOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA BRINDAR APOYO EN LA FORMULACIÓN, DISEÑO, DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS ASOCIADOS AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, CONTRIBUYENDO A LA PLANEACIÓN URBANA, INTEGRACIÓN ARQUITECTÓNICA, CALIDAD ESPACIAL Y FUNCIONALIDAD DE LOS PROYECTOS, ASÍ COMO AL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS, NORMATIVOS Y ESTÉTICOS DEL AREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 60.000.000,00	23/01/2026	26/01/2026	25/11/2026
2026	1692	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SEBASTIAN	RUEDA GODOY	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 22.500.000,00	23/01/2026	24/01/2026	23/06/2026
2026	1696	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DANIEL FELIPE	ROJAS CASTRO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 25.000.000,00	23/01/2026	24/01/2026	23/06/2026
2026	1715	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA ANDREA	ARENAS SANCHEZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TECNICO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 15.000.000,00	23/01/2026	24/01/2026	23/06/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	1716	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE LUIS	GONZALEZ CASTRO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 20.000.000,00	23/01/2026	24/01/2026	23/06/2026
2026	1725	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	BRAHIAN SNEYDER	OSORIO JAIMES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO FINANCIERO PARA APOYAR EL ÁREA DE BANCO DE PROYECTOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 25.000.000,00	23/01/2026	24/01/2026	23/06/2026
2026	1739	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	GUSTAVO	LANDAZABAL ARIAS	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 15.000.000,00	24/01/2026	26/01/2026	25/06/2026
2026	1740	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CARLOS HARVEY	ROBLES ROMERO	“PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA”.	$ 22.500.000,00	24/01/2026	26/01/2026	25/06/2026
2026	1751	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUZ DARY	MEDINA GOMEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 36.000.000,00	24/01/2026	26/01/2026	25/07/2026
2026	1753	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LINA MARIA	BASTOS MALDONADO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 36.000.000,00	24/01/2026	26/01/2026	25/07/2026
2026	1779	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIEGO ESTEBAN	SANCHEZ ORTIZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 18.000.000,00	24/01/2026	26/01/2026	25/07/2026
2026	1806	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUREINNY DAYANNA	LUNA RUEDA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 27.000.000,00	26/01/2026	27/01/2026	26/07/2026
2026	1813	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CAMILO ANDRES	RODRIGUEZ JAIMES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE EQUIPAMENTO URBANO EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 30.000.000,00	26/01/2026	27/01/2026	26/06/2026
2026	1820	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUIS MARIO	DURAN GONZALEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO A LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 27.000.000,00	26/01/2026	27/01/2026	26/07/2026
2026	1833	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE CLEMENTE	CORREA ALFONSO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ZONAS RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA	$ 16.500.000,00	26/01/2026	27/01/2026	26/06/2026
2026	1857	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	GUILLERMO	DIAZ SANDOVAL	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 20.000.000,00	26/01/2026	28/01/2026	27/06/2026
2026	1874	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	YASLIND CAROLINA	CASTILLO AVILA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 20.000.000,00	26/01/2026	27/01/2026	26/06/2026
2026	1878	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	GIOVANNI ENRIQUE	MELO ZAPATA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 25.000.000,00	26/01/2026	27/01/2026	26/06/2026
2026	1888	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA ALEJANDRA	GONZALEZ CAMACHO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 20.000.000,00	26/01/2026	27/01/2026	26/06/2026
2026	1893	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANDRES FELIPE	MONTAGUTH DURAN	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 27.500.000,00	26/01/2026	27/01/2026	26/06/2026
2026	1941	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OMAR	GARCIA GORDILLO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO TOPÓGRAFO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 22.500.000,00	26/01/2026	27/01/2026	26/06/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	1943	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JULIETH	BOLAÑOS BARANDICA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 24.000.000,00	26/01/2026	27/01/2026	26/07/2026
2026	1963	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANDRES MAURICIO	MANTILLA RIVERA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA	$ 16.000.000,00	26/01/2026	27/01/2026	26/05/2026
2026	1964	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANDRES JULIAN	MEJIA VIVIESCAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 16.000.000,00	26/01/2026	27/01/2026	26/05/2026
2026	1994	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CRISTHIAN HERNANDO	PAREDES CANDELA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE MINICARGADOR Y VIBRO COMPACTADOR EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 16.500.000,00	27/01/2026	28/01/2026	27/06/2026
2026	2044	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EDISSON	QUIROZ MENDEZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 18.000.000,00	27/01/2026	28/01/2026	27/07/2026
2026	2049	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DAVID HERNANDO	JAIMES MUÑOZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA PLANEACION DE LOS PROYECTOS DE GESTION DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 20.000.000,00	27/01/2026	28/01/2026	27/06/2026
2026	2050	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	INGRID NATALIA	MONSALVE ROSALES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 27.000.000,00	27/01/2026	28/01/2026	27/07/2026
2026	2051	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EDWAR JAVIER	PEREZ JAIMES	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 19.200.000,00	27/01/2026	28/01/2026	27/07/2026
2026	2058	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARLON ANDRES	CASTILLO SALAZAR	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 20.000.000,00	27/01/2026	28/01/2026	27/06/2026
2026	2084	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	YULI ANDREA	SANABRIA PLATA	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.	$ 80.000.000,00	27/01/2026	28/01/2026	27/11/2026
2026	2099	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HUGO	SUAREZ MANOSALVA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA	$ 16.000.000,00	27/01/2026	28/01/2026	27/06/2026
2026	2107	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JHON HAIVER	ESTEBAN AYALA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DEBUCARAMANGA.	$ 19.200.000,00	27/01/2026	28/01/2026	27/07/2026
2026	2115	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FAVIO ALONSO	MORALES SANABRIA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 27.000.000,00	27/01/2026	10/02/2026	9/08/2026
2026	2120	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA JOSE	PALACIOS CAMARGO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS QUE EJECUTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 24.000.000,00	27/01/2026	28/01/2026	27/07/2026
2026	2122	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIEGO ALEXANDER	LOPEZ OSORIO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO EN ENERGIA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 52.800.000,00	27/01/2026	28/01/2026	27/09/2026
2026	2144	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANA SOFIA	CADENA VILLAMIZAR	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 15.000.000,00	27/01/2026	28/01/2026	27/06/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	2161	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EDGAR MAURICIO	MARTINEZ URREA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE EQUIPAMENTO URBANO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 21.000.000,00	27/01/2026	28/01/2026	27/07/2026
2026	2163	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DANIEL STEVEN	FLORIAN AVENDAÑO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA LA ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y CONTRATOS ASOCIADOS AL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 90.000.000,00	27/01/2026	28/01/2026	27/11/2026
2026	2171	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HENRY	GONZALEZ PEREZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE MAQUINARIA AMARILLA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 18.000.000,00	27/01/2026	28/01/2026	27/07/2026
2026	2180	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DARIO JOSE	URIBE RIOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 27.000.000,00	27/01/2026	28/01/2026	27/07/2026
2026	2223	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN CARLOS	NIÑO REY	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE MERCADOS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 60.000.000,00	28/01/2026	29/01/2026	28/11/2026
2026	2224	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	GERARDO ALFONSO	ARDILA FRANCO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 18.000.000,00	28/01/2026	29/01/2026	28/07/2026
2026	2226	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HECTOR AUGUSTO	ORDUZ MALDONADO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL Y DE SANEAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 22.500.000,00	28/01/2026	29/01/2026	28/06/2026
2026	2242	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HUGO REINALDO	FIGUEROA RAMIREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.000.000,00	28/01/2026	29/01/2026	28/06/2026
2026	2244	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	WILFER OMAR	VERA JAIMES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 18.000.000,00	28/01/2026	29/01/2026	28/05/2026
2026	2260	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OMAR GILBERTO	ABELLO RODRIGUEZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTUALES EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 12.000.000,00	28/01/2026	29/01/2026	28/05/2026
2026	2269	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JHONFRETH ARLEY	GOMEZ ALMEIDA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 19.200.000,00	28/01/2026	29/01/2026	28/07/2026
2026	2270	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CRISTIAN JAHIR	PORTILLA PITA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 12.000.000,00	28/01/2026	29/01/2026	28/04/2026
2026	2296	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	VILMA ZULAY	GARCIA FONTECHA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 24.000.000,00	28/01/2026	29/01/2026	28/07/2026
2026	2299	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JAIRO	NUNEZ TRUJILLO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 18.000.000,00	28/01/2026	29/01/2026	28/07/2026
2026	2301	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LEDDYS SULAY	ARDILA GUERRERO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE EQUIPAMENTO URBANO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 20.000.000,00	28/01/2026	29/01/2026	28/06/2026
2026	2310	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SIDNEY ANDREA	URIBE DAZA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 20.000.000,00	28/01/2026	29/01/2026	28/06/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	2312	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SANDRA YENITH	RAMIREZ PEÑA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PETRÓLEOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 12.000.000,00	28/01/2026	29/01/2026	28/04/2026
2026	2314	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOLMAN	LOZANO PICO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.000.000,00	28/01/2026	30/01/2026	29/04/2026
2026	2338	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SERGIO AUGUSTO	HERNANDEZ MORENO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE DEFENSA JUDICIAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.000.000,00	28/01/2026	29/01/2026	28/04/2026
2026	2350	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	KATHERINE	MARTINEZ PAREJO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 16.000.000,00	28/01/2026	29/01/2026	28/05/2026
2026	2352	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FREDDY IRENARCO	TORRES SUAREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACION PUBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 22.500.000,00	28/01/2026	29/01/2026	28/06/2026
2026	2357	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA JOSE	ARENAS CACERES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE DEFENSA JUDICIAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 12.000.000,00	28/01/2026	30/01/2026	29/04/2026
2026	2381	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JAVIER ENRIQUE	GARCIA LIZARAZO	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 12.000.000,00	29/01/2026	30/01/2026	29/05/2026
2026	2392	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ALBA ROCIO	MORENO GAMBOA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTUALES EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 12.000.000,00	29/01/2026	30/01/2026	29/05/2026
2026	2405	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DANIEL EDICSON	GRAJALES AMADO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 12.000.000,00	29/01/2026	30/01/2026	29/04/2026
2026	2410	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LICET MARCELA	BOLIVAR SANDOVAL	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 12.000.000,00	29/01/2026	30/01/2026	29/04/2026
2026	2418	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	IVAN DARIO	BERNAL VELEZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 12.000.000,00	29/01/2026	30/01/2026	29/05/2026
2026	2437	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA PAULA	HERRERA NUÑEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 12.000.000,00	29/01/2026	30/01/2026	29/04/2026
2026	2449	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CRISTHIAN EDUARDO	PARRA BARRIOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 16.000.000,00	29/01/2026	30/01/2026	29/05/2026
2026	2452	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	YURY	BAYONA HERNANDEZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO COMO TECNÓLOGO EN CONTABILIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 12.000.000,00	29/01/2026	3/02/2026	2/05/2026
2026	2454	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HECTOR DANILO	SANABRIA ARANDA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL REGISTRO, TRAMITE Y SEGUIMIENTO DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES (PQRS) EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 50.000.000,00	29/01/2026	6/02/2026	5/12/2026
2026	2465	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIEGO FERNANDO	BECERRA RAMIREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 12.000.000,00	29/01/2026	3/02/2026	2/05/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	2469	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CHRISTIAN ARIEL	AMADO GAONA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 12.000.000,00	29/01/2026	3/02/2026	2/05/2026
2026	2477	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CAMILO ENRIQUE	DUEÑAS PUENTES	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 12.000.000,00	29/01/2026	30/01/2026	29/04/2026
2026	2494	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUPITA	LARA PEREZ	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 9.000.000,00	29/01/2026	30/01/2026	29/04/2026
2026	2495	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PAULA ANDREA	VILLAMIZAR ARCHILA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 10.500.000,00	29/01/2026	30/01/2026	29/04/2026
2026	2498	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JAVIER	ROJAS TAVERA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.	$ 60.000.000,00	29/01/2026	30/01/2026	29/11/2026
2026	2501	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LEIDY BIBIANA	CASTAÑEDA BERNAL	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL REGISTRO, TRAMITE Y SEGUIMIENTO DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES (PQRS) EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA SECRETRIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 50.000.000,00	29/01/2026	3/02/2026	2/12/2026
2026	2508	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ALFREDO JOSE	GOMEZ FLOREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 30.000.000,00	29/01/2026	6/02/2026	5/07/2026
2026	2509	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANGEL OCTAVIO	SANDOVAL PINZON	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 12.000.000,00	29/01/2026	3/02/2026	2/05/2026
2026	2510	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FREDY DEL CRISTO	GOMEZ DIAZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AGRONOMO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 25.000.000,00	29/01/2026	6/02/2026	5/07/2026
2026	2519	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CLAUDIA MILENA	PEDRAZA CACERES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 12.000.000,00	29/01/2026	30/01/2026	29/04/2026
2026	2546	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARTHA LUCIA	BAUTISTA LAGOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 45.000.000,00	30/01/2026	3/02/2026	2/12/2026
2026	2555	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JORGE ELIECER	BLANCO VESGA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 12.000.000,00	30/01/2026	3/02/2026	2/05/2026
2026	2563	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	IVAN FRANCISCO	RAMIREZ GALVIS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRÓNICO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 12.000.000,00	30/01/2026	3/02/2026	2/05/2026
2026	2567	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	YESENIA	SUAREZ PATIÑO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRÓNICO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 12.000.000,00	30/01/2026	3/02/2026	2/05/2026
2026	2574	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PAULA LIZETH	SUAREZ GONZALEZ	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 9.000.000,00	30/01/2026	3/02/2026	2/05/2026
2026	2586	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CAMILA ANDREA	ARDILA CEDIEL	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 12.000.000,00	30/01/2026	3/02/2026	2/05/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	2587	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUIS DUVAN	RODRIGUEZ DIAZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 13.500.000,00	30/01/2026	3/02/2026	2/05/2026
2026	2588	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LEONOR	SINUCO ROJAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 12.000.000,00	30/01/2026	10/02/2026	9/05/2026
2026	2593	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	NURIAN BIBIANA	MUNEVAR PEREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 20.000.000,00	30/01/2026	3/02/2026	2/06/2026
2026	2596	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SANTIAGO JOSE	CAJICA PLATA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 12.000.000,00	30/01/2026	5/02/2026	4/05/2026
2026	2597	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CIRO ALEXANDER	MURILLO BARRIOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN DENTRO DE SUS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 27.000.000,00	30/01/2026	3/02/2026	2/08/2026
2026	2598	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PAOLA ANDREA	MORENO CEPEDA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS PARA LOS PROYECTOS Y CONVENIOS PARTICIPATIVOS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 12.000.000,00	30/01/2026	3/02/2026	2/05/2026
2026	2603	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CARMEN LUCIA	LOZANO JAUREGUI	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 12.000.000,00	30/01/2026	3/02/2026	2/05/2026
2026	2620	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JENNYFER PAOLA	VILLAMIL MANTILLA	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	$ 24.000.000,00	30/01/2026	6/02/2026	5/08/2026
2026	2624	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIEGO GUILLERMO	VILLAREAL PEÑALOZA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 55.000.000,00	30/01/2026	3/02/2026	2/12/2026
2026	2641	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIDIER FABIAN	GAMBOA SALGADO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 36.000.000,00	30/01/2026	6/02/2026	5/08/2026
2026	2643	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN CARLOS	OQUENDO VILLACREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR ESPECIALIZADO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 80.000.000,00	30/01/2026	3/02/2026	2/12/2026
2026	2665	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SARA ANGELICA	MOYANO GOMEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA PLANEACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE GESTION DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 16.000.000,00	30/01/2026	13/02/2026	12/06/2026
2026	2671	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LETICIA	CASTELLANOS ZAMBRANO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 12.000.000,00	30/01/2026	13/02/2026	12/05/2026
2026	2676	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CARLOS ALBERTO	JIMENEZ BARON	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 45.000.000,00	30/01/2026	3/02/2026	2/12/2026
2026	2706	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARLON MAURICIO	CASTILLO VILLAMIZAR	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 12.000.000,00	30/01/2026	3/02/2026	2/06/2026
2026	2722	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CAROLINA ISABEL	LATORRE CORREA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA PLANEACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE GESTION DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 25.000.000,00	30/01/2026	3/02/2026	2/07/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	2744	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JORDY SEBASTIAN	BAEZ VILLAMIZAR	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 45.000.000,00	30/01/2026	3/02/2026	2/12/2026
2026	2750	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JORGE ENRIQUE	GONZALEZ FORERO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO, PARA APOYAR Y FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS JURÍDICOS, ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTUALES QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 12.000.000,00	30/01/2026	13/02/2026	12/05/2026
2026	2786	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LINDA KAREM	CHIA MACHUCA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO, PARA APOYAR Y FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS JURÍDICOS, ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTUALES QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 12.000.000,00	30/01/2026	3/02/2026	2/05/2026
2026	2788	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SMITH ALEJANDRA	PINTO PIMIENTO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 13.500.000,00	30/01/2026	13/02/2026	12/05/2026
2026	2803	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	NEL SEBASTIAN	OVIEDO MENDEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 9.000.000,00	30/01/2026	13/02/2026	12/04/2026
2026	2805	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	RICARDO ANDRES	ZARATE CABEZA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 13.500.000,00	30/01/2026	13/02/2026	12/05/2026
2026	2810	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CAMILA ANDREA	VEGA MONTAÑEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 12.000.000,00	30/01/2026	13/02/2026	12/05/2026
2026	2822	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE ALEJANDRO	GOMEZ SUAREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMO EXPERTO EN PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EN LA GESTION Y EL PLANTEAMIENTO DE LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 90.000.000,00	30/01/2026	13/02/2026	12/08/2026
2026	2828	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	GERALDINE	MARTINEZ CORREDOR	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 9.000.000,00	30/01/2026	4/02/2026	3/05/2026
