

ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Informe
de Gestión
2026
ACKER
NEUSON
Segundo Trimestre
Secretaría de Infraestructura
www.bucaramanga.gov.co
Alcaldía de Bucaramanga

INFORME DE GESTION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

La Secretaría de Infraestructura de Bucaramanga presenta el informe de gestión correspondiente al segundo trimestre del año 2026, comprendido del 01 de abril de 2026 al 30 de junio de 2026, en el cual ha continuado ejecutando y realizando las gestiones pertinentes para la contratación, el control y avance de las diferentes obras que actualmente se encuentran en ejecución. Este documento tiene como objetivo proporcionar un resumen detallado de las actividades realizadas en el marco de las líneas estratégicas, programas y alineados con las metas del plan de desarrollo municipal para el periodo 2024-2027 y el nivel de cumplimiento presupuestal.

1. INFORME DE EJECUCION PRESUPESTAL

El presupuesto definitivo a 30 de junio de 2026 de la Secretaria de Infraestructura, ascendió a $ 508.740.732.977,02 y se realizaron apropiaciones y compromisos por valor de $ 105.709.576.388,13 equivalente al **20,77%** de ejecución.

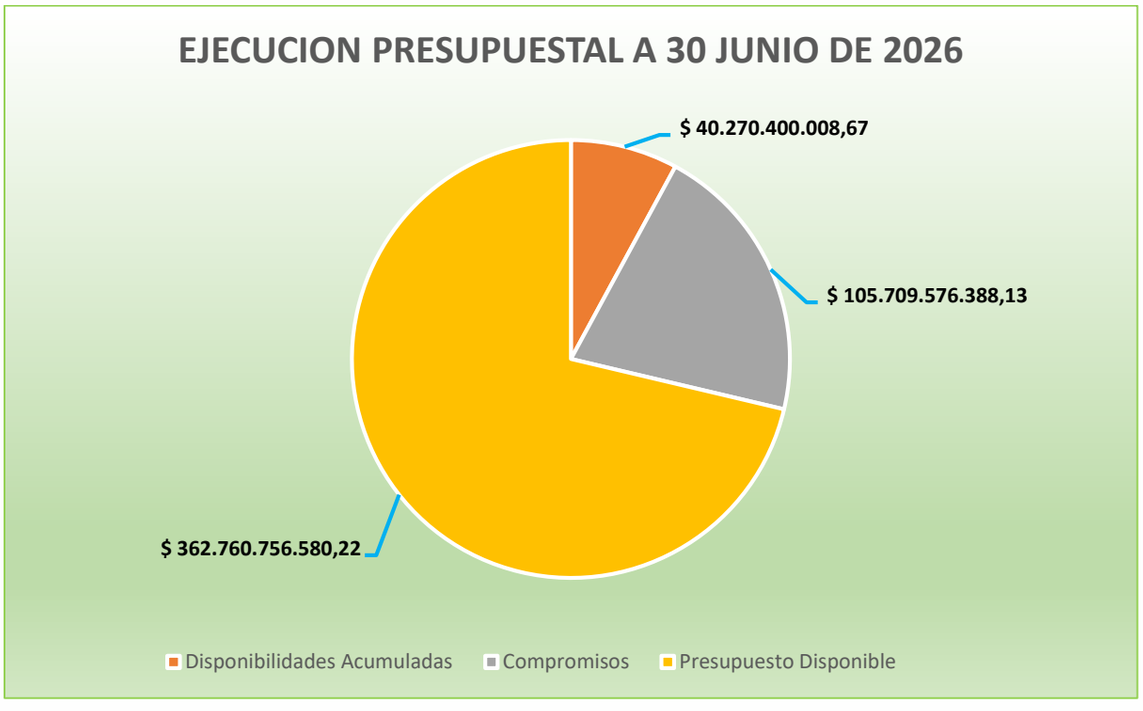

Durante el primer semestre de 2026 de acuerdo a las diferentes necesidades se debieron realizar diferentes movimientos presupuestales de créditos y contracreditos, mediante los siguientes actos administrativos así: DECRETO 0087 ACUERDO NO 003 DEL 05 DE MAYO DE 2026, RESOLUCIÓN No. 4-R-202605-00003775-14 DE MAYO 2026, RESOLUCION 4-R-202606-00004182 DEL 02 JUNIO 2026, Resolución 4-R-202606-00004448 DEL 17 JUNIO 2026 y Resolución 4-R-202606-00004661 DEL 24 JUNIO 2026quedando como presupuesto definitivo el valor de $ 508.740.732.977,02

A continuación, se detalla la inversión por las diferentes líneas estratégicas, sector, programas, metas e indicadores del Plan de Desarrollo:

2. LINEA ESTRATEGICA 2. TERRITORIO SEGURO QUE PROGRESA

SECTOR: Transporte

PROGRAMA: Infraestructura red vial regional

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario

Indicador	Meta 2026	Logro 2026	% Avance 2026	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	40	0	0%	$ 24.483.717.739	$ 20.195.361.712	82%

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	202500000036174	$20.195.361.714	$20.195.361.714

Descripción de actividades desarrolladas

CONTRATO DE OBRA 085 DEL 14 DE MAYO DE 2026 (SI-SI-LP-001-2026) CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAS BGA “MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER”.

Valor del contrato: **$ 18.573.570.772**
Valor Anticipo: N/A
Plazo inicial: **SEIS (06) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO**, EN TODO CASO ATENDIENDO LA FORMA DE PAGO DISPUESTA Y HASTA AGOTAR EL COMPORMISO PRESUPUESTAL, SIN SOBREPASAR EL 31/12/2025
Fecha de inicio: 20/05/2026
Fecha de terminación: 19/11/2026
Estado del Contrato: En Ejecución
Porcentaje avance: 10%

Ubicación: El proyecto se desarrolla en todas las comunas del Municipio de Bucaramanga.

Impacto: Comprende la ejecución de trabajos de mejoramiento y mantenimiento en las vías urbanas de Bucaramanga, mediante obras de bacheo y rehabilitación, en pavimento rígido o flexible buscando así la realizar actividades que mejoran la circulación vial y disminuyen el riesgo de accidentes.

Igualmente, la construcción de reductores de velocidad en diferentes puntos críticos de la ciudad avalados por la Dirección de tránsito de Bucaramanga – DTB, mediante diferentes resoluciones emitidas en el año 2025.

1.COMUNA 1 - NORTE

2.COMUNA 2 - NORORIENTAL

3.COMUNA 3 - SAN FRANCISCO

4.COMUNA 4 - OCCIDENTAL

5.COMUNA 5 - GARCÍA ROVIRA

6.COMUNA 6 - LA CORNCORDIA

7.COMUNA 7 - CIUDADELA

8.COMUNA 8 - SUR OCCIDENTE

9.COMUNA 9 - LA PEDREGOSA

10.COMUNA 10 - PROVENZA

11.COMUNA 11 - SUR

12.COMUNA 12 - CABECERA DEL LLANO

13.COMUNA 13 - ORIENTAL

14.COMUNA 14 - MORRORICO

15.COMUNA 15 - CENTRO

15.COMUNA 16 - LAGOS DEL CACIQUE

15.COMUNA 17 - MUTIS

Este proyecto contribuye al mejoramiento del flujo vehicular en la ciudad, y la diminución de accidentes por ende el mejoramiento en los índices de seguridad vial.

Beneficios para la Comunidad:

- **Mejoramiento en el flujo vehicular:** Al contar con vías en buen estado mejora la circulación de los vehículos y los tiempos de circulación.
- **Menor Impacto a daños:** Se disminuye el riesgo de accidentes y daños en el parte automotor y sus componentes mecánicos.
- **Aumento de la Seguridad vial:** Se tiende a baja en la tasa de mortalidad por accidentes y el mejoramiento de las condiciones de los actores viales.



Carrera 17 entre boulevard y calle 20 – Comuna 3



Avenida la Rosita entre carrera 25 y 27 – Comuna 13

han realizado trabajos de mantenimiento y rehabilitación de la malla vial en diferentes comunas y barrios de la ciudad enfocados en el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo – Vía urbana mejorada, con un avance de 2.3 km hasta el momento.

El contrato cuenta con 2 fases de ejecución, las cuales contemplan una primera en vías principales del municipio, la cual se está ejecutando en el mes de junio y la segunda, en donde se realizarán intervenciones en vías secundarias y en los barrios del municipio, la cual empezara su ejecución a partir del mes de julio hasta finales de año.

DESCRIPCION	M2 EJECUTADOS
Carrera 19 entre calles 20 y 21	24.00 m²
Carrera 28 entre calles 55 y 55A	646.80 m²
Avenida González Valencia entre calles 55 y 55A	276.92 m²
Avenida González Valencia entre calles 56 y 58	198.73 m²
Avenida González Valencia entre calles 58 y 59	190.56 m²
Avenida González Valencia entre calles 59 y 62	120.05 m²
Calle 36 con calle 16 - Intervención 1	5.04 m²
Calle 36 con calle 16 - Intervención 2	5.00 m²
Calle 36 con calle 16 - Intervención 3	7.04 m²
Calle 36 con calle 17 - Intervención 1	5.32 m²
Calle 36 con calle 17 - Intervención 2	8.64 m²
Calle 36 con calle 17 - Intervención 3	14.58 m²
Calle 36 con carrera 18 - Intervención 1	9.99 m²
Calle 36 con carrera 18 - Intervención 2	32.00 m²
Calle 36 con carrera 18 - Intervención 3	20.70 m²
Calle 36 entre carrera 13 y 14 - Intervención 1	12.60 m²
Calle 36 entre carrera 13 y 14 - Intervención 2	17.51 m²
Calle 36 entre carrera 15 y 16 - Intervención 1	27.93 m²
Calle 36 entre carrera 15 y 16 - Intervención 2	7.04 m²
Calle 36 entre carrera 15 y 16 - Intervención 3	19.50 m²
Calle 36 entre carrera 15 y 16 - Intervención 4	9.50 m²
Calle 36 entre carrera 15 y 16 - Intervención 5	4.00 m²
Calle 36 entre carrera 18 y 19 - Intervención 1	4.50 m²
Calle 36 entre carrera 18 y 19 - Intervención 2	4.20 m²
Calle 36 entre carrera 18 y 19 - Intervención 3	6.75 m²
Carrera 33 sobre colegio La Merced	240.00 m²
Calle 103A #06-16 (CC El Único) - Intervención 1	55.72 m²
Calle 103A #06-16 (CC El Único) - Intervención 2	134.98 m²
Calle 103A #06-16 (CC El Único) - Intervención 3	15.00 m²
Calle 103A #06-16 (CC El Único) - Intervención 4	5.28 m²
Calle 37 entre 18 y 19 - Intervención 1	9.40 m²
Calle 37 entre 18 y 19 - Intervención 2	16.83 m²
Calle 37 entre 18 y 19 - Intervención 3	13.44 m²
Calle 37 entre 18 y 19 - Intervención 4	5.76 m²
Calle 37 entre 18 y 19 - Intervención 5	3.69 m²
Calle 37 entre 18 y 19 - Intervención 6	2.20 m²
Calle 37 entre 18 y 19 - Intervención 7	2.40 m²
Calle 51 entre carreras 33 y 32	372.00 m²
Carrera 17 entre bulevar y calle 14	0.00 m²
Carrera 17 entre bulevar y calle 20	540.80 m²
Carrera 17 entre calle 15 y casa 15-56	370.40 m²
Carrera 17 entre calles 15 y 16	0.00 m²
Carrera 17 entre calles 17 y 18	338.80 m²
Carrera 17 entre calles 17 y 19	0.00 m²

Carrera 17 entre calles 18 y 19	204.84 m²
Carrera 17 entre calles 19 y 20	666.40 m²
Carrera 17 intersección con calle 18	0.00 m²
Carrera 17 intersección con calle 20	126.00 m²
Carrera 24 entre calles 83 y 88	465.75 m²
Carrera 31 entre Avenida González Valencia y calle 52	1403.95 m²
Diagonal 31 entre Avenida González Valencia y calle 52	89.00 m²
Avenida González Valencia entre calles 28 y 29	628.40 m²
Avenida González Valencia entre calles 48 y 49	606.53 m²
Avenida La Rosita entre carreras 25 y 27 (Occ-Ori)	358.68 m²
Avenida La Rosita entre carreras 28 y 28A (Occ-Ori)	526.80 m²
Calle 103 #06-141 - Intervención 1	5.29 m²
Calle 103 #06-141 - Intervención 2	19.04 m²
Calle 103A #06-16 (CC El Único) - Intervención 10	28.49 m²
Calle 103A #06-16 (CC El Único) - Intervención 11	18.15 m²
Calle 103A #06-16 (CC El Único) - Intervención 12	15.34 m²
Calle 103A #06-16 (CC El Único) - Intervención 13	188.40 m²
Calle 103A #06-16 (CC El Único) - Intervención 14	9.45 m²
Calle 103A #06-16 (CC El Único) - Intervención 15	43.80 m²
Calle 103A #06-16 (CC El Único) - Intervención 5	11.20 m²
Calle 103A #06-16 (CC El Único) - Intervención 6	6.11 m²
Calle 103A #06-16 (CC El Único) - Intervención 7	8.64 m²
Calle 103A #06-16 (CC El Único) - Intervención 8	18.36 m²
Calle 103A #06-16 (CC El Único) - Intervención 9	17.16 m²
Calle 85 entre carreras 24A y 25	657.00 m²
Calle 89 entre carreras 24 y 25	654.30 m²
Calle 91 entre carreras 25 y 26	702.00 m²
Carrera 26 entre calles 91 y 89	600.00 m²
Carrera 39A #41-80	292.80 m²
Avenida La Rosita entre carrera 19 y 18 (Ori-Occ) Tramo 1	152.00 m²
Avenida La Rosita entre carrera 19 y 18 (Ori-Occ) Tramo 2	57.60 m²
Avenida La Rosita entre carrera 25 y 24 (Ori-Occ)	271.80 m²
Avenida La Rosita entre carrera 27 y 25 (Ori-Occ)	180.00 m²
Avenida La Rosita entre carrera 27 y 28 (Ori-Occ)	240.00 m²
Calle 103 #05-09 - Intervención 1	9.45 m²
Calle 103 #06-03 - Intervención 2	41.40 m²
Calle 103 #06-09 - Intervención 1	70.98 m²
Calle 36 entre carreras 32 y 33 (Occ-Ori)	640.20 m²
Calle 42 entre carrera 37 y 38	392.00 m²
Calle 45 # 4W-05 - Intervención 1	18.45 m²
Calle 45 # 4W-30 - Intervención 1	17.36 m²
Calle 45 # 4W-30 - Intervención 2	11.76 m²
Calle 45 # 5W-05 - Intervención 1	20.79 m²
Calle 45 # 5W-35 - Intervención 2	39.00 m²
Calle 45 # 5W-40- Intervención 1	55.80 m²
Calle 45 # 5W-69- Intervención 1	10.50 m²
Calle 45 # 5W-75- Intervención 1	9.00 m²
Calle 45 # 6W-05 - Intervención 1	49.40 m²
Calle 89 entre carreras 24 y 23	1359.00 m²
Carrera 27 entre calle 55 a y 54 carril 1	598.50 m²
Carrera 38 con calle 42 intersección	81.81 m²
TOTAL	**16.664,27 m²**

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER	2024680010051	$30,904,033,662.30	$30,904,033,662.30

Descripción de actividades desarrolladas

CONTRATO DE OBRA 052 DE 21 DE ABRIL DE 2025 (SI-SI-LP-002-2024) CONSORCIO GENPRO GROUP “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER”.

Valor del contrato:	**$ 29.043.476.777**
Valor Anticipo:	N/A
Plazo inicial:	A monto agotable o hasta el 31 de diciembre de 2025
Fecha de inicio:	23/05/2025
Fecha de terminación inicial:	31/12/2025
Fecha de terminación:	19/03/2026
Estado del Contrato:	En liquidación
Porcentaje avance:	100%

Ubicación: El proyecto se desarrolla en todas las comunas del Municipio de Bucaramanga.

Impacto: Comprende la ejecución de trabajos de mejoramiento y mantenimiento en las vías urbanas de Bucaramanga, mediante obras de bacheo y rehabilitación, en pavimento rígido o flexible buscando así la realizar actividades que mejoran la circulación vial y disminuyen el riesgo de accidentes.

Igualmente, la construcción de reductores de velocidad en diferentes puntos críticos de la ciudad avalados por la Dirección de tránsito de Bucaramanga – DTB, mediante la resolución 328 del 18 de junio de 2024.

1.COMUNA 1 - NORTE

2.COMUNA 2 - NORORIENTAL

3.COMUNA 3 - SAN FRANCISCO

4.COMUNA 4 - OCCIDENTAL

5.COMUNA 5 - GARCÍA ROVIRA

6.COMUNA 6 - LA CORNCORDIA

7.COMUNA 7 - CIUDADELA

8.COMUNA 8 - SUR OCCIDENTE

9.COMUNA 9 - LA PEDREGOSA

10.COMUNA 10 - PROVENZA

11.COMUNA 11 - SUR

12.COMUNA 12 - CABECERA DEL LLANO

13.COMUNA 13 - ORIENTAL

14.COMUNA 14 - MORRORICO

15.COMUNA 15 - CENTRO

15.COMUNA 16 - LAGOS DEL CACIQUE

15.COMUNA 17 – MUTIS

Este proyecto contribuye al mejoramiento del flujo vehicular en la ciudad, y la diminución de accidentes por ende el mejoramiento en los índices de seguridad vial.

Beneficios para la Comunidad:

- **Mejoramiento en el flujo vehicular:** Al contar con vías en buen estado mejora la circulación de los vehículos y los tiempos de circulación.
- **Menor Impacto a daños:** Se disminuye el riesgo de accidentes y daños en el parte automotor y sus componentes mecánicos.
- **Aumento de la Seguridad vial:** Se tiende a baja en la tasa de mortalidad por accidentes y el mejoramiento de las condiciones de los actores viales.



Carrera 15 entre calle 55 y Avenida La Rosita



Carrera 36 entre calle 56 y 55 – Cabecera

Se han realizado trabajos de mantenimiento y rehabilitación de la malla vial en diferentes comunas y barrios de la ciudad enfocados en el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo – Vía urbana mejorada, con un avance de 22 km hasta el momento.

- Concordia – calle 53 entre carrera 15 y 17
- Concordia – calle 52 entre carrera 17 y 17b
- Concordia – calle 17b entre calle 52 y 54
- Concordia – calle 54 entre carrera 15 y 17
- Ciudad Bolívar – Avenida guayacanes entre transversal metropolitana y carrera 1
- Ciudad Bolívar – Calle 64c entre carrera 1 y carrera 6ª
- Ciudad Bolívar – Calle 64 entre carrera 6ª y carrera 5
- Ciudad Bolívar – Carrera 6ª entre calle 63 y 64
- Naranjos – Carrera 3 entre calles 55 y 63ª
- Ciudadela Real de minas - Diagonal 13 entre calle 60 y avenida Samanes
- Ciudadela Real de minas – Carrera 7 sector plaza mayor
- Centro - Carrera 15 entre avenida rosita y calle 61ª
- Antonia Santos – Calle 35 entre carrera 25 y 26
- Delicias Altas – Calle 105 entre transversal metropolitana y carrera 15d
- Kennedy – Carrera 14 entre calles 16 y 17
- Kennedy – Carrera 15 entre calles 14 y 16
- Kennedy – Carrera 14 con calle 13
- Villa Rosa – Calle 13 entre Avenida el libertador y carrera 18ª
- Villa Rosa – Calle 15N avenida principal
- Villa Rosa – Carrera 18b
- Villa rosa – Carrera 20N Avenida principal
- Villa Rosa – Carrera 19N curva entrada a Villa Helena
- Provenza – Calle 115 entre carreras 22 y 23
- Provenza – Calle 114 entre carreras 22 y 23
- Provenza – Calle 113 entre carreras 22 y 23
- Provenza – Calle 112 entre carreras 22 y 23
- Provenza – Carrera 23 entre calle 105 y 111
- Provenza – Calle 108 entre calles 23c y 24ª
- Altos del Cacique
- San Expedito
- Transversal oriental
- Coaviconsa – Calle 103 entre transversal metropolitana y carrera 14
- Calle 61
- La Ceiba
- Carrera 36 entre calle 56 a la 52
- Carrera 35a entre calle 53 y 52
- Los Pinos
- La Joya
- Alfonso López
- La Pedregosa
- Monterredondo
- La Victoria
- Viveros de Provenza
- Los Ángeles
- García Rovira
- Porvenir

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Realizar el mantenimiento periódico o rutinario a 110 Km de Vías terciarias de la malla vial rural de la ciudad por año.

Indicador	Meta 2026	Logro 2026	% Avance 2026	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario km	110	96,05	87%	$ 2.000.000.000	$ 1.400.000.000	70%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VÍAL RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARMANGA SANTANDER	2024680010043	$6.620.379.446	$ 4.218.077.627

Descripción de actividades desarrolladas

CONTRATO DE ALQUILER NO. 114 de fecha 16 de junio de 2025 -: HCL SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS “ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”.

Valor del contrato: $2.818.077,627
Plazo inicial: 6 meses y 6 días.
Fecha de Inicio: 24 de junio de 2025
Fecha de terminación: 30 de diciembre de 2025
Fecha Adicional No 1: 18 de febrero de 2026
Valor del Adicional: $1.400.000.000
Plazo Adicional: 5 meses
Fecha de terminación Final: 18 de Julio de 2026
Estado del contrato: En ejecución.

- **Ubicación del Proyecto**

El proyecto denominado “Mantenimiento Periódico de la Red Vial Rural del Municipio de Bucaramanga” se desarrolla en el área rural de la jurisdicción municipal, la cual se encuentra administrativamente dividida en tres (3) corregimientos

CORREGIMIENTO	SECTORES Y RUTAS DE INTERVENCIÓN
CORREGIMIENTO 1	San Ignacio – La Sabana – El Pantano; La Esmeralda – El Aburrido; San Pedro Alto – San Pedro Bajo (Miramar San Luis); San Cayetano – Vijagual; Angelinos – Santa Rita (vía San Cayetano); Nogal 1 y 2 – Gracia de Dios – El Plan; Angelinos – Bosconia; Bonanza – Villa Carmelo – Villa Luz.

CORREGIMIENTO	SECTORES Y RUTAS DE INTERVENCIÓN
CORREGIMIENTO 2	Veredas: Magueyes, Capilla Alta, Santos Altos, Cuchilla Alta, Monserrate Alta, Boloquí Bajo y Boloquí Alto. Sector Monserrate parte baja (vía Palbas de la Y del Embalse hacia Capilla Baja). Conectividad desde Puente Tona hacia Rosa Blanca, Chitota y Santos Bajos (vía Carabineros).
CORREGIMIENTO 3	Eje principal de El Porvenir a Miradores de la UIS; Pedregal (sectores Dos Sierras y Ancestros); Retiro Chiquito y Retiro Grande (vía principal y sector Acueducto); Gualilo San José – Piñares – León; Malaña Oriental – Gualilo Alto; Santa Bárbara UDES – San Joaquín; Conectividad vía principal a Cúcuta – Miramanga – Tres Balcones; Gualilo Bajo (vía Acueducto) – Malaña parte alta.

Las actividades de intervención con maquinaria amarilla se ejecutan de manera planificada y sectorizada sobre los diferentes corredores viales rurales, priorizados conforme a criterios técnicos como nivel de deterioro, importancia en la conectividad regional, flujo vehicular y requerimientos comunitarios.

La cobertura del proyecto abarca tramos estratégicos que permiten la articulación entre veredas, centros poblados y el casco urbano, garantizando la funcionalidad de la red vial terciaria como eje estructurante del desarrollo rural. La localización de las actividades se ajusta a la programación operativa y a las condiciones topográficas y climáticas propias de cada corregimiento, optimizando así el rendimiento de los equipos y la eficiencia en la ejecución.

- **Impacto del Proyecto**

Impacto Social: La ejecución del mantenimiento periódico de la red vial rural incide de manera directa en el mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiaria, al garantizar condiciones adecuadas de transitabilidad. Esto facilita el acceso oportuno a servicios esenciales como salud, educación y atención institucional, reduciendo el aislamiento de las comunidades rurales y fortaleciendo la integración territorial. Asimismo, contribuye a la seguridad vial al disminuir riesgos asociados al deterioro de la infraestructura.

Impacto Económico: El proyecto fortalece la dinámica económica del sector rural al optimizar las condiciones para el transporte de bienes y servicios, especialmente productos agrícolas y pecuarios. La reducción en los tiempos de desplazamiento, costos operativos y desgaste vehicular genera un impacto positivo en la productividad y competitividad de los productores locales, promoviendo la sostenibilidad de las actividades económicas y el desarrollo regional.

Impacto Ambiental: Las actividades de mantenimiento se ejecutan bajo criterios técnicos orientados a la mitigación de impactos ambientales, incluyendo la adecuada conformación de cunetas, manejo de aguas superficiales y control de procesos erosivos. Estas acciones contribuyen a la estabilidad de la infraestructura vial y a la protección del entorno natural, evitando la degradación del suelo y la afectación de los recursos hídricos presentes en las zonas intervenidas.

Impacto en la Movilidad y Conectividad: La intervención de la red vial rural mejora significativamente los niveles de servicio de las vías terciarias, garantizando condiciones de transitabilidad continua y segura durante diferentes épocas del año. Esto permite una conectividad más eficiente entre los corregimientos y el casco urbano, favoreciendo la articulación territorial y el acceso a mercados, servicios y oportunidades de desarrollo.

MES	HORAS	KM
ABRIL	349,7	22
MAYO	822,8	28,2
JUNIO	620,8	13,85






GECOLSA
MI007476
236B3
Alto de los F
Helados
Mirador Ciudad Bonita
Google
18 jun 2026 9:29:15 a.m.
312° NW
Altitud:1433.8msnm
Velocidad:2.5km/h
Número de índice: 1298


16 jun 2026 10:14:32 a.m.
124° SE
Unnamed Road
Bucaramanga
Santander
Altitud:1726.3msnm
Velocidad:0.4km/h
Número de índice: 547


18 jun 2026 12:07:13 p.m.
351° N
Altitud:1712.8msnm
Velocidad:0.8km/h
Número de índice: 565

RESUMEN DE INTERVENCIÓN EN ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DESPEJE DE VIAS POR OBSTRUCCIÓN, POR LLUVIAS SOBRE LAS VÍAS RURALES Y ZONAS URBANAS AFECTADAS. (OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2025) CON MAQUINARIA PROPIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

RESUMEN CONSOLIDADO 2do. TRIMESTRE ABRIL MAYO JUNIO 2026

ABRIL 2026

	TOTAL HORAS DE INTERVENCIÓN	TOTAL m3	TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS
ACUM. MAR. 2026	47,7	421	3,81

FECHA	Vereda-Barrio	Tramo Intervenido	Corregimiento - Urbano	Horas Máquina Invertida	CANTIDAD m3	Km Intervenidos	Actividades Realizadas
abr-26							
abril 6 2026	Chorreras de don Juan Calle 47 14A-22	Chorreras de don Juan Calle 47 14A-22	Urbano	2,7	15	0	Cargue recolección y despeje de escombros en predio municipal por muro en tapia caído por las lluvias sobre la vía.
abril 6 2026	Calle 45 Cárcel de Mujeres - Campo Hermoso	Vía Calle 45 Cárcel de Mujeres - Campo Hermoso	Urbano	1,5	10	0	Recolección cargue y limpieza de canaletas por material de arrastre erosionado por las lluvias que obstruyen el flujo de aguas lluvias y parte del carril sobre un carril de la vía.
abril 7 2026	Calle 16A 5-82 Barrio La Gloria.- Parque Tejar Norte Calle 19 Cra 10 Parque Tejar Norte	Calle 16A 5-82 Barrio La Gloria. Muro de predio Municipal -- Parque Tejar Norte Calle 19 Cra 10 Parque Tejar Norte	Urbano	0	2	0	Apoyo traslado de material Barrio La Gloria a grupo Cuadrilla del Alcalde y Herramientas Planta Eléctrica - Apoyo traslado de materiales al Parque Tejar Norte Calle 19 Cra 10 Parque Tejar Norte
abril 8 2026	Calle 16A 5-82 Barrio La Gloria.	Calle 16A 5-82 Barrio La Gloria. Muro de predio Municipal	Urbano	0	0	0	Traslado Retroexcavadora para realizar apoyo en excavación y demolición de muro Barrio La Gloria a grupo Cuadrilla del Alcalde.
abril 9 2026	Calle 16A 5-82 Barrio La Gloria.	Calle 16A 5-82 Barrio La Gloria. Muro de predio Municipal	Urbano	13,7	85	0	Excavación de talud en muro demolición de muro en predio municipal en apoyo al grupo de Cuadrilla Alcalde.
abril 10 2026	Calle 16A 5-82 Barrio La Gloria.	Calle 16A 5-82 Barrio La Gloria. Muro de predio Municipal	Urbano	5	50	0	Terminación de excavación de talud y demolición de muro en predio municipal en apoyo al grupo de Cuadrilla Alcalde.
abril 10 2026	Calle 39 carrera 4 Recrear barrio La Joya	Calle 39 carrera 4 Recrear barrio La Joya Cancha de Arena	Urbano	2,5	4	0,15	Nivelación, replanteo extendido de material en superficie de la cancha de tierra aproximadamente 700m2
abril 15 2026	Calle 67 Cra 29 Cancha Parque La Salle	Calle 67 Cra 29 Cancha Parque La Salle	Urbano	0	14	0	Apoyo de recolección de escombros de obra sobre la cancha del parque Barrio La Salle despeje de áreas ocupadas y trasporte de

							materiales de obra sobrantes al Taller Municipal
abril 20 2026	Autopista Girón Calle 70, Barrio 20 de Julio	Autopista Girón Calle 70, Barrio 20 de Julio	Urbano	0,7	8	0	Apoyo recolección de escombros sobre la zona peatonal de la calle 70 Barrio 20 de julio
abril 20 2026	Calle 55 Parque el Pulmón- B. Balconcitos	Cancha Calle 55 Parque el Pulmón- B. Balconcitos	Urbano	3,4	0	0,3	Replanteo, nivelación y extendido de arena de peña sobre la superficie de la cancha Parque el Pulmón. Área de la Cancha 1460 m2.
abril 21 2026	Calle 37 7-31 Taller Municipal	Calle 37 7-31 Taller Municipal	Urbano	0,6	3,5	0	Descargue de material sobrantes de obra en Cancha Barrio La Salle - Descargue
abril 21 2026	Calle 37 7-31 Taller Municipal - Carrasco Municipal	Calle 37 7-31 Taller Municipal - Carrasco Municipal	Urbano	0	3,5	0	Descargue de escombros sobrantes en Carrasco Municipal
abril 21 2026	Bomba EDS Vijagual Vía al Mar	Bomba EDS Vijagual Vía al Mar - Vereda La Esmeralda Sector La vega	C1	4,5	91	0	Cargue y trasporte de recebo de peña desde Bomba Vijagual hasta Acopio en Vereda la Esmeralda.
abril 22 2026	Bomba EDS Vijagual Vía al Mar	Bomba EDS Vijagual Vía al Mar - Vereda La Esmeralda Sector La vega	C1	3,3	35	0	Cargue y trasporte de recebo de peña desde Bomba Vijagual hasta Acopio en Vereda la Esmeralda.
abril 22 2026	Bomba EDS Vijagual Vía al Mar	Bomba EDS Vijagual Vía al Mar - El Palón	C1	2,5	42	0	Apoyo en Cargue a Volquetas externas de contratista con material recebo de peña para relleno en Obra Placa Huellas del Sector el Pablón.
abril 23 2026	Vereda San Pedro Bajo	Vereda San Pedro Bajo	C1	5,6	21	0,2	Cargue y extendido de material en Punto Crítico de la vía San Pedro Bajo, replanteo y cuneteo.
abril 27 2026	Vereda La Esmeralda - Sector Ingreso a la Vega	Vereda La Esmeralda - Sector Ingreso a la Vega	C1	3,5	21	0,2	Extendido de material acopiado, nivelación el tramo inicial del Ingreso a la Vega.
abril 28 2026	Vereda La Esmeralda - Sector Ingreso a la Vega	Vereda La Esmeralda - Sector Ingreso a la Vega	C1	6,2	7	0,2	Extendido de material acopiado, nivelación y compactación el tramo inicial del Ingreso a la Vega.
abril 30 2026	Vereda La Esmeralda - Sector Ingreso a la Vega	Vereda La Esmeralda - Sector Ingreso a la Vega	C1	4	14	0,1	Extendido de material acopiado, nivelación y compactación el tramo inicial del Ingreso a la Vega.
			TOTAL MES ABRIL 2026	**59,7**	**426**	**1,15**	
				TOTAL HORAS DE INTERVENCIÓN	**TOTAL m3**	**TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS**	
			ACUM. ABRIL 2026	***107,4***	***847***	***4,96***	














MAYO 2026

	TOTAL HORAS DE INTERVENCIÓN	TOTAL m3	TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS
ACUM. ABRIL 2026	**107,4**	**847**	**4,96**

FECHA	Vereda- Barrio	Tramo Intervenido	Corregimiento - Urbano	Horas Máquina Invertida	CANTIDAD m3	Km Intervenidos	Actividades Realizadas
may-26							
may-01	La Esmeralda	La Esmeralda - Ingreso a la vega La Batea	C1	7,7	24	0,23	Cargue de material recebo acopiado, extendido, nivelación, cuneteo perfilado y compactación de vía principal.
may-02	La Esmeralda	La Esmerada La Batea - Yee San pedro Bajo	C1	4,3	12	0,26	Cargue de material recebo acopiado, extendido, nivelación, cuneteo perfilado y compactación de vía principal.
may-09	La Esmeralda	La Esmerada - Yee San Pedro Bajo	C1	6,7	30	0,7	Continuación cargue y extendido de material, perfilado, nivelación replanteo cuneteo y compactado.
may-10	La Esmeralda	La Esmerada - Yee San Pedro Bajo	C1	4,3	12	0,6	Continuación cargue y extendido de material, perfilado, nivelación replanteo cuneteo y compactado.
may-11	La Esmeralda	La Esmerada - Los Galpones	C1	6,6	18	0,5	Continuación cargue y extendido de material, perfilado, nivelación replanteo cuneteo y compactado.
may-13	La Esmeralda - Angelinos	La Esmeralda - Angelinos	C1	7,2	24	0	Traslado Retroexcavadora Case para Inicio de Excavación de Canaleta para tubería de agua Potable. (Solicitud de comunidad a Sec. Infraestructura)

may-14	La Inmaculada Fase 1	Barrio La Inmaculada Fase 1	Urbano	0	14	0	Apoyo actividad solicitada por Sec. de Infraestructura recolección de escombros con destino al Carrasco Municipal
mayo 15 2026	Los Angelinos	Los Angelinos	C1	6,3	0	0,285	Reposición de manguera averiada en Retroexcavadora - Continuidad de Excavación en canaleta para mangueras de acueducto en la vereda Angelinos.
may-16	Transversal Central - Sector Terminal de Transportes	Transversal Central - Sector Terminal de Transportes	Urbano	5,7	18	0	Traslado de Minicargador y volqueta para realizar limpieza y recolección de material de arrastre lodo y vegetal del talud sobre la canaleta y la vía del costado sur de la Transversal central Frente a Terminal de Transportes de Bucaramanga
may-17	Transversal Central - Sector Terminal de Transportes	Transversal Central - Sector Terminal de Transportes	Urbano	1,7	18	0	Continuidad de limpieza y recolección de material de arrastre lodo y vegetal del talud sobre la canaleta y la vía del costado sur de la Transversal central Frente a Terminal de Transportes de Bucaramanga
may-18	Transversal Central - Sector Terminal de Transportes	Transversal Central - Sector Terminal de Transportes	Urbano	7,6	18	0	Limpieza y recolección de material de arrastre lodo y vegetal del talud sobre la canaleta y la vía del costado sur de la Transversal central Frente a Terminal de Transportes de Bucaramanga
may-19	Los Angelinos	Los Angelinos	C1	4,7	0	0,36	Continuidad de Excavación en canaleta para mangueras de acueducto en la vereda Angelinos.
may-20	Los Angelinos	Los Angelinos	C1	5,4	0	0,32	Continuidad de Excavación en canaleta para mangueras de acueducto en la vereda Angelinos.
FECHA	**Vereda- Barrio**	**Tramo Intervenido**	**Corregimiento - Urbano**	**Horas Máquina Invertida**	**CANTIDAD m3**	**Km Intervenidos**	**Actividades Realizadas**
may-26							
may-21	Carrasco Municipal	Carrasco Municipal	Urbano	0	7	0	Descargue de material escombros recogidos sobre canaleta y vía de la Transversal Central frente al Terminal de Transportes de canaletas con destino al Carrasco Municipal.
may-21	Los Angelinos	Los Angelinos	C1	5,6	0	0,345	Continuidad de Excavación en canaleta para mangueras de acueducto en la vereda Angelinos.
may-22	Carrasco Municipal	Carrasco Municipal	Urbano	0	7	0	Descargue de material escombros recogidos sobre canaleta y vía de la Transversal Central frente al Terminal de Transportes de canaletas con destino al Carrasco Municipal.
may-23	Transversal Central - Sector Terminal de Transportes	Transversal Central - Sector Terminal de Transportes	Urbano	4,4	0	0	Continuidad de limpieza y recolección de material de arrastre lodo y vegetal del talud sobre la canaleta y la vía del costado sur de la Transversal central Frente a Terminal de Transportes de Bucaramanga
may-25	Carrasco Municipal	Carrasco Municipal	Urbano	0	7	0	Descargue de material escombros recogidos sobre canaleta y vía de la Transversal Central frente al Terminal de Transportes de canaletas con destino al Carrasco Municipal.

may-26	Los Angelinos	Los Angelinos	C1	4,5	0	0,225	Continuidad de Excavación en canaleta para mangueras de acueducto en la vereda Angelinos.
may-27	Los Angelinos	Los Angelinos	C1	5,4	0	0,545	Continuidad de Excavación en canaleta para mangueras de acueducto en la vereda Angelinos.
may-29	Los Angelinos - La Esmeralda	Los Angelinos - La Esmeralda	C1	1,1	0	0	Traslado Retroexcavadora para labores de mantenimiento mecánico y continuidad de mantenimiento de la vía la Esmeralda.
may-30	Transversal Central - Sector Terminal de Transportes	Transversal Central - Sector Terminal de Transportes	Urbano	3,1	0	0	Continuidad de limpieza y recolección de material de arrastre lodo y vegetal del talud sobre la canaleta y la vía del costado sur de la Transversal central Frente a Terminal de Transportes de Bucaramanga
			TOTAL MES MAYO 2026	**92,3**	**209**	**3,6**	
				TOTAL HORAS DE INTERVENCIÓN	**TOTAL m3**	**TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS**	
			ACUM. MAYO 2026	**199,7**	**1056**	**8,56**	

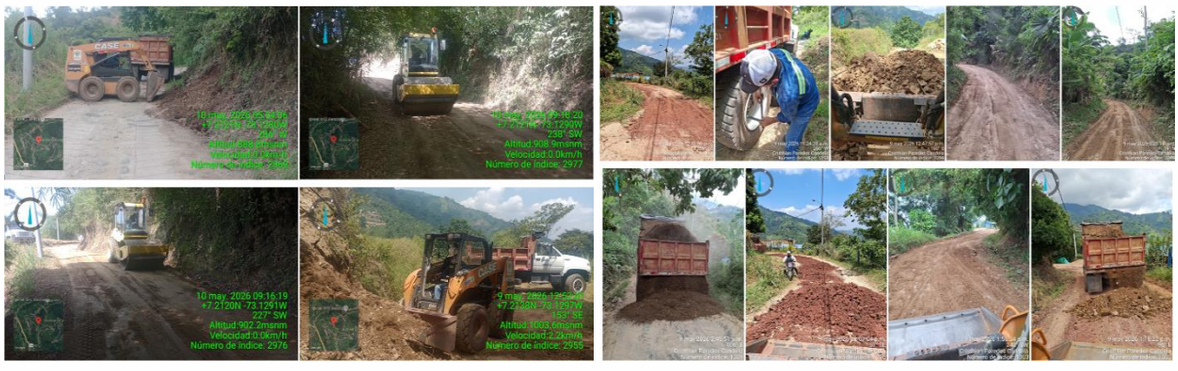

JUNIO 2026

TOTAL MES JUNIO 2026	**92,3**	**155**	**4,37**
	TOTAL HORAS DE INTERVENCIÓN	**TOTAL m3**	**TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS**
			
ACUM. JUNIO 2026	**199,7**	**1002**	**9,33**


FECHA	Vereda- Barrio	Tramo Intervenido	Corregimiento - Urbano	Horas Máquina Invertida	CANTIDAD m3	Km Intervenidos	Actividades Realizadas
jun-26							
junio 01 2026	La Esmeralda	Yee San pedro bajo la Vega - V. la Esmeralda	C1	0,3	21	0	Cargue de recebo acopiado hacia zona de intervención vía principal V. la Esmeralda. Mantenimiento preventivo Sistema de refrigeración Vibro Bomag BW 177 D5

junio 2 2026	CDA Tránsito de Bucaramanga	CDA Tránsito de Bucaramanga	Urbano	0	0	0	Revisión Técnico mecánica volqueta OSA 818 CDA TB
junio 03 2026	La Esmeralda	Yee San pedro bajo la Vega - V. la Esmeralda	C1	3,4	0	0	Continuidad actividad de replanteo nivelación extendido y cuneteo con Recebo sobre Vía a vereda la Esmeralda - El Aburrido
junio 04 2026	Esperanza 3	Esperanza 3	Urbano	0	7	0	Apoyo actividad solicitada por Sec. de Infraestructura recolección de escombros con destino al Carrasco Municipal
junio 05 2026	Carrasco Municipal	Carrasco Municipal	Urbano	0	7	0	Descargue de material escombros recogidos en el barrio Esperanza 3 con destino al Carrasco Municipal.
junio 06 2026	Diamante 2 - Gualilo Bajo	Diamante 2 - Gualilo Bajo km 9 vía Bucaramanga - Pamplona	Urbano - C3	0	28	0	Cargue de material fresado desde barrio Diamante 2 hasta Gualilo Bajo C3
junio 07 2026	Centro de acopio material fresado km 9 vía Bucaramanga - Pamplona	Buenavista - Gualilo bajo	C3	0	30	0	Cargue, transporte y descargue de material fresado en el punto de acopio km 9 vía a Pamplona
junio 08 2026	Transversal Central - Sector Puente el Bueno	Transversal Central - Sector Puente el Bueno	Urbano	5,9	0	0	Limpieza y recolección de material de arrastre lodo y vegetal del talud sobre la canaleta y la vía en el sector puente el Bueno
junio 09 2026	Carrasco Municipal	Carrasco Municipal	Urbano	0	14	0	Descargue de material escombros recogidos sobre canaleta y vía de la Transversal Central frente al puente el bueno con destino al Carrasco Municipal.
junio 10 2026	Vereda La Esmeralda	Vereda La Esmeralda	C1	0	0	0	Mantenimiento preventivo reemplazo de aceite y filtros Minicargador CASE SR 175B
junio 10 2026	SEMCOLSA	Taller municipal	Urbano	0	0	0	Se recoge la volqueta de la aseguradora
junio 13 2026	Transversal Central - Sector Puente el Bueno	Transversal Central - Sector Puente el Bueno	Urbano	2,9	7	0	Limpieza y recolección de material de arrastre lodo y vegetal del talud sobre la canaleta y la vía en el sector puente el Bueno por la transversal central
junio 14 2026	Transversal Central - Sector Puente el Bueno	Transversal Central - Sector Puente el Bueno	Urbano	4,6	7	0	Continuidad limpieza y recolección de material de arrastre lodo y vegetal del talud sobre la canaleta y la vía en el sector puente el Bueno por la transversal central

junio 15 2026	Carrasco Municipal	Carrasco Municipal	Urbano	0	7	0	Descargue de material escombros recogidos sobre canaleta y vía de la Transversal Central frente al puente el bueno con destino al Carrasco Municipal.
junio 17 2026	Carrasco Municipal	Carrasco Municipal	Urbano	0	0	0	Descargue de material escombros recogidos sobre canaleta y vía de la Transversal Central frente al puente el bueno con destino al Carrasco Municipal.
junio 17 2026	Sector Paso malo vía Chimita -café Madrid	Sector Paso malo vía Chimita -café Madrid	Urbano	1,8	0	0	Traslado de Minicargador para realizar limpieza y recolección de escombros en el sector de paso malo.
junio 18 2026	Sector Paso malo vía Chimita -café Madrid	Sector Paso malo vía Chimita -café Madrid	Urbano	6,2	36	0	Remoción, cargue. Despeje y nivelación de escombro sobre áreas del sector Paso Malo.
junio 18 2026	Carrasco Municipal	Carrasco Municipal	Urbano	0	7	0	Descargue de material escombros recogidos sobre canaleta y vía de la Transversal Central frente al puente el bueno con destino al Carrasco Municipal.
junio 19 2026	Sector Paso malo vía Chimita -café Madrid	Sector Paso malo vía Chimita -café Madrid	Urbano	2,5	30	0	Remoción, cargue. Despeje y nivelación de escombro sobre áreas del sector Paso Malo.
junio 21 2026	Autopista Bucaramanga Pamplona - Sector Muro Resiliencia B. Buenos Aires	Autopista Bucaramanga Pamplona - Sector Muro Resiliencia B. Buenos Aires	Urbano	1,8	7	0	Cargue, despeje de escombros sobre la vía nacional y canaleta.
junio 21 2026	Estación de Policía Norte Calle 4 Carrera 15a.	Estación de Policía Norte Calle 4 Carrera 15a.	Urbano	0,9	7	0	Cargue y recolección de llantas Usadas en apoyo con EMAB con destino a Cra 12 15-48 Gaitán.
junio 21 2026	Calle 63 entre Cra. 8 Cra 14a B. Los Almendros B. Bucaramanga.	Calle 63 entre Cra. 8 Cra 14a B. Los Almendros B. Bucaramanga.	Urbano	1,2	7	0	Cargue y Recolección de escombros en el espacio Público.
junio 21 2026	Carrera 15 106-39 B. Dongón Frente a Colegio Santa Ana	Carrera 15 106-39 B. Dongón Frente a Colegio Santa Ana	Urbano	0	7	0	Cargue y Recolección de escombros en el espacio Público.
junio 22 2026	Sector Paso malo vía Chimita -café Madrid	Sector Paso malo vía Chimita -café Madrid	Urbano	3,2	14	0	Despeje remoción cargue y limpieza de área paralela a vía nacional Sector de Paso Malo.
junio 23 2026	Barrio la Esperanza 3	Barrio la Esperanza 3	Urbano	0	7	0	Recolección de escombros de muro caído. Apoyo a cuadrilla de Infraestructura
junio 23 2026	Diamante 2 - Vereda Gualilo	Diamante 2 - Vereda Gualilo		0	21	0	Cargue y traslado de material fresado desde Diamante 2 hasta km 9 vía Bucaramanga -

							Pamplona Vereda Gualilo Alto.
junio 24 2026	Mejoras Públicas Calle 36 Cra. 28 - Vereda Angelinos	Mejoras Públicas Calle 36 Cra. 28 - Vereda Angelinos	Urbano - C1	0	28	0	Transporte de material fresado a Vereda Angelinos.
junio 25 2026	Mejoras Públicas Calle 36 Cra. 28 - B. Baria Paz	Mejoras Públicas Calle 36 Cra. 28 - B. Baria Paz	Urbano	0	21	0	Transporte de material fresado a Barrio maría Paz
junio 26 2026	Barrio María Paz	Barrio María Paz	Urbano	0	0	0,17	Perfilado nivelación extendido de material fresado sobre vías internas del barrio maría Paz
junio 27 2026	Barrio Bosconia-Vereda Bolarquí	Barrio Bosconia-Vereda Bolarquí	Urbano - C2	0	7	0	Traslado de material arena para la comunidad de Vereda Bolarquí sector caserío Institución Educativa.
junio 30 2026	Barrio María Paz	Barrio María Paz	Urbano	0	0	0,65	Perfilado nivelación extendido de material fresado sobre vías internas del barrio maría Paz
			TOTAL MES JUNIO 2026	**34,7**	**327**	**0,82**	
				TOTAL HORAS DE INTERVENCIÓN	**TOTAL m3**	**TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS**	
							
			ACUM. JUNIO 2026	***234,4***	***1329***	***10,15***	




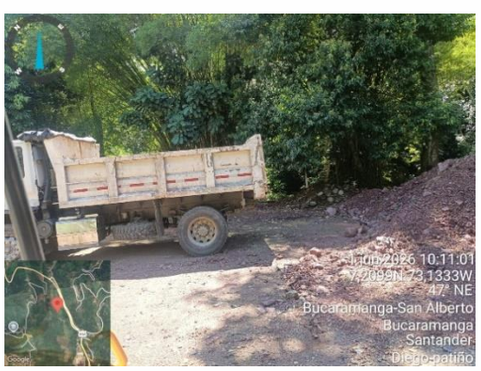








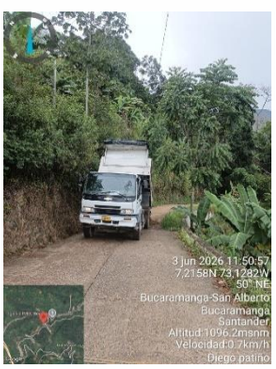

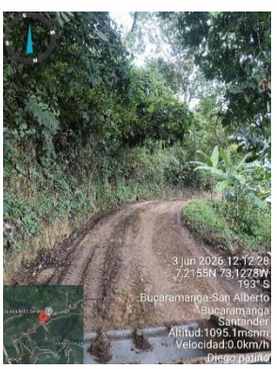

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Construir 5.000 metros lineales de placa huella en la zona rural

Indicador	Meta 2026	Logro 2026	% Avance 2026	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Placa huella construida	310	838	100%	$ 4.432.291.472	$ 2.239.823.112	51%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES A TRAVES DE PLACA HUELLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	202500000035592	$ 2.633.963.069	$ 2.633.963.069

Descripción de actividades desarrolladas

Contrato 024 del 30 de enero de 2026 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-005-2026 el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **CAPILLA ALTA** DEL CORREGIMIENTO DOS (02), PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER"

Valor del contrato: $394.139.879
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 4 meses
Plazo con Prórroga: 5 meses
Fecha de Inicio: 23 de febrero de 2026
Fecha de terminación: 22 de julio de 2026
Estado del contrato: En ejecución
Porcentaje Avance físico ejecutado: 93%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Capilla Alta, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 2 del municipio Bucaramanga.



Placa Huella en la Vereda Capilla Alta

Contrato 025 del 30 de enero de 2026 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-002-2026 el objetivo de “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE **LA VEREDA ESMERALDA** DEL CORREGIMIENTO (1) UNO, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER”

Valor del contrato: $394.139.879
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 4 meses
Plazo con Prórroga: 5 meses
Fecha de Inicio: 23 de febrero de 2026
Fecha de terminación: 22 de julio de 2026
Estado del contrato: En ejecución
Porcentaje Avance físico ejecutado: 80%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda La Esmeralda, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 1 del municipio Bucaramanga.



Placa Huella en la Vereda La Esmeralda

Contrato 026 del 30 de enero de 2026 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-001-2026 el objetivo de “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **RETIRO GRANDE SECTOR ACUEDUCTO** DEL CORREGIMIENTO TRES (03), PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER”

Valor del contrato: $328.790.410
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 4 meses
Plazo con Prórroga: 5 meses
Fecha de Inicio: 23 de febrero de 2026
Fecha de terminación: 22 de julio de 2026
Estado del contrato: En ejecución
Porcentaje Avance físico ejecutado: 92%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Retiro Grande Sector Acueducto, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 3 del municipio Bucaramanga.





Placa Huella en la Vereda Retiro Grande Sector Acueducto

Contrato 027 del 30 de enero de 2026 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-004-2026 el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **ABURRIDO PARTE BAJA** DEL CORREGIMIENTO UNO (1), DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER"

Valor del contrato: $328.790.410
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 4 meses
Plazo con Prórroga: 4 meses
Fecha de Inicio: 23 de febrero de 2026
Fecha de terminación: 7 de julio de 2026
Estado del contrato: Suspendido
Porcentaje Avance físico ejecutado: 0%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Aburrido Parte Baja, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 1 del municipio Bucaramanga.

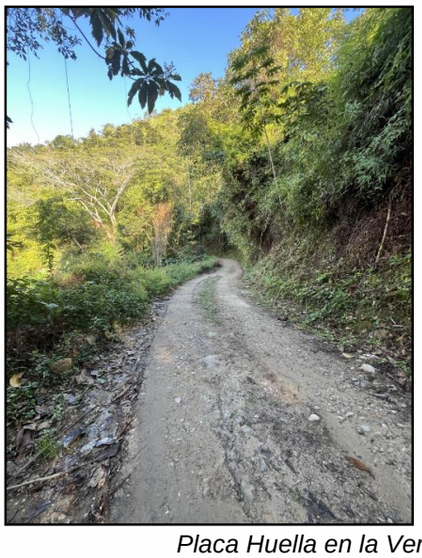


Placa Huella en la Vereda Aburrido Parte Baja

Contrato 028 del 30 de enero de 2026 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-003-2026 el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL **NOGAL PARTE SUR DE LA VEREDA VIJAGUAL**, CORREGIMIENTO 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y ALCANTARILLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"

Valor del contrato: $352.467.825
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 4 meses
Plazo con Prórroga: 4 meses y 15 días
Fecha de Inicio: 23 de febrero de 2026
Fecha de terminación: 7 de julio de 2026
Estado del contrato: En ejecución
Porcentaje Avance físico ejecutado: 95%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Nogal Parte Sur De La Vereda Vijagual, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 1 del municipio Bucaramanga.




Placa Huella en la Vereda Nogal Parte Sur De La Vereda Vijagual

Contrato 029 del 30 de enero de 2026 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-006-2026 el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **SAN PEDRO BAJO SECTOR NORTE MIRAMAR** DEL CORREGIMIENTO UNO (01), PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER"

Valor del contrato: $394.139.879
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 4 meses
Plazo con Prórroga: 5 meses
Fecha de Inicio: 23 de febrero de 2026
Fecha de terminación: 22 de julio de 2026
Estado del contrato: En ejecución
Porcentaje Avance físico ejecutado: 90%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda San Pedro Bajo Sector Norte Miramar, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 1 del municipio Bucaramanga.



Placa Huella en la Vereda San Pedro Bajo Sector Norte Miramar

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES A TRAVES DE PLACA HUELLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	2024680010253	$ 9.522.592.280	$ 8.512.307.597

Descripción de actividades desarrolladas

Impacto: Este importante proyecto tienen un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de estas veredas de ejecución de los proyectos, así como de las veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.

Contrato 068 del 09 de mayo de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-001-2025 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **SAN CAYETANO Y SANTA RITA,** DEL CORREGIMIENTO UNO (1) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER"

Valor del contrato: $410.000.727,00
Plazo inicial: 4 meses
Fecha de Inicio: 20 de mayo de 2025
Fecha de terminación: 19 de septiembre de 2025
Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación
Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda San Cayetano, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 1 del municipio Bucaramanga.



Placa Huella en la Vereda San Cayetano y Santa Rita

Contrato 069 del 09 de mayo de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-005-2025 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **MONSERRATE Y RETIRO GRANDE** DEL CORREGIMIENTO DOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER"

Valor del contrato: $410.000.000,00
Valor del adicional: $21.408.093
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 4 meses
Plazo con prórrogas: ocho (08) meses y cinco (05) días
Suspensión: 3 meses y 15 días
Fecha de Inicio: 26 de mayo de 2025
Fecha de terminación: 12 de mayo de 2026
Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación
Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Monserrate y Retiro Grande, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 2 del municipio Bucaramanga.



Placa Huella en la Vereda Monserrate y Retiro Grande

Contrato 070 del 09 de mayo de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-004-2025 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **LOS ANGELINOS SECTOR LA CEMENTO** DEL CORREGIMIENTO UNO (1), DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER"

Valor del contrato: $410.000.000,00
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 4 meses
Plazo con Prórroga: 5 meses
Fecha de Inicio: 20 de mayo de 2025

Fecha de terminación: 19 de octubre de 2025
Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación
Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Los Angelinos Sector La Cemento, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 1 del municipio Bucaramanga.




Placa Huella en la Vereda Los Angelinos Sector La Cemento

Contrato 071 del 09 de mayo de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-002-2025 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **SANTA BARBARA SECTOR BAJO LA UDES SAN JOAQUIN**, DEL CORREGIMIENTO TRES (3) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y ALCANTARILLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"

Valor del contrato: $410.000.000,00
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 4 meses
Plazo con Prórroga: 5 meses
Fecha de Inicio: 20 de mayo de 2025
Fecha de terminación: 19 de octubre de 2025
Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación
Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Santa Bárbara Sector Bajo La Udes San Joaquín, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 3 del municipio Bucaramanga.

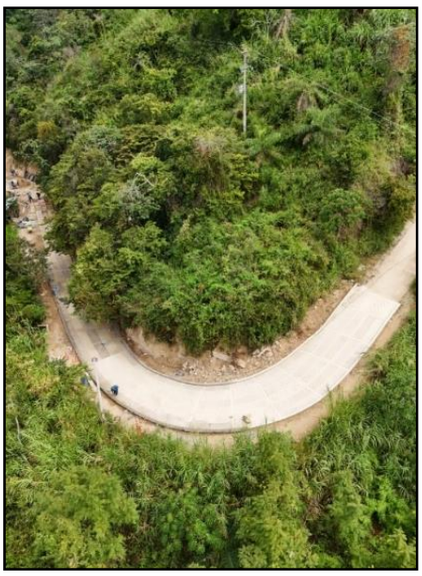Placa Huella en la Vereda Santa Bárbara Sector Bajo La Udes San Joaquín

Contrato 072 del 09 de mayo de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-003-2025 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **LA CAPILLA** DEL CORREGIMIENTO DOS (2) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y ALCANTARILLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"

Valor del contrato: $410.000.000,00
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 4 meses
Plazo con Prórroga: 5 meses
Fecha de Inicio: 20 de mayo de 2025
Fecha de terminación: 19 de octubre de 2025
Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación
Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda La Capilla, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 2 del municipio Bucaramanga.




Placa Huella en la Vereda La Capilla

Contrato 109 del 13 de junio de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-009-2025 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **ROSA BLANCA** DEL CORREGIMIENTO DOS (2), MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y ALCANTARILLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER"

Valor del contrato: $410.000.000,00
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 4 meses
Fecha de Inicio: 4 de agosto de 2025
Fecha de terminación: 3 de diciembre de 2025
Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación
Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Rosa Blanca, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 2 del municipio Bucaramanga.



Placa Huella en la Vereda Rosa Blanca

Contrato 110 del 13 de junio de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-008-2025 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **CUCHILLA ALTA** DEL CORREGIMIENTO DOS (2), DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER"

Valor del contrato: $410.000.000,00
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 4 meses
Plazo con Prórroga: 5 meses
Fecha de Inicio: 12 de agosto de 2025
Fecha de terminación: 15 de febrero de 2026
Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación
Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Cuchilla Alta, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 2 del municipio Bucaramanga.



Placa Huella en la Vereda Cuchilla Alta

Contrato 111 del 13 de junio de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-007-2025 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **SANTA RITA SECTOR CEYLAN MONTECRISTO** DEL CORREGIMIENTO UNO (1) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER"

Valor del contrato: $410.000.000,00
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 4 meses
Plazo con Prórroga: 5 meses
Fecha de Inicio: 18 de julio de 2025
Fecha de terminación: 17 de diciembre de 2025
Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación
Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Santa Rita Sector Ceylan Montecristo, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 1 del municipio Bucaramanga.



Placa Huella en la Vereda Santa Rita Sector Ceylan Montecristo

Contrato 112 del 13 de junio de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-010-2025 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **VIJAGUAL** DEL CORREGIMIENTO UNO (1), DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER"

Valor del contrato: $410.000.000,00
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 4 meses
Fecha de Inicio: 14 de julio de 2025
Fecha de terminación: 13 de noviembre de 2025
Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación
Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Vijagual, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 1 del municipio Bucaramanga.



Placa Huella en la Vereda Vijagual

Contrato 113 del 13 de junio de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-006-2025 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **MAGUEYES** DEL CORREGIMIENTO DOS, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y ALCANTARILLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER"

Valor del contrato: $410.000.000,00
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 4 meses
Plazo con Prórroga: 5 meses
Fecha de Inicio: 14 de julio de 2025
Fecha de terminación: 13 de diciembre de 2025
Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación
Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Magueyes, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 2 del municipio Bucaramanga.



Placa Huella en la Vereda Magueyes

Contrato 210 del 04 de septiembre de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-011-2025 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **GUALILO PARTE ALTA** DEL CORREGIMIENTO TRES, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y ALCANTARILLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER"

Valor del contrato: $410.000.000,00
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 3 meses y 15 días
Plazo con Prórroga: cuatro (04) meses y once (11) días
Fecha de Inicio: 18 de septiembre de 2025
Fecha de terminación: 16 de febrero de 2026

Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación
Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Gualilo Parte Alta, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 3 del municipio Bucaramanga.



Placa Huella en la Vereda Gualilo Parte Alta

Contrato 211 del 04 de septiembre de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-016-2025 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE **SAN PEDRO ALTO** DEL CORREGIMIENTO UNO (1) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y ALCANTARILLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"

Valor del contrato: $328.790.410
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 3 meses y 15 días
Plazo con Prórroga: 5 meses y 24 días
Fecha de Inicio: 18 de septiembre de 2025
Fecha de terminación: 17 de abril de 2026
Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación
Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda San Pedro Alto, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 1 del municipio Bucaramanga.





Placa Huella en la Vereda San Pedro Alto

Contrato 212 del 04 de septiembre de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-013-2025 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL **PEDREGAL** DEL CORREGIMIENTO TRES (3) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER"

Valor del contrato: $762.467.825
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 3 meses y 15 días
Plazo con Prórroga: 6 meses y 15 días
Fecha de Inicio: 18 de septiembre de 2025
Fecha de terminación: 21 de abril de 2026
Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación
Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Pedregal, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 3 del municipio Bucaramanga.

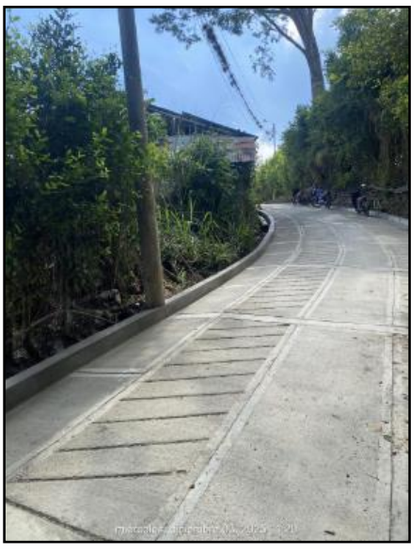Placa Huella en la Vereda Pedregal

Contrato 213 del 04 de septiembre de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-012-2025 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **SAN JOSE** DEL CORREGIMIENTO TRES (3) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER"

Valor del contrato: $762.467.825
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 3 meses y 15 días
Plazo con Prórroga: 6 meses y 15 días
Fecha de Inicio: 18 de septiembre de 2025
Fecha de terminación: 15 de abril de 2026
Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación
Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda San José, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 3 del municipio Bucaramanga.



Placa Huella en la Vereda San José

Contrato 214 del 04 de septiembre de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-015-2025 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **EL ABURRIDO PARTE ALTA**, DEL CORREGIMIENTO UNO (1) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y ALCANTARILLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"

Valor del contrato: $ 352.467.825
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 3 meses y 15 días
Plazo con Prórroga: 6 meses y 15 días
Fecha de Inicio: 22 de septiembre de 2025
Fecha de terminación: 10 de junio de 2026
Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación
Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda El Aburrido Parte Alta, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 1 del municipio Bucaramanga.



Placa Huella en la Vereda El Aburrido Parte Alta

Contrato 220 del 12 de septiembre de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-014-2025 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **LOS SANTOS PARTE ALTA** DEL CORREGIMIENTO DOS (2) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER"

Valor del contrato: $762.467.825
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 3 meses y 15 días
Plazo con Prórroga: 8 meses
Fecha de Inicio: 23 de septiembre de 2025
Fecha de terminación: 4 de junio de 2026
Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación
Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Los Santos Parte Alta, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 2 del municipio Bucaramanga.




Placa Huella en la Vereda Los Santos Parte Alta

Contrato 268 del 30 de octubre de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-017-2025con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BOLARQUI ALTO DEL CORREGIMIENTO DOS (2) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER"

Valor del contrato: $410.000.000
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 2 meses
Plazo con Prórroga: 9 meses
Fecha de Inicio: 11 de diciembre de 2025
Fecha de terminación: 21 de agosto de 2026
Estado del contrato: En ejecución
Porcentaje Avance físico ejecutado: 27%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Bolarqui Alto, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 2 del municipio Bucaramanga.




Placa Huella en la Vereda Bolarqui Alto

Contrato 269 del 30 de octubre de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-018-2025con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BOLARQUI BAJO DEL CORREGIMIENTO DOS (2) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER"

Valor del contrato: $ 273.881.925
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 2 meses
Plazo con Prórroga: 6 meses
Fecha de Inicio: 19 de noviembre de 2025
Fecha de terminación: 21 de mayo de 2026
Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación
Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Bolarqui Bajo, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 2 del municipio Bucaramanga.



Placa Huella en la Vereda Bolarqui Bajo

SECTOR: Vivienda Ciudad y Territorio

PROGRAMA: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Beneficiar a 289.645 usuarios con subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en los estratos 1, 2 y 3.

Indicador	Meta 2026	Logro 2026	% Avance 2026	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Usuarios beneficiados con subsidios al consumo	289.645	289.645	100%	$ 51.976.340.265	$ 9.314.647.081	18%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Subsidios a los servicios púbicos de acueducto, alcantarillado y aseo a la población de estratos 1, 2 y 3 del Municipio de Bucaramanga.	202500000035595	$ 51.976.340.265,90	$ 101.596.696.836,73

Descripción de actividades desarrolladas

Durante el segundo trimestre de la presente vigencia la Secretaria de Infraestructura continúa realizado el pago de los subsidios a las diferentes empresas de servicios públicos, facturación enviada por la Unidad Técnica de Servicios Públicos detalle acumulado por empresas así:

EMPRESA	VALOR PAGADO
ACUEDUCTO	$ 1.686.387.733,00
EMPAS	$ 198.541.069,00
EMAB	$ 2.615.319.282,00
LIMPIEZA URBANA	$ 180.574.208,00
VEOLIA	$ 26.678.494,00
VALOR TOTAL	**$ 4.707.500.786,00**

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Transportar y entregar 18.000 metros cúbicos de Agua potable en carrotanques para garantizar el mínimo vital de agua en zonas sin cobertura del municipio.

Indicador	Meta 2026	Logro 2026	% Avance 2026	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Agua transportada y entregada	6.000	402,30	7%	$ 150.000.000	$ 150.000.000	100%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Suministro de agua potable para garantizar la cobertura del mínimo vital de agua a los sectores de los corregimientos 1, 2, y 3 del Municipio de Bucaramanga, Santander	2024680010053	$ 150.000.000	$ 538.055.514

Descripción de actividades desarrolladas

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 038 DE 30 DE ENERO DE 2026 "SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA GARANTIZAR LA COBERTURA DEL MINIMO VITAL DE AGUA A LOS SECTORES DE LOS CORREGIMIENTOS 1, 2, 3 DEL MUNCIPIO DE BUCARAMANGA.

NÚMERO DEL CONVENIO:	038
FECHA DEL CONTRATO:	30/01/2026
TIPOLOGÍA DEL CONTRATO O CONVENIO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
MODALIDAD DE SELECCIÓN DE CONTRATO:	CONTRATACIÓN DIRECTA
CONTRATISTA	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. ESP
PLAZO EJECUCIÓN:	DIEZ (10) MESES
VALOR INICIAL:	$150.000.000,00
FECHA DE INICIO	16 DE ABRIL DEL 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	15 DE FEBRERO DEL 2026
SUPERVISION ALCALDIA	WILSON MOTTA RODRIGUEZ
SUPERVISION AMB	CARLOS EDUARDO MANTILLA B
Estado del Contrato	: EN EJECUCION
Porcentaje avance	: 14%

Ubicación:

- Vereda Chiltota.
- Asentamiento Villa Carmelo
- El porvenir, Los cuadros.
- Vereda San Ignacio.

Impacto: Este proyecto impacta a 682 familias del sector rural del Municipio de Bucaramanga

Beneficios para la Comunidad:

El artículo 2 de la constitución Política de Colombia, establece que son fines esenciales del estado; servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitución; facilita la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia política y la vigilancia de un orden justo(…)



Imagen No 1. Suministro de agua potable Villa Carmelo



Imagen No 2. Vereda los santos bajos



Imagen No 3. Vereda Chitota



Imagen No 4. Vereda Los Cuadros



Imagen No 5. Estacion Carabineros

3. LINEA ESTRATEGICA 3. TERRITORIO SEGURO Y SOSTENIBLE

SECTOR: Vivienda Ciudad y Territorio

PROGRAMA: Ordenamiento Territorial y Desarrollo urbano

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Adecuar 300,000 metros cuadrados de espacio púbico.

Indicador	Meta 2026	Logro 2026	% Avance 2026	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Espacio público adecuado	119.276	24200,43	20%	$ 86.301.698.033	$ 12.034.452.908	14%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES EQUIPAMIENTO Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	2024680010045	$ 3.013.740.065	$ 3.745.306.988

Descripción de actividades desarrolladas

CONTRATO DE OBRA 065 DEL 2026- "MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS EQUIPAMIENTO Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER"

VALOR TOTAL:	$ 2,735, 880,690
PORCENTAJE AVANCE:	9.55%
ESTADO CONTRATO:	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	04/05/2026
FECHA DE FINALIZACION:	03/08/2026
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES 477
CONTRATO	065-2026
INTERVENTORÍA	MAAS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.
CONTRATO	066-2026
SUPERVISOR INTERVENTORÍA	LAURA ROCÍO GUERRERO LÓPEZ


RESUMEN EJECUTIVO

La intervención del contrato de obra en el marco del mantenimiento y mejoramiento abarca la intervención de (11) once parques:

1. Simón Bolívar
2. Cristo Rey
3. Polideportivo Hacienda San Juan
4. De los niños
5. Carrera 33 calle 51
6. Giordano Bruno
7. De los Enamorados
8. De la Vida
9. Bosque Encantado
10. Las Palmas
11. Carrera 33 Calle 51

De los cuales, (3) tres parques se encuentran en ejecución: Bolívar, Cristo Rey y Polideportivo Hacienda San Juan, los (8) restantes se encuentran próximos a iniciar, ya que los frentes de obra se van abriendo simultáneamente de acuerdo a los avances de las actividades programadas. Esto representa un avance físico del 9.55%.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

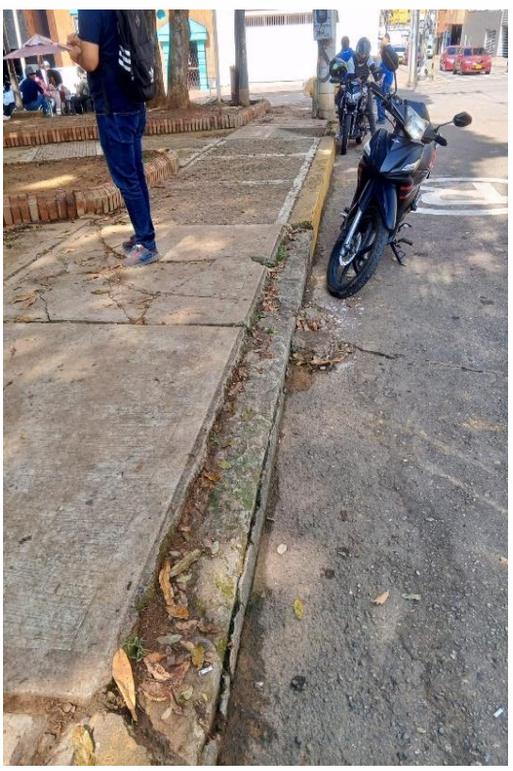
<table>
<tr><th colspan="2">PARQUE SIMÓN BOLIVAR
ANTES DE INTERVENCIONES</th></tr>
<tr><td>
Andenes en mal estado</td><td>
Andenes en mal estado</td></tr>
</table>

PARQUE SIMÓN BOLIVAR EN EJECUCIÓN	
	
Replanteo e instalación de Sardinel	Instalación de anden y bordillo

PARQUE CRISTO REY ANTES	
	
Sardinel destrozado, concreto en mal estado	Juegos oxidados y deteriorados

PARQUE CRISTO REY EN INTERVENCIÓN	
	
construcción del bordillo y del anden	**mejoramiento del piso y de las mallas de la zona de gimnasio biosaludable**

PARQUE POLIDEPORTIVO HACIENDA SAN JUAN ANTES	
	malla y cerramientos en mal estado
	
Cancha sintética deteriorada	

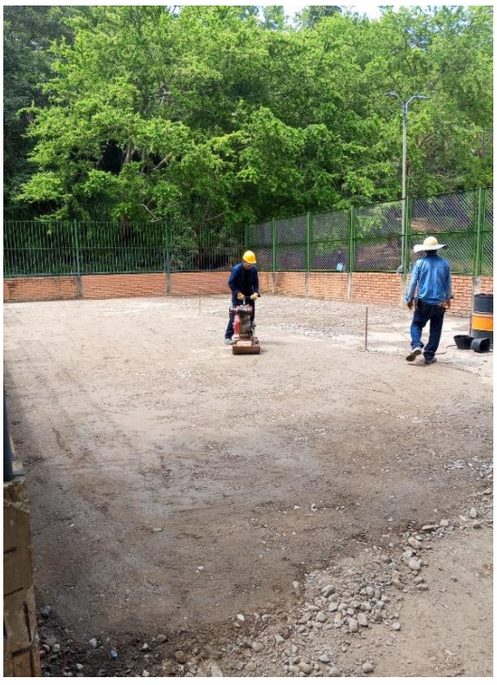PARQUE POLIDEPORTIVO HACIENDA SAN JUAN EN EJECUCIÓN	
	
Por pedido de la comunidad, construcción cancha mini básquet	**Mantenimiento y reparación de cerramiento**

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL BORDE SUR LA VICTORIA EN EL BARRIO LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	2023680010007	$9.042.908.877,23	$14.256.691.826,19

CONTRATO No.184 DE 2023: “LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BORDE SUR LA VICTORIA EN EL BARRIO LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”

VALOR TOTAL DEL CONTRATO : 12.918.441.253,19
PLAZO : SEIS (06) MESES
PLAZO ADICIONAL : SEIS (06) MESES

FECHA DE INICIACIÓN: : Agosto 08 de 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL: : Febrero 08 de 2024

ACTA DE MODIFICACION No 1 : Noviembre 15 de 2023
ACTA DE MODIFICACION No 2 : Diciembre 20 de 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN No 1 : Febrero 06 de 2024
AMPLIACION No 1 A LA SUSPENSIÓN No 1 : Abril 05 de 2024

AMPLIACION No 2 A LA SUSPENSIÓN No 1 : Mayo 03 de 2024

AMPLIACION No 3 A LA SUSPENSIÓN No 1 : Diciembre 06 de 2024

AMPLIACION No 4 A LA SUSPENSIÓN No 1 : Abril 04 de 2025

ACTA DE REINICIO No 1 : Octubre 06 de 2025
OTRO SI No 1 : Octubre 07 de 2025
ACTA DE MODIFICACION No 3 : Octubre 10 de 2025
ACTA DE MODIFICACION No 4 y OTRO SI No 2 : Diciembre 12 de 2025

ACTA DE SUSPENSIÓN No 2 : Diciembre 31 de 2025
ACTA DE REINICIO No 2 : Enero 2 de 2026
ACTA DE SUSPENSIÓN No3 :Abril 06 de 2026
AMPLIACION No 1 A LA SUSPENSIÓN No 3 :Mayo 06 de 2026

AMPLIACION No 2 A LA SUSPENSIÓN No 3 : Mayo 21 de 2026

ACTA DE REINICIO No 3 : Junio 03 de 2026
PRORROGA No 2 : Junio 04 de 2026
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA: : Septiembre 19 de 2026

PORCENTAJE AVANCE : 67,0%
ACUMULADO PROGRAMADO 47.0%
EJECUTADO ACUMULADO 67.0%
ADELANTO 20.0%

ESTADO DEL CONTRATO:

AVANCE Financiero: A la fecha de corte del presente informe del 21 DE JUNIO DE 2026, se tiene los siguientes indicadores frente al VALOR TOTAL DEL CONTRATO un acumulado programado del 22.78% que corresponde a $2.942.328.731,72 contra un ejecutado acumulado de 23.85%, que corresponde a $3.081.387.438,00 presentándose un adelanto del 1.08%.

ACTIVIDADES TECNICAS DE OBRA:

- Desencofrado de muro, tramo 2
- Excavación para zapatas, tramo 4
- Acero para dado de concreto, tramo 3
- Instalación de bordillos para sendero peatonal, tramo 4
- Concreto para vastago de muro, tramo 3
- Vaciado de concreto para anillos, tramo 4

Instalación de base granular para senderos, tramo 4 y 5

ÁREA SOCIAL:
•Inicio de actividades de obra en tramo 1.
•Recorrido en obra.
•Atención de la comunidad.
•Comité de Obra
Oficina de Interventoría
•Trabajo de oficina.

HSEQ:
Obra todos los tramos.

- Acompañamiento en charla de seguridad diaria.
- Recorrido de obra.
- Se inician actividades de tramo 1.
- Se recomienda dejar señalizado tramo 1

- Se recomienda hacer el lavado y limpieza del baño. Tramo 2
- Comité de obra y recorrido.
- Se recomienda guardar o tapar las llantas que se encuentran ubicadas en tramo 2. Prevenir riego biológico
- Se recomienda dejar señalizado el tramo 2 y 1
- Se realiza aseo a los baños
- Ejecución de labores administrativas.

Oficina de Interventoría

- Ejecución de labores administrativas.
- Se imprime el informe HSEQ con las observaciones que estaban pendientes.
- Bajar los megas a los archivos del informe HSEQ de marzo.
- Enviar correo de solicitud de dotación.
- Responder oficios.

ELECTRICO

- Recorrido de obra
- Respuesta oficio NPs
- Informe Semanal
- Comité de obra

ESTRUCTURAL

- Desencofrados muros de contención en concreto reforzado.
- Instalación y apuntalamiento de formaleta para muro de contención en concreto reforzado.
- Armado de refuerzo para muros de contención en concreto reforzado.
- Montaje estructura metálica pasarela. Reunión con especialista en estructuras del consorcio
- Comité de seguimiento con supervisor
- Instalación y apuntalamiento de formaleta para muro de contención en concreto reforzado.
- Armado de refuerzo para Caissons.

TOPOGRAFIA

TRAMO I
- Localización y replanteo caisson
- Materialización de sendero y descapote del tramo
- Levantamiento topográfico

TRAMO II
- Desencofrado de muro

TRAMO III
- Verificación de alineamiento de muro
- Referencia de alineamiento y nivel de dado en concreto
- Vaciado de concreto en vástago de muro – Tramo 3
- Localización de eje de muro

TRAMO IV
- Referencia de alineamiento y nivel de dado en concreto
- Localización de eje de muro
- Instalación de bordillos rectos de confinamiento en senderos
- Excavación de zapatas
- Vaciado anillo en concreto
- Instalación de subbase granular.


TRAMO V
- Instalación de subbase granular**.**

GENERAL
Comité de obra

REGISTRO FOTOGRAFICO

TECNICO-TOPOGRAFIA

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Localización y replanteo caisson</td><td>Desencofrado de muro</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Materialización de sendero y descapote del tramo</td><td>Verificación de alineamiento de muro</td></tr>
<tr><td colspan="2">Anillos de caisson</td></tr>
</table>

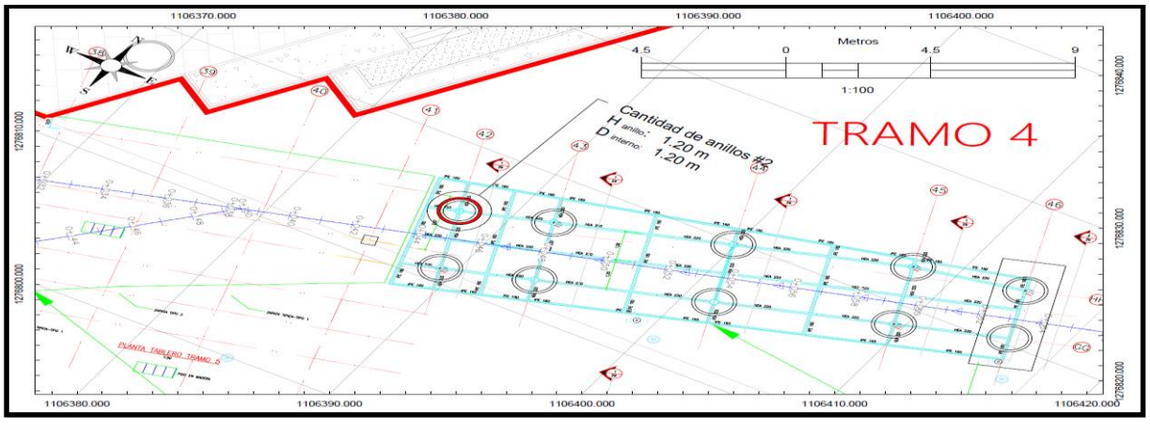


SOCIAL

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Inicio de intervención en tramo 1</td><td>Atención de comunidad</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">Atención de comunidad</td></tr>
</table>


SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

	
Señalización tramo 5	Señalización informativa SST
	
señalización tramo 3	Charlas de seguridad

ELECTRICO

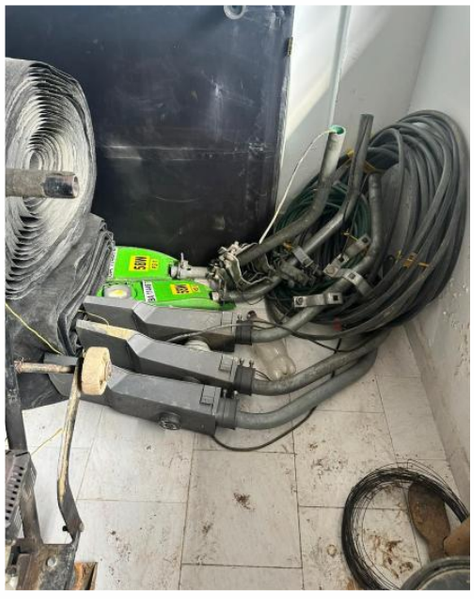	
RETIRO DE LUMINARIAS 5 UNIDADES -	RETIRO DE POSTES METALICOS 5 UNIDADES
	
PROVISIONAL DE ENERGIA	CAJA DE INSPECCIÓN 6 UNIDADES

ESTRUCTURAL

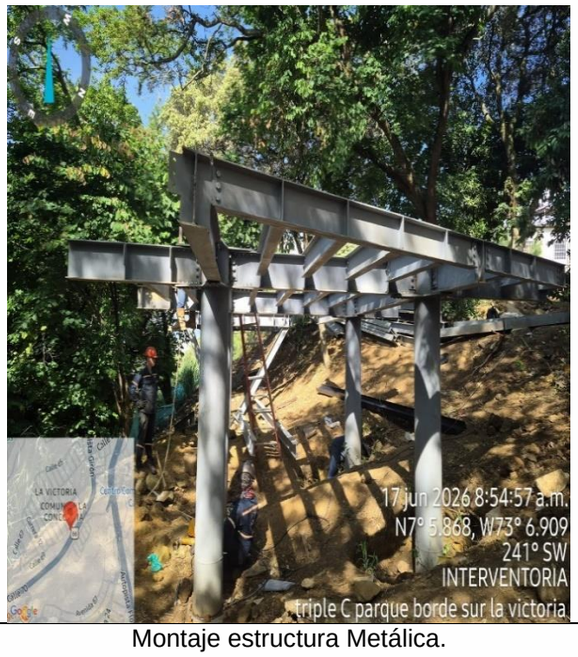	
Desencofrado de Muros de Contención	Instalación y apuntalamiento de formaleta
	
Montaje estructura Metálica.	Montaje estructura Metálica.

Convenio 333 – 2021: **CONVENIO** INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE LA ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P., EL ACUDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P., GASORIENTE S.A.E.S.P. Y EL INSTITUO DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA; PARA LA CONMEMORACIÓN DE LOS 400 AÑOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ÍCONO DE LA CIUDAD.

Objeto: Aunar esfuerzos para conmemorar los 400 años de fundación de la ciudad e Bucaramanga, que tuvo lugar el 22 de diciembre de 1622, permitiendo el posicionamiento de marca de empresas; así como la apropiación de ciudadana territorio; reflejo de identidad y sentido de pertenencia por el patrimonio de la ciudad en favor de sus grupos de interés

CONVENIDOS:	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. NIT:890.201.230-1 ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A E.S. P NIT:890200.162-2 GASORIENTE S.A. E.S.P. NIT:890.205.952-7 INSTITUO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BGA NIT:890.204.594-9 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT:890.201.222-0
VALOR INICIAL:	$1.500.000.000,00
ANTICIPO (%):	$N/A
VALOR ADICIONAL:	$ N/A
VALOR TOTAL:	$ 1.500.000.000,00
PLAZO INICIAL:	14 MESES
PRORROGA No. 1	11 MESES
PRORROGA No. 2	20 DIAS
PLAZO TOTAL:	25 MESES – 20 DIAS
INTERVENTORÍA:	NOMBRE - NIT: N/A
FECHA DE INICIO:	12/11/2021
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	22/12/2023 – 20/01/2024
FECHA DE REINICIO 1:	
ESTADO DEL CONTRATO:	SUSPENDIDO
FECHA TERMINACIÓN FINAL	28/01/2024
PORCENTAJE AVANCE FÍSICO:	0%
AVANCE FINANCIERO:	9.45%

PROBLEMÁTICAS:

1. Que, el día doce (12) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) se suscribió el **CONVENIO** entre el municipio de Bucaramanga y la Electrificadora De Santander S.A. E.S.P., Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P., Gasoriente S.A. E.S.P., Instituto Municipal de Cultura y Turismo De Bucaramanga, que tiene por objeto: "AUNAR ESFUERZOS PARA CONMEMORAR LOS 400 AÑOS DE FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, QUE TUVO LUGAR EL 22 DE DICIEMBRE DE 1622, PERMITIENDO EL POSICIONAMIENTO DE MARCA DE LAS EMPRESAS; ASÍ COMO LA APROPIACIÓN CIUDADANA DEL TERRITORIO; REFLEJO DE IDENTIDAD Y SENTIDO DE PERTENENCIA POR EL PATRIMONIO DE LA CIUDAD EN FAVOR
   DE SUS GRUPOS DE INTERÉS", con aportes por un valor de mil quinientos millones de pesos M/CTE ($1.500.000.000) de acuerdo a la cláusula décima segunda del **CONVENIO.**
2. Que, de conformidad con la cláusula Trigésima Primera el CONVENIO inició su ejecución el 12 de noviembre del 2021, fecha en que se firmó y perfeccionó el mencionado Convenio Interadministrativo
3. Que, el CONVENIO tiene un plazo de ejecución de CATORCE (14) MESES con fecha de terminación: 11 de enero de 2023.
4. Que el día 12 de enero de 2023 se suscribió la prórroga número 1 ampliando el plazo de ejecución del convenio en ONCE (11) MESES, quedando con un plazo total de veinticinco (25) meses, con fecha de terminación 10 de diciembre de 2023.
5. Que el día 07 de febrero de 2023 se suscribió otrosí número 1 al convenio, modificando la CLÁUSULA DÉCIMA - PARÁMETROS DEL CONCURSO ARQUITECTÓNICO, PARÁGRAFO
   SEGUNDO de conformidad con lo argumentado en el acto administrativo.

6. Que el día 06 de diciembre de 2023 se suscribió prórroga número 2 ampliando el plazo de ejecución del convenio en veinte (20) días, quedando con un plazo total de veinticinco (25) meses y veinte (20) días, con fecha de terminación 30 de diciembre de 2023.

7. Que el alcance del convenio incluirá la estructuración de las bases e idea del icono arquitectónico, la realización de un concurso arquitectónico para el diseño y posterior proceso para construcción e instalación de un icono arquitectónico, que refleje los servicios públicos domiciliarios de energía, acueducto y gas, que abordan los siguientes temas: agua, energía eléctrica, gas, energías renovables, comunicaciones y participación ciudadana, conciencia ambiental, historia, cultura local y espacio público, y su interacción e influencia, pasada; presente y futura en el municipio de Bucaramanga.

8. Que para la construcción del monumento conmemorativo los parámetros del convenio indican que la misma deberá ser contratada mediante licitación pública, por lo cual teniendo en cuenta que esta modalidad está regulada por la ley 80 de 1993, el decreto 1082 del 2015 y la ley 1882 del 2018 por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones y que el diseño arquitectónico del monumento será entregado al municipio por el consultor, una vez finalice la ejecución de la consultoría que a su vez está a la espera de la revisión de los ajustes solicitados por el ministerio de cultura para la aprobación del permiso de construcción; por lo tanto no se podrá publicar el proceso licitatorio hasta que se agoten las etapas anteriormente relacionadas.

9. Que, el 22 de diciembre de 2023, se suscribió el Acta de Suspensión No. 1 del Convenio Interadministrativo No. 333 de 2021, teniendo en cuenta que una vez finalizará la ejecución de la consultoría, a su vez debía aguardar la revisión de los ajustes solicitados por el ministerio de cultura para la aprobación del permiso de construcción; por lo tanto, no se podrá publicar el proceso licitatorio hasta tanto no se agoten las etapas anteriormente relacionadas.

Ahora bien, que la suspensión mencionada en el numeral anterior según el tiempo determinado finalizaba el día 20 de enero de 2024; sin tenerse en cuenta que una vez se obtuviera el permiso de intervención por parte del Ministerio de Cultura, debía realizarse una serie de trámites de orden técnico, administrativo y presupuestal al interior de la entidad para poder adelantar el proceso de selección y ejecución de la misma.

En ese orden de ideas nos permitimos señalar a detalle cuales son las actuaciones pertinentes que debemos adelantar con el fin de garantizar la debida ejecución del proyecto:

1. El proceso no se podría finalizar o reiniciar hasta tanto no se expidiera la respectiva autorización por parte del Ministerio de Cultura. Ahora bien, el Ministerio de Cultura expidió la resolución 1414 de 2024, esto para el mes de noviembre, otorgando la respectiva autorización para la intervención.

2. El principio de anualidad que rige en materia presupuestal a las entidades públicas y los plazos que se estipularon para la ejecución del proyecto nos impedía que en un mes y medio pudiera iniciarse y realizarse la obra; reiterando que la expedición del acto administrativo que autoriza la intervención se dio por parte del Ministerio de Cultura solo hasta mediados del mes noviembre de 2024, por tal razón debíamos iniciar el respectivo tramite durante la vigencia 2025.


3. Aunado a lo anterior, para contar con la disposición de los recursos durante la presente anualidad se debía contar con la aprobación de incorporación de recursos del balance al presupuesto.


OBSERVACIÓN TÉCNICO Y JURÍDICA QUE INDICA ALERTA Y QUE SE DEBE TENER EN CUENTA:

Se programa nueva reunión virtual con los convenidos para el 25 de febrero del año en curso debido a que no están conformes con el acta de cierre de controversias y por parte del Gasoriente se presenta un acta para revisión, estudio y aprobación de las partes.

Se realizó reunión virtual el día 4 de marzo con los convenidos dado que el acta de cierre de controversias elaborado por el municipio en donde en la reunión anterior se había dado visto bueno por las partes para sus respectivas firmas, Gasoriente manifiesta que revisando con sus directivos no lo firmarían y elaboraron uno nuevo el cual se expuso para revisión en donde el municipio no lo aprueba debido a que cambió totalmente el aprobado. Se llega al acuerdo entre las partes que el municipio va a revisar las actas enviadas por ESSA, Gasoriente para unificar el acta y en nueva reunión someterlo a revisión por las partes y finiquitar el acta de cierre de controversias para poder continuar con la liquidación del convenio según lo solicitado por los convenidos.

Se llega al acuerdo que se reúnen Vanti y municipio y revisan las actas de reunión de cierre de controversias y el acta de cierre de controversias, una vez se llega a un acuerdo se procede a firmas por las partes. Estas actas ya se encuentran en revisión por parte jurídica de Vanti.

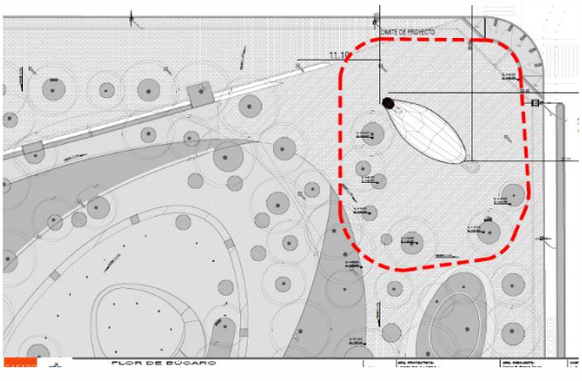

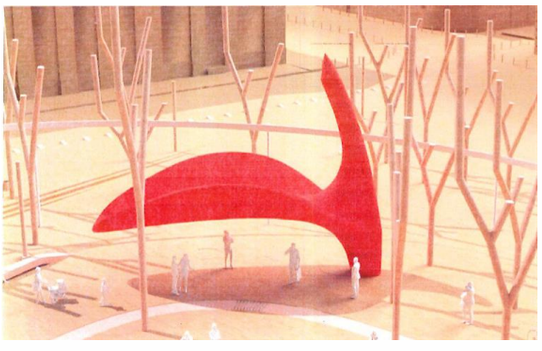

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
ADECUACION DE ESPACIO PUBLICO EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNIICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	2024680010050	$ 24.134.607.023	$ 45.114.109.841,13

CONTRATO DE OBRA 105 de fecha 20 de junio de 2025 -: CONSORCIO ESPACIOS BGA "ADECUACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER".

VALOR INICIAL:	$ 16.317.394.434, 13
VALOR ADICIONAL N° 1:	$ 6.919.976.498,00
VALOR ADICIONAL N° 2:	$ 2.783.384.571,00
VALOR TOTAL CON ADICIONALES:	$ 26.020.755.503,13
PLAZO INICIAL:	PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (11 DE AGOSTO Y EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)
PLAZO ADICIONAL N° 1:	NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL N° 2:	NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL N° 3:	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO


PLAZO TOTAL CON ADICIONALES:	ONCE (11) MESES Y DIECIOCHO (18) DÍAS
PORCENTAJE AVANCE:	89,79%
ESTADO CONTRATO:	EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO:	11/08/2025
FECHA DE FINALIZACION:	19/08/2026
CONTRATISTA	Consorcio Espacios BGA
INTERVENTORÍA	Consorcio Inter Urbanismo BGA
SUPERVISOR	Laura Rocío Guerrero López

RESUMEN EJECUTIVO

De acuerdo con el análisis del avance financiero de los barrios priorizados, se evidencia una ejecución acumulada de $23.209.731.156,17, equivalente al 89,79 % del presupuesto total asignado de $25.847.487.981,32. Asimismo, se observa que la mayoría de los barrios alcanzaron una ejecución del 100 %, lo que demuestra un alto nivel de cumplimiento en la destinación y ejecución de los recursos asignados

1. REGISTRO FOTOGRAFICO

BARRIO DANGOND
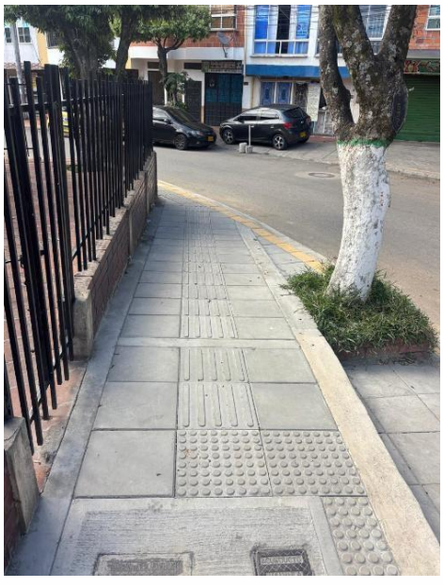
<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>


BARRIO PORVENIR

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>


BARRIO MANUELA BELTRAN

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

BARRIO GARCIA ROVIRIA

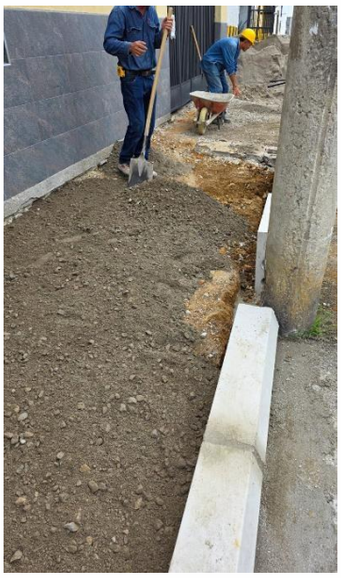BARRIO RICAUTE



BARRIO SOTOMAYOR

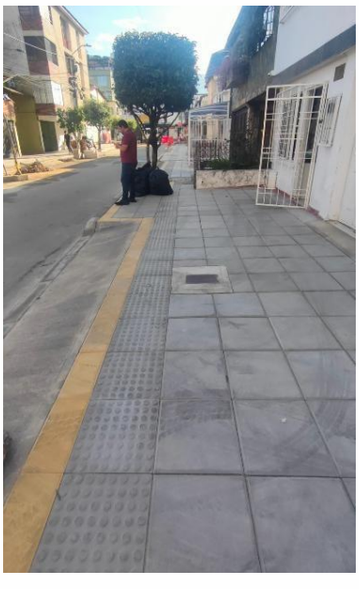BARRIO SAUCES

BARRIO QUINTADANIA

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>


BARRIO MEJORAS PUBLICAS

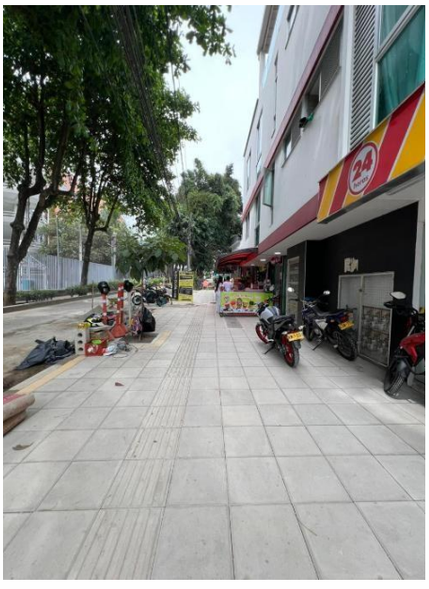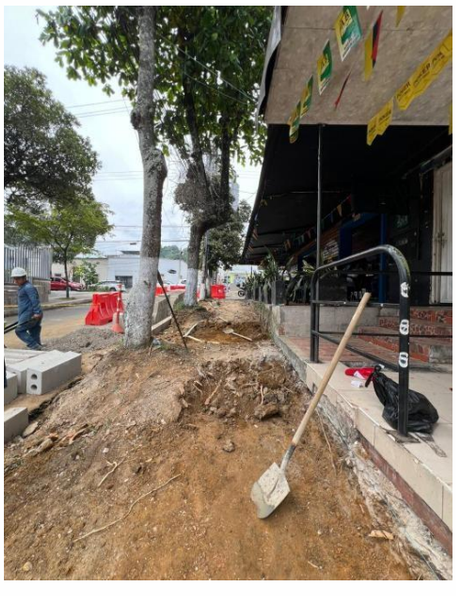BARRIO LA AURORA

BARRIO PLAZA MAYOR


BARRIO MUTUALIDAD

BARRIO LOS ANGELES

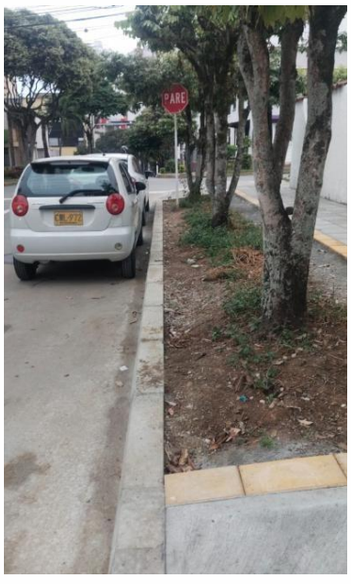BARRIO MINUTO DE DIOS

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA

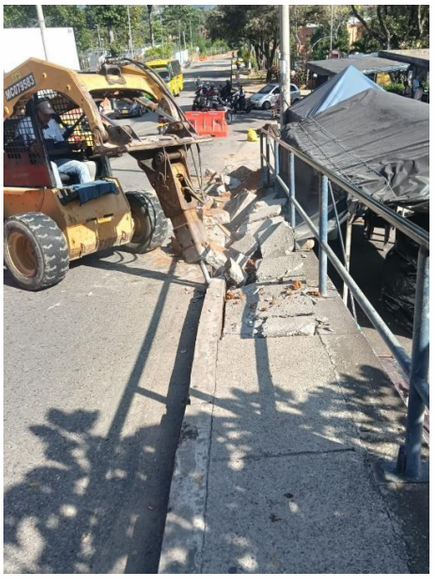ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA N° 105 DE 2025 - 06 DE JUNIO DE 2026

	N°	Comuna	Vigencia	Barrio	Presupuesto Asignado	Presupuesto ejecutado	% Ejecutado	M2 ejecutado
Alcance inicial	1	1	2022	Colorados	$ 245.050.280,16	$ 245.050.280,16	100,00%	138,47
	2	1	2022	Villas de San Ignacio	$ 245.050.280,16	$ 245.050.280,16	100,00%	147,85
	3	1	2022	Paisajes del Norte	$ 245.050.280,16	$ 245.050.280,16	100,00%	290,32
	4	2	2023	San Cristobal	$ 294.178.529,98	$ 294.178.529,98	100,00%	440,49
	5	2	2022	Transición I	$ 245.050.280,16	$ 245.050.280,16	100,00%	29,13
	6	2	2022	Transición V	$ 245.050.280,16	$ 245.050.280,16	100,00%	34,38
	7	17	2022	Estoraques I	$ 245.050.280,16	$ 245.050.280,16	100,00%	225,43
	8	11	2022	Villa Flor	$ 245.050.280,16	$ 245.050.280,16	100,00%	335,75
	9	2	2023	Esperanza III	$ 294.178.529,98	$ 294.178.529,98	100,00%	474,59
	10	3	2021	Modelo	$ 227.089.762,49	$ 227.089.762,49	100,00%	263,27
	11	3	2023	Alarcon	$ 294.178.529,98	$ 294.178.529,98	100,00%	322,22
	12	3	2022	Mutualidad	$ 227.089.762,49	$ 227.089.762,49	100,00%	340,08
	13	3	2021	San Francisco	$ 245.050.280,16	$ 245.050.280,16	100,00%	340,96
	14	4	2022	12 de Octubre	$ 245.050.280,16	$ 245.050.280,16	100,00%	245,55
	15	4	2022	23 de Junio	$ 245.050.280,16	$ 245.050.280,16	100,00%	323,66
	16	13	2023	Bolivar	$ 294.178.529,98	$ 294.178.529,98	100,00%	64,87
	17	5	2022	Primero de mayo	$ 227.089.762,49	$ 227.089.762,49	100,00%	205,45
	18	5	2022	Chorreras de Don Juan	$ 245.050.280,16	$ 245.050.280,16	100,00%	338,96
	19	5	2022	Alfonso Lopez	$ 245.050.280,16	$ 245.050.280,16	100,00%	347,28
	20	12	2023	Los Cedros	$ 294.178.529,98	$ 294.178.529,98	100,00%	274,56
	21	6	2022	Ricaurte	$ 245.050.280,16	$ 245.050.280,16	100,00%	348,69
	22	7	2022	Ciudad Bolivar	$ 245.050.280,16	$ 245.050.280,16	100,00%	251,63
	23	7	2023	Macaregua	$ 294.178.529,98	$ 294.178.529,98	100,00%	270,25
	24	7	2023	Samanes	$ 294.178.529,98	$ 294.178.529,98	100,00%	291,79
	25	12	2022	Bolarqui	$ 245.050.280,16	$ 245.050.280,16	100,00%	310,69
	26	7	2021	San Marcos	$ 245.050.280,16	$ 245.050.280,16	100,00%	349,77
	27	7	2023	Almendros	$ 294.178.529,98	$ 294.178.529,98	100,00%	434,42
	28	8	2022	San Gerardo	$ 245.050.280,16	$ 245.050.280,16	100,00%	179,91
	29	9	2021	La Pedregosa	$ 227.089.762,49	$ 213.123.742,10	93,85%	235,37
	30	9	2022	San Martin	$ 245.050.280,16	$ 203.759.307,95	83,15%	235,57
	31	7	2024	La Victoria	$ 245.050.280,16	$ 245.050.280,16	100,00%	265,13
	32	9	2022	Asturias 2	$ 245.050.280,16	$ 245.050.280,16	100,00%	285,7
	33	9	2023	San Pedro	$ 294.178.529,98	$ 294.178.529,98	100,00%	420,1
	34	10	2020	Provenza	$ 136.175.582,61	$ 136.175.582,61	100,00%	183,16
	35	10	2022	Viveros de Provenza	$ 245.050.280,16	$ 245.050.280,16	100,00%	285,45
	36	2	2022	Villa Helena	$ 245.050.280,16	$ 245.050.280,16	100,00%	206,67
	37	12	2023	El Jardin	$ 294.178.529,98	$ 294.178.529,98	100,00%	236,51
	38	5	2022	Campo Hermoso	$ 183.658.405,53	$ 183.658.405,53	100,00%	249,91
	39	11	2023	Igsabelar	$ 294.178.529,98	$ 294.178.529,98	100,00%	297,28
	40	11	2022	Delicias Altas	$ 245.050.280,16	$ 245.050.280,16	100,00%	309,39
	41	11	2022	Malpaso	$ 245.050.280,16	$ 245.050.280,16	100,00%	317,07
	42	13	2023	La Aurora	$ 294.178.529,98	$ 294.178.529,98	100,00%	406,85
	43	10	2023	Cristal Alto	$ 294.178.529,98	$ 3.588.978,07	1,22%	0
	44	11	2023	Candado	$ 294.178.529,98	$ 294.178.529,98	100,00%	305,46
	45	12	2022	Conucos	$ 245.050.280,16	$ 245.050.280,16	100,00%	311,76
	46	12	2022	Antiguo Campestre	$ 245.050.280,16	$ 245.050.280,16	100,00%	344,8
	47	12	2023	Mercedes	$ 294.178.529,98	$ 294.178.529,98	100,00%	424,7
	48	13	2023	El Prado	$ 294.178.529,98	$ 294.178.529,98	100,00%	430,98
	49	2	2023	Esperanza I	$ 294.178.529,98	$ 294.178.529,98	100,00%	216,91
	50	13	2022	Tejaditos	$ 245.050.280,16	$ 245.050.280,16	100,00%	287,78
	51	13	2022	Quintadania	$ 245.050.280,16	$ 245.050.280,16	100,00%	309,05
	52	13	2022	Los Pinos	$ 245.050.280,16	$ 245.050.280,16	100,00%	359,53
	53	9	2023	La Libertad	$ 294.178.529,98	$ 294.178.529,98	100,00%	381,2
	54	13	2023	Mejoras publicas	$ 294.178.529,98	$ 294.178.529,98	100,00%	405,58
	55	13	2023	San Alonso	$ 294.178.529,98	$ 294.178.529,98	100,00%	412,61
	56	14	2023	Morrorico	$ 294.178.529,98	$ 294.178.529,98	100,00%	409,85
	57	15	2023	Centro	$ 294.178.529,98	$ 294.178.529,98	100,00%	80,56
	58	11	2022	Granjas de Julio Rincon	$ 227.089.762,49	$ 227.089.762,49	100,00%	260,8
	59	16	2021	Balcon del Lago	$ 227.089.762,49	$ 227.089.762,49	100,00%	137,06
	60	16	2021	Tejar	$ 227.089.762,49	$ 227.089.762,49	100,00%	249,69
	61	17	2023	Mutis	$ 294.178.529,98	$ 294.178.529,98	100,00%	255,45
	62	17	2022	Garcia Rovira	$ 245.050.280,16	$ 245.050.280,16	100,00%	291,99
	63	17	2022	Estoraques II	$ 245.050.280,16	$ 245.050.280,16	100,00%	339,72
Adicional 1	64	1	2024	Colseguros Norte	$ 315.363.415,00	$ 315.363.415,00	100,00%	189,50
	65	1	2024	Minuto De Dios	$ 315.363.415,00	$ 14.506.717,09	4,60%	0,00
	66	2	2024	Villa Mercedes	$ 315.363.415,00	$ 16.398.897,58	5,20%	0,00
	67	3	2024	Alarcón	$ 315.363.415,00	$ 315.363.415,00	100,00%	413,90
	68	6	2022	La Victoria	$ 315.363.415,00	$ 315.363.415,00	100,00%	354,98
	69	7	2024	Real De Minas	$ 315.363.415,00	$ 315.363.415,00	100,00%	308,46
	70	8	2024	Juan XXIII	$ 315.363.415,00	$ 315.363.415,00	100,00%	77,82
	71	9	2024	Villa Inés	$ 315.363.415,00	$ 315.363.415,00	100,00%	270,00
	72	11	2024	Manuela Beltrán	$ 315.363.415,00	$ 315.363.415,00	100,00%	115,00
	73	11	2024	Porvenir	$ 315.363.415,00	$ 315.363.415,00	100,00%	150,00
	74	12	2024	Sotomayor	$ 315.363.415,00	$ 315.363.415,00	100,00%	486,00
	75	12	2024	Antiguo Campestre	$ 315.363.415,00	$ 115.864.518,67	36,74%	98,67
	76	12	2024	Conucos	$ 315.363.415,00	$ 315.363.415,00	100,00%	125,81
	77	13	2022	Pinos	$ 315.363.415,00	$ 315.363.415,00	100,00%	252,24
	78	13	2024	Galán - Quintadania *	$ 315.363.415,00	$ 315.363.415,00	100,00%	200,00
	79	14	2024	Sauces	$ 315.363.415,00	$ 315.363.415,00	100,00%	132,00
	80	15	2024	García Rovira	$ 315.363.415,00	$ 228.417.721,48	72,43%	290,89
	81	16	2024	Altos Del Cacique	$ 315.363.415,00	$ 189.123.439,98	59,97%	210,00
	82	17	2024	Estoraques 1	$ 315.363.415,00	$ 315.363.415,00	100,00%	322,53
	83	12	2025	Bolarquí	$ 352.648.638,00	$ 352.648.638,00	100,00%	319,33
	84	12	2025	Mercedes	$ 352.648.638,00	$ 352.648.638,00	100,00%	387,89
	85	7	2025	Plaza mayor	$ 352.648.638,00	$ 212.788.188,17	60,34%	238,00
Adicional 2	86	11	2020 y 2023	Dangond	$ 366.557.664,00	$ 20.380.606,12	5,56%	0,00
	87	2	2021	Los Angeles	$ 227.089.762,00	$ 9.787.568,74	4,31%	0,00
	88	9	2021	Nueva Granada	$ 227.089.762,00	$ 0,00	0,00%	0,00
	89	6	2023	La Ceiba	$ 294.178.531,00	$ 7.060.284,74	2,40%	0,00
	90	13	2025	Mejoras públicas	$ 352.648.638,00	$ 0,00	0,00%	0,00
	91	3	2025	Mutualidad	$ 352.648.638,00	$ 0,00	0,00%	0,00
	92	10	2025	Diamante II	$ 352.648.638,00	$ 12.554.291,51	3,56%	0,00
	93	6	2025	La Aurora	$ 352.648.638,00	$ 0,00	0,00%	0,00

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Mantener 100 parques en el municipio

Indicador	Meta 2026	Logro 2026	% Avance 2026	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Parques mantenidos	30	9,55	32%	$ 16.056.535.615	$ 3.013.740.065	19%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES, EQUIPAMENTO Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER.	2024680010045	$ 3.000.000.000	$ 3.731.566.923,14

Descripción de actividades desarrolladas

Con este proyecto se ha podido realizar el mantenimiento y embellecimiento de 56 parques de la ciudad trabajo realizado por la cuadrilla del Alcalde.

Contrato 244 – 2024: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES DEL MUNICIPIO:

CONTRATISTA: JAIRO OSORIO CABALLERO
NIT: 912.282.210-0
VALOR INICIAL: $616.071.617,60
ANTICIPO (%): $0
VALOR ADICIONAL: $ 0
VALOR TOTAL: $ 616.071.617,60
PLAZO INICIAL: 14 DÍAS
PRORROGA No. 1 3MESES 13 DIAS
PRORROGA No. 2 4 MESES
PRORROGA No. 3 1 MES – 26 DIAS
PLAZO TOTAL: 9 MESES - 23 DIAS
INTERVENTORÍA: NOMBRE - NIT: N/A
FECHA DE INICIO: 18/12/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 24/12/2024 – 14/01/2025
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN: 15/01/2024 – 28/02/2025
FECHA DE REINICIO 1: 01/03/2025
ESTADO DEL CONTRATO: TERMINADO
FECHA TERMINACIÓN FINAL 19/12/2025
PORCENTAJE AVANCE FÍSICO: 95%%
AVANCE FINANCIERO: 29.74%

OBSERVACIONES: Se elaboró la solicitud de constitución de pasivo exigible por un valor de $371.228.146,50, con el fin de garantizar la disponibilidad de los recursos requeridos para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. De manera paralela, se continúa adelantando el proceso de liquidación contractual; sin embargo, este se encuentra pendiente debido a que el contratista aún no ha presentado las correcciones solicitadas al informe final, ni ha radicado los documentos originales debidamente suscritos, así como los demás soportes y actuaciones requeridas para culminar el trámite de liquidación

PROBLEMÁTICAS: Se ha citado de manera reiterativa al contratista para ejercer garantía por el insumo de los columpios ya que son de mala calidad.

PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS (por componente):

Componente Técnico: Componente Técnico:

La finalidad del contrato es poder realizar el pedido, compra, entregas y suministro de materiales de ferretería y herramientas para el mantenimiento periódico de la infraestructura de los parques ubicados en el municipio de Bucaramanga. Para ello realizamos un paso a paso de actividades necesarias para la correcta ejecución del mismo, las cuales se enuncian a continuación:

1. Los insumos se encuentran almacenamos en el Taller Municipal ubicado en la calle 37 # 7- 31, Barrio Alfonso López, en donde contamos con 3 bodegas.
2. La recepción de los insumos se realizó la revisión, conteo y verificación respectiva del pedido e inventario correspondiente según remisión enviada por parte del contratista y se procedió a su respectivo almacenaje e ingreso al sistema de inventarios del municipio.
3. El control de salidas e inventario de los suministros se lleva mediante documento interno en formato Excel, en donde se registra cada salida de material.
4. El inventario de las bodegas se verifica de manera mensual para poder llevar el control de salidas y un óptimo registro en el documento Excel para su control.
5. Se elaboró la solicitud de constitución de pasivo exigible por un valor de $371.228.146,50, con el fin de adelantar el trámite administrativo correspondiente para garantizar la disponibilidad de los recursos destinados al cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.
7. El día 22 de mayo de 2026 se elaboró el oficio identificado con el radicado 2-S-SdIB-202605-00046041, mediante el cual se solicitó al contratista hacer efectiva la garantía correspondiente a 50 columpios que fueron recibidos con defectos de fabricación, con el fin de que se adelanten las acciones necesarias para su reparación o reposición, de conformidad con las obligaciones contractuales.
8. El día 19 de junio de 2026 se elaboró el oficio identificado con el radicado 2-S-SdIB-202606-00056059, mediante el cual se reiteró al contratista la solicitud de hacer efectiva la garantía correspondiente a los columpios defectuosos, debido a la ausencia de respuesta al requerimiento inicial. Asimismo, se remitió copia del oficio a la aseguradora del contrato, con el fin de poner en conocimiento la situación y adelantar las actuaciones que correspondan en el marco de la garantía contractual.
9. Se remitieron, mediante correo electrónico, las observaciones requeridas para la corrección del informe final presentado por el contratista, con el fin de que este cumpliera con los ajustes necesarios para dar continuidad al proceso de liquidación del contrato.
10. A la fecha, el contratista no ha dado respuesta a la solicitud de hacer efectiva la garantía correspondiente a los columpios defectuosos. En consecuencia, se proyecta la elaboración de un último requerimiento mediante oficio, con copia a la aseguradora del contrato, con el fin de instar al cumplimiento de la obligación y adelantar las actuaciones que correspondan en el marco de las garantías contractuales.
11. A la fecha, se está a la espera de que el contratista presente en medio físico la totalidad de los documentos debidamente suscritos, con el fin de dar continuidad al proceso de liquidación del contrato y culminar el trámite correspondiente.









META E INDICADOR DE PRODUCTO: Mantener 1,605,851 metros cuadrados de zonas verdes

Indicador	Meta 2026	Logro 2026	% Avance 2026	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Zonas verdes mantenidas	1605851	1210320	75%	$ 21.553.059.189	$ 4.398.193.087	20%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Mantenimiento y manejo integral arbóreo y de zonas verdes en el municipio de Bucaramanga, Santander	2024680010046	$ 14.838.630.390	$ 36.501.928.636

Descripción de actividades desarrolladas

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 135 DEL 26 DE JUNIO DE 2025 suscrito con: EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA (EMAB) SA ESP con el objeto de “"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA y LA EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA(EMAB)PARADESARROLLAR ACTIVIDADESRELACIONADAS CON LA

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES UBICADAS EN EL ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.""".

CONVENIADO:	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA (EMAB) S.A. E.S.P. NIT. 804.006.674-8
VALOR INICIAL:	$ 6.384.842.436,00
VALOR ADICIONAL 01:	$ 3.192.421.218,00
VALOR ADICIONAL 01:	$ 707.860.463,00
VALOR ACUMULADO:	$ 10.285.124.117
FECHA DE INICIO:	29/08/2025
FECHA TERMINACION:	07/05/2026
SUPERVISION:	CARLOS JAVIER MENDEZ SUAREZ SUB SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
ESTADO DEL CONTRATO:	FINALIZADO
PORCENTAJE AVANCE FÍSICO:	99.2 %
AVANCE FINANCIERO:	83,20%
PERIODO INFORME:	PRIMER SEMESTRE DE 2026 (ENERO A JUNIO)

Ubicación:

- Parques y zonas verdes ubicadas en el espacio público del municipio de Bucaramanga, Santander

Impacto: El impacto que genera el convenio 135 en el municipio de Bucaramanga es de alto alcance, la realización de los siete componentes ejecutados a lo largo del municipio ha reflejado un impacto positivo. Entre los aspectos a destacar en el desarrollo del convenio se destacan: La siembra de cobertura vegetal en áreas de gran afluencia como el Parque Santander y el Parque de los niños, parque las cigarras, rotonda del meson de los bucaros, separadores viales y también la siembra de césped en las zonas secas (áridas) del Parque de los Niños, Riego de cobertura vegetal en áreas como el Mesón de los Búcaros, Parque Turbay, Parque de los Niños, Parque Santander, Puerta del sol y los diferentes separadores viales (separador calle 36 , separador calle 45), recolección y transporte de residuos sólidos ordinarios (residuos bolsa negra) y residuos voluminosos localizados en los parques y zonas verdes del municipio, mantenimiento de coberturas vegetales en el municipio de Bucaramanga de las zonas donde se realiza la siembra, Corte de césped en las áreas verdes del municipio y parqueros encargados de la jardinería, la limpieza en las áreas verdes del municipio.

ESTADO DEL CONTRATO:

El contrato ha finalizado en fecha mayo 07-2026, ha logrado un avance de ejecución de 99,2 % está pendiente el acta de recibo final y acta de liquidación.
En este primer semestre al mes de junio se ha logrado la intervención de 1.210.320 m2 de áreas del 1.605.851 m2 establecidos en el convenio.


Cabe resaltar que 1.605.851 m2 es el alcance total de metros cuadrados establecidos en el convenio, aunque el total de m2 intervenidos por el convenio ha sido mayor. Esto se debe a que las áreas han sido intervenidas en diferentes ocasiones y por diferentes componentes. Es decir, un área como el parque de los niños puede tener intervención de los 7 componentes según lo requiera el componente técnico.

En las intervenciones establecidas en las diferentes áreas se puede destacar el aspecto técnico y la caracterización de cada área ya que para la intervención se debe segregar que tipo de intervención requiere el área para poder ejecutar efectivamente los metros cuadrados establecidos en el convenio.

Las cuadrillas de trabajo de todos los componentes han estado distribuidas a lo largo del municipio de Bucaramanga generando el siguiente resumen de intervenciones, durante el primer semestre de 2026:

COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
LIMPIEZA DE PARQUES	METRO CUADRADO	1.429.800
MANTENIMIENTO DE COVERTURA VEGETAL	METRO CUADRADO	345.750
RIEGO DE AREAS VERDES	METRO CUADRADO	464.600
CORTE DE CESPED	METRO CUADRADO	1.431.250
SIEMBRA DE CESPED	METRO CUADRADO	18.100
SIEMBRA DE COBERTURA VEGETAL	UNIDADES	20.000

A continuación, se mostrará evidencias de los 7 componentes durante la ejecución del convenio para el primer semestre de 2026:

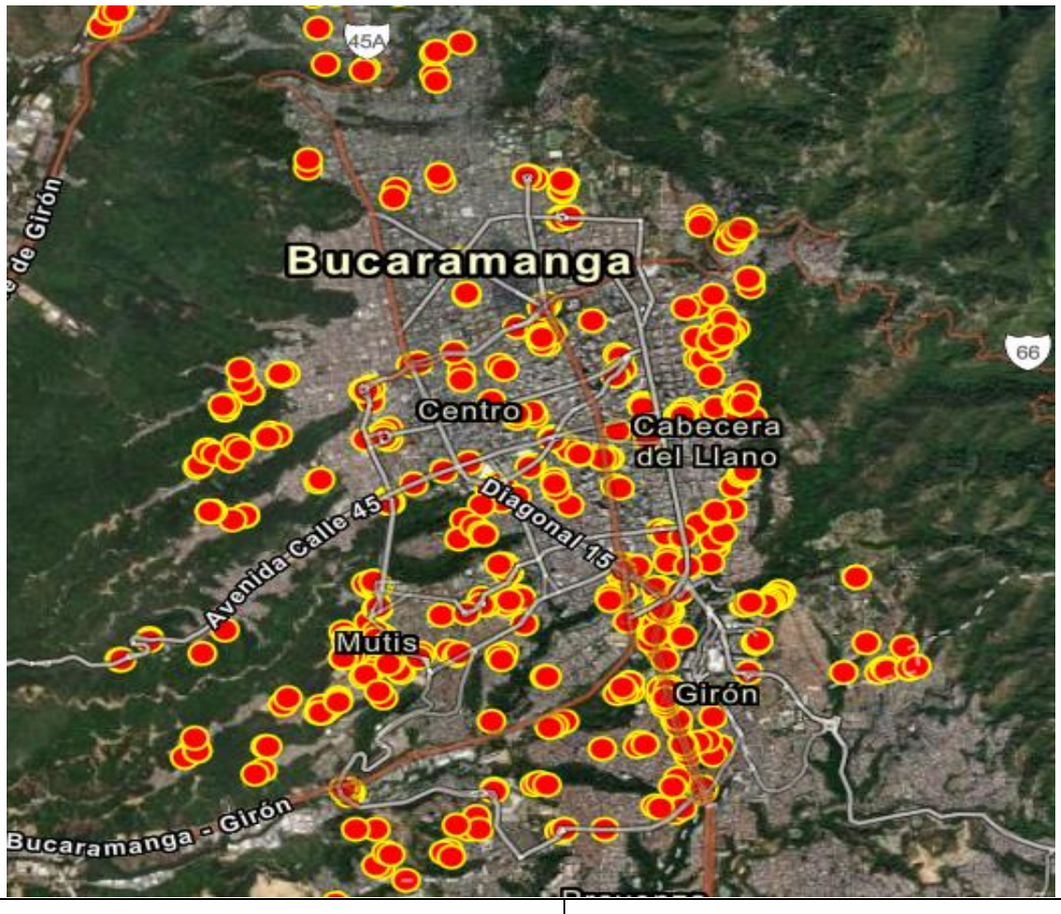



3/2/2026 9:00 A. M.
Lat 7.103945°N
Lon 73.120758°W


30/1/2026 9:09 A. M.
Lat 7.122452°N
Lon 73.121872°W


16/03/26 2:03 P. M.
Lat 7.106864°N
Lon 73.110716°W


28/03/26 10:39 A. M.
Lat 7.115784°N
Lon 73.142212°W

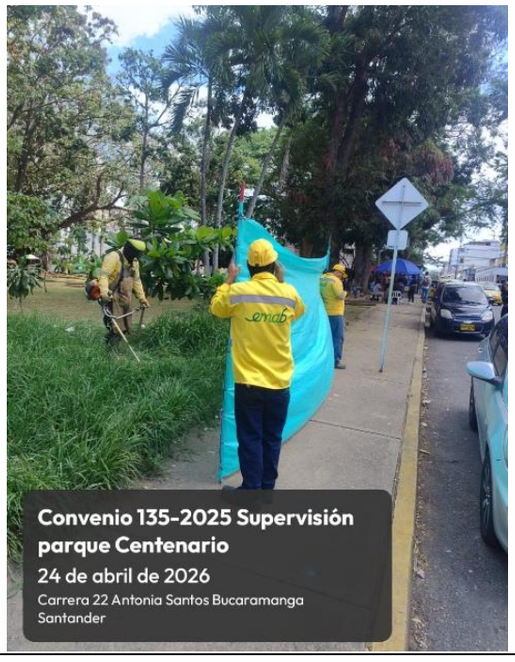
Convenio 135-2025 Supervisión parque Centenario
24 de abril de 2026
Carrera 22 Antonia Santos Bucaramanga Santander


Convenio 135-2025 Supervisión parque de los niños
24 de abril de 2026
33-88 Carrera 26 Antonia Santos Bucaramanga Santander


Convenio 135-2025 Supervisión parque las Cigarras
22 de abril de 2026
Avenida Búcaros Este Bucaramanga Santander


Convenio 135-2025 Supervisión parque las Cigarras
22 de abril de 2026
Avenida Búcaros Este Bucaramanga Santander



Convenio 135-2025 Supervisión parque kenedy
29 de abril de 2026
Bucaramanga Santander


Convenio 135-2025 Supervisión parque Las
7 de mayo de 2026
Parque Las Cigarras, 60 Bis, Av Búcaros Este, Bucaramanga, Santander, Colombia
7°6'N 73°7'W
Calle 56
Cigarras

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>


30/03/26 11:47 A. M.
Lat 7.152903°N
Lon 73.133554°W


19/02/26 11:16 A. M.
Lat 7.115235°N
Lon 73.114830°W

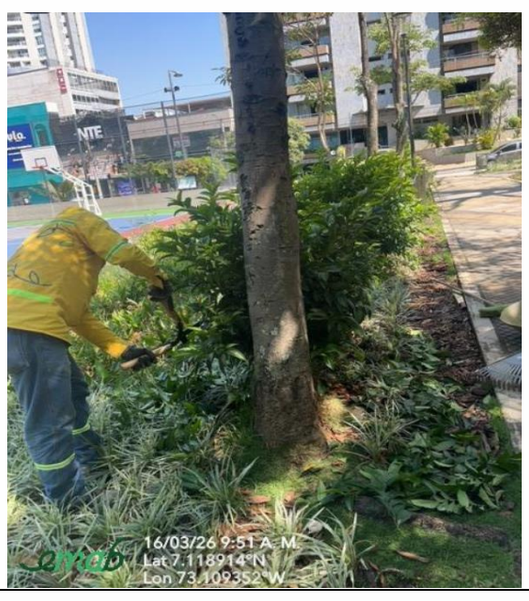
16/03/26 9:51 A. M.
Lat 7.118914°N
Lon 73.109352°W


26/02/26 7:44 A. M.
Lat 7.121801°N
Lon 73.124984°W


2/02/26 8:41 A. M.
Lat 7.125904°N
Lon 73.119318°W


3/02/26 7:56 A. M.
Lat 7.125775°N
Lon 73.119168°W

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
MANTENIMIENTO Y MANEJO INTEGRAL ARBÓREO DE ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	2024680010046	$ 1.214.500.906,89	$ 1.214.500.906,89

Descripción de actividades desarrolladas

CONTRATO DE OBRA 195 DE 27 DE AGOSTO DE 2025 (SI-SI-SAMC-002-2025) CONSORCIO FORESTAL BUCARAMANGA "MANTENIMIENTO Y MANEJO INTEGRAL ARBÓREO DE ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER".

Valor del contrato: **$ 1.214.500.906,89**
Valor Anticipo: N/A
Plazo inicial: A monto agotable o hasta el 31 de diciembre de 2025
Fecha de inicio: 20/10/2025
Fecha de terminación inicial: 31/12/2025
Fecha de terminación: 16/05/2026
Estado del Contrato: En liquidación
Porcentaje avance: 100%

Ubicación: El proyecto se desarrolló en todas las comunas del Municipio de Bucaramanga.

Impacto: La ejecución del Contrato No. 195 de 2025 permitió intervenir de manera integral el arbolado urbano del Municipio de Bucaramanga, mediante la realización de más de 550 talas autorizadas por riesgo y 1.500 podas de mantenimiento, contribuyendo significativamente a la reducción de condiciones de amenaza para la comunidad, la protección de la infraestructura pública y privada, y la mejora de la seguridad vial y peatonal.

Las actividades ejecutadas favorecieron la mitigación de riesgos asociados a la caída de árboles y ramas en mal estado fitosanitario o con afectaciones estructurales, disminuyendo la probabilidad de incidentes durante eventos climáticos adversos. Asimismo, las podas de mantenimiento permitieron optimizar el desarrollo del arbolado urbano, mejorar la visibilidad en vías y espacios públicos, prevenir interferencias con redes de servicios públicos y fortalecer las condiciones paisajísticas y ambientales de diferentes sectores del municipio.

Con estas intervenciones se contribuyó al adecuado manejo del patrimonio arbóreo de Bucaramanga, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos y garantizando espacios públicos más seguros y sostenibles

1.COMUNA 1 - NORTE

2.COMUNA 2 - NORORIENTAL

3.COMUNA 3 - SAN FRANCISCO

4.COMUNA 4 - OCCIDENTAL

5.COMUNA 5 - GARCÍA ROVIRA

6.COMUNA 6 - LA CORNCORDIA

7.COMUNA 7 - CIUDADELA

8.COMUNA 8 - SUR OCCIDENTE

9.COMUNA 9 - LA PEDREGOSA

10.COMUNA 10 - PROVENZA

11.COMUNA 11 - SUR

12.COMUNA 12 - CABECERA DEL LLANO

13.COMUNA 13 - ORIENTAL

14.COMUNA 14 - MORRORICO

15.COMUNA 15 - CENTRO

15.COMUNA 16 - LAGOS DEL CACIQUE

15.COMUNA 17 - MUTIS

Este proyecto contribuye al mejoramiento y disminución de accidentes por caída de árboles o ramas en el espacio público.

Beneficios para la Comunidad:

- **Menor Impacto a daños:** Se disminuye el riesgo de accidentes y daños en el espacio público.
- **Aumento de la Seguridad:** Se tiende a bajar en la tasa por accidentes y se da el mejoramiento de las condiciones del espacio público.

SEGUIMIENTO	
	
PODA	**PODA**
	
TALA	**TALA**

Se han realizado trabajos de mantenimiento y manejo integral arbóreo en diferentes comunas y barrios de la ciudad enfocados en el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo – Mantener 1.605.851 metros cuadrados de zonas verdes.

• Comuna 3: San Francisco

• Comuna 7: Real de minas

• Comuna 9: Barrio Pedregosa.

• Comuna 10: Barrios Provenza y Fontana.

• Comuna 12: Parque Ecológico La Flora.

• Comuna 13: Barrios Álvarez y La Aurora.

• Comuna 16: Hacienda San Juan.

• Comuna 17: Barrios Balconcitos y Mutis.

• Comuna 1: Colorados

• Comuna 1: Café Madrid

• Comuna 1: Olas altas

• Comuna 4: Nápoles

• Comuna 10: Diamante 2

• Comuna 12: Parque Ecológico La Flora, Sotomayor

• Comuna 1: Claveriano

• Comuna 12: Cabecera

• Comuna 12: Sotomayor

• Comuna 6: Ricaurte

• Comuna 1: Villa Rosa

4. LINEA ESTRATEGICA 4. TERRITORIO SEGURO QUE GENERA VALOR

SECTOR: Gobierno territorial

PROGRAMA: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Asistir técnicamente a nueve (9) dependencias de la administración municipal para el diseño, seguimiento y ejecución de proyectos estratégicos de la ciudad en el área de infraestructura

Indicador	Meta 2026	Logro 2026	% Avance 2026	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	9	9	100%	$ 11.119.996.023	$ 10.742.603.333	97%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Fortalecimiento institucional a los procesos misiones y de gestión de la secretaría de infraestructura del municipio de Bucaramanga, Santander	2024680010049	$ 11.506.163.086	$ 28.292.139.343

Descripción de actividades desarrolladas

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2026 la Secretaria de Infraestructura ha continuado realizo la contratación del recurso humano que requiere la dependencia para el fortalecimiento a la ejecución de los procesos transversales, así como la planificación de las diferentes obras.

GASTOS DE INVERSION	A 30 DE JUNIO 2026
	VALOR
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION	$ 10.742.603.333,33

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Elaborar (04) estudios de preinversión para la realización de documentos en las fases de pre-factibilidad, factibilidad o definitivos para la consolidación de la infraestructura social en el municipio.

Indicador	Meta 2026	Logro 2026	% Avance 2026	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Estudios de preinversión elaborados	1	0,83	83%	$ 126.095.762	$ 126.095.762	100%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RESTAURACIÓN DE LA PLAZA SAN MATEO INMUEBLE DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	2024680010084	$1.542.128.640,00	$1.542.128.640,00

Descripción de actividades desarrolladas

Contrato 197– 2025: ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RESTAURACIÓN DE LA PLAZA SAN MATEO INMUEBLE DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER:

Durante el periodo objeto del presente informe, el Contrato de Consultoría No. 197 de 2025 retomó su ejecución a partir del día 07 de mayo de 2026, dando continuidad al proceso de actualización de los estudios y diseños para la restauración de la Plaza San Mateo.

En esta etapa se continuó con el desarrollo, consolidación y ajuste de los componentes técnicos previamente estructurados, incorporando las observaciones y validaciones realizadas en el marco del seguimiento contractual. Como resultado del trabajo adelantado, se logró definir y seleccionar la alternativa de intervención que orientará la formulación definitiva del proyecto de restauración.

Actualmente, el equipo consultor e interventor adelanta las actividades requeridas para la socialización y presentación de la alternativa seleccionada ante el Consejo Departamental de Patrimonio, los ediles, la comunidad en general y la Secretaría de Planeación, con el propósito de obtener retroalimentación técnica e institucional que contribuya al fortalecimiento y consolidación de la propuesta.

A la fecha del presente informe, el contrato presenta un avance físico aproximado del **90%**, reflejando un estado avanzado de ejecución y evidenciando el cumplimiento progresivo de los productos contractuales previstos. De manera paralela, la Administración Municipal y la interventoría mantienen el seguimiento técnico, administrativo y contractual correspondiente, orientado a garantizar la calidad de los entregables y el cumplimiento de los objetivos del proyecto, encaminados a la adecuada restauración y puesta en valor de este bien de interés cultural.

CONTRATISTA:	**NOMBRE**	**CONSORCIO RESTAURACIÓN PLAZA DE SAN MATEO.**
	NIT:	901.980.756-1
VALOR INICIAL:	$1.542.128.640	
ANTICIPO (%):	$0	
VALOR ADICIONAL:	$ 0	
VALOR TOTAL:	$1.542.128.640	
PLAZO INICIAL:	3.5 MESES	
PRORROGA No. 1	2.5 MESES	
PRORROGA No. 2	N/A	
PLAZO TOTAL:	6 MESES	
INTERVENTORÍA:	NOMBRE - NIT:	
FECHA DE INICIO:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2025	
FECHA DE REINICIO 1:	7 DE MAYO DE 2025	
ESTADO DEL CONTRATO:	EN EJECUCIÓN	
FECHA TERMINACIÓN FINAL	23 DE JULIO DE 2026	
PORCENTAJE AVANCE FÍSICO:	85%	
AVANCE FINANCIERO:	60%	

OBSERVACIONES:


1. Se evidenció necesidad de fortalecer el seguimiento al cumplimiento del cronograma contractual, considerando la proximidad de la fecha de terminación frente a las actividades pendientes de ejecución.
2. Durante el periodo evaluado se identificó rezago en el desarrollo de algunas actividades programadas, especialmente aquellas relacionadas con los procesos de socialización y articulación institucional previstos dentro del alcance del proyecto.
3. A la fecha del seguimiento realizado, no se contaba con evidencia suficiente de la ejecución de la totalidad de las jornadas de socialización contempladas en la planeación del contrato.
4. Se requirió a la interventoría presentar un análisis comparativo entre el avance programado y el avance ejecutado, con el fin de determinar el estado real del proyecto y adoptar medidas oportunas de gestión.
5. Se solicitó la formulación de un plan de acción que permita asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y mitigar riesgos asociados a la ejecución dentro de

los plazos establecidos.

6. Se mantiene seguimiento permanente por parte de la supervisión e interventoría para verificar el cumplimiento de los productos pendientes y la adecuada finalización del proyecto.

PROBLEMÁTICAS:

- Concentración de actividades relevantes en la etapa final del cronograma contractual.
- Pendiente ejecución o acreditación de actividades de socialización y concertación.
- Riesgo de afectación al cumplimiento del plazo inicialmente previsto.
- Necesidad de fortalecimiento de la articulación entre consultoría, interventoría y actores institucionales.
- Dependencia de validaciones y presentaciones ante instancias externas para la consolidación del producto final.

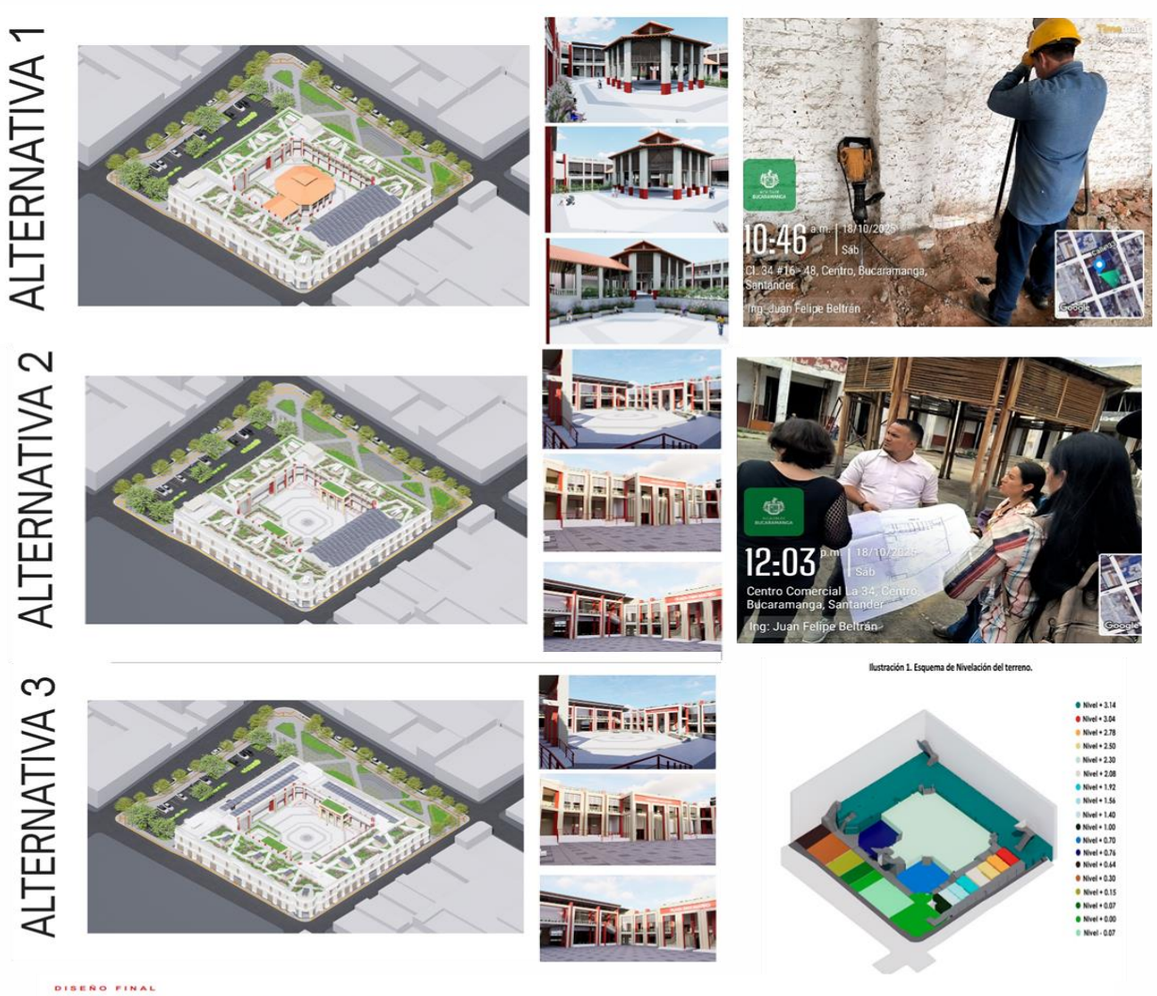



5. LINEA ESTRATEGICA 5. TERRITORIO SEGURO QUE PROTEGE

SECTOR: Minas y Energía

PROGRAMA: Consolidación productiva del sector de energía eléctrica

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Garantizar 51,229 lámparas de alumbrado público para la prestación del servicio de alumbrado público en el Municipio de Bucaramanga.

Indicador	Meta 2026	Logro 2026	% Avance 2026	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Garantizar lámparas de alumbrado público.	51.229	51.131	99.8%	$ 165.588.362.147	$ 18.581.499.223	11%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Fortalecimiento DE LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 2024-2027 Bucaramanga	2024680010192	$28.970.000.000,00	$88.769.657.897,08

El municipio es responsable de prestar el servicio de alumbrado público consistente en la iluminación de las vías públicas, parques públicos y demás espacios de libre circulación que no se encuentran a cargo de ninguna persona natural o jurídica diferente del municipio.

En cuando a la administración y operación del Alumbrado Público, se hace necesario fortalecer la nómina provisional institucional, dando cumplimiento a lo establecido por el Ministerio de Trabajo y la Comisión Nacional del Servicio Civil — CNSC; así como también contar con insumos, materiales, herramientas e instalaciones adecuadas, necesarias para fortalecer su funcionamiento.

Es importante tener en cuenta, que la prestación del servicio de alumbrado público debe ser constante, lo que crea la necesidad que algunos servidores públicos, generen continuidad y estabilidad en el desarrollo de los compromisos adquiridos; asimismo contar con recurso humano de calidad, con el fin de mantener un desarrollo competente,

Siendo así, que se continúa asignando recursos para la actual vigencia en los diferente programas y actividades que desarrolla la Oficina de Alumbrado Público, con el fin de garantizar una adecuada prestación del servicio y generar el mayor impacto positivo en la comunidad.

Con el fin de mejorar la operación y administración del sistema de alumbrado público, y a su vez ofrecer a la comunidad un servicio de calidad, se hace necesario adquirir insumos de papelería y elementos de oficina, aires acondicionados, impresoras, tableros digitales, elementos de seguridad y licencias de software que fortalezcan el debido cumplimiento de las labores diarias, dado a los usuarios un respuesta oportuna y eficiente, Para esto también se hace necesario Pagar los servicios internos y externos de la oficina que permitan el correcto funcionamiento de la oficina.

BENEFICIOS DEL PROYECTO:

SOCIALES: El proyecto tiene como principal beneficio el fortalecimiento en el desarrollo y ejecución de las actividades de seguimiento y control a procesos de la secretaría de Infraestructura-Alumbrado Público. Así como también ofrecer a la comunidad un ambiente iluminado y seguro, contribuyendo al desarrollo cultural, preservando el lado urbano y rural de la Ciudad.

ECONÓMICOS: Implementado nueva tecnología e instalando luminarias LED, genera disminución en los altos niveles de consumo de energía y en los costos de mantenimiento especialmente en el ahorro en la contratación de cuadrillas de mantenimiento.

AMBIENTALES: Generar un impacto ambiental, disminuyendo los niveles de dióxido de carbono en la ciudad, al construir el sistema de iluminación con nuevas tecnologías y uso de luminarias LED.

INFORMACIÓN AVANCE DE EJECUCIÓN

Se realiza pagos de las CPS y los contratos de arriendo y servicios públicos

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	2024680010189	$35.703.428.981,00	$86.919.084.325,44

Descripción de actividades desarrolladas

Dentro del proyecto de mantenimiento del sistema de alumbrado público 2020-2023 del municipio de Bucaramanga, enfocados en el mismo objeto realizar un mantenimiento preventivo y correctivo del sistema mediante los contratos:

CONTRATO: 341 DEL 2025
OBJETO: MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 6.930.979.159,7
VALOR LOTE 1: 3.362.913.018,85
VALOR LOTE 2: 3.568.066.140,85
FECHA DE INICIO: 16/02/2026
FECHA FIN: 15/07/2026
ESTADO: EN EJECUCION.





1. **Priorización de zonas críticas:**
   La Secretaría aplica una metodología de priorización basada en criterios técnicos y de impacto social, orientada a garantizar la seguridad, la movilidad y el adecuado uso del espacio público.
   En este sentido, la atención de las intervenciones se define considerando los siguientes factores:

- **Nivel de riesgo:** Zonas con deficiencias de iluminación que puedan afectar la seguridad ciudadana o incrementar la probabilidad de incidentes.
- **Impacto en la movilidad:** Corredores viales principales y vías de alto flujo vehicular y peatonal.
- **Entornos sensibles:** Áreas con alta afluencia de población, tales como:
  - Instituciones educativas (colegios)
  - Paraderos de transporte público
  - Parques, zonas recreativas y escenarios deportivos
  - Zonas comerciales
- **Demanda ciudadana:** Número y recurrencia de reportes o PQRS registrados por la comunidad.

Bajo estos criterios, se establece un orden de atención que prioriza inicialmente los sectores de mayor criticidad e impacto (corredores viales principales y espacios públicos de alta concurrencia). Posteriormente, se programan intervenciones en los diferentes barrios del municipio, dando prelación a aquellos con mayor número de reportes ciudadanos.

Esta metodología permite optimizar los recursos disponibles y garantizar una atención oportuna y equitativa a las necesidades de la comunidad.

2. **Contratación, operador y cumplimiento contractual:**
   El contratista actual es el CONSORCIO EYC1 2025, cuyo objeto contractual corresponde al mantenimiento del alumbrado público del municipio de Bucaramanga, distribuido por lotes por comunas y corregimientos

   Sus obligaciones se enmarcan en la ejecución del mantenimiento correctivo, atención de reportes y garantía de operación del sistema. A la fecha, el contrato se encuentra en ejecución.

3. **Calidad de las reparaciones:**

   Durante los últimos seis (6) meses no se han registrado reparaciones reiteradas a luminarias. La metodología implementada establece que, cuando una luminaria presenta fallas, no se somete a procesos de reparación correctiva reiterativa, sino que se prioriza su reemplazo por una luminaria nueva, garantizando así mayor confiabilidad y vida útil del sistema.

   No obstante, previo a definir el reemplazo, se realiza un procedimiento técnico de verificación en campo, con el fin de descartar fallas asociadas a otros componentes del sistema. Este procedimiento incluye:

- **Verificación de presencia de tensión** en los bornes de alimentación de la luminaria.
- **Medición de niveles de voltaje** para confirmar que se encuentran dentro de los rangos operativos.
- **Inspección del estado de las conexiones eléctricas** (cableado, empalmes, borneras).
- **Revisión del sistema de control** (fotocelda, temporizador o sistema de telegestión, si aplica).
- **Evaluación visual del estado de la luminaria** (driver, módulo LED, carcasa, presencia de humedad o daño físico).
- **Verificación de continuidad eléctrica**, en caso de ser necesario.

Una vez realizadas estas pruebas, y si se confirma que la falla corresponde a la luminaria (driver o módulo LED), se procede a su reemplazo inmediato, evitando intervenciones repetitivas y optimizando los tiempos de atención.

Este procedimiento permite asegurar diagnósticos acertados, reducir reprocesos y mejorar la eficiencia operativa del servicio de alumbrado público.

4. **Seguridad eléctrica y riesgos para la ciudadanía:**

Actualmente se registran sesenta y un (61) reportes asociados a diferentes fallas en postes, dentro de los cuales se incluyen casos como: poste a punto de caer, poste caído, poste deteriorado en su base, poste energizado, poste inclinado y solicitudes de retiro de poste.

Adicionalmente, se cuentan con veintiún (21) reportes relacionados con redes eléctricas, que comprenden situaciones como red caída o reventada, reposición de poste, luminaria y red, así como revisión de redes en posible corto circuito, información extraída del SIAP.

En cuanto al plan de mitigación, este se fundamenta en la ejecución de actividades de mantenimiento correctivo orientadas a restablecer oportunamente el servicio en los puntos afectados, así como en la gestión y seguimiento de las denuncias públicas y judiciales relacionadas con eventos de vandalismo y hurto de infraestructura de alumbrado público.

El plan contempla:

- **Atención priorizada de daños reportados**, mediante la programación y ejecución de intervenciones correctivas sobre luminarias, redes y demás componentes afectados.
- **Registro y trazabilidad de incidentes**, permitiendo identificar zonas críticas con alta recurrencia de vandalismo o hurto.
- **Articulación con autoridades competentes** (Policía, Fiscalía y entes territoriales), para la radicación y seguimiento de denuncias formales.
- **Análisis de patrones de afectación**, con el fin de implementar medidas preventivas en sectores vulnerables.
- **Reposición de infraestructura bajo criterios de seguridad**, incluyendo el uso de materiales o configuraciones que reduzcan la exposición al hurto.

Este enfoque integral permite no solo restablecer el servicio de manera eficiente, sino también generar acciones de control y prevención que contribuyen a disminuir la reincidencia de estos eventos.

1. **Relación alumbrada – seguridad (articulación con interior/policía):**

Mediante el programa de seguridad como “El alcalde en mi barrio” se ha logrado articular trabajo entre Alumbrado público, EMAB, Señalización vial, guardianes ambientales, Bomberos, DADEP, Policía nacional, escuadrón de la empatía, ISABU, secretaria del interior, Bienes y servicios, IDERBU e IMCT para llegar de manera integral a diferentes sectores de la ciudad.

Adicionalmente, se han realizado las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes en los casos identificados de hurto y vandalismo sobre la infraestructura de alumbrado público. Estas acciones tienen como finalidad dejar los respectivos precedentes legales, facilitar el seguimiento institucional de los casos y promover la adopción de medidas correctivas y preventivas que contribuyan a mitigar la ocurrencia de estos eventos.

Este proceso se desarrolla en articulación con las entidades de control y seguridad, fortaleciendo la gestión operativa y el control sobre las afectaciones a la infraestructura eléctrica.

1. **Alumbrado en parques, escenarios deportivos y rutas escolares:**


Etiquetas de fila	Cuenta de Barrio
Cancha Apagada	**16**
ALTOS DE BETANIA	1
ALTOS DEL PROGRESO	1
CAFE MADRID	2
CAMPO HERMOSO	1
GIRARDOT	1
GRANJAS DE JULIO RINCON	1
JOSE A. GALAN	1
KENNEDY	1
LA ESPERANZA III	1
NAPOLES	1
SAN GERARDO I	1
TOLEDO PLATA	1
VILLA MERCEDES	1
VILLA ROSA	1
VILLAS DE SAN IGNACIO_SAN IGNACIO REAL BAVARIA II	1
Parque Apagado	**6**
COLSEGUROS NORTE	1
GARCIA ROVIRA	1
GRANJAS DE JULIO RINCON	1
LAS MERCEDES	1
LOS ANGELES	1
VILLAS DE SAN IGNACIO_SAN IGNACIO REAL BAVARIA II	1
Total general	**22**

Se incluye relación de parques y canchas reportadas con baja iluminación o apagado, en base a los reportes creados se informa que los demás se encuentran en óptimo funcionamiento o no han sido reportados.

Estos reportes ya hacen parte de las ordenes de trabajo emitidas a cuadrillas de mantenimiento para su atención.

CONTRATO: 342 DEL 2025
CONTRATISTA: JALGAVI INGENIEROS SAS
OBJETO: PODAS PARA EL DESPEJE DE LUMINARIAS Y REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO
VALOR: $ 1.033.955-610
FECHA DE INICIO: 10/03/2026
FECHA FIN: 10/08/2026
ESTADO: EN EJECUCION



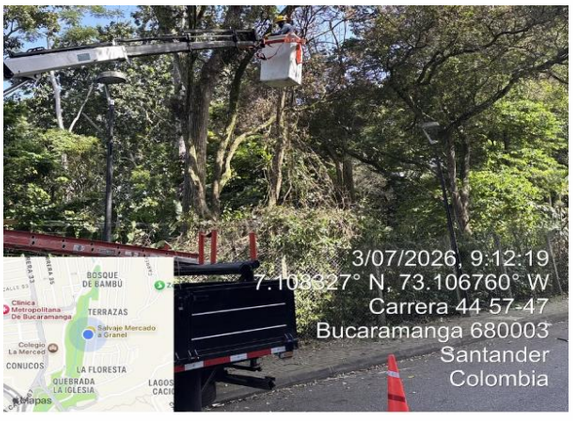

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	202500000015897	$ 2.236.173.074,00	$23.055.801.147

ESTADO: Proyectos adjudicados en proceso de inicio.

PROYECTOS CON RECURSOS POAI

① Modernización Viaducto Alejandro Galvis Ramírez – Carrera Novena (Viaducto Puente La Novena entre Calle 45 y Calle 55)

Mes	**Actividad**
Junio - Julio	Re-diseño y ajuste de presupuesto a 2026
Junio - Julio	Banco proyectos (estructuración técnica)
Junio - Julio	Proceso de contratación
Agosto - Septiembre	Suscripción del contrato

② Modernización Carrera 21, Intercambiador Puente El Bueno, Calle 36 y Av. La Rosita (Intercambiador Puente El Bueno; Calle 36 entre Cra. 27 y Cra. 33; Av. La Rosita entre Cra. 27 y Cra. 32; Cra. 21 entre Diagonal 15 y Calle 18 |)

Mes	**Actividad**
Junio - Julio	Re-diseño y ajuste de presupuesto a 2026
Junio - Julio	Banco proyectos (estructuración técnica)
Junio - Julio	Proceso de contratación
Agosto - Septiembre	Suscripción del contrato

③ Modernización Carrera 9 entre Calle 31 y Calle 44 / Intercambiador Provenza (Carrera 9 entre Calle 31 y Calle 44; Intercambiador Puente de Provenza | $5.332.318.993)

Mes	Actividad
Marzo	Re-diseño y ajuste de presupuesto a 2026
Abril - Mayo	Banco proyectos (estructuración técnica)
Junio – Julio	Proceso de contratación
Agosto – Septiembre	Suscripción del contrato

④ Modernización Carrera 33 / Carrera 33A / Calle 14 (Carrera 33 entre Viaducto La Flora y Av. Quebradaseca; Carrera 33A entre Calle 34 y Calle 14; Calle 14 entre Cra. 33A y Glorieta Estadio Américo Montanini |)

Mes	Actividad
Junio - Julio	Re-diseño y ajuste de presupuesto a 2026
Junio - Julio	Banco proyectos (estructuración técnica)
Junio - Julio	Proceso de contratación
Agosto - Septiembre	Suscripción del contrato

META E INDICADOR DE PRODUCTO

Elaborar 2 Documentos de estudio técnico para mejorar la prestación de servicio de alumbrado público.

Indicador	Meta 2026	Logro 2026	% Avance 2026	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Numero de documentos	0	0	0%	$ 0	$ 0	0%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO DE REFERENCIA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	202500000028264	$ 0	$ 2.500.000.000,00

Resumen del proyecto: El municipio es responsable de prestar el servicio de alumbrado público consistente en la iluminación de las vías públicas, parques públicos, escenarios deportivos y demás espacios de libre circulación que no se encuentran a cargo de ninguna persona Natural o Jurídica diferente del municipio.

Realizar un estudio técnico diagnóstico del sistema de alumbrado público que permita identificar sus condiciones actuales, deficiencias técnicas y oportunidades de mejora para orientar su planificación y modernización del alumbrado en el municipio.

Realizar un ajuste integral a la prestación del servicio mediante un estudio técnico de referencia, con el fin de satisfacer las necesidades de avanzar en la modernización, renovación y expansión del alumbrado público urbano y rural del Municipio de Bucaramanga, haciendo uso de tecnologías más amigables con el medio ambiente, favoreciendo la seguridad de los ciudadanos, entregando espacios iluminados que brinden la sensación de espacios seguros en la ciudad, tanto en sus zonas urbanas como rurales, encaminando grandes esfuerzos e inversiones, tanto físicas, económicas y de personal.

Objetivo: Mejorar el servicio de Alumbrado Público en la ciudad, mediante el desarrollo de nuevas tecnologías, la optimización del sistema tarifario, el fortalecimiento de la infraestructura, la implementación eficiente de un centro de control y monitoreo, y la autogeneración de energías limpias autosostenibles, con el fin de garantizar un servicio de calidad, eficiente, sostenible y efectivo del sistema de iluminación en espacios públicos, que además propicie seguridad ciudadana, confianza en el uso de espacios públicos y desarrollo económico.

BENEFICIOS DEL PROYECTO:

SOCIALES: El proyecto tiene como principal beneficio el fortalecimiento en el desarrollo y ejecución de las actividades de seguimiento y control a procesos de la secretaría de Infraestructura-Alumbrado Público.

ECONÓMICOS: Implementado nueva tecnología e instalando luminarias LED, genera disminución en los altos niveles de consumo de energía y mantenimiento.

AMBIENTALES: Generar un impacto ambiental, disminuyendo los niveles de dióxido de carbono en la ciudad, al construir el sistema de iluminación con nuevas tecnologías y uso de luminarias LED.

INFORMACIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL DEL PROYECTO

- **CONTRATO**: 176 DEL 2025
- **OBJETO**: Realizar El Estudio Técnico De Referencia De Determinación De Costos, Optimizar La Eficiencia Energética Y Puesta En Marcha Del Esquema De Operación Para El Sistema De Alumbrado Público Del Municipio De Bucaramanga
- **VALOR**: $ 2.500.000.000
- **FECHA DE INICIO**: 25/08/2025
- **FECHA FIN**: 30/12/2025
- **ESTADO**: SUSPENDIDO – EN TRAMITE DE REINICIO Y ESTUDIO DE ADICIÒN PRORRGA EN TIMEPO.

INFORMACIÓN AVANCE DE EJECUCIÓN:

- Se revisó y aprobó el plan de trabajo remitido por el contratista.
- Se realizó mesa de trabajo con el líder técnico del proceso de formulación del ETR el 15 de Sept, donde se revisó el plan de trabajo y entregables, se definió avances de forma quincenal con el fin de llevar un seguimiento.
- Se recibió Solicitud de información por parte del contratista, de esta información ya se realizó una primera entrega de información el día 19 de Sept. Para los puntos pendientes por entregar ya se elaboraron los oficios para ser remitidos a la secretaria de Planeación y secretaria de Hacienda y poder consolidar la información solicitada.
- Se dio trámite al primer pago del contrato

INFORMACIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL DEL ESTUDIO TECNICO DE REFERENCIA.

- **CONTRATO**: 176 DEL 2025
- **OBJETO**: REALIZAR EL ESTUDIO TÉCNICO DE REFERENCIA DE DETERMINACION DE COSTOS, OPTIMIZAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y PUESTA EN MARCHA DEL ESQUEMA DE OPERACIÓN PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO
- **VALOR**: $ 2`500.000.000
- **FECHA DE INICIO**: 25/08/2025
- **FECHA FIN**: EN DEFINICIÒN SEGÚN SUSPENSIÒN Y PROXIMA AMPLIACIÒN.
- **ESTADO**: SUSPENDIDO


El estudio técnico de referencia se encuentra actualmente en la fase de georreferenciación de los activos de alumbrado público, tales como luminarias, ductería, transformadores, tableros, cámaras de inspección, canalizaciones, postes y demás elementos que hacen parte de los activos del sistema.

Adicionalmente, como parte del proceso de identificación y consolidación de la información, se avanza en la estructuración final y el detalle de los insumos técnicos necesarios para el desarrollo de las actividades propias del objeto contractual del Contrato No. 176 de 2025.


Ítem	**Información requerida**	**Dependencia / Responsable**
1	Polígonos del municipio de Bucaramanga	Secretaría de Planeación Municipal – Dirección de Ordenamiento Territorial / SIG
2	Listado de espacios propiedad del municipio	Secretaría de Planeación / Secretaría de Hacienda – Gestión de Bienes
3	Planos con zonas que cuentan con WM – Tableros	Oficina de Alumbrado Público / ESSA
4	Inventario de la interventoría de los activos del SAP	Oficina de Alumbrado Público / Interventoría SAP
5	Inventario ESSA – Componentes del SAP	ESSA – Área de Alumbrado Público / Distribución
6	Planos de redes subterráneas existentes	ESSA / Secretaría de Planeación – Infraestructura
7	Base de datos de transformadores encapsulados	ESSA
8	Contratos de suministro de energía	Secretaría Jurídica / Secretaría de Hacienda
9	Convenio de facturación y recaudo	Secretaría de Hacienda Municipal
10	Acuerdos municipales últimos 5 años o vigente	Secretaría Jurídica / Concejo Municipal
11	Balances mensuales remitidos por ESSA	Secretaría de Hacienda / Oficina de Alumbrado Público
12	Facturas completas de energía – SAP	Secretaría de Hacienda
13	Históricos de consumos y potencias	ESSA / Secretaría de Hacienda
14	Componentes tarifarios aplicados	ESSA / CREG (referencial)

15	Condiciones comerciales pactadas	Oficina de Alumbrado Público / Contratos con OR
16	Base de datos ICA 2022–2025 armonizada	Secretaría de Hacienda – Dirección de Impuestos
17	Usuarios con actividades de relevancia	Secretaría de Hacienda / Dependencia de Alumbrado / Cámara de Comercio
18	Usuarios especiales (empresas industriales)	Secretaría de Hacienda / Dependencia de Alumbrado
19	Recursos y costos municipales SAP 2021–2024	Secretaría de Hacienda / Oficina de Alumbrado Público
20	Descripción de la población	Secretaría de Planeación / DANE
21	Estudios de iluminación previos (RETILAP 3.3.1.4)	Oficina de Alumbrado Público / Infraestructura
22	Manuales de espacio público y silvicultura	Planeación / Infraestructura / Medio Ambiente / DADEP


1. Imagen donde se observan los elementos cargados en el SIAP y georreferenciados por ETR

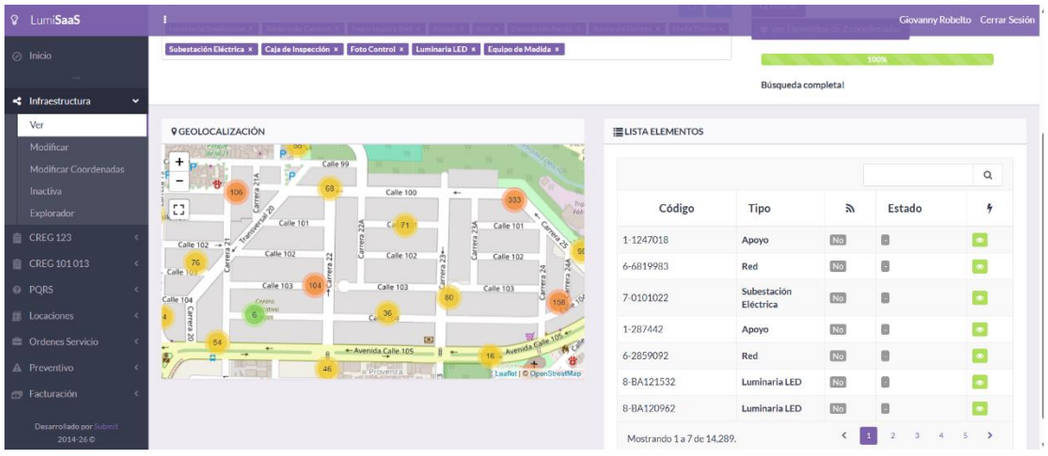



1. Imagen donde se observan redes aéreas y subterraneas en el SIAP

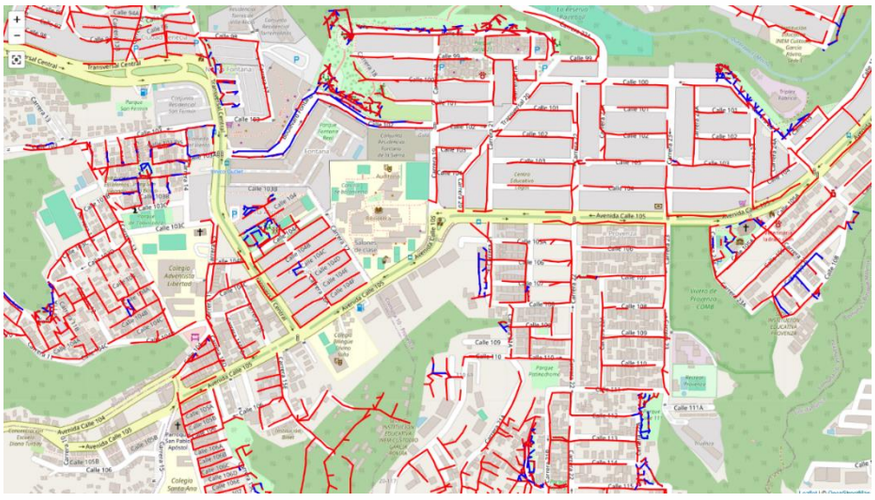



1. Parametrización del SIAP

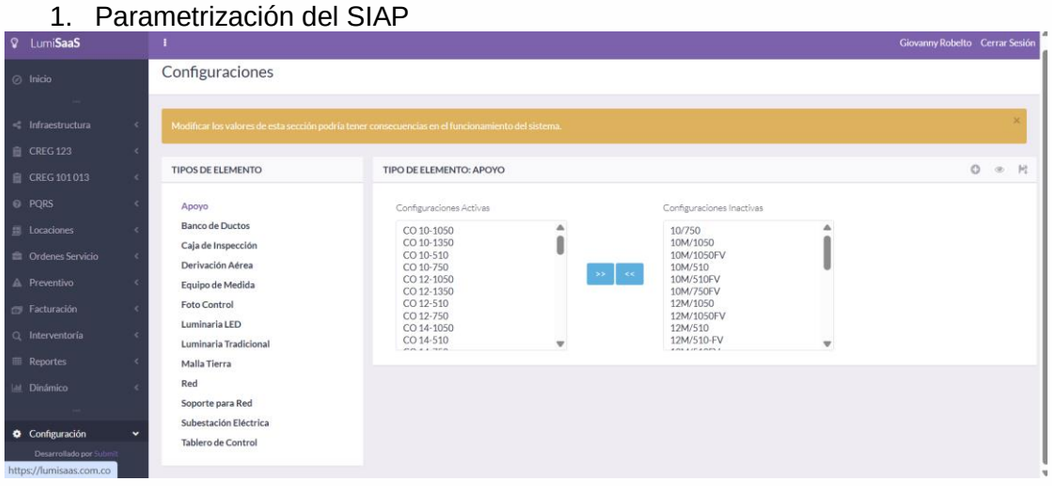


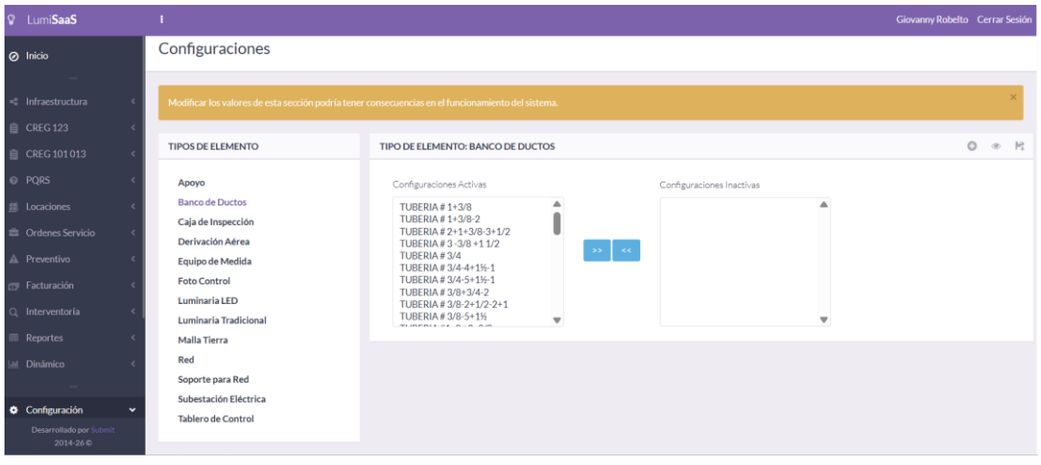


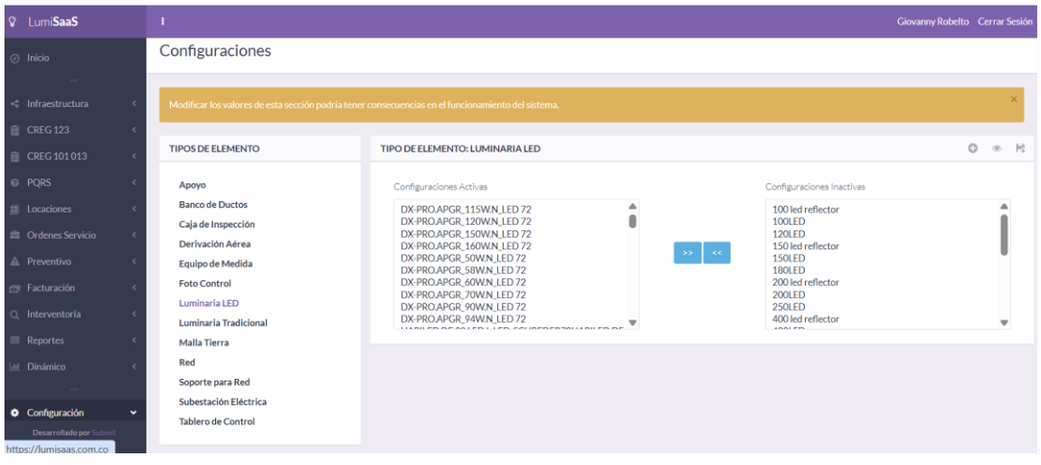


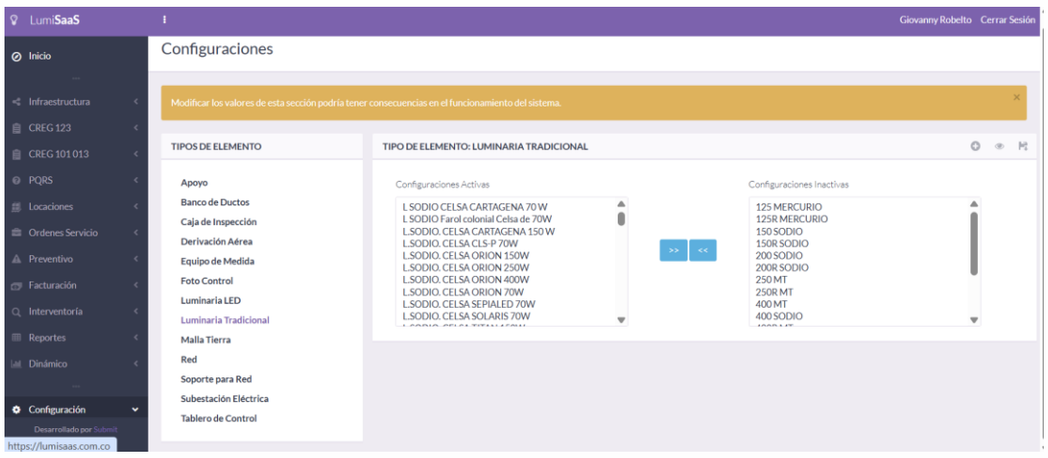

LumiSaaS
Giovanny Robelto Cerrar Sesión
Inicio
Infraestructura
CREG 123
CREG 101 013
PQRS
Locaciones
Ordenes Servicio
Preventivo
Facturación
Interventoría
Reportes
Dinámico
Configuración
Desarrollado por Submit
https://lumisaas.com.co
Configuraciones
Modificar los valores de esta sección podría tener consecuencias en el funcionamiento del sistema.
TIPOS DE ELEMENTO
Apoyo
Banco de Ductos
Caja de Inspección
Derivación Aérea
Equipo de Medida
Foto Control
Luminaria LED
Luminaria Tradicional
Malla Tierra
Red
Soporte para Red
Subestación Eléctrica
Tablero de Control
TIPO DE ELEMENTO: LUMINARIA TRADICIONAL
Configuraciones Activas
L.SODIO CELSA CARTAGENA 70 W
L.SODIO Farol colonial Celsa de 70W
L.SODIO. CELSA CARTAGENA 150 W
L.SODIO. CELSA CLS-P 70W
L.SODIO. CELSA ORION 150W
L.SODIO. CELSA ORION 250W
L.SODIO. CELSA ORION 400W
L.SODIO. CELSA ORION 70W
L.SODIO. CELSA SEPIALED 70W
L.SODIO. CELSA SOLARIS 70W
>> <<
Configuraciones Inactivas
125 MERCURIO
125R MERCURIO
150 SODIO
150R SODIO
200 SODIO
200R SODIO
250 MT
250R MT
400 MT
400 SODIO

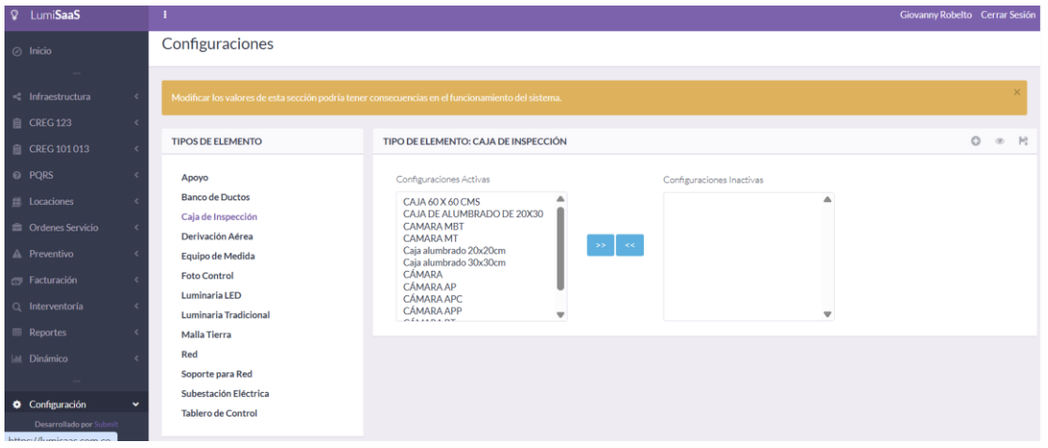
LumiSaaS
Giovanny Robelto Cerrar Sesión
Inicio
Infraestructura
CREG 123
CREG 101 013
PQRS
Locaciones
Ordenes Servicio
Preventivo
Facturación
Interventoría
Reportes
Dinámico
Configuración
Desarrollado por Submit
Configuraciones
Modificar los valores de esta sección podría tener consecuencias en el funcionamiento del sistema.
TIPOS DE ELEMENTO
Apoyo
Banco de Ductos
Caja de Inspección
Derivación Aérea
Equipo de Medida
Foto Control
Luminaria LED
Luminaria Tradicional
Malla Tierra
Red
Soporte para Red
Subestación Eléctrica
Tablero de Control
TIPO DE ELEMENTO: CAJA DE INSPECCIÓN
Configuraciones Activas
CAJA 60 X 60 CMS
CAJA DE ALUMBRADO DE 20X30
CAMARA MBT
CAMARA MT
Caja alumbrado 20x20cm
Caja alumbrado 30x30cm
CÁMARA
CÁMARA AP
CÁMARA APC
CÁMARA APP
>> <<
Configuraciones Inactivas

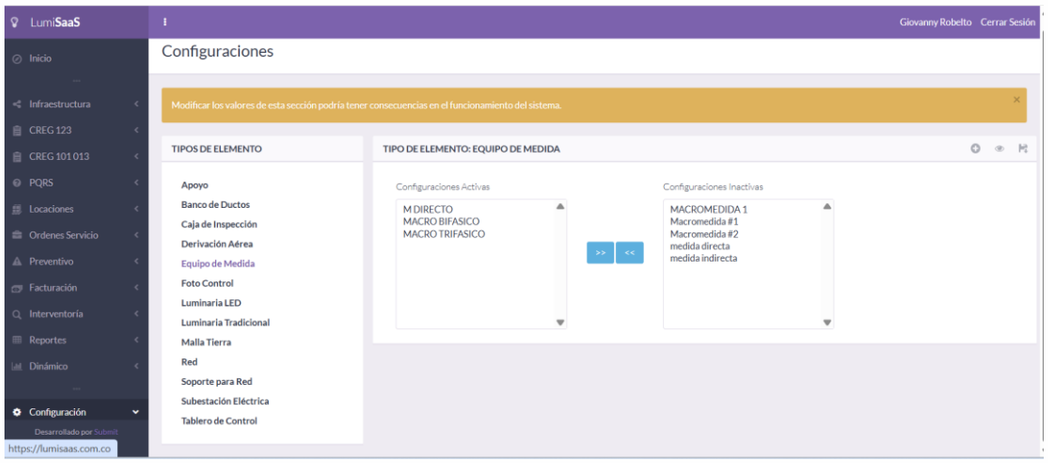
LumiSaaS
Giovanny Robelto Cerrar Sesión
Inicio
Infraestructura
CREG 123
CREG 101 013
PQRS
Locaciones
Ordenes Servicio
Preventivo
Facturación
Interventoría
Reportes
Dinámico
Configuración
Desarrollado por Submit
https://lumisaas.com.co
Configuraciones
Modificar los valores de esta sección podría tener consecuencias en el funcionamiento del sistema.
TIPOS DE ELEMENTO
Apoyo
Banco de Ductos
Caja de Inspección
Derivación Aérea
Equipo de Medida
Foto Control
Luminaria LED
Luminaria Tradicional
Malla Tierra
Red
Soporte para Red
Subestación Eléctrica
Tablero de Control
TIPO DE ELEMENTO: EQUIPO DE MEDIDA
Configuraciones Activas
M DIRECTO
MACRO BIFASICO
MACRO TRIFASICO
>> <<
Configuraciones Inactivas
MACROMEDIDA 1
Macromedida #1
Macromedida #2
medida directa
medida indirecta

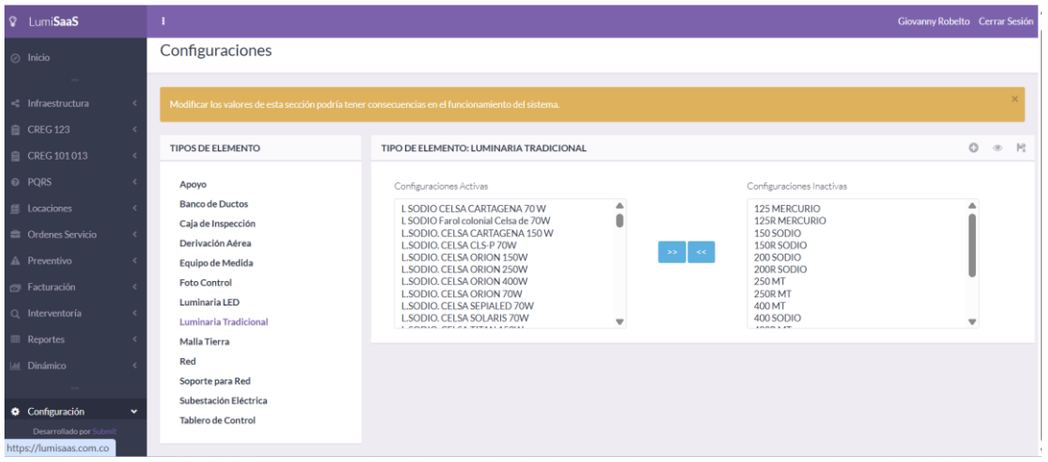
LumiSaaS
Giovanny Robelto Cerrar Sesión
Inicio
Infraestructura
CREG 123
CREG 101 013
PQRS
Locaciones
Ordenes Servicio
Preventivo
Facturación
Interventoría
Reportes
Dinámico
Configuración
Desarrollado por Submit
https://lumisaas.com.co
Configuraciones
Modificar los valores de esta sección podría tener consecuencias en el funcionamiento del sistema.
TIPOS DE ELEMENTO
Apoyo
Banco de Ductos
Caja de Inspección
Derivación Aérea
Equipo de Medida
Foto Control
Luminaria LED
Luminaria Tradicional
Malla Tierra
Red
Soporte para Red
Subestación Eléctrica
Tablero de Control
TIPO DE ELEMENTO: LUMINARIA TRADICIONAL
Configuraciones Activas
L.SODIO CELSA CARTAGENA 70 W
L.SODIO Farol colonial Celsa de 70W
L.SODIO. CELSA CARTAGENA 150 W
L.SODIO. CELSA CLS-P 70W
L.SODIO. CELSA ORION 150W
L.SODIO. CELSA ORION 250W
L.SODIO. CELSA ORION 400W
L.SODIO. CELSA ORION 70W
L.SODIO. CELSA SEPIALED 70W
L.SODIO. CELSA SOLARIS 70W
>> <<
Configuraciones Inactivas
125 MERCURIO
125R MERCURIO
150 SODIO
150R SODIO
200 SODIO
200R SODIO
250 MT
250R MT
400 MT
400 SODIO

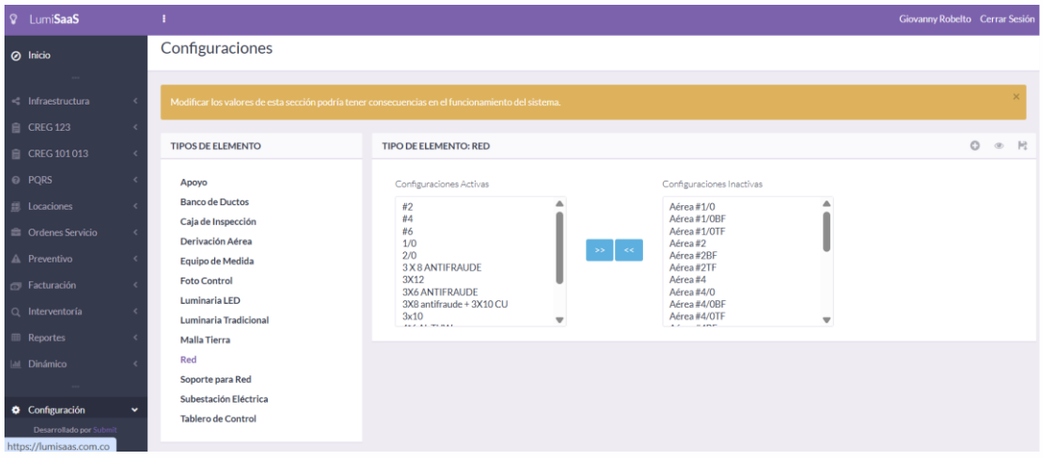

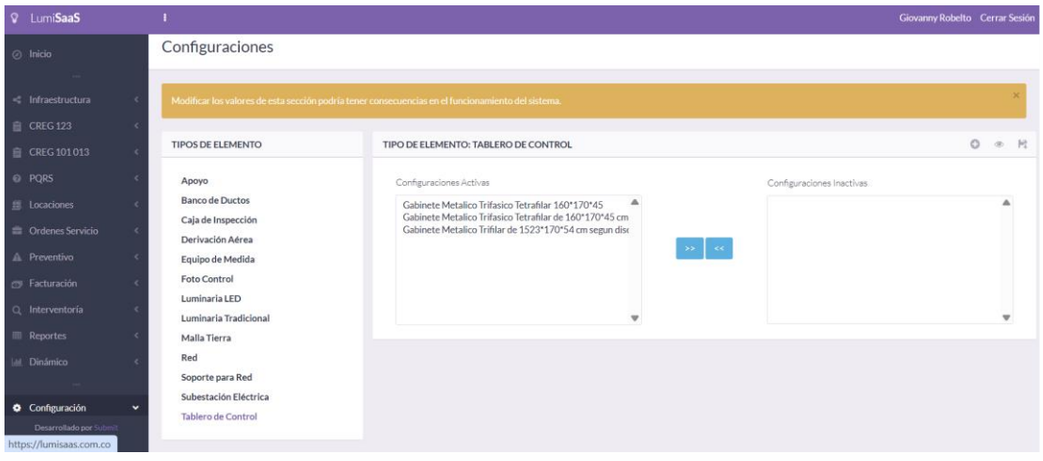

Fuente: Lumisaas fecha 18 de marzo de 2026

A continuación, se enlista las consideraciones que motivaron la suspensión del contrato No 176 de 2025, adicionalmente se anexa el acta de suspensión No 1 del contrato de fecha de 22 de diciembre de 2025, el Informe de actividades y solicitud de suspensión al Contrato Interadministrativo 176 de 2025 y el concepto técnico y jurídico por parte de la supervisión *(ver anexo - Anexo acta de suspensión CTO INTERADTIVO 176-2025 ETR).*

6. Que, en atención a la naturaleza técnica del Estudio Técnico de Referencia y a la necesidad de asegurar que los entregables finales cumplan con los estándares regulatorios exigidos para la toma de decisiones en materia de alumbrado público, se configura la procedencia de la modificación contractual solicitada.

7. Que, el 10 de diciembre de 2025 el contratista PROMOTORA ENERGÉTICA DEL CENTRO S.A.S. E.S.P. mediante oficio S-CO-1400-2025-44 "Informe de actividades y solicitud de suspensión al Contrato Interadministrativo 176 de 2025: "REALIZAR EL ESTUDIO TÉCNICO DE REFERENCIA DE DETERMINACION DE COSTOS, OPTIMIZAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y PUESTA EN MARCHA DEL ESQUEMA DE OPERACIÓN PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.", solicitó la suspensión por treinta (30) días calendario del contrato interadministrativo N° 176 del 4 de agosto de 2025, considerando necesaria la consolidación del total de la información por cada una de las fases que conforman el desarrollo del Estudio Técnico de la Referencia; lo anterior con el fin de dar continuidad a las actividades que permitan el desarrollo del objeto contractual y garantizar la consolidación de información respectiva.

8. Que, el supervisor el 19 de diciembre de 2025 presenta concepto de viabilidad partiendo de la necesidad de la modificación contractual consistente en la suspensión temporal del plazo del Contrato Interadministrativo No. 176 de 2025, y con sujeción a los argumentos técnicos y metodológicos que la motivan, expuestos en el informe de actividades y solicitud presentada por el contratista, así como en el análisis técnico efectuado por la supervisión del contrato, se concluye que dicha modificación persigue una finalidad legítima y se encuentra debidamente justificada desde el punto de vista técnico, jurídico y administrativo.

Las razones que motivaron la suspensión del Contrato Interadministrativo No. 176 de 2025 se fundamentan en la necesidad de garantizar la calidad, integridad y cumplimiento de los estándares técnicos del Estudio Técnico de Referencia (ETR), insumo clave para la toma de decisiones en materia de alumbrado público.

En este sentido, la suspensión fue solicitada por el contratista mediante informe de actividades, en el cual se evidenció la necesidad de **consolidar la totalidad de la información correspondiente a las diferentes fases del estudio**, con el fin de asegurar la coherencia, trazabilidad y calidad de los entregables. Esta solicitud fue avalada por la supervisión del contrato, quien emitió concepto de viabilidad técnica, jurídica y administrativa, considerando que la modificación contractual persigue una finalidad legítima y debidamente justificada.

Adicionalmente, se identificó la necesidad de realizar un análisis técnico detallado de los rendimientos reales en campo, teniendo en cuenta que el volumen de información recopilada, situaciones imprevistas en campo como cajas soldadas para verificación de los elementos soterrados y la cantidad de activos evaluados han superado las estimaciones iniciales, lo que ha impactado los tiempos de ejecución previstos. Este análisis permitirá ajustar de manera adecuada los tiempos requeridos para la correcta consolidación del estudio.

De conformidad con el Acta de Reunión N° 001-2026 del 25 de junio de 2026, suscrita entre representantes de la Oficina de Alumbrado Público del Municipio de Bucaramanga y de Promotora Energética del Centro, se llevó a cabo mesa de trabajo de coordinación para el reinicio de actividades y la solicitud de prórroga del Contrato Interadministrativo 176-2025, cuyo objeto es la realización del Estudio Técnico de Referencia para la determinación de costos, optimización de la eficiencia energética y puesta en marcha del esquema de operación del Sistema de Alumbrado Público del municipio.

En dicha reunión se verificó el estado de entrega de la información pendiente frente a los veintidós (22) aspectos identificados en el Informe de Ejecución de Actividades radicado el 10 de diciembre de 2025 (Rad. S-CO-1400-2025-44). Al respecto, se precisa que los avances reportados son de carácter **definitivo en varios de los aspectos evaluados**, mientras que en otros corresponden a avances **parciales**, condición que obedece a la naturaleza propia de dicha información, la cual requiere labores de **levantamiento en terreno y consolidación técnica por parte del proyecto**, particularmente en lo relacionado con polígonos, geo-referenciación, planos de redes y validación de zonas, cuya verificación definitiva está sujeta a la actuación de los supervisores del proyecto respectivo. De igual forma, se dejó constancia de la inexistencia de cierta información en poder de terceros o de la entidad (inventario de interventoría del SAP, convenios de suministro de energía formalmente suscritos), frente a lo cual las partes acordaron evaluar las alternativas técnicas y administrativas o planes de contingencia que resulten procedentes.

Así mismo, Promotora Energética del Centro manifestó contar con la capacidad administrativa y operativa para reiniciar actividades a partir del 1 de julio de 2026, y anunció la necesidad de tramitar una adición en tiempo de cinco (5) meses al plazo contractual, la cual deberá presentarse formalmente por el contratista ante el supervisor, acompañada de la justificación técnica correspondiente. Se precisó expresamente que las manifestaciones efectuadas en dicha mesa de trabajo **no constituyen autorización, aceptación ni modificación de las condiciones contractuales**, quedando la fecha efectiva de reinicio sujeta a la evaluación de la solicitud formal y al agotamiento de los trámites administrativos, técnicos y jurídicos pertinentes.

En este sentido, se informa que **se avanza en la consecución y consolidación de la documentación técnica requerida para surtir el procedimiento de reinicio de actividades**, en cumplimiento de lo señalado en el Acta de Seguimiento N° 001-2026, con el propósito de dar continuidad al trámite administrativo necesario para la reactivación formal del contrato, sin que ello implique pronunciamiento anticipado sobre la viabilidad de la solicitud de adición en tiempo presentada por el contratista.

En cuanto a la disponibilidad del insumo (ETR), este se encuentra actualmente en proceso de consolidación. Su entrega se realizará una vez se complete la validación técnica de la información y se garantice el cumplimiento del alcance esperado del proyecto, en el marco del plazo de suspensión aprobado de treinta (30) días calendario, se debe realizar una ampliación a la suspensión, conforme al acta No. 1.

Lo anterior se encuentra soportado en los documentos anexos: acta de suspensión, informe de actividades y solicitud de suspensión, así como el concepto técnico y jurídico emitido por la supervisión.

META E INDICADOR DE PRODUCTO

Implementar un sistema de gestión y monitoreo de la información del alumbrado público acorde a RETILAP.

Indicador	Meta 2026	Logro 2026	% Avance 2026	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Sistemas de información actualizados	0,3	0	0%	$ 1.633.400.344	$ 0	0%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE BUCARAMANGA	2024680010205	$ 500.000.000	$ 2.266.800.689,23

Resumen del proyecto: Teniendo en cuenta que el Municipio de Bucaramanga tiene establecido el Impuesto de Alumbrado Público según acuerdo municipal vigente 044 de 2008 y que esta es una renta de destinación específica, es claro y conveniente que se utilice recursos de este rubro para atender todas las necesidades de la prestación del servicio de alumbrado público incluido los gastos administrativos.

Dada la importancia en la prestación del servicio de alumbrado público es necesario realizar la adquisición de la renovación de las licencias OPUS, SGAP, SIAP y otras herramientas tecnológicas, para garantizar el funcionamiento eficaz del área de diseño, garantizando a su vez la administración, operación y mantenimiento y de esta manera prestar el servicio esencial de alumbrado público que no se puede dejar de prestar, por seguridad de todos los habitantes del Municipio.

SOCIALES: El proyecto tiene como principal beneficio el fortalecimiento en el desarrollo y ejecución de las actividades de seguimiento y control a procesos de la secretaría de Infraestructura-Alumbrado Público.

ECONÓMICOS: Implementado nueva tecnología, genera disminución en los altos niveles de consumo de energía y en los costos de mantenimiento especialmente en el ahorro en la contratación de cuadrillas de mantenimiento.

AMBIENTALES: Generar un impacto ambiental, disminuyendo los niveles de dióxido de carbono en la ciudad, al construir el sistema de iluminación con nuevas tecnologías.

PROCESOS CONTRACTUALES RELACIONADOS CON EL PROYECTO Y LA META

INFORMACIÓN DEL PROCESO COTRACTUAL DE SGAP

- **CONTRATO**: 075 DEL 2025
- **OBJETO**: Servicio De Soporte Y Mantenimiento Del Sistema De Gestión De Alumbrado Público-SGAP Y El Hardware De Control Asociado En Los Diferentes Sitios De Telemedida Del Municipio De Bucaramanga.
- **VALOR**: $ 277.556.919
- **FECHA DE INICIO**: 21/05/2025
- **FECHA FIN**: 31/12/2025
- **ESTADO**: TERMINADO EN TRAMITE DE LIQUIDACIÓN.

El software de gestión del Alumbrado Público tiene como objetivo optimizar el control y la operación de las luminarias de la ciudad de Bucaramanga. La plataforma se enfoca en mantener la máxima disponibilidad del servicio, asegurar una alta eficiencia operativa y minimizar los costos asociados a las fallas recurrentes, todo ello a través de una estrategia que va más allá del mantenimiento convencional.

Objetivo del Software: El software busca transformar la gestión del alumbrado público en una plataforma inteligente, trazable y adaptable, asegurando que cada acción técnica esté respaldada por análisis predictivos, indicadores de rendimiento y propuestas de mejora continuas. Esta herramienta facilita una toma de decisiones más ágil y precisa, permitiendo a los gestores anticiparse a posibles riesgos y mejorar la calidad del servicio para los ciudadanos.

Características Claves del Software

1. Monitoreo y Control Remoto: El software permite monitorear el estado de las luminarias en tiempo real, con actualizaciones periódicas sobre la comunicación y el funcionamiento de cada unidad. Esto facilita la identificación de fallas y la implementación de soluciones antes de que se conviertan en problemas mayores.
2. Gestión de Alarmas y Fallas: A través del sistema, se gestionan las alarmas y fallas de forma eficiente, con un proceso automatizado que detecta y notifica incidencias en el menor tiempo posible. Además, el software tiene la capacidad de reducir eventos críticos en más del 95% mediante mantenimiento preventivo, correctivo y un seguimiento remoto constante.
3. Optimización de Mantenimiento Preventivo: El sistema permite la programación de intervenciones periódicas, garantizando que todas las luminarias se mantengan en condiciones óptimas. Las intervenciones incluyen inspecciones regulares, limpieza, revisión de conexiones eléctricas y validación de parámetros técnicos.
4. Gestión de Base de Datos y Respaldos: El software asegura la integridad de los datos mediante la depuración semanal y la verificación de copias de seguridad. De esta manera, se preserva la información histórica y operativa para la toma de decisiones a largo plazo.
5. Análisis de Desempeño y Mejora Continua: El software consolida los indicadores clave de desempeño, trazabilidad de fallas, análisis de costos operativos y propuestas de mejora. Esto permite a los responsables de la gestión del alumbrado público optimizar los recursos, reducir el tiempo de inactividad y mejorar la calidad del servicio prestado a la comunidad.
6. Soporte Técnico Especializado: A través de la plataforma, se proporciona soporte técnico tanto remoto como presencial para resolver incidentes relacionados con el hardware y el software. Esto incluye la atención de fallas en sensores, controladores y otros componentes esenciales para el funcionamiento del sistema de alumbrado público.

7. Capacitación y Actualización del Personal: El software también incluye módulos para la capacitación continua del personal operativo, asegurando que estén actualizados en el manejo del sistema y la integración de nuevos equipos.


Beneficios para la Gestión del Alumbrado Público. El uso de este software permite una gestión más eficiente y proactiva del alumbrado público de Bucaramanga, con los siguientes beneficios clave:

- Mayor disponibilidad y confiabilidad del servicio, reduciendo significativamente el tiempo de inactividad.
- Mejor control y trazabilidad, lo que permite una mejor planificación y ejecución de las actividades de mantenimiento.
- Reducción de costos operativos, gracias a la optimización de recursos y la prevención de fallas.
- Mayor resiliencia ante incidentes, con una respuesta más rápida y efectiva a las alertas del sistema.

El software de gestión implementado por WM SAS en el Alumbrado Público de Bucaramanga no solo facilita la operación diaria de las luminarias de la ciudad, sino que también transforma la gestión del alumbrado en una plataforma inteligente y adaptable. Con su capacidad de monitoreo en tiempo real, gestión de alarmas, mantenimiento preventivo y análisis de desempeño, el sistema asegura una operación eficiente, confiable y resiliente, elevando la calidad del servicio y optimizando los recursos públicos.

Recursos públicos.



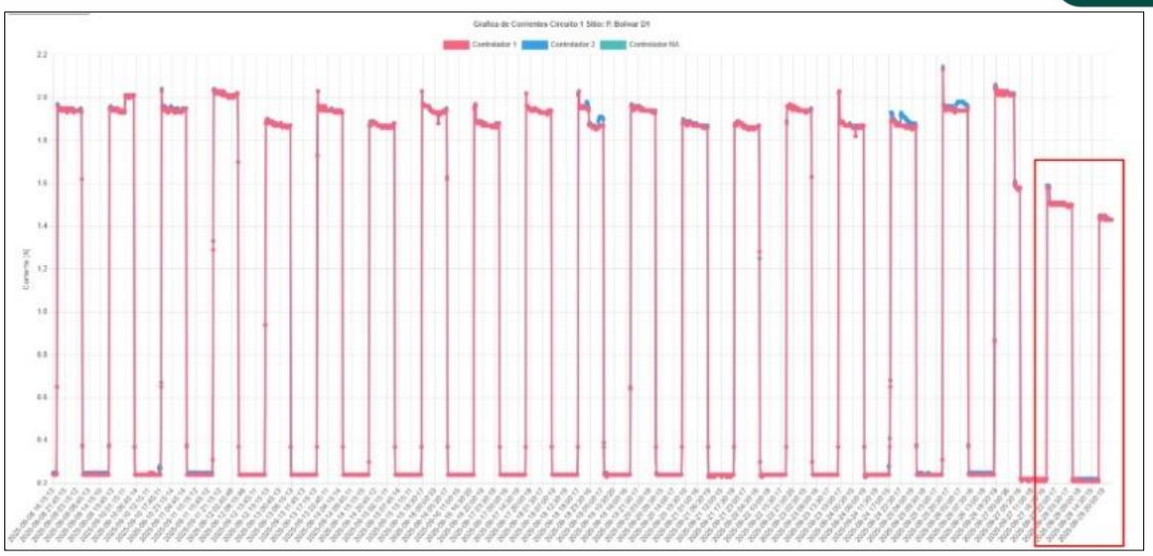


Medidores del Sitio: C. La Feria Q2
Oct 02 2025
14:08:08
Medidor Frontera
Serial: 21081044
Marca: P2000D
Lectura Activa: 42318.512
Corriente Fase A (A): 00.00
Corriente Fase B (A): 00.06
Corriente Fase C (A): 00.00
Tension Fase A (V): 128.17
Tension Fase B (V): 127.93
Tension Fase C (V): 128.37
Seleccionar Todos
CTO 1
128[V] 00.08 [A]
Cont. 1 - OFF
128[V] 00.00 [A]
Cont. 2 - OFF
CTO 2
128[V] 00.00 [A]
Cont. 3 - OFF
128[V] 00.00 [A]
Cont. 4 - OFF
128[V] 00.00 [A]
Cont. 5 - OFF



INFORMACIÓN DEL PROCESO COTRACTUAL DE OPUS

ICONTRATO: 153 DEL 2025

- **OBJETO**: Renovación De Suscripción De 11 Licencias Del Software Opus 24 Por Dos Años Para Alumbrado Público Del Municipio De Bucaramanga.
- **VALOR**: $ 58.821.460,00
- **FECHA DE INICIO**: 05/08/2025
- **FECHA FIN**: 04/09/2025
- **ESTADO**: EN RECIBO FINAL PARA INICIAR PROCESO DE LIQUIDACIÒN

OPUS está diseñado para optimizar la gestión de presupuestos, su principal objetivo es automatizar, controlar y analizar los presupuestos de manera eficiente, permitiendo una planificación financiera más precisa y un seguimiento en tiempo real de los gastos e ingresos. Con OPUS, la organización puede mejorar la asignación de recursos y garantizar el cumplimiento de los objetivos financieros establecidos.

Características del Software:

- Planificación y Asignación de Presupuestos: OPUS permite la creación de presupuestos detallados por áreas, proyectos o departamentos, con la capacidad de realizar ajustes conforme se desarrollan las actividades financieras.
- Monitoreo en Tiempo Real: Ofrece la capacidad de monitorear los gastos y compararlos con el presupuesto proyectado, alertando sobre desviaciones y facilitando la toma de decisiones correctivas.
- Informes Detallados y Personalizados: Genera informes financieros completos que muestran el estado de los presupuestos, permitiendo un análisis exhaustivo de las variaciones y facilitando la toma de decisiones.
- Integración con Otros Sistemas Financieros: OPUS puede integrarse con sistemas contables y de gestión de recursos, lo que garantiza la consistencia y precisión de los datos financieros a lo largo de la organización.

Beneficios para la Gestión de Presupuestos:

- Optimización de Recursos Financieros: El programa asegura que los recursos se asignen de manera eficiente, evitando sobrecostos y asegurando que cada área se mantenga dentro de su presupuesto.
- Mejor Control y Seguimiento: La capacidad de monitorear el presupuesto en tiempo real permite a los gerentes realizar ajustes inmediatos y evitar desviaciones que afecten los resultados financieros.
- Mayor Precisión en la Planificación: Gracias a las herramientas de análisis y simulación, los presupuestos se planifican con mayor precisión, considerando variables e imprevistos, lo que mejora la exactitud de las previsiones financieras.
- Cumplimiento de Objetivos Financieros: Con OPUS, se facilita el cumplimiento de metas financieras, ya que permite un seguimiento constante y detallado, ayudando a las organizaciones a cumplir con sus objetivos sin exceder los límites presupuestarios. La implementación del software OPUS para la gestión de presupuestos permitirá a la organización mejorar significativamente la precisión en la planificación financiera, optimizar los recursos y tener un control exhaustivo sobre los gastos. Esto no solo optimiza el proceso de presupuestación, sino que también contribuye al éxito financiero a largo plazo de la empresa, asegurando que cada área esté alineada con las metas financieras globales.



INFORMACIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SIAP

- **CONTRATO**: 175 DEL 2025
- **OBJETO**: Análisis Y Diagnostico De La Situación Actual E Implementación De Un Sistema De Información De Alumbrado Público - SIAP En El Municipio De Bucaramanga
- **VALOR**: $ 259.205.210
- **FECHA DE INICIO**: 25/08/2025
- **FECHA FIN**: 31/12/2025
- **ESTADO**: TERMINADO EN TRAMITE DE LIQUIDACIÒN

Información Sobre Avance De Ejecución Del Proceso

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN

1.1 Sobre la información base y la fase de diagnóstico

- La supervisión observa que una parte significativa de la información utilizada como insumo para el diagnóstico inicial correspondía a bases de datos desactualizadas y a información incompleta, situación que fue debidamente documentada por el contratista y validada por la supervisión.
- Se deja constancia de que dichas limitaciones no fueron atribuibles al contratista, sino a condiciones preexistentes del sistema de información del Alumbrado Público.
- La supervisión verificó que estas limitaciones fueran explícitamente reconocidas en los informes, permitiendo que las conclusiones y decisiones posteriores se adoptaran con conocimiento de los riesgos asociados.

1.2 Sobre la selección de la alternativa tecnológica

- La supervisión observa que la selección de la alternativa tecnológica se realizó con base en criterios funcionales y normativos alineados con las necesidades identificadas en el diagnóstico.
- No obstante, se deja constancia de que, para efectos de auditoría o control posterior, resulta conveniente fortalecer el expediente con evidencias adicionales que respalden la verificación de cumplimiento de todos los requisitos técnicos y normativos evaluados.
- La supervisión considera que esta observación no afecta la validez de la selección, sino que constituye una recomendación para robustecer la trazabilidad documental.

1.3 Sobre la implementación y puesta en marcha del SIAP

- La supervisión observa que la implementación del SIAP se realizó de manera progresiva y articulada con el Estudio Técnico de Referencia, considerando la decisión institucional de levantar la información desde cero.
- Se deja constancia de que la puesta en marcha corresponde a la **habilitación operativa del sistema**, y no a la culminación del levantamiento total del inventario de alumbrado público, el cual constituye un proceso posterior y continuo.
- La supervisión verificó la instalación del sistema, la creación de usuarios, la instalación de aplicaciones y la ejecución de capacitaciones como requisitos mínimos para la puesta en marcha.

1.4 Sobre la capacitación y apropiación del sistema

- La supervisión observa que las capacitaciones se priorizaron en las áreas críticas para el inicio de la operación del sistema, tales como bodega, almacén y levantamiento en campo.
- Se deja constancia de que, debido a la alta rotación de personal en algunas áreas, la capacitación integral de todos los usuarios finales fue prevista como un proceso progresivo, recomendándose su continuidad para garantizar la apropiación institucional del sistema.
- Esta situación fue conocida, aceptada y gestionada dentro del marco del contrato, sin afectar el cumplimiento de la actividad de implementación.

1.5 Sobre la documentación y versión de los informes

- La supervisión observa que algunos informes se presentan como versiones preliminares, debido a la programación de entrevistas y validaciones pendientes relacionadas con seguridad de la información y privacidad.
- Se recomienda que dichas validaciones sean incorporadas en una versión final consolidada del informe, con el fin de fortalecer el componente de seguridad y gobernanza de la información.
- Esta observación no impide el reconocimiento del cumplimiento de las actividades contractuales, pero sí se registra como un aspecto a cerrar formalmente en el expediente.

1.6 Sobre el ejercicio de la supervisión

- La supervisión deja constancia de que durante la ejecución del contrato se ejerció control permanente mediante revisión documental, seguimiento cronológico, requerimientos formales, mesas técnicas y validación de evidencias.
- Las observaciones realizadas al contratista fueron atendidas oportunamente, sin que se presentaran incumplimientos reiterados ni controversias que afectaran la ejecución del contrato.

2. CONCLUSIONES DE LA SUPERVISIÓN

1. Las actividades contractuales correspondientes a las **Actividades 1.1 (Recopilación), 1.2 (Análisis y Diagnóstico), 1.3 (Selección de Alternativa) y Actividad 2 (Implementación y Puesta en Marcha del SIAP)** fueron ejecutadas conforme al alcance definido en el Contrato Interadministrativo No. 175 de 2025.
2. El contratista dio cumplimiento a las obligaciones contractuales, entregando los productos esperados y atendiendo los requerimientos realizados por la supervisión durante la ejecución del contrato.
3. La supervisión ejerció de manera efectiva sus funciones de control, seguimiento y verificación, dejando trazabilidad documental y cronológica de las actuaciones realizadas.
4. El Sistema de Información de Alumbrado Público – SIAP fue implementado y puesto en marcha, quedando habilitado para su operación inicial por parte de la Entidad, con usuarios creados, dispositivos configurados y personal capacitado.
5. Las observaciones formuladas por la supervisión se enmarcan en un enfoque preventivo y de mejora continua, y no constituyen incumplimientos contractuales.

6. En consecuencia, y sin perjuicio de las recomendaciones consignadas, la supervisión concluye que el contrato **cumplió con el objeto y las actividades contratadas**, dejando constancia para los fines administrativos, técnicos y de control a que haya lugar

6-OTROS PROYECTOS CONTRATADOS Y QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 166 DEL 2013 con objeto: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Valor del contrato:	$85.373.383.221
Duración del contrato:	38 Meses
Fecha de inicio:	12 de julio de 2023
Fecha de terminación:	11 de septiembre de 2026
Estado del Contrato:	EJECUCIÓN
Porcentaje avance:	16,7 %

Ubicación: Intervención en las siguientes Instituciones Educativas:

- Institución Educativa Tecnológico Dámaso Zapata
- Institución Educativa Custodio García Rovira INEM
- Institución Educativa: Santander

Descripción de actividades desarrolladas

1. **Remisión de información a FINDETER**

Desde la supervisión del municipio de Bucaramanga, se ha remitido a FINDETER la información necesaria para adelantar los respectivos procesos de contratación, en las siguientes fechas:

1. Proyecto Dámaso Zapata: Se envió el alcance del proyecto el **22 de mayo de 2025**, mediante radicado 2-S-SdIB-202505-00040686
2. Proyecto Institución Educativa Santander: Se envió el alcance del proyecto **el 30 de enero de 2025**, mediante radicado S-SdIB-202504-00003567 al cual se le dio alcance el pasado 25 de junio de 2025, a través radicado 2-S-SdIB-202506-00055252 realizando la actualización de precios al segundo semestre del 2025, así como incluyendo el proyecto de estudio de patología en esta institución.
3. Proyecto INEM: Se envió el link con la información que contiene el alcance final del proyecto el 06 de junio de 2025, y la actualización de precios para el segundo semestre el 25 de junio de 2025.

Así mismo, de manera oportuna se ha revisado y enviado las observaciones a los estudios previos remitidos por parte de Findeter.

2. **Estado contractual y financiero del convenio**

El valor del contrato se encuentra distribuido de la siguiente manera:

- VALOR INICIAL CONTRATO de SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($79.668.991.613), correspondientes a los del **empréstito**.

A este convenio posteriormente se le realizaron 4 adiciones con cargo a los recursos del presupuesto de la alcaldía (no de empréstitos), de la siguiente forma:

- VALOR ADICIONAL 1: DOS MIL SEISCIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($2.601.319.769).
- VALOR ADICIONAL 2: DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($2.494.271.839).
- VALOR ADICIONAL 3: CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCT ($ 163.800.000,00)
- VALOR ADICIONAL 4: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCT ($445.000.000,00),

Para un valor total del contrato de OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE. ($ 85.373.383.221,00)

3. Distribución presupuestal por institución educativa

Teniendo en cuenta el valor global del convenio, anteriormente indicado, se aclara que en este se encuentran incluidos todos los costos asociados, tales como: los estudios y diseños, los estudios de patología, la ejecución de las obras, las interventorías, la gerencia del proyecto, así como los correspondientes impuestos y tasas derivados de la suscripción del convenio, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera por Institución educativa:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	VALOR ASIGNADO
Institución Educativa Custodio García Rovira INEM	$ 27.652.155.890
Institución Educativa: Santander	$ 12.041.647.730
Institución Educativa Tecnológico Dámaso Zapata	$ 45.679.579.601

4. Avances en procesos de contratación

De manera que a la fecha FINDETER ha adelantado los procesos de contratación de estudios, diseños y obra https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atbucaramanga-o-052-2025 e interventoría https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atbucaramanga-i-058-2025 para la Institución Educativa Tecnológico Dámaso Zapata

Teniendo en cuenta el link del proceso anteriormente indicado y de acuerdo a los términos de referencia publicados se tienen los siguientes plazos establecidos para la ejecución del proyecto:

ESTADO DEL PROYECTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DÁMASO ZAPATA

CONSTRUCCION

Estado: En ejecución

Link: https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atbucaramanga-o-052-2025

No de proceso de contratación: PAF-ATBUCARAMANGA-O-052-2025

Objeto: Contratar la “Elaboración de estudios y diseños, construcción y adecuación de edificaciones y espacios en la institución educativa técnico Dámaso Zapata del municipio de Bucaramanga, departamento de Santander”

Valor: $28,004,682,260.00 COP

INTERVENTORIA

Estado: En ejecución.

Link: https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atbucaramanga-i-058-2025

No de proceso de contratación: PAF-ATBUCARAMANGA-I-058-2025

Objeto: CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO DÁMASO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”

Por otra parte FINDETER ha adelantado los procesos de contratación de obra https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atbucaramanga-o-062-2025 e interventoría https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atbucaramanga-i-066-2025 para la Institución **Educativa Santander**

CONSTRUCCION

Estado: En ejecución.

Link: https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atbucaramanga-o-062-2025

No de proceso de contratación: PAF-ATBUCARAMANGA-O-062-2025

Objeto: CONTRATAR “EL MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTANDER DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.””

INTERVENTORIA

Estado: En ejecución.

Linkhttps://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atbucaramanga-i-066-2025

No de proceso de contratación: PAF-ATBUCARAMANGA-I-066-2025

Objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) AL MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTANDER DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”

Valor: $316,381,250.00

Finalmente, FINDETER ha adelantado los procesos de contratación de obra https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10285266&isFromPublicArea=True&isModal=False e interventoría https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10285629&isFromPublicArea=True&isModal=False para la **IE Custodio García Rovira INEM.**

CONSTRUCCION

Estado: En proceso de contratación.

Link:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10285266&isFromPublicArea=True&isModal=False

No de proceso de contratación: PAF-ATBUCARAMANGA-O-027-2026

Objeto: CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CUSTODIO GARCIA ROVIRA INEM, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Valor: $ 18.290.761.366,00 COP

INTERVENTORIA

Estado: En proceso de contratación.

Link:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10285629&isFromPublicArea=True&isModal=False

No de proceso de contratación: PAF-ATBUCARAMANGA-I-039-2026

Objeto: INTERVENTORIA MEJORAMIENTO INSTITUCIÓN EDUCATIVA CUSTODIO GARCIA ROVIRA INEM - BUCARAMANGA

Valor: $ 1.114.144.020,00 COP

El proceso de contratación correspondiente al proyecto del Colegio INEM actualmente se encuentra en su etapa final previa a la adjudicación, habiendo surtido las fases de evaluación de las propuestas y atención de observaciones presentadas dentro del proceso.

Actualmente, se encuentra a la espera de la recomendación del orden de elegibilidad por parte del Comité Técnico y de la posterior aprobación y adjudicación por parte del Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo Aliados Findeter para la Asistencia Técnica y Administración de Recursos – Subcuenta Infraestructura Educativa Bucaramanga.

Una vez surtidos dichos trámites y culminadas las actuaciones administrativas y contractuales correspondientes, se procederá con la suscripción del Acta de Inicio del contrato respectivo.

CONVENIO N° 285 DE 2024: Convenio Interadministrativo 285 del 27 de diciembre de 2024 OBJETO: AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES ADMINSITRATIVOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A E.S.P. PARA GESTIONAR ANTE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO LA PRESENTACION DEL PROYECTO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMEINTO BASICO “PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR RIO DE ORO PARA LA EXPEDICION DEL CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD”

CONVENIANTE / Nit.	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.22-0
CONVENIDO / Nit.	EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP EMPAS S.A NIT: 900115931
VALOR INICIAL:	$ 0
ANTICIPO (%):	N/A
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR TOTAL:	N/A
PLAZO INICIAL:	6 MESES

PRORROGA No.1	CINCO (5) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS Fecha terminación hasta el 31 de diciembre de 2025
PRORROGA No.2	DOCE (12) MESES Fecha terminación hasta el 31 de diciembre de 2026
PLAZO TOTAL:	VEINTITRES (23) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS
INTERVENTORÍA:	N/A
FECHA DE INICIO:	07 ENERO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	N/A
FECHA DE REINICIO 1:	N/A
ESTADO DEL CONTRATO:	ACTIVO
FECHA TERMINACIÓN FINAL	31 DE DICIEMBRE DE 2026
PORCENTAJE AVANCE FÍSICO:	87 %
AVANCE FINANCIERO:	%

ESTADO DEL CONTRATO: ACTIVO

Las actividades del presente contrato consisten en la transferencia de información, o presentación del proyecto “PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR RIO DE ORO” al Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio para la revisión de los aspectos técnico, predial y financiero y demás que competen al proyecto, para la posterior expedición del concepto técnico de viabilidad.

OBSERVACIONES:

En cuanto al estado del convenio 285-2024, una vez enviadas las observaciones técnicas por parte del Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, EMPAS realizo las respectivas subsanaciones. A la fecha el aspecto técnico se encuentra totalmente revisado y subsanado.

Se están realizando subsanaciones en cuanto al aspecto predial. Se adelantan procesos de aspecto predial con las respectivas entidades territoriales, en lo concerniente a predios baldíos y no baldíos, para posteriormente realizar las solicitudes de permisos de paso.

En el aspecto financiero se cuenta con el documento CONPES 4173 PTAR RIO DE ORO,

La documentación esta entregada con plenitud en revisión al Viceministerio.

Se está proyectando el convenio para transferencia de fondos del gobierno Nacional al proyecto de obra. Es un convenio para seguimiento y control al uso de los recursos por parte de los beneficiarios del proyecto, que son los usuarios del Municipio de Bucaramanga, del Municipio de Girón y de EMPAS.

PROBLEMÁTICAS:

El tema predial no se consideraría problemática, si no que hace parte de las subsanaciones y requerimientos que el ministerio ha realizado al componente predial del proyecto.

Se realiza solicitud de prórroga para ampliar el plazo de entrega de subsanación para integrar lo pertinente al CONPES, (la aprobación da un plazo de 6 meses para entregar lo que está pendiente con el Ministerio en cuanto al componente predial). La agencia Nacional de tierras requiere más tiempo para subsanar el tema del marco de predios baldíos.

AVANCE POR FRENTES / ACTIVIDADES				
FRENTE	**% INVERSION INICIAL**	**ESTADO**	**% AVANCE**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**
Aspecto técnico	N/A	Cerrado / revisado y subsanado	100%	Revisiones y subsanaciones solicitadas

Aspecto predial	N/A	Activo / en revisión	60%	Revisiones y subsanaciones solicitadas
Aspecto financiero	N/A	Activo / en revisión	85%	Revisiones y subsanaciones solicitadas CONPES

IMPACTO: POBLACIÓN BENEFICIADA

La PTAR Río de Oro beneficiará directamente a Bucaramanga y Girón, ya que está diseñada para tratar el 100 % de las aguas residuales urbanas de estos dos municipios, impactando a más de un millón de habitantes.







Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCE: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: A FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	2023680010005	$ 42.999.999.999,00	$ 42.999.999.999,00

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE OBRAS ADICIONALES EN LOS CAUSES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	202500000019488	$ 21.135.251.009,00	$ 21.135.251.009,00

CONTRATO DE OBRA 69 de 2023 -: CONSORCIO LA FLORA 2023 "CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCE: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: A FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA".

SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA CTO 85 de 2023
Laura Rocío Guerrero López – Asesor de despacho.
Secretaría de Infraestructura Municipal.

Valor inicial del contrato:	$ 40.514.056.133,00
Valor adicional No 1:	$ 20.168.495.053,00
Valor total:	$ 60.682.551.186,00
Plazo inicial:	Dieciocho (18) meses
Plazo adicional No 1:	Un (01) mes
Plazo adicional No 2:	Cinco (05) meses
Plazo adicional No 3:	Siete (07) meses
Plazo adicional No 4:	Veintiún (21) días
Plazo adicional No 5:	Cinco (05) meses
Plazo total:	Treinta y un (36) meses y veintiún (21) días
Suspensión No 1:	04/12/2024
Reinicio No 1:	10/12/2024
Suspensión No 2:	23/12/2024
Ampliación a la Suspensión:	13/01/2026
Reinicio No 2:	13/03/2026
Suspensión No 3:	20/03/2026
Reinicio No 3:	27/03/2026
Fecha de inicio:	05 de mayo de 2023
Fecha de terminación:	04 de noviembre de 2024
Nueva fecha de terminación:	27 de agosto de 2026
Porcentaje avance:	89.30%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra actualmente en ejecución. Dentro de las actividades principales se ha ejecutado lo siguiente:

- **Construcción Box Coulvert 3.50*3.50:** Se han ejecutado 810 metros lineales.
- **Construcción Box Coulvert 3.0*3.0:** Se han ejecutado 210 metros lineales.
- **Instalación de Tubería para el colector de aguas servidas D: 24":** Se han ejecutado 943 metros lineales
- **Compactación de Rellenos:** Se han compactado 52.197,76 m³ de relleno
- **Construcción de Sumideros:** Se han construido 14 sumideros
- **Construcción pavimento en concreto MR41:** 1.200,00 metros lineales de vía en pavimento rígido y bahías de parqueo.
- **Suministro e instalación de tubería PEAD estructurada Ø1800 mm:** Se han instalado 410 ml
-

- **Mejoramiento del espacio público:** En la cancha de fútbol se realizó relleno nivelado en arena de peña y cerramiento parcial. Por otra parte, se ha llevado a cabo empradización de zonas verdes e instalación de senderos peatonales.

REGISTRO FOTOGRAFICO

	
Imagen: Suministro e instalación de tubería PEAD estructurada Ø1800 mm	**Imagen:** Adecuación de los entornos peatonales
	
Imagen: Construcción de pozos de inspección y relleno.	**Imagen:** Pavimentación Concreto MR41

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL BARRIO LA FERIA, ASENTAMIENTO CAMILO TORRES Y CUYANITA ETAPA 1. UBICADOS EN LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	2024680010080	$ 43.840.721.399,25	$ 43.840.721.399,25

CONTRATO DE OBRA 226 de 2024 – MANUEL GUILLERMO CAMACHO CARVAJAL **“**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL BARRIO LA FERIA, ASENTAMIENTO CAMILO TORRES Y CUYANITA ETAPA 1. UBICADOS EN LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”.

Valor del contrato:	$ 27.395.301.404,00
Valor adicional No 1:	$ 13.682.605.825,00
Valor total:	$ 41.077.907.229,00
Plazo inicial:	Quince (15) meses
Plazo adicional No 1:	Siete (07) meses
Plazo total:	Veintidós (22) meses
Fecha de inicio:	17 de diciembre de 2024
Fecha de terminación:	16 de marzo de 2026
Nueva fecha de terminación:	16 de octubre de 2026
Interventor	JM CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A.S
Supervisor	Wilson Motta Rodríguez
Porcentaje avance:	89.45%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en ejecución. Con avances significativos en varias de las actividades programadas. A continuación, se presenta el detalle de las actividades principales ejecutadas a la fecha:

- Suministro e Instalación de anclajes: Se instalaron 459 anclajes.
- Suministro y colocación de drenes: Se instalaron 416 drenes
- Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda, espesor 10 cm: tiene un área de 3.780 m2 correspondiente al 94, 58 % del valor a intervenir
- Suministro e instalación de tubería de alcantarillado NOVAFORT Ø 16” (400 mm), incluyendo excavación: la longitud de tubería instalada en la parte baja de la obra tiene valor 150,21 ml.
- Tensionamiento de anclajes: hay 195 anclajes tensionados.
- Micropilotes fundidos en sitio Diámetro de 25 cm (incluye concreto de 4000 psi): Hay construidos 2.250,96 ml de micropilotes para conformar vía de la parte superior
- Concreto 4000 psi para muro de contención: construidos 71,48 m3 de concreto de 4.000 psi para muro de contención.

REGISTRO FOTOGRAFICO

	
Imagen: Construcción de Muro de contención que permitirá conformar vía en la parte superior.	**Imagen:** Se construyen dados de concreto para posterior tensionamiento de anclajes.
	
Imagen: Construcción de pilotes para cimentación de muro de contención.	**Imagen:** Construcción de alcantarillado en la parte baja de la obra-compactación del terreno.

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN EL SECTOR CLUB GALLINERAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER	202500000004329	$ 1.789.079.800	$ 1.789.079.800

CONTRATO DE OBRA 99 de 2025 – CORPORACIÓN INGESEM IDEAS QUE CONTRUYEN FUTURO "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN EL SECTOR CLUB GALLINERAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER".

Valor del contrato:	$ 1.513.937.250,00
Plazo inicial:	Cuatro (04) meses
Plazo adicional No 1:	Diecisiete (17) días
Fecha de inicio:	28 de julio de 2025
Fecha de terminación:	27 de noviembre de 2025
Nueva fecha de terminación:	14 de diciembre de 2025
Interventor	SISTEMA DE INGENIERÍA SUCURSAL COLOMBIA
Supervisor	Wilson Motta Rodríguez
Porcentaje avance:	100%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra terminado, con acta de recibo final y en trámite de liquidación.

REGISTRO FOTOGRAFICO

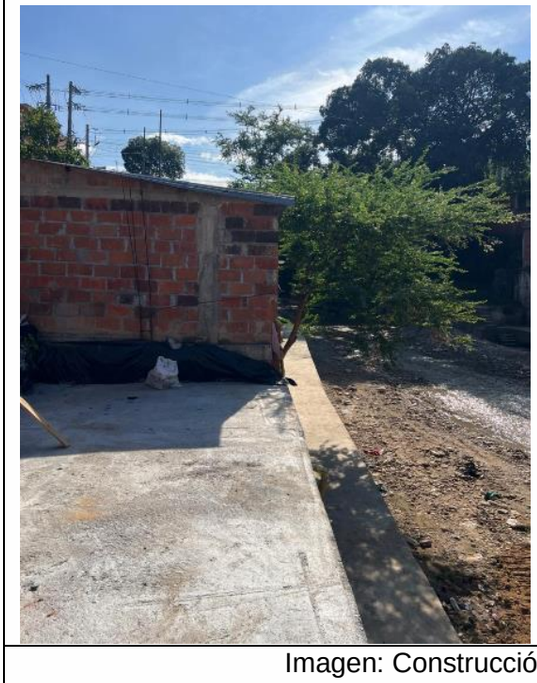




Imagen: Construcción de muro en gavión

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN EL BARRIO CRISTAL BAJO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	202500000007089	$ 5.774.128.850	$ 5.774.128.850

CONTRATO DE OBRA 98 de 2025 – CONSORCIO GAVIONES LEWIS ROJAS **“**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN EL BARRIO CRISTAL BAJO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”.

Valor del contrato:	$ 5.277.464.143,00
Valor adicional No 1:	$ 2.615.045.981,00
Valor total:	$ 7.892.510.124,00
Plazo inicial:	Siete (07) meses
Pazo adicional No 1:	Quince (15) días
Pazo adicional No 2:	Tres (03) meses
Plazo total:	Diez (10) meses y quince (15) días
Fecha de inicio:	28 de julio de 2025
Fecha de terminación:	27 de febrero de 2026
Nueva fecha de terminación:	26 de julio del 2026
Suspensión No 1:	11/03/2026
Reinicio No 1:	24/04/2026
Interventor	CONSORCIO INTERGAVIONES FZ-AGLV
Supervisor	Wilson Motta Rodríguez
Porcentaje avance:	83.66 %

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en ejecución. Con avances significativos en varias de las actividades programadas. A continuación, se presenta el detalle de las actividades principales ejecutadas a la fecha:

- **Construcción de gavión:** Se han construido 2.773 m³ de gaviones. Equivalentes al 78%.
- **Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG (incluye acarreo):** Se han compactado 1.292,22 m³. Equivalentes al 91,65%
- **Recubrimiento de gaviones en concreto de 3000 psi (espesor mínimo de 12,5 cm):** con un valor de 261,41 m³. Equivalentes al 81,26%
- **Concreto 4.000 PSI para muro en concreto reforzado (incluye materiales, formaleta y aditivo acelerante)** con un valor de 26,42%. Equivalentes al 100%.





Imagen: Construcción de gaviones y disipador transversal

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN EL SECTOR DE JOSÉ ANTONIO GALÁN, CARLOS PIZARRO Y 5 DE ENERO ETAPA 1, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	202500000004438	$ 9.435.889.561,60	$ 9.435.889.561,60

CONTRATO DE OBRA 97 de 2025 – CONSORCIO ONIX "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN EL SECTOR DE JOSÉ ANTONIO GALÁN, CARLOS PIZARRO Y 5 DE ENERO ETAPA 1, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER".

Valor del contrato:	$ 8.885.552.392,00
Plazo inicial:	Seis (06) meses
Plazo adicional No 1:	Un (01) mes
Plazo adicional No 2:	Un (01) mes
Plazo adicional No 3:	Tres (03) mes
Plazo Total:	Once (11) meses
Fecha de inicio:	28 de julio de 2025
Fecha de terminación:	27 de enero de 2026
Nueva fecha de terminación:	25 de julio de 2026
Suspensión No 1:	26/03/2026
Reinicio No 1:	24/04/2026
Porcentaje avance:	55.73%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en ejecución. Con avances significativos en varias de las actividades programadas. A continuación, se presenta el detalle de las actividades principales ejecutadas a la fecha en el margen derecho del rio de oro:

- **Se ha fundido dentellón en concreto ciclópeo:** Se ha fundido dentellón en concreto ciclópeo en una longitud de 141 ml en la ribera margen derecha del Río de Oro.
- **Se ha fundido placa para gavión en concreto ciclópeo:** Se ha fundido placa para gavión en concreto ciclópeo en una longitud de 141 ml (Sección 6mx0,7m) en la ribera margen derecha del Río de Oro.
- **Construcción de gavión:** construcción de gavión con 3.980,00 m³, que representa 59,42%.
- **Recubrimiento de gaviones en concreto de 3000 psi (espesor mínimo de 12,5 cm):** Se ha realizado recubrimiento con valor de 199,50 m³, que representa el 33,57%.

Durante la ejecución de las actividades en el margen derecho de la quebrada Chimita se identificó la presencia de infraestructura de transporte de gas perteneciente a las empresas CENIT y PROMIORIENTE, lo que ha generado restricciones técnicas para la construcción de las obras. En las mesas de trabajo realizadas, dichas empresas establecieron distancias mínimas de seguridad entre la tubería y las estructuras proyectadas. En consecuencia, actualmente se adelanta el rediseño de las obras en este sector para garantizar el cumplimiento de los requisitos de seguridad y la viabilidad técnica de la intervención.

REGISTRO FOTOGRAFICO

	
Imagen: Conformación de gaviones margen derecha Río de Oro	**Imagen:** Vista General de gavión construido

RESTAURACIÓN DEL COLISEO PERALTA INMUEBLE DECLARADO BIEN DE INTERESES CULTURAL DE ÁMBITO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.

Con el propósito de adelantar la recuperación integral del Coliseo Peralta, fue necesario gestionar la elaboración de los estudios técnicos y del proyecto de intervención, los cuales constituyen la base para la ejecución de las futuras obras de restauración del Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional (BICN).

En la vigencia 2023, el Ministerio de Cultura asignó, mediante su Plan de Acción, recursos por valor de quinientos millones de pesos ($500.000.000) para iniciar el proceso de recuperación del inmueble. Como contrapartida, el Municipio de Bucaramanga, a través de la Alcaldía, aportó trescientos millones de pesos ($300.000.000) destinados a cofinanciar la elaboración de los estudios técnicos y la interventoría correspondiente.

Como resultado de la ejecución de la consultoría, el contratista hizo entrega de la totalidad de los productos contractuales. Posteriormente, adelantó los trámites requeridos para la obtención de la licencia de construcción ante la Curaduría Urbana No. 1 y la aprobación de las disponibilidades de servicios públicos por parte de las empresas prestadoras.

Debido a que la culminación de los contratos derivados del Convenio No. 3985 de 2023 dependía de la obtención de la licencia de construcción, fue necesario prorrogar la Suspensión No. 4, suscrita el 17 de diciembre de 2025, hasta el 1 de agosto de 2026, mientras se obtenía la decisión definitiva sobre el trámite de licenciamiento. La obtención de este acto administrativo constituyó un hito fundamental para el cierre y liquidación de los contratos derivados del convenio.

Una vez atendidas las observaciones formuladas por el Ministerio de Cultura y presentada la documentación técnica y legal correspondiente, dicha entidad expidió la Resolución No. 1565 de 2025, mediante la cual aprobó la intervención del Coliseo Peralta. Posteriormente, el 26 de mayo de 2026, la Curaduría Urbana No. 1 aprobó la licencia de construcción correspondiente al Expediente VR25-4867, radicado el 16 de diciembre de 2025.

A continuación, se presenta la información general del Convenio No. 3985 de 2023 y de los contratos derivados del mismo:

Convenio Interadministrativo No. 3985-2023

Objeto	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la recuperación del Coliseo Peralta – Bien de Interés Cultural de ámbito Nacional – Decreto 292 del 24 de febrero de 1975, en el municipio de Bucaramanga, Santander
Fecha de suscripción	28 de junio de 2023
Valor total	$ 800.000.000
Aportes	
Ministerio de Cultura	$500.000.000
Total aporte Ministerio	$500.000.000
Municipio de Bucaramanga	$300.000.000
Total aporte Departamento	$300.000.000
Plazo de ejecución	
Fecha de inicio	19 de julio de 2023
Término de ejecución	Hasta el 31 de marzo del 2026
Supervisión	
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes	Arquitecta Lina María Rosales Suárez. Supervisora convenio.
Municipio de Bucaramanga Secretaría de Infraestructura	Edgar Yamitd Pinto Hernández. Supervisor convenio.
Contratos derivados del convenio:	

OBJETO	INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PROYECTO DE RESTAURACION DEL COLISEO PERALTA INMUBLE DECLARADO BIEN DE INTERES CULTURAL DEL AMBITO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
NÚMERO Y FECHA DEL CONTRATO	252-29/09/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$174.358.800,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$35.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 209.358.800,00
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES
PLAZO ADICIONAL DE EJECUCIÓN	DOS (2) MESES
PLAZO ADICIONAL DE EJECUCIÓN 2	UN (1) MES
PLAZO TOTAL DEL EJECUCIÓN	SEIS (6) MESES
CONTRATISTA	CONSULTORÍA ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCIÓN SAS
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS GABRIEL CAMACHO OBREGÓN
NIT	900160387
SUPERVISOR	EDGAR YAMITD PINTO HERNÁNDEZ
FECHA DE INICIO	23/10/2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	22/01/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	29/12/2023
FECHA DE AMPLIACIÓN No.1 DE LA SUSPENSIÓN No.1	24/01/2024
FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 DE LA SUSPENSIÓN No.1	18/02/2024
FECHA DE REINICIO	12/03/2024


FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	29/05/2024
FECHA DE AMPLIACIÓN No.1 DE LA SUSPENSIÓN No.2	28/08/2024
FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 DE LA SUSPENSIÓN No.2	28/11/2024
FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 DE LA SUSPENSIÓN No.3	23/12/2024
FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 DE LA SUSPENSIÓN No.4	27/02/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 DE LA SUSPENSIÓN No.5	28/04/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 DE LA SUSPENSIÓN No.6	28/06/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 DE LA SUSPENSIÓN No.7	28/08/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 DE LA SUSPENSIÓN No.8	28/09/2025
Suspensión No. 3	05/11/2025
FECHA DE AMPLIACIÓN No.1 DE LA SUSPENSIÓN No.3	01/12/2025
FECHA DE REINICIO	09/12/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No 4	18/12/2025
FECHA DE TERMINACION	02/08/2026
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS – AC DE SUSPENSIÓN No. 3	20/11/2025
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
POLIZA	11-44-101209020 11-40-101055758
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP CONTRATO ORIGINAL	No 6208 del 2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL – RP CONTRATO ORIGINAL	No 12221 del 2023
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP RESERVA	Reserva No. 604 del 2024
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL – RP RESERVA	Reserva No. 394 del 2024
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP ADICIONAL	70634 de 2025
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – RP ADICIONAL	103591 de 20205
NUEVO CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL – CDP CONTRATO	00008181 de 2025
NUEVO CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL – RP CONTRATO	00011642 de 2025

No2	PRODUCTO	RESPUESTA	FECHA.	ESTADO
1	**ESTUDIOS PRELIMINARES**	INT-PERALTA-097-2024	11/03/2024	APROBADO
2	**LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y TOPOGRÁFICO**			
2.1	ENTREGA DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	INT-PERALTA-085-2024	7/02/2024	APROBADO
2.2	LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO	INT-PERALTA-097-2024	11/03/2024	APROBADO
3	**ESTUDIO PATOLÓGICO Y DIAGNOSTICO DEL INMUEBLE**			
	Estudio patologico y diagnostico del inmueble (Planos y fichas de calificación con fotografías y descripción de los deterioros de acuerdo al sistema constructivo) Incluir información de exploraciones constructivas y de cimentación según se requiera	INT-PERALTA-097-2024	11/03/2024	APROBADO
4	**ESTUDIOS TÉCNICOS**			
4.1	ESTUDIOS TÉCNICOS Y DIAGNÓSTICO DE HUMEDADES	INT-PERALTA-169-2024	5/06/2024	APROBADO
4.2	ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS DE SANIDAD DE MADERAS	INT-PERALTA-189-2024	6/08/2024	APROBADO
4.3	ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS DE REDES ELÉCTRICAS	INT-PERALTA-136-2024	25/04/2024	APROBADO
4.4	ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS DE REDES HIDROSANIATRIAS	INT-PERALTA-092-2024	29/02/2024	APROBADO
4.5	ESTUDIOS HVAC	INT-PERALTA-202-2024	27/09/2024	APROBADO
4.6	ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS GEOTÉCNICOS	INT-PERALTA-242-2024	22/10/2025	APROBADO
4.7	ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA Y EVALUACIÓN ESTRUCTURAL	INT-PERALTA-207-2024	22/10/2024	APROBADO
4.8	CALAS ESTRATIGRÁFICAS	INT-PERALTA-191-2024	20/08/2024	APROBADO
4.9	ARQUEOLOGÍA (PLAN PREVENTIVO DE INVERSIÓN)	INT-PERALTA-119-2024	12/04/2024	APROBADO
5	**PROYECTO DE INTERVENCIÓN**			
FASE I				

5.1.1	PROYECTO ARQUITECTÓNICO	INT-PERALTA-213-2024	7/11/2024	APROBADO CON OBS
5.1.2	PROYECTO ESTRUCTURAL	INT-PERALTA-216-2024	20/11/2024	APROBADO
5.1.3	PROYECTO ELÉCTRICO, VOZ, DATOS Y SONIDO	INT-PERALTA-212-2024	7/11/2024	APROBADO
5.1.4	PROYECTO INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DRENAJES Y RCI	INT-PERALTA-208-2024	22/10/2024	APROBADO
5.1.5	PROYECTO DE SEGURIDAD (ALARMAS, CAMARAS, EVACUACIÓN)	INT-PERALTA-212-2024	7/11/2024	APROBADO
FASE II				
5.2.1	PROYECTO ARQUITECTÓNICO	INT-PERALTA-213-2024	7/11/2024	APROBADO
5.2.2	PROYECTO ESTRUCTURAL	INT-PERALTA-216-2024	20/11/2024	APROBADO
5.2.3	PROYECTO ELÉCTRICO, VOZ, DATOS Y SONIDO	INT-PERALTA-212-2024	7/11/2024	APROBADO
5.2.4	PROYECTO INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DRENAJES Y RCI	INT-PERALTA-208-2024	22/10/2024	APROBADO
5.2.5	PROYECTO DE SEGURIDAD (ALARMAS, CAMARAS, EVACUACIÓN)	INT-PERALTA-212-2024	7/11/2024	APROBADO
5.2.6	PROYECTO DE SEGURIDAD HUMANA	INT-PERALTA-240-2025	1/02/2025	APROBADO
5.2.7	COORDINACIÓN BIM	INT-PERALTA-300-2025	04/11/2025	APROBADO
6	**PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA**			
6.1	PRESUPUESTO, PROGRAMACIÓN, APUS, CANTIDADES, ESPECIFICACIONES	INT-PERALTA-299-2025	04/11/2025	APROBADO
6.2	RADICACIÓN DEL PROYECTO AL MINISTERIO DE CULTURA	CORREO ELECTRÓNICO	9/10/2025	APROBADO
	ACCESIBILIDAD			APROBADO

REGISTRO FOTOGRAFICO

	
Estado Fachada Actual	Estado Interior de la edificación.

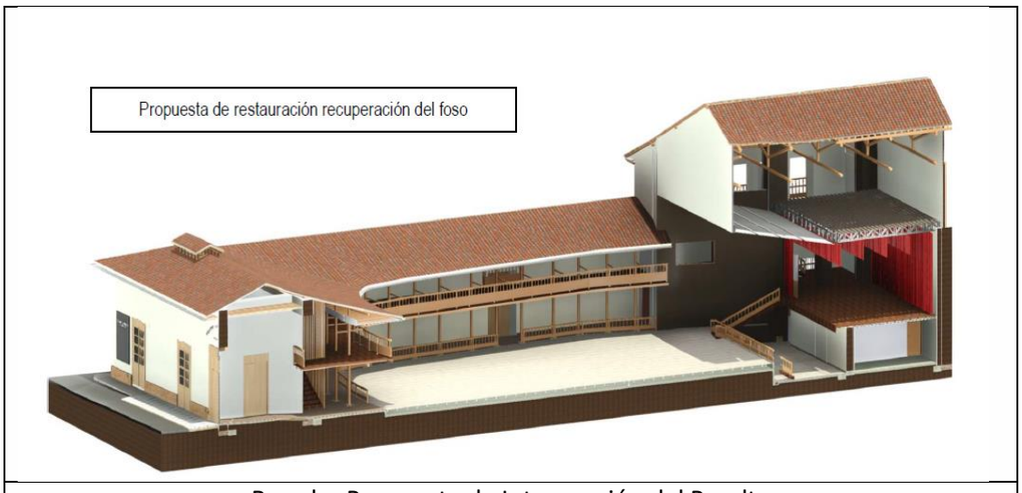

Remder Propuesta de Intervención del Peralta

CONVENIO No. 109/2022 ENTRE FINDETER Y EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2022

Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto denominado: “CONSTRUCCIÓN CANCHAS DE SQUASH EN EL BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”, en los términos señalados en este Convenio y en el marco del Contrato Interadministrativo No. COI-1364 DE 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO.

CONTRATISTA:	CONSORCIO CIUDAD BONITA. NIT: 901684711-1
VALOR INICIAL:	$ 3.919´923.373
VALOR ADICIONAL 1:	$ 120´159.995
VALOR ADICIONAL 2;	$ 22´162.366
VALOR TOTAL:	$ 4.062´245.734
PLAZO INICIAL:	Siete (07) Meses y 15 dias
PRORROGA No.1	Un mes
PRORROGA No. 2	Un mes
PRORROGA No. 3	15 dias
PLAZO TOTAL:	Tres (03) Meses
INTERVENTORÍA:	N/A
FECHA DE INICIO:	31 de marzo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	29/12/2023 por 20 días
FECHA DE SUSPENSION 2	9/04/2024 por Un mes
FECHA DE REINICIO 2:	25/5/2024
ESTADO DEL CONTRATO:	Activo
FECHA TERMINACIÓN FINAL	14 de junio 2024 con pendientes
PORCENTAJE AVANCE FÍSICO:	95 %
AVANCE FINANCIERO:	100%

ESTADO DEL CONTRATO: liquidado por Findeter, sin recibir por la alcaldía e Bucaramanga.

ANTECEDENTES:

• El CONVENIO No. 109/2022 entre FINDETER Y EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA de fecha 11 DE AGOSTO DE 2022 CANCHAS DE SQUASH presenta retrasos y dificultades principalmente asociadas a la conexión eléctrica, lo que ha impedido la entrega y puesta en funcionamiento total del proyecto; en la actualidad el convenio está vigente.

• Desde el 2024 el año 2024 la Alcaldía de Bucaramanga ha adelantado comunicaciones formales y reuniones con IDERBU, la secretaria de infraestructura, el DADEP y la administración del centro Comercial Acrópolis, con el propósito de coordinar la entrega y solucionar los pendientes relacionados con la conexión eléctrica.

• En octubre de 2024 se sostuvo una reunión con FINDETER, IDERBU, DADEP y la Secretaria de Infraestructura en la cual se dejó constancia de la necesidad de revisar las cargas eléctricas y las condiciones técnicas de conexión. En los encuentros posteriores el centro comercial manifestó que para autorizar la conexión de las canchas era necesario instalar un transformador independiente, argumentando que la carga requerida superaba la capacidad inicialmente prevista; sin embargo desde la administración municipal se indicó que según la reglamentación de propiedad horizontal, dicha exigencia no estaba contemplada en el manual original del proyecto y que antes de asumir costos adicionales debería definirse jurídicamente la titularidad y responsabilidad.

• Durante el año 2025 continuaron las gestiones administrativas. La secretaria de Infraestructura realizo visitas técnicas y mesas de trabajo, incluyendo una reunión en julio de 2025 con presencia de la Procuraduría Provisional, buscando una solución concertada. No obstante, no se logró un acuerdo definitivo. También se acudió a la superintendencia de Industria y comercio para mediar en el conflicto, sin que se obtuviera una solución satisfactoria. Ante la persistencia del problema la alcaldía interpuso una acción de tutela con el fin de proteger los derechos que consideraba vulnerados; sin embargo, el Juzgado 12 Penal del Circuito de Bucaramanga declaro la improcedencia de la acción.

Posteriormente se remitieron oficios formales a FINDETER requiriendo la atención inmediata de los pendientes técnicos y contractuales, con el objeto de evitar la configuración de un incumplimiento del convenio. En estos requerimientos de advirtió la necesidad de definir claramente las obligaciones de cada parte y de garantizar la operatividad del escenario deportivo conforme al objeto contractual.

• A febrero 2026, la situación se encuentra en fase de análisis jurídico. Se solicitó concepto a la Oficina Jurídica del Municipio de Bucaramanga, para determinar si las circunstancias presentadas configuran un incumplimiento contractual.

Cabe resaltar que el Convenio se dio por el Contrato de Obra que se relaciona a continuación:

A través de contrato de obra N° 3-1-102452-COI-1364-84 (PAF-ATMINDEPORTE O-117-2022) celebrado entre BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. Sociedad Fiduciaria, quien actúa como vocera y administradora del patrimonio Autónomo Matriz de Asistencia Técnica FINDETER y Consorcio Ciudad Bonita.

Según oficio de FINDETER con radicado 2202652001389 del 16 de febrero de 2026 nos informaron que ellos recibieron a satisfacción el 11 de diciembre del 2025.

A la fecha se ha pagado la suma de $3.689.352.405,32 mediante 10 actas parciales, lo que significa un avance financiero del 90.82% del valor total del contrato: a la fecha está pendiente el pago de $372.893.328,68. De todos los pagos realizados se hizo una rete garantía del 10% correspondiente a $368.935.240,53 que no ha sido devuelta al contratista.

Marzo 2026

De acuerdo a las indicaciones de sec jurídica es necesario documentar e impugnar alguna acta de asamblea, es por eso que la alcaldía como dueña de algunos locales del centro

comercial acrópolis citó a la asamblea para poder confirmar la negativa a la conexión de las canchas. Posterior a eso se iniciará el proceso jurídico.

Mayo 2026

El 8 de mayo de 2026 el Dr. Pedro José Quitián Pradilla presentó demanda verbal de impugnación de decisiones de asamblea general de copropietarios contra la persona jurídica SUPERCENTRO COMERCIAL ACRÓPOLIS PROPIEDAD HORIZONTAL con el objeto de "Declarar la nulidad parcial del Acta No. 38 de la Asamblea General Ordinaria de copropietarios del SUPERCENTRO COMERCIAL ACRÓPOLIS frente a la decisión adoptada en el punto 17 "VARIOS", celebrada el 19 de marzo de 2026, por la cual no se aprobó (con votación del 76,71%) la proposición relativa a la conexión eléctrica de las canchas de squash ubicada en los locales comerciales 3-11 y 3-12 del centro comercial, de propiedad del ente territorial, por ser contraria a la Ley 675 de 2001, al Reglamento de Propiedad Horizontal, a la Constitución Política y por constituir abuso del derecho de voto".

Dicha demanda le correspondió al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga con radicación: 68001310300620260014500.

El 11 de junio el juzgado expide un auto que inadmite demanda

El 19 de junio se subsano por parte del apoderado, la doc. Laura Hoyos. Estamos a la espera de la decisión del juez del juzgado sexto civil del circuito

Mediante comunicación de fecha 20260330027976 22 de mayo de 2026 la ESSA da respuesta a la petición elevada por el apoderado de la Secretaría Jurídica relacionada con la certificación sobre capacidad y cargabilidad de la subestación y transformador del SUPERCENTRO COMERCIAL ACROPOLIS, así como la viabilidad técnica de la conexión eléctrica asociada a la Factibilidad No. 67268351, donde informan lo siguiente:

• Responsabilidad de la Subestación: ESSA aclara que la cargabilidad operativa interna es responsabilidad del dueño de la subestación (el Centro Comercial).

Estado de la Factibilidad: La factibilidad del servicio (No. 67268351) para una carga de 45 kVA en Nivel 2 está aprobada y tiene vigencia hasta el 9 de octubre de 2026. Esta factibilidad es una viabilidad técnica preliminar y no garantiza la energización inmediata.

• Trámite de Conexión Compleja: Debido a que la carga supera los 30 kVA en zona urbana, el proyecto se clasifica como una "Conexión Compleja". A la fecha, el proceso solo ha cumplido el primer paso (Factibilidad), por lo que el municipio de Bucaramanga debe completar los siguientes trámites en orden:

1. Presentación de planos o diseño eléctrico.

2. Solicitud de visita técnica.

3. Solicitud de diagnóstico.

4. Solicitud de recibo técnico y conexión definitiva.

Es importante tener en cuenta que, para el cumplimiento de los requisitos técnicos anteriormente señalados, el municipio de Bucaramanga debe contratar a un profesional acreditado para realizar los trámites y reformas. Los diseños deben cumplir estrictamente con el RETIE, la Norma Técnica


Colombiana NTC 2050, las normas internas de ESSA y el POT del municipio.

Finalmente, ha de señalarse que, aunque la factibilidad está vigente, el proceso de vinculación se encuentra en su etapa inicial, se requiere la autorización y aprobación por parte del Representante legal del Centro Comercial ACRÓPOLIS para la entrega ante la ESSA de la documentación técnica adicional y así avanzar hacia la energización definitiva de las canchas de squash

OBSERVACIÓN TÉCNICO Y JURÍDICA QUE INDICA ALERTA Y QUE SE DEBE TENER EN CUENTA:

Revisar la posibilidad de iniciar el proyecto de energización de las canchas y no esperar los resultados del proceso judicial para iniciar la fase técnica exigida por ESSA. En ese caso La Secretaría de Infraestructura debería contratar el profesional certificado para elaborar los planos eléctricos definitivos bajo normas NTC 2050 y RETIE.



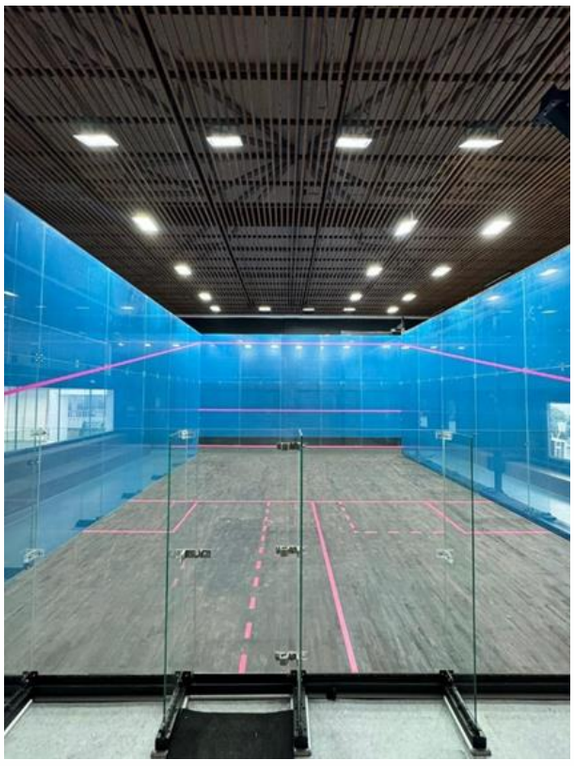

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 239 DE 2025: "CONVENIO 239 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2025, cuyo objeto se denomina CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA UIMIST DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA (E.S.E. ISABU)"

CONVENIDO:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA (E.S.E. ISABU) NIT: 800084206
VALOR INICIAL:	$ 515.820.106
ANTICIPO (%):	$ 0
VALOR ADICIONAL:	$ 0
VALOR TOTAL:	$ 515.820.106
PLAZO INICIAL:	2 MESES 20 DIAS
PRORROGA No. 1	2 MESES 2 DIAS
PLAZO TOTAL:	4 MESES 22 DIAS
FECHA DE INICIO:	10 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE PRORROGA No. 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	26 DE FEBRERO DE 2026
ESTADO DEL CONTRATO:	SUSPENDIDO
FECHA TERMINACIÓN FINAL:	12 DE MARZO DE 2026
PORCENTAJE AVANCE FÍSICO:	25%

AVANCE FINANCIERO: 100%

ESTADO DEL CONVENIO: Conforme a corte del informe del mes de mayo de 2026, el avance físico del contrato de obra derivado del presente convenio a la fecha es aproximadamente 25%.

OBSERVACIONES:

- Existe un remanente en el valor total del convenio de aproximadamente $52.786.654, por diferencia entre los valores contratados en los contratos de obra e interventoría y el valor total del convenio.

- Se requiere realizar una modificación a la CLAUSULA SEGUNDA del convenio por la diferencia económica con los costos de los contratos derivados y la variación en las cantidades y actividades a ejecutar, conforme al balance presentado en la mesa de trabajo del 18 de marzo de 2026 por el contratista de obra y avalada por la interventoría.

- Se requiere un valor adicional de $40.590.889 para obra, un mes adicional para la interventoría, un mes adicional para el contrato de obra, por lo cual la E.S.E. ISABU solicita una prórroga en plazo de 2 meses para el convenio; sin embargo, con respecto al recurso, este ya está cubierto dentro del valor del convenio, teniendo en cuenta el remanente antes mencionado.

PROBLEMATICAS:

-Pese a que a la fecha se han surtido todas labores administrativas, por la ESE ISABU y se ha dado todo el apoyo técnico de soporte a la secretaria de salud, esta no finiquita la suscripción de la prórroga, modificación y el reinicio del convenio 239-25.

ESTADO FINANCIERO: Se tramitó un único desembolso el 29/12/2025 por valor de $515.820.106 (AVANCE: 100%)

Es importante aclarar que ni el contratista de obra ni de interventoría han realizado cobros al ISABU, por lo anterior, el estado financiero para los contratos derivados es 0% a la fecha

VALOR ANTICIPO: No se realizó entrega de anticipo, así que no aplica

AMORTIZACION DE ANTICIPO: No se realizó entrega de anticipo, así que no aplica

N° Pago	valor	Fecha de pago	Porcentaje de ejecución certificado
Pago 1	**$515.820.106**	**31/12/2025**	
Total Pagos	$515.820.106		100%

OBSERVACIÓN TÉCNICO Y JURÍDICA QUE INDICA ALERTA Y QUE SE DEBE TENER EN CUENTA:

La ESE ISABU celebró dos contratos con los recursos del presente convenio, uno es la consultoría y el otro es la interventoría de esta consultoría.

-No. 1563-2025, cuyo objeto es: "ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA UIMIST DE LA ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA, EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA", por un valor de cuatrocientos treinta y ocho millones novecientos cuarenta y cuatro mil cuarenta y cuatro pesos m/cte. ($438.944.044).

-No. 1565-2025, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y FINANCIERA PARA LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA UIMIST DE LA E.S.E. INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA.", por un valor de veinticuatro millones ochenta y nueve mil cuatrocientos ocho pesos m/cte ($24.089.408).

A continuación, se presenta plano general de la intervención programada en los siguientes sectores:

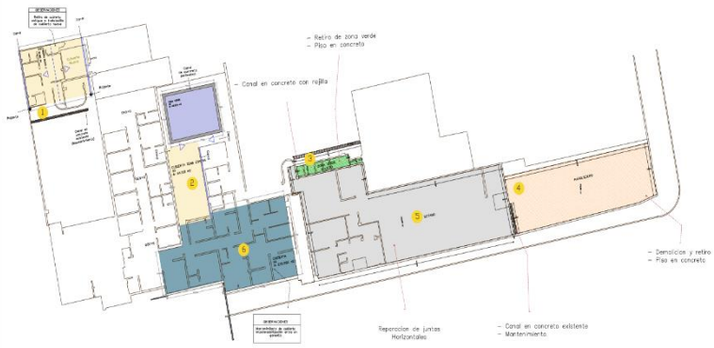


Ilustración No. 1: *Tomada de presentación elaborada por la ESE ISABU 19-2-26*

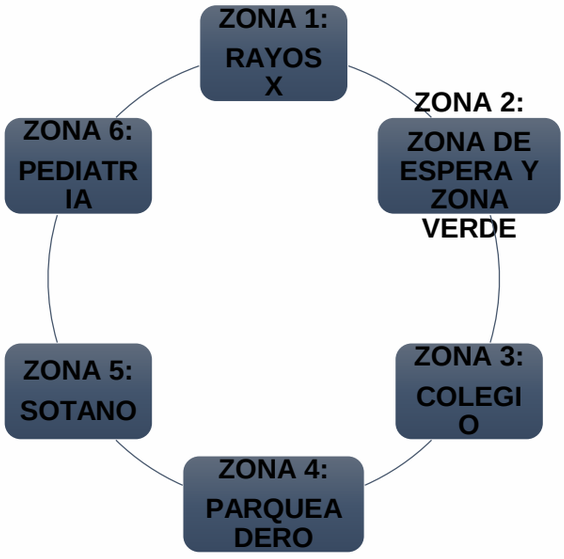



Ilustración No. 2: *Tomada de presentación elaborada por la ESE ISABU 19-2-26*

En esta visita, se evidenció un progreso en las zonas descritas en las especificaciones técnicas. Entre los avances se encuentra el acondicionamiento de red hidráulica y endurecimiento del jardín interior, tal como se evidencia en las ***Fotografías 1 y 2***;



Fotografías 1 y 2. *Intervención realizada en zona de jardín interior*


y la rigidización de la zona colindante con el Colegio Piloto, como se muestra en la ***Fotografía 3***;

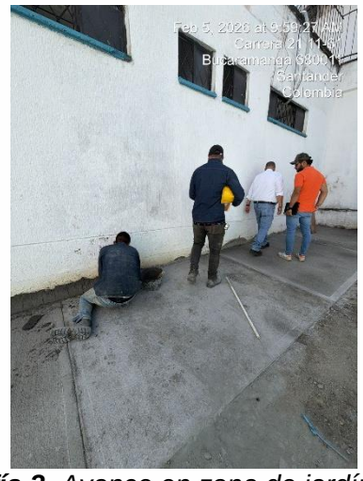

Fotografía 3. *Avance en zona de jardín exterior.*

quedando pendientes la zona de rayos X donde se presentan inconvenientes con la cubierta y humedad en la placa (***Fotografías 4, 5 y 6***);



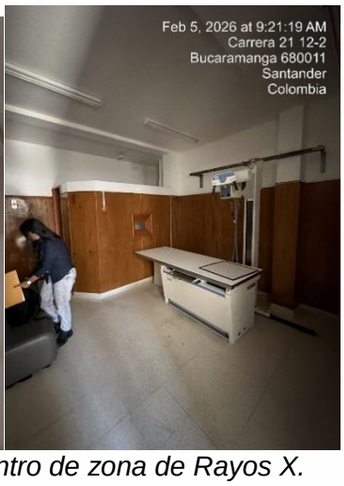


Fotografías 4 y 5. *Humedad en la placa dentro de zona de Rayos X.*



Fotografía 6. *Cubierta de la zona de Rayos X.*

pediatría, donde la placa ha sufrido filtraciones y se debe adecuar la viga-canal (***Fotografías 7, 8 y 9***);

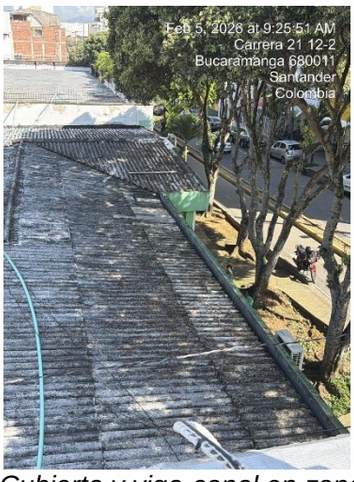


Fotografía 7. *Cubierta y viga-canal en zona de Pediatría.*




Fotografías 8 y 9. *Placa afectada por humedad en zona de Pediatría*

sótano, donde los muros se ven afectados por la humedad (***Fotografías 10 y 11***);

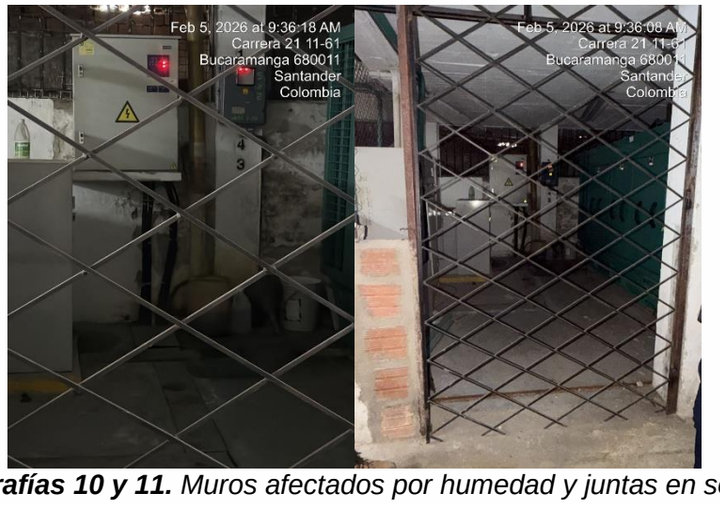

Fotografías 10 y 11. *Muros afectados por humedad y juntas en sótano.*

y la zona de entrada al sótano por el parqueadero (***Fotografías 12 y 13***).

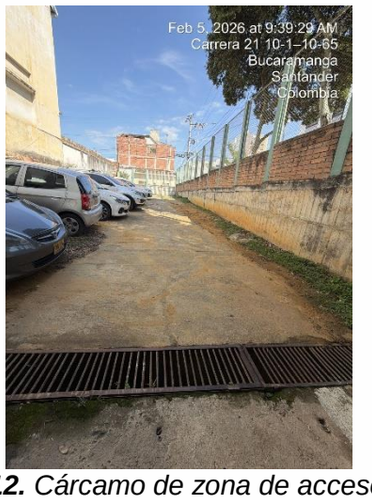

Fotografía 12. *Cárcamo de zona de acceso al sótano.*



Fotografía 13. *Sifón de la morgue, junto al acceso al sótano*

7. RELACION PROCESOS EN CONTRATACION

OBJETO	VALOR	MODALIDAD	ESTADO DEL PROCESO
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	$ 10.835.829.108,00	LICITACIÓN PÚBLICA	ADJUDICADO
CONSTRUCCIÓN DE POZOS SEPTICOS PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTAL EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	$ 2.197.268.494,00	LICITACIÓN PÚBLICA	VIABILIDAD JURIDICA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 3.566.768.556,00	LICITACIÓN PÚBLICA	VIABILIDAD JURIDICA
INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS SEPTICOS PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTAL EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	$ 303.494.997,00	CONCURSO DE MERITOS ABIERTO	ELABORACION DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES

SUMINISTRO DE INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 793.138.267,00	ACUERDO MARCO DE PRECIOS	ADJUDICADO
INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA OBRA PUBLICA DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	$ 1.401.977.497,00	CONCURSO DE MERITOS ABIERTO	ADJUDICADO
ADECUACIÓN DE ELEMENTOS CONSTITUTIVOS Y COMPLEMENTARIOS DEL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER	$ 10.846.516.886,00	LICITACIÓN PÚBLICA	VIABILIDAD JURIDICA

ANEXO

- PRESUPUESTOS EJECUTADOS (Ejecución presupuestal)
- GASTO (Relación personal)
- GASTOS (Relación de Inversión)

ALCALDIA DE BUCARAMANGA
NIT: 890.201.222-0
INFORME DE EJECUCION CONSOLIDADA
A 30 DE JUNIO DE 2026

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES							TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	% Ejecucion
		Presupuesto Inicial	Credito	Contracredito	Modificaciones Acumuladas	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	Obligaciones	Pagos Acumulados				
		$ 1,00			$ 2,00	3 = 1 + 2	$ 5,00	$ 7,00		$ 9,00	10 = 3 - 5	11 = 5 - 7	12 = 7 - 9	13 = 7 / 3
TOTAL INFORME SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		$ 352.595.437.734,00	$ 35.942.327.774,00	$ 69.602.576.568,00	$ 156.145.295.243,02	$ 508.740.732.977,02	$145.979.976.396,80	$105.709.576.388,13	$38.256.802.353,25	$ 36.074.598.540,94	$ 362.760.756.580,22	$ 40.270.400.008,67	$ 67.452.774.034,88	20,78
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA													
	LINEA 1. TERRITORIO SEGURO QUE INTEGRA													
	DEPORTE Y RECREACION													
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS													
	ADQUISICION DE SERVICIOS													
	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION													
	LINEA 2. TERRITORIO SEGURO QUE PROGRESA													
	MINAS Y ENERGA													
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS													
	ADQUISICION DE SERVICIOS													
	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION													
RUBRO	GASODUCTOS LOCALES													
2.3.2.02.02.005.2024680010210.2.2101016.53251.201	GASODUCTOS LOCALES 201	$ 91.082.517,00	$ -	$ -	$ -	$ 91.082.517,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 91.082.517,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2024680010210.2.2101016.53251.221	GASODUCTOS LOCALES 221	$ 38.917.483,00	$ -	$ -	$ -	$ 38.917.483,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 38.917.483,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2024680010210.2.2101016.53251.327	GASODUCTOS LOCALES 327	$ 20.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 20.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.000.000,00	$ -	$ -	0
	TRANSPORTE													
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS													
	ADQUISICION DE SERVICIOS													
	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION													
RUBRO	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS													
2.3.2.02.02.005.20250000035927.2.2401039.53221.201	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS 201	$ 4.244.795.083,00	$ -	$ 4.244.795.083,00	$ (4.244.795.083,00)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20250000036178.2.2401039.53221.201	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS 201	$ 3.990.743.822,00	$ -	$ 3.990.743.822,00	$ (3.990.743.822,00)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0
RUBRO	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES													
2.3.2.02.02.005.20250000035592.2.2402042.53211.289	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 289	$ 1.576.559.594,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.576.559.594,00	$ 1.182.419.637,00	$ 1.182.419.637,00	$ 1.182.419.637,00	$ 1.182.419.637,00	$ 394.139.957,00	$ -	$ -	74,99
2.3.2.02.02.005.20250000035592.2.2402042.53211.588	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 588	$ 1.057.403.475,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.057.403.475,00	$ 1.057.403.475,00	$ 1.057.403.475,00	$ 1.010.048.645,00	$ 1.010.048.645,00	$ -	$ -	$ 47.354.830,00	100
2.3.2.02.02.005.20260000011531.2.2402042.53211.588	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 588	$ -	$ -	$ -	$ 1.798.328.403,00	$ 1.798.328.403,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.798.328.403,00	$ -	$ -	0
RUBRO	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS													
2.3.2.02.02.005.20250000028779.2.2402083.53221.213	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS 213	$ 2.507.682.615,00	$ 421.203.511,00	$ -	$ 421.203.511,00	$ 2.928.886.126,00	$ 2.928.886.126,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.928.886.126,00	$ -	0
RUBRO	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES													
2.3.2.02.02.005.2024680010043.2.2402112.53211.201	CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 201	$ 2.000.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.000.000.000,00	$ 1.400.000.000,00	$ 1.400.000.000,00	$ 819.713.928,69	$ 586.131.023,76	$ 600.000.000,00	$ -	$ 580.286.071,31	70
RUBRO	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES													
2.3.2.02.02.005.2022680010100.2.2402113.53211.230	CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 230	$ 2.453.550.034,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.453.550.034,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.453.550.034,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2022680010100.2.2402113.53211.255	CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 255	$ 350.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 350.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 350.000.000,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2022680010100.2.2402113.53211.501	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 501	$ -	$ -	$ 11.000.000.000,00	$ 12.500.000.000,00	$ 12.500.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.500.000.000,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2022680010100.2.2402113.53211.530	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 530	$ -	$ -	$ -	$ 20.027.672.893,09	$ 20.027.672.893,09	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.027.672.893,09	$ -	$ -	0

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES							TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	% Ejecucion
		Presupuesto Inicial	Credito	Contracredito	Modificaciones Acumuladas	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	Obligaciones	Pagos Acumulados				
		$ 1,00			$ 2,00	3 = 1 + 2	$ 5,00	$ 7,00		$ 9,00	10 = 3 - 5	11 = 5 - 7	12 = 7 - 9	13 = 7 / 3
RUBRO	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES													
2.3.2.02.02.005.20250000027207.2.2402114.53211.213	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 213	$ -	$ 344.097.890,00	$ -	$ 344.097.890,00	$ 344.097.890,00	$ 344.097.890,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 344.097.890,00	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20250000027207.2.2402114.53211.251	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 251	$ 2.532.661.346,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.532.661.346,00	$ 2.532.661.346,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.532.661.346,00	$ -	0
RUBRO	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES													
2.3.2.02.02.005.20250000036174.2.2402115.53211.201	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 201	$ 9.999.999.996,00	$ 5.101.454.009,00	$ -	$ 5.101.454.009,00	$ 15.101.454.005,00	$ 15.101.454.002,83	$ 15.101.454.002,83	$ -	$ -	$ 2,17	$ -	$ 15.101.454.002,83	99,99
2.3.2.02.02.005.20250000036174.2.2402115.53211.213	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 213	$ 243.830.136,00	$ -	$ -	$ -	$ 243.830.136,00	$ 243.830.136,00	$ 243.830.136,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 243.830.136,00	100
2.3.2.02.02.005.20250000036174.2.2402115.53211.248	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 248	$ 324.358.969,00	$ -	$ -	$ -	$ 324.358.969,00	$ 324.358.969,00	$ 324.358.969,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 324.358.969,00	100
2.3.2.02.02.005.20250000036174.2.2402115.53211.251	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 251	$ 653.493.068,00	$ -	$ -	$ -	$ 653.493.068,00	$ 653.493.068,00	$ 653.493.068,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 653.493.068,00	100
2.3.2.02.02.005.20250000036174.2.2402115.53211.318	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 318	$ 250.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 250.000.000,00	$ 250.000.000,00	$ 250.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 250.000.000,00	100
2.3.2.02.02.005.20250000036174.2.2402115.53211.319	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 319	$ 2.000.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.000.000.000,00	$ 2.000.000.000,00	$ 2.000.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.000.000.000,00	100
2.3.2.02.02.005.20250000036174.2.2402115.53211.501	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 501	$ 1.622.225.536,17	$ -	$ -	$ -	$ 1.622.225.536,17	$ 1.622.225.536,17	$ 1.622.225.536,17	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.622.225.536,17	100
2.3.2.02.02.005.20250000036174.2.2402115.53211.588	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 588	$ -	$ -	$ -	$ 4.288.356.025,00	$ 4.288.356.025,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.288.356.025,00	$ -	$ -	0
RUBRO	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS													
2.3.2.02.02.005.2023680010060.2.2402119.53221.251	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS 251	$ 5.000.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 5.000.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.000.000.000,00	$ -	$ -	0
RUBRO	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS													
2.3.2.02.02.005.20250000028779.2.2402120.53221.201	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS 201	$ 935.882.277,00	$ -	$ -	$ -	$ 935.882.277,00	$ 585.585.403,00	$ -	$ -	$ -	$ 350.296.874,00	$ 585.585.403,00	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20250000028779.2.2402120.53221.213	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 213	$ -	$ 52.297.027,00	$ -	$ 52.297.027,00	$ 52.297.027,00	$ 52.297.027,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 52.297.027,00	$ -	0
	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION													
RUBRO	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION													
2.3.2.02.02.008.20250000035750.2.2402118.83321.201	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 536.988.872,00	$ -	$ -	$ -	$ 536.988.872,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 536.988.872,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.008.20250000035927.2.2402118.83321.201	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 140.459.886,00	$ -	$ -	$ -	$ 140.459.886,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 140.459.886,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.008.20250000035927.2.2402118.83321.501	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501	$ -	$ 87.549.670,00	$ -	$ 87.549.670,00	$ 87.549.670,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 87.549.670,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.008.20250000036173.2.2402118.83321.201	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 2.019.476.878,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.019.476.878,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.019.476.878,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.008.20250000036178.2.2402118.83321.201	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ -	$ 120.344.831,00	$ -	$ 120.344.831,00	$ 120.344.831,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 120.344.831,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.008.20250000036178.2.2402118.83321.501	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501	$ -	$ 163.097.411,00	$ -	$ 163.097.411,00	$ 163.097.411,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 163.097.411,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.008.20250000036180.2.2402118.83321.201	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 1.908.253.371,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.908.253.371,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.908.253.371,00	$ -	$ -	0
	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO													
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS													
	ADQUISICION DE SERVICIOS													
	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION													
RUBRO	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA EXCEPTO A TRAVES DE LA RED A COMISION O POR CONTRATO													

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES							TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	% Ejecucion
		Presupuesto Inicial	Credito	Contracredito	Modificaciones Acumuladas	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	Obligaciones	Pagos Acumulados				
		$ 1,00			$ 2,00	3 = 1 + 2	$ 5,00	$ 7,00		$ 9,00	10 = 3 - 5	11 = 5 - 7	12 = 7 - 9	13 = 7 / 3
2.3.2.02.02.008.20246800 10053.1.4003048.86350.2 01	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA, EXCEPTO A TRAVES DE LA RED (A COMISION O POR CONTRATO) 201	$ 150.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 150.000.000,00	$ 150.000.000,00	$ 150.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 150.000.000,00	100
	LINEA 3. TERRITORIO SEGURO Y SOSTENIBLE													
	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO													
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS													
	ADQUISICION DE SERVICIOS													
	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION													
RUBRO	**CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES**													
2.3.2.02.02.005.20246800 10050.2.4002020.53211.5 88	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 588	$ 7.734.153.516,00	$ -	$ -	$ 3.015.212.946,15	$ 10.749.366.462,15	$ 10.749.366.462,15	$ 10.749.366.462,15	$ 4.509.899.222,33	$ 4.509.899.222,33	$ -	$ -	$ 6.239.467.239,82	100
2.3.2.02.02.005.20246800 10076.2.4002020.53211.5 32	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 532	$ -	$ -	$ -	$ 1.158.853.309,00	$ 1.158.853.309,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.158.853.309,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20246800 10076.2.4002020.53211.5 33	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 533	$ -	$ -	$ -	$ 3.727.166.660,00	$ 3.727.166.660,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.727.166.660,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20250000 0035591.2.4002020.53211 .289	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 289	$ 24.906.234.469,00	$ -	$ -	$ -	$ 24.906.234.469,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 24.906.234.469,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20250000 0035591.2.4002020.53211 .317	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 317	$ 4.000.000.000,00	$ -	$ 4.000.000.000,00	$ (4.000.000.000,00)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20250000 0035591.2.4002020.53211 .324	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 324	$ 6.000.000.000,00	$ -	$ 6.000.000.000,00	$ (6.000.000.000,00)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20250000 0035591.2.4002020.53211 .501	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 501	$ 1.576.608.504,00	$ -	$ 1.576.608.504,00	$ (1.576.608.504,00)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20250000 0035591.2.4002020.53211 .588	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 588	$ -	$ -	$ 4.230.624.341,00	$ 15.738.042.145,16	$ 15.738.042.145,16	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15.738.042.145,16	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20260000 0009765.2.4002020.53211 .282	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES	$ -	$ 922.917.149,00	$ -	$ 922.917.149,00	$ 922.917.149,00	$ 922.917.149,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 922.917.149,00	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20260000 0009765.2.4002020.53211 .317	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES	$ -	$ 4.000.000.000,00	$ -	$ 4.000.000.000,00	$ 4.000.000.000,00	$ 4.000.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.000.000.000,00	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20260000 0009765.2.4002020.53211 .324	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES	$ -	$ 6.000.000.000,00	$ -	$ 6.000.000.000,00	$ 6.000.000.000,00	$ 5.923.599.737,00	$ -	$ -	$ -	$ 76.400.263,00	$ 5.923.599.737,00	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20260000 0009765.2.4002020.53211 .501	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES	$ -	$ 1.576.608.504,00	$ -	$ 1.576.608.504,00	$ 1.576.608.504,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.576.608.504,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20260000 0009765.2.4002020.53211 .521	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 521	$ -	$ -	$ -	$ 126.278.659,00	$ 126.278.659,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 126.278.659,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO**													
2.3.2.02.02.005.20250000 0029578.2.4002020.53270 .588	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 588	$ 1.047.152.823,00	$ -	$ 1.047.152.823,00	$ (1.047.152.823,00)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20260000 0011370.2.4002020.53270 .588	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 588	$ -	$ -	$ -	$ 731.519.884,00	$ 731.519.884,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 731.519.884,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20260000 0011371.2.4002020.53270 .588	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 588	$ -	$ -	$ -	$ 1.163.822.622,00	$ 1.163.822.622,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.163.822.622,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20260000 0011484.2.4002020.53270 .588	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 588	$ -	$ 118.589.229,00	$ -	$ 1.038.890.992,00	$ 1.038.890.992,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.038.890.992,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20260000 0011693.2.4002020.53270 .501	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 501	$ -	$ -	$ 6.714.428.799,00	$ 7.904.798.030,60	$ 7.904.798.030,60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.904.798.030,60	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20260000 0011693.2.4002020.53270 .513	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 513	$ -	$ -	$ -	$ 1.570.000.000,00	$ 1.570.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.570.000.000,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20260000 0011693.2.4002020.53270 .567	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 567	$ -	$ -	$ -	$ 810.773.170,40	$ 810.773.170,40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 810.773.170,40	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20260000 0011697.2.4002020.53270 .588	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 588	$ -	$ -	$ -	$ 345.497.073,00	$ 345.497.073,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 345.497.073,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20260000 0015224.2.4002020.53270 .588	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 588	$ -	$ 1.047.152.823,00	$ -	$ 1.047.152.823,00	$ 1.047.152.823,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.047.152.823,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE**													

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES							TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	% Ejecucion
		Presupuesto Inicial	Credito	Contracredito	Modificaciones Acumuladas	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	Obligaciones	Pagos Acumulados				
		$ 1,00			$ 2,00	3 = 1 + 2	$ 5,00	$ 7,00		$ 9,00	10 = 3 - 5	11 = 5 - 7	12 = 7 - 9	13 = 7 / 3
2.3.2.02.02.005.20250000 0030966.2.4002021.85970 .501	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE 501	$ 10.976.815.977,00	$ -	$ 11.716.312.765,00	$ (9.221.301.710,00)	$ 1.755.514.267,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.755.514.267,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20250000 0035687.2.4002021.85970 .213	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE 213	$ 6.961.570.164,00	$ -	$ 1.381.042.158,00	$ (1.381.042.158,00)	$ 5.580.528.006,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.580.528.006,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20250000 0035687.2.4002021.85970 .251	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE 251	$ 538.300.693,00	$ -	$ -	$ -	$ 538.300.693,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 538.300.693,00	$ -	$ -	0
RUBRO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE													
2.3.2.02.02.005.20246800 10045.2.4002022.85970.2 01	PARQUES MANTENIDOS 201	$ -	$ 3.013.740.065,00	$ -	$ 3.013.740.065,00	$ 3.013.740.065,00	$ 3.013.740.065,00	$ 3.013.740.065,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.013.740.065,00	100
2.3.2.02.02.005.20246800 10045.2.4002022.85970.2 13	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE 213	$ -	$ -	$ -	$ 804.988.945,00	$ 804.988.945,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 804.988.945,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20250000 0031111.2.4002022.85970 .213	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE 213	$ 11.977.484.557,00	$ 260.322.048,00	$ -	$ 260.322.048,00	$ 12.237.806.605,00	$ 12.237.806.605,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.237.806.605,00	$ -	0
RUBRO	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AGUA EXCEPTO GASODUCTOS													
2.3.2.02.02.005.20246800 10249.2.4003015.53231.2 15	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AGUA EXCEPTO GASODUCTOS 215	$ 2.426.953.896,17	$ -	$ -	$ 455.153.475,00	$ 2.882.107.371,17	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.882.107.371,17	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20246800 10249.2.4003015.53231.2 68	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AGUA EXCEPTO GASODUCTOS 268	$ 30.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 30.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.000.000,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20246800 10249.2.4003015.53231.5 01	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AGUA EXCEPTO GASODUCTOS 501	$ 9.726.432.633,83	$ -	$ 2.393.138.267,00	$ (2.393.138.267,00)	$ 7.333.294.366,83	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.333.294.366,83	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20246800 10249.2.4003015.53231.5 15	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AGUA EXCEPTO GASODUCTOS 515	$ -	$ -	$ -	$ 3.772.624.467,37	$ 3.772.624.467,37	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.772.624.467,37	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20250000 0035711.2.4003015.53231 .201	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AGUA EXCEPTO GASODUCTOS 201	$ 2.742.815.006,00	$ -	$ 2.609.008.028,00	$ (2.609.008.028,00)	$ 133.806.978,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 133.806.978,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20250000 0035711.2.4003015.53231 .267	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AGUA EXCEPTO GASODUCTOS 267	$ 600.000.000,00	$ -	$ 600.000.000,00	$ (600.000.000,00)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20250000 0035711.2.4003015.53231 .515	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AGUA EXCEPTO GASODUCTOS 515	$ -	$ -	$ -	$ 3.209.008.028,00	$ 3.209.008.028,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.209.008.028,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20250000 0035711.2.4003015.53231 .573	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AGUA EXCEPTO GASODUCTOS 573	$ -	$ -	$ -	$ 387.099.967,00	$ 387.099.967,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 387.099.967,00	$ -	$ -	0
RUBRO	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL													
2.3.2.02.02.005.20246800 10215.2.4003044.53290.2 13	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL 213	$ -	$ 184.150.021,00	$ -	$ 184.150.021,00	$ 184.150.021,00	$ 184.150.021,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 184.150.021,00	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20246800 10215.2.4003044.53290.2 15	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL 215	$ 2.316.613.470,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.316.613.470,00	$ 2.316.613.470,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.316.613.470,00	$ -	0
	COMERCIO Y DISTRIBUCION ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA													
RUBRO	COMERCIO AL POR MAYOR EXCEPTO EL REALIZADO A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION O POR CONTRATA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MANUALES													
2.3.2.02.02.006.20260000 0010465.2.4002020.61165 .501	COMERCIO AL POR MAYOR EXCEPTO EL REALIZADO A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION O POR CONTRATA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MANUALES 501	$ -	$ 793.138.267,00	$ -	$ 793.138.267,00	$ 793.138.267,00	$ 793.138.267,00	$ 793.138.267,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 793.138.267,00	100
	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION													
RUBRO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE													
2.3.2.02.02.008.20246800 10046.2.4002026.85970.5 01	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE 501	$ 14.838.630.390,00	$ 6.714.428.799,00	$ -	$ 6.714.428.799,00	$ 21.553.059.189,00	$ 4.398.193.087,00	$ 4.398.193.087,00	$ 2.816.613.213,56	$ 2.816.613.213,56	$ 17.154.866.102,00	$ -	$ 1.581.579.873,44	20,4
	LINEA 4. TERRITORIO SEGURO QUE GENERA VALOR													
	GOBIERNO TERRITORIAL													
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS													
	ADQUISICION DE SERVICIOS													

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES							TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	% Ejecucion
		Presupuesto Inicial	Credito	Contracredito	Modificaciones Acumuladas	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	Obligaciones	Pagos Acumulados				
		$ 1,00			$ 2,00	3 = 1 + 2	$ 5,00	$ 7,00		$ 9,00	10 = 3 - 5	11 = 5 - 7	12 = 7 - 9	13 = 7 / 3
	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION													
RUBRO	**OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES**													
2.3.2.02.02.005.20250000 0035596.2.4502003.53129 .251	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 251	$ 2.488.030.658,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.488.030.658,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.488.030.658,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES**													
2.3.2.02.02.005.20250000 0035821.2.4502007.53129 .588	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 588	$ -	$ -	$ -	$ 153.853.179,00	$ 153.853.179,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 153.853.179,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES**													
2.3.2.02.02.005.20250000 0041555.2.4599011.53129 .213	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 213	$ -	$ 118.971.661,00	$ -	$ 118.971.661,00	$ 118.971.661,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 118.971.661,00	$ -	$ -	0
	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION													
RUBRO	**SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION**													
2.3.2.02.02.008.20246800 10084.2.4599006.83321.2 67	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 267	$ -	$ 126.095.762,00	$ -	$ 126.095.762,00	$ 126.095.762,00	$ 126.095.762,00	$ 126.095.762,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 126.095.762,00	100
RUBRO	**SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO**													
2.3.2.02.02.008.20246800 10049.2.4599031.82120.2 51	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 251	$ 1.200.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.200.000.000,00	$ 1.200.000.000,00	$ 1.168.233.333,33	$ 860.666.666,66	$ 708.183.333,33	$ -	$ 31.766.666,67	$ 307.566.666,67	97,35
RUBRO	**SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES**													
2.3.2.02.02.008.20246800 10049.2.4599031.83213.2 01	SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 201	$ 800.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 800.000.000,00	$ 800.000.000,00	$ 793.100.000,00	$ 614.343.333,33	$ 496.593.333,32	$ -	$ 6.900.000,00	$ 178.756.666,67	99,13
RUBRO	**SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION**													
2.3.2.02.02.008.20246800 10049.2.4599031.83321.2 01	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 3.400.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.400.000.000,00	$ 3.400.000.000,00	$ 3.384.750.000,00	$ 2.467.966.666,67	$ 2.008.766.666,67	$ -	$ 15.250.000,00	$ 916.783.333,33	99,55
RUBRO	**OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P**													
2.3.2.02.02.008.20246800 10049.2.4599031.83990.2 01	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 3.900.000.000,00	$ 521.400.000,00	$ -	$ 521.400.000,00	$ 4.421.400.000,00	$ 4.421.400.000,00	$ 4.421.400.000,00	$ 3.573.006.666,68	$ 2.939.263.333,32	$ -	$ -	$ 848.393.333,32	100
2.3.2.02.02.008.20246800 10049.2.4599031.83990.5 01	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501	$ -	$ 598.596.023,00	$ -	$ 598.596.023,00	$ 598.596.023,00	$ 598.596.023,00	$ 277.900.000,00	$ 195.656.666,67	$ 114.333.333,33	$ -	$ 320.696.023,00	$ 82.243.333,33	46,42
RUBRO	**OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P**													
2.3.2.02.02.008.20246800 10049.2.4599031.85999.2 01	OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 201	$ 700.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 700.000.000,00	$ 700.000.000,00	$ 697.220.000,00	$ 523.070.666,66	$ 427.297.333,32	$ -	$ 2.780.000,00	$ 174.149.333,34	99,6
	DISMINUCION DE PASIVOS													
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS													
RUBRO	**EDIFICIOS COMERCIALES**													
2.3.7.06.02.202600000011 689.2.4599002.53122.501	EDIFICIOS COMERCIALES 501	$ -	$ -	$ -	$ 1.056.914.326,18	$ 1.056.914.326,18	$ 1.056.914.326,18	$ 1.056.914.326,18	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.056.914.326,18	100
2.3.7.06.02.202600000011 689.2.4599002.53122.573	EDIFICIOS COMERCIALES 573	$ -	$ -	$ -	$ 663.949.600,48	$ 663.949.600,48	$ 663.949.600,48	$ 663.949.600,48	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 663.949.600,48	100
RUBRO	**OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES**													
2.3.7.06.02.202600000011 689.2.4599002.53129.501	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 501	$ -	$ -	$ -	$ 832.663.052,74	$ 832.663.052,74	$ 832.663.052,74	$ 832.663.052,74	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 832.663.052,74	100
2.3.7.06.02.202600000011 689.2.4599002.53129.516	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 516	$ -	$ -	$ -	$ 259.826.547,30	$ 259.826.547,30	$ 259.826.547,30	$ 259.826.547,30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 259.826.547,30	100
2.3.7.06.02.202600000011 689.2.4599002.53129.521	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 521	$ -	$ -	$ -	$ 32.320.345,00	$ 32.320.345,00	$ 32.320.345,00	$ 32.320.345,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 32.320.345,00	100
2.3.7.06.02.202600000011 689.2.4599002.53129.573	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 573	$ -	$ -	$ -	$ 251.523.966,71	$ 251.523.966,71	$ 251.523.966,71	$ 251.523.966,71	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 251.523.966,71	100
RUBRO	**CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES**													
2.3.7.06.02.202600000011 689.2.4599002.53211.501	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 501	$ -	$ -	$ -	$ 3.977.597.796,66	$ 3.977.597.796,66	$ 3.977.597.796,66	$ 3.977.597.796,66	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.977.597.796,66	100
RUBRO	**INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO**													

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES							TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	% Ejecucion
		Presupuesto Inicial	Credito	Contracredito	Modificaciones Acumuladas	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	Obligaciones	Pagos Acumulados				
		$ 1,00			$ 2,00	3 = 1 + 2	$ 5,00	$ 7,00		$ 9,00	10 = 3 - 5	11 = 5 - 7	12 = 7 - 9	13 = 7 / 3
2.3.7.06.02.2026000000116 89.2.4599002.53270.501	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 501	$ -	$ -	$ -	$ 9.266.883.583,11	$ 9.266.883.583,11	$ 9.266.883.583,11	$ 9.266.883.583,11	$ 109.979.636,00	$ 109.979.636,00	$ -	$ -	$ 9.156.903.947,11	100
2.3.7.06.02.2026000000116 89.2.4599002.53270.573	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 573	$ -	$ -	$ -	$ 294.672.040,75	$ 294.672.040,75	$ 294.672.040,75	$ 294.672.040,75	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 294.672.040,75	100
RUBRO	**SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES**													
2.3.7.06.02.2026000000116 89.2.4599002.54129.501	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 501	$ -	$ -	$ -	$ 153.203.540,00	$ 153.203.540,00	$ 153.203.540,00	$ 153.203.540,00	$ 78.023.032,86	$ 78.023.032,86	$ -	$ -	$ 75.180.507,14	100
RUBRO	**SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES**													
2.3.7.06.02.2026000000116 89.2.4599002.54211.582	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 582	$ -	$ -	$ -	$ 284.027.909,09	$ 284.027.909,09	$ 284.027.909,09	$ 284.027.909,09	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 284.027.909,09	100
RUBRO	**SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO**													
2.3.7.06.02.2026000000116 89.2.4599002.54270.501	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 501	$ -	$ -	$ -	$ 1.797.185.770,76	$ 1.797.185.770,76	$ 1.797.185.770,76	$ 1.797.185.770,76	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.797.185.770,76	100
2.3.7.06.02.2026000000116 89.2.4599002.54270.513	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 513	$ -	$ -	$ -	$ 339.950.000,00	$ 339.950.000,00	$ 339.950.000,00	$ 339.950.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 339.950.000,00	100
2.3.7.06.02.2026000000116 89.2.4599002.54270.573	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 573	$ -	$ -	$ -	$ 1.155.613.438,80	$ 1.155.613.438,80	$ 1.155.613.438,80	$ 1.155.613.438,80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.155.613.438,80	100
RUBRO	**COMERCIO AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN Y FERRETERA, PRESTADOS A COMISIN O POR CONTRATA**													
2.3.7.06.02.2026000000116 89.2.4599002.62560.501	COMERCIO AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATA 501	$ -	$ -	$ -	$ 371.228.146,50	$ 371.228.146,50	$ 371.228.146,50	$ 371.228.146,50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 371.228.146,50	100
RUBRO	**SERVICIOS DE ASESORIA EN ARQUITECTURA**													
2.3.7.06.02.2026000000116 89.2.4599002.83211.501	SERVICIOS DE ASESORIA EN ARQUITECTURA 501	$ -	$ -	$ -	$ 370.830.776,00	$ 370.830.776,00	$ 370.830.776,00	$ 370.830.776,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 370.830.776,00	100
RUBRO	**SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION**													
2.3.7.06.02.2026000000116 89.2.4599002.83321.306	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 306	$ -	$ -	$ -	$ 500.000.000,00	$ 500.000.000,00	$ 500.000.000,00	$ 500.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 500.000.000,00	100
2.3.7.06.02.2026000000116 89.2.4599002.83321.501	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501	$ -	$ -	$ -	$ 166.941.759,00	$ 166.941.759,00	$ 166.941.759,00	$ 166.941.759,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 166.941.759,00	100
RUBRO	**OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P**													
2.3.7.06.02.2026000000116 89.2.4599002.83990.501	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501	$ -	$ -	$ -	$ 24.525.000,00	$ 24.525.000,00	$ 24.525.000,00	$ 24.525.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 24.525.000,00	100
RUBRO	**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE**													
2.3.7.06.02.2026000000116 89.2.4599002.85970.501	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE 501	$ -	$ -	$ -	$ 679.760.749,41	$ 679.760.749,41	$ 679.760.749,41	$ 679.760.749,41	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 679.760.749,41	100
RUBRO	**SERVICIOS DE DISTRIBUCIN DE AGUA, EXCEPTO A TRAVS DE LA RED (A COMISIN O POR CONTRATO)**													
2.3.7.06.02.2026000000116 89.2.4599002.86350.501	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA EXCEPTO A TRAVES DE LA RED A COMISION O POR CONTRATO 501	$ -	$ -	$ -	$ 188.055.514,00	$ 188.055.514,00	$ 188.055.514,00	$ 188.055.514,00	$ 59.725.737,40	$ 59.725.737,40	$ -	$ -	$ 128.329.776,60	100
RUBRO	**SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS**													
2.3.7.06.02.2026000000116 89.2.4599002.91123.526	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 526	$ -	$ -	$ -	$ 839.489.356,00	$ 839.489.356,00	$ 839.489.356,00	$ 839.489.356,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 839.489.356,00	100
	FONDO PARA EL ESPACIO PUBLICO													
	LINEA 3. TERRITORIO SEGURO Y SOSTENIBLE													
	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO													
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS													
	ADQUISICION DE SERVICIOS													
	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION													
RUBRO	**CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES**													
2.3.2.02.02.005.2024680010050.2.4002020.53211.582	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 582	$ -	$ -	$ -	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100.000.000,00	100

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES							TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	% Ejecucion
		Presupuesto Inicial	Credito	Contracredito	Modificaciones Acumuladas	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	Obligaciones	Pagos Acumulados				
		$ 1,00			$ 2,00	3 = 1 + 2	$ 5,00	$ 7,00		$ 9,00	10 = 3 - 5	11 = 5 - 7	12 = 7 - 9	13 = 7 / 3
2.3.2.02.02.005.2024680010076.2.4002020.53211.232	CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 232	$ 470.741.930,00	$ -	$ -	$ -	$ 470.741.930,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 470.741.930,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2025000000035591.2.4002020.53211.282	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 282	$ 922.917.149,00	$ -	$ 922.917.149,00	$ (922.917.149,00)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2026000000009765.2.4002020.53211.582	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 582	$ -	$ -	$ -	$ 1.027.947.705,29	$ 1.027.947.705,29	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.027.947.705,29	$ -	$ -	0
	FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRUBUCION DEL INGRESO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA													
	LINEA 2. TERRITORIO SEGURO QUE PROGRESA													
	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO													
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
	A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS													
	SUBVENCIONES PARA SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO													
RUBRO	**SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS**													
2.3.3.01.02.004.01.20250000035595.1.4003047.91123.215	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 3.066.183.099,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.066.183.099,00	$ 1.966.724.265,00	$ 1.659.476.249,00	$ 1.659.476.249,00	$ 1.659.476.249,00	$ 1.099.458.834,00	$ 307.248.016,00	$ -	54,12
2.3.3.01.02.004.01.20250000035595.1.4003047.91123.331	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 16.031.457.032,00	$ -	$ -	$ -	$ 16.031.457.032,00	$ 2.202.847.586,00	$ 1.097.001.898,00	$ 1.097.001.898,00	$ 1.097.001.898,00	$ 13.828.609.446,00	$ 1.105.845.688,00	$ -	6,84
2.3.3.01.02.004.01.20250000035595.1.4003047.91123.528	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 528	$ -	$ -	$ -	$ 432.271.178,00	$ 432.271.178,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 432.271.178,00	$ -	$ -	0
2.3.3.01.02.004.02.20250000035595.1.4003047.91123.515	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 528	$ -	$ -	$ -	$ 1.276.444.557,66	$ 1.276.444.557,66	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.276.444.557,66	$ -	$ -	0
2.3.3.01.02.004.02.20250000035595.1.4003047.91123.528	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 528	$ -	$ -	$ -	$ 184.996.781,34	$ 184.996.781,34	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 184.996.781,34	$ -	$ -	0
2.3.3.01.02.004.03.20250000035595.1.4003047.91123.528	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 528	$ -	$ -	$ -	$ 432.271.178,07	$ 432.271.178,07	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 432.271.178,07	$ -	$ -	0
2.3.3.01.02.004.03.20250000035595.1.4003047.91123.568	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 528	$ -	$ -	$ -	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.000.000,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS**													
2.3.3.01.02.004.02.20250000035595.1.4003047.91123.215	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 277.955.424,88	$ -	$ -	$ -	$ 277.955.424,88	$ 225.452.553,00	$ 225.452.553,00	$ 225.452.553,00	$ 225.452.553,00	$ 52.502.871,88	$ -	$ -	81,11
2.3.3.01.02.004.02.20250000035595.1.4003047.91123.333	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 9.500.028.621,00	$ -	$ -	$ -	$ 9.500.028.621,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.500.028.621,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS**													
2.3.3.01.02.004.03.20250000035595.1.4003047.91123.215	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 4.501.842.643,90	$ -	$ -	$ -	$ 4.501.842.643,90	$ 2.615.319.282,00	$ 2.615.319.282,00	$ 2.615.319.282,00	$ 2.615.319.282,00	$ 1.886.523.361,90	$ -	$ -	58,09
2.3.3.01.02.004.03.20250000035595.1.4003047.91123.260	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 30.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 30.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.000.000,00	$ -	$ -	0
2.3.3.01.02.004.03.20250000035595.1.4003047.91123.332	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 13.620.081.434,65	$ -	$ -	$ -	$ 13.620.081.434,65	$ 3.147.393.495,00	$ 3.147.393.495,00	$ 3.147.393.495,00	$ 3.147.393.495,00	$ 10.472.687.939,65	$ -	$ -	23,1
	MINIMO VITAL													
	SUBSIDIOS DE ASEO													
RUBRO	**SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS**													
2.3.3.01.04.004.03.20250000035595.1.4003047.91123.215	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 376.223.024,05	$ -	$ -	$ -	$ 376.223.024,05	$ 234.743.464,00	$ 207.252.702,00	$ 207.252.702,00	$ 207.252.702,00	$ 141.479.560,05	$ 27.490.762,00	$ -	55,08
2.3.3.01.04.004.03.20250000035595.1.4003047.91123.332	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 2.216.585.291,35	$ -	$ -	$ -	$ 2.216.585.291,35	$ 448.890.948,00	$ 362.750.902,00	$ 362.750.902,00	$ 246.300.214,00	$ 1.767.694.343,35	$ 86.140.046,00	$ -	16,36

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES							TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	% Ejecucion
		Presupuesto Inicial	Credito	Contracredito	Modificaciones Acumuladas	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	Obligaciones	Pagos Acumulados				
		$ 1,00			$ 2,00	3 = 1 + 2	$ 5,00	$ 7,00		$ 9,00	10 = 3 - 5	11 = 5 - 7	12 = 7 - 9	13 = 7 / 3
	ALUMBRADO PUBLICO													
	LINEA 4. TERRITORIO SEGURO QUE GENERA VALOR													
	GOBIERNO TERRITORIAL													
	DISMINUCION DE PASIVOS													
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS													
RUBRO	**SERVICIO DE INGENIERIA 513**													
2.3.7.06.02.202600000011719.2.4599002.83324.513	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS ENERGETICOS 513	$ -	$ 1.250.000.000,00	$ -	$ 1.250.000.000,00	$ 1.250.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.250.000.000,00	$ -	$ -	0
	LINEA 5. TERRITORIO SEGURO QUE PROTEGE													
	MINAS Y ENERGIA													
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS													
	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS													
	MATERIALES Y SUMINISTROS													
	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO													
RUBRO	**PAPEL BOND**													
2.3.2.02.01.003.2024680010192.2.2102069.3212801.226	PAPEL PARA IMPRESORA O FOTOCOPIADORA 226	$ 40.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 40.000.000,00	$ 40.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 40.000.000,00	$ -	0
2.3.2.02.01.003.2024680010192.2.2102069.3212801.526	PAPEL BOND 526	$ -	$ -	$ -	$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.000.000,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**DIESEL OIL ACPM FUEL GAS GASOIL MARINE GAS**													
2.3.2.02.01.003.2024680010192.2.2102069.3336103.226	DIESEL OIL ACPM FUEL GAS GASOIL MARINE GAS 226	$ 20.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.000.000,00	100
2.3.2.02.01.003.2024680010192.2.2102069.3336103.526	DIESEL OIL ACPM FUEL GAS GASOIL MARINE GAS 526	$ -	$ -	$ -	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.000.000,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**CARTUCHOS PLASTICOS PARA IMPRESORA DE COMPUTADOR**													
2.3.2.02.01.003.2024680010192.2.2102069.3699060.226	CARTUCHOS PLASTICOS PARA IMPRESORA DE COMPUTADOR 226	$ 60.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 60.000.000,00	$ 60.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 60.000.000,00	$ -	0
2.3.2.02.01.003.2024680010192.2.2102069.3699060.526	CARTUCHOS PLASTICOS PARA IMPRESORA DE COMPUTADOR 526	$ -	$ -	$ -	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.000.000,00	$ -	$ -	0
	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO													
RUBRO	**APARATOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE Y CALEFACCION.**													
2.3.2.02.01.004.2024680010192.2.2102069.4391201.226	APARATOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE Y CALEFACCION 226	$ 20.000.000,00	$ -	$ 20.000.000,00	$ (20.000.000,00)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0
2.3.2.02.01.004.2024680010192.2.2102069.4391201.526	APARATOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE Y CALEFACCION 526	$ -	$ -	$ -	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.000.000,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**HERRAMIENTAS ELECTRICAS DE MANO EXCEPTO SOLDADORES**													
2.3.2.02.01.004.2024680010192.2.2102069.4423201.226	HERRAMIENTAS ELECTRICAS DE MANO EXCEPTO SOLDADORES 226	$ 50.000.000,00	$ -	$ 50.000.000,00	$ (50.000.000,00)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0
2.3.2.02.01.004.2024680010192.2.2102069.4423201.526	HERRAMIENTAS ELECTRICAS DE MANO EXCEPTO SOLDADORES 526	$ -	$ -	$ -	$ 25.000.000,00	$ 25.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25.000.000,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**ACCESORIOS ELECTRICOS N C P**													
2.3.2.02.01.004.2024680010189.2.2102069.4693999.226	ACCESORIOS ELECTRICOS N C P 226	$ 11.618.938.287,00	$ -	$ -	$ -	$ 11.618.938.287,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.618.938.287,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.01.004.2024680010189.2.2102069.4693999.253	ACCESORIOS ELECTRICOS N C P 253	$ 4.000.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 4.000.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.000.000.000,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.01.004.2024680010189.2.2102069.4693999.526	ACCESORIOS ELECTRICOS N C P 526	$ 4.120.663.768,00	$ -	$ 2.236.173.074,00	$ 7.633.627.953,50	$ 11.754.291.721,50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.754.291.721,50	$ -	$ -	0
2.3.2.02.01.004.2025000000158972.2.2102069.4693999.526	ACCESORIOS ELECTRICOS N C P 526	$ -	$ 2.236.173.074,00	$ -	$ 2.236.173.074,00	$ 2.236.173.074,00	$ 2.236.173.074,00	$ 2.236.173.074,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.236.173.074,00	100
	ADQUISICION DE SERVICIOS													
	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION													
RUBRO	**OTROS SERVICIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS**													
2.3.2.02.02.005.2025000000135842.2.2102069.54619.226	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 226	$ 12.093.520.514,00	$ -	$ -	$ -	$ 12.093.520.514,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.093.520.514,00	$ -	$ -	0

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES					Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	% Ejecucion
		Presupuesto Inicial	Credito	Contracredito	Modificaciones Acumuladas	Presupuesto Definitivo			Obligaciones	Pagos Acumulados				
		$ 1,00			$ 2,00	3 = 1 + 2	$ 5,00	$ 7,00		$ 9,00	10 = 3 - 5	11 = 5 - 7	12 = 7 - 9	13 = 7 / 3
2.3.2.02.02.005.20250000 0013584.2.2102069.54619 .526	OTROS SERVICIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS 526	$ 106.364.687,00	$ -	$ -	$ -	$ 106.364.687,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 106.364.687,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20250000 0015897.2.2102069.54619 .526	OTROS SERVICIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS 526	$ -	$ -	$ -	$ 11.527.900.573,50	$ 11.527.900.573,50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.527.900.573,50	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20250000 0036192.2.2102069.54619 .526	OTROS SERVICIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS 526	$ 22.665.192.063,00	$ -	$ -	$ -	$ 22.665.192.063,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.665.192.063,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20250000 0036197.2.2102069.54619 .526	OTROS SERVICIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS 526	$ 5.073.567.072,00	$ -	$ -	$ -	$ 5.073.567.072,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.073.567.072,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20250000 0036207.2.2102069.54619 .526	OTROS SERVICIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS 526	$ 12.481.807.434,00	$ -	$ -	$ -	$ 12.481.807.434,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.481.807.434,00	$ -	$ -	0
	COMERCIO Y DISTRIBUCION ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA													
RUBRO	**SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD POR CUENTA PROPIA**													
2.3.2.02.02.006.20246800 10192.2.2102069.69112.2 26	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD POR CUENTA PROPIA 226	$ 20.500.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 20.500.000.000,00	$ 7.539.534.882,00	$ 7.539.534.882,00	$ 7.539.534.882,00	$ 7.539.534.882,00	$ 12.960.465.118,00	$ -	$ -	36,77
2.3.2.02.02.006.20246800 10192.2.2102069.69112.5 26	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD POR CUENTA PROPIA 526	$ -	$ -	$ -	$ 10.877.803.360,64	$ 10.877.803.360,64	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.877.803.360,64	$ -	$ -	0
	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING													
RUBRO	**SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES NO RESIDENCIALES DIFERENTES A VIVIENDA A COMISION O POR CONTRATO**													
2.3.2.02.02.007.20246800 10192.2.2102069.72212.2 26	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES NO RESIDENCIALES DIFERENTES A VIVIENDA A COMISION O POR CONTRATO 226	$ 300.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 300.000.000,00	$ 300.000.000,00	$ 296.928.511,00	$ 111.573.137,47	$ 111.573.137,47	$ -	$ 3.071.489,00	$ 185.355.373,53	98,97
2.3.2.02.02.007.20246800 10192.2.2102069.72212.5 26	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES NO RESIDENCIALES DIFERENTES A VIVIENDA A COMISION O POR CONTRATO 526	$ -	$ -	$ -	$ 150.000.000,00	$ 150.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 150.000.000,00	$ -	$ -	0
	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION													
RUBRO	**SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO**													
2.3.2.02.02.008.20246800 10192.2.2102069.82120.2 26	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 226	$ 650.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 650.000.000,00	$ 650.000.000,00	$ 467.000.000,00	$ 258.183.333,33	$ 209.683.333,33	$ -	$ 183.000.000,00	$ 208.816.666,67	71,84
2.3.2.02.02.008.20246800 10192.2.2102069.82120.5 26	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIN JURIICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 526	$ -	$ -	$ -	$ 325.000.000,00	$ 325.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 325.000.000,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**SERVICIOS DE CONSULTORA EN GESTIN ADMINISTRATIVA**													
2.3.2.02.02.008.20246800 10192.2.2102069.83115.2 26	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA 226	$ 90.000.000,00	$ -	$ 90.000.000,00	$ (90.000.000,00)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.008.20246800 10192.2.2102069.83115.5 26	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA 526	$ -	$ -	$ -	$ 45.000.000,00	$ 45.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 45.000.000,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES**													
2.3.2.02.02.008.20246800 10192.2.2102069.83213.2 26	SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 226	$ 250.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 250.000.000,00	$ 250.000.000,00	$ 60.000.000,00	$ 31.000.000,00	$ 25.000.000,00	$ -	$ 190.000.000,00	$ 29.000.000,00	24
2.3.2.02.02.008.20246800 10192.2.2102069.83213.5 26	SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 526	$ -	$ -	$ -	$ 125.000.000,00	$ 125.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 125.000.000,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION**													
2.3.2.02.02.008.20246800 10192.2.2102069.83321.2 26	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 226	$ 300.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 300.000.000,00	$ 300.000.000,00	$ 182.800.000,00	$ 71.600.000,00	$ 62.600.000,00	$ -	$ 117.200.000,00	$ 111.200.000,00	60,93
2.3.2.02.02.008.20246800 10192.2.2102069.83321.5 26	SERVICIO DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 526	$ -	$ -	$ -	$ 150.000.000,00	$ 150.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 150.000.000,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P**													
2.3.2.02.02.008.20246800 10192.2.2102069.83990.2 26	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	$ 2.400.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.400.000.000,00	$ 2.400.000.000,00	$ 1.857.400.000,00	$ 959.566.666,01	$ 774.566.666,01	$ -	$ 542.600.000,00	$ 897.833.333,99	77,39

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES							TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	% Ejecucion
		Presupuesto Inicial	Credito	Contracredito	Modificaciones Acumuladas	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	Obligaciones	Pagos Acumulados				
		$ 1,00			$ 2,00	3 = 1 + 2	$ 5,00	$ 7,00		$ 9,00	10 = 3 - 5	11 = 5 - 7	12 = 7 - 9	13 = 7 / 3
2.3.2.02.02.008.20246800 10192.2.2102069.83990.5 26	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 526	$ -	$ -	$ -	$ 1.200.000.000,00	$ 1.200.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.200.000.000,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**SERVICIOS DE TELEFONA FIJA (ACCESO)**													
2.3.2.02.02.008.20246800 10192.2.2102069.84120.2 26	SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA ACCESO 226	$ 200.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 200.000.000,00	$ 199.816.707,61	$ 199.816.707,61	$ 199.816.707,61	$ 199.816.707,61	$ 183.292,39	$ -	$ -	99,9
2.3.2.02.02.008.20246800 10192.2.2102069.84120.5 26	SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA ACCESO 526	$ -	$ -	$ -	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100.000.000,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**SERVICIOS DE PROTECCION (GUARDAS DE SEGURIDAD)**													
2.3.2.02.02.008.20246800 10192.2.2102069.85250.2 26	SERVICIOS DE PROTECCION GUARDAS DE SEGURIDAD 226	$ 3.100.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.100.000.000,00	$ 3.092.643.344,55	$ 3.092.643.344,55	$ 734.088.626,33	$ 734.088.626,33	$ 7.356.655,45	$ -	$ 2.358.554.718,22	99,76
2.3.2.02.02.008.20246800 10192.2.2102069.85250.5 26	SERVICIOS DE PROTECCION GUARDAS DE SEGURIDAD 526	$ -	$ -	$ -	$ 1.550.000.000,00	$ 1.550.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.550.000.000,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL**													
2.3.2.02.02.008.20246800 10192.2.2102069.85330.2 26	SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL 226	$ 50.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 50.000.000,00	$ 50.000.000,00	$ 50.000.000,00	$ 10.971.314,00	$ 10.971.314,00	$ -	$ -	$ 39.028.686,00	100
2.3.2.02.02.008.20246800 10192.2.2102069.85330.5 26	SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL 526	$ -	$ -	$ -	$ 25.000.000,00	$ 25.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25.000.000,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**SERVICIOS DE CENTROS DE LLAMADAS TELEFONICAS CALL CENTER**													
2.3.2.02.02.008.20246800 10192.2.2102069.85931.2 26	SERVICIOS DE CENTROS DE LLAMADAS TELEFONICAS CALL CENTER PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 226	$ 350.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 350.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 350.000.000,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.008.20246800 10192.2.2102069.85931.5 26	SERVICIOS DE CENTROS DE LLAMADAS TELEFONICAS CALL CENTER 526	$ -	$ -	$ -	$ 175.000.000,00	$ 175.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 175.000.000,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE**													
2.3.2.02.02.008.20246800 10189.2.2102069.85970.2 26	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE 226	$ 2.000.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.000.000.000,00	$ 894.657.218,00	$ 251.403.878,00	$ -	$ -	$ 1.105.342.782,00	$ 643.253.340,00	$ 251.403.878,00	12,57
2.3.2.02.02.008.20246800 10189.2.2102069.85970.5 26	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE 526	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000.000,00	$ 1.000.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000.000,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P**													
2.3.2.02.02.008.20246800 10192.2.2102069.85999.2 26	OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 226	$ 500.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 500.000.000,00	$ 500.000.000,00	$ 374.000.000,00	$ 198.689.999,99	$ 161.289.999,99	$ -	$ 126.000.000,00	$ 175.310.000,01	74,8
2.3.2.02.02.008.20246800 10192.2.2102069.85999.5 26	OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 526	$ -	$ -	$ -	$ 250.000.000,00	$ 250.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 250.000.000,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES N C P**													
2.3.2.02.02.008.20246800 10192.2.2102069.8714199 .226	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE VEHICULOS AUTOMOTORES N.C.P.226	$ 80.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 80.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 80.000.000,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.008.20246800 10192.2.2102069.8714199 .526	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES N C P 526	$ -	$ -	$ -	$ 40.000.000,00	$ 40.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 40.000.000,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE BATERIAS Y ACUMULADORES ELECTRICOS.**													
2.3.2.02.02.008.20246800 10192.2.2102069.8715204 .226	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BATERIAS Y ACUMULADORES ELECTRICOS 226	$ 10.000.000,00	$ -	$ 10.000.000,00	$ (10.000.000,00)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.008.20246800 10192.2.2102069.8715204 .526	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BATERIAS Y ACUMULADORES ELECTRICOS 526	$ -	$ -	$ -	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.000.000,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION.**													
2.3.2.02.02.008.20246800 10189.2.2102069.8715205 .226	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION 226	$ 16.200.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 16.200.000.000,00	$ 6.216.342.030,00	$ 1.953.798.826,00	$ -	$ -	$ 9.983.657.970,00	$ 4.262.543.204,00	$ 1.953.798.826,00	12,06
2.3.2.02.02.008.20246800 10189.2.2102069.8715205 .526	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION 526	$ -	$ -	$ -	$ 8.727.803.360,64	$ 8.727.803.360,64	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.727.803.360,64	$ -	$ -	0
RUBRO	**SERVICIOS DE SOPORTE EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TI**													
2.3.2.02.02.008.20246800 10205.2.2106033.83132.5 26	SERVICIOS DE SOPORTE EN TECNOLOGAS DE LA INFORMACION TI 526	$ 500.000.000,00	$ -	$ -	$ 1.133.400.344,62	$ 1.633.400.344,62	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.633.400.344,62	$ -	$ -	0
	SECTOR													
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS													
	ADQUISICION DE SERVICIOS													
	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION													

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES							TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	% Ejecucion
		Presupuesto Inicial	Credito	Contracredito	Modificaciones Acumuladas	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	Obligaciones	Pagos Acumulados				
		$ 1,00			$ 2,00	3 = 1 + 2	$ 5,00	$ 7,00		$ 9,00	10 = 3 - 5	11 = 5 - 7	12 = 7 - 9	13 = 7 / 3
RUBRO	**INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO**													
2.3.2.02.02.005.20250000 0020181.2.4002020.53270 .201	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 201	$ 391.948.179,00	$ -	$ -	$ -	$ 391.948.179,00	$ 391.948.179,00	$ 391.948.179,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 391.948.179,00	100
RUBRO	**OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES**													
2.3.2.02.02.005.20250000 0035597.2.4301011.53129 .201	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 201	$ 822.718.839,00	$ -	$ -	$ -	$ 822.718.839,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 822.718.839,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20250000 0035597.2.4301011.53129 .248	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 248	$ 675.641.031,00	$ -	$ -	$ -	$ 675.641.031,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 675.641.031,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS**													
2.3.2.02.02.005.20250000 0035593.2.2402044.53221 .201	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS 201	$ 2.753.698.467,00	$ -	$ 1.855.619.287,00	$ (1.855.619.287,00)	$ 898.079.180,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 898.079.180,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20250000 0035593.2.2402044.53221 .501	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS 501	$ 131.761.475,00	$ -	$ -	$ -	$ 131.761.475,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 131.761.475,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20250000 0035678.2.2402044.53221 .251	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS 251	$ 2.587.514.235,00	$ -	$ 1.664.012.468,00	$ (1.664.012.468,00)	$ 923.501.767,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 923.501.767,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**OTROS SERVICIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS**													
2.3.2.02.02.005.20250000 0030966.2.4002021.54619 .226	OTROS SERVICIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS 226	$ 3.000.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.000.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000.000.000,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20250000 0035687.2.4002021.54619 .226	OTROS SERVICIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS 226	$ 2.500.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.500.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.500.000.000,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES**													
2.3.2.02.02.005.20250000 0035821.2.4502007.53129 .588	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 588	$ 1.351.924.318,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.351.924.318,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.351.924.318,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**MÁQUINAS PORTÁTILES DE PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO DE DATOS QUE NO PESEN MÁS DE 10 KG, COMO COMPUTADORES PORTÁTILES (LAPTOP Y NOTEBOOK)**													
2.3.2.02.01.004.20246800 10192.2.2102069.45221.5 26	MAQUINAS PORTATILES DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS QUE NO PESEN MAS DE 10 KG COMO COMPUTADORES PORTATILES LAPTOP Y NOTEBOOK 526	$ -	$ -	$ -	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.000.000,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**MÁQUINAS DE PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO DE DATOS, QUE CONTENGAN UNA CAJA Y AL MENOS UNA UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU) Y UNA UNIDAD DE ENTRADA Y DE SALIDA, ESTÉN COMBINADOS O NO**													
2.3.2.02.01.004.20246800 10192.2.2102069.45230.5 26	MÁQUINAS DE PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO DE DATOS, QUE CONTENGAN UNA CAJA Y AL MENOS UNA UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU) Y UNA UNIDAD DE ENTRADA Y DE SALIDA, ESTÉN COMBINADOS O NO 526	$ -	$ -	$ -	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.000.000,00	$ -	$ -	0
	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA													
RUBRO	**COMERCIO AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONESTRUCCION Y FERRETERIA, PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO 226**													
2.3.2.02.01.006.20246800 10192.2.2102069.62560.2 26	COMERCIO AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATA 226	$ -	$ 170.000.000,00	$ -	$ 170.000.000,00	$ 170.000.000,00	$ 170.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 170.000.000,00	$ -	0
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS													
	DISMINUCION DE PASIVOS													
	FINANCIACION DE DEFICIT FISCAL													
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS													
RUBRO	**INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO**													
2.3.7.06.02.202600000011 719.2.4599002.53270.501	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 501	$ -	$ -	$ -	$ 420.000.000,00	$ 420.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 420.000.000,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**OTROS SERVICIOS DE APOYO N.C.P.**													
2.3.7.06.02.202600000011 719.2.4599002.85999.526	OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 526	$ -	$ -	$ -	$ 83.333,33	$ 83.333,33	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 83.333,33	$ -	$ -	0
RUBRO	**OTROS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIN PBLICA N.C.P.**													

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES							TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	% Ejecucion
		Presupuesto Inicial	Credito	Contracredito	Modificaciones Acumuladas	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	Obligaciones	Pagos Acumulados				
		$ 1,00			$ 2,00	3 = 1 + 2	$ 5,00	$ 7,00		$ 9,00	10 = 3 - 5	11 = 5 - 7	12 = 7 - 9	13 = 7 / 3
2.3.7.06.02.2026000000119.2.4599002.91119.526	OTROS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA N C P 526	$ -	$ -	$ -	$ 1.473.595.524,26	$ 1.473.595.524,26	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.473.595.524,26	$ -	$ -	0
RUBRO	**SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIN PBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PBLICOS**													
2.3.7.06.02.2026000000119.2.4599002.91123.526	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 526	$ -	$ -	$ -	$ 2.472.019.668,29	$ 2.472.019.668,29	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.472.019.668,29	$ -	$ -	0
RUBRO	**PAPEL BOND**													
2.3.7.06.02.2026000000119.2.4599002.3212801.526	PAPEL BOND 526	$ -	$ -	$ -	$ 5.996.886,00	$ 5.996.886,00	$ 5.996.886,00	$ 5.996.886,00	$ 5.996.886,00	$ -	$ -	$ -	$ -	100
RUBRO	**SERVICIOS DE SOPORTE EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI)**													
2.3.7.06.02.2026000000119.2.4599002.83132.526	SERVICIOS DE SOPORTE EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TI 526	$ -	$ -	$ -	$ 25.023.612,00	$ 25.023.612,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25.023.612,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**SERVICIOS DE INGENIERÍA EN PROYECTOS ENERGÉTICOS**													
2.3.7.06.02.2025000000282 64.2.2102008.83324.513	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS ENERGETICOS 513	$ -	$ -	$ 1.250.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0
RUBRO	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS DE ILUMINACIÓN**													
2.3.7.06.02.2026000000119.2.4599002.8715205.526	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION 526	$ -	$ -	$ -	$ 36.720.720,76	$ 36.720.720,76	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 36.720.720,76	$ -	$ -	0
RUBRO	**SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE EQUIPO DE ILUMINACIÓN ELÉCTRICA**													
2.3.7.06.02.2026000000119.2.4599002.88756.501	SERVICIOS DE FABRICACION DE EQUIPO DE ILUMINACION ELECTRICA 501	$ -	$ -	$ -	$ 689.885.166,86	$ 689.885.166,86	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 689.885.166,86	$ -	$ -	0

RELACION GASTOS DE INVERSION A 30 DE JUNIO DE 2026

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Solicitó	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
5125	9/04/2026 15:18	2803	1098753675	NEL SEBASTIAN OVIEDO MENDEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 4.500.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 4.500.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO 2803 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
5232	13/04/2026 14:19		830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P BIC	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LESPINOSABOHOR - LAURA PATRICIA ESPINOSA BOHORQUEZ	$ 11.392.617,73	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.84120.226 - SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA ACCESO 226	$ 11.392.617,73	SERVICIO DE TELEFONIA CONSUMO DE BACKUP EN DISCO DS-02973567 CONSUMO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2026 CUENTA # 17 REFERENCIA # 181195417
5233	13/04/2026 14:21		830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P BIC	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LESPINOSABOHOR - LAURA PATRICIA ESPINOSA BOHORQUEZ	$ 28.901.243,74	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.84120.226 - SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA ACCESO 226	$ 28.901.243,74	SERVICIO DE TELEFONIACONSUMO DE INTERNET-PROTECION 3 MULTIDISPOSITIVOS-UCAAS-WEBEX CALLING-RPVIP ACKUP DISCO - CUENTA # 010 PERIODO FACTURADO 01 AL 31 DE MARZO 2026. REFERECIA # 181185077. ESTE RECIBO LLEGO POR VALOR DE $28,901,243,74
5234	13/04/2026 14:22		890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LESPINOSABOHOR - LAURA PATRICIA ESPINOSA BOHORQUEZ	$ 1.228.232.041,00	2.3.2.02.02.006.2024680010192.2.2102069.69112.226 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD POR CUENTA PROPIA 226	$ 1.228.232.041,00	ENERGIA - ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/03/2026- 31 03 /2026 SEGÚN FACTURA 246490079 NUMERO DE CUENTA 1075933.
5346	15/04/2026 14:27	2405	1098714857	DANIEL EDICSON GRAJALES AMADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 6.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 3.800.000,00	ADICIONAL NÚMERO 1 AL CONTRATO 2405 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
5346	15/04/2026 14:27	2405	1098714857	DANIEL EDICSON GRAJALES AMADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ -	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 2.200.000,00	ADICIONAL NÚMERO 1 AL CONTRATO 2405 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
5347	15/04/2026 14:28	2410	1098675528	LICET MARCELA BOLIVAR SANDOVAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 6.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 6.000.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO 2410 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
5348	15/04/2026 14:30	2338	91489251	SERGIO AUGUSTO HERNANDEZ MORENO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 6.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 6.000.000,00	ADICIONAL NÚMERO 1 AL CONTRATO 2338 DE 2026, CUYO OBJETO ES:PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE DEFENSA JUDICIAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
5349	15/04/2026 14:30	2312	1096948322	SANDRA YENITH RAMIREZ PEÑA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 6.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 6.000.000,00	ADICIONAL NÚMERO 1 AL CONTRATO 2312 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PETRÓLEOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
5350	15/04/2026 14:32	2270	1098731880	CRISTIAN JAHIR PORTILLA PITA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 6.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 6.000.000,00	ADICIONAL NÚMERO 1 AL CONTRATO 2270 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
5351	15/04/2026 14:33	2437	1098784327	MARIA PAULA HERRERA NUÑEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 6.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 6.000.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO 2437 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
5377	16/04/2026 12:00	65	902043077	CONSORCIO PARQUES 477	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 2.735.880.690,00	2.3.2.02.02.005.2024680010045.2.4002022.85970.201 - PARQUES MANTENIDOS 201	$ 2.735.880.690,00	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES, EQUIPAMIENTO Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER
5378	16/04/2026 12:02	66	901702151	MAAS INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 277.859.375,00	2.3.2.02.02.005.2024680010045.2.4002022.85970.201 - PARQUES MANTENIDOS 201	$ 277.859.375,00	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS EQUIPAMIENTO Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER
5382	16/04/2026 16:57	2477	1098767259	CAMILO ENRIQUE DUEÑAS PUENTES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 6.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 6.000.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO 2477 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Solicitó	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
5383	16/04/2026 16:58	2495	1005161299	PAULA ANDREA VILLAMIZAR ARCHILA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 5.250.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 5.250.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO 2495 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
5384	16/04/2026 16:58	2314	91288583	JOLMAN LOZANO PICO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 6.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 6.000.000,00	ADICIONAL NÚMERO 1 AL CONTRATO 2314 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
5483	21/04/2026 15:18	1472	1098631857	OCTAVIO ANDRES SANDOVAL GONZALEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 8.250.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 8.250.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO 1472 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO A LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
5549	23/04/2026 12:06	135	804006674	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S A E S P	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 707.860.463,00	2.3.2.02.02.008.2024680010046.2.4002026.85970.501 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE 501	$ 707.860.463,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 3 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 135 DEL 26 DE JUNIO DE 2025, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA (EMAB) PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES UBICADAS EN EL ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
5550	23/04/2026 12:10	891	1005324483	ASHLYE JOHANNA ORTIZ LARROTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 28.800.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 28.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
5651	23/04/2026 16:14	2494	1098745797	LUPITA LARA PEREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 4.500.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 4.500.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO 2494 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
5652	23/04/2026 16:15	2519	63524206	CLAUDIA MILENA PEDRAZA CACERES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 6.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 6.000.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO 2519 DE 2016, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.
5653	23/04/2026 16:15	2357	37896855	MARIA JOSE ARENAS CACERES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 6.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 6.000.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO 2357 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE DEFENSA JUDICIAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
5666	24/04/2026 12:57		804016472	AMERICANA DE SERVICIOS LTDA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LESPINOSABOHOR - LAURA PATRICIA ESPINOSA BOHORQUEZ	$ 38.995.172,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.85330.226 - SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL 226	$ 38.995.172,00	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACION Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, INCLUYENDO LA DISPOSICIÓN DE INSUMOS, ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA RESPECTIVA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS"
5668	24/04/2026 13:02		830095213	ORGANIZACION TERPEL S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LESPINOSABOHOR - LAURA PATRICIA ESPINOSA BOHORQUEZ	$ 16.855.700,00	2.3.2.02.01.003.2024680010192.2.2102069.3336103.226 - DIESEL OIL ACPM FUEL GAS GASOIL MARINE GAS 226	$ 16.855.700,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM), PARA LOS EQUIPOS, VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS Y MAQUINARIA PESADA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"
5770	27/04/2026 16:45		890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LESPINOSABOHOR - LAURA PATRICIA ESPINOSA BOHORQUEZ	$ 3.347.293,00	2.3.2.02.02.006.2024680010192.2.2102069.69112.226 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD POR CUENTA PROPIA 226	$ 3.347.293,00	ENERGIA - ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 14/03/2026 AL 13/04/2026- 31 SEGÚN FACTURA 247311961 NUMERO DE CUENTA 32675.
5771	27/04/2026 16:45		800153993	COMCEL S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LESPINOSABOHOR - LAURA PATRICIA ESPINOSA BOHORQUEZ	$ 3.641.288,47	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.84120.226 - SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA ACCESO 226	$ 3.641.288,47	PLAN DE DATOS DE TELEMEDIDA, TELEGESTION Y PLATAFORMA TECNOLOGICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEL 20 DE MARZO DE 2065 AL 19 DE ABRIL DE 2026 POR VALOR DE $3.641.288.47 SEGÚN FACTURA DE CLARO NO. E6052579153 REFERENCIA 8221383845. FECHA LIMITE 07 DE MAYO 2026 Y EL CONSUMO DEL 20 DE MARZO A 19 DE ABRIL 2026 POR VALOR DE $3.641.288.47

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Solicitó	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
5846	29/04/2026 8:52	2563	13870340	IVAN FRANCISCO RAMIREZ GALVIS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 6.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 6.000.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO 2563 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRÓNICO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
5847	29/04/2026 8:53	2828	1095833579	GERALDINE MARTINEZ CORREDOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 4.500.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 4.500.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO 2828 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
5848	29/04/2026 8:53	2603	1098675302	CARMEN LUCIA LOZANO JAUREGUI	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 6.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 6.000.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO 2603 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
5849	29/04/2026 8:54	2509	13873753	ANGEL OCTAVIO SANDOVAL PINZON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 6.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 6.000.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO 2509 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
5850	29/04/2026 9:01	2574	1193545801	PAULA LIZETH SUAREZ GONZALEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 4.500.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 4.500.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO 2574 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
5851	29/04/2026 9:02	2598	1005309562	PAOLA ANDREA MORENO CEPEDA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 6.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 6.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS PARA LOS PROYECTOS Y CONVENIOS PARTICIPATIVOS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.
5852	29/04/2026 9:04	2452	1098684410	YURY BAYONA HERNANDEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 6.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 6.000.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO 2452 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO COMO TECNÓLOGO EN CONTABILIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
5860	29/04/2026 10:30		804006674	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S A E S P	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 860.825.752,00	2.3.3.01.02.004.03.20250000003559 5.1.4003047.91123.215 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 860.825.752,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES ENERO DE 2026 SEGÚN FACTURA NO. ES 389 $ 411.010.882,00 Y MES DE FEBRERO DE 2026 SEGÚN FACTURA NO. ES 390 $ 449.814.870,00 VALOR TOTAL $ 860.825.752,00 - EMAB
5861	29/04/2026 10:31		804006674	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S A E S P	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 1.535.064.407,00	2.3.3.01.02.004.03.20250000003559 5.1.4003047.91123.332 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 1.535.064.407,00	VALOR APORTES SIN SITUACION DE FONDOS- SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES ENERO DE 2026 SEGÚN BALANCE Y CONTRIBUCIONES $ 736.658.977,00 Y MES DE FEBRERO DE 2026 SEGÚN BALANCE Y CONTRIBUCIONES $ 798.405.430 VALOR TOTAL DE APORTES SSF $ 1.535.064.407,00 - EMAB
5874	29/04/2026 16:13	2587	1102353678	LUIS DUVAN RODRIGUEZ DIAZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 6.750.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 6.750.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO 2587 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
5875	29/04/2026 16:14	2786	1098731124	LINDA KAREM CHIA MACHUCA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 6.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 6.000.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO 2786 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO, PARA APOYAR Y FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS JURÍDICOS, ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTUALES QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
5876	29/04/2026 16:15	2465	91511754	DIEGO FERNANDO BECERRA RAMIREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 6.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 6.000.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO 2465 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Solicitó	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
5877	29/04/2026 16:16	2469	91499958	CHRISTIAN ARIEL AMADO GAONA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 6.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 6.000.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO 2469 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
5878	29/04/2026 16:17	2567	63536471	YESENIA SUAREZ PATIÑO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 6.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 6.000.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO 2567 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRÓNICO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
5884	30/04/2026 11:12	2555	91151139	JORGE ELIECER BLANCO VESGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 6.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83213.201 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 201	$ 6.000.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO 2555 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
5885	30/04/2026 11:56		890200162	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA AMB S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 348.494.459,00	2.3.3.01.02.004.01.2025000000035595.1.4003047.91123.215 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 348.494.459,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN FACTURA NO. 0006581 $ 348.494.459,00 TOTAL $ 348.494.459,00-ACUEDUCTO METROPOLITANO
5938	7/05/2026 9:52	1396	37751108	ESPERANZA TORRES PEREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 8.750.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.85999.201 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 201	$ 8.750.000,00	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER EL AREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
6070	8/05/2026 15:07	2588	63365736	LEONOR SINUCO ROJAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 6.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501	$ 6.000.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO 2588 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
6071	8/05/2026 16:03	217	901702151	MAAS INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 126.095.762,00	2.3.2.02.02.008.2024680010084.2.4599006.83321.267 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 267	$ 126.095.762,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 217 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA A LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RESTAURACIÓN DE LA PLAZA SAN MATEO, INMUEBLE DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
6098	11/05/2026 16:24		830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P BIC	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LESPINOSABOHOR - LAURA PATRICIA ESPINOSA BOHORQUEZ	$ 11.392.617,73	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.84120.226 - SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA ACCESO 226	$ 11.392.617,73	SERVICIO DE TELEFONIA CONSUMO DE BACKUP EN DISCO DS-02973567 CONSUMO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2026 CUENTA # 17 REFERENCIA # 181195417
6168	12/05/2026 16:13	2810	1098814453	CAMILA ANDREA VEGA MONTAÑEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 6.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501	$ 6.000.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO 2810 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
6169	12/05/2026 16:13	2750	1101694395	JORGE ENRIQUE GONZALEZ FORERO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 6.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501	$ 6.000.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO 2750 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO, PARA APOYAR Y FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS JURÍDICOS, ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTUALES QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
6170	12/05/2026 16:16	2788	1098746548	SMITH ALEJANDRA PINTO PIMIENTO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 6.750.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501	$ 6.750.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO 2788 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
6171	12/05/2026 16:32	2805	1098745463	RICARDO ANDRES ZARATE CABEZA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 6.750.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501	$ 6.750.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO 2805 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Solicitó	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
6172	12/05/2026 16:33	2671	63279635	LETICIA CASTELLANOS ZAMBRANO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 6.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 5.700.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO 2671 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
6172	12/05/2026 16:33	2671	63279635	LETICIA CASTELLANOS ZAMBRANO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ -	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501	$ 300.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO 2671 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
6272	15/05/2026 14:16	195	901980960	CONSORCIO FORESTAL BGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 93.095.717,00	2.3.2.02.02.008.2024680010046.2.4002026.85970.501 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE 501	$ 93.095.717,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 2 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 195 DEL 27 DE AGOSTO DE 2025, CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y MANEJO INTEGRAL ARBOREO DE ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
6303	15/05/2026 16:31		890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LESPINOSABOHOR - LAURA PATRICIA ESPINOSA BOHORQUEZ	$ 1.251.231.561,00	2.3.2.02.02.006.2024680010192.2.2102069.69112.226 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD POR CUENTA PROPIA 226	$ 1.251.231.561,00	ENERGIA - ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/04/2026-30/04 /2026 SEGÚN FACTURA 247643460 NUMERO DE CUENTA 1075933.
6306	19/05/2026 10:55	85	902059350	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAS BGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 18.573.570.772,00	2.3.2.02.02.005.2025000000036174.2.2402115.53211.201 - CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 201	$ 13.479.663.062,83	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
6306	19/05/2026 10:55	85	902059350	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAS BGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ -	2.3.2.02.02.005.2025000000036174.2.2402115.53211.213 - CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 213	$ 243.830.136,00	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
6306	19/05/2026 10:55	85	902059350	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAS BGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ -	2.3.2.02.02.005.2025000000036174.2.2402115.53211.248 - CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 248	$ 324.358.969,00	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
6306	19/05/2026 10:55	85	902059350	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAS BGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ -	2.3.2.02.02.005.2025000000036174.2.2402115.53211.251 - CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 251	$ 653.493.068,00	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
6306	19/05/2026 10:55	85	902059350	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAS BGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ -	2.3.2.02.02.005.2025000000036174.2.2402115.53211.318 - CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 318	$ 250.000.000,00	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
6306	19/05/2026 10:55	85	902059350	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAS BGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ -	2.3.2.02.02.005.2025000000036174.2.2402115.53211.319 - CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 319	$ 2.000.000.000,00	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
6306	19/05/2026 10:55	85	902059350	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAS BGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ -	2.3.2.02.02.005.2025000000036174.2.2402115.53211.501 - CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 501	$ 1.622.225.536,17	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
6307	19/05/2026 11:08	86	902066043	CONSORCIO INTER MALLA VIAL BGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 1.621.790.940,00	2.3.2.02.02.005.2025000000036174.2.2402115.53211.201 - CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 201	$ 1.621.790.940,00	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA OBRA PÚBLICA DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
6433	25/05/2026 10:12	1963	1098732994	ANDRES MAURICIO MANTILLA RIVERA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 8.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501	$ 8.000.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO 1963 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Solicitó	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
6436	25/05/2026 11:09	2392	63553561	ALBA ROCIO MORENO GAMBOA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 6.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501	$ 6.000.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO 2392 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTUALES EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
6437	25/05/2026 11:10	2244	13541239	WILFER OMAR VERA JAIMES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 9.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 9.000.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO 2244 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
6451	25/05/2026 15:12		901569399	CONSORCIO PRACI	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 373.934.432,00	2.3.7.06.02.2026000000011689.2.4599002.53129.573 - OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 573	$ 220.730.892,00	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 38 DE 2022, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER. - GRUPO 1
6451	25/05/2026 15:12		901569399	CONSORCIO PRACI	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ -	2.3.7.06.02.2026000000011689.2.4599002.54129.501 - SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 501	$ 153.203.540,00	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 38 DE 2022, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER. - GRUPO 1
6452	25/05/2026 15:13		890200162	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA AMB S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 188.055.514,00	2.3.7.06.02.2026000000011689.2.4599002.86350.501 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA EXCEPTO A TRAVES DE LA RED A COMISION O POR CONTRATO 501	$ 188.055.514,00	PASIVO EXIGIBLE CTO 134 DE 2024, CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA GARANTIZAR LA COBERTURA DEL MINIMO VITAL DE AGUA A LOS SECTORES DE LOS CORREGIMIENTOS DE LOS SECTOR 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
6453	25/05/2026 15:14		800153993	COMCEL S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LESPINOSABOHOR - LAURA PATRICIA ESPINOSA BOHORQUEZ	$ 1.199.528,07	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.84120.226 - SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA ACCESO 226	$ 1.199.528,07	CONSUMO DE VOZ CORRESPONDIENTE A LOS PERIODO DE: 04 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO 2026 $399.842.69 04 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2026 $399.842.69 04 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2026 $399,842,69 PLAN DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y SIM CARD DE PRUEBA DE TELEMEDIDA, SEGÚN FACTURA E6057601463 DE CLARO REFERENCIA 8221401343.
6455	25/05/2026 16:25		890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LESPINOSABOHOR - LAURA PATRICIA ESPINOSA BOHORQUEZ	$ 4.069.230,00	2.3.2.02.02.006.2024680010192.2.2102069.69112.226 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD POR CUENTA PROPIA 226	$ 4.069.230,00	ENERGIA - ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 14/04/2026 AL 13/05/2026- 31 SEGÚN FACTURA 248452994 NUMERO DE CUENTA 32675.
6456	25/05/2026 16:51		800153993	COMCEL S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LESPINOSABOHOR - LAURA PATRICIA ESPINOSA BOHORQUEZ	$ 3.641.288,47	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.84120.226 - SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA ACCESO 226	$ 3.641.288,47	PLAN DE DATOS DE TELEMEDIDA, TELEGESTION Y PLATAFORMA TECNOLOGICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CONSUMO DEL 20 DE ABRIL DE 2065 AL 19 DE MAYO DE 2026 POR VALOR DE $3.641.288.47 SEGÚN FACTURA DE CLARO NO. E6063483922 REFERENCIA 8221383845. FECHA LIMITE 05 DE JUNIO 2026
6541	26/05/2026 15:18	2260	1090535249	OMAR GILBERTO ABELLO RODRIGUEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 3.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501	$ 3.000.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO 2260 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTUALES EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
6542	26/05/2026 15:20	2350	1095816935	KATHERINE MARTINEZ PAREJO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 8.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501	$ 8.000.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO 2350 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
6543	26/05/2026 15:37		901666087	CONSORCIO SALONES BUCARAMANGA LC 1248	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 93.240.503,57	2.3.7.06.02.2026000000011689.2.4599002.53129.501 - OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 501	$ 62.447.428,86	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 428 DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN DE LOS SALONES COMUNALES DE LOS BARRIOS LA CONCORDIA Y SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
6543	26/05/2026 15:37		901666087	CONSORCIO SALONES BUCARAMANGA LC 1248	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ -	2.3.7.06.02.2026000000011689.2.4599002.53129.573 - OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 573	$ 30.793.074,71	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 428 DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN DE LOS SALONES COMUNALES DE LOS BARRIOS LA CONCORDIA Y SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Solicitó	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
6544	26/05/2026 15:37		901663030	CONSORCIO VTAY BUCARAMANGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 230.992.064,00	2.3.7.06.02.202600000011689.2.45 99002.53129.501 - OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 501	$ 230.992.064,00	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO 388 DE 2022, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN DE LOS SALONES COMUNALES DE LOS BARRIOS LA CONCORDIA Y SAN LUIS DEL BUCARAMANGA SANTANDER
6545	26/05/2026 15:38		800155100	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 535.286.860,00	2.3.7.06.02.202600000011689.2.45 99002.53211.501 - CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 501	$ 535.286.860,00	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 397 DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO DÁMASO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
6546	26/05/2026 15:42		900593828	ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 54.137.405,22	2.3.7.06.02.202600000011689.2.45 99002.53129.501 - OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 501	$ 54.137.405,22	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 37 DE 2022, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER. - GRUPO 2
6547	26/05/2026 15:44		901664006	CONSORCIO DEPORTIVOS SM	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 545.091.799,88	2.3.7.06.02.202600000011689.2.45 99002.53270.501 - INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 501	$ 545.091.799,88	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 409 DE 2022, CUYO OBJETO ES: ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - GRUPO 2, CONTRATISTA: CONSORCIO DEPORTIVOS SM NIT: 901664006
6548	26/05/2026 15:45		901571379	CONSORCIO CELQO-INGECON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 198.352.006,96	2.3.7.06.02.202600000011689.2.45 99002.54270.501 - SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 501	$ 19.077.125,26	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 46 DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 2
6548	26/05/2026 15:45		901571379	CONSORCIO CELQO-INGECON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ -	2.3.7.06.02.202600000011689.2.45 99002.54270.573 - SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 573	$ 179.274.881,70	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 46 DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 2
6549	26/05/2026 15:46		901572183	CONSORCIO INTERVENTORES ORDAN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 28.412.089,00	2.3.7.06.02.202600000011689.2.45 99002.53129.501 - OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 501	$ 28.412.089,00	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 49 DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER
6551	26/05/2026 15:47		901566490	CONSORCIO PARQUES Y ESCENARIOS PG	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 1.790.972.520,10	2.3.7.06.02.202600000011689.2.45 99002.54270.501 - SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 501	$ 474.683.963,00	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 34 DE 2022, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. - GRUPO 3
6551	26/05/2026 15:47		901566490	CONSORCIO PARQUES Y ESCENARIOS PG	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ -	2.3.7.06.02.202600000011689.2.45 99002.54270.513 - SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 513	$ 339.950.000,00	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 34 DE 2022, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. - GRUPO 3
6551	26/05/2026 15:47		901566490	CONSORCIO PARQUES Y ESCENARIOS PG	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ -	2.3.7.06.02.202600000011689.2.45 99002.54270.573 - SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 573	$ 976.338.557,10	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 34 DE 2022, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. - GRUPO 3
6552	26/05/2026 15:50		901506390	CONSORCIO DESARROLLO URBANO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 267.280.537,00	2.3.7.06.02.202600000011689.2.45 99002.53270.573 - INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 573	$ 267.280.537,00	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 172 DE 2021, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS ADYACENTES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" - GRUPO 3
6556	26/05/2026 16:24		800115427	IRC S.A.S.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 259.826.547,30	2.3.7.06.02.202600000011689.2.45 99002.53129.516 - OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 516	$ 259.826.547,30	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 296 DE 2015, CUYO OBJETO ES: ADECUACION DE TRES HOGARES INFANTILES EL TRENCITO ACOMUNAL ZONA 4 Y DOMINGO SABIO PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Solicitó	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
6557	26/05/2026 16:25		901303722	CONSORCIO MEJORANDO A BUCARAMANGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 282.769.984,66	2.3.7.06.02.202600000011689.2.45 99002.53129.501 - OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 501	$ 282.769.984,66	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 266 DE 2019, CUYO OBJETO ES: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LOS SALONES COMUNALES EN LOS BARRIOS BUCARAMANGA, DIAMANTE I, LA LIBERTAD, EL GAITAN, LA FERIA, CAFÉ MADRID, NUEVA COLOMBIA, NORTE BAJO, SAN MIGUEL Y VILLA DEL PRADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
6558	26/05/2026 16:26		91282210	JAIRO OSORIO CABALLERO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 371.228.146,50	2.3.7.06.02.202600000011689.2.45 99002.62560.501 - COMERCIO AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATA 501	$ 371.228.146,50	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 244 DE 2024, CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÌA Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
6559	26/05/2026 16:28		890210581	AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 679.760.749,41	2.3.7.06.02.202600000011689.2.45 99002.85970.501 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE 501	$ 679.760.749,41	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 126 DE 2024, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y EL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES UBICADAS EN EL ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
6560	26/05/2026 16:29		890405995	ING INGENIERIA SAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 625.069.999,00	2.3.7.06.02.202600000011689.2.45 99002.83321.306 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 306	$ 500.000.000,00	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 253 DE 2023, CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL COLISEO PERALTA INMUEBLE DECLARADO BIEN DE INTERES CULTURAL DEL AMBITO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
6560	26/05/2026 16:29		890405995	ING INGENIERIA SAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ -	2.3.7.06.02.202600000011689.2.45 99002.83321.501 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501	$ 125.069.999,00	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 253 DE 2023, CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL COLISEO PERALTA INMUEBLE DECLARADO BIEN DE INTERES CULTURAL DEL AMBITO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
6561	26/05/2026 16:29		900160387	CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 41.871.760,00	2.3.7.06.02.202600000011689.2.45 99002.83321.501 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501	$ 41.871.760,00	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 252 DE 2023, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL COLISEO PERALTA INMUEBLE DECLARADO BIEN DE INTERES CULTURAL DEL AMBITO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
6562	26/05/2026 16:37	2381	91498037	JAVIER ENRIQUE GARCIA LIZARAZO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 6.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2. 4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501	$ 6.000.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO 2381 DE 20263, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
6563	26/05/2026 16:37	2418	71763171	IVAN DARIO BERNAL VELEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 6.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2. 4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501	$ 6.000.000,00	ADICINAL NUMERO 1 AL CONTRATO 2418 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
6564	26/05/2026 16:38	2449	91528812	CRISTHIAN EDUARDO PARRA BARRIOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 8.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2. 4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501	$ 8.000.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO 2449 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
6592	27/05/2026 14:27		901728243	CONSORCIO MANGA 23	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 178.882.906,00	2.3.7.06.02.202600000011689.2.45 99002.53270.501 - INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 501	$ 178.882.906,00	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 183 DE 2023, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BORDE SUR LA VICTORIA EN EL BARRIO LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
6603	28/05/2026 9:54	390	13616548	RAUL FERNANDO FONTECHA PEÑA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 21.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2. 4599031.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 21.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Solicitó	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
6604	28/05/2026 10:35		804000152	COINOBRAS S.A.S.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 1.318.413.724,01	2.3.7.06.02.202600000011689.2.45 99002.53211.501 - CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 501	$ 1.318.413.724,01	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 387 DE 2022, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA “CENTRO CAMINABLE” EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER. VIGENCIA FUTURA ACUERDO NO. 037 DE 2022
6605	28/05/2026 10:36		901728026	CONSORCIO LA VICTORIA II	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 9.042.908.877,23	2.3.7.06.02.202600000011689.2.45 99002.53270.501 - INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 501	$ 8.542.908.877,23	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 184 DE 2023, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BORDE SUR LA VICTORIA EN EL BARRIO LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
6605	28/05/2026 10:36		901728026	CONSORCIO LA VICTORIA II	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ -	2.3.7.06.02.202600000011689.2.45 99002.91123.526 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 526	$ 500.000.000,00	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 184 DE 2023, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BORDE SUR LA VICTORIA EN EL BARRIO LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
6606	28/05/2026 10:36		901677404	CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 284.027.909,09	2.3.7.06.02.202600000011689.2.45 99002.54211.582 - SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 582	$ 284.027.909,09	PASIVOS EXIGIBLES CONTRATO NO. 28 DE 2023, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER - GRUPO 2
6607	28/05/2026 10:37		901606477	CONSORCIO MALLA INCAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 885.920.200,42	2.3.7.06.02.202600000011689.2.45 99002.53211.501 - CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 501	$ 885.920.200,42	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 163 DE 2022, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ENMARCADO DENTRO DE LA ESTRATEGIA PLAN REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO CENTRO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
6608	28/05/2026 10:38		98552707	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 233.615.929,75	2.3.7.06.02.202600000011689.2.45 99002.53129.501 - OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 501	$ 173.904.081,00	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 266 DE 2021, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. - GRUPO 2
6608	28/05/2026 10:38		98552707	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ -	2.3.7.06.02.202600000011689.2.45 99002.53129.521 - OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 521	$ 32.320.345,00	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 266 DE 2021, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. - GRUPO 2
6608	28/05/2026 10:38		98552707	CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ -	2.3.7.06.02.202600000011689.2.45 99002.53270.573 - INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 573	$ 27.391.503,75	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 266 DE 2021, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL "CASA GALÁN" DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. - GRUPO 2
6622	28/05/2026 17:10		901666847	CONSORCIO PLAZAS DE MERCADO CC	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 1.283.304.882,31	2.3.7.06.02.202600000011689.2.45 99002.53122.501 - EDIFICIOS COMERCIALES 501	$ 857.247.276,72	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 426 DE 2022, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN Y REFORMAS LOCATIVAS A LAS PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 1 - VIGENCIA FUTURA, ACUERDO NO. 037 DE 2022
6622	28/05/2026 17:10		901666847	CONSORCIO PLAZAS DE MERCADO CC	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ -	2.3.7.06.02.202600000011689.2.45 99002.53122.573 - EDIFICIOS COMERCIALES 573	$ 426.057.605,59	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 426 DE 2022, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN Y REFORMAS LOCATIVAS A LAS PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 1 - VIGENCIA FUTURA, ACUERDO NO. 037 DE 2022
6623	28/05/2026 17:10		804012755	SITELSA SAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 437.559.044,35	2.3.7.06.02.202600000011689.2.45 99002.53122.501 - EDIFICIOS COMERCIALES 501	$ 199.667.049,46	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 427 DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA A LA ADECUACION Y REFORMAS LOCATIVAS A LAS PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
6623	28/05/2026 17:10		804012755	SITELSA SAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ -	2.3.7.06.02.202600000011689.2.45 99002.53122.573 - EDIFICIOS COMERCIALES 573	$ 237.891.994,89	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 427 DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA A LA ADECUACION Y REFORMAS LOCATIVAS A LAS PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Solicitó	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
6624	28/05/2026 17:11		901280124	CONSORCIO OBRAS CICLORUTAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 1.237.977.012,23	2.3.7.06.02.2026000000011689.2.4599002.53211.501 - CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 501	$ 1.237.977.012,23	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 162 DE 2019, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN CICLO-INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - GRUPO 2 QUE COMPRENDE CORREDOR 5 OCCIDENTE, 8, 9, 10 Y 12.
6625	28/05/2026 17:12		901120358	7G7 S.A.S	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 1.555.076.975,50	2.3.7.06.02.2026000000011689.2.4599002.54270.501 - SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 501	$ 1.215.587.619,50	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 292 DE 2023, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN DEL PARQUE DIAMANTE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
6625	28/05/2026 17:12		901120358	7G7 S.A.S	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ -	2.3.7.06.02.2026000000011689.2.4599002.91123.526 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 526	$ 339.489.356,00	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 292 DE 2023, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN DEL PARQUE DIAMANTE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
6626	28/05/2026 17:12		901592671	DAROHE SAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 87.837.063,00	2.3.7.06.02.2026000000011689.2.4599002.54270.501 - SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 501	$ 87.837.063,00	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 311 DE 2023, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DEL PARQUE DIAMANTE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
6627	28/05/2026 17:13		1017130052	SEBASTIAN MONSALVE GOMEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 370.830.776,00	2.3.7.06.02.2026000000011689.2.4599002.83211.501 - SERVICIOS DE ASESORIA EN ARQUITECTURA 501	$ 370.830.776,00	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 316 DE 2019. CUYO OBJETO ES: DISEÑO ARQUITECTONICO ESTRUCTURAL E INGENIERIA COMPLEMENTARIA DEL PROYECTO UNIDAD HOSPITALARIA UIMIST EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
6628	28/05/2026 17:14		37746705	LUZ ANDREA TOVAR MORALES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 4.275.000,00	2.3.7.06.02.2026000000011689.2.4599002.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501	$ 4.275.000,00	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 1705 DE 2021, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES INHERENTES AL CUMPLIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES, ESPACIOS PUBLICOS Y ZONAS VERDES EN DESARROLLO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL DE LAS ZONAS VERDES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
6629	28/05/2026 17:14		91217203	NELSON LEONARDO LEZAMA SERRANO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 20.250.000,00	2.3.7.06.02.2026000000011689.2.4599002.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501	$ 20.250.000,00	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 3258 DE 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA APOYANDO LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE ELÉCTRICO DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
6679	29/05/2026 16:59	105	901941095	CONSORCIO ESPACIOS BGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 2.783.384.571,00	2.3.2.02.02.005.2024680010050.2.4002020.53211.588 - CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 588	$ 2.683.384.571,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 3 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 105 DEL 11 DE JUNIO DE 2025, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
6679	29/05/2026 16:59	105	901941095	CONSORCIO ESPACIOS BGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ -	2.3.2.02.02.005.2024680010050.2.4002020.53211.582 - CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 582	$ 100.000.000,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 3 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 105 DEL 11 DE JUNIO DE 2025, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
6680	29/05/2026 16:59	158	901964773	CONSORCIO INTER URBANISMO BGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 331.828.375,15	2.3.2.02.02.005.2024680010050.2.4002020.53211.588 - CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 588	$ 331.828.375,15	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 158 DEL 24 DE JULIO DE 2025, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
6717	2/06/2026 11:28	2593	37671172	NURIAN BIBIANA MUNEVAR PEREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 10.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501	$ 10.000.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO 2593 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Solicitó	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
6734	2/06/2026 14:26		804006674	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S A E S P	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 476.312.332,00	2.3.3.01.02.004.03.20250000003559 5.1.4003047.91123.215 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 476.312.332,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES MARZO DE 2026 SEGÚN FACTURA NO. ES 391 $ 476.312.332,00 VALOR TOTAL $ 476.825.752,00 - EMAB
6735	2/06/2026 14:27		804006674	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S A E S P	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 800.162.248,00	2.3.3.01.02.004.03.20250000003559 5.1.4003047.91123.332 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 800.162.248,00	VALOR APORTES SIN SITUACION DE FONDOS- SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES MARZO DE 2026 SEGÚN BALANCE Y CONTRIBUCIONES $ 800.162.248,00 VALOR TOTAL DE APORTES SSF $ 800.162.248,00 - EMAB
6741	2/06/2026 14:55	2706	13873449	MARLON MAURICIO CASTILLO VILLAMIZAR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 4.500.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2. 4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501	$ 4.500.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO 2706 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
6742	2/06/2026 15:50		890200162	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA AMB S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 343.904.641,00	2.3.3.01.02.004.01.20250000003559 5.1.4003047.91123.215 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 343.904.641,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL MES DE ENERO DE 2026 SEGUN FACTURA NO. 0006596 $ 343.904.641,00 TOTAL $ 343.904.641,00-ACUEDUCTO METROPOLITANO
6743	2/06/2026 15:51		890200162	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA AMB S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 1.097.001.898,00	2.3.3.01.02.004.01.20250000003559 5.1.4003047.91123.331 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 1.097.001.898,00	VALOR APORTES SIN SITUACION DE FONDOS- SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO DEL MES ENERO DE 2026 SEGÚN BALANCE Y CONTRIBUCIONES $ 1.097.001.898,00 VALOR TOTAL DE APORTES SSF $ 1.097.001.898,00 - ACUEDUCTO
6826	5/06/2026 8:06	196	901256066	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 391.948.179,00	2.3.2.02.02.005.202500000020181. 2.4002020.53270.201 - INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 201	$ 391.404.662,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO N° 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 194 DEL 28 DE AGOSTO DE 2025 CON OBJETO “INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BORDE SUR LA VICTORIA EN EL BARRIO LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”
6826	5/06/2026 8:06	196	901256066	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ -	2.3.2.02.02.005.202500000020181. 2.4002020.53270.201 - INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 201	$ 543.517,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO N° 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 194 DEL 28 DE AGOSTO DE 2025 CON OBJETO “INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BORDE SUR LA VICTORIA EN EL BARRIO LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”
6969	9/06/2026 14:06	105	900370262	JEM SUPPLIES SAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 793.138.267,00	2.3.2.02.02.006.202600000010465. 2.4002020.61165.501 - COMERCIO AL POR MAYOR EXCEPTO EL REALIZADO A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION O POR CONTRATA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MANUALES 501	$ 793.138.267,00	SUMINISTRO DE INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
6970	9/06/2026 15:20		900028989	LIMPIEZA URBANA S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 246.300.214,00	2.3.3.01.04.004.03.20250000003559 5.1.4003047.91123.332 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 246.300.214,00	VALOR APORTES SIN SITUACION DE FONDOS- SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES ENERO DE 2026 SEGÚN BALANCE Y CONTRIBUCIONES $ 81.521.228,00, MES DE FEBRERO DE 2026 SEGUN BALANCE Y CONTRIBUCIONES $ 80.180.402,00 Y MES DE MARZO DE 2026 SEGÚN BALANCE Y CONTRIBUCIONES $ 84.598.584,00 VALOR TOTAL DE APORTES SSF $ 246.300.214,00 - LIMPIEZA URBANA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Solicitó	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
6971	9/06/2026 15:21		900028989	LIMPIEZA URBANA S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 80.847.467,00	2.3.3.01.04.004.03.2025000000355 95.1.4003047.91123.215 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 80.847.467,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES DE ENERO DE 2026 SEGÚN FACTURA NO. FEVE-817 $ 25.214.966,00, MES DE FEBRERO DE 2026 SEGÚN FACTUAR NO. FEVE-818 $ 23.992.477,00 Y MARZO DE 2026 SEGÚN FACTURA NO. FEVE-819 $ 31.640.024,00 VALOR TOTAL $ 80.847.467,00 LIMPIEZA URBANA
7070	11/06/2026 14:04	1602	1098260587	KELLY JOHANNA PEÑA ROJAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LESPINOSABOHOR - LAURA PATRICIA ESPINOSA BOHORQUEZ	$ 32.800.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2. 2102069.83321.226 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 226	$ 32.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA FORMULACION,SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO Y DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
7163	12/06/2026 18:50	2665	1098758792	SARA ANGELICA MOYANO GOMEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 4.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2. 4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501	$ 4.000.000,00	ADICIONAL NÚMERO 1 AL CONTRATO 2665 DE 2026 , CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA PLANEACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE GESTION DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
7218	18/06/2026 14:33		804006674	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S A E S P	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 474.101.971,00	2.3.3.01.02.004.03.2025000000355 95.1.4003047.91123.215 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 474.101.971,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES ABRIL DE 2026 SEGÚN FACTURA NO. ES 392 $ 474.101.971,00 VALOR TOTAL $ 474.101.971,00 - EMAB
7219	18/06/2026 14:34		804006674	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S A E S P	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 812.166.840,00	2.3.3.01.02.004.03.2025000000355 95.1.4003047.91123.332 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 812.166.840,00	VALOR APORTES SIN SITUACION DE FONDOS- SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES ABRIL DE 2026 SEGÚN BALANCE Y CONTRIBUCIONES $ 812.166.840,00 VALOR TOTAL DE APORTES SSF $ 812.166.840,00 - EMAB
7240	19/06/2026 13:06	351	900948622	SUESCUN COMPANY S.A.S.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LESPINOSABOHOR - LAURA PATRICIA ESPINOSA BOHORQUEZ	$ 5.996.886,00	2.3.7.06.02.202600000011719.2.45 99002.3212801.526 - PAPEL BOND 526	$ 5.996.886,00	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
7241	19/06/2026 13:08	28	900192545	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL NOGAL PARTE SUR DE LA VEREDA VIJAGUAL CORREGIMIENTO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 47.354.830,00	2.3.2.02.02.005.202500000035592. 2.2402042.53211.588 - CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 588	$ 47.354.830,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONVENIO SOLIDARIO NO. 028 DEL 30 DE ENERO DE 2026, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL NOGAL PARTE SUR DE LA VEREDA VIJAGUAL, CORREGIMIENTO 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y ALCANTARILLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
7256	22/06/2026 11:03	1567	1099370458	ANDRES FERNNEY BARAJAS BARAJAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 7.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2. 4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501	$ 7.000.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 1567 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
7257	22/06/2026 11:15	1725	1095530313	BRAHIAN SNEYDER OSORIO JAIMES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 10.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2. 4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501	$ 4.500.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO 1725 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO FINANCIERO PARA APOYAR EL ÁREA DE BANCO DE PROYECTOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
7257	22/06/2026 11:15	1725	1095530313	BRAHIAN SNEYDER OSORIO JAIMES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ -	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2. 4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501	$ 5.500.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO 1725 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO FINANCIERO PARA APOYAR EL ÁREA DE BANCO DE PROYECTOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
7258	22/06/2026 11:41	1540	1095843472	YILBERT FABIAN QUIROGA PASTRANA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 6.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2. 4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501	$ 6.000.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO 1540 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Solicitó	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
7260	22/06/2026 15:35	1548	1005107055	DIEGO ANDRES VILLAMIZAR MARTINEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 6.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501	$ 6.000.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO 1548 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.
7261	22/06/2026 15:36	1486	1098609803	LEIDY JOHANA SANCHEZ ORDOÑEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 5.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83213.201 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 201	$ 5.000.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO 1486 DE 20263, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.
7335	24/06/2026 16:40		900293868	VEOLIA ASEO BUCARAMANGA S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 12.565.742,00	2.3.3.01.04.004.03.2025000000035595.1.4003047.91123.215 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 12.565.742,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES DE ENERO DE 2026 SEGÚN FACTURA NO. OPE213 $ 4.642.362,00 Y FEBRERO DE 2026 SEGÚN FACTURA NO. OPE214 $ 7.923.380,00 VALOR TOTAL $ 12.565.742,00 VEOLIA
7336	24/06/2026 16:41		900293868	VEOLIA ASEO BUCARAMANGA S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 116.450.688,00	2.3.3.01.04.004.03.2025000000035595.1.4003047.91123.332 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 116.450.688,00	VALOR APORTES SIN SITUACION DE FONDOS- SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES ENERO DE 2026 SEGÚN BALANCE Y CONTRIBUCIONES $ 54.373.874,00, MES DE FEBRERO DE 2026 SEGUN BALANCE Y CONTRIBUCIONES $ 62.076.814,00 VALOR TOTAL DE APORTES SSF $ 116.450.688,00 -VEOLIA
7477	26/06/2026 11:46		890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LESPINOSABOHOR - LAURA PATRICIA ESPINOSA BOHORQUEZ	$ 1.306.078.759,00	2.3.2.02.02.006.2024680010192.2.2102069.69112.226 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD POR CUENTA PROPIA 226	$ 1.306.078.759,00	ENERGIA - ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/05/2026-31/05 /2026 SEGÚN FACTURA 248821965 NUMERO DE CUENTA 1075933.
7478	26/06/2026 11:47		830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P BIC	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LESPINOSABOHOR - LAURA PATRICIA ESPINOSA BOHORQUEZ	$ 11.392.617,73	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.84120.226 - SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA ACCESO 226	$ 11.392.617,73	SERVICIO DE TELEFONIA CONSUMO DE BACKUP EN DISCO DS-02973567 CONSUMO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE MAYO 2026 CUENTA # 17 REFERENCIA # 181195417
7496	26/06/2026 15:05	1813	1098752709	CAMILO ANDRES RODRIGUEZ JAIMES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 12.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83213.201 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 201	$ 12.000.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 1813 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE EQUIPAMENTO URBANO EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
7502	26/06/2026 16:10	1833	13832172	JOSE CLEMENTE CORREA ALFONSO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENGOMEZ - ENELDA GOMEZ NIÑO	$ 6.600.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501	$ 6.600.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 1833 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ZONAS RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA

RELACION PERSONAL A 30 DE JUNIO DE 2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	1472	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OCTAVIO ANDRES	SANDOVAL GONZALEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO A LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 8.250.000,00	20/04/2026	23/04/2026	7/06/2026
2026	1486	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LEIDY JOHANA	SANCHEZ ORDOÑEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 5.000.000,00	19/06/2026	23/06/2026	22/07/2026
2026	1540	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	YILBERT FABIAN	QUIROGA PASTRANA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 6.000.000,00	19/06/2026	23/06/2026	22/08/2026
2026	1548	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIEGO ANDRES	VILLAMIZAR MARTINEZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 6.000.000,00	19/06/2026	24/06/2026	23/08/2026
2026	1567	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANDRES FERNNEY	BARAJAS BARAJAS	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 7.000.000,00	19/06/2026	24/06/2026	23/08/2026
2026	1725	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	BRAHIAN SNEYDER	OSORIO JAIMES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO FINANCIERO PARA APOYAR EL ÁREA DE BANCO DE PROYECTOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 10.000.000,00	18/06/2026	24/06/2026	23/08/2026
2026	1813	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CAMILO ANDRES	RODRIGUEZ JAIMES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE EQUIPAMENTO URBANO EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 12.000.000,00	19/06/2026	27/06/2026	26/08/2026
2026	1833	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE CLEMENTE	CORREA ALFONSO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ZONAS RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA	$ 6.600.000,00	19/06/2026	27/06/2026	26/08/2026
2026	1963	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANDRES MAURICIO	MANTILLA RIVERA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA	$ 8.000.000,00	21/05/2026	27/05/2026	26/07/2026
2026	2244	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	WILFER OMAR	VERA JAIMES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 9.000.000,00	21/05/2026	29/05/2026	28/07/2026
2026	2260	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OMAR GILBERTO	ABELLO RODRIGUEZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTUALES EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 3.000.000,00	20/05/2026	29/05/2026	28/06/2026
2026	2270	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CRISTIAN JAHIR	PORTILLA PITA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 6.000.000,00	9/04/2026	29/04/2026	13/06/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	2312	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SANDRA YENITH	RAMIREZ PEÑA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PETRÓLEOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 6.000.000,00	9/04/2026	29/04/2026	13/06/2026
2026	2314	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOLMAN	LOZANO PICO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 6.000.000,00	14/04/2026	30/04/2026	13/06/2026
2026	2338	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SERGIO AUGUSTO	HERNANDEZ MORENO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE DEFENSA JUDICIAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 6.000.000,00	9/04/2026	29/04/2026	13/06/2026
2026	2350	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	KATHERINE	MARTINEZ PAREJO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 8.000.000,00	20/05/2026	29/05/2026	28/07/2026
2026	2357	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA JOSE	ARENAS CACERES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE DEFENSA JUDICIAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 6.000.000,00	14/04/2026	30/04/2026	14/06/2026
2026	2381	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JAVIER ENRIQUE	GARCIA LIZARAZO	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 6.000.000,00	25/05/2026	30/05/2026	29/07/2026
2026	2392	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ALBA ROCIO	MORENO GAMBOA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTUALES EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 6.000.000,00	20/05/2026	30/05/2026	29/07/2026
2026	2405	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DANIEL EDICSON	GRAJALES AMADO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 6.000.000,00	9/04/2026	30/04/2026	13/06/2026
2026	2410	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LICET MARCELA	BOLIVAR SANDOVAL	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 6.000.000,00	9/04/2026	30/04/2026	14/06/2026
2026	2418	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	IVAN DARIO	BERNAL VELEZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 6.000.000,00	25/05/2026	30/05/2026	29/07/2026
2026	2437	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA PAULA	HERRERA NUÑEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 6.000.000,00	9/04/2026	30/04/2026	14/06/2026
2026	2449	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CRISTHIAN EDUARDO	PARRA BARRIOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 8.000.000,00	25/05/2026	30/05/2026	29/07/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	2452	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	YURY	BAYONA HERNANDEZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO COMO TECNÓLOGO EN CONTABILIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 6.000.000,00	27/04/2026	3/05/2026	17/06/2026
2026	2465	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIEGO FERNANDO	BECERRA RAMIREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 6.000.000,00	28/04/2026	3/05/2026	17/06/2026
2026	2469	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CHRISTIAN ARIEL	AMADO GAONA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 6.000.000,00	28/04/2026	3/05/2026	17/06/2026
2026	2477	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CAMILO ENRIQUE	DUEÑAS PUENTES	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 6.000.000,00	13/04/2026	30/04/2026	14/06/2026
2026	2494	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUPITA	LARA PEREZ	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 4.500.000,00	13/04/2026	30/04/2026	14/06/2026
2026	2495	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PAULA ANDREA	VILLAMIZAR ARCHILA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 5.250.000,00	13/04/2026	30/04/2026	14/06/2026
2026	2509	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANGEL OCTAVIO	SANDOVAL PINZON	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 6.000.000,00	27/04/2026	3/05/2026	17/06/2026
2026	2519	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CLAUDIA MILENA	PEDRAZA CACERES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 6.000.000,00	15/04/2026	30/04/2026	13/06/2026
2026	2555	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JORGE ELIECER	BLANCO VESGA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 6.000.000,00	28/04/2026	3/05/2026	17/06/2026
2026	2563	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	IVAN FRANCISCO	RAMIREZ GALVIS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRÓNICO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 6.000.000,00	27/04/2026	3/05/2026	17/06/2026
2026	2567	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	YESENIA	SUAREZ PATIÑO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRÓNICO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 6.000.000,00	27/04/2026	3/05/2026	17/06/2026
2026	2574	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PAULA LIZETH	SUAREZ GONZALEZ	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 4.500.000,00	27/04/2026	3/05/2026	17/06/2026
2026	2587	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUIS DUVAN	RODRIGUEZ DIAZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 6.750.000,00	28/04/2026	3/05/2026	17/06/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	2588	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LEONOR	SINUCO ROJAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 6.000.000,00	8/05/2026	10/05/2026	24/06/2026
2026	2593	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	NURIAN BIBIANA	MUNEVAR PEREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 10.000.000,00	1/06/2026	3/06/2026	2/08/2026
2026	2598	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PAOLA ANDREA	MORENO CEPEDA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS PARA LOS PROYECTOS Y CONVENIOS PARTICIPATIVOS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 6.000.000,00	27/04/2026	3/05/2026	17/06/2026
2026	2603	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CARMEN LUCIA	LOZANO JAUREGUI	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 6.000.000,00	27/04/2026	3/05/2026	17/06/2026
2026	2665	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SARA ANGELICA	MOYANO GOMEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA PLANEACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE GESTION DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 4.000.000,00	12/06/2026	13/06/2026	12/07/2026
2026	2671	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LETICIA	CASTELLANOS ZAMBRANO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 6.000.000,00	11/05/2026	13/05/2026	27/06/2026
2026	2706	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARLON MAURICIO	CASTILLO VILLAMIZAR	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 4.500.000,00	1/06/2026	3/06/2026	17/07/2026
2026	2750	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JORGE ENRIQUE	GONZALEZ FORERO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO, PARA APOYAR Y FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS JURÍDICOS, ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTUALES QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 6.000.000,00	11/05/2026	13/05/2026	27/06/2026
2026	2786	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LINDA KAREM	CHIA MACHUCA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO, PARA APOYAR Y FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS JURÍDICOS, ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTUALES QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 6.000.000,00	27/04/2026	3/05/2026	17/06/2026
2026	2788	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SMITH ALEJANDRA	PINTO PIMIENTO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 6.750.000,00	11/05/2026	13/05/2026	27/06/2026
2026	2803	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	NEL SEBASTIAN	OVIEDO MENDEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 4.500.000,00	9/04/2026	13/04/2026	12/05/2026
2026	2805	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	RICARDO ANDRES	ZARATE CABEZA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 6.750.000,00	11/05/2026	13/05/2026	27/06/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	2810	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CAMILA ANDREA	VEGA MONTAÑEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 6.000.000,00	11/05/2026	13/05/2026	27/06/2026
2026	2828	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	GERALDINE	MARTINEZ CORREDOR	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 4.500.000,00	27/04/2026	4/05/2026	18/06/2026
