

ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA

Informe de Gestión 2026

Tercer Trimestre

Secretaría de **Infraestructura**

www.bucaramanga.gov.co

Alcaldía de Bucaramanga

INFORME DE GESTION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

La Secretaría de Infraestructura de Bucaramanga presenta el informe de gestión correspondiente al tercer trimestre del año 2026, comprendido del 01 de julio de 2026 al 30 de septiembre de 2026, en el cual ha continuado ejecutando y realizando las gestiones pertinentes para la contratación, el control y avance de las diferentes obras que actualmente se encuentran en ejecución. Este documento tiene como objetivo proporcionar un resumen detallado de las actividades realizadas en el marco de las líneas estratégicas, programas y alineados con las metas del plan de desarrollo municipal para el periodo 2024-2027 y el nivel de cumplimiento presupuestal.

1. INFORME DE EJECUCION PRESUPESTAL

Para el tercer trimestre del año 2026 a la Secretaría le fue asignado un presupuesto definitivo por valor de $ 1.055.573.647.871,44, el cual ha venido ejecutándose con corte al 30 de septiembre de 2026 como se muestra a continuación:

DESCRIPCION	VALOR
PRESUPUESTO INICIAL	$ 352.595.437.734,00
ADICION (+)	$ 757.978.267.076,44
CREDITO (+)	$ 79.778.468.512,08
CONTRACREDITO (-)	$ 134.778.525.451,08
PRESUPUESTO DEFINITIVO (=)	**$ 1.055.573.647.871,44**

Discriminación porcentual del presupuesto de destinación especifica.

FUENTE DE FINANCIACION	PPTO DEFINITIVO	% RECURSOS A EJECUTAR
Recursos del Crédito 273	$ 538.611.485.946,00	51,03%
Tasas por derecho de parqueo (zonas ZER)	$ 5.356.761.899,00	0,51%
Recursos Valorización 230	$ 22.831.222.927,09	2,16%
SUB TOTAL No ejecutables	**$ 566.799.470.772,09**	**53,70%**
Recursos de pasivos exigibles	$ 31.248.005.427,07	2,96%
Recursos Presupuestos participativos 289 y 588	$ 63.759.845.054,72	6,04%
Recursos Subsidios – Fondo de Solidaridad 215	$ 52.002.872.943,79	4,93%
SUB TOTAL	**$ 147.010.723.425,58**	**13,93%**
SUB TOTAL Acciones de otras dependencias	**$ 713.810.194.197,67**	**67,62%**
Alumbrado Publico	$ 181.221.762.491,90	17,17%
Saldo para Inversión Infraestructura	***$ 160.541.691.181,87***	***15,21%***
SUB TOTAL	**$ 341.763.453.673,77**	**32,38%**
TOTAL	**$ 1.055.573.647.871,44**	**100,00%**

Compromisos Acumulados.

DESCRIPCION	VALOR
PRESUPUESTO DEFINITIVO (=)	**$ 1.055.573.647.871,44**
COMPROMISOS ACUMULADOS	$ 206.823.218.786,11
% EJECUCION	19,59%

Sin embargo, es preciso mencionar que la secretaria tiene en su presupuesto fuentes con destinación específica las cuales se relacionan así:

FUENTE DE FINANCIACION	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%
Recursos del Crédito 273	$ 538.611.485.946,00	$ 0,00	0,00%
Tasas por derecho de parqueo (zonas ZER)	$ 5.356.761.899,00	$ 0,00	0,00%
Recursos Valorización 230	$ 22.831.222.927,09	$ 0,00	0,00%
SUB TOTAL No ejecutables	**$ 566.799.470.772,09**	**$ 0,00**	**0,00%**
Recursos de pasivos exigibles	$ 31.248.005.427,07	$ 31.248.005.426,46	15,10%
Recursos Presupuestos participativos 289 y 588	$ 63.759.845.054,72	$ 20.553.831.159,15	10,00%
Recursos Subsidios – Fondo de Solidaridad 215	$ 52.002.872.943,79	$ 19.612.883.587,00	9,50%
SUB TOTAL	**$ 147.010.723.425,58**	**$ 71.414.720.172,61**	**34,60%**
SUB TOTAL	**$ 713.810.194.197,67**	**$ 71.414.720.172,61**	**34,60%**
Alumbrado Publico	$ 181.221.762.491,90	$ 31.853.256.150,16	15,40%
Saldo para Inversión Infraestructura	***$ 160.541.691.181,87***	***$ 103.555.242.463,34***	***50,00%***
SUB TOTAL	**$ 341.763.453.673,77**	**$ 135.408.498.613,50**	**65,40%**
TOTAL	**$ 1.055.573.647.871,44**	**$ 206.823.218.786,11**	**100,00%**

Nota: El % obedece a los compromisos por fuente de financiación / total compromisos acumulados

El presupuesto anterior, se divide en dos grandes bloques según el tipo de fuentes de financiación, sumando un total de compromisos por **$206.823.218.786,11**.

1. Fuentes con Destinación Específica
Este bloque cuenta con un presupuesto definitivo de **$713.810.194.197,67**, del cual se han comprometido **$71.414.720.172,61**. Está compuesto por:

- **Recursos del crédito:** Adicionados por el Decreto No. 0319 del 04/08/2026; actualmente se encuentran suspendidos por decisión judicial.
- **Presupuestos participativos:** Priorizados por la ciudadanía para obras locales y liderados por la Secretaría de Planeación Municipal, algunos de las iniciativas priorizados por la comunidad algunos no son viables (disponibilidad de servicios públicos, la tradición del inmueble los cuales no están en el inventario del Municipio, entre otros) que imposibilitan su ejecución y por parte de la Secretaria de Planeación se encuentran en trámite estos cambios para las nuevas priorizaciones.
- **Fondo de Solidaridad:** Destinados exclusivamente a subsidios para estratos 1, 2, 3 y pilas públicas y estos pagos se realizan según cobro de la Empresas Publicas al Municipio.
- **Recursos de valorización:** Restringidos únicamente para financiar las obras del par vial de la calle 54.
- **Pasivos exigibles:** Adicionados para el pago de obligaciones de contratos en ejecución, terminación o liquidación de la vigencia actual.
- **Fuentes Generales y de Libre Destinación.**
- Este bloque cuenta con un presupuesto definitivo de **$341.763.453.673,77**, del cual se han comprometido **$135.408.498.613,50**.
- Dentro de este presupuesto definitivo, un total de **$160.541.691.181,87** corresponden a recursos de **libre destinación**.

A continuación, se detalla el valor disponible a 30 de septiembre de 2026

FUENTE DE FINANCIACION	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	% COMPROMETIDO	DISPONIBLE
Alumbrado Publico	$ 181.221.762.491,90	$ 31.853.256.150,16	18%	$ 149.368.506.341,74
Saldo para Inversión Infraestructura	$ 160.541.691.181,87	$ 103.555.242.463,34	65%	$ 56.986.448.718,53

El valor de los compromisos aumentaran, toda vez que existen proyectos adjudicados y que con corte al 30 de septiembre se encuentran en tramites de legalizacion, asi mismo proyectos en proceso de contratacion detallados asi:

- **Procesos adjudicados y en tramite de legalizacion**

1. Interventoria integral para el mantenimiento rutinario de puentes peatonales y vehiculares en el municipio de Bucaramanga, Santander ($ 350.296.874,00)
2. Interventoria integral para la obra publica de adecuación de elementos constitutivos y complementarios del espacio público del municipio de Bucaramanga Santander ($ 1.652.708.767,00)
3. Adecuación de elementos constitutivos y complementarios del espacio público del municipio de Bucaramanga Santander ($ 10.846.516.886)
4. Interventoría integral para la implementación de la estrategia de reverdecimiento integral, recuperación e instauración de componentes verdes, mobiliario e infraestructura de espacio público, para mejoramiento del entorno público y la seguridad en sectores de las comunas 6 y 12 en el sector de la puerta del sol del municipio de Bucaramanga. ($ 540.280.520,50)
5. Implementación de la estrategia de reverdecimiento integral, recuperación e instauración de componentes verdes, mobiliario e infraestructura de espacio público, para mejoramiento del entorno público y la seguridad en sectores de las comunas 6 y 12 en el sector de la puerta del sol del municipio de Bucaramanga. ($ 9.379.559.857,00)

- **En proceso de contratacion**

1. Implementación de la estrategia de reverdecimiento integral, recuperación e instauración de componentes verdes, mobiliario e infraestructura de espacio público, para mejoramiento del entorno público y la seguridad en sectores de las comunas 9 y 10 en el sector de provenza del municipio de Bucaramanga. ($ 6.371.088.075,50)
2. Interventoría integral para la implementación de la estrategia de reverdecimiento integral, recuperación e instauración de componentes verdes, mobiliario e infraestructura de espacio público, para mejoramiento del entorno público y la seguridad en sectores de las comunas 9 y 10 en el sector de provenza del municipio de Bucaramanga. ($ 385.914.657,50)
3. Mantenimiento y manejo integral arbóreo de zonas verdes en el municipio de Bucaramanga, Santander. ($ 820.125.569,00)
4. Construcción del salón comunal vijagual corregimiento no.1 del municipio de Bucaramanga, Santander. ($ 1.338.504.567,00)
5. Alquiler de vehiculos tipo camioneta para el transporte en actividades que se desarrollen para la supervision de los convenios solidarios suscritos por el municipio de Bucaramanga. ($ 154.438.200,00)
6. Realizar los estudios de exploración geotécnica y ensayos de laboratorio para los proyectos en estructuración del municipio de Bucaramanga, Santander. ($ 135.248.818,12)

A continuación, se detalla la inversión por las diferentes líneas estratégicas, sector, programas, metas e indicadores del Plan de Desarrollo:

2. LINEA ESTRATEGICA 2. TERRITORIO SEGURO QUE PROGRESA

SECTOR: Transporte

PROGRAMA: Infraestructura red vial regional

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario

Indicador	Meta 2026	Logro 2026	% Avance 2026	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	40	13	33%	$ 56.816.821.098	$ 30.188.387.947	53%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	202500000036174	$30.188.387.946,00	$30.188.387.946,00

Descripción de actividades desarrolladas

CONTRATO DE OBRA 085 DEL 14 DE MAYO DE 2026 (SI-SI-LP-001-2026) CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAS BGA “MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER”.

Valor del contrato: **$ 27.860.356.158,00**
Valor Anticipo: N/A
Plazo inicial: **SEIS (06) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE**

SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, EN TODO CASO ATENDIENDO LA FORMA DE PAGO DISPUESTA Y HASTA AGOTAR EL COMPORMISO PRESUPUESTAL, SIN SOBREPASAR EL 31/12/2025
Prorroga no.1 Cuarenta y dos (42) días calendario
Plazo total: **SIETE (7) MESES Y DOCE (12) CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO** HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SIN QUE SOBREPASE EN TODO CASO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
Fecha de inicio: 20/05/2026
Fecha de terminación inicial: 19/11/2026
Fecha de terminación: 31/12/2026
Estado del Contrato: En Ejecución
Porcentaje avance: 80.65%

Ubicación: El proyecto se desarrolla en todas las comunas del Municipio de Bucaramanga.

Impacto: Comprende la ejecución de trabajos de mejoramiento y mantenimiento en las vías urbanas de Bucaramanga, mediante obras de bacheo y rehabilitación, en pavimento rígido o flexible buscando así la realizar actividades que mejoran la circulación vial y disminuyen el riesgo de accidentes.

Igualmente, la construcción de reductores de velocidad en diferentes puntos críticos de la ciudad avalados por la Dirección de tránsito de Bucaramanga – DTB, mediante diferentes resoluciones emitidas en el año 2025.

1.COMUNA 1 - NORTE
2.COMUNA 2 - NORORIENTAL

3.COMUNA 3 - SAN FRANCISCO
4.COMUNA 4 - OCCIDENTAL
5.COMUNA 5 - GARCÍA ROVIRA
6.COMUNA 6 - LA CONCORDIA
7.COMUNA 7 - CIUDADELA
8.COMUNA 8 - SUR OCCIDENTE
9.COMUNA 9 - LA PEDREGOSA
10.COMUNA 10 - PROVENZA
11.COMUNA 11 - SUR
12.COMUNA 12 - CABECERA DEL LLANO
13.COMUNA 13 - ORIENTAL
14.COMUNA 14 - MORRORICO
15.COMUNA 15 - CENTRO
16.COMUNA 16 - LAGOS DEL CACIQUE
17.COMUNA 17 - MUTIS

Este proyecto contribuye al mejoramiento del flujo vehicular en la ciudad, y la diminución de accidentes por ende el mejoramiento en los índices de seguridad vial.

Beneficios para la Comunidad:

- **Mejoramiento en el flujo vehicular:** Al contar con vías en buen estado mejora la circulación de los vehículos y los tiempos de circulación.
- **Menor Impacto a daños:** Se disminuye el riesgo de accidentes y daños en el parte automotor y sus componentes mecánicos.
- **Aumento de la Seguridad vial:** Se tiende a baja en la tasa de mortalidad por accidentes y el mejoramiento de las condiciones de los actores viales



Reductor de velocidad – Sector Transversal Oriental


Avenida la Rosita entre carrera 25 y 27 – Comuna 13



Carrera 35 entre Calle 37 y 36 – Comuna 12

Se han realizado trabajos de mantenimiento y rehabilitación de la malla vial en diferentes comunas y barrios de la ciudad enfocados en el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo – Vía urbana mejorada, con un avance de 13.2 km hasta el momento.

El contrato cuenta con 2 fases de ejecución, las cuales contemplan una primera en vías principales del municipio, la cual se está ejecutando desde el mes de junio y la segunda, en donde se vienen realizado intervenciones en vías secundarias y en los barrios del municipio mediante recursos adicionados de presupuestos participativos.

TRAMOS INTERVENIDOS
Carrera 19 entre calles 20 y 21
Carrera 28 entre calles 55 y 55A
Avenida González Valencia entre calles 55 y 55A
Avenida González Valencia entre calles 56 y 58
Avenida González Valencia entre calles 58 y 59
Avenida González Valencia entre calles 59 y 62
Calle 36 con calle 16 - Intervención 1
Calle 36 con calle 16 - Intervención 2
Calle 36 con calle 16 - Intervención 3
Calle 36 con calle 17 - Intervención 1
Calle 36 con calle 17 - Intervención 2
Calle 36 con calle 17 - Intervención 3
Calle 36 con carrera 18 - Intervención 1
Calle 36 con carrera 18 - Intervención 2
Calle 36 con carrera 18 - Intervención 3
Calle 36 entre carrera 13 y 14 - Intervención 1
Calle 36 entre carrera 13 y 14 - Intervención 2
Calle 36 entre carrera 15 y 16 - Intervención 1
Calle 36 entre carrera 15 y 16 - Intervención 2
Calle 36 entre carrera 15 y 16 - Intervención 3
Calle 36 entre carrera 15 y 16 - Intervención 4
Calle 36 entre carrera 15 y 16 - Intervención 5
Calle 36 entre carrera 18 y 19 - Intervención 1
Calle 36 entre carrera 18 y 19 - Intervención 2
Calle 36 entre carrera 18 y 19 - Intervención 3
Carrera 33 sobre colegio La Merced
Calle 103A #06-16 (CC El Único) - Intervención 1
Calle 103A #06-16 (CC El Único) - Intervención 2
Calle 103A #06-16 (CC El Único) - Intervención 3
Calle 103A #06-16 (CC El Único) - Intervención 4
Calle 37 entre 18 y 19 - Intervención 1
Calle 37 entre 18 y 19 - Intervención 2
Calle 37 entre 18 y 19 - Intervención 3
Calle 37 entre 18 y 19 - Intervención 4
Calle 37 entre 18 y 19 - Intervención 5
Calle 37 entre 18 y 19 - Intervención 6
Calle 37 entre 18 y 19 - Intervención 7
Calle 51 entre carreras 33 y 32
carrera 17 entre calle 16 y calle 15
carrera 17 entre calle 18 y calle 17
carrera 17 entre bulevar Santander y calle 19
carrera 17 entre calle 19 y 18 reparcheo
Carrera 24 entre calles 83 y 88
Carrera 31 entre Avenida González Valencia y calle 52
Diagonal 31 entre Avenida González Valencia y calle 52
Avenida González Valencia entre calles 28 y 29
Avenida González Valencia entre calles 52 Y 54

Avenida González Valencia entre calles 48 y 49
Avenida La Rosita entre carreras 25 y 27 (Occ-Ori)
Avenida La Rosita entre carreras 28 y 28A (Occ-Ori)
Calle 103 #06-141 - Intervención 1
Calle 103 #06-141 - Intervención 2
Calle 103A #06-16 (CC El Único) - Intervención 10
Calle 103A #06-16 (CC El Único) - Intervención 11
Calle 103A #06-16 (CC El Único) - Intervención 12
Calle 103A #06-16 (CC El Único) - Intervención 13
Calle 103A #06-16 (CC El Único) - Intervención 14
Calle 103A #06-16 (CC El Único) - Intervención 15
Calle 103A #06-16 (CC El Único) - Intervención 5
Calle 103A #06-16 (CC El Único) - Intervención 7
Calle 103A #06-16 (CC El Único) - Intervención 8
Calle 103A #06-16 (CC El Único) - Intervención 9
Calle 85 entre carreras 24A y 25
Calle 89 entre carreras 24 y 25
Calle 91 entre carreras 25 y 26
Carrera 26 entre calles 91 y 89
Carrera 39A #41-80
Avenida La Rosita entre calle 45 y carrera 22 (Ori-Occ)
Avenida La Rosita entre carrera 19 y 18 (Ori-Occ) Tramo 1
Avenida La Rosita entre carrera 25 y 24 (Ori-Occ)
Avenida La Rosita entre carrera 27 y 25 (Ori-Occ)
Avenida La Rosita entre carrera 27 y 28 (Ori-Occ)
Calle 103 #05-09 - Intervención 1
Calle 103 #06-09 - Intervención 1
Calle 36 entre carreras 32 y 33 (Occ-Ori)
Calle 42 entre carrera 37 y 38
Calle 45 # 4W-05 - Intervención 1
Calle 45 # 4W-30 - Intervención 1
Calle 45 # 4W-30 - Intervención 2
Calle 45 # 5W-05 - Intervención 1
Calle 45 # 5W-35 - Intervención 2
Calle 45 # 5W-40- Intervención 1
Calle 45 # 5W-69- Intervención 1
Calle 45 # 5W-75- Intervención 1
Calle 45 # 6W-05 - Intervención 1
Calle 89 entre carreras 24 y 23
Carrera 24a con calle 102
Calle 104 entre carreras 24 y 25
Avenida 105 salida a autopista Floridablanca
Paralela Provenza sentido norte-sur debajo del puente
Paralela Provenza sentido norte-sur frente a jarris
Calle 36 entre carreras 31 y 29 (Occ-Ori)
Calle 36 entre carreras 33 y 32 (Ori-Occ)
Calle 36 entre carreras 31 y 28 (Ori - Occ)
Carrera 27 entre calle 55 a y 54
Carrera 18 entre calles 34 y 35 - Intervención 1
Carrera 18 entre calles 34 y 35 - Intervención 2
Carrera 18 entre calles 34 y 35 - Intervención 3
Carrera 20 #36
Carrera 20#34-01
Carrera 20#36-110
Carrera 20#36-72 - Intervención 1
Carrera 20#36-72 - Intervención 2

Carrera 20 #38
Carrera 20 #36-01
Calle 67#10e-77 - Intervención 1
Calle 67#10e-67 - Intervención 2
Calle 67#10e61
Calle 67#10e-53
Calle 67 #10e-45
Calle 67#10e-37
Calle 67 #110e-27
Cra 10e # 67 esquina
Carrera 10e #67 esquina
Carrera 10d #67-07
Carrera 10e #67-12
Carrera 10e#67-30 - Intervención 1
Carrera 10e#67-30 - Intervención 2
Carrera 10e#67-30 - Intervención 3
Calle 67#10d-04 - Intervención 1
Calle 67 #10d-04 - Intervención 2
Carrera 10#68-08
Carrera 10e 368-08 - Intervención 1
Carrera 10e 368-08 - Intervención 2
Carrera 10e #67-58
Calle 11 #67-51
Calle 11 # 67 entrada del CAI - Intervención 1
Calle 11 # 67 entrada del CAI - Intervención 2
carrera 27 entre calle 54 y 53
Carrera 27 entre calle 52 y carrera 29
cra 19 entre calles 33 y 34 Intervención 1
cra 19 entre calles 33 y 34 Intervención 2
cra 18 entre 33 y 34 Intervención 1
cra 18 entre 33 y 34 Intervención 2
cra 16 entre 33 y 34 Intervención 1
cra 16 entre 33 y 34 Intervención 2
cra 16 entre 33 y 34 Intervención 3
cra 16 entre 33 y 34 Intervención 4
calle 34 entre carreras 16 y 17
cra 35 #35-30 Intervención 1
cra 35 #35-30 Intervención 2
cra 35 #34-61
Cra 35 #34-43
Cra 35 # 34-17
Cra 35 #35-41
Cra 35 # 35-47
Cra 35 #42-17 Intervención 1
Cra 35 #42-17 intervención 2
cra 35 #41-35 Intervención 1
cra 35 #41-35 Intervención 2
Cra 35 # 41-24
Cra 35 #41-73
Cra 35 #41-85
Calle 36 entre carreras 29 y 28 (Occ - Ori)
Calle 36 entre carreras 26 y 25 (Ori - Occ)
Calle 36 entre carreras 26 y 25 (Occ - Ori)
Paralela puente Provenza sentido sur - norte
Calle 45 entre carreras 21-22 (Occ - Ori)
Calle 45 con carrera 22 (intersección)

Calle 45 entre carreras 16-17 (Occ - Ori)
Carrera 9 entre calles 42-41 (Norte - Sur) Tramo 1
Carrera 9 entre calles 34-35 (Sur - Norte)
Carrera 9 con quebrada seca carril 1
Carrera 25 con avenida 102 Carril 2
Calle 104 entre carreras 26A - 26
Carrera 27 entre AV Gonzales Valencia y Calle 53
Carrera 28 entre AV Gonzales Valencia y Calle 51
Carrera 27 entre calles 42 y 45 Carril 1
Pedregosa acceso D1
Pedregosa acceso conjunto portal vivero
pedregosa acceso a bomba terpel
pedregosa salida a bomba terpel
pedregosa flexible
Pedregosa
cra 16 entre 33 y 34
cra 14 entre calles 33 y 34
cra 13 entre calles 33 y 34
cra 13 entre calles 33 y 34 sendero 2
calle 51 entre cras 22 y 23
calle 52 entre cras 22 y 23
calle 34 entre cra 15 y 14
cra 35 frente al parque san pio
CRA 35 ENTRE CALLES 51 Y 52
CRA 35A #51-100
CRA 35 CON CALLE 49
Carrera 35 con calle 49
Carrera 35A #49 Intervención 2
Carrera 35A Entre calles 51 Y 52
Carrera 35A #48-131
Calle 45 #35
Carrera 23 #33-65
Carrera 23 #31-32
Carrera 23 #33-98
Carrera 23 #35-75
Carrera 23 entre calles 31 y 32
Carrera 35 entre calles 41 y 42 intervención 1
Carrera 35 entre calles 41 y 42 intervención 2
Cra 39 # 42 intervención 1
Cra 39 # 42 intervención 2
Cra 39 # 42 intervención 3
Cra 39 # 42 intervención 4
Cra 39 # 42 intervención 5
Cra 39 # 42 intervención 6
Cra 39 # 44 - 72
Cra 35 # 44 -36
Cra 35 entre 46 y 47
Calle 99 # 18 - 05
Calle 99 # 18 - 06
Calle 99 # 18 - 07
Calle 99 # 18 - 08
Calle 102#19-62
Calle 102#19-26
Carrera 9 con quebradaseca carril 2
Carrera 9 con Quebradaseca Rotonda
Carrera 27 entre calles 42 y 45 carril central

Carrera 27 entre calles 42 y 45 carril 3
Carrera 27 entre calle 41 y AV La Rosita
Calle 42 con carrera 27
Diamante 2
Calle 46 y 47 entre cra 10w y 9w, Campo Hermoso
Av. González Valencia con Calle 55B
Av. González Valencia con Calle 59
Cra 27 con Calle 55A
Av. Quebradaseca entre carreras 9-12
Calle 33 entre carreras 9-11
Calle 33 entre carreras 11-12
Calle 33 entre carreras 12-13
Carrera 35 entre calles 34-52
Carrera 35 entre calles 34-35
Carrera 35 entre calles 35-36
Carrera 35 entre calles 36-37
Carrera 35 entre calles 38-41
Carrera 35 entre calles 41-42
Carrera 35 entre calles 42-43
Carrera 35 entre calles 44-45
Carrera 35 entre calles 45-48
Carrera 35 entre calles 48-51
Carrera 35 entre calles 51-52
Carrera 26 entre calles 41-40A
Calle 41 entre carreras 26-25
Calle 41 entre carreras 28-29
Intersección calle 41 con cra 28 tramo 1
Intersección calle 41 con cra 28 tramo 2
Carrera 39# 51 - 47
Carrera 39# 51 -31
Carrera 35 # 36 - 42
Carrera 39 # 48 -111
Carrera 39 # 41 -70
Carrera 39 # 41 -09
Carrera 40 # 42 - 06
Carrera 40 # 42 - 69
Carrera 40 # 45A
Calle 102 con carrera 21 esquina
Carrera 19 entre calles 102 y 103
calle 103 # 19 toda
calle 103 # 19 rotonda
Plan de manejo de trafico
Cra 23 entre calles 31 y 33
Plaza guarín intervención 1
Plaza guarín intervención 2
Plaza guarín intervención 3
Cra 33A # 32 - 160
Cra 33 # 32 - 76
Cra 33 # 33 - 79
Calle 33 # 33 esquina
Carrera 40 # 41 intervención 1
Carrera 40 # 41 intervención 2
Carrera 40 # 42 - 47
Carrera 40 # 42 - 80
Carrera 21 A con calle 109
Calle 111 # 22 - 36

Calle 111 # 22 - 27
Carrera 22 A # 111 esquina
Calle 33 entre cras 13-14
Carrera 11 entre calles 31-32 tramo 1
Carrera 11 entre calles 31-32 tramo 2
Carrera 11 entre Av. Quebradaseca y calle 31
Avenida Búcaros frente conjunto Marsella
Calle 41 entre carreras 28-27
Carrera 27A entre calle 41 y Av. la Rosita
Carrera 32 entre calles 47 -48 (CAI)
Carrera 27 entre calles 55-55A Norte - Sur
Avenida Búcaros frente conjunto Marsella tramo2
Avenida Búcaros frente patinodromo
Avenida perimetral Mutis Tramo1
Calle 55 entre carreras 21-22
Calle 54 entre carreras 21-22
campo hermoso CAI de la policía
Cra 15 # 11
cra 15 # 10
Cra 33 # 63d-62 intervención 1
Cra 33 # 63d-62 intervención 2
Cra 33 # 63d-62 intervención 3
Cra 33 # 63d-62 intervención 4
Diagonal 105 # 27 - 39 intervención 1
Diagonal 105 # 27 - 39 intervención 2
Diagonal 105 # 27 - 39 intervención 3
Diagonal 105 # 27 - 39 intervención 4
Calle 105 # 21C - 110 intervención 1
Calle 111 # 22a - 158
Calle 105 # 21C - 110 intervención 2
Calle 105 # 22 - 10 intervención 1
Calle 105 # 22 - 18
Rotonda de la calle 105 con el colegio INEM intervención 1
Rotonda de la calle 105 con el colegio INEM intervención 2
Rotonda de la calle 105 con el colegio INEM intervención 3
Avenida perimetral Mutis Tramo 2
Calle 44 entre cras 35 y 36 intervención 2
Calle 44 entre cras 35 y 36 intervención 3
Calle 44 entre cras 35 y 36 intervención 4
Calle 45 entre cras 35 y 34
Calle 44 entre cras 33 y 34 intervención 1
Calle 44 entre cras 33 y 34 intervención 2
Calle 44 entre cras 33 y 34 intervención 3
Calle 44 entre cras 33 y 34 intervención 4
Calle 44 entre cras 33 y 34 intervención 5
Calle 32 entre cras 14 y 15
Carrera 11 # 23
Carrera 12 entre calles 32 y 33
Calle 33 entre carreras 14 y 15
Calle 31 entre cras 14 y 15 intervención 1
Calle 31 entre cras 14 y 15 intervención 2
Carrera 21 # 39 -51
Avenida la rosita frente a estación de gas de la cra 21
Carrera 22 entre calles 35 y 36 intervención 1
Carrera 22 entre calles 35 y 36 intervención 2
Carrera 22 entre calles 36 y 37 intervención 1

Carrera 7 entre calle 42 y 45 Alfonso López
Bahía del éxito de la cra 35 intervención 4
Bahía del éxito de la cra 35 intervención 5
Bahía del éxito de la cra 35 intervención 6
Rotonda de las mejores publicas intervención 1
Rotonda de las mejores publicas intervención 2
Rotonda de las mejores publicas intervención 3
Rotonda de las mejores publicas intervención 4
Rotonda de las mejores publicas intervención 5
Rotonda de las mejores publicas intervención 6
Cra 32 entre calles 36 y 39 intervención 1
Cra 32 entre calles 36 y 39 intervención 2
Cra 32 entre calles 36 y 39 intervención 3
Rotonda de las mejores publicas intervención 7
Rotonda de las mejores publicas intervención 8
Cra 32 entre calles 36 y 39 intervención 4
Cra 32 entre calles 36 y 39 intervención 5
Cra 32 entre calles 36 y 39 intervención 6
Cra 22 entre calles 36 y 37
Cra 22 # 41 esquina
Avenida la rosita con cra 21
Cra 21 con calle 41
Cra 22 entre calles 36 y 37 intervención 2
Cra 22 con calle 30
Cra 22 entre calles 31 y 30
Cra 22 con calle 33 esquina
Cra 21 con calle 45
Cra 22 entre calles 31 y 33
Cra 22 frente al parque el san Pio
Cra 15 con calle 61 Norte - Sur
Cra 15 autopista Sur - Norte Tramo 1
Cra 15 autopista Sur - Norte Tramo 2
Cra 15 autopista Sur - Norte Tramo 3
Cra 15 autopista Sur - Norte Tramo 4
Rotonda de plaza mayor (pasaje los búcaros Este)
Conjunto residencial Metrópolis II Cra 8 #61-53
Diagonal 14 # 58-57 intervención 1
Diagonal 14 # 58-57 intervención 2
Cra 15 # 56 esquina
Av. calle 57 # 16 esquina
Cra 8 #61-61
Conjunto residencial Metrópolis III Cra 8 #61-175
El recrear (mutis)
El recrear
Carrera 2 #58
Calle 30 con carrera 30
Calle 30 con carrera 28
Calle 30 con carrera 29
Cra 38A # 48A
cra 33 con calle 45 Sotomayor
carrera 27 entre calle 55a y av. González Val.
carrera 27 con calle 55a
carrera 17 con calle 18
Cra 15 autopista Sur - Norte con carrera 21
Carrera 35 entre 52-53 pepe ganga
Carrera 27 entre calles 56 - 60 Tramo 1

Carrera 27 entre calles 56 - 60 Tramo 2
Carrera 31 con calles 52
Carrera 31 con calles 53
Avenida Gonzales valencia con calle 62
Av. perimetral mutis tramo 1
Diagonal 31 con calle 52
Calle 51 con Carrera 32
Av. la Rosita entre cra 28-29
Calle 36 entre carrera 32-33
Calle 36 entre carrera 28-29
Calle 36 entre carrera 24-26
Carrera 9 entre calle 34-35
Calle 33 entre carrera 10-11
Calle 33 entre carrera 11-12
Calle 33 entre carrera 12-13
Calle 33 entre carrera 13-14
Cra 16 hasta glorieta a calle 31
Carrera 11 entre calle 31-32
Av. Quedradaseca entre Cra 11 y 12
Glorieta Av. Quebradaseca
Cra 9 con Cl 30 Glorieta
Carrera 11 con av. quebradaseca
Carrera 9 con rotonda Girardot
Av. quebradaseca con carrera 11
Av. quebradaseca entre cra 11-12
Cl 36 entre Cra 33 y 32
Cl 52 con Av. González Valencia
Cra 24 con Av. González Valencia
Cl 45 con Cra 22
Cl 45 con Cra 17
Cra 9 con Cl 42
Cl 51 con Cra 33
Carrera 35 entre calles 45-48 Bahía
Transversal oriental ambos sentidos
Carrera 15 con calle 61 norte - sur
Cra 24 con calle 37 intervención 1
Cra 24 con calle 37 intervención 2
Cra 24 # 39Intervención 1
Cra 24 # 39Intervención 2
Cra 58 # 16 - 36
Calle 82 # 62
Cra 58 # 16 - Intervención 2
Calle 67 # 27 Intervención 1
Calle 67 # 27 Intervención 2
Calle 67 A # 28
Cra 27A # 67 esquina
Calle 67 A #28 intervención 1
Calle 67 A #28 intervención 2
Calle 67 A #28 intervención 3
Calle 67 A #27 intervención 1
Calle 67 A #27 intervención 2
Calle 69 # 27 intervención 2
Calle 20 # 19 Intervención 1
Cra 22 # 21 intervención 1
Cra 22 # 21 intervención 2
Cra 22 # 21 intervención 3

Cra 22 # 21 intervención 4
Cra 23 # 33
Cra 24 # 33 intervención 1
Cra 24 # 33 intervención 2
Cra 24 # 21 intervención 1
Cra 24 # 21 intervención 2
Carrera 22 # 28 - 50
Carrera 22 # 24
pmt
Calle 67A # 27 intervención 3
Calle 69 # 27 intervención 1
Calle 62 # 3.0 cc intervención 1
Calle 62 # 3.0 cc intervención 2
Carrera 8W # 60 -20
Carrera 8 occ # 56
Carrera 7 occ con calle 60 intervención 1
Carrera 7 occ con calle 60 intervención 2
Carrera 7 occ con calle 60 intervención 3
Carrera 7 occ con calle 60 intervención 4
Calle 61 # 7 occ intervención 1
Calle 61 # 7 occ intervención 2
Carrera 23 # 20 intervención 1
Carrera 23 # 20 intervención 2
Carrera 23 # 18
Carrera 23 # 20
Carrera 23 con bulevar bolívar intervención 1
Carrera 23 con bulevar bolívar intervención 2
Antonia Santos - Calle 31 entre carrera 22 y 21
Carrera 33 con 68 vía antigua a florida
Carrera19 entre calles 36-37
Carrera 19 entre calles 37-38
Transversal oriental ambos sentidos resaltos
Transversal oriental ambos sentidos cebras
Transversal oriental ambos sentidos aviso resalto
Transversal oriental ambos sentidos señales verticales
barrio Provenza
cra 27 con calle 41
cra 27 con calle 45
Sotomayor - calle 41 entre 27 y 29
Sotomayor - cra 28A entre cll 41 y la av. rosita
cra 26 entre calle 41 y 40A
Calle 41 entre cra 25 y cra 26
Carrera 19 de avenida quebradaseca a calle 24
Lagos del cacique detrás del colegio el rosario
Lagos del cacique detrás del colegio el rosario vigas
Lagos del cacique detrás del colegio el rosario cuerpo
Lagos del cacique detrás del colegio el rosario parabólico
Lagos del cacique detrás del colegio el rosario resalto
Lagos del cacique detrás del colegio el rosario cebras
Puente conucos
Carrera 19 cámara de comercio
Carrera 19 fiscalía
calle 20 entre cras 20 y 21
Carrera 23 con bulevar
Carrera 23 con calle 15
Carrera 23 con 17

Carrera 23 # 20
Carrera 23 # 14
Cra 24 # 9 intervención 1
Cra 24 # 9 intervención 2
Cra 24 # 9 intervención 3
Cra 24 # 9 intervención 4
Cra 24 # 9 intervención 5
Cra 24 # 9 intervención 6
Cra 24 # 10 intervención 1
Cra 24 # 10 intervención 2
Cra 24 # 10 intervención 3
Cra 24 # 12
Carrera 24 # 10 - 48 intervención 1
Carrera 24 # 10 - 48 intervención 2
Carrera 19 # 13 intervención 1
Carrera 19 # 13 intervención 2
Carrera 19 # 13 intervención 3
Carrera 19 #13 esquina
Carrera 19 # 12 intervención 1
Carrera 19 # 12 intervención 2
Carrera 19 # 12 intervención 3
Carrera 19 #13 intervención 4
Carrera 19 # 14
Carrera 29 # 41
Carrera 29 #42 intervención 1
Carrera 29 # 42 intervención 2
Carrera 26 entre calles 45 y 48
Carrera 24 # 28
Carrera22 # 46 A - 21
Carrera 22 # 50 -esquina
Carrera 22 # 49 - 23
CAI Sotomayor
carrera 27 con av. González valencia
carrera 27 con calle 54
Urbanización Porto Fino tramo 3
Urbanización Porto Fino tramo 3
Brisas del Mutis - Calle 60a bis entre cras 11w y 13w
Brisas del Mutis - Calle 60a bis entre cras 11w y 13w
Brisas del Mutis - Cra 12w entre calles 60bis y 60A
Brisas del Mutis - Cra 12w entre calles 60bis y 60A
Brisas del Mutis - Cra 11w entre calles 60bis y 60A
Naranjos Calle 59 entre Cra 3 y 5
Lagos del cacique - cra 51 con calle 71
Lagos del cacique - cra 51 con calle 71 - geotextil
Lagos del cacique - cra 51 con calle 71 - sardinel
Brisas del Mutis - Calle 60a bis entre cras 11w y 13w (Recursos propios)
Urbanización Porto Fino tramo 3
Urbanización Porto Fino tramo 5
Urbanización Porto Fino tramo 4
Av. Quebradaseca con glorieta Girardot
Av. Quebradaseca con carrera 12
Rotonda Girardot
Carrera 11 con calle 33
Carrera 9 entre calle 47-46
Av. Búcaros - Marsella
Av. perimetral del mutis

Lagos del cacique detrás del colegio el rosario (Señalización Resalto Despacio)
Delicias bajas - Calle 106A entre carreras 15D y 15E
Delicias bajas - Calle 106A entre carreras 15D y 15E intervención 2
Delicias bajas - Carrera 15E entre calles 106 y 106A
campo hermoso CAI POLICIA
Campo hermoso calle 46 y calle 47 cra 10
carrera 33 calle 95 pedregosa
calle 42 con cra 38 SR-01
carrera 38 con calle 42 SR-39
Bosconia - Carrera 32 entre calle 39 y 40
Bosconia - Carrera 32 entre calle 39 y 40
Carrera 9 con calle 41
Carrera 28 con calle 55
Calle 45 con carrera 22
Carrera 25 con calle 30
Calle 45 con carrera 17
Av. Gonzales valencia con calle 53
Av. la rosita con carrera 25
Av. la rosita con carrera 27
Av. la rosita con carrera 21
Av. la rosita con carrera 20

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Mejorar 20 Km de Vías urbanas del municipio

Indicador	Meta 2026	Logro 2026	% Avance 2026	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Vía urbana mejorada	0,21	0,06	29%	$ 87.288.857.113	$ 2.837.617.542	3%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
CONSTRUCCIÓN DE LA CONEXIÓN VIAL CARRERA 24 CON ACCESO AL BARRIO DIAMANTE II DE LA ALCALDÍA DE BUCARAMANGA, SANTANDER	202500000027207	$2.455.460.788,00	$2.416.418.960,00

Descripción de actividades desarrolladas

CONTRATO DE OBRA 112 DE 19 DE JUNIO DE 2026 (SI-SI-LP-002-2026) CONSORCIO VIAL DIAMANTE II GR 2026 “CONSTRUCCIÓN DE LA CONEXIÓN VIAL CARRERA 24 CON ACCESO AL BARRIO DIAMANTE II DE LA ALCALDÍA DE BUCARAMANGA, SANTANDER”.

Valor del contrato:	**$ 2.416.418.960,00**
Valor Anticipo:	N/A
Plazo inicial:	4 MESES Y 15 DIAS
Fecha de inicio:	02/07/2026
Fecha de terminación inicial:	16/11/2026
Fecha de terminación:	16/11/2026
Estado del Contrato:	En Ejecución
Porcentaje avance:	36%

Ubicación: El proyecto se desarrolla en la comuna 10 (Provenza) del Municipio de Bucaramanga.

Impacto: El proyecto tiene como objetivo redirigir el flujo vehicular proveniente de la calle 93 (Sector Centro Comercial Cacique) y que se dirige hacia el sur del municipio y el municipio de

Floridablanca, el cual ocasiona demoras en la movilidad debido ya que se debe ingresar al barrio Diamante II por la carrera 24 para salir e incorporarse a la calle 83. La solución plantea cerrar totalmente el acceso a los vehículos que transitan desde la autopista y que se dirigen al barrio Diamante II por la Carrera 24, en este punto se plantea una bahía de zona verde paralela a la autopista, el área de esta bahía. Con este cierre en la autopista, se garantiza que el flujo vehicular proveniente de la Calle 93 ingrese al barrio como se está haciendo actualmente, es decir, por la Carrera 24, además este flujo se puede incorporar a la autopista por medio de vía que se propone construir conectando la Carrera 24 en calzada sencilla, con un carril de aceleración.

Una vez estos vehículos ingresan a la autopista, pueden continuar su recorrido hacia el sur o retornar al barrio Diamante II por la Calle 83 en sentido oriente – occidente, sin generar afectaciones ambientales y/o auditivas sobre las zonas residenciales del Barrio Diamante II.

Beneficios para la Comunidad:

- **Optimización de la Conectividad Metropolitana:** Permite una canalización continua y directa del flujo vehicular proveniente de la Calle 93 (sector C.C. Cacique) con destino hacia el sur de Bucaramanga y el municipio de Floridablanca.
- **Reducción de Tiempos de Desplazamiento:** Elimina las demoras operativas e intersecciones críticas en horas pico al evitar que el tráfico de paso deba saturar la red vial interna del Barrio Diamante II.
- **Incorporación Técnica y Segura a la Autopista:** La construcción de la vía en calzada sencilla dotada con un carril de aceleración garantiza un acople fluido y progresivo a la Autopista Bucaramanga – Floridablanca, eliminando maniobras de trenzado vehicular de alto riesgo.
- **Protección Integral del Peatón:** Segrega de forma efectiva el tráfico vehicular de las zonas de circulación peatonal, fortaleciendo la seguridad de los transeúntes mediante el desarrollo de senderos, cruces protegidos y adecuación del espacio público en la Calle 83 y la Carrera 24A.
- **Pacificación del Tráfico Residencial:** Evita que las vías locales residenciales sean empleadas como atajos de alta velocidad, protegiendo a la población vulnerable del sector (niños, estudiantes y adultos mayores).
- **Mitigación de la Contaminación Acústica:** La reorientación del flujo vehicular fuera del núcleo habitacional disminuye drásticamente los niveles de ruido y vibración producidos por aceleración y frenado sobre las zonas residenciales.
- **Reducción de Emisiones Contaminantes:** La continuidad de la marcha vehicular disminuye los tiempos de detención en ralentí, optimizando el consumo de combustible y reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero (CO_2) y material particulado.
- **Aumento de Cobertura Verde y Paisajismo:** La conformación de la bahía verde paralela a la autopista consolida una barrera ambiental protectora, aporta a la permeabilidad del suelo y mejora la calidad paisajística del acceso principal al barrio.

SEGUIMIENTO



Ilustración 1. Ubicación general y flujo proyectado del proyecto vía de acceso barrio Diamante II.



Ilustración 2. Conformación de Banca y relleno en vía de aceleración nueva Cra. 24 con salida a la autopista Bucaramanga - Floridablanca.



Ilustración 3. Demolición de Capa rodadura antigua vía de acceso al barrio Diamante II.



Ilustración 4. Conformación de Curva Horizontal para acceso a Calle 83.



Ilustración 5. Conformación retorno en Cra. 24 Entre calle 83 y 84.



Ilustración 6. Adecuación de espacio peatonal costado izquierda Calle 83 - Barrio D

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Realizar el mantenimiento periódico o rutinario a 110 Km de Vías terciarias de la malla vial rural de la ciudad por año.

Indicador	Meta 2026	Logro 2026	% Avance 2026	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario km	110	129,3	100%	$ 2.600.000.000	$ 1.400.000.000	54%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VÍAL RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARMANGA SANTANDER	2024680010043	$6.620.379.446	$ 4.218.077.627

Descripción de actividades desarrolladas

Contrato **No.114** de 16 de junio de 2025 – **CONTRATO DE ALQUILER**: Mediante el proceso SI-SI-SASI-001-2025 con objeto “ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, VOLQUETAS Y VEHÍCULOS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA RED VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”.

Valor del contrato: $2.818.077,627
Plazo inicial: 6 meses y 6 días.
Fecha de Inicio: 24 de junio de 2025
Fecha de terminación: 30 de diciembre de 2025
Fecha Adicional No 1: 18 de febrero de 2026
Valor del Adicional: $1.400.000.000
Plazo Adicional: 5 meses
Fecha de terminación Final: 18 de Julio de 2026
Estado del contrato: En ejecución.

- **Ubicación del Proyecto**

El proyecto denominado “Mantenimiento Periódico de la Red Vial Rural del Municipio de Bucaramanga” se desarrolla en el área rural de la jurisdicción municipal, la cual se encuentra administrativamente dividida en tres (3) corregimientos.

CORREGIMIENTO	SECTORES Y RUTAS DE INTERVENCIÓN
CORREGIMIENTO 1	San Ignacio – La Sabana – El Pantano; La Esmeralda – El Aburrido; San Pedro Alto – San Pedro Bajo (Miramar San Luis); San Cayetano – Vijagual; Angelinos – Santa Rita (vía San Cayetano); Nogal 1 y 2 – Gracia de Dios – El Plan; Angelinos – Bosconia; Bonanza – Villa Carmelo – Villa Luz.
CORREGIMIENTO 2	Veredas: Magueyes, Capilla Alta, Santos Altos, Cuchilla Alta, Monserrate Alta, Bolorquí Bajo y Boloquí Alto. Sector Monserrate parte baja (vía Palbas de la Y del Embalse hacia Capilla Baja). Conectividad desde Puente Tona hacia Rosa Blanca, Chitota y Santos Bajos (vía Carabineros).
CORREGIMIENTO 3	Eje principal de El Porvenir a Miradores de la UIS; Pedregal (sectores Dos Sierras y Ancestros); Retiro Chiquito y Retiro Grande (vía principal y sector Acueducto); Gualilo San José – Piñares – León; Malaña Oriental – Gualilo Alto; Santa Bárbara UDES – San Joaquín; Conectividad vía principal a Cúcuta – Miramanga – Tres Balcones; Gualilo Bajo (vía Acueducto) – Malaña parte alta.

Las actividades de intervención con maquinaria amarilla se ejecutan de manera planificada y sectorizada sobre los diferentes corredores viales rurales, priorizados conforme a criterios técnicos como nivel de deterioro, importancia en la conectividad regional, flujo vehicular y requerimientos comunitarios.

La cobertura del proyecto abarca tramos estratégicos que permiten la articulación entre veredas, centros poblados y el casco urbano, garantizando la funcionalidad de la red vial terciaria como eje estructurante del desarrollo rural. La localización de las actividades se ajusta a la programación operativa y a las condiciones topográficas y climáticas propias de cada corregimiento, optimizando así el rendimiento de los equipos y la eficiencia en la ejecución.

Impacto del Proyecto

- **Impacto Social:** La ejecución del mantenimiento periódico de la red vial rural incide de manera directa en el mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiaria, al garantizar condiciones adecuadas de transitabilidad. Esto facilita el acceso oportuno a servicios esenciales como salud, educación y atención institucional, reduciendo el aislamiento de las comunidades rurales y fortaleciendo la integración territorial. Asimismo, contribuye a la seguridad vial al disminuir riesgos asociados al deterioro de la infraestructura.
- **Impacto Económico:** El proyecto fortalece la dinámica económica del sector rural al optimizar las condiciones para el transporte de bienes y servicios, especialmente productos agrícolas y pecuarios. La reducción en los tiempos de desplazamiento, costos operativos y desgaste vehicular genera un impacto positivo en la productividad y

competitividad de los productores locales, promoviendo la sostenibilidad de las actividades económicas y el desarrollo regional.

- **Impacto Ambiental:** Las actividades de mantenimiento se ejecutan bajo criterios técnicos orientados a la mitigación de impactos ambientales, incluyendo la adecuada conformación de cunetas, manejo de aguas superficiales y control de procesos erosivos. Estas acciones contribuyen a la estabilidad de la infraestructura vial y a la protección del entorno natural, evitando la degradación del suelo y la afectación de los recursos hídricos presentes en las zonas intervenidas.
- **Impacto en la Movilidad y Conectividad:** La intervención de la red vial rural mejora significativamente los niveles de servicio de las vías terciarias, garantizando condiciones de transitabilidad continua y segura durante diferentes épocas del año. Esto permite una conectividad más eficiente entre los corregimientos y el casco urbano, favoreciendo la articulación territorial y el acceso a mercados, servicios y oportunidades de desarrollo.

Durante los meses de julio y agosto de 2026, en el marco del contrato de mantenimiento de la red vial rural, se ejecutaron actividades de intervención que representaron un total de 33,25 kilómetros intervenidos, mediante la utilización de maquinaria y equipos destinados al desarrollo de las actividades programadas.

En el mes de julio se registró la ejecución de 1.811,20 horas de maquinaria, con una intervención de 28,70 kilómetros. Para el mes de agosto, se ejecutaron 111,60 horas, correspondientes a 4,55 kilómetros intervenidos.

Para el mes de septiembre de 2026, el contrato se reporta como finalizado, alcanzando un total de 3.476,30 horas de maquinaria ejecutadas durante la vigencia contractual. De acuerdo con el balance de ejecución, se logró el cumplimiento del 118 % de la meta establecida, superando la meta inicialmente prevista y dando cumplimiento a las actividades de mantenimiento programadas sobre la red vial objeto del contrato.

MES	HORAS	KM
JULIO	1811,2	28,7
AGOSTO	111,6	4,55
SEPTIEMBRE	FINALIZADO	

Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

- **Registro Fotográfico.**





Casa Finca El Gab
Tienda la KZ Las Maria
Finca Sabar
Finca el soplete
Google
3 ago 2026 1:00:06 p.m.
219° SW
Altitud:1486.3msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 2016


CATERPILLAR
Escuela Aguirre
Google
3 ago 2026 9:54:02 a.m.
57° NE
Número de índice: 2013


Google
3 ago 2026 3:15:04 p.m.
7.2023N 73.1106W
208° SW
Bucaramanga-San Alberto
Bucaramanga
Santander
Altitud:1449.5msnm
Velocidad:1.4km/h
Número de índice: 2020



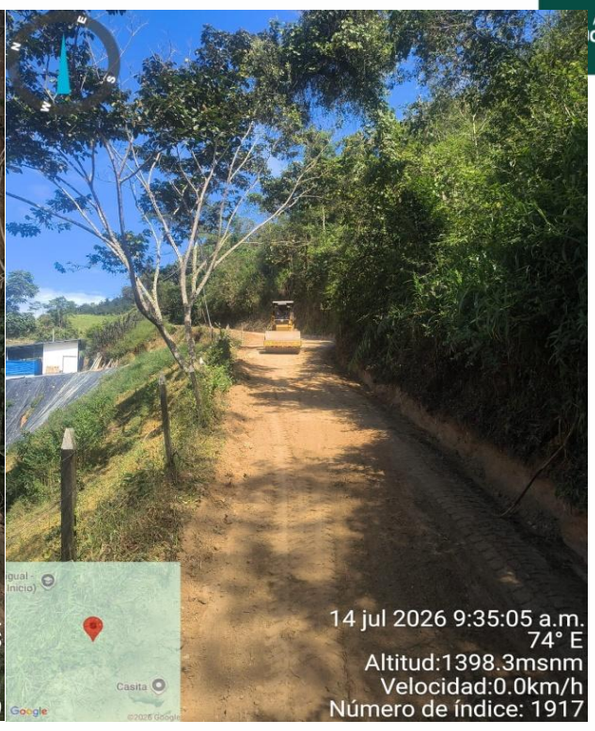

RESUMEN COSOLIDADO DE INTERVENCIÓN EN ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, MANTENIMIENTO VIAL Y APOYO OPERATIVO – TERCER TRIMESTRE DE 2026. CON MAQUINARIA PROPIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

CONSOLIDADO DE INTERVENCIONES Y MANTENIMIENTO VIAL –TRIMESTRE ANTERIOR 2026

TOTAL MES JUNIO 2026	34,7	327	0,82
	TOTAL HORAS DE INTERVENCIÓN	TOTAL m3	TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS
			
ACUM. JUNIO 2026	234,4	1329	10,15

JULIO 2026

FECHA	Vereda-Barrio	Tramo Intervenido	Corregimiento - Urbano	Horas Máquina Invertidas	CANTIDAD m3	Km Intervenidos	Actividades Realizadas
jul-26							
Julio 02 de 2026	Calle 36 con carrera 24 y carrera 25.	Calle 36 con carrera 24 y carrera 25.	Urbano	**0**	**14**	**0**	Se apoyó en la recolección y traslado de fresado desde la calle 36 con carrera 24 y carrera 25 hasta el lugar asignado en el barrio Miradores de la UIS.
Julio 02 de 2026	Barrio la Inmaculada fase 1	Barrio la Inmaculada fase 1	Urbano	**3,5**	**0**	**0**	Se apoyó en el mantenimiento en el cual se realizó el extendido de material en la entrada del barrio la inmaculada fase 1.
Julio 03 de 2026	Carrera 23 con calle 100 y calle 103.	Carrera 23 con calle 100 y calle 103.	Urbano	**0**	**14**	**0**	Se apoyó en la recolección de fresado en el barrio Provenza en la carrera 23 entre las calle 100 y 103, para ser trasladada a la vereda Retiro Chiquito al lugar asignado.
Julio 03 de 2026	Entrada barrio la inmaculada fase 1.	Entrada barrio la Inmaculada fase 1.	Urbano	**5,6**	**0**	**0,1**	Se apoyó en el traslado y extendido de fresado asignado para la entrada del barrio la Inmaculada fase 1 de Bucaramanga.

Julio 04 de 2026	Carrera 23 con calle 100 y calle 103.	Carrera 23 con calle 100 y calle 103.	Urbano	**0**	**7**	**0**	Se apoyó en la recolección de fresado en el barrio Provenza en la carrera 23 entre las calle 100 y 103, para ser trasladada a la vereda Retiro Chiquito en el lugar asignado.
Julio 06 de 2026	Calle 45 con carrera 22.	Calle 45 con carrera 22.	Urbano	**0**	**7**	**0**	Se apoyó en la recolección de fresado en la calle 45 con carrera 22 para luego ser trasladada a la vereda Retiro Chiquito en el lugar asignado.
Julio 08 de 2026	Carrera 5 No. 16ª norte – 46 Barrio María Paz.	Carrera 5 No. 16ª norte – 46 Barrio María Paz.	Urbano	**3,7**	**0**	**0,3**	Se apoyó a la comunidad en el extendido de fresado en la carrera 5 No. 16ª norte – 46 del barrio María Paz.
Julio 09 de 2026	Calle 69 con carrera 11 y carrera 21 barrio la victoria.	Calle 69 con carrera 11 y carrera 21 barrio la victoria.	Urbano	**0**	**14**	**0**	Se apoyó en la recolección de desechos en la obra borde sur realizada en el barrio la Victoria para ser trasladada al Carrasco.
Julio 10 de 2026	Calle 69 con carrera 11 y carrera 21 barrio la Victoria.	Calle 69 con carrera 11 y carrera 21 barrio la Victoria.	Urbano	**0**	**7**	**0**	Se apoyó en la recolección de desechos en la obra borde sur realizada en el barrio la Victoria para ser trasladada al Carrasco.
Julio 12 de 2026	Carrera 22 No. 39 – 85 Barrio Bolívar.	Carrera 22 No. 39 – 85 Barrio Bolívar.	Urbano	**0**	**7**	**0**	Se apoyó en la recolección de los escombros de la casa desplomada sobre la carrera 22 con calle 39 del barrio Bolívar el cual fue trasladado al Carrasco.
Julio 16 de 2026	Carrasco Municipal	Carrasco Municipal	Urbano	**0**	**7**	**0**	Se apoyó en el descargue del material que contenía la volqueta el cual fue trasladado al Carrasco.
Julio 17 de 2026	Calle 54N No. Con Carrera 25 Barrio Colorados.	Calle 54N No. Con Carrera 25 Barrio Colorados.	Urbano	**0**	**84**	**0**	Se apoyó en la recolección del exceso de tierra de la cancha principal de tierra del barrio Colorados.
Julio 18 de 2026	Calle 54N No. Con Carrera 25 Barrio Colorados.	Calle 54N No. Con Carrera 25 Barrio Colorados.	Urbano	**0**	**63**	**0**	Se apoyó en la recolección del exceso de tierra de la cancha principal de tierra del barrio Colorados.
Julio 22 de 2026	Parque Carrera 33 con Calle 55.	Parque Carrera 33 con Calle 55.	Urbano	**0**	**7**	**0**	Se apoyó en la recolección de material vegetal en el parque ubicado en la carrera 33 con calle 55 el cual fue trasladado al Carrasco.
Julio 22 de 2026	Calle 33 con Carrera 11 Barrio García Rovira	Calle 33 con Carrera 11 Barrio García Rovira	Urbano	**0**	**14**	**0**	Se apoyó en la recolección de material de fresado en la calle 33 con carrera 11 del barrio García Rovira del Municipio de Bucaramanga para ser trasladado al barrio Colorados.
Julio 23 de 2026	Calle 33 con Carrera 11 Barrio García Rovira	Calle 33 con Carrera 11 Barrio García Rovira	Urbano	**0**	**14**	**0**	Se apoyó en la recolección de material de fresado en la calle 33 con carrera 11 del barrio García Rovira del Municipio de Bucaramanga para ser trasladado al barrio Colorados.
Julio 26 de 2026	Barrio el Pedregal.	Barrio el Pedregal.	Urbano	**0**	**14**	**0**	Se apoyó en la recolección de material inservible en el pedregal el cual fue trasladado al Carrasco.
Julio 27 de 2026	Vereda La Esmeralda	Vereda La Esmeralda	Urbano	**0**	**14**	**0**	Se apoyó en el traslado de material fresado a la vereda la Esmeralda al lugar asignado.
			TOTAL MES JULIO 2026	**12,8**	**287**	**0,4**	
				TOTAL HORAS DE INTERVENCIÓN	**TOTAL m3**	**TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS**	
							
			ACUM. JULIO 2026	**247,2**	**1616**	**10,55**	


2/7/2026 11:31
7.1053N 73.1636W
Vía Girón
Bucaramanga
Santander
Altitud:683.6msnm
Velocidad:0.0km/h
Alexander Hernández Moreno
Recorredor VII


2/7/2026 07:38
Alexander Hernández Moreno
Recorredor VII


17 jul 2026 1:50:13 p. m.
7.1780N 73.1323W
Altitud:819.9msnm
Velocidad:0.6km/h
Henry González


2/7/2026 12:04
Alexander Hernández Moreno
Recorredor VII


9/07/2026, 9:56:59 a.m.
Calle 69 11-29
Bucaramanga 680005
Santander
Colombia
Ronald Sec Infraestructura


4 jul 2026 11:12:09
7.13974333333334N 73.076305W
350° N
Autopista Bucaramanga - Pamplona
Floridablanca
Santander
Ricardo


6 jul 2026 12:53:19 p. m.
7.1398N 73.0764W
Pamplona, Floridablanca, Santander, Colombia
Altitud:1714.0msnm
Velocidad:1.0km/h
Henry González


Bucaramanga
Santander
Ricardo





REGISTRO FOTOGRAFICO-GRUPO MAQUINARIA

AGOSTO 2026

FECHA	Vereda- Barrio	Tramo Intervenido	Corregimiento - Urbano	Horas Máquina Invertida	CANTIDAD m3	Km Intervenidos	Actividadess Realizadas
ago-26							
Agosto 01 de 2026	Asentamiento Garcia de Dios	Asentamiento Garcia de Dios	Urbano	**0**	**7**	**0**	Se apoyó en el traslado de material fresado al lugar asignado en el asentamiento Gracia de Dios.
Agosto 03 de 2026	Asentamiento Garcia de Dios	Asentamiento Garcia de Dios	Urbano	**0**	**14**	**0**	Se apoyó en el traslado de material fresado al lugar asignado en el asentamiento Gracia de Dios.
Agosto 04 de 2026	Parque de la Vida - Barrio Luz de Salvación	Parque de la Vida - Barrio Luz de Salvación	Urbano	**0**	**7**	**0**	Apoyo a la cuadrilla del alcalde en el traslado de material de juegos de parque, desde el parque de la Vida (Campo Hermoso) al lugar asignado en el barrio Luz de Salvación.
Agosto 11 de 2026	Barrio Punta Betin - Vereda La Sabana	Barrio Punta Betin - Vereda La Sabana	C1	**5,4**	**14**	**0**	Se apoyó en la recolección de material en el barrio Punta Betin y traslado al lugar asignado en la vereda La Sabana.
Agosto 11 de 2026	Parque extremo San Martin	Parque extremo San Martin	Urbano	**7**	**0**	**0**	Se apoyó en la remoción de tierra, limpieza de cunetas y retiro de material vegetal en el sendero peatonal milla verde - parque extremo del barrio San Martin.
Agosto 12 de 2026	Barrio Campo Hermoso - Barrio Villa Esmeralda	Barrio Campo Hermoso - Barrio Villa Esmeralda	Urbano	**0**	**7**	**0**	Apoyo a la cuadrilla del alcalde en el traslado de material (arena) desde el taller municipal hasta se trasladó el urbanización Villa Esmeralda.

Agosto 12 de 2026	Parque extremo San Martin	Parque extremo San Martin	Urbano	**5,5**	**0**	**0**	Apoyo en el traslado de material de fresado a dos puntos de la pista de BMX.
Agosto 13 de 2026	Barrio Punta Betin - Barrio Cristal Bajo - Vereda La Sabana	Barrio Punta Betin - Barrio Cristal Bajo - Vereda La Sabana	Urbano	**3,3**	**14**	**0**	Se apoyó en la recolección y traslado de material de fresado en el barrio Punta Betin el cual fue trasladado al barrio Cristal Bajo.
Agosto 13 de 2026	Parque extremo San Martin	Parque extremo San Martin	Urbano	**1,8**	**0**	**0,2**	Se apoyó en el extendido de material de fresado en el parque extremo del barrio San Martin.
Agosto 14 de 2026	Instituto INCE - Barrio La Concordia	Instituto INCE - Barrio La Concordia	Urbano	**0**	**14**	**0**	Se apoyó en la traslado de escombros del instituto INCE en el barrio La Concordia el cual fue trasladado al Carrasco Municipal.
Agosto 14 de 2026	Parque ubicado en la Carrera 33 #54-41	Parque ubicado en la Carrera 33 #54-41	Urbano	**0**	**7**	**0**	Se apoyó en la traslado de material vegetal en el parque ubicado en la carrera 33 con calle 54-41 el cual fue trasladado al Carrasco Municipal.
Agosto 14 de 2026	Parque extremo San Martin	Parque extremo San Martin	Urbano	**1,6**	**0**	**0,2**	Se apoyó en el extendido de material de fresado en el parque extremo del barrio San Martin.
Agosto 19 de 2026	Parque extremo San Martin	Parque extremo San Martin	Urbano	**0,7**	**0**	**0,3**	Se apoyó en el extendido de material de fresado en el parque extremo del barrio San Martin.
Agosto 20 de 2026	Parque extremo San Martin	Parque extremo San Martin	Urbano	**3,6**	**0**	**0,8**	Se apoyó en el extendido de material de fresado en el parque extremo del barrio San Martin.
Agosto 21 de 2026	Ramal Miramar - Vereda San Pedro	Ramal Miramar - Vereda San Pedro	C1	**6,3**	**0**	**0,3**	Cargue, remoción y extendido de material de peña para el replanteo de la vía del ramal de Miramar.
Agosto 24 de 2026	Parque extremo San Martin - Barrio Brisas de Provenza	Parque extremo San Martin - Barrio Brisas de Provenza	Urbano	**0**	**7**	**0**	Se apoyó en la recolección y traslado de materia fresado en el parque extremo del barrio San Martin para ser trasladado al lugar asignado en el barrio Brisas de Provenza.
Agosto 24 de 2026	Parque extremo San Martin	Parque extremo San Martin	Urbano	**7,8**	**0**	**0**	Traslado de material de fresado a la pista de BMX y replanteo de las partes deterioradas dentro de la pista de BMX en el parque extremo del Barrio San Martin.
Agosto 25 de 2026	Vía San Pedro - Miramar	Vía San Pedro - Miramar	C1	**9,9**	**0**	**0,8**	Cargue, remoción y extendido de material de peña para el replanteo de la vía del ramal de Miramar.
Agosto 25 de 2026	Parque extremo San Martin	Parque extremo San Martin	Urbano	**1,9**	**0**	**0**	Se apoyó con mini cargador para cernir 6 metros cúbicos de material fresado en el parque extremo del barrio San Martin.
Agosto 26 de 2026	Vía San Pedro - Miramar	Vía San Pedro - Miramar	C1	**0,4**	**0**	**0,4**	Cargue, remoción y extendido de material de peña para el replanteo de la vía del ramal de Miramar.

Agosto 26 de 2026	Parque extremo San Martin	Parque extremo San Martin	Urbano	**3,7**	**0**	**0**	se apoyó en el nivelado y replanteo de la zona de terraza en el parque extremo del barrio San Martin.
Agosto 27 de 2026	Vía San Pedro - Miramar	Vía San Pedro - Miramar	C1	**1**	**0**	**0,2**	Cargue y despeje de material de arrastre erosionado por las lluvias en la vereda San Pedro.
Agosto 28 de 2026	Parque extremo San Martin - Barrio Brisas de Provenza	Parque extremo San Martin - Barrio Brisas de Provenza	Urbano	**0**	**14**	**0**	Se apoyó en la recolección de material fresado del parque extremo del barrio San Martin y trasladado al Barrio Brisas de Provenza.
Agosto 31 de 2026	Vereda San Pedro	Vereda San Pedro	C1	**5,2**	**0**	**0,5**	Cargue, remoción y extendido de material de peña para el replanteo de la vía sector la Vega - Miramar.
Agosto 31 de 2026	Parque extremo San Martin	Parque extremo San Martin	Urbano	**3,2**	**0**	**0**	Se apoyó en el cernido de material de fresado en el parque extremo del barrio San Martin.
			TOTAL MES AGOSTO 2026	**68,3**	**105**	**3,7**	
				TOTAL HORAS	**TOTAL M3**	**TOTAL KILOMETROS**	
							
			ACUM. AGOSTO 2026	**315,5**	**1721**	**14,25**	







REGISTRO FOTOGRAFICO-GRUPO MAQUINARIA

SEPTIEMBRE 2026

FECHA	Vereda- Barrio	Tramo Intervenido	Corregimiento - Urbano	Horas Máquina Invertida	Cantidad m3	Km Intervenidos	Actividades Realizadas
sep-26							
Septiembre 01 de 2026	Parque Simón Bolivar, Calle 39 #22-30	Parque Simon Bolivar, Calle 39 #22-30	Urbano	**0**	**7**	**0**	Se apoyó en el traslado de material tipo CESPED que se encontraba en el parque Simón Bolívar.
Septiembre 01 de 2026	Vereda San Pedro	Vía sector vereda San Pedro - Miramar	C1	**6,2**	**0**	**0**	Se apoyó en el mantenimiento y despeje que se realizó a la vía que comunica el sector de la vereda San Pedro con Miramar.
Septiembre 02 de 2026	Vereda San Pedro	Vía sector vereda San Pedro - Miramar	C1	**4,3**	**0**	**0**	Se apoyó en el mantenimiento y despeje que se realizó a la vía que comunica el sector de la vereda San Pedro con Miramar.
Septiembre 04 de 2026	Parque de la Vida	Parque de la Vida	Urbano	**1,6**	**0**	**0**	Se apoyó por parte del grupo de ingenieros y operarios el encendido de las motoniveladoras CHANGLIN PY165H y KOMATSU GD535.
Septiembre 07 de 2026	Barrio Galán	Barrio Galán	Urbano	**14,2**	**14**	**0,2**	Se trasladó el equipo de operarios y maquinaria con el fin de iniciar las actividades de mantenimiento de la vía, realizando limpieza y nivelación de la vía.
Septiembre 08 de 2026	Barrio La Feria	Barrio La Feria	Urbano	**0**	**0**	**0**	Se apoyó a la cuadrilla el alcalde en el traslado de materiales en el barrio la Feria.
Septiembre 09 de 2026	Via San Pedro - Miramar	Via San Pedro - Miramar	C1	**0,3**	**0**	**0**	Se apoyó en el traslado del mini cargador desde la vereda San Pedro - Miramar a la entrada La Vega y se despeja la vía.
Septiembre 14 de 2026	Carrera 19 #24-61 (Fiscalia)	Carrera 19 #24-61 (Fiscalia)	Urbano	**0**	**14**	**0**	Se apoyó en el traslado de material de fresado desde la carrera 19 # 24 - 61 en la Fiscalía hasta el barrio Brisas

							de Provenza por medio de las volquetas Kodiak OSA 818 y FVR OSA 868.
Septiembre 15 de 2026	Taller Municipal	Taller Municipal	Urbano	**0**	**7**	**0**	Se apoya con volqueta OSA 818 para el acompañamiento y colaboración a la cuadrilla de alcalde para el traslado de materiales y actividades indicadas.
Septiembre 15 de 2026	Carrera 19 #24-61 (Fiscalia)	Carrera 19 #24-61 (Fiscalia)	Urbano	**0**	**7**	**0**	Se apoyó en el traslado de material de fresado desde la carrera 19 # 24 - 61 en la fiscalía por medio de las volquetas de la volqueta FVR OSA 818 al barrio brisas de Provenza.
Septiembre 15 de 2026	Parque de la Vida	Parque de la Vida	Urbano	**0**	**0**	**0**	Se apoyó por parte del grupo de ingenieros y operarios el acompañamiento a las actividades de mantenimiento que se le realizaron a las motoniveladoras CHANGLIN PY165H y KOMATSU GD535.
Septiembre 15 de 2026	Cancha de Tierra Barrio Santander	Cancha de Tierra Barrio Santander	Urbano	**7,7**	**0**	**0**	Se apoyó por parte del equipo de maquinaria amarilla el raspado y mantenimiento de la cancha de tierra del barrio Santander con la ayuda del mini cargador.
Septiembre 16 de 2026	Carrera 11oe. 11W-06 Barrio Brisas del Mutis.	Carrera 11oe. 11W-06 Barrio Brisas del Mutis.	Urbano	**0**	**7**	**0**	Se apoyó con las volquetas el traslado de material de fresado desde el barrio Brisas de Provenza hasta el barrio El Pablón al lugar donde asignaron.
Septiembre 17 de 2026	Cancha de Tierra Prados del Mutis	Cancha de Tierra Prados del Mutis	Urbano	**4,1**	**0**	**0**	Se apoyó en la limpieza y mantenimiento de la cancha de tierra del barrio Prados del Mutis con ayuda del Mini cargador CASE SR175B.
Septiembre 17 de 2026	Barrio Brisas del Mutis	Barrio Brisas del Mutis	Urbano	**0**	**14**	**0**	Se apoyó en el traslado de material tipo fresado desde el Barrio Brisas del Mutis al Barrio Buenavista parte baje Calle 19 #64 -01 al lugar que fue asignado.
Septiembre 17 de 2026	Barrio Maria Paz	Barrio Maria Paz	Urbano	**0**	**0**	**0**	Se puso a disposición Volqueta para el apoyo a la cuadrilla del alcalde en mi barrio para el traslado de material asignado por ellos.
Septiembre 18 de 2026	Barrio Buena Vista Parte Baja	Barrio Buena Vista Parte Baja	Urbano	**0**	**7**	**0**	Se apoyó en el traslado de material tipo fresado al barrio Buenavista parte baje al lugar que sea asignado.
Septiembre 18 de 2026	Barrio La Independencia	Barrio La Independencia	Urbano	**0**	**7**	**0**	Se dispone Volqueta para el traslado de material tipo fresado al Barrio La Independencia al lugar que sea asignado.

Septiembre 18 de 2026	Cancha de Tierra Prados del Mutis	Cancha de Tierra Prados del Mutis	Urbano	**4**	**0**	**0**	Se apoyó en la limpieza, remoción de tierra y mantenimiento de la cancha de tierra del barrio Prados del Mutis con ayuda del Minicargador CASE SR175B.
Septiembre 22 de 2026	Barrio Galán	Barrio Galán	Urbano	**7,3**	**7**	**0**	Se continua con la limpieza, remoción de tierra y mantenimiento de la malla vial en el barrio Galán con la maquinaria amarilla.
Septiembre 22 de 2026	Taller Municipal	Taller Municipal	Urbano	**0**	**0**	**0**	Se apoyó en el traslado de material ubicado en el taller municipal al barrio Quinta Estrella el cual fue solicitado al grupo de maquinaria por parte de la cuadrilla alcalde en mi barrio.
Septiembre 23 de 2026	Barrio Galán	Barrio Galán	Urbano	**22,2**	**42**	**0,1**	Se continua con la limpieza, remoción de tierra y mantenimiento de la malla vial en el barrio Galán con la maquinaria amarilla.
Septiembre 24 de 2026	Barrio Galán	Barrio Galán	Urbano	**10,6**	**14**	**0,1**	Se continua con la limpieza, remoción de tierra y mantenimiento de la malla vial en el barrio Galán con la maquinaria amarilla.
Septiembre 25 de 2026	Barrio Galán	Barrio Galán	Urbano	**6,8**	**35**	**0,1**	Se continua con la limpieza, remoción de tierra y mantenimiento de la malla vial en el barrio galan con la maquinaria amarilla.
Septiembre 28 de 2026	Barrio Galán	Barrio Galán	Urbano	**17,5**	**30**	**0,2**	Se continua con la limpieza, remoción de tierra y mantenimiento de la malla vial en el barrio Galán con la maquinaria amarilla.
Septiembre 29 de 2026	Barrio Galán	Barrio Galán	Urbano	**8,5**	**40**	**0,15**	Se continua con la limpieza, remoción de tierra y mantenimiento de la malla vial en el barrio Galán con la maquinaria amarilla.
Septiembre 29 de 2026	Cancha de Tierra Brisas del Mutis	Cancha de Tierra Brisas del Mutis	Urbano	**6,2**	**0**	**0**	Se apoyó en la limpieza y mantenimiento de la cancha de tierra del barrio Brisas del Mutis con ayuda del Mini cargador CASE SR175B.
Septiembre 30 de 2026	Barrio La Inmaculada	Barrio La Inmaculada	Urbano	**0**	**28**	**0**	Se apoyó en el traslado de material de Fresado desde el barrio el Galán hasta el barrio Buenavista de Morro rico.
			TOTAL MES SEPTIEMBRE 2026	**121,5**	**280**	**0,85**	
				TOTAL HORAS DE INTERVENCIÓN	**TOTAL m3**	**TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS**	
							

			ACUM. SEPTIEMBRE 2026	437	2001	14,7	



REGISTRO FOTOGRAFICO-GRUPO MAQUINARIA

Se deja constancia de que la información y las evidencias presentadas en el presente informe, corresponden a las actividades ejecutadas por el **Grupo de Maquinaria, con equipo propiedad del municipio, al servicio de la Secretaría de Infraestructura**, durante los meses de **julio, agosto y septiembre de 2026**, como parte de las labores de atención de emergencias, mantenimiento vial y apoyo operativo, realizados durante el tercer trimestre del año en curso.

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Construir 5.000 metros lineales de placa huella en la zona rural

Indicador	Meta 2026	Logro 2026	% Avance 2026	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Placa huella construida	310	949	100%	$ 4.432.291.472	$ 4.432.291.472	100%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES A TRAVES DE PLACA HUELLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	202600000011531	$ 1.798.328.403,00	$ 1.798.328.403,00

Impacto: Este importante proyecto tienen un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de estas veredas de ejecución de los proyectos, así como de las veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.

SAN PEDRO BAJO

Descripción de actividades desarrolladas

Contrato 196 del 25 de septiembre de 2026 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-009-2026 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN PEDRO BAJO DEL CORREGIMIENTO 1, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, ATRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER"

Valor del contrato: $359.284.640
Plazo inicial: 3 meses
Fecha de Inicio: por iniciar
Fecha de terminación: 31 de noviembre de 2026
Porcentaje Avance físico ejecutado: 0%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda San Pedro Bajo, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 1 del municipio Bucaramanga.

RETIRO CHIQUITO

Descripción de actividades desarrolladas

Contrato 201 del 25 de septiembre de 2026 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-008-2026 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RETIRO CHIQUITO DEL CORREGIMIENTO TRES (03), DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, ATRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER"

Valor del contrato: $335.607.360
Plazo inicial: 3 meses
Fecha de Inicio: por iniciar
Fecha de terminación: 31 de noviembre de 2026
Porcentaje Avance físico ejecutado: 0%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Retiro Chiquito, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 3 del municipio Bucaramanga.

GUALILO PARTE ALTA

Descripción de actividades desarrolladas

Contrato 200 del 25 de septiembre de 2026 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-011-2026 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUALILO ALTO DEL CORREGIMIENTO 3, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, ATRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER"

Valor del contrato: $400.957.603
Plazo inicial: 3 meses
Fecha de Inicio: por iniciar
Fecha de terminación: 31 de noviembre de 2026
Porcentaje Avance físico ejecutado: 0%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Gualilo Alto área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 3 del municipio Bucaramanga.

BOLARQUI BAJO

Descripción de actividades desarrolladas

Contrato 199 del 25 de septiembre de 2026 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-007-2026 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BOLARQUI BAJO DEL CORREGIMIENTO 2, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, ATRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER"

Valor del contrato: $400.956.917
Plazo inicial: 3 meses
Fecha de Inicio: por iniciar
Fecha de terminación: 31 de noviembre de 2026
Porcentaje Avance físico ejecutado: 0%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Bolarqui Bajo área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 2 del municipio Bucaramanga.

CUCHILLA ALTA

Descripción de actividades desarrolladas

Contrato 198 del 25 de septiembre de 2026 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-012-2026 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CUCHILLA ALTA DEL CORREGIMIENTO DOS (02),

PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER”

Valor del contrato: $ 400.956.646
Plazo inicial: 3 meses
Fecha de Inicio: por iniciar
Fecha de terminación: 31 de noviembre de 2026
Porcentaje Avance físico ejecutado: 0%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Cuchilla Alta área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 2 del municipio Bucaramanga.

SAN IGNACIO

Descripción de actividades desarrolladas

Contrato 197 del 25 de septiembre de 2026 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-010-2026 con el objetivo de “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN IGNACIO DEL CORREGIMIENTO 1, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, ATRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER”

Valor del contrato: $ 335.606.954 COP
Plazo inicial: 3 meses
Fecha de Inicio: por iniciar
Fecha de terminación: 31 de noviembre de 2026
Porcentaje Avance físico ejecutado: 0%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda San Ignacio área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 1 del municipio Bucaramanga.

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES A TRAVES DE PLACA HUELLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	202500000035592	$ 2.633.963.069	$ 2.633.963.069

Descripción de actividades desarrolladas


VEREDA CAPILLA ALTA

Contrato 024 del 30 de enero de 2026 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-005-2026 el objetivo de “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **CAPILLA ALTA** DEL CORREGIMIENTO DOS (02), PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER”

Valor del contrato: $394.139.879
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 4 meses
Plazo con Prórroga: 5 meses
Fecha de Inicio: 23 de febrero de 2026

Fecha de terminación: 22 de julio de 2026
Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación
Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Capilla Alta, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 2 del municipio Bucaramanga.

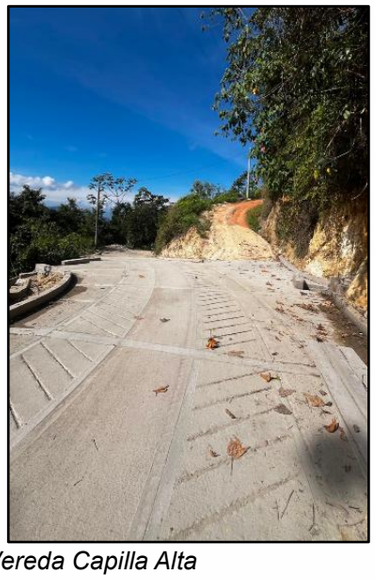Placa Huella en la Vereda Capilla Alta


VEREDA LA ESMERALDA

Descripción de actividades desarrolladas

Contrato 025 del 30 de enero de 2026 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-002-2026 el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE **LA VEREDA ESMERALDA** DEL CORREGIMIENTO (1) UNO, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER"

Valor del contrato: $394.139.879
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 4 meses
Plazo con Prórroga: 5 meses
Fecha de Inicio: 23 de febrero de 2026
Fecha de terminación: 22 de julio de 2026
Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación
Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda La Esmeralda, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 1 del municipio Bucaramanga.

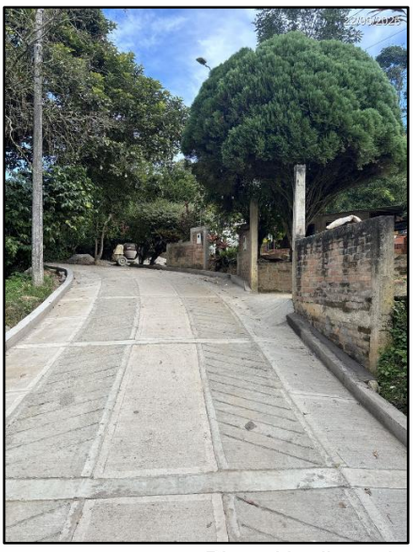


Placa Huella en la Vereda La Esmeralda

VEREDA RETIRO GRANDE SECTOR ACUEDUCTO

Descripción de actividades desarrolladas

Contrato 026 del 30 de enero de 2026 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-001-2026 el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **RETIRO GRANDE SECTOR ACUEDUCTO** DEL CORREGIMIENTO TRES (03), PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER"

Valor del contrato: $328.790.410
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 4 meses
Plazo con Prórroga: 5 meses
Fecha de Inicio: 23 de febrero de 2026
Fecha de terminación: 22 de julio de 2026
Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación
Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Retiro Grande Sector Acueducto, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 3 del municipio Bucaramanga.




Placa Huella en la Vereda Retiro Grande Sector Acueducto

VEREDA ABURRIDO PARTE BAJA

Descripción de actividades desarrolladas

Contrato 027 del 30 de enero de 2026 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-004-2026 el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **ABURRIDO PARTE BAJA** DEL CORREGIMIENTO UNO (1), DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER"

Valor del contrato: $328.790.410
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 4 meses
Plazo con Prórroga: 8 meses
Fecha de Inicio: 23 de febrero de 2026
Fecha de terminación: 7 de octubre de 2026
Estado del contrato: En ejecución
Porcentaje Avance físico ejecutado: 80%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Aburrido Parte Baja, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 1 del municipio Bucaramanga.



Placa Huella en la Vereda Aburrido Parte Baja

VEREDA NOGAL PARTE SUR DE LA VEREDA VIJAGUAL

Descripción de actividades desarrolladas

Contrato 028 del 30 de enero de 2026 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-003-2026 el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL **NOGAL PARTE SUR DE LA VEREDA VIJAGUAL**, CORREGIMIENTO 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y ALCANTARILLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"

Valor del contrato: $352.467.825
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 4 meses
Plazo con Prórroga: 4 meses y 15 días
Fecha de Inicio: 23 de febrero de 2026

Fecha de terminación: 7 de julio de 2026
Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación
Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Nogal Parte Sur De La Vereda Vijagual, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 1 del municipio Bucaramanga.



Placa Huella en la Vereda Nogal Parte Sur De La Vereda Vijagual

VEREDA SAN PEDRO BAJO SECTOR NORTE MIRAMAR

Descripción de actividades desarrolladas

Contrato 029 del 30 de enero de 2026 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-006-2026 el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **SAN PEDRO BAJO SECTOR NORTE MIRAMAR** DEL CORREGIMIENTO UNO (01), PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER"

Valor del contrato: $394.139.879
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 4 meses
Plazo con Prórroga: 5 meses
Fecha de Inicio: 23 de febrero de 2026
Fecha de terminación: 22 de julio de 2026
Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación
Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda San Pedro Bajo Sector Norte Miramar, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 1 del municipio Bucaramanga.



Placa Huella en la Vereda San Pedro Bajo Sector Norte Miramar

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES A TRAVES DE PLACA HUELLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	2024680010253	$ 9.522.592.280	$ 8.512.307.597

Descripción de actividades desarrolladas

Impacto: Este importante proyecto tienen un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de estas veredas de ejecución de los proyectos, así como de las veredas aledañas.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.

VEREDA SAN CAYETANO Y SANTA RITA


Descripción de actividades desarrolladas

Contrato 068 del 09 de mayo de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-001-2025 con el objetivo de “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **SAN CAYETANO Y SANTA RITA,** DEL CORREGIMIENTO UNO (1) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER”

Valor del contrato: $410.000.727,00
Plazo inicial: 4 meses
Fecha de Inicio: 20 de mayo de 2025
Fecha de terminación: 19 de septiembre de 2025
Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación

Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda San Cayetano, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 1 del municipio Bucaramanga.

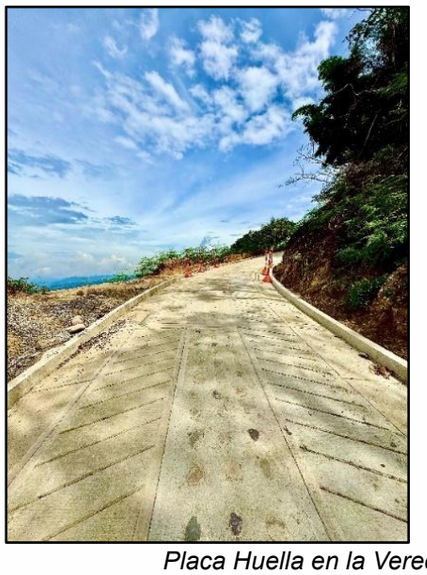


Placa Huella en la Vereda San Cayetano y Santa Rita

VEREDA MONSERRATE Y RETIRO GRANDE

Descripción de actividades desarrolladas

Contrato 069 del 09 de mayo de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-005-2025 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **MONSERRATE Y RETIRO GRANDE** DEL CORREGIMIENTO DOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER"

Valor del contrato: $410.000.000,00
Valor del adicional: $21.408.093
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 4 meses
Plazo con prórrogas: ocho (08) meses y cinco (05) días
Suspensión: 3 meses y 15 días
Fecha de Inicio: 26 de mayo de 2025
Fecha de terminación: 12 de mayo de 2026
Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación
Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Monserrate y Retiro Grande, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 2 del municipio Bucaramanga.




Placa Huella en la Vereda Monserrate y Retiro Grande


VEREDA LOS ANGELINOS SECTOR LA CEMENTO

Descripción de actividades desarrolladas

Contrato 070 del 09 de mayo de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-004-2025 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **LOS ANGELINOS SECTOR LA CEMENTO** DEL CORREGIMIENTO UNO (1), DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER"

Valor del contrato: $410.000.000,00
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 4 meses
Plazo con Prórroga: 5 meses
Fecha de Inicio: 20 de mayo de 2025
Fecha de terminación: 19 de octubre de 2025
Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación
Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Los Angelinos Sector La Cemento, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 1 del municipio Bucaramanga.

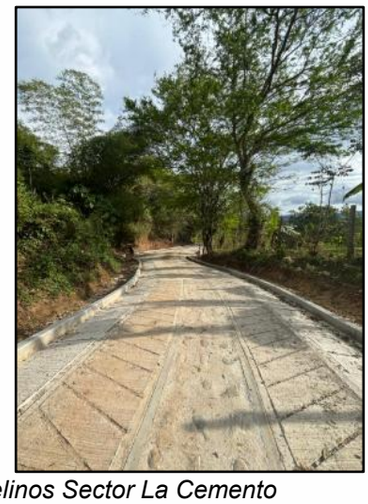Placa Huella en la Vereda Los Angelinos Sector La Cemento

VEREDA SANTA BARBARA SECTOR BAJO LA UDES SAN JOAQUIN

Descripción de actividades desarrolladas

Contrato 071 del 09 de mayo de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-002-2025 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **SANTA BARBARA SECTOR BAJO LA UDES SAN JOAQUIN**, DEL CORREGIMIENTO TRES (3) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y ALCANTARILLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"

Valor del contrato: $410.000.000,00
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 4 meses
Plazo con Prórroga: 5 meses
Fecha de Inicio: 20 de mayo de 2025
Fecha de terminación: 19 de octubre de 2025
Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación
Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Santa Bárbara Sector Bajo La Udes San Joaquín, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 3 del municipio Bucaramanga.



Placa Huella en la Vereda Santa Bárbara Sector Bajo La Udes San Joaquín

VEREDA LA CAPILLA



Descripción de actividades desarrolladas

Contrato 072 del 09 de mayo de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-003-2025 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **LA CAPILLA** DEL CORREGIMIENTO DOS (2) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y ALCANTARILLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"

Valor del contrato: $410.000.000,00
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 4 meses

Plazo con Prórroga: 5 meses
Fecha de Inicio: 20 de mayo de 2025
Fecha de terminación: 19 de octubre de 2025
Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación
Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda La Capilla, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 2 del municipio Bucaramanga.

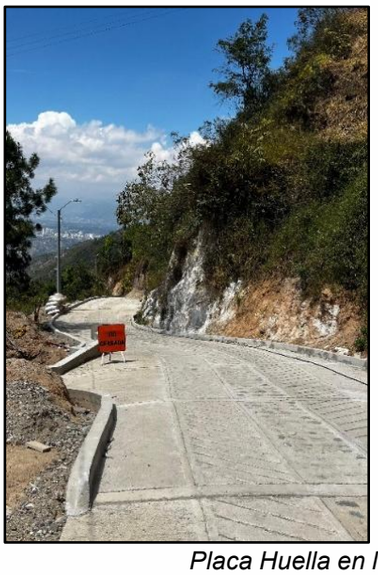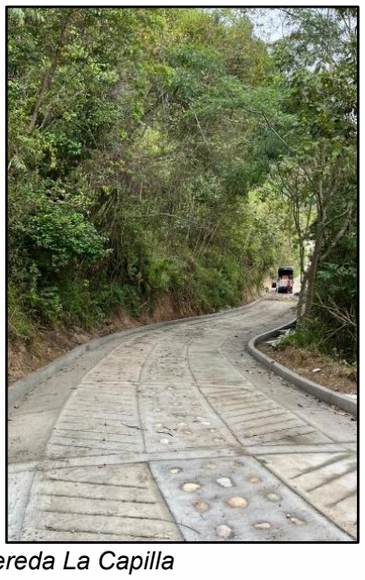Placa Huella en la Vereda La Capilla

VEREDA ROSA BLANCA

Descripción de actividades desarrolladas

Contrato 109 del 13 de junio de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-009-2025 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **ROSA BLANCA** DEL CORREGIMIENTO DOS (2), MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y ALCANTARILLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER"

Valor del contrato: $410.000.000,00
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 4 meses
Fecha de Inicio: 4 de agosto de 2025
Fecha de terminación: 3 de diciembre de 2025
Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación
Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Rosa Blanca, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 2 del municipio Bucaramanga.



Placa Huella en la Vereda Rosa Blanca

VEREDA CUCHILLA ALTA

Descripción de actividades desarrolladas

Contrato 110 del 13 de junio de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-008-2025 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **CUCHILLA ALTA** DEL CORREGIMIENTO DOS (2), DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER"

Valor del contrato: $410.000.000,00
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 4 meses
Plazo con Prórroga: 5 meses
Fecha de Inicio: 12 de agosto de 2025
Fecha de terminación: 15 de febrero de 2026
Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación
Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Cuchilla Alta, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 2 del municipio Bucaramanga.



Placa Huella en la Vereda Cuchilla Alta

VEREDA SANTA RITA SECTOR CEYLAN MONTECRISTO

Descripción de actividades desarrolladas

Contrato 111 del 13 de junio de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-007-2025 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **SANTA RITA SECTOR CEYLAN MONTECRISTO** DEL CORREGIMIENTO UNO (1) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER"

Valor del contrato: $410.000.000,00
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 4 meses
Plazo con Prórroga: 5 meses
Fecha de Inicio: 18 de julio de 2025
Fecha de terminación: 17 de diciembre de 2025
Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación
Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Santa Rita Sector Ceylan Montecristo, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 1 del municipio Bucaramanga.



Placa Huella en la Vereda Santa Rita Sector Ceylan Montecristo

VEREDA VIJAGUAL

Descripción de actividades desarrolladas

Contrato 112 del 13 de junio de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-010-2025 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **VIJAGUAL** DEL CORREGIMIENTO UNO (1), DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER"

Valor del contrato: $410.000.000,00
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 4 meses
Fecha de Inicio: 14 de julio de 2025
Fecha de terminación: 13 de noviembre de 2025
Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación
Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Vijagual, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 1 del municipio Bucaramanga.




Placa Huella en la Vereda Vijagual

VEREDA MAGUEYES

Descripción de actividades desarrolladas

Contrato 113 del 13 de junio de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-006-2025 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **MAGUEYES** DEL CORREGIMIENTO DOS, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y ALCANTARILLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER"

Valor del contrato: $410.000.000,00
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 4 meses
Plazo con Prórroga: 5 meses
Fecha de Inicio: 14 de julio de 2025
Fecha de terminación: 13 de diciembre de 2025
Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación
Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Magueyes, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 2 del municipio Bucaramanga.




Placa Huella en la Vereda Magueyes

VEREDA GUALILO PARTE ALTA

Descripción de actividades desarrolladas

Contrato 210 del 04 de septiembre de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-011-2025 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **GUALILO PARTE ALTA** DEL CORREGIMIENTO TRES, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y ALCANTARILLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER"

Valor del contrato: $410.000.000,00
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 3 meses y 15 días
Plazo con Prórroga: cuatro (04) meses y once (11) días
Fecha de Inicio: 18 de septiembre de 2025
Fecha de terminación: 16 de febrero de 2026
Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación
Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Gualilo Parte Alta, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 3 del municipio Bucaramanga.



Placa Huella en la Vereda Gualilo Parte Alta

VEREDA SAN PEDRO ALTO

Descripción de actividades desarrolladas

Contrato 211 del 04 de septiembre de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-016-2025 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE **SAN PEDRO ALTO** DEL CORREGIMIENTO UNO (1) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y ALCANTARILLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"

Valor del contrato: $328.790.410
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 3 meses y 15 días
Plazo con Prórroga: 5 meses y 24 días

Fecha de Inicio: 18 de septiembre de 2025
Fecha de terminación: 17 de abril de 2026
Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación
Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda San Pedro Alto, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 1 del municipio Bucaramanga.



Placa Huella en la Vereda San Pedro Alto


VEREDA PEDREGAL

Descripción de actividades desarrolladas

Contrato 212 del 04 de septiembre de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-013-2025 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL **PEDREGAL** DEL CORREGIMIENTO TRES (3) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER"

Valor del contrato: $762.467.825
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 3 meses y 15 días
Plazo con Prórroga: 6 meses y 15 días
Fecha de Inicio: 18 de septiembre de 2025
Fecha de terminación: 21 de abril de 2026
Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación
Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Pedregal, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 3 del municipio Bucaramanga.

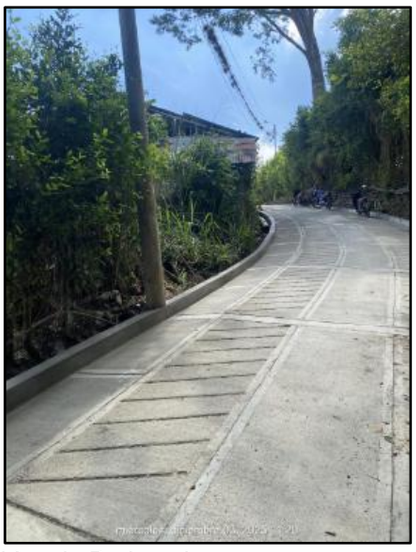Placa Huella en la Vereda Pedregal

VEREDA SAN JOSÉ

Descripción de actividades desarrolladas

Contrato 213 del 04 de septiembre de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-012-2025 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **SAN JOSE** DEL CORREGIMIENTO TRES (3) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER"

Valor del contrato: $762.467.825
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 3 meses y 15 días
Plazo con Prórroga: 6 meses y 15 días
Fecha de Inicio: 18 de septiembre de 2025
Fecha de terminación: 15 de abril de 2026
Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación
Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda San José, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 3 del municipio Bucaramanga.




Placa Huella en la Vereda San José

VEREDA EL ABURRIDO PARTE ALTA

Descripción de actividades desarrolladas

Contrato 214 del 04 de septiembre de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-015-2025 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **EL ABURRIDO PARTE ALTA**, DEL CORREGIMIENTO UNO (1) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y ALCANTARILLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"

Valor del contrato: $ 352.467.825
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 3 meses y 15 días
Plazo con Prórroga: 6 meses y 15 días
Fecha de Inicio: 22 de septiembre de 2025
Fecha de terminación: 10 de junio de 2026
Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación
Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda El Aburrido Parte Alta, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 1 del municipio Bucaramanga.



Placa Huella en la Vereda El Aburrido Parte Alta

VEREDA LOS SANTOS PARTE ALTA

Descripción de actividades desarrolladas

Contrato 220 del 12 de septiembre de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-014-2025 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA **LOS SANTOS PARTE ALTA** DEL CORREGIMIENTO DOS (2) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER"

Valor del contrato: $762.467.825
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 3 meses y 15 días
Plazo con Prórroga: 8 meses
Fecha de Inicio: 23 de septiembre de 2025
Fecha de terminación: 4 de junio de 2026
Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación

Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Los Santos Parte Alta, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 2 del municipio Bucaramanga.



Placa Huella en la Vereda Los Santos Parte Alta

VEREDA BOLARQUI ALTO

Descripción de actividades desarrolladas

Contrato 268 del 30 de octubre de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-017-2025con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BOLARQUI ALTO DEL CORREGIMIENTO DOS (2) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER"

Valor del contrato: $410.000.000
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 2 meses
Plazo con Prórroga: 9 meses
Fecha de Inicio: 11 de diciembre de 2025
Fecha de terminación: 21 de agosto de 2026
Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación
Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Bolarqui Alto, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 2 del municipio Bucaramanga.



Placa Huella en la Vereda Bolarqui Alto

VEREDA BOLARQUI BAJO

Descripción de actividades desarrolladas

Contrato 269 del 30 de octubre de 2025 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-018-2025con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BOLARQUI BAJO DEL CORREGIMIENTO DOS (2) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER"

Valor del contrato: $ 273.881.925
Valor del Anticipo: N/A
Plazo inicial: 2 meses
Plazo con Prórroga: 6 meses
Fecha de Inicio: 19 de noviembre de 2025
Fecha de terminación: 21 de mayo de 2026
Estado del contrato: Finalizado, en proceso de liquidación
Porcentaje Avance físico ejecutado: 100%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Bolarqui Bajo, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 2 del municipio Bucaramanga.



Placa Huella en la Vereda Bolarqui Bajo

SECTOR: Vivienda Ciudad y Territorio

PROGRAMA: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Beneficiar a 289.645 usuarios con subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en los estratos 1, 2 y 3.

Indicador	Meta 2026	Logro 2026	% Avance 2026	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Usuarios beneficiados con subsidios al consumo	289.645	289.645	100%	$ 52.002.872.943	$ 19.612.883.587	38%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Subsidios a los servicios púbicos de acueducto, alcantarillado y aseo a la población de estratos 1, 2 y 3 del Municipio de Bucaramanga.	202500000035595	$ 51.976.340.265,90	$ 101.596.696.836,73

Descripción de actividades desarrolladas

Durante el tercer trimestre de la presente vigencia la Secretaria de Infraestructura continúa realizado el pago de los subsidios a las diferentes empresas de servicios públicos, facturación enviada por la Unidad Técnica de Servicios Públicos detalle acumulado por empresas así:

EMPRESA	VALOR PAGADO
ACUEDUCTO	$ 2.677.620.634,00
EMPAS	$ 680.203.409
EMAB	$ 3.541.902.194,00
LIMPIEZA URBANA	$ 267.804.338,00
VEOLIA	$ 55.582.535,00
VALOR TOTAL	**$ 7.223.113.110,00**

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Transportar y entregar 18.000 metros cúbicos de Agua potable en carrotanques para garantizar el mínimo vital de agua en zonas sin cobertura del municipio.

Indicador	Meta 2026	Logro 2026	% Avance 2026	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Agua transportada y entregada	6.000	1549,4	26%	$ 150.000.000	$ 150.000.000	100%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA GARANTIZAR LA COBERTURA DEL MÍNIMO VITAL DE AGUA A LOS SECTORES DE LOS CORREGIMIENTOS 1,	2024680010053	$ 150.000.000	$ 538.055.514

2, Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER			

Descripción de actividades desarrolladas

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 038 DE 30 DE ENERO DE 2026: "SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA GARANTIZAR LA COBERTURA DEL MINIMO VITAL DE AGUA A LOS SECTORES DE LOS CORREGIMIENTOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

NÚMERO DEL CONTRATO:	038
FECHA DEL CONTRATO:	30/01/2026
TIPOLOGÍA DEL CONTRATO O CONVENIO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO.
MODALIDAD DE SELECCIÓN DE CONTRATO:	CONTRATACIÓN DIRECTA.
CONTRATISTA:	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. ESP.
PLAZO EJECUCIÓN:	DIEZ (10) MESES.
VALOR INICIAL:	$150.000.000,00
FECHA DE INICIO:	16 DE ABRIL DE 2026.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	10 DE FEBRERO DE 2027.
SUPERVISIÓN MUNICIPIO BUCARAMANGA:	HENRY MERCHÁN MORENO.
SUPERVISIÓN amb:	CARLOS EDUARDO MANTILLA BARRAGAN.
Estado del Contrato:	EN EJECUCIÓN.

ESTADO FINANCIERO:

Valor del Contrato:	**$ 150.000.000.00**
Valor pagado:	**$ 0.00**

Porcentaje avance físico: 9 % (Se han entregado 467.4 m3 de agua potable de un estimado de 5.195 m3 de agua potable).

Nota: El Contratista no ha tramitado Acta de ejecución. A la fecha se encuentran en trámite de aprobación de pólizas actualizadas del Acta de Inicio.

Ubicación:

- Sector Chitota.
- Asentamiento Villa Carmelo
- El Porvenir, Los Cuadros.
- Vereda San Ignacio.

Impacto: Este proyecto impacta a 682 familias del sector rural del Municipio de Bucaramanga.

Beneficios para la Comunidad:
El Artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece que son fines esenciales del Estado; servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilita la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia política y la vigilancia de un orden justo(…)



Imagen No 1. Suministro de agua potable Villa Carmelo



Imagen No 2. Vereda los Santos Bajos





Imagen No 3. Sector Chitota



Imagen No 4. Estación Carabineros

3. LINEA ESTRATEGICA 3. TERRITORIO SEGURO Y SOSTENIBLE

SECTOR: Vivienda Ciudad y Territorio

PROGRAMA: Ordenamiento Territorial y Desarrollo urbano

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Adecuar 300,000 metros cuadrados de espacio púbico.

Indicador	Meta 2026	Logro 2026	% Avance 2026	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal

Espacio público adecuado	119.276	27500	23%	$ 105.921.219.034	$ 22.020.599.059	21%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES EQUIPAMIENTO Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	2024680010045	$ 3.013.740.065	$ 3.745.306.988

Descripción de actividades desarrolladas

CONTRATO DE OBRA 065 DEL 2026- "MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS EQUIPAMIENTO Y ESPACIO PÚBLICO DEL

Presupuesto Inicial Obra: $ 2.735.880.690
Presupuesto Inicial interventoría: $277.869.375
Plazo de ejecución: 6 meses 10 días
Modificaciones Contractuales:

- Prorroga No 1 del 3 de agosto de 2026, (1 mes)
- Prorroga 2 del 3 de septiembre de 2026 (10 días)
- Prorroga No 2 y Adición No 1 del 11 de septiembre de 2026 (2 meses y 1.514 Millones

Fecha de inicio: 04 de mayo de 2026
Fecha de terminación: 03 de agosto de 2026
Nueva fecha de terminación: 13 de noviembre de 2026
Porcentaje avance: 56,5%
Gestión Financiera: Pago Cuenta cobro parcial No 1 de Obra por $444.757.273,00 y Cuenta No 1 de interventoría por $51.394.579.37

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en ejecución. Con avances significativos en varias de las actividades programadas. A continuación, se presenta el detalle de las actividades principales ejecutadas a la fecha:

Polideportivo Parque hacienda San Juan (Intervención finalizada):

- Construcción de canal perimetral y retiro de grama sintética
- Fundición de placa para cancha de minibaloncesto
- Mantenimiento a cerramiento en varilla y reemplazo de malla eslabonada
- Construcción de muro faltante e instalación de estructura metálica de baloncesto.

Parque Cra 33 Club Unión (Intervención Finalizada):

- Demolición y fundición de losa de concreto frente al monumento
- Construcción de pasos peatonales de acceso a la losa principal.
- Sustitución y cambio de losetas lisas en sendero peatonal
- Mantenimiento general de losas existentes en zonas comunes

Parque Carrera 33 # 55 (Intervención Finalizada)

- Instalación de loseta podo táctil
- Tala de 2 individuos arbóreos

Parque Simón Bolívar (81% de avance)

- Sistema de riego
- Sustitución de andén perimetral según especificaciones MEPB
- Cambio integral de bordillo en gres
- Reemplazo de loseta cuadrática prepulida
- Adecuación y reposición de losas en senderos internos

- Adecuación de bordillos
- Suministro e Instalación de Juego infantil
- Suministro e Instalación de rueda
- Suministro e Instalación de equipos biosaludables
- Suministro e Instalación de grama sintética

Actividades pendientes:
- Instalación de luces centrales decorativas.

Parque Cristo Rey (78% de avance)
- Cambio de cerramiento, andén y canal.
- Construcción de placa biosaludables,
- entrega de equipos, pañete y pintura en muro adyacente a la cancha.
- Suministro e Instalación de juego infantil
- Suministro e Instalación de rueda infantil

Parque Giordano Bruno (18% de avance)
- Fundición de bancas en concreto
- Tala de 1 individuo arbóreo
- Resane general en dados de concreto
- Adecuación general de andenes en concreto

Actividades pendientes:
- Suministro e instalación de 12 equipos de gimnasio al aire libre
- Instalación de juego multiplataforma, carrusel y resbaladero
- Arreglo de bordillos

Parque de los Niños (17% de avance)
- Retiro de cerramiento deteriorado.
- Retiro de piso amortiguante deteriorado

Actividades pendientes:
- Retiro y reposición de cerramiento en madera para mayor seguridad
- Suministro e instalación de kit nuevo de 3 juegos infantiles
- Instalación de piso amortiguante de alta densidad tipo *Shockpad*
- Suministro e instalación de bancas en madera urbana
- Reposición de losetas de concreto anticado en áreas con deterioro físico.

Parque de la Vida (62% de avance)
- Mantenimiento preventivo y correctivo en el cerramiento existente.
- Tratamiento de podas radiculares e instalación de contenedores de raíces
- Suministro e Instalación de 12 máquinas de gimnasio biosaludable

Actividades pendientes
- Suministro e instalación de kit infantil de 3 juegos + piso Shockpad
- Reparación de senderos peatonales, gaviones e instalación de rejillas

Parque José de San Martín (Las Palmas) (0% de avance)
- Reemplazo total del piso en la plazoleta de cuenteros.
- Suministro e instalación de kit infantil (3 juegos) con piso de impacto
- Instalación de adoquín decorativo tipo corbatín
- Construcción de rampa en concreto para accesibilidad universal.

Parque Bosque Encantado (19% de avance)
- Mantenimiento integral a pasamanos en senderos peatonales
- Aplicación de anticorrosivo, masilla y pintura de protección.
- Refuerzo estructural con platinas y varillas de 1/4".
- Cambio de piso en estructura tipo deck.

Actividades pendientes
- Mantenimiento y puesta a punto de columpios
- Suministro e instalación de 2 asientos de plástico caucho con insertos metálicos.
- Instalación de cadenas nuevas en acero galvanizado
- Trabajos de soldadura, masillado y pintura anticorrosiva.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Construcción cancha de mini básquet Polideportivo Hacienda San Juan



Parque Club Unión carrera 33 con 51



Parque carrera 33 con 55



Parque Bolívar



Parque Giordano Bruno



Parque de los Niños



Parque de la vida



Parque Bosque Encantado

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE REVERDECIMIENTO INTEGRAL, RECUPERACIÓN E INSTAURACIÓN DE COMPONENTES VERDES, MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA DE ESPACIO PÚBLICO, PARA MEJORAMIENTO DEL ENTORNO PÚBLICO Y LA SEGURIDAD EN SECTORES DE LAS COMUNAS 6 Y 12 EN EL SECTOR DE LA PUERTA DEL SOL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	202600000015494	$ 9.919.840.377,50	$ 9.919.840.377,50

Descripción de actividades desarrolladas

Contrato **No.205** de 30 de septiembre de 2026 – **CONTRATO DE OBRA**: Mediante el proceso SI-SI-LP-007-2026, con objeto “IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE REVERDECIMIENTO INTEGRAL, RECUPERACIÓN E INSTAURACIÓN DE COMPONENTES VERDES, MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA DE ESPACIO PÚBLICO, PARA MEJORAMIENTO DEL ENTORNO PÚBLICO Y LA SEGURIDAD EN SECTORES DE LAS COMUNAS 6 Y 12 EN EL SECTOR DE LA PUERTA DEL SOL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.

Valor del contrato: $9.254.796.776,00
Plazo inicial: 3 meses y 15 días.
Fecha de Inicio: Por iniciar
Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2026
Estado del contrato: Adjudicado
Porcentaje Avance físico ejecutado: 0%

- **Ubicación del Proyecto**

El proyecto denominado “IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE REVERDECIMIENTO INTEGRAL, RECUPERACIÓN E INSTAURACIÓN DE COMPONENTES VERDES, MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA DE ESPACIO PÚBLICO, PARA MEJORAMIENTO DEL ENTORNO PÚBLICO Y LA SEGURIDAD EN SECTORES DE LAS COMUNAS 6 Y 12 EN EL SECTOR DE LA PUERTA DEL SOL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA” se desarrolla en el área urbana de las comunas 6 y 12 en el sector la Puerta del Sol de la jurisdicción municipal.

Las actividades de intervención se ejecutarán de manera planificada y sectorizada sobre los diferentes sectores, priorizados conforme a criterios técnicos y requerimientos.

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
ADECUACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO Y EQUIPAMIENTO DE LA SALLE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"	202600000011370	$ 731.519.884,00	$ 731.519.884,00

Descripción de actividades desarrolladas

Contrato 202 del 26 de septiembre de 2026 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CDCS-013-2026 con el objetivo de "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL, DEL BARRIO LA SALLE COMUNA 6; PARA LA ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTO PRIORIZADO MEDIANTE EL EJERCICIOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS"

Valor del contrato: $ 738.166.335
Plazo inicial: 3 meses
Fecha de Inicio: Por iniciar
Fecha de terminación: 31 de noviembre de 2026
Porcentaje Avance físico ejecutado: 0%

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en el barrio La Salle, área urbana del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, en la comuna 6 del municipio Bucaramanga.

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL BORDE SUR LA VICTORIA EN EL BARRIO LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	2023680010007	$ 12.918.441.253,19	$ 14.311.927.587,00

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 184 DE 2023: "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BORDE SUR LA VICTORIA EN EL BARRIO LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"

NÚMERO CONTRATO 184 - 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO LA VICTORIA II
NIT: 901.728.026-5
VALOR INICIAL: $12.918.441.253,19
ANTICIPO (%): $3.875.532.375,96 equivalente al 30%
VALOR ADICIONAL: N.A.

La CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BORDE SUR LA VICTORIA EN EL BARRIO LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER, obedece con los siguientes objetivos del sistema de espacio público urbano, así:

- Generar y adecuar áreas verdes y parques en las distintas escalas, para el desarrollo de actividades recreacionales, de forma tal que se potencien beneficios ambientales y urbanísticos.
- Establecer la interconexión espacial y funcional de los elementos de la estructura ecológica principal urbano-rural, especialmente los escarpes oriental y occidental, a través de corredores, parques y ejes ambientales integrando los ecosistemas con la ciudad construida.
- Generar espacios públicos de encuentro, convivencia y cohesión comunitaria para el ejercicio de la democracia, el libre desarrollo cultural, recreativo, comunitario y social.

- Proporcionar áreas de carácter multifuncional que permitan la interacción de los ciudadanos, a través de los servicios, la disposición de mobiliario urbano, la implantación de arborización adecuada, la accesibilidad al medio físico, zonas verdes y demás elementos que propicien una estancia agradable para el ciudadano.

Es importante señalar que el espacio público de la ciudad tanto en sus elementos físicos como sociales definen y determinan la calidad de vida de los ciudadanos, por lo cual, este se encuentra conectado de forma directa con el modelo de ciudad que vivimos, entendiéndose que no sólo es importante y relevante tener más y mejores espacios públicos en la ciudad, sino que también resulta importante tener en cuenta las condiciones físicas de nuestro espacio público efectivo, el cual debe estar en óptimas condiciones para que todos los ciudadanos puedan gozar, disfrutar y acceder a los espacios públicos en condiciones físicas, bióticas y de seguridad aceptables para que todos los ciudadanos puedan hacer uso de ellos, pues los estos permiten y garantizan lugares de encuentro para el desarrollo de nuestra vida social y en comunidad.

ESTADO DEL CONTRATO: SUSPENDIDO

N° DE RP Y FECHA INICIAL	**8336 de 13 de julio de 2023**
VALOR TOTAL	$ 12.918.441.253,19
PLAZO INICIAL	6 MESES
PLAZO ADICIONAL N° 1	6 MESES
PLAZO ADICIONAL No. 02	3,5 MESES
PLAZO TOTAL	15,5 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	Agosto 08 de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No 1	Febrero 06 de 2024
AMPLIACION No 1 A LA SUSPENSIÓN No 1	Abril 05 de 2024
AMPLIACION No 2 A LA SUSPENSIÓN No 1	Mayo 03 de 2024
AMPLIACION No 3 A LA SUSPENSIÓN No 1	Diciembre 06 de 2024
AMPLIACION No 4 A LA SUSPENSIÓN No 1	Abril 04 de 2025
FECHA REINICIO No 1	Octubre 06 de 2025
FECHA SUSPENSIÓN No 2	Diciembre 31 de 2025
FECHA REINICIO No 2	Enero 2 de 2026
FECHA DE SUSPENSION No. 03	Abril 04 de 2026
AMPLIACION No. 01 SUSPENSION No. 03	Mayo 6 de 2026
AMPLIACION No. 02 SUSPENSION No. 03	Mayo 21 de 2026
FECHA DE REINICIO No.03	Junio 03 de 2026
PRORROGA	Junio 04 de 2026
SUSPENSION No. 04	Septiembre 17 de 2026
FECHA TERMINACION	Septiembre 19 de 2026
PORCENTAJE AVANCE	70% EJECUTADO FISICO

FISICO: A la fecha de corte del presente informe del 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026, se tiene los siguientes indicadores frente a la PROGRAMACION DE PROJECT con un acumulado programado del 96% contra un ejecutado acumulado de 70%, presentándose un atraso del 26%.

OBSERVACIONES: Se solicitó por parte del contratista de obra e interventoría un adicional en tiempo y recursos.

PROBLEMÁTICAS: El contrato a la fecha presenta un atraso del 26%, no se ha iniciado proceso administrativo sancionatorio.

ESTADO FINANCIERO: Suspendido avance físico 70% avance financiero 28%
VALOR ANTICIPO: $3.875.532.375,96 equivalente al 30%
AMORTIZACION DE ANTICIPO: $1.171.237.004

AVANCE POR FRENTES

FRENTE	INVERSIÓN INICIAL %	ESTADO	% AVANCE	ACTIVIDADES EJECUTADAS
Consorcio la victoria II	0%	SUSPENDIDO	70 %	1.3 DEMOLICIONES 1.3.3 Demolición placa de piso en general con compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final (incluye pisos, rampas en concreto, adoquín, losa, tableta y cualquier otro tipo de acabado) 1.3.4 Demolición de sardineles y /o bordillos en concreto con compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final 1.4 EXCAVACIONES 1.4.1 Excavación manual en material común en seco, incluye cargue, retiro y disposición final 1.5 RELLENOS 1.5.2 Relleno con material seleccionado, compactación mecánica con apisonador 2. Concretos 2.1. Cimentación 2.1.1 Solado de limpieza en concreto 1500 PSI mezclado en sitio 2.1.2 Concreto ciclópeo 60% concreto 2500 PSI mezclado en sitio y 40% piedra rajon 2.1.4 Dados de cimentación en concreto 3000 PSI mezclado en sitio 2.3. Columnas y muros 2.3.2 Muro en concreto 3000 PSI mezclado en sitio, altura máxima 5 m 2.4.4 Sardinel tipo A-10 prefabricado en concreto, achaflanado de 0.20 x 0.50 x 0.80 m 3. Aceros y Estructuras Metálicas 3.1. Aceros de refuerzo y estructuras metálicas 3.1.1 Acero de refuerzo figurado 3.1.2 Malla electro soldada 3.1.3 Estructura metálica en acero estructural con acabado en pintura anticorrosiva y acabado epóxico para superficies metálicas de exterior 6. Red alcantarillado 6.2. Tuberías drenajes 6.2.1 Suministro e instalación de tubería tipo kananet diámetro 6" 19 Sistema eléctrico 19.2 Canalización de baja tensión 9.2.2 Suministro, transporte e instalación de Banco de ducto 2x1-1/2" PVC conduit tipo pesado. 21 ITEMS NO PREVISTOS • NP 12. Suministro en instalación de bordillo recto prefabricado de 20x35X80, no incluye excavación. NP 20. Caisson en concreto 3000 PSI, con D=1,20 a cualquier profundidad, incluye izaje y colocación de canastilla, no incluye ítem de acero NP 21. Construcción de anillos externos en concreto de 2500 PSI para estabilización de excavación, D=1.20 espesor de pared e=10 cm, incluye la excavación, incluye acero de refuerzo. NP 24. Suministro e instalación de geodren tubular con capuchón para tubería perforada de 6" y/o geodren planar, no incluye tubería. No incluye zanja ni relleno. NP 26. Lloraderos en tubería de tubería de 2" para muros de contención.

ANEXO FOTOGRAFICO



Visita de Obra Parque Borde Sur La Victoria

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
ADECUACION DE ESPACIO PUBLICO EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNIICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	2024680010050	$ 24.134.607.023	$ 45.114.109.841,13

Descripción de actividades desarrolladas

CONTRATO DE OBRA 105 de fecha 20 de junio de 2025 -: CONSORCIO ESPACIOS BGA "ADECUACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER".

VALOR INICIAL:	$ 16.317.394.434, 13
VALOR ADICIONAL N° 1:	$ 6.919.976.498,00
VALOR ADICIONAL N° 2:	$ 2.783.384.571,00
VALOR TOTAL CON ADICIONALES:	$ 26.020.755.503,13
PLAZO INICIAL:	PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025).
PLAZO ADICIONAL N° 1:	NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL N° 2:	NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL N° 3:	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL CON ADICIONALES:	ONCE (11) MESES Y DIECIOCHO (18) DÍAS
PORCENTAJE AVANCE:	100 %
ESTADO CONTRATO:	finalizado
FECHA DE INICIO:	11/08/2025
FECHA DE FINALIZACION:	19/09/2026
CONTRATISTA	Consorcio Espacios BGA
INTERVENTORÍA	Consorcio Inter Urbanismo BGA
SUPERVISOR	Jaime Alberto Ruiz Yépez

De acuerdo con el análisis de avance físico y financiero correspondiente al presente trimestre, se consolida el estado de ejecución general del proyecto:

- Estado Acumulado Global:
- Ejecución Financiera Acumulada: 100 % del presupuesto total asignado.
- Ejecución Física General: 100 % de la meta programada.
- Total, de Barrios Intervenidos: 93 barrios completados de manera satisfactoria.

RELACIÓN DE BARRIOS EJECUTADOS (93 BARRIOS)
A continuación, se detalla la lista de los barrios que alcanzaron el 100 % de ejecución:


N	Barrio	N°	Barrio
1	Colorados	48	El Prado
2	Villas de San Ignacio	49	Esperanza I
3	Paisajes del Norte	50	Tejaditos
4	San Cristobal	51	Quintadania
5	Transición I	52	Los Pinos
6	Transición V	53	La Libertad
7	Estoraques I	54	Mejoras publicas
8	Villa Flor	55	San Alonso
9	Esperanza III	56	Morrorico
10	Modelo	57	Centro
11	Alarcon	58	Granjas de Julio Rincon
12	Mutualidad	59	Balcon del Lago
13	San Francisco	60	Tejar
14	12 de Octubre	61	Mutis
15	23 de Junio	62	Garcia Rovira
16	Bolivar	63	Estoraques II
17	Primero de mayo	64	Colseguros Norte
18	Chorreras de Don Juan	65	Minuto De Dios
19	Alfonso Lopez	66	Villa Mercedes
20	Los Cedros	67	Alarcón
21	Ricaurte	68	La Victoria
22	Ciudad Bolivar	69	Real De Minas (Sector
23	Macaregua	70	Juan XXIII
24	Samanes	71	Villa Inés
25	Bolarqui	72	Manuela Beltrán
26	San Marcos	73	Porvenir
27	Almendros	74	Sotomayor
28	San Gerardo	75	Antiguo Campestre
29	La Pedregosa	76	Conucos
30	San Martin	77	Pinos
31	La Victoria	78	Galán - Quintadania *
32	Asturias 2	79	Sauces
33	San Pedro	80	García Rovira
34	Provenza	81	Altos Del Cacique
35	Viveros de Provenza	82	Estoraques 1
36	Villa Helena	83	Bolarquí
37	El Jardin	84	Mercedes
38	Campo Hermoso	85	Plaza mayor
39	Igsabelar	86	Dangond
40	Delicias Altas	87	Los Angeles
41	Malpaso	88	Nueva Granada
42	La Aurora	89	La Ceiba
43	Toledo Plata	90	Mejoras públicas
44	Candado	91	Mutualidad
45	Conucos	92	Diamante II
46	Antiguo Campestre	93	La Aurora
47	Mercedes		


REGISTRO FOTOGRAFICO







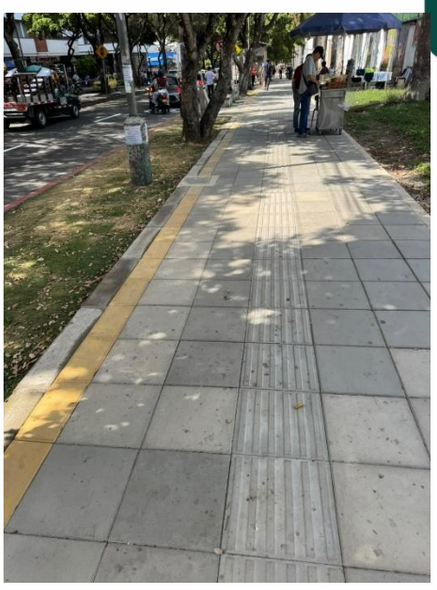


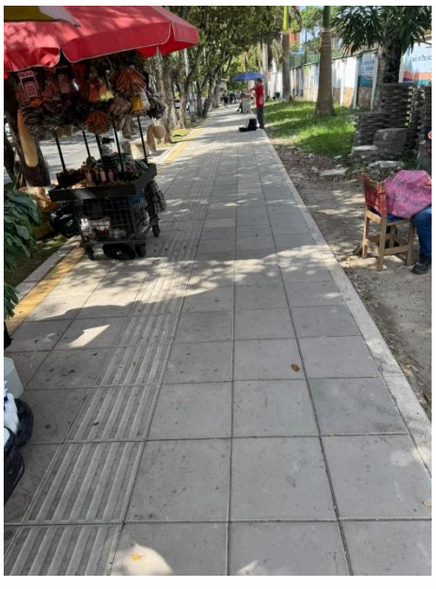







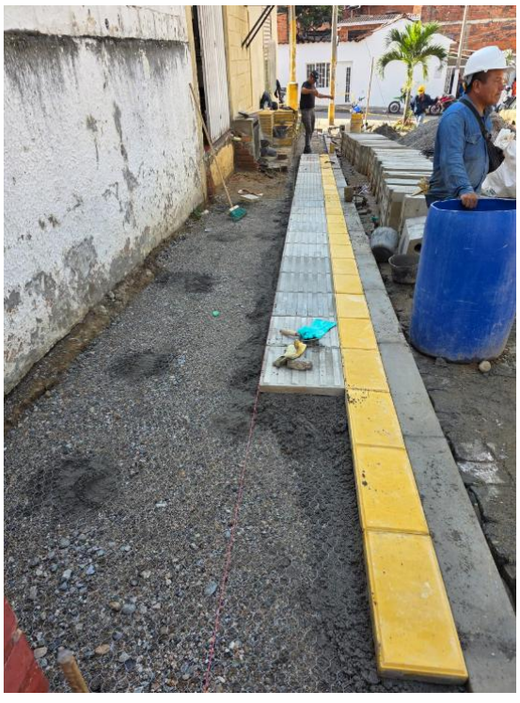



META E INDICADOR DE PRODUCTO: Mantener 100 parques en el municipio

Indicador	Meta 2026	Logro 2026	% Avance 2026	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Parques mantenidos	30	23	77%	$ 22.874.831.922	$ 16.755.321.624	73%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	202500000031111	$12.237.806.605,00	$10.835.829.108

CONTRATO No.113 DE 2026: “MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”

N° DE RP Y FECHA INICIAL	113 del19 de junio de 2026f
VALOR	$10.835.829.108
PLAZO INICIAL	6 MESES
PLAZO TOTAL	6 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	Julio 22 de 2026
FECHA TERMINACION	Diciembre 31 de 2026
PORCENTAJE AVANCE	38% EJECUTADO FISICO

CONTRATO No.128 DE 2026: “INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA OBRA PUBLICA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”

N° DE RP Y FECHA INICIAL	128 del 9 de julio de 2026
VALOR	$1.400.763.506,00
PLAZO INICIAL	6 MESES
PLAZO TOTAL	6 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	Julio 22 de 2026
FECHA TERMINACION	Diciembre 31 de 2026
PORCENTAJE AVANCE	38% EJECUTADO FISICO

A través de este proyecto se busca preservar el bienestar de la comunidad mediante intervenciones programadas en parques, áreas verdes, mobiliario urbano y demás elementos que conforman el espacio público, promoviendo entornos seguros, accesibles y adecuados para el uso ciudadano.

El proyecto comprende la ejecución de diversas actividades orientadas a la recuperación y mantenimiento de la infraestructura existente, tales como la limpieza, reparación, adecuación y renovación de elementos deteriorados por el uso continuo, las condiciones ambientales y el paso del tiempo. Dentro de estas intervenciones se incluyen acciones sobre mobiliario urbano, como bancas, papeleras, jardineras, gimnasios al aire libre y juegos infantiles, así como labores de mantenimiento en senderos peatonales, superficies duras, cerramientos y demás componentes que contribuyen a la funcionalidad y seguridad de estos espacios.

El proyecto contempla un enfoque integral, combinando esfuerzos técnicos, económicos y sociales para maximizar los beneficios. Se implementarán inspecciones periódicas y evaluaciones técnicas para identificar necesidades prioritarias y planificar intervenciones de manera eficiente, optimizando los recursos disponibles. Además, se prioriza el uso de materiales sostenibles y técnicas amigables con el medio ambiente, promoviendo la sostenibilidad y minimizando el impacto ecológico.

Los beneficios esperados del proyecto son significativos e impactan directamente en la calidad de vida de los habitantes del municipio de Bucaramanga. Un espacio público bien mantenido no solo mejora la percepción visual de la ciudad, sino que también fomenta la convivencia, el ocio, la práctica de actividades deportivas y culturales, y el fortalecimiento del tejido social. Además, contribuye a la seguridad al garantizar que las infraestructuras sean funcionales y seguras para su uso

AVANCE FISICO: A la fecha de corte del presente informe del 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026, se tiene los siguientes indicadores frente a la PROGRAMACION DE PROJECT con un acumulado programado del 22 % contra un ejecutado acumulado de 38%, presentándose un adelanto del 16%.

Actualmente se cuenta con 8 frentes de trabajo de los 38 proyectos a ejecutar en el marco del contrato:

No.	Frente No.	PARQUE	Estado	% Avance
1	1	Parque Diamante 1	En Ejecución	43,72%
2	2	Glorieta CAI Metropolitano	En Ejecución	57,33%
3	3	Parque La Rosita	En Ejecución	47,50%
4	4	Parque San Miguel Jose Maria	En Ejecución	51,43%
5	5	Parque Álvarez	En Ejecución	24,53%
6	6	Intersección Barrio Conucos La Flora	En Ejecución	32,13%
7	7	Parque Palmas Del Mutis	En Ejecución	30,56%
8	8	Parque Sol De Venados	En Ejecución	16,99%
9		Parque Colegio El Pablón	Por Ejecutar	
10		Parque Barrio Bucaramanga M10	Por Ejecutar	
11		Parque Tres Canchas	Por Ejecutar	
12		Parque Colseguros Glorieta Norte	Por Ejecutar	
13		Parque CAI La Victoria	Por Ejecutar	
14		Parque Las Llantas C	Por Ejecutar	
15		Parque La Parabólica	Por Ejecutar	
16		Parque Las Cigarras	Por Ejecutar	
17		Parque Las Palomas	Por Ejecutar	
18		Parque Kennedy La 19	Por Ejecutar	
19		Parque La Esperanza 2	Por Ejecutar	
20		Parque Ciudad Bolivar	Por Ejecutar	
21		Parque La Libertad	Por Ejecutar	
22		Parque Los Sarrapios	Por Ejecutar	
23		Parque Coaviconsa	Por Ejecutar	
24		Parque Estoraques	Por Ejecutar	
25		Parque Gaitán	Por Ejecutar	
26		Parque Comedor Infantil La Joya	Por Ejecutar	
27		Parque Gimnasio Quinta Estrella	Por Ejecutar	
28		Parque Girardot	Por Ejecutar	
29		Parque Hacienda San Juan Bosques Del Cacique	Por Ejecutar	
30		Glorietas (Dos) Sector Plaza Mayor	Por Ejecutar	
31		Glorieta Antonia Santos	Por Ejecutar	
32		Glorieta Barrio Mejoras Públicas	Por Ejecutar	
33		Boulevard Cacique	Por Ejecutar	
34		Lateral Club Unión	Por Ejecutar	
35		Triángulo CAI Sotomayor	Por Ejecutar	
36		Parque San Pio	Por Ejecutar	
37		Parque Ferrocarriles	Por Ejecutar	
38		Parque Fontana Real	Por Ejecutar	

ACTIVIDADES REALIZADAS POR FRENTE DE TRABAJO:

1. **Frente PARQUE DIAMANTE 1**
   Avance: 43.72%
   Ubicación: Calle 105K 30 PAR
   Actividades en ejecución:
   - Instalación de sardineles prefabricados.
   - Instalación de losetas de espacio público.
   - Instalación de acero de Refuerzo.
   - Realce de tapas eléctricas.
   - Construcción de muro en concreto.
   - Construcción de bordillo en concreto.
   - Inicia construcción de placa en concreto para zona de juegos







2. **Frente CAI METROPOLITANO**
   Avance: 57.33%
   Ubicación: Carrera 29 #90 – 10
   Actividades en ejecución:
   - Instalación de sardineles prefabricados.
   - Instalación de losetas de espacio publico.




3. **Frente PARQUE LA ROSITA**
   Avance: 47.50%
   Ubicación: Avda La Rosita con Calle 30
   Actividades en ejecución:
   - Instalación de losetas de concreto 40 x 40
   - Instalación de acero de refuerzo
   - Construcción de bordillos en concreto
   - Construcción de placas de concreto
   - Podas radiculares

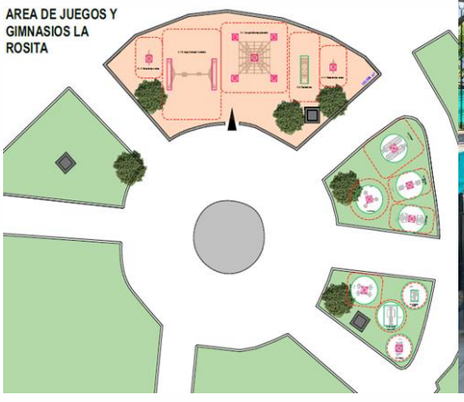

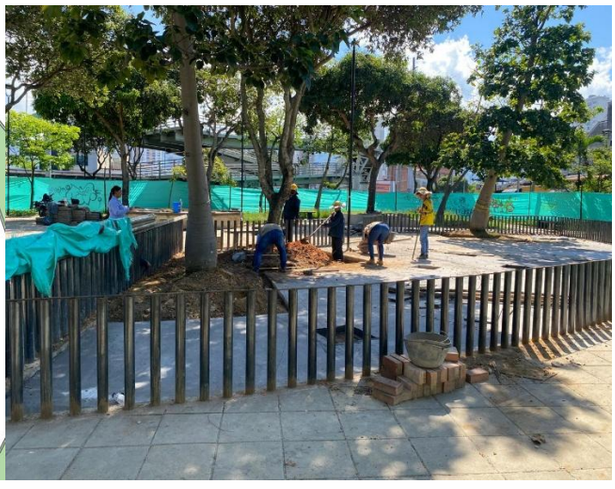

4. **Frente PARQUE SAN MIGUEL**
   Avance: 51.43%
   Ubicación: Calle 50 con Carrera 15
   Actividades en ejecución:
   - Instalación de losetas de concreto 40 x 40
   - Instalación de acero de refuerzo
   - Desmonte de cerramientos en malla eslabonada
   - Demolición de muros en mampostería y columnetas de cerramiento
   - Construcción de bordillos en concreto
   - Construcción de andenes de concreto

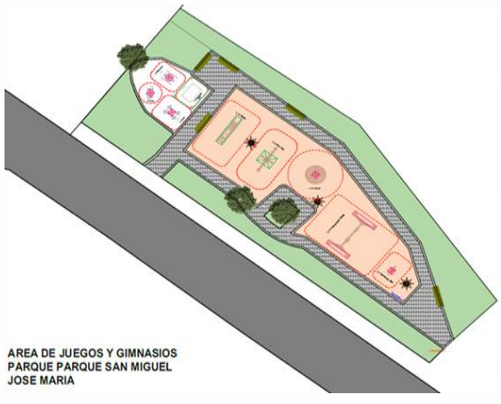



5. **Frente PARQUE ALVAREZ**
   Avance: 24.53%
   Ubicación: Carrera 38 con Calle 33
   Actividades en ejecución:
   - Demolición de andenes interiores y bordillos existentes
   - Instalación de sardineles nuevos para andenes de espacio público
   - Instalación de adoquín para senderos interiores
   - Aplicación de base y compactación






6. **Frente Intersección Conucos**
   Avance: 32.13%
   Ubicación: Carrera 33 con Calle 68
   Actividades en ejecución:
   - Demolición de sardinel existentes
   - Instalación de sardineles nuevos
   - Instalación de losetas espacio publico
   - Relleno y granular





7. **Frente PALMAS DEL MUTIS**
   Avance: 30.56%
   Ubicación: Carrera 7W con Calle 55
   Actividades en ejecución:
   - Demolición de placa en concreto.
   - Replanteo con topografía de maquinas de gimnasio nuevas

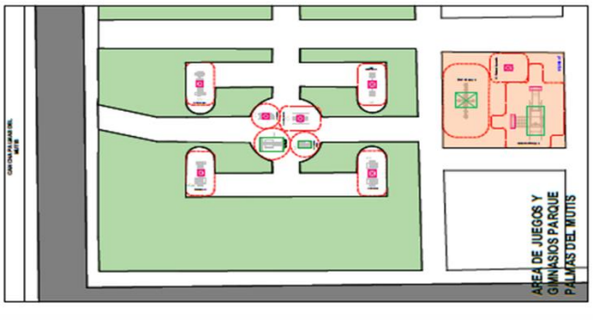



8. **Frente PARQUE SOL DE VENADOS**
   Avance: 16.99%
   Ubicación: Carrera 7W con Calle 57
   Actividades en ejecución:
   - Demoliciones de andenes de espacio público y senderos internos del parque.
   - Demolición de bancas en ladrillo existente.
   - Podas aéreas de árboles existentes para posterior poda reticular





Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
UMINISTRO DE INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	202600000010465	$793.138.267,00	$793.138.267,00

CONTRATO No.105 DE 2026: “SUMINISTRO DE INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”

A través del proyecto de suministros de insumos, equipos y herramientas para el mantenimiento y mejoramiento del espacio público del municipio de Bucaramanga, la Secretaría de Infraestructura atiende las situaciones que generan riesgo para la integridad de los usuarios que afectan la funcionalidad de las estructuras y en donde se evidencie la necesidad de intervención por falta de mantenimiento periódico así como acciones de mantenimiento preventivo y correctivo tales como limpieza general, adecuación y nivelación de superficies, resanes estructurales, aplicación de tratamientos corrosivos, reposición o instalación de elementos de seguridad como son pasamanos y demás intervenciones necesarias, con el fin de restablecer las condiciones de seguridad, estabilidad y adecuada prestación del servicio del espacio público en cumplimiento con los lineamientos de conservación y mantenimiento de la infraestructura del municipio.

Junto con el equipo de la cuadrilla del alcalde se contribuye a mejorar los tiempos de ejecución, la calidad técnica de las intervenciones y la cobertura territorial de las acciones de mantenimiento, garantizando una gestión más eficiente, trazable y alineada con los principios de economía, planeación y responsabilidad en el gasto público.

ESTADO DEL CONTRATO: En ejecución

CONTRATISTA:	JEM SUPPLIES SAS
	NIT: 900370262
	JORGE ENRIQUE MENDEZ CALDERON

VALOR INICIAL:	$ 793.138.267,00
VALOR TOTAL:	$ 793.138.267,00
PLAZO INICIAL:	(5) Cinco Meses y (24) Veinticuatro Días
PLAZO TOTAL:	(5) Cinco Meses y (24) Veinticuatro Días
FECHA DE INICIO:	7/07/2026
FECHA DE FINALIZACION FINAL:	30/12/2026
FECHA TERMINACIÓN FINAL:	30/12/2026
AVANCE FINANCIERO:	0%

Desde el mes de julio de 2026 se inició el trámite correspondiente al primer pedido de suministros del contrato, cuya entrega se ha realizado de manera parcial durante los meses de agosto y septiembre de 2026, de acuerdo con la disponibilidad y programación de los elementos requeridos.

De manera paralela, la supervisión ha venido adelantando las actividades de revisión, verificación y recibo de los suministros entregados, así como la correspondiente elaboración y suscripción de los documentos de entrega a satisfacción, previa comprobación de las cantidades, características y condiciones de los elementos recibidos.

La población beneficiada corresponde a la comunidad en general del municipio de Bucaramanga, especialmente a los habitantes y usuarios de parques, zonas recreativas, escenarios deportivos y demás espacios públicos que requieren actividades permanentes de mantenimiento y adecuación.

De manera indirecta, el contrato contribuye al mejoramiento de las condiciones de funcionalidad, conservación, seguridad y aprovechamiento de los espacios públicos, favoreciendo el uso adecuado de estos lugares por parte de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y demás habitantes del municipio.

RESUMEN FOTOGRÁFICO



Foto 1 – Recepción de Pinturas

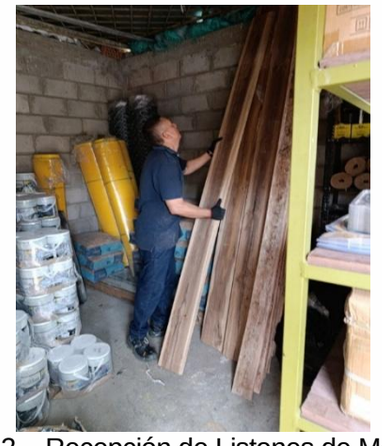


Foto 2 – Recepción de Listones de Madera



Foto 3 – Almacenamiento en la bodega



Foto 4 – Recepción de suministros

CUADRILLA DEL ALCALDE. A la fecha se han intervenido un total de 124 lugares

No.	LUGAR	No.	LUGAR
1	BARRIO LA GLORIA	63	PARQUE BARRIO CRISTAL
2	BARRIO LA INMACULADA	64	PARQUE BARRIO DANGON
3	BARRIO ALVAREZ	65	PARQUE BARRIO SAN LUIS
4	BARRIO ANTONIA SANTOS SUR	66	PARQUE BOSQUES DEL CACIQUE
5	BARRIO ASTURIAS	67	PARQUE BRISAS DEL MUTIS
6	BARRIO BOMBONERA	68	PARQUE CLAVERIANO
7	BARRIO BUCARAMANGA	69	PARQUE CONUCOS
8	BARRIO BUENOS AIRES	70	PARQUE CRISTAL BAJO
9	BARRIO COMUNA	71	PARQUE DE LOS NIÑOS
10	BARRIO LA CONCORDIA	72	PARQUE DE PROVENZA
11	BARRIO LUZ DE SALVACION	73	PARQUE DIVINO PORVENIR
12	BARRIO MANUELA BELTRAN	74	PARQUE ESTORAQUES
13	BARRIO NARIÑO	75	PARQUE EXTREMO INDERBU
14	BARRIO SAN LUIS	76	PARQUE FONTANA
15	BARRRIO CRISTO REY	77	PARQUE GIRARDOT
16	BOSQUES DEL CACIQUE	78	PARQUE LA CEIBA
17	BRISAS DEL MUTIS	79	PARQUE LA JOYA
18	CAFÉ MADRID	80	PARQUE LA LIBERTAD
19	CAMPO HERMOSO	81	PARQUE LA VIRGEN
20	CAMPO MADRID	82	PARQUE LAGOS DEL CACIQUE
21	CANALETAS LAGOS DEL CACIQUE	83	PARQUE LEONES
22	CANCHA BARRIO PORVENIR	84	PARQUE LOS ABUELOS
23	CANCHA COSMOS	85	PARQUE MOJARRAS
24	CANCHA GIRARDOT	86	PARQUE MOJARRAS (PUERTA)
25	CANCHA KENEDY	87	PARQUE PASEO DE LA FERIA
26	CANCHA LAS TORRES	88	PARQUE PERIODISTAS
27	CANCHA NUEVA PLAZUELA REAL	89	PARQUE SAN PIO
28	CANDILES	90	PARQUE SAN RAFAEL
29	CARABINEROS	91	PARQUE SANTANDER
30	CARRERA 22 # 39-85	92	PARQUE SIMON BOLIVAR
31	CENTRO VIDA ANTONIA SANTOS	93	PARQUE TEJAR NORTE
32	CHORRERAS DE DON JUAN	94	PARQUE UNION
33	CIUDAD BOLIVAR	95	PARQUE VILLA ROSA
34	CIUDAD VENECIA	96	PARQUE VIRVIESCAS
35	COLEGIO BICENTENARIO	97	PASAMANOS LA LIBERTAD
36	COLEGIO VILLA DE SAN IGNACIO	98	PASEO DE LA FERIA
37	EL ROCIO (CALLE 105 X CARRERA 16)	99	PEDREGOSA (escalera y pasa manos)
38	ESPERANZA 1	100	PLAZA MAYOR
39	ESPERANZA 3	101	PLAZOLETA CIVICA LUIS CARLOS GALAN
40	ESTACION DE POLICIA CENTRO	102	PLAZUELA REAL
41	ESTACION DE POLICIA NORTE	103	POLIDEPORTIVO LA SALLE
42	ESTACION METROLINEA LA ROSITA(LIMPIEZA)	104	PRADOS DEL MUTIS
43	ESTACION NORTE COMUNA 1	105	PUENTE EL BUENO
44	GABRIELA MISTRAL	106	PUENTE GABRIELA MISTRAL
45	GAITAN	107	PUENTE LA NOVENA
46	GRANJAS DE PROVENZA	108	PUENTE PASEO DEL COMERCIO
47	INSTITUTO SANTO ANGEL (Demoli. muro y cerram.)	109	PUENTE PEATONAL LA PEDREGOSA
48	JUAN PAEZ	110	PUENTE PEATONAL TRANSVERSAL ORIENTAL
49	LA BOMBONERA	111	PUENTE PUERTA DEL SOL
50	LA UBA (Soldadura)	112	PUENTE QUEBRADA LA CASCADA
51	LAGOS DEL CACIQUE	113	PUENTE UCC
52	LUDOTECA BOSQUES	114	PUNTA VETIN
53	LUDOTECA KENEDY	115	QUINTA ESTRELLA
54	LUZ DE SALVACION	116	REAL DE MINAS
55	MALAÑA	117	SAN ALONSO
56	MANUELA BELTRAN	118	SAN CAYETANO
57	MARIA PAZ	119	SAN MIGUEL
58	MIRAMANGA	120	SAN RAFAEL
59	NARANJOS	121	SANTO ANGEL
60	NORTE BAJO	122	TEJAR NORTE
61	PABLO SEXTO	123	UIS (Recolección Escombros)
62	PARQUE ALTOS DEL CACIQUE	124	VIAJGUAL (COLEGIO)

REGISTRO FOTOGRAFICO BARRIO PASEO LA FERIA

ANTES	DESPUES
	
	
	
	

REGISTRO FOTOGRAFICO BARRIO MIRAMANGA

ANTES	DESPUES
	
	
	
	

REGISTRO FOTOGRAFICO BARRIO SAN LUIS

ANTES



DESPUES











Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES, EQUIPAMENTO Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER.	2024680010045	$ 3.000.000.000	$ 3.731.566.923,14

Descripción de actividades desarrolladas

Con este proyecto se ha podido realizar el mantenimiento y embellecimiento de 56 parques de la ciudad trabajo realizado por la cuadrilla del Alcalde.

Contrato 244 – 2024: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES DEL MUNICIPIO:

CONTRATISTA:	JAIRO OSORIO CABALLERO NIT: 912.282.210-0
VALOR INICIAL:	$616.071.617,60
ANTICIPO (%):	$0
VALOR ADICIONAL:	$ 0
VALOR TOTAL:	$ 616.071.617,60
PLAZO INICIAL:	14 DÍAS
PRORROGA No. 1	3MESES 13 DIAS
PRORROGA No. 2	4 MESES
PRORROGA No. 3	1 MES – 26 DIAS
PLAZO TOTAL:	9 MESES - 23 DIAS
INTERVENTORÍA:	NOMBRE - NIT: N/A
FECHA DE INICIO:	18/12/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	24/12/2024 – 14/01/2025
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN:	15/01/2024 – 28/02/2025
FECHA DE REINICIO 1:	01/03/2025
ESTADO DEL CONTRATO:	TERMINADO
FECHA TERMINACIÓN FINAL	19/12/2025
PORCENTAJE AVANCE FÍSICO:	95%
AVANCE FINANCIERO:	29.74%

OBSERVACIONES: Se elaboró la solicitud de constitución de pasivo exigible por un valor de $371.228.146,50, con el fin de garantizar la disponibilidad de los recursos requeridos para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. De manera paralela, se continúa adelantando el proceso de liquidación contractual; sin embargo, este se encuentra pendiente debido a que el contratista aún no ha presentado las correcciones solicitadas al informe final, ni ha radicado los documentos originales debidamente suscritos, así como los demás soportes y actuaciones requeridas para culminar el trámite de liquidación

PROBLEMÁTICAS: Se ha citado de manera reiterativa al contratista para ejercer garantía por el insumo de los columpios ya que son de mala calidad.

PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS (por componente):

Componente Técnico: Componente Técnico:

La finalidad del contrato es poder realizar el pedido, compra, entregas y suministro de materiales de ferretería y herramientas para el mantenimiento periódico de la infraestructura de los parques ubicados en el municipio de Bucaramanga. Para ello realizamos un paso a paso de actividades necesarias para la correcta ejecución del

mismo, las cuales se enuncian a continuación:

1. Los insumos se encuentran almacenamos en el Taller Municipal ubicado en la calle 37 # 7- 31, Barrio Alfonso López, en donde contamos con 3 bodegas.
2. La recepción de los insumos se realizó la revisión, conteo y verificación respectiva del pedido e inventario correspondiente según remisión enviada por parte del contratista y se procedió a su respectivo almacenaje e ingreso al sistema de inventarios del municipio.
3. El control de salidas e inventario de los suministros se lleva mediante documento interno en formato Excel, en donde se registra cada salida de material.
4. El inventario de las bodegas se verifica de manera mensual para poder llevar el control de salidas y un óptimo registro en el documento Excel para su control.
5. Se elaboró la solicitud de constitución de pasivo exigible por un valor de $371.228.146,50, con el fin de adelantar el trámite administrativo correspondiente para garantizar la disponibilidad de los recursos destinados al cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.
7. El día 22 de mayo de 2026 se elaboró el oficio identificado con el radicado 2-S-SdIB-202605-00046041, mediante el cual se solicitó al contratista hacer efectiva la garantía correspondiente a 50 columpios que fueron recibidos con defectos de fabricación, con el fin de que se adelanten las acciones necesarias para su reparación o reposición, de conformidad con las obligaciones contractuales.
8. El día 19 de junio de 2026 se elaboró el oficio identificado con el radicado 2-S-SdIB-202606-00056059, mediante el cual se reiteró al contratista la solicitud de hacer efectiva la garantía correspondiente a los columpios defectuosos, debido a la ausencia de respuesta al requerimiento inicial. Asimismo, se remitió copia del oficio a la aseguradora del contrato, con el fin de poner en conocimiento la situación y adelantar las actuaciones que correspondan en el marco de la garantía contractual.
9. Se remitieron, mediante correo electrónico, las observaciones requeridas para la corrección del informe final presentado por el contratista, con el fin de que este cumpliera con los ajustes necesarios para dar continuidad al proceso de liquidación del contrato.
10. A la fecha, el contratista no ha dado respuesta a la solicitud de hacer efectiva la garantía correspondiente a los columpios defectuosos. En consecuencia, se proyecta la elaboración de un último requerimiento mediante oficio, con copia a la aseguradora del contrato, con el fin de instar al cumplimiento de la obligación y adelantar las actuaciones que correspondan en el marco de las garantías contractuales.
11. A la fecha, se está a la espera de que el contratista presente en medio físico la totalidad de los documentos debidamente suscritos, con el fin de dar continuidad al proceso de liquidación del contrato y culminar el trámite correspondiente.
12. El 30 de septiembre se recibe el informe final por parte del contratista para continuar con el proceso de liquidación y así saldar ese pasivo exigible.









META E INDICADOR DE PRODUCTO: Mantener 1,605,851 metros cuadrados de zonas verdes

Indicador	Meta 2026	Logro 2026	% Avance 2026	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Zonas verdes mantenidas	1605851	1513531	94%	$ 21.553.059.189	$ 20.732.823.794	96%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A E.S.P PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SIEMBRA, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES UBICADAS EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	2024680010046	$ 16.334.630.707	$ 16.334.630.707

Descripción de actividades desarrolladas

Convenio Interadministrativo No. 129 de 2026 cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A E.S.P PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SIEMBRA, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES UBICADAS EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”.

CONVENIDO	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A E.S.P.
SUPERVISOR	ELSA JIMENA CARDENAS MALDONADO
VALOR INICIAL:	$ 16.334.630.707
VALOR TOTAL	$ 16.334.630.707
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES

MODIFICACIÓN No 1 AL PLAZO: CUATRO (4) MESES TRECE (13) DIAS

FECHA INICIO: 19 DE AGOSTO DE 2026

FECHA DE TERMINACION 31 DE DICIEMBRE DE 2026

AVANCE FINANCIERO : 6.37. %
AVANCE FÍSICO : 6.37 %
PRIMER DESEMBOLSO : 30%

ESTADO DEL CONTRATO: EN EJECUCIÓN

En cuanto a la ejecución física, durante el periodo reportado se desarrollaron actividades correspondientes al componente de siembra en el Parque Simón Bolívar, con un área aproximada de intervención de 4.300 m², donde se realizó la instalación de especies vegetales correspondientes a las tipologías de siembra I, II y III, así como la instalación de grama en tapete.

De igual manera, en el separador de la autopista Bucaramanga–Floridablanca, en el tramo comprendido entre Provenza y Puerta del Sol, se adelantaron actividades de corte de césped y alistamiento del terreno como preparación para la posterior ejecución de las actividades de siembra.

Paralelamente, se han ejecutado de manera continua actividades de limpieza, mantenimiento de jardines y zonas verdes, y corte de césped en diferentes parques y zonas de espacio público del municipio de Bucaramanga, alcanzando, con corte al 30 de septiembre de 2026, un área acumulada de intervención de aproximadamente 367.000 m².

Las actividades anteriormente descritas corresponden a los diferentes componentes contemplados en el Convenio y hacen parte del avance físico alcanzado durante el periodo objeto del presente informe.





a e



ANTES



DESPUES

FOTO 2. Actividad de Corte de césped de zona de espacio publico

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
MANTENIMIENTO Y MANEJO INTEGRAL ARBÓREO Y DE ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	2024680010046	$ 14.838.630.390	$ 36.501.928.636

Descripción de actividades desarrolladas

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 135 DEL 26 DE JUNIO DE 2025 suscrito con: EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA (EMAB) SA ESP con el objeto de “"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA y LA EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA(EMAB)PARADESARROLLAR ACTIVIDADESRELACIONADAS CON LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES UBICADAS EN EL ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.””.

CONVENIADO:	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA (EMAB) S.A. E.S.P. NIT. 804.006.674-8
VALOR INICIAL:	$ 6.384.842.436,00
VALOR ADICIONAL 01:	$ 3.192.421.218,00
VALOR ADICIONAL 01:	$ 707.860.463,00
VALOR ACUMULADO:	$ 10.285.124.117
FECHA DE INICIO:	29/08/2025
FECHA TERMINACION:	07/05/2026
SUPERVISION:	CARLOS JAVIER MENDEZ SUAREZ SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
ESTADO DEL CONTRATO:	LIQUIDADO
PORCENTAJE AVANCE FÍSICO:	100 %
AVANCE FINANCIERO:	95,97%
PERIODO INFORME:	TERCER TRIMESTRE DE 2026 (JULIO A SEPTIEMBRE)
EL CONVENIO FUE LIQUIDADO EL 28 DE JULIO DE 2026.	

Ubicación:

- Parques y zonas verdes ubicadas en el espacio público del municipio de Bucaramanga, Santander

Impacto: El impacto que genera el convenio 135 en el municipio de Bucaramanga es de alto alcance, la realización de los siete componentes ejecutados a lo largo del municipio ha reflejado un impacto positivo. Entre los aspectos a destacar en el desarrollo del convenio se destacan: La siembra de cobertura vegetal en áreas de gran afluencia como el Parque Santander y el Parque de los niños, parque las cigarras, rotonda del mesón de los búcaros, separadores viales y también la siembra de césped en las zonas secas (áridas) del Parque de los Niños, Riego de cobertura vegetal en áreas como el Mesón de los Búcaros, Parque Turbay, Parque de los Niños, Parque Santander, Puerta del sol y los diferentes separadores viales (separador calle 36 , separador calle 45), recolección y transporte de residuos sólidos ordinarios (residuos bolsa negra) y residuos voluminosos localizados en los parques y zonas verdes del municipio, mantenimiento de coberturas vegetales en el municipio de Bucaramanga de las zonas donde se realiza la siembra, Corte de césped en las áreas verdes del municipio y parqueros encargados de la jardinería, la limpieza en las áreas verdes del municipio.

ESTADO DEL CONTRATO:

El contrato ha finalizado en fecha mayo 07-2026, ha logrado un avance de ejecución de 100 %.
En este año 2026 se logró la intervención de 1.605.851 m2 de áreas de los 1.605.851 m2 establecidos en el convenio.


Cabe resaltar que 1.605.851 m2 es el alcance total de metros cuadrados establecidos en el convenio, aunque el total de m2 intervenidos por el convenio ha sido mayor. Esto se debe a que las áreas han sido intervenidas en diferentes ocasiones y por diferentes componentes. Es decir, un área como el parque de los niños puede tener intervención de los 7 componentes según lo requiera el componente técnico.

En las intervenciones establecidas en las diferentes áreas se puede destacar el aspecto técnico y la caracterización de cada área ya que para la intervención se debe segregar que tipo de intervención requiere el área para poder ejecutar efectivamente los metros cuadrados establecidos en el convenio.

Las cuadrillas de trabajo de todos los componentes han estado distribuidas a lo largo del municipio de Bucaramanga generando el siguiente resumen de intervenciones, durante el 2026:

COMPONENTE	ÁREA INTERVENIDA
LIMPIEZA DE PARQUES	1’586.107
MANTENIMIENTO DE COBERTURA VEGETAL	147.140
RIEGO DE ÁREAS VERDES	159.887
CORTE DE CÉSPED	1’504.140
SIEMBRA DE CÉSPED	16.966
SIEMBRA DE COBERTURA VEGETAL	65.763
TOTAL ÁREAS INTERVENIDAS	418

A continuación, se mostrará evidencias de los 7 componentes durante la ejecución del convenio para el año de 2026:

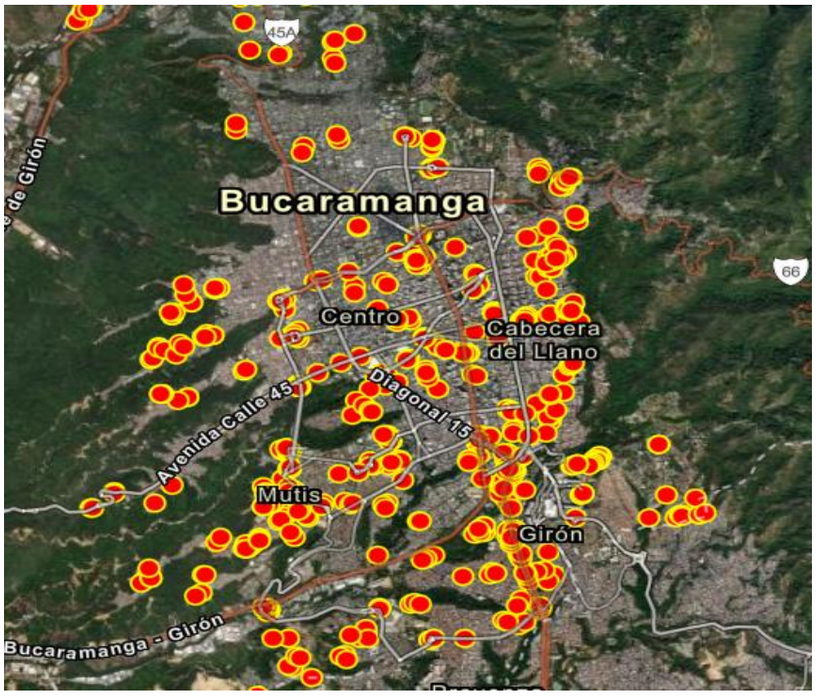
45A
Bucaramanga
66
Centro
Cabecera
del Llano
Diagonal 15
Avenida Calle 45
Mutis
Girón
Bucaramanga - Girón


7/5/2026 11:20 A. M.
Lat 7.104358°N
Lon 73.103385°W


2/5/2026 9:41 A. M.
Lat 7.118797°N
Lon 73.119560°W


2/5/2026 10:14 A. M.
Lat 7.103700°N
Lon 73.105210°W


4/05/26 8:03 A. M.
Lat 7.103095°N
Lon 73.111182°W


5/5/2026 12:00 P. M.
Lat 7.099536°N
Lon 73.132468°W



2/5/2026 11:19 A. M.
Lat 7.123395°N
Lon 73.108593°W


2/05/26 6:51 A. M.
Lat 7.126941°N
Lon 73.119420°W


2/05/26 6:51 A. M.
Lat 7.126941°N
Lon 73.119420°W


Mié, 06 de may 2026 06:34
Parque Las Cigarras, 60 Bis, Av Bucaros
Este, Bucaramanga, Santander
7.104420°N, 73.121587°W


Timemark
Sab, 02 de may 2026 08:40
Parque de Las Cigarras,
Bucaramanga, Santander
7.104212°N, 73.121356°W

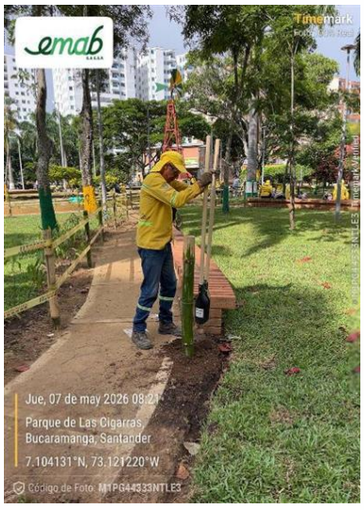



META E INDICADOR DE PRODUCTO: Optimizar 4 alcantarillados en barrios legalizados del municipio

Indicador	Meta 2026	Logro 2026	% Avance 2026	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Alcantarillado optimizados	4	0	0	$ 6.979.223.423	$ 6.979.223.423	100%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
OPTIMIZACION DE LAS REDES Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS EN SITIOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	202600000016974	$ 7.278.406.118,70	$ 7.278.406.118,70

Descripción de actividades desarrolladas

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 170 DE 2026 - OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN SITIOS ESTRATÉGICOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (Marco Institucional entre el Municipio de Bucaramanga y EMPAS S.A. E.S.P.)

- **CONVENIADO / EJECUTOR:** EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP – EMPAS S.A. | **NIT:** 900.115.931-1
- **OBJETO:** Aunar esfuerzos entre el Municipio de Bucaramanga y EMPAS S.A. ESP para desarrollar actividades relacionadas con la optimización de las redes y sistemas de alcantarillado en sitios estratégicos del Municipio de Bucaramanga.
- **VALOR TOTAL DEL CONVENIO:** $7.488.540.507,70 COP
- **APORTE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA:** $6.979.223.423,00 COP *(CDP N° 47721 / RP N° 11253)*
- **APORTE EMPAS S.A.** “Económico ($299.182.695,70 COP) + Especie ($210.134.389,00 COP)”: $509.317.084,70 COP
- **FORMA DE PAGO (%):** *Primer desembolso por valor del 50% del valor del aporte del municipio. Un segundo desembolso por un monto equivalente del cincuenta por ciento (50%) del valor del aporte del municipio, con el avance correspondiente al 50% en la ejecución de las obras.*
- **PLAZO INICIAL DEL CONVENIO:** 3 MESES *(o hasta el 31 de diciembre de 2026)*
- **PLAZO TOTAL VIGENTE:** 3 MESES - 21 DÍAS
- **FECHA DE INICIO CONVENIO:** 11/09/2026
- **ESTADO DEL CONVENIO:** En Ejecución / Fase de Trámites Pre-operativos, Apertura de Cuenta Exclusiva

- **FECHA TERMINACIÓN FINAL:** 31/12/2026
- **AVANCE FINANCIERO DEL CONVENIO:** 50,0% *(Primer desembolso por $3.489.611.711,50 en trámite tras cumplimiento de requisitos iniciales de legalización)*

N° Pago	Valor ($ COP)	Fecha de pago	Periodo de pago	Porcentaje de ejecución certificado
Pago 1	$3.489.611.711,50	En Trámite	Cumplimiento Requisitos Iniciales	N.A.
Pago 2	$3.489.611.711,50	Pendiente	Al alcanzar el 50% de avance físico	50.0% *(Requisito para segundo giro)*
Total Pagos	**$6.979.223.423,00**	--	--	**--**

INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA (Obra e Interventoría a cargo de EMPAS S.A.)

- **CONTRATO DERIVADO DE OBRA CIVIL:** En proceso de selección y adjudicación por parte de EMPAS S.A. E.S.P.
- **CONTRATO DERIVADO DE INTERVENTORÍA:** En proceso de contratación por EMPAS S.A. E.S.P. *(Financiado con el aporte económico propio de EMPAS por $299.182.695,70)*
- **SUPERVISOR:** Edwin Miguel Quintero Cepeda

ACTIVIDADES A EJECUTAR

- **ALCANTARILLADO COMBINADO**

INVERSIÓN TOTAL: $ 4.979.982.627,00

Contexto Técnico: Optimización hidráulica, estructural y operativa de redes de alcantarillado en siete (7) sectores urbanos priorizados del municipio de Bucaramanga, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 170 de 2026.
Alcance Principal: Reposición de aproximadamente **874** metros lineales de colectores obsoletos (sustitución de tuberías de gres y concreto por PVC estructurado tipo Novafort), adecuación y remodelación de pozos de inspección, y modernización de estructuras de captación superficial (sumideros) bajo la normativa RAS 2017 y los estándares técnicos de EMPAS S.A. ESP.

Barrios propuestos a intervenir	Sector de intervención	Inversión
1. Barrio Comuneros	Tramo 1: carrera 18 entre calles 5 y 6 Tramo 2: Carrera 16 entre calles 8 y 9	$ 974.166.707,00
2. Barrio La Feria	Calle 26 desde la Carrera 1 hasta encontrar la Calle 25 (Tapón)	$ 910.045.664,00
3. Barrio Mutualidad	Carrera 19 entre calles 5 y 6	$ 448.294.594,00
4. Barrio El Prado	Carrera 34 entre calles 35 y 36	$ 561.794.625,00
5. Barrio San Alonso	Carrera 30 entre calles 16 y 17 Carrera 32b entre calles 18 y 19	$ 1.087.685.236,00
6. Barrio La Universidad	Calle 9ª entre carreras 24 y 25	$ 505.146.852,00
7. Barrio Girardot	Carrera 7 entre calles 28 y 29	$ 492.848.949,00
	TOTAL	**$ 4.979.982.627,00**

- **ALCANTARILLADO PLUVIAL**

INVERSIÓN TOTAL: $ 1.999.240.796,00
Contexto Técnico: Diagnóstico, mantenimiento y adecuación estructural del sistema de drenaje pluvial en dieciocho (18) corredores viales y sectores estratégicos del municipio de Bucaramanga.

Alcance Principal: Inspección y evaluación subterránea previa mediante equipos de succión-presión (50 horas) y tecnología de circuito cerrado de televisión - CCTV (10 horas), complementada con localización topográfica, limpieza profunda y reposición de elementos de protección (tapas, rejillas y coronas en concreto) para mitigar empozamientos y preservar la infraestructura vial.

No.	IDENTIFICACIÓN	SECTOR	INICIO	FINAL
1	Viaducto La Novena – Provincial	Carrera 9	Calle 45	Calle 55
2	Calle 45	Calle 45	Quinta Estrella – Carrera 14A W	Intersection Vía Palenque – Girón
3	Vía al Mar	Carrera 15	Calle 3	Sector La Cemento
4	Vía a Matanza	Calle 3	Carrera 15	Carrera 34A – Calle 17C Norte – B. Los Ángeles
5	Vía al Porvenir	Porvenir – Ladrillera	Calle 103A – Carrera 9	Autopista a Girón
6	Vía al Cementerio La Colina	Calle 70	Carrera 33 – Carretera Antigua	Carrera 55 – UDES
7	Autopista a Girón	Carrera 27 – Calle 70	Calle 67	Límite con Girón (PR 73+000)
8	Transversal Metropolitana	Calle 65 – Q. El Bueno – La Iglesia	Calle 63A – Plazuela Real	Carrera 15 – Nueva Fontana / Carrera 3 – Peñón del Valle
9	Autopista a Floridablanca	Intercambiador Puerta del Sol	Calle 63	Puente Provenza (PR 80+881)
10	Barrio Porvenir Vía Antigua - Autopista Bucaramanga / Barrancabermeja	Ladrilleras	Carrera 5 - Avenida 105	Anillo vial
11	Conexión San Luis – Autopista a Girón	Quebrada La Iglesia	Calle 88 – Carrera 16	Autopista a Girón
12	Conexión Diamante II – Provenza	Quebrada El Macho	Carrera 19 – Calle 91	Carrera 19 – Calle 91
13	Avenida Pan de Azúcar	Carrera 49	Quebrada La Flora – Av. El Jardín	Rotonda – Calle 52
14	Vía Parque Industrial Provincia de Soto 1-2	Zona Industrial	Carrera 30 Vía Barrio Porvenir	Acceso Parque Industrial Soto Norte 2
15	Intercambiador Mesón de los Búcaros	Mesón de los Búcaros	Intercambiador Mesón de los Búcaros - Intersección Carrera 27 con Quebradaseca	Deprimido Av. Quebradaseca - Deprimido Carrera 27 Boulevard Bolívar
16	Intercambiador Neomundo	Deprimido Neomundo		
17	Carrera 15 con Quebradaseca	Glorieta Carrera 15 con Quebrada seca	Carrera 15 con calle 28	Carrera 15 con calle 30
18	Comuna 14 - Miraflores	Vía Bucaramanga - Cúcuta estructura	CAI Morrorrico Carrera 51 calle 17	K3+400 Calle 14 - 50

RESUMEN

DESCRIPCION	VALOR	
ALCANTARILLADO PLUVIAL (18 puntos de intervención)	**$**	**1.999.240.796,00**
TOTAL ALCANTARILLADO COMBINADO	**$**	**4.979.982.627,00**
COMUNEROS (2 tramos)	$	974.166.707,00
FERIA	$	910.045.664,00
UNVIERSIDAD	$	505.146.852,00
MUTUALIDAD	$	448.294.594,00
PRADO	$	561.794.625,00
GIRARDOT	$	492.848.949,00
SAN ALONSO (2 tramos)	$	1.087.685.236,00
INTERVENTORIA (EMPAS)	**$**	**299.182.695,70**
TOTAL PROYECTO	**$**	**7.278.406.118,70**

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Construir 80 unidades sanitarias con saneamiento básico para vivienda rural

Indicador	Meta 2026	Logro 2026	% Avance 2026	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Unidades sanitarias con saneamiento básico construidas para vivienda rural.	53	0	0%	$ 2.500.763.491	$ 2.492.796.674	99,68%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
CONSTRUCCION DE POZOS SEPTICOS PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTAL EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	2024680010215	$2.364.086.185.00	$2.189.319.314

Descripción de actividades desarrolladas

Contrato **No.182** de 11 de septiembre de 2026 – **CONTRATO DE OBRA**: Mediante el proceso SI-SI-LP-004-2026 con objeto "CONSTRUCCION DE POZOS SEPTICOS PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTAL EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA".

Valor del contrato: $2.189.319.314
Plazo inicial: 4 meses.
Fecha de Inicio: Por iniciar
Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2026
Estado del contrato: Adjudicado
Porcentaje Avance físico ejecutado: 0%

- **Ubicación del Proyecto**

El proyecto denominado "CONSTRUCCION DE POZOS SEPTICOS PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTAL EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" se desarrolla en el área rural de la jurisdicción municipal, la cual se encuentra administrativamente dividida en tres (3) corregimientos.

CORREGIMIENTO	SECTORES Y RUTAS DE INTERVENCIÓN
CORREGIMIENTO 1	Veredas: San pedro alto, San Cayetano, Santa Rita, Angelinos y Aburrido.
CORREGIMIENTO 2	Veredas: Magueyes, Capilla Alta, Rosa Blanca, Capilla Baja y Los Santos y chitota.
CORREGIMIENTO 3	Veredas: Capilla Alta, Retiro Chiquito, San Jose y Santa Barbara.

Las actividades de intervención se ejecutarán de manera planificada y sectorizada sobre los diferentes corregimientos, priorizados conforme a criterios técnicos y requerimientos.

4. LINEA ESTRATEGICA 4. TERRITORIO SEGURO QUE GENERA VALOR

SECTOR: Gobierno territorial

PROGRAMA: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Asistir técnicamente a nueve (9) dependencias de la administración municipal para el diseño, seguimiento y ejecución de proyectos estratégicos de la ciudad en el área de infraestructura

Indicador	Meta 2026	Logro 2026	% Avance 2026	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	9	9	100%	$ 18.570.984.061	$ 17.620.081.397	95%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS PROCESOS MISIONES Y DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	2024680010049	$ 11.506.163.086	$ 28.292.139.343

Descripción de actividades desarrolladas

Durante el tercer trimestre de la vigencia 2026 la Secretaria de Infraestructura ha continuado realizo la contratación del recurso humano que requiere la dependencia para el fortalecimiento a la ejecución de los procesos transversales, así como la planificación de las diferentes obras.

GASTOS DE INVERSION	A 30 DE SEPTIEMBRE 2026
	VALOR
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION	$ 17.572.641.333,34

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Adecuar dos (02) sedes de bienes inmuebles que son propiedad municipal para fortalecer los procesos administrativos y promover el desarrollo de capacidades dentro de la administración

Indicador	Meta 2026	Logro 2026	% Avance 2026	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Sedes adecuadas	2	0	0%	$ 118.971.661	$ 114.212.702	96%

CONTRATO DE OBRA 161 de 2026 -:" ADECUACIÓN CENTRO TRANSITORIO JUVENIL CETRA – B.LA JOYA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA."

Valor inicial del contrato: $ 114.212.702,00
Plazo inicial: 1 (UN) MES
Fecha de inicio: PENDIENTE – No se ha suscrito Acta de Inicio
Fecha de terminación: N/A – Pendiente de suscripción del Acta de Inicio
Nueva fecha de terminación: N/A
Avance físico ejecutado: 0%
Avance financiero: 0%

ESTADO DEL CONTRATO: FIRMADO, PENDIENTE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

OBSERVACIONES: La suscripción del Acta de Inicio se encuentra pendiente, toda vez que no se cuenta aún con la disponibilidad de las áreas objeto de intervención, debido a la


permanencia de los jóvenes en el CETRA. Se han adelantado actuaciones de coordinación institucional orientadas a garantizar la disponibilidad de las áreas de intervención, encontrándose pendiente la gestión del ICBF para el traslado de los jóvenes.

PROBLEMÁTICAS: Disponibilidad de las áreas de intervención, condicionada al traslado de los jóvenes actualmente ubicados en el CETRA.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Revisión detallada de los planos, cantidades de obra y especificaciones técnicas, verificando su concordancia con el presupuesto contractual aprobado.

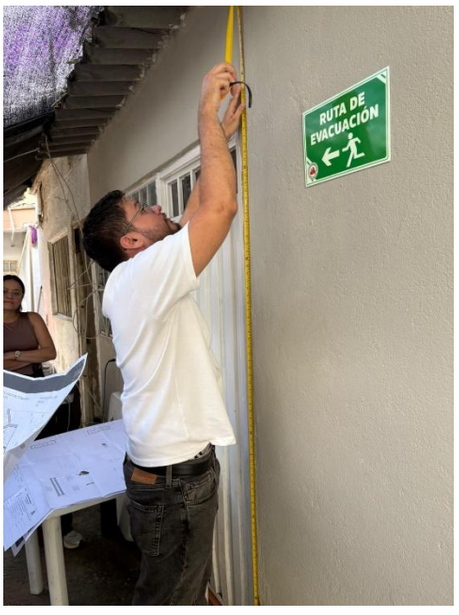

Realizar las mediciones y verificaciones correspondientes en sitio, con base en los planos y especificaciones técnicas.

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Elaborar (04) estudios de preinversión para la realización de documentos en las fases de pre-factibilidad, factibilidad o definitivos para la consolidación de la infraestructura social en el municipio.

Indicador	Meta 2026	Logro 2026	% Avance 2026	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Estudios de preinversión elaborados	1	0,88	88%	$ 261.344.580	$ 126.095.762	48%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RESTAURACIÓN DE LA PLAZA SAN MATEO INMUEBLE DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	2024680010084	$1.800.000.000,00	$1.542.128.640,00

Descripción de actividades desarrolladas

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 197– 2025: “ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RESTAURACIÓN DE LA PLAZA SAN MATEO INMUEBLE DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”

El Municipio de Bucaramanga – Secretaría de Infraestructura estimó la necesidad de efectuar la consultoría teniendo en cuenta que en la actualidad la Plaza San Mateo es un Bien de Interés cultural para Bucaramanga, mediante la resolución No. 0434 de 2013, bien que en las condiciones actuales de la construcción requiere ser restaurado y conservado, por tal motivo se necesita desarrollar la “Actualización de los estudios y diseños para la restauración de la Plaza San Mateo, con el fin de acondicionar espacios seguros que cumplan con la normativa vigente y que brinden seguridad y comodidad para la puesta al servicio de los bumangueses.

CONTRATISTA:	**NOMBRE**	CONSORCIO RESTAURACIÓN PLAZA DE SAN MATEO.
	NIT:	901.980.756-1
VALOR INICIAL:	$1.542.128.640	
ANTICIPO (%):	$0	
VALOR ADICIONAL:	$ 0	
VALOR TOTAL:	$1.542.128.640	
PLAZO INICIAL:	3.5 MESES	
PRORROGA No. 1	2.5 MESES	
PRORROGA No. 2	N/A	
PLAZO TOTAL:	6 MESES	
INTERVENTORÍA:	NOMBRE - NIT:	
FECHA DE INICIO:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2025	
FECHA DE REINICIO 1:	7 DE MAYO DE 2026	
ESTADO DEL CONTRATO:	TERMINADO-EN PROCESO DE RECIBO Y VERIFICACIÓN ENTREGABLES	
FECHA TERMINACIÓN FINAL	23 DE JULIO DE 2026	
PORCENTAJE AVANCE FÍSICO:	90% (Certificable por interventoría)	
AVANCE FINANCIERO:	60%	

Durante el periodo objeto de seguimiento, el Contrato de Consultoría No. 197 de 2025 continuó con el desarrollo y consolidación de los estudios y diseños definitivos requeridos para la actualización del proyecto de restauración y puesta en valor de la Plaza San Mateo.

En el marco de la ejecución contractual, el Consultor adelantó la entrega de los diferentes componentes técnicos correspondientes al Tomo IV – Estudios y Diseños Definitivos y Planes, incluyendo, entre otros, los estudios de diseño arquitectónico y urbanístico, diseño estructural y reforzamiento estructural, diseños hidráulicos, sanitarios, pluviales, red contra incendios y gas, instalaciones eléctricas y redes especiales, seguridad, señalización y señalética, manejo de tráfico, manejo ambiental, sostenibilidad, gestión social, presupuesto, programación, proceso constructivo, especificaciones técnicas, modelo BIM e informe técnico ejecutivo.

De manera paralela, la Interventoría realizó la revisión técnica e interdisciplinaria de los productos presentados, verificando la coherencia y articulación de memorias de cálculo, planos, especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuesto, programación, modelos BIM y demás documentos que integran los estudios y diseños. Como resultado de estas revisiones, se formularon observaciones, solicitudes de ajuste y requerimientos de complementación orientados a garantizar la trazabilidad, consistencia técnica y cumplimiento de los requerimientos normativos y patrimoniales aplicables al proyecto.

Asimismo, durante el periodo se adelantaron actividades de socialización y articulación institucional de la alternativa de intervención, con participación de actores civiles, la Secretaría de Planeación, los ediles y el Consejo de Patrimonio. Estos espacios permitieron presentar los avances del proyecto, recoger observaciones y efectuar el acompañamiento técnico correspondiente para su incorporación en los documentos de diseño.

Como parte del proceso de consolidación de los productos, el Consultor continuó atendiendo los requerimientos formulados por la Interventoría mediante la presentación de correcciones, aclaraciones, documentos complementarios y subsanaciones de los diferentes componentes técnicos. No obstante, de acuerdo con el seguimiento efectuado, permanecieron aspectos técnicos y documentales que debían ser ajustados y validados antes del cierre integral de los estudios y diseños.

En cuanto al estado de ejecución, el informe de Interventoría registra que el contrato alcanzó el 100 % del plazo contractual previsto, encontrándose los productos contractuales en proceso de revisión, ajuste, complementación y cierre técnico. En consecuencia, la culminación material del plazo contractual no implicaba por sí misma el cierre integral de los productos, toda vez que se requería la atención de las observaciones pendientes y la incorporación de los permisos, conceptos, trámites y aprobaciones correspondientes ante las entidades competentes.

La Administración Municipal, a través de la supervisión y con el acompañamiento de la Interventoría, mantuvo el seguimiento técnico, administrativo y contractual orientado a verificar la atención de los requerimientos, la consolidación de la documentación soporte y la adecuada articulación de los diferentes componentes, con el propósito de contar con estudios y diseños técnicamente consistentes y susceptibles de cierre y recibo conforme a las obligaciones contractuales.

OBSERVACIONES:

1. Durante el proceso de revisión de los estudios y diseños definitivos, la Interventoría formuló observaciones de carácter técnico, documental, gráfico, presupuestal y de coordinación interdisciplinaria sobre los diferentes componentes entregados por el Consultor.
2. Las observaciones estuvieron principalmente relacionadas con la necesidad de garantizar la correspondencia y trazabilidad entre memorias de cálculo, planos, especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuesto, programación, proceso constructivo y demás documentos que integran los estudios y diseños.
3. En desarrollo del seguimiento contractual, el Consultor presentó respuestas, ajustes, aclaraciones y documentos complementarios para atender los requerimientos formulados por la Interventoría, registrándose avances en el proceso de subsanación de los componentes observados. Entre estos se encuentran entregas y subsanaciones correspondientes a los componentes arquitectónico, urbanístico, eléctrico y demás documentos técnicos del proyecto.
4. Se adelantaron mesas de trabajo y jornadas de socialización con diferentes actores institucionales y sociales, entre ellos la Secretaría de Planeación, ediles, actores civiles y el Consejo de Patrimonio, espacios en los cuales se presentaron los avances del proyecto y se recibieron observaciones para su consideración dentro del proceso de consolidación de la propuesta.
5. Las observaciones identificadas durante las etapas anteriores han venido siendo objeto de atención y subsanación por parte del Consultor, en coordinación con la Interventoría, por lo cual su estado debe entenderse como parte del proceso de revisión y consolidación de los productos, y no necesariamente como incumplimientos o pendientes vigentes al corte del presente informe.
6. El proceso de revisión ha requerido la actualización y articulación de los diferentes componentes técnicos, considerando que las modificaciones efectuadas en una especialidad pueden generar ajustes o verificaciones cruzadas en otros componentes del proyecto.
7. Se ha mantenido el seguimiento técnico y documental por parte de la Interventoría, orientado a verificar que las correcciones y complementaciones presentadas por el Consultor atiendan integralmente los requerimientos formulados y permitan avanzar hacia el cierre de los productos contractuales.

PROBLEMÁTICAS:

1. El proceso de cierre integral de los estudios y diseños requiere la culminación de las actividades de revisión, validación y consolidación documental de los componentes que hayan presentado observaciones o ajustes durante su proceso de evaluación.
2. Se mantiene la necesidad de contar con la totalidad de los soportes, conceptos, permisos, trámites y aprobaciones que resulten aplicables para la consolidación definitiva del proyecto y el correspondiente cierre contractual, particularmente aquellos que dependan de actuaciones de entidades o instancias externas. La Interventoría había identificado esta situación como un requisito para el cierre integral de los estudios y diseños.
3. Debido a la naturaleza interdisciplinaria de los estudios y diseños, resulta necesario mantener la coordinación entre las diferentes especialidades para garantizar que las

modificaciones y subsanaciones realizadas sean consistentes entre sí y se reflejen de manera integral en planos, memorias, cantidades, presupuesto, especificaciones y demás documentos contractuales.

4. Se requiere continuar con el seguimiento técnico y administrativo hasta verificar la incorporación efectiva de las subsanaciones realizadas y la consolidación de una versión integral y coherente de los productos objeto del contrato.
5. La principal situación a gestionar corresponde actualmente al proceso de cierre y recibo integral de los productos, teniendo en cuenta que el cumplimiento del plazo contractual no sustituye la necesidad de verificar técnicamente la totalidad de los documentos y soportes requeridos para su aceptación definitiva.
6. Las situaciones inicialmente identificadas como retrasos y observaciones han presentado avances en su atención mediante la entrega de ajustes, respuestas y documentos complementarios por parte del Consultor, por lo que el seguimiento actual debe concentrarse en la verificación de los pendientes efectivamente vigentes al corte del 30 de septiembre de 2026 y no en aquellos que ya hayan sido subsanados.

AVANCE POR FRENTES

FRENTE	% INVERSIÓN INICIAL	ESTADO	% AVANCE	ACTIVIDADES EJECUTADAS
CONSORCIO RESTAURACIÓN SAN MATEO	**0%**	**EN EJECUCIÓN**	**90% (certificable por interventoría)**	• INVESTIGACION CONSTRUCTIVA Y TIPOLOGICA • LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO • LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO • REGISTRO FOTOGRAFICO TOTAL • ESTUDIO DE GESTION PREDIAL • ESTUDIO DE IMPACTO SOCIAL • ESTUDIO PATOLOGICO Y DIAGNOSTICO DEL INMUEBLE ESTUDIO TECNICO DE HUMEDADES • ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS • CONCEPTO ESTADO REDES ELECTRICA • CONCEPTO ESTADO REDES HIDROSANITARIAS • ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA • ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA Y EVALUACION ESTRUCTURAL, INCLUYE PRUEBAS DE LABORATORIO • ESTUDIO DE ANALISIS DE CALAS ESTRATIGRAFICAS • ESTUDIO DEL ESTADO DE CONVERSION, INVENTARIO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA ORNAMENTACION • ESTUDIO DE EXPLORACIONES ARQUEOLOGICAS Y CONCEPTO • ANALISIS Y EVALUACION DE ALTERNATIVAS ESTUDIO DE DISEÑO ARQUITECTONICO Y URBANISMO • ***ESTUDIO DE DISEÑO ESTRUCTURAL Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL*** • ***ESTUDIO DE DISEÑO HIDRAULICO, SANITARIO, PLUVIAL, RED CONTRA INCENDIOS Y AGAS*** • ESTUDIO DE DISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR DE SONIDO, VOZ, DATOS, TELEFONIA Y REDES ESPECIALES • ESTUDIO PROYECTO DE SEGURIDAD (ALARMAS, CAMARAS, EVACUACION, SEGURIDAD FISICA) • ESTUDIO PROYECTO DE SEÑALIZACION Y SEÑALETICA • PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT) • PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) • INFORME GESTION SOCIAL • ***ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTO, PROGRAMACION***

				PROCESO CONSTRUCTIVO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS • ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD • ***ESTUDIO TECNICO BIM*** • INFORME EJECUTIVO FINAL

OBSERVACIÓN TÉCNICO Y JURÍDICA QUE INDICA ALERTA Y QUE SE DEBE TENER EN CUENTA:

Para el corte del presente informe, las actividades de socialización y presentación de la alternativa de intervención ante las instancias y actores correspondientes han sido adelantadas. En consecuencia, el seguimiento técnico y jurídico se concentra en la verificación de la atención de las observaciones formuladas, la consolidación de los documentos y soportes requeridos y el cierre integral de los productos contractuales, con el fin de garantizar su correspondencia con las obligaciones establecidas y las condiciones técnicas, normativas y patrimoniales aplicables al proyecto.

PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS (POR COMPONENTE)

Componente Técnico

- Seguimiento, control y verificación al desarrollo y consolidación de los estudios y diseños definitivos adelantados por la Consultoría para la actualización del proyecto de restauración de la Plaza San Mateo.
- Revisión técnica e interdisciplinaria de los productos y documentos entregados por el Consultor, verificando su correspondencia con las obligaciones contractuales, los requerimientos técnicos, normativos y patrimoniales aplicables al proyecto.
- Análisis y verificación de los diferentes componentes que integran los estudios y diseños, incluyendo aspectos arquitectónicos, urbanísticos, estructurales, hidráulicos, sanitarios, eléctricos, de seguridad, señalización, sostenibilidad, presupuesto, programación, especificaciones técnicas y demás productos asociados al alcance contractual.
- Formulación, seguimiento y verificación de las observaciones, recomendaciones, ajustes y complementaciones requeridas al Consultor, orientadas a garantizar la coherencia, integralidad y trazabilidad entre memorias, planos, cantidades de obra, presupuesto, especificaciones, programación y demás documentos técnicos.
- Revisión de las respuestas y documentos de subsanación presentados por el Consultor, verificando la incorporación de los ajustes requeridos y el avance en el proceso de consolidación de los productos contractuales.
- Seguimiento a la articulación entre las diferentes especialidades que intervienen en el proyecto, con el propósito de garantizar la compatibilidad y consistencia técnica de los estudios y diseños definitivos.
- Participación en comités de seguimiento, mesas de trabajo y reuniones técnicas con la Consultoría, Supervisión y demás actores institucionales vinculados al proyecto, para analizar el estado de ejecución, atender requerimientos y definir acciones encaminadas a la consolidación y cierre de los productos.

Componente Social

- Seguimiento y acompañamiento a las actividades de socialización y participación desarrolladas en el marco del proyecto de restauración de la Plaza San Mateo.
- Acompañamiento técnico y seguimiento a las jornadas de socialización realizadas con actores institucionales, sociales y comunitarios vinculados al área de influencia del proyecto.
- Seguimiento a los espacios de presentación y socialización de la alternativa de intervención ante la Secretaría de Planeación, ediles, actores civiles y Consejo de Patrimonio, verificando la recopilación de observaciones y recomendaciones derivadas de dichos espacios.
- Verificación de la incorporación y atención de los aspectos resultantes de las jornadas de socialización que tuvieran incidencia en la consolidación de los estudios y diseños.
- Acompañamiento a la articulación institucional requerida para la presentación, revisión y consolidación de la propuesta de intervención ante las diferentes instancias competentes.

Componente Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo – SST

- Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST asociadas a las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato de consultoría.
- Verificación de la aplicación de los lineamientos y requisitos ambientales y de SST establecidos para las actividades de campo y demás actuaciones desarrolladas en el marco de la consultoría.
- Seguimiento a los productos y documentos relacionados con el componente ambiental, incluyendo la revisión del Plan de Manejo Ambiental y demás instrumentos contemplados dentro del alcance contractual.
- Seguimiento al cumplimiento de la normativa y de las obligaciones contractuales aplicables en materia ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Verificación de la incorporación de los aspectos ambientales y de SST dentro del proceso de consolidación de los estudios, diseños y documentos técnicos del proyecto.

IMPACTO: POBLACIÓN BENEFICIADA

- El desarrollo de las actividades de seguimiento, control y verificación de la Interventoría contribuye a fortalecer la calidad técnica, documental y contractual de los estudios y diseños requeridos para la restauración y puesta en valor de la Plaza San Mateo.
- El proyecto tiene incidencia directa sobre la comunidad del municipio de Bucaramanga y, de manera particular, sobre los usuarios, residentes, comerciantes, visitantes y demás actores relacionados con el área de influencia de la Plaza San Mateo, en tanto busca consolidar las condiciones técnicas necesarias para la futura intervención, conservación y sostenibilidad del inmueble.
- De igual manera, la adecuada estructuración y consolidación de los estudios y diseños constituye un insumo fundamental para la toma de decisiones institucionales y para la eventual ejecución de las obras de restauración, recuperación y puesta en valor del Bien de Interés Cultural, contribuyendo a la protección de sus valores arquitectónicos, históricos, culturales y urbanos.
- En este sentido, el impacto de las actividades de interventoría se relaciona principalmente con el fortalecimiento de los procesos de control técnico, seguimiento contractual, articulación interdisciplinaria y verificación de los productos desarrollados por la Consultoría, procurando que estos respondan a las condiciones y requerimientos establecidos para el proyecto.



Socialización a ediles, junta de acción comunal comuna centro, propuesta de restauración de la Plaza San Mateo, Bucaramanga



Socialización con secretaria de planeación municipio de Bucaramanga propuesta de restauración de la Plaza San Mateo, Bucaramanga



Socialización con concejo departamental de patrimonio, universidades, organizaciones culturales y lideres empresariales propuestas de restauración de la Plaza San Mateo, Bucaramanga





Renders arquitectónicos de la propuesta de restauración de la Plaza San Mateo, Bucaramanga

5. LINEA ESTRATEGICA 5. TERRITORIO SEGURO QUE PROTEGE

SECTOR: Minas y Energía

PROGRAMA: Consolidación productiva del sector de energía eléctrica

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Garantizar 51,229 lámparas de alumbrado público para la prestación del servicio de alumbrado público en el Municipio de Bucaramanga.

Indicador	Meta 2026	Logro 2026	% Avance 2026	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Garantizar lámparas de alumbrado público.	51.229	51.229	100%	$172.324.345.378	$ 31.362.878.376	18%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 2024-2027 BUCARAMANGA	2024680010192	$45.697.964.376,64	$104.798.698.195,72

Resumen del proyecto:
El municipio es responsable de prestar el servicio de alumbrado público consistente en la iluminación de las vías públicas, parques públicos y demás espacios de libre circulación que no se encuentran a cargo de ninguna persona natural o jurídica diferente del municipio.

En cuando a la administración y operación del Alumbrado Público, se hace necesario fortalecer la nómina provisional institucional, dando cumplimiento a lo establecido por el Ministerio de Trabajo y la Comisión Nacional del Servicio Civil — CNSC; así como también contar con insumos, materiales, herramientas e instalaciones adecuadas, necesarias para fortalecer su funcionamiento.

Es importante tener en cuenta, que la prestación del servicio de alumbrado público debe ser constante, lo que crea la necesidad que algunos servidores públicos, generen continuidad y estabilidad en el desarrollo de los compromisos adquiridos; asimismo contar con recurso humano de calidad, con el fin de mantener un desarrollo competente, siendo así, que se continúa asignando recursos para la actual vigencia en los diferente programas y actividades que desarrolla la Oficina de Alumbrado Público, con el fin de garantizar una adecuada prestación del servicio y generar el mayor impacto positivo en la comunidad.

Con el fin de mejorar la operación y administración del sistema de alumbrado público, y a su vez ofrecer a la comunidad un servicio de calidad, se hace necesario adquirir insumos de papelería y elementos de oficina, aires acondicionados, impresoras, tableros digitales, elementos de seguridad y licencias de software que fortalezcan el debido cumplimiento de las labores diarias, dado a los usuarios un respuesta oportuna y eficiente, Para esto también se hace necesario Pagar los servicios internos y externos de la oficina que permitan el correcto funcionamiento de la oficina.

BENEFICIOS DEL PROYECTO:
SOCIALES: El proyecto tiene como principal beneficio el fortalecimiento en el desarrollo y ejecución de las actividades de seguimiento y control a procesos de la secretaría de Infraestructura-Alumbrado Público. Así como también ofrecer a la comunidad un ambiente iluminado y seguro, contribuyendo al desarrollo cultural, preservando el lado urbano y rural de la Ciudad.

ECONÓMICOS: Implementado nueva tecnología e instalando luminarias LED, genera disminución en los altos niveles de consumo de energía y en los costos de mantenimiento especialmente en el ahorro en la contratación de cuadrillas de mantenimiento.

AMBIENTALES: Generar un impacto ambiental, disminuyendo los niveles de dióxido de carbono en la ciudad, al construir el sistema de iluminación con nuevas tecnologías y uso de luminarias LED.

INFORMACIÓN AVANCE DE EJECUCIÓN

Se realiza pagos de las CPS y los contratos de arriendo y servicios públicos.

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	2024680010189	$35.703.428.981,00	$86.919.084.325,44

Descripción de actividades desarrolladas

Dentro del proyecto de mantenimiento del sistema de alumbrado público 2020-2023 del municipio de Bucaramanga, enfocados en el mismo objeto realizar un mantenimiento preventivo y correctivo del sistema mediante los contratos:

CONTRATO: 341 DEL 2025
OBJETO: MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 6.930.979.159,7
VALOR LOTE 1: 3.362.913.018,85
VALOR LOTE 2: 3.568.066.140,85
ADICIONAL 1: SOLO TTIEMPO 2 MESES 25 DIAS
ADICIONAL 2: 4.262.543.204
ADICIONAL 3: SOLO TIEMPO 1 MES 20 DIAS
FECHA DE INICIO: 16/02/2026
FECHA FIN: 30/11/2026
ESTADO: EN EJECUCION.
AVANCE DE EJECUCION :96%





1. **Priorización de zonas críticas:**
   La Secretaría aplica una metodología de priorización basada en criterios técnicos y de impacto social, orientada a garantizar la seguridad, la movilidad y el adecuado uso del espacio público.
   En este sentido, la atención de las intervenciones se define considerando los siguientes factores:

- **Nivel de riesgo:** Zonas con deficiencias de iluminación que puedan afectar la seguridad ciudadana o incrementar la probabilidad de incidentes.
- **Impacto en la movilidad:** Corredores viales principales y vías de alto flujo vehicular y peatonal.
- **Entornos sensibles:** Áreas con alta afluencia de población, tales como:
  - Instituciones educativas (colegios)
  - Paraderos de transporte público
  - Parques, zonas recreativas y escenarios deportivos
  - Zonas comerciales

- **Demanda ciudadana:** Número y recurrencia de reportes o PQRS registrados por la comunidad.

Bajo estos criterios, se establece un orden de atención que prioriza inicialmente los sectores de mayor criticidad e impacto (corredores viales principales y espacios públicos de alta concurrencia). Posteriormente, se programan intervenciones en los diferentes barrios del municipio, dando prelación a aquellos con mayor número de reportes ciudadanos.

Esta metodología permite optimizar los recursos disponibles y garantizar una atención oportuna y equitativa a las necesidades de la comunidad.

2. **Contratación, operador y cumplimiento contractual:**
   El contratista actual es el CONSORCIO EYC1 2025, cuyo objeto contractual corresponde al mantenimiento del alumbrado público del municipio de Bucaramanga, distribuido por lotes por comunas y corregimientos
   Sus obligaciones se enmarcan en la ejecución del mantenimiento correctivo, atención de reportes y garantía de operación del sistema. A la fecha, el contrato se encuentra en ejecución.

3. **Calidad de las reparaciones:**
   Durante los últimos seis (6) meses no se han registrado reparaciones reiteradas a luminarias. La metodología implementada establece que, cuando una luminaria presenta fallas, no se somete a procesos de reparación correctiva reiterativa, sino que se prioriza su reemplazo por una luminaria nueva, garantizando así mayor confiabilidad y vida útil del sistema.
   No obstante, previo a definir el reemplazo, se realiza un procedimiento técnico de verificación en campo, con el fin de descartar fallas asociadas a otros componentes del sistema. Este procedimiento incluye:

- **Verificación de presencia de tensión** en los bornes de alimentación de la luminaria.

- **Medición de niveles de voltaje** para confirmar que se encuentran dentro de los rangos operativos.
- **Inspección del estado de las conexiones eléctricas** (cableado, empalmes, borneras).
- **Revisión del sistema de control** (fotocelda, temporizador o sistema de telegestión, si aplica).
- **Evaluación visual del estado de la luminaria** (driver, módulo LED, carcasa, presencia de humedad o daño físico).
- **Verificación de continuidad eléctrica**, en caso de ser necesario.

  Una vez realizadas estas pruebas, y si se confirma que la falla corresponde a la luminaria (driver o módulo LED), se procede a su reemplazo inmediato, evitando intervenciones repetitivas y optimizando los tiempos de atención.

  Este procedimiento permite asegurar diagnósticos acertados, reducir reprocesos y mejorar la eficiencia operativa del servicio de alumbrado público.

4. **Seguridad eléctrica y riesgos para la ciudadanía:**

   Actualmente se registran sesenta y un (61) reportes asociados a diferentes fallas en postes, dentro de los cuales se incluyen casos como: poste a punto de caer, poste caído, poste deteriorado en su base, poste energizado, poste inclinado y solicitudes de retiro de poste.

   Adicionalmente, se cuentan con veintiún (21) reportes relacionados con redes eléctricas, que comprenden situaciones como red caída o reventada, reposición de poste, luminaria y red, así como revisión de redes en posible corto circuito, información extraída del SIAP.

   En cuanto al plan de mitigación, este se fundamenta en la ejecución de actividades de mantenimiento correctivo orientadas a restablecer oportunamente el servicio en los puntos afectados, así como en la gestión y seguimiento de las denuncias públicas y judiciales relacionadas con eventos de vandalismo y hurto de infraestructura de alumbrado público.

   El plan contempla:

- **Atención priorizada de daños reportados**, mediante la programación y ejecución de intervenciones correctivas sobre luminarias, redes y demás componentes afectados.
- **Registro y trazabilidad de incidentes**, permitiendo identificar zonas críticas con alta recurrencia de vandalismo o hurto.
- **Articulación con autoridades competentes** (Policía, Fiscalía y entes territoriales), para la radicación y seguimiento de denuncias formales.
- **Análisis de patrones de afectación**, con el fin de implementar medidas preventivas en sectores vulnerables.
- **Reposición de infraestructura bajo criterios de seguridad**, incluyendo el uso de materiales o configuraciones que reduzcan la exposición al hurto.

  Este enfoque integral permite no solo restablecer el servicio de manera eficiente, sino también generar acciones de control y prevención que contribuyen a disminuir la reincidencia de estos eventos.

5. **Relación alumbrada – seguridad (articulación con interior/policía):**

Mediante el programa de seguridad como “El alcalde en mi barrio” se ha logrado articular trabajo entre Alumbrado público, EMAB, Señalización vial, guardianes ambientales, Bomberos, DADEP, Policía nacional, escuadrón de la empatía, ISABU, secretaria del interior, Bienes y servicios, IDERBU e IMCT para llegar de manera integral a diferentes sectores de la ciudad.

Adicionalmente, se han realizado las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes en los casos identificados de hurto y vandalismo sobre la infraestructura de alumbrado público. Estas acciones tienen como finalidad dejar los respectivos precedentes legales, facilitar el seguimiento institucional de los casos y promover la adopción de medidas correctivas y preventivas que contribuyan a mitigar la ocurrencia de estos eventos.

Este proceso se desarrolla en articulación con las entidades de control y seguridad, fortaleciendo la gestión operativa y el control sobre las afectaciones a la infraestructura eléctrica.

6. **Alumbrado en parques, escenarios deportivos y rutas escolares:**

Etiquetas de fila	Cuenta de Barrio
Cancha Apagada	**11**
ALTOS DEL PROGRESO	1
CAMPO HERMOSO	1
CAMPO MADRID_ ETAPA-1 Y ETAPA -2	1
GALAN	1
GIRARDOT	1
GRANJAS DE JULIO RINCON	1
LA ESPERANZA III	1
NAPOLES	1
VILLA MERCEDES	1
VILLA ROSA	1
VILLAS DE SAN IGNACIO_SAN IGNACIO REAL BAVARIA II	1
Parque Apagado	**4**
ANTONIA SANTOS CENTRO	1
BOLIVAR	1
COLSEGUROS NORTE	1
GRANJAS DE JULIO RINCON	1
Total general	**15**

Se incluye relación de parques y canchas reportadas con baja iluminación o apagado, en base a los reportes creados se informa que los demás se encuentran en óptimo funcionamiento o no han sido reportados.

Estos reportes ya hacen parte de las ordenes de trabajo emitidas a cuadrillas de mantenimiento para su atención.

CONTRATO: 342 DEL 2025
CONTRATISTA: JALGAVI INGENIEROS SAS
OBJETO: PODAS PARA EL DESPEJE DE LUMINARIAS Y REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO
VALOR: $ 1.033.955-610
ADICIONAL 1: 622.660.854,88
ADICIONAL 2: SOLO TIEMPO 1 MES 23 DIAS
FECHA DE INICIO: 10/03/2026
FECHA FIN: 30/11/2026
ESTADO: EN EJECUCION
AVANCE EJECUCION:96%





Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	202500000015897	$ 2.236.173.074,00	$23.055.801.147

ESTADO: Proyectos que se encuentran en estructuración y planeación

PROYECTOS CON RECURSOS POAI

① Modernización del sistema de iluminación del viaducto Alejandro Galvis Ramírez – carrera novena de Bucaramanga

Mes	Actividad
Septiembre	Re-diseño y ajuste de presupuesto a 2026
Septiembre	Banco proyectos (estructuración técnica)
Octubre	Proceso de contratación
Noviembre - Diciembre	Suscripción del contrato

② Modernización del alumbrado público en la carrera 21 entre la calle 56 y el parque san francisco, intercambiador vial del puente el bueno, calle 36 y avenida la rosita entre la carrera 27 y la carrera 33, en el municipio de Bucaramanga, Santander

Mes	Actividad
Septiembre	Re-diseño y ajuste de presupuesto a 2026
Septiembre	Banco proyectos (estructuración técnica)
Octubre	Proceso de contratación
Noviembre - Diciembre	Suscripción del contrato

③ Modernización del alumbrado público en la carrera novena entre la calle 44 y la calle 31 y del intercambiador vial de Provenza localizado en la intersección de la calle 105 con la autopista a Floridablanca, en el municipio de Bucaramanga, Santander ($5.332.318.993)

Mes	Actividad
Septiembre	Re-diseño y ajuste de presupuesto a 2026
Septiembre	Banco proyectos (estructuración técnica)
Octubre	Proceso de contratación
Noviembre - Diciembre	Suscripción del contrato

④ Modernización del alumbrado público de la carrera 33 entre el viaducto la flora y avenida quebrada seca; carrera 33a entre la calle 34 y la calle 14 y, calle 14 entre la carrera 33a y la glorieta del estadio américo Montanini del municipio de Bucaramanga.

Mes	Actividad
Septiembre	Re-diseño y ajuste de presupuesto a 2026
Septiembre	Banco proyectos (estructuración técnica)
Octubre	Proceso de contratación
Noviembre - Diciembre	Suscripción del contrato

⑤ Implementación de iluminación solar fotovoltaica con panel independiente de la luminaria en la vía colorados hasta el intercambiador de la cemento, en el municipio de Bucaramanga, Santander

Mes	Actividad
Septiembre	Re-diseño y ajuste de presupuesto a 2026
Septiembre	Banco proyectos (estructuración técnica)
Octubre	Proceso de contratación
Noviembre - Diciembre	Suscripción del contrato

INFORMACIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL DEL PROYECTO

- **CONTRATO:** 240 DEL 2025
- **OBJETO:** Modernización del alumbrado público en la calle 45 entre el anillo vial y la carrera novena; calle 61 entre el puente El Bueno y la Puerta del Sol; así como la calle 105 entre el puente de Provenza y el puente El Bueno, en el municipio de Bucaramanga
- **VALOR:** $ 20.819.628.073
- **CONTRATISTA:** Consorcio A.P. CVU (EICON S.A.S., 95 %, y Corzo Ingeniería S.A.S., 5 %)
- **INTERVENTORÍA:** Universidad de Pamplona (Contrato de interventoría No. 039 de 2026)
- **FECHA DE INICIO:** 02/03/2026
- **FECHA FIN:** 31/12/2026 (tras la prórroga No. 1 hasta el 01/10/2026 y la prórroga No. 2 de noventa días calendario)
- **ESTADO:** EN EJECUCIÓN – Contrato vigente, prorrogado y modificado mediante el Otrosí No. 2
- **AVANCE EJECUCION FISICA:** 8%

INFORMACIÓN AVANCE DE EJECUCIÓN:

- El contrato se adjudicó mediante licitación pública SI-SI-LP-004-2025 y se suscribió el 03 de octubre de 2025, con un plazo inicial de dos (2) meses y veinte (20) días. El acta de inicio se firmó el 02 de marzo de 2026, con fecha de terminación inicial el 21 de mayo de 2026.
- El 20 de marzo de 2026 se suscribió la prórroga No. 1 por cuatro (4) meses y diez (10) días, para igualar el plazo con el del contrato de interventoría No. 039 de 2026. Con ella, la fecha de terminación pasó al 01 de octubre de 2026.
- Antes de iniciar las obras, el contratista revisó la ingeniería de detalle: levantamientos topográficos, validación de la infraestructura existente, análisis de interferencias, actualización de cantidades de obra y verificación del cumplimiento del RETIE y el RETILAP.
- Esa revisión evidenció diferencias frente a la estructuración inicial del proyecto. Por ello fue necesario incorporar actividades no previstas, ajustar cantidades de obra, actualizar especificaciones técnicas y elaborar treinta y dos (32) análisis de precios unitarios no previstos (APU NP). También se ajustaron los costos de mano de obra al salario mínimo y al auxilio de transporte de 2026 (Decretos 1469 y 1470 de 2025).
- El 31 de julio de 2026, mediante la comunicación AP CVU-070-2025, el contratista solicitó una prórroga de noventa (90) días calendario y la modificación del contrato. La interventoría revisó la solicitud y la avaló mediante concepto del 07 de septiembre de 2026.
- El 08 de septiembre de 2026 las partes suscribieron el acta de modificación y el acta de pactación de precios unitarios, con base en el balance de mayores y menores cantidades de obra. Estos ajustes no modifican el valor total del contrato.
- Mediante el Otrosí No. 2 se prorroga el contrato por noventa (90) días calendario, para

un plazo total de siete (7) meses y noventa (90) días contados desde el 02 de marzo de 2026, sin superar el 31 de diciembre de 2026. Además, se modifican el alcance y los valores unitarios, y el valor total se mantiene en $ 20.819.628.073.







Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO DE REFERENCIA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	202500000028264	$ 0	$ 2.500.000.000,00

Resumen del proyecto: El municipio es responsable de prestar el servicio de alumbrado público consistente en la iluminación de las vías públicas, parques públicos, escenarios deportivos y demás espacios de libre circulación que no se encuentran a cargo de ninguna persona Natural o Jurídica diferente del municipio.

Realizar un estudio técnico diagnóstico del sistema de alumbrado público que permita identificar sus condiciones actuales, deficiencias técnicas y oportunidades de mejora para orientar su planificación y modernización del alumbrado en el municipio.

Realizar un ajuste integral a la prestación del servicio mediante un estudio técnico de referencia, con el fin de satisfacer las necesidades de avanzar en la modernización, renovación y expansión del alumbrado público urbano y rural del Municipio de Bucaramanga, haciendo uso de tecnologías más amigables con el medio ambiente, favoreciendo la seguridad de los ciudadanos, entregando espacios iluminados que brinden la sensación de espacios seguros en la ciudad, tanto en sus zonas urbanas como rurales, encaminando grandes esfuerzos e inversiones, tanto físicas, económicas y de personal.

Objetivo: Mejorar el servicio de Alumbrado Público en la ciudad, mediante el desarrollo de nuevas tecnologías, la optimización del sistema tarifario, el fortalecimiento de la infraestructura, la implementación eficiente de un centro de control y monitoreo, y la autogeneración de energías limpias autosostenibles, con el fin de garantizar un servicio de calidad, eficiente, sostenible y efectivo del sistema de iluminación en espacios públicos, que además propicie seguridad ciudadana, confianza en el uso de espacios públicos y desarrollo económico.

BENEFICIOS DEL PROYECTO:
SOCIALES: El proyecto tiene como principal beneficio el fortalecimiento en el desarrollo y ejecución de las actividades de seguimiento y control a procesos de la secretaría de Infraestructura-Alumbrado Público.
ECONÓMICOS: Implementado nueva tecnología e instalando luminarias LED, genera disminución en los altos niveles de consumo de energía y mantenimiento.
AMBIENTALES: Generar un impacto ambiental, disminuyendo los niveles de dióxido de carbono en la ciudad, al construir el sistema de iluminación con nuevas tecnologías y uso de luminarias LED.

INFORMACIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL DEL PROYECTO

- **CONTRATO**: 176 DEL 2025
- **OBJETO**: Realizar El Estudio Técnico De Referencia De Determinación De Costos, Optimizar La Eficiencia Energética Y Puesta En Marcha Del Esquema De Operación Para El Sistema De Alumbrado Público Del Municipio De Bucaramanga
- **VALOR**: $ 2.500.000.000
- **FECHA DE INICIO**: 25/08/2025
- **FECHA FIN**: 23/12/2026 (fecha de terminación final, tras suspensión del 22/12/2025 y reinicio del 16/07/2026)
- **ESTADO**: EN EJECUCIÓN – Avance del 14 % del primer entregable con corte al 20/08/2026

INFORMACIÓN AVANCE DE EJECUCIÓN:

- Se revisó y aprobó el plan de trabajo remitido por el contratista.

- Se realizó mesa de trabajo con el líder técnico del proceso de formulación del ETR el 15 de Sept, donde se revisó el plan de trabajo y entregables, se definió avances de forma quincenal con el fin de llevar un seguimiento.
- Se recibió Solicitud de información por parte del contratista, de esta información ya se realizó una primera entrega de información el día 19 de Sept. Para los puntos pendientes por entregar ya se elaboraron los oficios para ser remitidos a la secretaria de Planeación y secretaria de Hacienda y poder consolidar la información solicitada.
- El contrato fue suspendido el 22/12/2025 y reiniciado el 16/07/2026, con fecha de terminación final el 23/12/2026. Contratista: Promotora Energética del Centro S.A.S. E.S.P.
- Entre el 16 de julio y el 16 de agosto de 2026 se adelantó el Producto No. 1: Inventario georreferenciado de la infraestructura del sistema de alumbrado público, registrado y actualizado en el Sistema de Información de Alumbrado Público (SIAP), con levantamientos en las comunas 7, 8, 9, 11 y 17.
- La supervisión realizó visitas técnicas de verificación en campo entre el 29 y el 31 de julio de 2026 (parque Las Mariposas – comuna 17, parque Los Canelos – comuna 8 y parque Los Gatos), así como en la comuna 11 (parque Divino Porvenir), la comuna 6 (polideportivo) y la comuna 9 (parque lineal, barrio San Martín).
- El 01 de agosto de 2026 se suscribió el acta de reunión No. 01 sobre los imprevistos presentados en el levantamiento del inventario de la comuna 7.
- Mediante oficio con radicado No. 2-AP-202608-00073809 del 13 de agosto de 2026 se solicitó al contratista la programación semanal anticipada del personal en campo y las planillas de pago de seguridad social del personal.
- En el comité técnico del 20 de agosto de 2026 se acordaron las socializaciones por comunas, el envío semanal de la programación del ETR, la entrega de planillas e informes mensuales y la inclusión de los reportes de infraestructura levantada. A la fecha, Alumbrado Público ha entregado el 75 % de la información requerida por el contratista; queda pendiente el 25 %.
- La supervisión verificó el pago de seguridad social de las 33 personas en campo y revisa diariamente la información cargada en la plataforma; las inconsistencias evidenciadas se comunican al contratista para su corrección.

Registro fotográfico de las visitas de supervisión – julio de 2026:



Foto 1. El ingeniero Giovanny Robelto Valderrama explica la importancia del ETR para el municipio de Bucaramanga (parque Las Mariposas, comuna 17 – 29/07/2026).

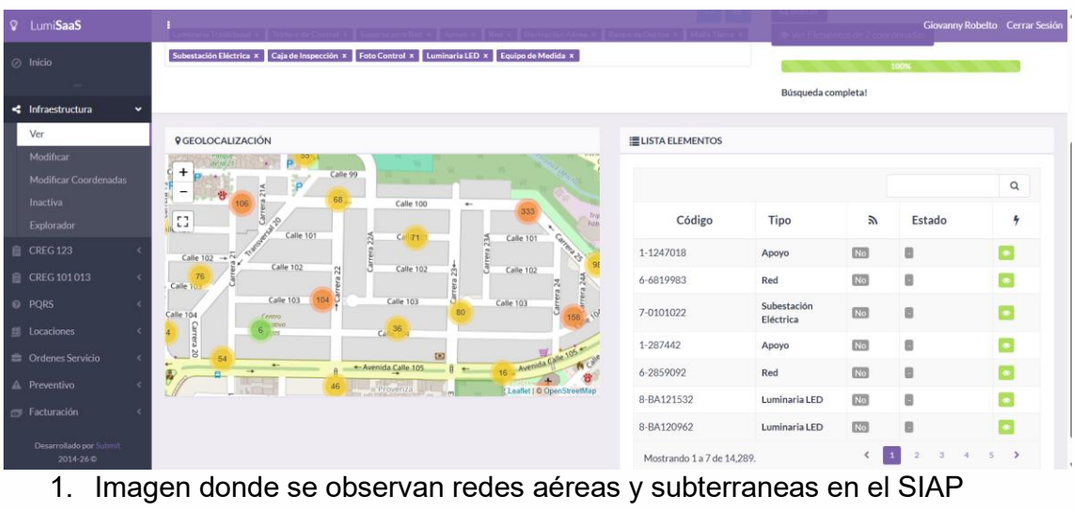


Foto 2. El equipo de apoyo a la supervisión revisa que los elementos cargados en campo a la plataforma coincidan con los respectivos BA de las luminarias (parque Los Canelos, comuna 8 – 30/07/2026).

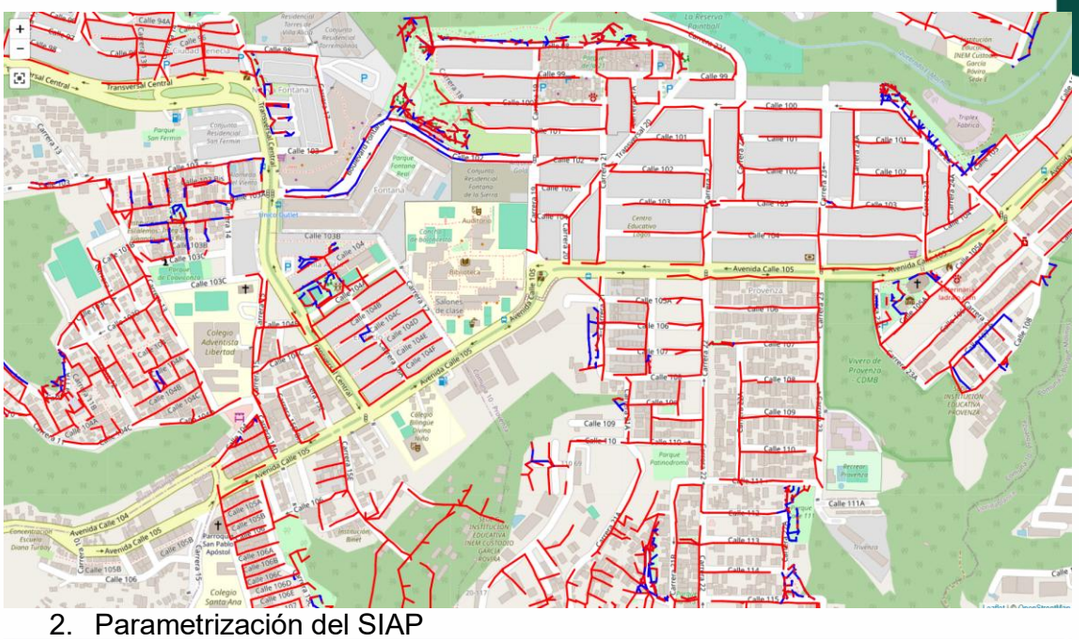


Foto 3. Se revisa por parte de los apoyos técnicos de la supervisión de alumbrado Público, el levantamiento del inventario de los elementos que conforman el sistema de alumbrado público del parque divino porvenir comuna 11


1. Imagen donde se observan los elementos creados en el SIAP y georreferenciados por ETR





1. Imagen donde se observan redes aéreas y subterraneas en el SIAP





2. Parametrización del SIAP

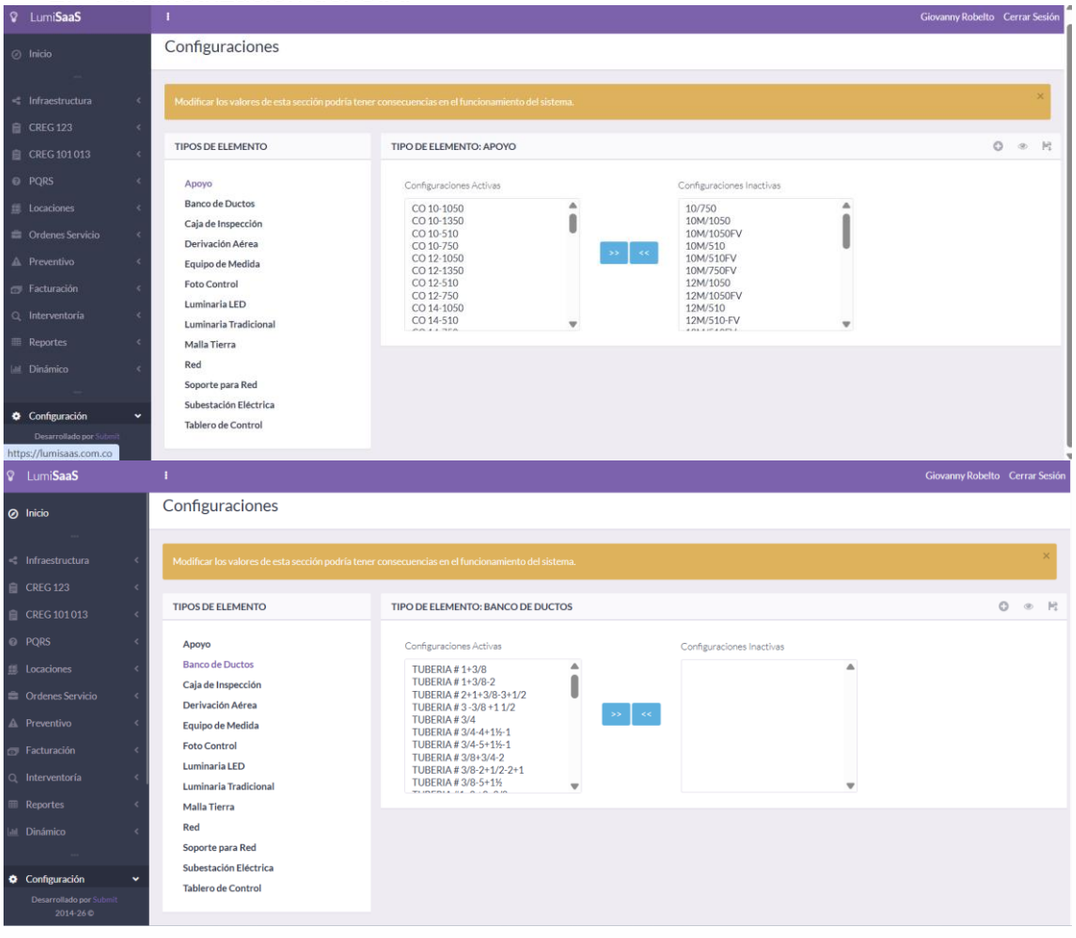


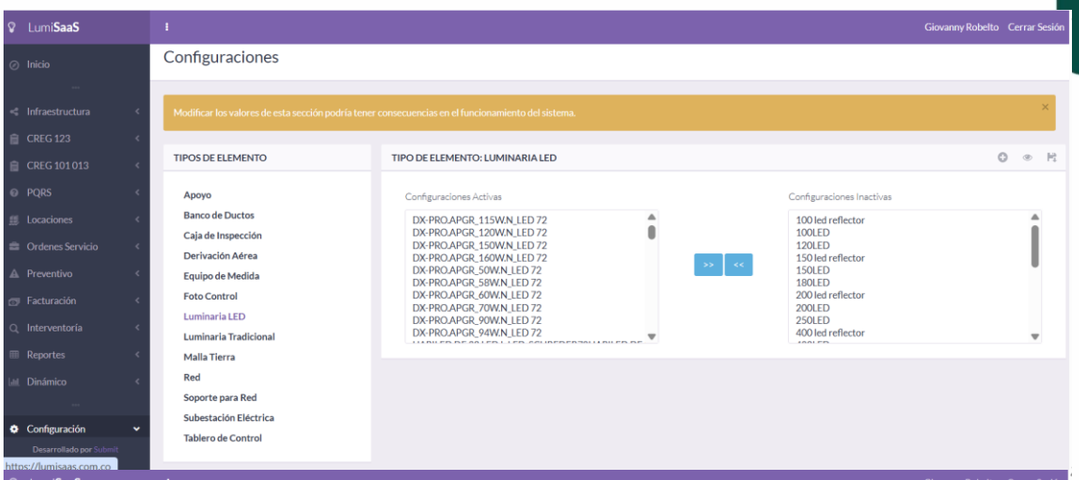

LumiSaaS
Giovanny Robelto Cerrar Sesión
Inicio
Infraestructura
CREG 123
CREG 101 013
PQRS
Locaciones
Ordenes Servicio
Preventivo
Facturación
Interventoría
Reportes
Dinámico
Configuración
Desarrollado por Submit
https://lumisaas.com.co
Configuraciones
Modificar los valores de esta sección podría tener consecuencias en el funcionamiento del sistema.
TIPOS DE ELEMENTO
Apoyo
Banco de Ductos
Caja de Inspección
Derivación Aérea
Equipo de Medida
Foto Control
Luminaria LED
Luminaria Tradicional
Malla Tierra
Red
Soporte para Red
Subestación Eléctrica
Tablero de Control
TIPO DE ELEMENTO: LUMINARIA LED
Configuraciones Activas
DX-PRO.APGR_115W.N_LED 72
DX-PRO.APGR_120W.N_LED 72
DX-PRO.APGR_150W.N_LED 72
DX-PRO.APGR_160W.N_LED 72
DX-PRO.APGR_50W.N_LED 72
DX-PRO.APGR_58W.N_LED 72
DX-PRO.APGR_60W.N_LED 72
DX-PRO.APGR_70W.N_LED 72
DX-PRO.APGR_90W.N_LED 72
DX-PRO.APGR_94W.N_LED 72
>> <<
Configuraciones Inactivas
100 led reflector
100LED
120LED
150 led reflector
150LED
180LED
200 led reflector
200LED
250LED
400 led reflector

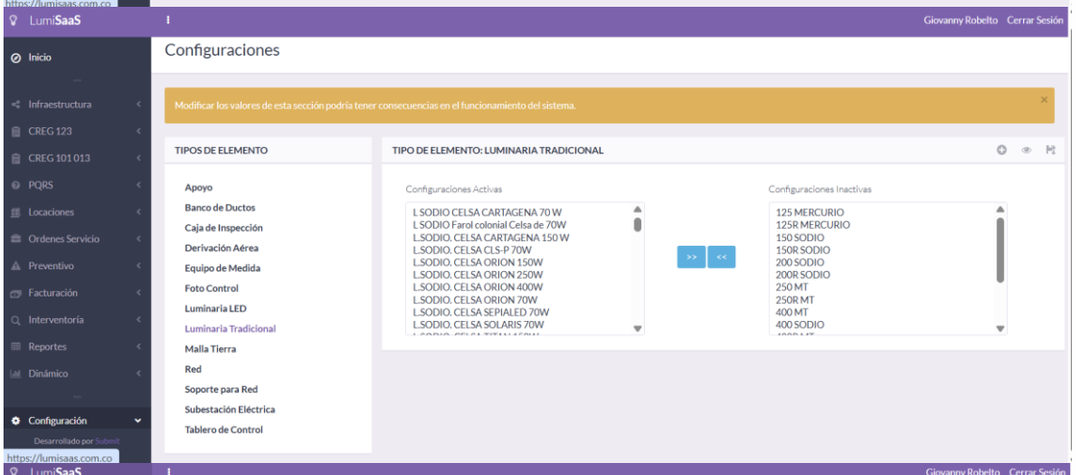

LumiSaaS
Giovanny Robelto Cerrar Sesión
Inicio
Infraestructura
CREG 123
CREG 101 013
PQRS
Locaciones
Ordenes Servicio
Preventivo
Facturación
Interventoría
Reportes
Dinámico
Configuración
Desarrollado por Submit
https://lumisaas.com.co
Configuraciones
Modificar los valores de esta sección podría tener consecuencias en el funcionamiento del sistema.
TIPOS DE ELEMENTO
Apoyo
Banco de Ductos
Caja de Inspección
Derivación Aérea
Equipo de Medida
Foto Control
Luminaria LED
Luminaria Tradicional
Malla Tierra
Red
Soporte para Red
Subestación Eléctrica
Tablero de Control
TIPO DE ELEMENTO: LUMINARIA TRADICIONAL
Configuraciones Activas
L.SODIO CELSA CARTAGENA 70 W
L.SODIO Farol colonial Celsa de 70W
L.SODIO. CELSA CARTAGENA 150 W
L.SODIO. CELSA CLS-P 70W
L.SODIO. CELSA ORION 150W
L.SODIO. CELSA ORION 250W
L.SODIO. CELSA ORION 400W
L.SODIO. CELSA ORION 70W
L.SODIO. CELSA SEPIALED 70W
L.SODIO. CELSA SOLARIS 70W
>> <<
Configuraciones Inactivas
125 MERCURIO
125R MERCURIO
150 SODIO
150R SODIO
200 SODIO
200R SODIO
250 MT
250R MT
400 MT
400 SODIO

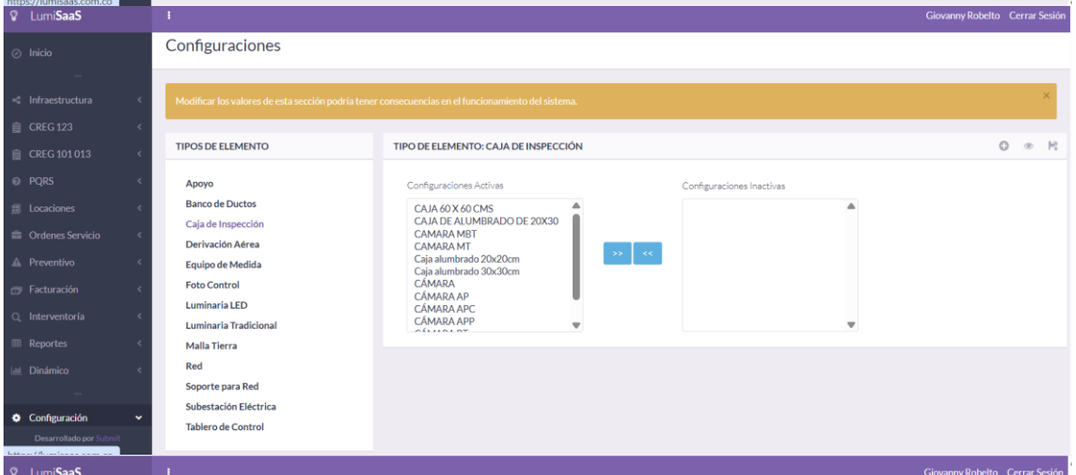
LumiSaaS
Giovanny Robelto Cerrar Sesión
Inicio
Infraestructura
CREG 123
CREG 101 013
PQRS
Locaciones
Ordenes Servicio
Preventivo
Facturación
Interventoría
Reportes
Dinámico
Configuración
Desarrollado por Submit
Configuraciones
Modificar los valores de esta sección podría tener consecuencias en el funcionamiento del sistema.
TIPOS DE ELEMENTO
Apoyo
Banco de Ductos
Caja de Inspección
Derivación Aérea
Equipo de Medida
Foto Control
Luminaria LED
Luminaria Tradicional
Malla Tierra
Red
Soporte para Red
Subestación Eléctrica
Tablero de Control
TIPO DE ELEMENTO: CAJA DE INSPECCIÓN
Configuraciones Activas
CAJA 60 X 60 CMS
CAJA DE ALUMBRADO DE 20X30
CAMARA MBT
CAMARA MT
Caja alumbrado 20x20cm
Caja alumbrado 30x30cm
CÁMARA
CÁMARA AP
CÁMARA APC
CÁMARA APP
>> <<
Configuraciones Inactivas

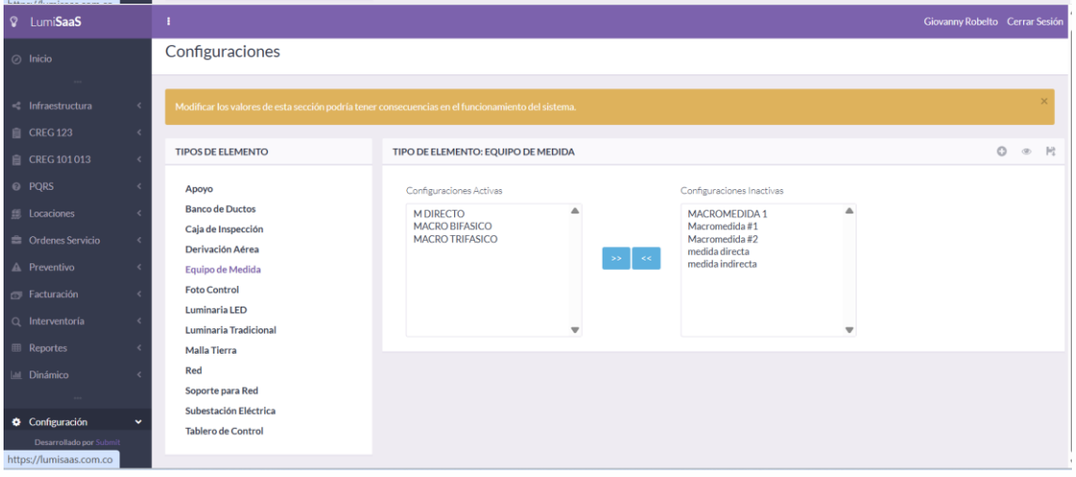
LumiSaaS
Giovanny Robelto Cerrar Sesión
Inicio
Infraestructura
CREG 123
CREG 101 013
PQRS
Locaciones
Ordenes Servicio
Preventivo
Facturación
Interventoría
Reportes
Dinámico
Configuración
Desarrollado por Submit
https://lumisaas.com.co
Configuraciones
Modificar los valores de esta sección podría tener consecuencias en el funcionamiento del sistema.
TIPOS DE ELEMENTO
Apoyo
Banco de Ductos
Caja de Inspección
Derivación Aérea
Equipo de Medida
Foto Control
Luminaria LED
Luminaria Tradicional
Malla Tierra
Red
Soporte para Red
Subestación Eléctrica
Tablero de Control
TIPO DE ELEMENTO: EQUIPO DE MEDIDA
Configuraciones Activas
M DIRECTO
MACRO BIFASICO
MACRO TRIFASICO
>> <<
Configuraciones Inactivas
MACROMEDIDA 1
Macromedida #1
Macromedida #2
medida directa
medida indirecta

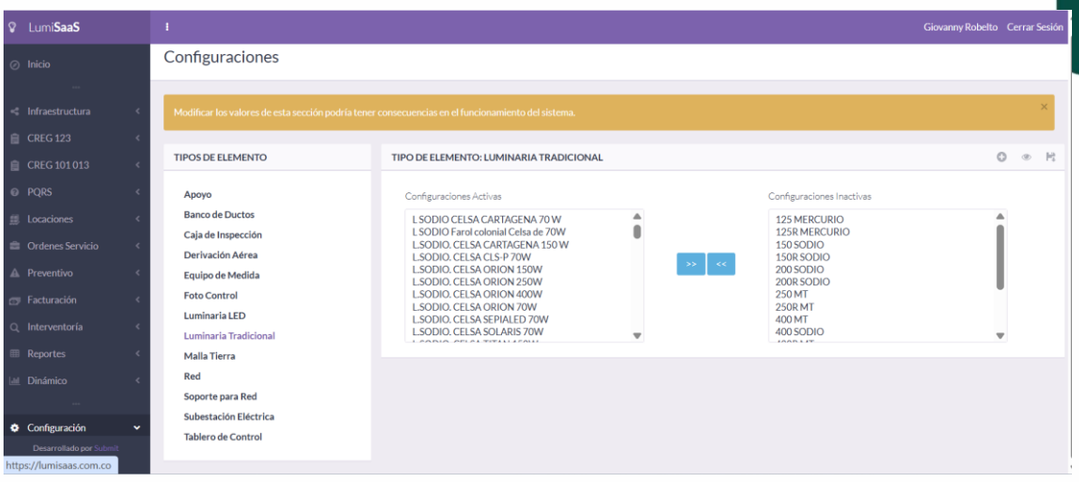

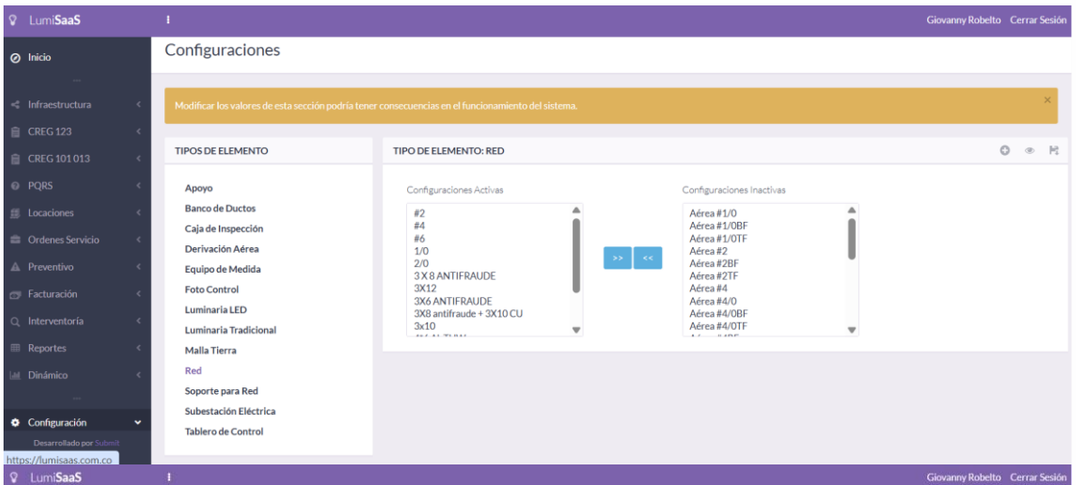

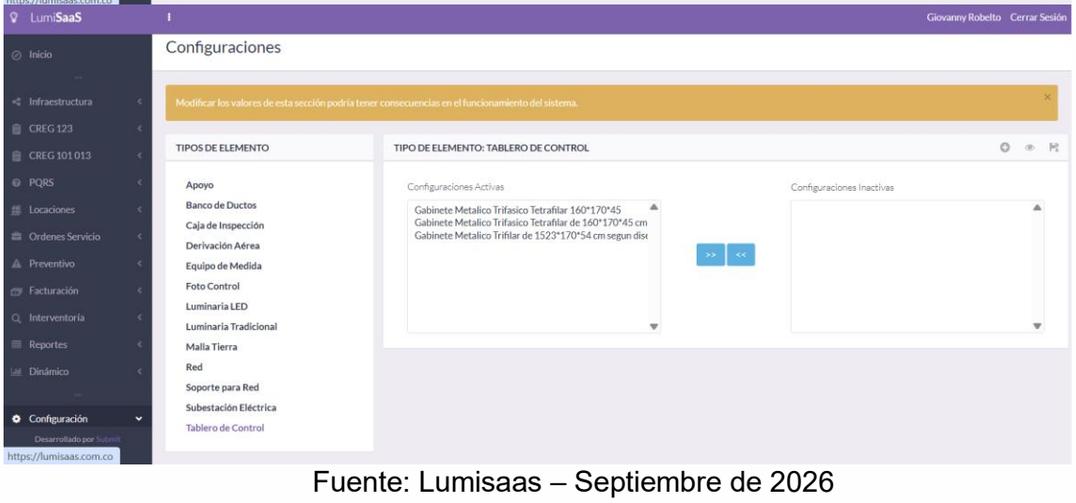

Fuente: Lumisaas – Septiembre de 2026

META E INDICADOR DE PRODUCTO

Implementar un sistema de gestión y monitoreo de la información del alumbrado público acorde a RETILAP.

Indicador	Meta 2026	Logro 2026	% Avance 2026	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Sistemas de información actualizados	0,3	0	0%	$ 1.633.400.344,62	$ 0	0%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE BUCARAMANGA	2024680010205	$ 500.000.000	$ 2.266.800.689,23

Resumen del proyecto: Teniendo en cuenta que el Municipio de Bucaramanga tiene establecido el Impuesto de Alumbrado Público según acuerdo municipal vigente 044 de 2008 y que esta es una renta de destinación específica, es claro y conveniente que se utilice recursos de este rubro para atender todas las necesidades de la prestación del servicio de alumbrado público incluido los gastos administrativos.

Dada la importancia en la prestación del servicio de alumbrado público es necesario realizar la adquisición de la renovación de las licencias OPUS, SGAP, SIAP y otras herramientas tecnológicas, para garantizar el funcionamiento eficaz del área de diseño, garantizando a su vez la administración, operación y mantenimiento y de esta manera prestar el servicio esencial de alumbrado público que no se puede dejar de prestar, por seguridad de todos los habitantes del Municipio.

SOCIALES: El proyecto tiene como principal beneficio el fortalecimiento en el desarrollo y ejecución de las actividades de seguimiento y control a procesos de la secretaría de Infraestructura-Alumbrado Público.
ECONÓMICOS: Implementado nueva tecnología, genera disminución en los altos niveles de consumo de energía y en los costos de mantenimiento especialmente en el ahorro en la contratación de cuadrillas de mantenimiento.
AMBIENTALES: Generar un impacto ambiental, disminuyendo los niveles de dióxido de carbono en la ciudad, al construir el sistema de iluminación con nuevas tecnologías.

PROCESOS CONTRACTUALES RELACIONADOS CON EL PROYECTO Y LA META INFORMACIÓN DEL PROCESO COTRACTUAL DE SGAP

- **CONTRATO**: 075 DEL 2025
- **OBJETO**: Servicio De Soporte Y Mantenimiento Del Sistema De Gestión De Alumbrado Público-SGAP Y El Hardware De Control Asociado En Los Diferentes Sitios De Telemedida Del Municipio De Bucaramanga.
- **VALOR**: $ 277.556.919
- **FECHA DE INICIO**: 21/05/2025
- **FECHA FIN**: 31/12/2025
- **ESTADO**: Proyecto liquidado y en proceso de contratación.

Actualmente se encuentra en proceso de contratación la plataforma tecnológica (SGAP), Se estima que el proceso contractual inicie en la primera semana de octubre de 2026.

El software de gestión del Alumbrado Público tiene como objetivo optimizar el control y la operación de las luminarias de la ciudad de Bucaramanga. La plataforma se enfoca en mantener la máxima disponibilidad del servicio, asegurar una alta eficiencia operativa y minimizar los costos asociados a las fallas recurrentes, todo ello a través de una estrategia que va más allá del mantenimiento convencional.

El software busca transformar la gestión del alumbrado público en una plataforma inteligente, trazable y adaptable, asegurando que cada acción técnica esté respaldada por análisis predictivos, indicadores de rendimiento y propuestas de mejora continuas. Esta herramienta facilita una toma de decisiones más ágil y precisa, permitiendo a los gestores anticiparse a posibles riesgos y mejorar la calidad del servicio para los ciudadanos.

Características Claves del Software

1. Monitoreo y Control Remoto: El software permite monitorear el estado de las luminarias en tiempo real, con actualizaciones periódicas sobre la comunicación y el

funcionamiento de cada unidad. Esto facilita la identificación de fallas y la implementación de soluciones antes de que se conviertan en problemas mayores.


2. Gestión de Alarmas y Fallas: A través del sistema, se gestionan las alarmas y fallas de forma eficiente, con un proceso automatizado que detecta y notifica incidencias en el menor tiempo posible. Además, el software tiene la capacidad de reducir eventos críticos en más del 95% mediante mantenimiento preventivo, correctivo y un seguimiento remoto constante.
3. Optimización de Mantenimiento Preventivo: El sistema permite la programación de intervenciones periódicas, garantizando que todas las luminarias se mantengan en condiciones óptimas. Las intervenciones incluyen inspecciones regulares, limpieza, revisión de conexiones eléctricas y validación de parámetros técnicos.
4. Gestión de Base de Datos y Respaldos: El software asegura la integridad de los datos mediante la depuración semanal y la verificación de copias de seguridad. De esta manera, se preserva la información histórica y operativa para la toma de decisiones a largo plazo.
5. Análisis de Desempeño y Mejora Continua: El software consolida los indicadores clave de desempeño, trazabilidad de fallas, análisis de costos operativos y propuestas de mejora. Esto permite a los responsables de la gestión del alumbrado público optimizar los recursos, reducir el tiempo de inactividad y mejorar la calidad del servicio prestado a la comunidad.


6. Soporte Técnico Especializado: A través de la plataforma, se proporciona soporte técnico tanto remoto como presencial para resolver incidentes relacionados con el hardware y el software. Esto incluye la atención de fallas en sensores, controladores y otros componentes esenciales para el funcionamiento del sistema de alumbrado público.
7. Capacitación y Actualización del Personal: El software también incluye módulos para la capacitación continua del personal operativo, asegurando que estén actualizados en el manejo del sistema y la integración de nuevos equipos.

Beneficios para la Gestión del Alumbrado Público. El uso de este software permite una gestión más eficiente y proactiva del alumbrado público de Bucaramanga, con los siguientes beneficios clave:

- Mayor disponibilidad y confiabilidad del servicio, reduciendo significativamente el tiempo de inactividad.
- Mejor control y trazabilidad, lo que permite una mejor planificación y ejecución de las actividades de mantenimiento.
- Reducción de costos operativos, gracias a la optimización de recursos y la prevención de fallas.
- Mayor resiliencia ante incidentes, con una respuesta más rápida y efectiva a las alertas del sistema.

El software de soporte y tele gestión implementado en el Alumbrado Público de Bucaramanga SGAP, no solo facilita la operación diaria de las luminarias de la ciudad, sino que también transforma la gestión del alumbrado en una plataforma inteligente y adaptable. Con su capacidad de monitoreo en tiempo real, gestión de alarmas, mantenimiento preventivo y análisis de desempeño, el sistema asegura una operación eficiente, confiable y resiliente, elevando la calidad del servicio y optimizando los recursos públicos.

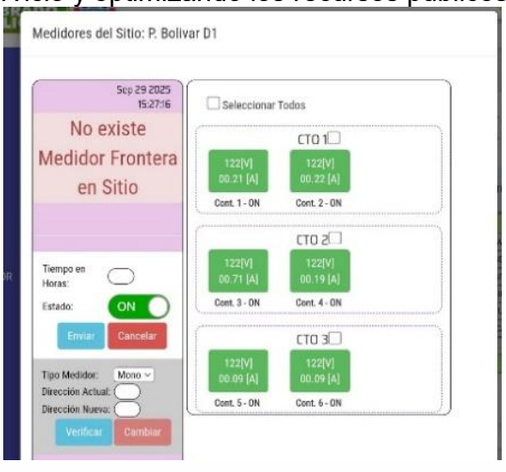

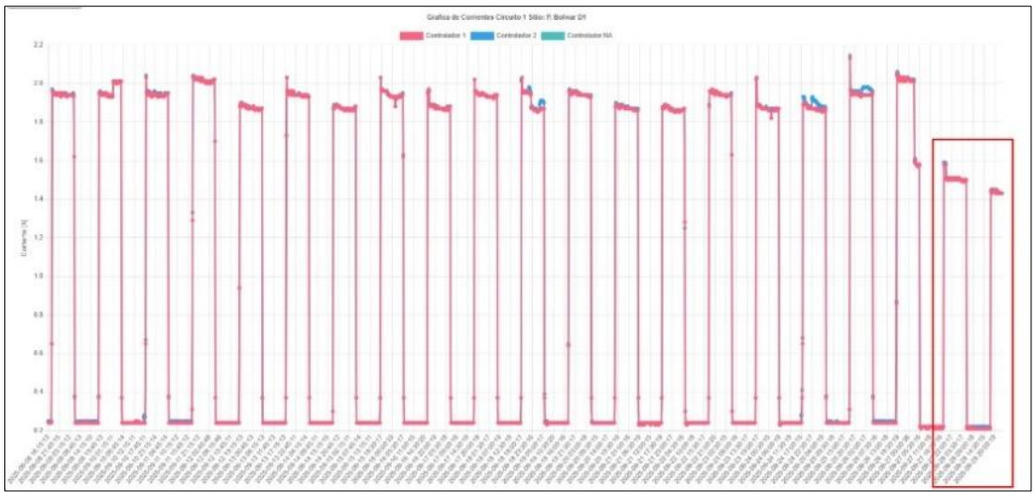



INFORMACIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SIAP

- **CONTRATO**: 175 DEL 2025
- **OBJETO**: Análisis Y Diagnostico De La Situación Actual E Implementación De Un Sistema De Información De Alumbrado Público - SIAP En El Municipio De Bucaramanga
- **VALOR**: $ 259.205.210
- **FECHA DE INICIO**: 25/08/2025
- **FECHA FIN**: 31/12/2025
- **ESTADO**: TERMINADO EN TRAMITE DE LIQUIDACIÒN

Información Sobre Avance De Ejecución Del Proceso

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN

1.1 Sobre la información base y la fase de diagnóstico

- La supervisión observa que una parte significativa de la información utilizada como insumo para el diagnóstico inicial correspondía a bases de datos desactualizadas y a información incompleta, situación que fue debidamente documentada por el contratista y validada por la supervisión.
- Se deja constancia de que dichas limitaciones no fueron atribuibles al contratista, sino a condiciones preexistentes del sistema de información del Alumbrado Público.
- La supervisión verificó que estas limitaciones fueran explícitamente reconocidas en los informes, permitiendo que las conclusiones y decisiones posteriores se adoptaran con conocimiento de los riesgos asociados.

1.2 Sobre la selección de la alternativa tecnológica

- La supervisión observa que la selección de la alternativa tecnológica se realizó con base en criterios funcionales y normativos alineados con las necesidades identificadas en el diagnóstico.
- No obstante, se deja constancia de que, para efectos de auditoría o control posterior, resulta conveniente fortalecer el expediente con evidencias adicionales que respalden la verificación de cumplimiento de todos los requisitos técnicos y normativos evaluados.
- La supervisión considera que esta observación no afecta la validez de la selección, sino que constituye una recomendación para robustecer la trazabilidad documental.

1.3 Sobre la implementación y puesta en marcha del SIAP

- La supervisión observa que la implementación del SIAP se realizó de manera progresiva y articulada con el Estudio Técnico de Referencia, considerando la decisión institucional de levantar la información desde cero.
- Se deja constancia de que la puesta en marcha corresponde a la **habilitación operativa del sistema**, y no a la culminación del levantamiento total del inventario de alumbrado público, el cual constituye un proceso posterior y continuo.
- La supervisión verificó el funcioamiento del sistema, la creación de usuarios, la instalación de aplicaciones y la ejecución de capacitaciones como requisitos mínimos para la puesta en marcha.

1.4 Sobre la capacitación y apropiación del sistema

- La supervisión observa que las capacitaciones se priorizaron en las áreas críticas para el inicio de la operación del sistema, tales como bodega, almacén y levantamiento en campo.
- Se deja constancia de que, debido a la alta rotación de personal en algunas áreas, la capacitación integral de todos los usuarios finales fue prevista como un proceso progresivo, recomendándose su continuidad para garantizar la apropiación institucional del sistema.
- Esta situación fue conocida, aceptada y gestionada dentro del marco del contrato, sin afectar el cumplimiento de la actividad de implementación.

1.5 Sobre la documentación y versión de los informes

- La supervisión observa que algunos informes se presentan como versiones preliminares, debido a la programación de entrevistas y validaciones pendientes relacionadas con seguridad de la información y privacidad.
- Se recomienda que dichas validaciones sean incorporadas en una versión final consolidada del informe, con el fin de fortalecer el componente de seguridad y gobernanza de la información.
- Esta observación no impide el reconocimiento del cumplimiento de las actividades contractuales, pero sí se registra como un aspecto a cerrar formalmente en el expediente.

1.6 Sobre el ejercicio de la supervisión

- La supervisión deja constancia de que durante la ejecución del contrato se ejerció control permanente mediante revisión documental, seguimiento cronológico, requerimientos formales, mesas técnicas y validación de evidencias.
- Las observaciones realizadas al contratista fueron atendidas oportunamente, sin que se presentaran incumplimientos reiterados ni controversias que afectaran la ejecución del contrato.

2. CONCLUSIONES DE LA SUPERVISIÓN

1. Las actividades contractuales correspondientes a las **Actividades 1.1 (Recopilación), 1.2 (Análisis y Diagnóstico), 1.3 (Selección de Alternativa) y Actividad 2 (Implementación y Puesta en Marcha del SIAP)** fueron ejecutadas conforme al alcance definido en el Contrato Interadministrativo No. 175 de 2025.
2. El contratista dio cumplimiento a las obligaciones contractuales, entregando los productos esperados y atendiendo los requerimientos realizados por la supervisión durante la ejecución del contrato.

3. La supervisión ejerció de manera efectiva sus funciones de control, seguimiento y verificación, dejando trazabilidad documental y cronológica de las actuaciones realizadas.
4. El Sistema de Información de Alumbrado Público – SIAP fue implementado y puesto en marcha, quedando habilitado para su operación inicial por parte de la Entidad, con usuarios creados, dispositivos configurados y personal capacitado.
5. Las observaciones formuladas por la supervisión se enmarcan en un enfoque preventivo y de mejora continua, y no constituyen incumplimientos contractuales.
6. En consecuencia, y sin perjuicio de las recomendaciones consignadas, la supervisión concluye que el contrato **cumplió con el objeto y las actividades contratadas**, dejando constancia para los fines administrativos, técnicos y de control a que haya lugar

Actualmente se encuentra en proceso de contratación la plataforma tecnológica del Sistema de Información de Alumbrado Público (SIAP), a la cual se migrarán los datos actualizados para garantizar su óptima operación. Se estima que este proceso contractual inicie en octubre de 2026.

6-OTROS PROYECTOS CONTRATADOS Y QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 166 DEL 2023 con objeto: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Información con corte al 30 de septiembre de 2026

Valor del contrato:	$85.373.383.221
Duración del contrato:	53 meses y 20 días
Fecha de suscripción:	28 de junio de 2023
Fecha de inicio:	12 de julio de 2023
Fecha de terminación:	31 de diciembre de 2027
Estado del Contrato:	EJECUCIÓN
Porcentaje avance:	17,33 %

Ubicación: Intervención en las siguientes Instituciones Educativas:

- Institución Educativa Tecnológico Dámaso Zapata
- Institución Educativa Custodio García Rovira INEM
- Institución Educativa: Santander

Descripción de actividades desarrolladas

1. Remisión de información a FINDETER

Desde la supervisión del municipio de Bucaramanga, se ha remitido a FINDETER la información necesaria para adelantar los respectivos procesos de contratación, en las siguientes fechas:

1. Proyecto Dámaso Zapata: Se envió el alcance del proyecto el **22 de mayo de 2025**, mediante radicado 2-S-SdIB-202505-00040686
2. Proyecto Institución Educativa Santander: Se envió el alcance del proyecto **el 30 de enero de 2025**, mediante radicado S-SdIB-202504-00003567 al cual se le dio alcance el pasado 25 de junio de 2025, a través radicado 2-S-SdIB-202506-00055252 realizando la actualización de precios al segundo semestre del 2025, así como incluyendo el proyecto de estudio de patología en esta institución.

3. Proyecto INEM: Se envió el link con la información que contiene el alcance final del proyecto el 06 de junio de 2025, y la actualización de precios para el segundo semestre el 25 de junio de 2025.

Así mismo, de manera oportuna se ha revisado y enviado las observaciones a los estudios previos remitidos por parte de Findeter.

2. Estado contractual y financiero del convenio

El valor del contrato se encuentra distribuido de la siguiente manera:

- VALOR INICIAL CONTRATO de SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($79.668.991.613), correspondientes a los del **empréstito**.

A este convenio posteriormente se le realizaron 4 adiciones con cargo a los recursos del presupuesto de la alcaldía (no de empréstitos), de la siguiente forma:

- VALOR ADICIONAL 1: DOS MIL SEISCIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($2.601.319.769).
- VALOR ADICIONAL 2: DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($2.494.271.839).
- VALOR ADICIONAL 3: CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCT ($ 163.800.000,00)
- VALOR ADICIONAL 4: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCT ($445.000.000,00).

Para un valor total del contrato de OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE. ($ 85.373.383.221,00)

En cuanto al plazo, el convenio ha tenido las siguientes modificaciones:

- PRÓRROGA No. 1: suscrita el 11 de marzo de 2025, junto con el Adicional No. 3.
- PRÓRROGA No. 2: suscrita el 10 de septiembre de 2026, sin costo adicional, con la cual el plazo del convenio se extiende hasta el 31 de diciembre de 2027.

3. Distribución presupuestal por institución educativa

Teniendo en cuenta el valor global del convenio, anteriormente indicado, se aclara que en este se encuentran incluidos todos los costos asociados, tales como: los estudios y diseños, los estudios de patología, la ejecución de las obras, las interventorías, la gerencia del proyecto, así como los correspondientes impuestos y tasas derivados de la suscripción del convenio, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera por Institución educativa:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	VALOR ASIGNADO
Institución Educativa Custodio García Rovira INEM	$ 27.652.155.890
Institución Educativa: Santander	$ 12.041.647.730
Institución Educativa Tecnológico Dámaso Zapata	$ 45.679.579.601

4. Avances en procesos de contratación

De manera que a la fecha FINDETER ha adelantado los procesos de contratación de estudios, diseños y obra https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atbucaramanga-o-052-2025 e interventoría https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atbucaramanga-i-058-2025 para la Institución Educativa Tecnológico Dámaso Zapata

Teniendo en cuenta el link del proceso anteriormente indicado y de acuerdo a los términos de referencia publicados se tienen los siguientes plazos establecidos para la ejecución del proyecto:

ESTADO DEL PROYECTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DÁMASO ZAPATA

CONTRATO DE CONSTRUCCION

Estado: En ejecución – El contrato de obra se realizó en llave en mano, el mismo contrato tiene 2 etapas, la primera etapa estudios y diseños, la cual tenía una duración inicial de 3 meses y q prorroga de 1 mes, quedando 4 meses de ejecución los cuales terminaron el día 21 de mayo del 2026. Sin embargo, a la fecha presente estamos aún a la espera del reporte por parte de Findeter de los entregables finales de dicha consultoría, todo esto debido a que no han sido aprobados en su 100% por el quipo de la interventoría.

Los diseños ya fueron radicados en la curaduría urbana No 2 de Bucaramanga y está ya se pronunció con varias observaciones el día 28 de agosto de 2026, las cuales ya fueron resueltas y radicadas nuevamente, a la fecha presente se está a la espera del veredicto final de la curaduría para la actualización y/o expedición de la licencia de construcción del proyecto, para seguido a esto iniciar el proceso de la etapa 2 que corresponde a la obra. Una vez se apruebe la licencia y Findeter nos socialice el definitivo de los componentes del proyecto, se conocerá el tiempo y valor de la etapa de la Obra.

Link: https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atbucaramanga-o-052-2025

No de proceso de contratación: PAF-ATBUCARAMANGA-O-052-2025
Contratista: Consorcio Santander NRZC
Objeto: Contratar la “Elaboración de estudios y diseños, construcción y adecuación de edificaciones y espacios en la institución educativa técnico Dámaso Zapata del municipio de Bucaramanga, departamento de Santander”
Valor del proceso: $28,004,682,260.00 COP

INTERVENTORIA
Estado: En ejecución.
Link: https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atbucaramanga-i-058-2025

No de proceso de contratación: PAF-ATBUCARAMANGA-I-058-2025
Contratista: Consorcio GD – Joyco Dámaso
Objeto: CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO DÁMASO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”

Valor contratado: $ 2.076.633.895,00 COP










Por otra parte FINDETER ha adelantado los procesos de contratación de obra https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atbucaramanga-o-062-2025 e interventoría https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atbucaramanga-i-066-2025 para la Institución **Educativa Santander**

ESTADO DEL PROYECTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTANDER

CONSTRUCCION
Estado: En ejecución – prórroga de 45 días; terminación prevista el 19 de octubre de 2026.
Link: https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atbucaramanga-o-062-2025
No de proceso de contratación: PAF-ATBUCARAMANGA-O-062-2025

Contratista: Consorcio I.E. Bucaramanga
Objeto: CONTRATAR “EL MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTANDER DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.””
Valor contratado: $ 3.583.480.560,00 COP
Fecha de inicio: 4 de marzo de 2026
Plazo inicial: 6 meses, + 1 prorroga de 45 días.

INTERVENTORIA
Estado: En ejecución.
Linkhttps://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atbucaramanga-i-066-2025
No de proceso de contratación: PAF-ATBUCARAMANGA-I-066-2025
Contratista: Consorcio Santander 066
Objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) AL MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTANDER DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”

Valor del contrato: $ 296.399.680,00 COP
Fecha de inicio: 4 de marzo de 2026
Plazo inicial: 8 meses, + 1 prorroga de 45 días.

Estado a 30 de septiembre de 2026: Al contrato de obra se le otorgó una prórroga de cuarenta y cinco (45) días calendario, con la cual su terminación está prevista para el 19 de octubre de 2026. De acuerdo con los informes de la Interventoría, el avance físico de la obra fue de 46,03 % con corte al 22 de septiembre de 2026 y de 57,61 % en la semana 30 (28 de septiembre a 3 de octubre de 2026). Persiste el retraso frente al cronograma, incluso frente a la última reprogramación pactada por el contratista con posterioridad a la prórroga.

Debido al atraso en la ejecución, FINDETER adelantó un proceso de apremio contra el contratista de obra por un valor superior a cien millones de pesos ($100.000.000), el cual contó con el voto favorable del Comité Técnico.

En el Comité Técnico y de Seguimiento del 9 de septiembre de 2026, realizado en la Institución Educativa Santander, se informó que el contratista estaba adoptando medidas para fortalecer los frentes de trabajo mediante el incremento de cuadrillas y de personal operativo. Mediante oficio No. 2-S-SdIB-202609-00082632 del 15 de septiembre de 2026, la Secretaría de Infraestructura solicitó a FINDETER información sobre la implementación efectiva de dichas medidas y sobre el cumplimiento de los compromisos de reducción del impacto por ruido durante la jornada escolar.

Finalmente, FINDETER ha adelantado los procesos de contratación de obra https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10285266&isFromPublicArea=True&isModal=False e interventoría https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10285629&isFromPublicArea=True&isModal=False para la **IE Custodio García Rovira INEM.**

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



Auditorio



Cancha N.º1

Auditorio



Cancha N.º1



Impermeabilización Cubierta



Impermeabilización Cubierta



Cancha N.º2



Cancha N.º2



Cancha N.º3



Cancha N.º3

ESTADO DEL PROYECTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM

CONSTRUCCION
Estado: En ejecución
Link:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10285266&isFromPublicArea=True&isModal=False
No de proceso de contratación: PAF-ATBUCARAMANGA-O-027-2026
Contratista: Consorcio Mejoramiento Educativo

Objeto: CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CUSTODIO GARCIA ROVIRA INEM, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Valor del proceso: $ 17.833.480.231,00COP
Plazo: 10 meses
Fecha de suscripción: 2 de septiembre de 2026
Fecha de inicio: 23 de septiembre de 2026.

INTERVENTORIA
Estado: En ejecución
Link:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10285629&isFromPublicArea=True&isModal=False
No de proceso de contratación: PAF-ATBUCARAMANGA-I-039-2026
Contratista: CONSULTEC S.A.S.

Objeto: INTERVENTORIA MEJORAMIENTO INSTITUCIÓN EDUCATIVA CUSTODIO GARCIA ROVIRA INEM - BUCARAMANGA

Valor del proceso: $ 1.052.514.540,00 COP
Plazo: 12 meses
Fecha de inicio: 23 de septiembre de 2026.

Estado a 30 de septiembre de 2026: El proceso de contratación del proyecto del Colegio INEM culminó con la adjudicación de los contratos de obra e interventoría. El contrato de obra fue suscrito el 2 de septiembre de 2026 con el Consorcio Mejoramiento Educativo y el contrato de interventoría el 3 de septiembre de 2026 con CONSULTEC S.A.S.

A la fecha de corte se encuentra el contratista con los días otorgados para hacer la apropiación de diseños y observaciones que haya lugar a los documentos contractuales.

5. Estado actual del convenio

Con corte al 30 de septiembre de 2026, el convenio cuenta con seis (6) contratos derivados (obra e interventoría para cada una de las tres instituciones educativas), por un valor contratado de $52.332.558.906,00, equivalente al 61,30 % del valor total del convenio ($85.373.383.221). El plazo del convenio se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2027. El valor del avance en porcentaje descrito anteriormente del 17,33% equivale al avance conforme esta estipulada la forma de pago del convenio.

- **I.E. Técnico Dámaso Zapata:** estudios y diseños terminados; licencia de construcción en trámite ante la Curaduría Urbana No. 2, con observaciones por subsanar por parte del contratista.
- **I.E. Santander:** obra en ejecución, con prórroga de 45 días y terminación prevista el 19 de octubre de 2026; avance de 57,61 % (semana 30) con atraso frente al cronograma y proceso de apremio en curso.

- **I.E. INEM Custodio García Rovira:** contratos de obra e interventoría suscritos los días 2 y 3 de septiembre de 2026; con actas de inicio del 23 de septiembre del 2023.

CONVENIO N° 285 DE 2024: Convenio Interadministrativo 285 del 27 de diciembre de 2024 OBJETO: AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES ADMINSITRATIVOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A E.S.P. PARA GESTIONAR ANTE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO LA PRESENTACION DEL PROYECTO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMEINTO BASICO “PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR RIO DE ORO PARA LA EXPEDICION DEL CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD”

Se efectuó la radicación formal del proyecto de construcción de la PTAR Río de Oro ante el Ministerio, posteriormente se atendieron de manera oportuna las subsanaciones requeridas, las cuales fueron remitidas por EMPAS conforme a las directrices impartidas por la entidad.

En la actualidad, el proyecto se encuentra en fase de gestión de los aspectos prediales y financieros, considerados críticos para su viabilidad. En el ámbito predial, se adelantan procesos de adquisición, saneamiento y formalización de la titularidad de los terrenos, en cumplimiento de la normativa civil, urbanística y de ordenamiento territorial.

En el componente financiero, se desarrollan las gestiones necesarias para garantizar la disponibilidad, asignación y trazabilidad de los recursos, conforme a los lineamientos presupuestales, fiscales y de contratación pública.

Descripción de la ejecución del convenio

CONVENIANTE / Nit. **CONVENIDO / Nit.**	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.22-0 EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP EMPAS S.A NIT: 900115931
VALOR INICIAL:	$ 0
ANTICIPO (%):	N/A
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR TOTAL:	N/A
PLAZO INICIAL:	6 MESES
PRORROGA No.1	CINCO (5) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS Fecha terminación hasta el 31 de diciembre de 2025
PRORROGA No.2	DOCE (12) MESES Fecha terminación hasta el 31 de diciembre de 2026
PLAZO TOTAL:	VEINTITRES (23) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS
INTERVENTORÍA:	N/A
FECHA DE INICIO:	07 ENERO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	N/A
FECHA DE REINICIO 1:	N/A
ESTADO DEL CONTRATO:	ACTIVO
FECHA TERMINACIÓN FINAL	31 DE DICIEMBRE DE 2026
PORCENTAJE AVANCE FÍSICO:	87 %
AVANCE FINANCIERO:	%

ESTADO DEL CONTRATO: ACTIVO
Las actividades del presente contrato consisten en la transferencia de información, o presentación del proyecto “PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR RIO DE ORO” al Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio para la revisión de los aspectos técnico, predial y financiero y demás que competen al proyecto, para la posterior expedición del concepto técnico de viabilidad.

OBSERVACIONES:

En cuanto al estado del convenio 285-2024, una vez enviadas las observaciones técnicas por parte del Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, EMPAS realizo las respectivas subsanaciones. A la fecha el aspecto técnico se encuentra totalmente revisado y subsanado.

Se recibe correo por parte del Ministerio de vivienda solicitando nuevamente adjuntar documentos del señor alcalde para la prórroga del convenio, las cuales fueron enviadas el día 24 de septiembre quedando subsanada la solicitud.

Se están realizando subsanaciones en cuanto al aspecto predial. Se adelantan procesos de aspecto predial con las respectivas entidades territoriales, en lo concerniente a predios baldíos y no baldíos, para posteriormente realizar las solicitudes de permisos de paso.

En el aspecto financiero se cuenta con el documento CONPES 4173 PTAR RIO DE ORO

La documentación esta entregada con plenitud en revisión al Viceministerio.

Se está proyectando el convenio para transferencia de fondos del gobierno Nacional al proyecto de obra. Es un convenio para seguimiento y control al uso de los recursos por parte de los beneficiarios del proyecto, que son los usuarios del Municipio de Bucaramanga, del Municipio de Girón y de EMPAS.

PROBLEMÁTICAS:

El tema predial no se consideraría problemática, si no que hace parte de las subsanaciones y requerimientos que el ministerio ha realizado al componente predial del proyecto.

Se realiza solicitud de prórroga para ampliar el plazo de entrega de subsanación para integrar lo pertinente al CONPES, (la aprobación da un plazo de 6 meses para entregar lo que está pendiente con el Ministerio en cuanto al componente predial). La agencia Nacional de tierras requiere más tiempo para subsanar el tema del marco de predios baldíos.

IMPACTO: POBLACIÓN BENEFICIADA

La PTAR Río de Oro beneficiará directamente a Bucaramanga y Girón, ya que está diseñada para tratar el 100 % de las aguas residuales urbanas de estos dos municipios, impactando a más de un millón de habitantes.



Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCE: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: A FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	2023680010005	$ 42.999.999.999,00	$ 42.999.999.999,00

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE OBRAS ADICIONALES EN LOS CAUSES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	202500000019488	$ 21.135.251.009,00	$ 21.135.251.009,00

CONTRATO DE OBRA 69 de 2023 -: CONSORCIO LA FLORA 2023 "CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCE: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: A FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA".

Valor inicial del contrato:	$ 40.514.056.133,00
Valor adicional No 1:	$ 20.168.495.053,00
Valor total:	$ 60.682.551.186,00
Plazo inicial:	Dieciocho (18) meses
Plazo adicional No 1:	Un (01) mes
Plazo adicional No 2:	Cinco (05) meses
Plazo adicional No 3:	Siete (07) meses
Plazo adicional No 4:	Veintiún (21) días
Plazo adicional No 5:	Cinco (05) meses
Plazo adicional No 6:	Dos (02) meses
Plazo total:	Treinta y ocho (38) meses y veintiún (21) días
Suspensión No 1:	04/12/2024
Reinicio No 1:	11/12/2024
Suspensión No 2:	23/12/2024
Ampliación a la Suspensión:	13/01/2026
Reinicio No 2:	13/03/2026
Suspensión No 3:	20/03/2026
Reinicio No 3:	27/03/2026
Fecha de inicio:	05 de mayo de 2023
Fecha de terminación:	04 de noviembre de 2024
Nueva fecha de terminación:	27 de octubre de 2026
Porcentaje avance:	95,66 %

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra actualmente en ejecución. Con avances significativos en varias de las actividades programadas. Dentro de las actividades principales se ha ejecutado lo siguiente:

- **Construcción Box Coulvert 3.50*3.50:** Se han ejecutado 810 metros lineales.
- **Construcción Box Coulvert 3.0*3.0:** Se han ejecutado 210 metros lineales.
- **Construcción box coulvert 2.0*2.0:** estructura de empalme 55.0 m
- **Instalación de Tubería para el colector de aguas servidas D:** 24": Se han ejecutado 993 metros lineales
- **Compactación de Rellenos:** Se han compactado 62,329.89 m³ de relleno
- **Construcción de Sumideros:** Se han construido 15 sumideros
- **Construcción pavimento en concreto MR41:** 1.200,00 metros lineales de vía en pavimento rígido y bahías de parqueo.
- **Suministro e instalación de tubería PEAD estructurada Ø1800mm:** Se han instalado 476.5 ml
- **Mejoramiento del espacio público:** En la cancha de fútbol se realizó relleno nivelado en arena de peña y cerramiento total. Por otra parte, se ha llevado a cabo empradización de zonas verdes e instalación de senderos peatonales.
- **Piso adoquín peatonal rectangular 20 x 20 x 6 cm en concreto color gris o amarillo sobre mortero 1:4 y malla gallinero**: Se han instalado 1,707.28 m2

- **Suministro e instalación de sardinel tipo A-10 prefabricado en concreto achaflanado de 0,20 x 0,50 x 0,80 m:** Incluye sello de juntas. Se han instalado 2,237.45 m2.
- **Instalación de máquinas de gimnasio en el sector Barrio San Pedro. Al corte del día de hoy 18 de sept 2026, se han instalado 10 unidades:** Rueda de tai chi - timones doble, máquina gimnasio al aire cintura, tipo MGJ.003, máquina gimnasio al aire extensión de piernas y sentadilla doble, tipo MGJ.004, máquina de gimnasio al aire libre pectorales doble en wpc, máquina de gimnasio al aire libre piernas sentadilla doble wpc, tipo MGJ.007, máquina de gimnasio al aire libre banca doble abdominales doble wpc, tipo MGJ.008, máquina de gimnasio al aire libre elíptica doble en wpc, tipo MGJ.009, máquina de gimnasio al aire libre swing balanceo y cintura doble wpc, tipo MGJ.010, máquina de gimnasio al aire libre bicicleta estática doble en wpc, tipo MGJ.011, máquina de gimnasio al aire libre timón/volantes de brazos wpc, tipo MGJ.012.
- **Instalación de juegos infantiles:** En el sector barrio san Pedro, se inició las instalaciones de los juegos infantiles.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Suministro e instalación de tubería PEAD estructurada Ø1800 mm



Construcción de estructura de empalme



Instalación de máquinas de gimnasio



Pavimentación Concreto MR41

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL BARRIO LA FERIA, ASENTAMIENTO CAMILO TORRES Y CUYANITA ETAPA 1. UBICADOS EN LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	2024680010080	$ 43.840.721.399,25	$ 43.840.721.399,25

CONTRATO DE OBRA 226 de 2024 – MANUEL GUILLERMO CAMACHO CARVAJAL "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL BARRIO LA FERIA, ASENTAMIENTO CAMILO TORRES Y CUYANITA ETAPA 1. UBICADOS EN LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER".

Valor del contrato:	$ 27.395.301.404,00
Valor adicional No 1:	$ 13.682.605.825,00
Valor total:	$ 41.077.907.229,00
Plazo inicial:	Quince (15) meses
Plazo adicional No 1:	Siete (07) meses
Plazo total:	Veintidós (22) meses
Fecha de inicio:	17 de diciembre de 2024
Fecha de terminación:	16 de marzo de 2026
Nueva fecha de terminación:	16 de octubre de 2026
Porcentaje avance:	95.15%


ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en ejecución. Con avances significativos en varias de las actividades programadas. A continuación, se presenta el detalle de las actividades principales ejecutadas a la fecha:

- **Actividades preliminares:** Ejecutadas al 100%
- **Movimientos de Tierra:** Actividades ejecutadas al 100%
- **Suministro y Colocación de Concreto Lanzado:** Actividad ejecutada al 92,22%
- **Inyección de lechada para anclajes:** Actividad ejecutada al 100%
- **Micropilotes fundidos en sitio Diámetro de 25 cm:** Actividad ejecutada al 96%
- **Suministro y colocación de concretos F'c 4000 PSI con mezcla húmeda para zapatas:** Actividad ejecutada al 81,25%
- **Suministro y colocación Acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2:** Actividad ejecutada al 99%
- **Suministro y colocación de anclajes 3 cables D =5/8":** Actividad ejecutada al 100%
- **Suministro y colocación malla electrosoldada calibre 10:** Actividad ejecutada al 94,58%
- **Suministro e instalación platinas metálicas en lamina HR E=3/4" 200x200mm:** Actividad ejecutada al 74,51%
- **Suministro e instalación de Cuñas y Poparás:** Actividad ejecutada al 69,28%
- **Perforación y construcción de drenes de penetración con tubería P.V.C y Encamisado en perforaciones horizontales para anclajes y drenes de penetración horizontal:** Actividades ejecutadas al 100%
- **Perforaciones horizontales:** Actividades ejecutadas al 100%
- **Suministro e instalación de tubería alcantarillado NOVAFORT 16":** Actividad ejecutadas al 100%
- **Pozos de inspección de alcantarillado:** Actividades ejecutadas al 90%

REGISTRO FOTOGRAFICO



Construcción de Muro de contención que permitirá conformar vía en la parte superior.

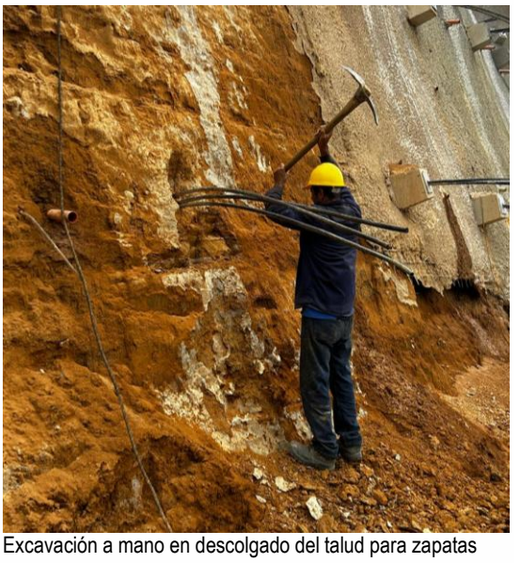

Excavación a mano en descolgado del talud para zapatas



Construcción de micropilotes para cimentación de muro de contención.



Encamisado para micropilotes

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN EL SECTOR CLUB GALLINERAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER	202500000004329	$ 1.789.079.800	$ 1.789.079.800

CONTRATO DE OBRA 99 de 2025 – CORPORACIÓN INGESEM IDEAS QUE CONTRUYEN FUTURO "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN EL SECTOR CLUB GALLINERAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER".

Valor del contrato: $ 1.513.937.250,00
Plazo inicial: Cuatro (04) meses
Plazo adicional No 1: Diecisiete (17) días
Fecha de inicio: 28 de julio de 2025
Fecha de terminación: 27 de noviembre de 2025
Nueva fecha de terminación: 14 de diciembre de 2025
Porcentaje avance: 100%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra liquidado

REGISTRO FOTOGRAFICO



Imagen: Construcción de muro en gavión

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN EL BARRIO CRISTAL BAJO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	202500000007089	$ 5.774.128.850	$ 5.774.128.850

CONTRATO DE OBRA 98 de 2025 – CONSORCIO GAVIONES LEWIS ROJAS **“**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN EL BARRIO CRISTAL BAJO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”.

Valor del contrato:	$ 5.277.464.143,00
Valor adicional No 1:	$ 2.615.045.981,00
Valor total:	$ 7.892.510.124,00
Plazo inicial:	Siete (07) meses
Pazo adicional No 1:	Quince (15) días
Pazo adicional No 2:	Tres (03) meses
Plazo total:	Diez (10) meses y quince (15) días
Fecha de inicio:	28 de julio de 2025
Fecha de terminación:	27 de febrero de 2026
Nueva fecha de terminación:	26 de julio del 2026
Suspensión No 1:	11 de marzo del 2026
Reinicio No 1:	24 de abril del 2026
Porcentaje avance:	100 %

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra terminado, en revisión documentación para recibo final y trámite de liquidación.

REGISTRO FOTOGRAFICO




Construcción de muro en gavión

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN EL SECTOR DE JOSÉ ANTONIO GALÁN, CARLOS PIZARRO Y 5 DE ENERO ETAPA 1, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	202500000004438	$ 9.435.889.561,60	$ 9.435.889.561,60

CONTRATO DE OBRA 97 de 2025 – CONSORCIO ONIX "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN EL SECTOR DE JOSÉ ANTONIO GALÁN, CARLOS PIZARRO Y 5 DE ENERO ETAPA 1, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER".

Valor del contrato:	$ 8.885.552.392,00
Plazo inicial:	Seis (06) meses
Plazo adicional No 1:	Un (01) mes
Plazo adicional No 2:	Un (01) mes
Plazo adicional No 3:	Tres (03) mes
Plazo Total:	Once (11) meses
Fecha de inicio:	28 de julio de 2025
Fecha de terminación:	27 de enero de 2026
Nueva fecha de terminación:	25 de julio de 2026
Suspensión No 1:	26/03/2026
Reinicio No 1:	24/04/2026
Porcentaje avance:	61,12%


ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en ejecución. A continuación, se presenta el detalle de las actividades principales ejecutadas a la fecha en el margen derecho del rio de oro:

- Campamento y Valla Tipo 1A.
- Excavaciones
- Rellenos
- Conformación de estructura de Jarillón
- Recubrimiento de Gaviones
- Aceros
- Concreto Ciclópeo 3500 PSI
- Gaviones de Alambre Galvanizados de malla Hexagonal Triple Torsión

Dentro de la ejecución, en el margen derecho del rio de oro se ejecutó avance de obra, pero en el margen derecho de la quebrada Chimita se identificó la presencia de infraestructura de transporte de gas perteneciente a las empresas CENIT y PROMIORIENTE, lo que ha

generado restricciones técnicas para la construcción de las obras. En las mesas de trabajo realizadas, dichas empresas establecieron distancias mínimas de seguridad entre la tubería y las estructuras proyectadas. En consecuencia, actualmente se adelanta el rediseño de las obras en este sector para garantizar el cumplimiento de los requisitos de seguridad y la viabilidad técnica de la intervención.

REGISTRO FOTOGRAFICO

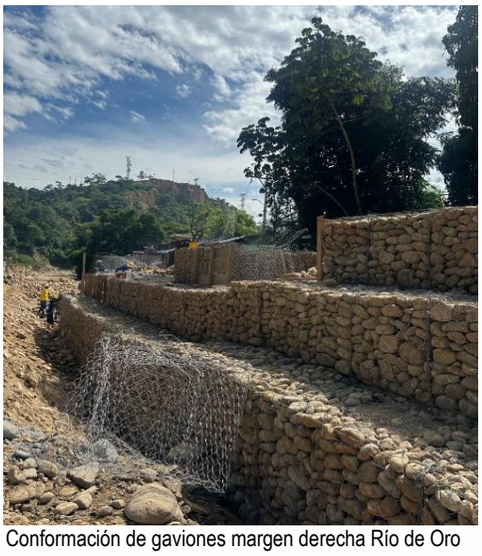

Conformación de gaviones margen derecha Río de Oro



Vista General de gavión construido

RESTAURACIÓN DEL COLISEO PERALTA INMUEBLE DECLARADO BIEN DE INTERESES CULTURAL DE ÁMBITO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.

Con el propósito de adelantar la recuperación integral del Coliseo Peralta, fue necesario gestionar la elaboración de los estudios técnicos y del proyecto de intervención, los cuales constituyen la base para la ejecución de las futuras obras de restauración del Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional (BICN).

En la vigencia 2023, el Ministerio de Cultura asignó, mediante su Plan de Acción, recursos por valor de quinientos millones de pesos ($500.000.000) para iniciar el proceso de recuperación del inmueble. Como contrapartida, el Municipio de Bucaramanga, a través de la Alcaldía, aportó trescientos millones de pesos ($300.000.000) destinados a cofinanciar la elaboración de los estudios técnicos y la interventoría correspondiente.

Como resultado de la ejecución de la consultoría, el contratista hizo entrega de la totalidad de los productos contractuales. Posteriormente, adelantó los trámites requeridos para la obtención de la licencia de construcción ante la Curaduría Urbana No. 1 y la aprobación de las disponibilidades de servicios públicos por parte de las empresas prestadoras.

Debido a que la culminación de los contratos derivados del Convenio No. 3985 de 2023 dependía de la obtención de la licencia de construcción, fue necesario prorrogar la Suspensión No. 4, suscrita el 17 de diciembre de 2025, hasta el 1 de agosto de 2026, mientras se obtenía la decisión definitiva sobre el trámite de licenciamiento. La obtención de este acto administrativo constituyó un hito fundamental para el cierre y liquidación de los contratos derivados del convenio.

Una vez atendidas las observaciones formuladas por el Ministerio de Cultura y presentada la documentación técnica y legal correspondiente, dicha entidad expidió la Resolución No. 1565 de 2025, mediante la cual aprobó la intervención del Coliseo Peralta. Posteriormente, Curaduría Urbana No. 1 aprobó la licencia de construcción correspondiente. Los contratos derivados ya se encuentran terminados y recibidos a satisfacción por parte de la interventoría de los productos y a la espera de los trámites administrativos para el acta final y de liquidación y pago.

A continuación, se presenta la información general del Convenio No. 3985 de 2023 y de los contratos derivados del mismo:

Convenio Interadministrativo No. 3985-2023	
Objeto	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la recuperación del Coliseo Peralta – Bien de Interés Cultural de ámbito Nacional – Decreto 292 del 24 de febrero de 1975, en el municipio de Bucaramanga, Santander
Fecha de suscripción	28 de junio de 2023
Valor total	$ 800.000.000
Aportes	
Ministerio de Cultura	$500.000.000
Total aporte Ministerio	$500.000.000
Municipio de Bucaramanga	$300.000.000
Total aporte Departamento	$300.000.000
Plazo de ejecución	
Fecha de inicio	19 de julio de 2023
Término de ejecución	Hasta el 31 de marzo del 2026
Supervisión	
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes	Arquitecta Lina María Rosales Suárez. Supervisora convenio.
Municipio de Bucaramanga Secretaría de Infraestructura	Edgar Yamitd Pinto Hernández. Supervisor convenio.
Contratos derivados del convenio:	

No. DE CONTRATO Y FECHA	**253 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023**	
OBJETO	ESTUDIO Y DISEÑO PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL COLISEO PERALTA INMUEBLE DECLARADO BIEN DE INTERESES CULTURAL DE ÁMBITO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	
CONTRATISTA	NOMBRE	ING INGENIERIA S.A.S
	C.C/ NIT	890405995
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA
	C.C	73.106127
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	**CARLOS JAVIER MENDEZ SUÁREZ**
	CARGO	SECRETARIO DE
	C.C	13.746.642
INTERVENTORIA CONTRATO 252 DE 2023	NOMBRE	CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCIONES SAS
	C.C/ NIT	900.160.387-5
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	CARLOS GABRIEL CAMACHO OBREGÓN
	C.C	46.644.261
SUPERVISOR	NOMBRE	CARLOS JAVIER MENDEZ SUAREZ

Modificaciones a contratos:

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final
Suspensión	01	25 DIAS	29-12-2023	23-01-2024
Ampliación 1 a la suspensión No 1	01	25 DIAS	24-01-2024	17-02-2024
Ampliación 2 a la suspensión No 1	02	25 DÍAS	18-02-2024	11-03-2024
Prórroga 1 al Contrato	01	60 DIAS	01-04-2024	02-06-2024
Suspensión	02	90 DIAS	29-05-2024	28-08/2024
Ampliación 1 a la suspensión No 2	01	90 DIAS	28-08-2024	28-11-2024
Ampliación 2 a la suspensión No 2	02	30 DIAS	28-11-2024	28-12-2024
Ampliación 3 a la suspensión No 2	03	60 DIAS	28-12-2024	28-02-2025
Ampliación 4 a la suspensión No.2	04	60 DÍAS	28-02-2025	28-04-2025
Ampliación 5 a la suspensión No.2	05	60 DÍAS	28-05-2025	28-06-2025
Ampliación 6 a la suspensión No.2	06	60 DÍAS	28-06-2025	28-08-2025
Ampliación 7 a la suspensión No.2	07	30 DÍAS	28-08-2025	28-09-2025
Ampliación 8 a la suspensión No.2	08	15 DÍAS	28-09-2025	13-10-2025
Prórroga 2 al Contrato	01	30 DIAS	14-10-2025	14-11-2025
Suspensión No 3	03	26 DIAS	05-11-2025	01-12/2025
Ampliación 1 a la suspensión No.3	07	26 DIAS	01-12-2025	09-12-2025
Reinicio Suspensión No.3	01	8 DIAS	10-12-2025	18-12-2025
Suspensión 4	04	45 DIAS	17-12-2025	02-01-2026
Ampliación 1 a la suspensión No.4	01	60 DIAS	02-02-2025	02-04-2026
Ampliación 2 a la suspensión No.4	02	60 DIAS	02-04-2026	02-06-2026
Ampliación 3 a la suspensión No.4	03	30 DIAS	02-06-2026	02-07-2026
Ampliación 4 a la suspensión No.4	04	30 DIAS	02-07-2026	02-08-2026
Ampliación 5 a la suspensión No.4	05	60 DIAS	02-08-2026	02-10-2026
Reinicio del Contrato 4	4	n/a	02-10-2026	03-10-2026
Terminación del contrato	1	n/a		03-10-2026

No2	PRODUCTO	RESPUESTA	FECHA.	ESTADO
1	**ESTUDIOS PRELIMINARES**	INT-PERALTA-097-2024	11/03/2024	APROBADO
2	**LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y TOPOGRÁFICO**			
2.1	ENTREGA DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	INT-PERALTA-085-2024	7/02/2024	APROBADO
2.2	LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO	INT-PERALTA-097-2024	11/03/2024	APROBADO
3	**ESTUDIO PATOLÓGICO Y DIAGNOSTICO DEL INMUEBLE**			
	Estudio patológico y diagnóstico del inmueble (Planos y fichas de calificación con fotografías y descripción de los deterioros de acuerdo al sistema constructivo) Incluir información de exploraciones constructivas y de cimentación según se requiera	INT-PERALTA-097-2024	11/03/2024	APROBADO
4	**ESTUDIOS TÉCNICOS**			

4.1	ESTUDIOS TÉCNICOS Y DIAGNÓSTICO DE HUMEDADES	INT-PERALTA-169-2024	5/06/2024	APROBADO
4.2	ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS DE SANIDAD DE MADERAS	INT-PERALTA-189-2024	6/08/2024	APROBADO
4.3	ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS DE REDES ELÉCTRICAS	INT-PERALTA-136-2024	25/04/2024	APROBADO
4.4	ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS DE REDES HIDROSANIATRIAS	INT-PERALTA-092-2024	29/02/2024	APROBADO
4.5	ESTUDIOS HVAC	INT-PERALTA-202-2024	27/09/2024	APROBADO
4.6	ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS GEOTÉCNICOS	INT-PERALTA-242-2024	22/10/2025	APROBADO
4.7	ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA Y EVALUACIÓN ESTRUCTURAL	INT-PERALTA-207-2024	22/10/2024	APROBADO
4.8	CALAS ESTRATIGRÁFICAS	INT-PERALTA-191-2024	20/08/2024	APROBADO
4.9	ARQUEOLOGÍA (PLAN PREVENTIVO DE INVERSIÓN)	INT-PERALTA-119-2024	12/04/2024	APROBADO
5	**PROYECTO DE INTERVENCIÓN**			
		FASE I		
5.1.1	PROYECTO ARQUITECTÓNICO	INT-PERALTA-213-2024	7/11/2024	APROBADO CON OBS
5.1.2	PROYECTO ESTRUCTURAL	INT-PERALTA-216-2024	20/11/2024	APROBADO
5.1.3	PROYECTO ELÉCTRICO, VOZ, DATOS Y SONIDO	INT-PERALTA-212-2024	7/11/2024	APROBADO
5.1.4	PROYECTO INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DRENAJES Y RCI	INT-PERALTA-208-2024	22/10/2024	APROBADO
5.1.5	PROYECTO DE SEGURIDAD (ALARMAS, CAMARAS, EVACUACIÓN)	INT-PERALTA-212-2024	7/11/2024	APROBADO
		FASE II		
5.2.1	PROYECTO ARQUITECTÓNICO	INT-PERALTA-213-2024	7/11/2024	APROBADO
5.2.2	PROYECTO ESTRUCTURAL	INT-PERALTA-216-2024	20/11/2024	APROBADO
5.2.3	PROYECTO ELÉCTRICO, VOZ, DATOS Y SONIDO	INT-PERALTA-212-2024	7/11/2024	APROBADO
5.2.4	PROYECTO INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DRENAJES Y RCI	INT-PERALTA-208-2024	22/10/2024	APROBADO
5.2.5	PROYECTO DE SEGURIDAD (ALARMAS, CAMARAS, EVACUACIÓN)	INT-PERALTA-212-2024	7/11/2024	APROBADO
5.2.6	PROYECTO DE SEGURIDAD HUMANA	INT-PERALTA-240-2025	1/02/2025	APROBADO
5.2.7	COORDINACIÓN BIM	INT-PERALTA-300-2025	04/11/2025	APROBADO
6	**PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA**			
6.1	PRESUPUESTO, PROGRAMACIÓN, APUS, CANTIDADES, ESPECIFICACIONES	INT-PERALTA-299-2025	04/11/2025	APROBADO

6.2	RADICACIÓN DEL PROYECTO AL MINISTERIO DE CULTURA	CORREO ELECTRÓNICO	9/10/2025	APROBADO
	ACCESIBILIDAD			APROBADO


REGISTRO FOTOGRAFICO



Estado Fachada Actual



Estado Interior de la edificación.

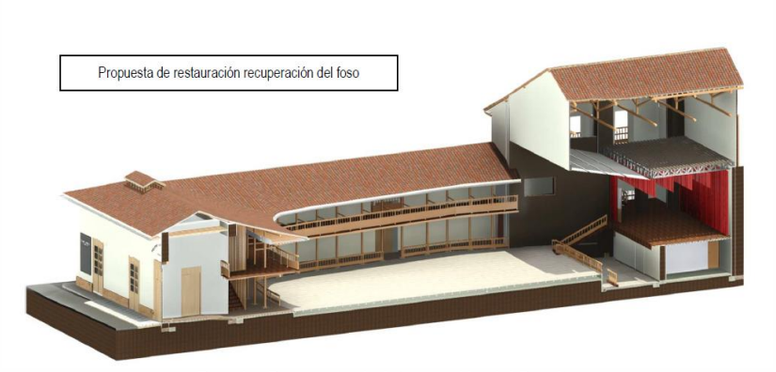

Remder Propuesta de Intervención del Peralta

CONVENIO No. 109/2022 ENTRE FINDETER Y EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2022

Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto denominado: "CONSTRUCCIÓN CANCHAS DE SQUASH EN EL BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER", en los términos señalados en este Convenio y en el marco del Contrato Interadministrativo No. COI-1364 DE 2021 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO.

CONTRATISTA:	CONSORCIO CIUDAD BONITA. NIT: 901684711-1
VALOR INICIAL:	$ 3.919´923.373
ANTICIPO (%):	$
VALOR ADICIONAL 1:	$ 120´159.995
VALOR ADICIONAL 2;	$ 22´162.366
VALOR TOTAL:	$ 4.062´245.734
PLAZO INICIAL:	Siete (07) Meses y 15 días
PRORROGA No.1	Un mes
PRORROGA No. 2	Un mes
PRORROGA No. 3	15 días
PLAZO TOTAL:	Tres (03) Meses
INTERVENTORÍA:	N/A
FECHA DE INICIO:	31 de marzo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	29/12/2023 por 20 días
FECHA DE SUSPENSION 2	9/04/2024 por Un mes
FECHA DE REINICIO 2:	25/5/2024

ESTADO DEL CONTRATO: Activo
FECHA TERMINACIÓN FINAL 14 de junio 2024 con pendientes
PORCENTAJE AVANCE FÍSICO: 95 %
AVANCE FINANCIERO: 100%

ESTADO DEL CONTRATO: liquidado por Findeter, sin recibir por la alcaldía e Bucaramanga.

ANTECEDENTES:

- El CONVENIO No. 109/2022 entre FINDETER Y EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA de fecha 11 DE AGOSTO DE 2022 CANCHAS DE SQUASH presenta retrasos y dificultades principalmente asociadas a la conexión eléctrica, lo que ha impedido la entrega y puesta en funcionamiento total del proyecto; en la actualidad el convenio está vigente.

- Desde el 2024 el año 2024 la Alcaldía de Bucaramanga ha adelantado comunicaciones formales y reuniones con IDERBU, la secretaria de infraestructura, el DADEP y la administración del centro Comercial Acrópolis, con el propósito de coordinar la entrega y solucionar los pendientes relacionados con la conexión eléctrica.

- En octubre de 2024 se sostuvo una reunión con FINDETER, IDERBU, DADEP y la Secretaria de Infraestructura en la cual se dejó constancia de la necesidad de revisar las cargas eléctricas y las condiciones técnicas de conexión. En los encuentros posteriores el centro comercial manifestó que para autorizar la conexión de las canchas era necesario instalar un transformador independiente, argumentando que la carga requerida superaba la capacidad inicialmente prevista; sin embargo desde la administración municipal se indicó que según la reglamentación de propiedad horizontal, dicha exigencia no estaba contemplada en el manual original del proyecto y que antes de asumir costos adicionales debería definirse jurídicamente la titularidad y responsabilidad.

- Durante el año 2025 continuaron las gestiones administrativas. La secretaria de Infraestructura realizo visitas técnicas y mesas de trabajo, incluyendo una reunión en julio de 2025 con presencia de la Procuraduría Provisional, buscando una solución concertada. No obstante, no se logró un acuerdo definitivo. También se acudió a la superintendencia de Industria y comercio para mediar en el conflicto, sin que se obtuviera una solución satisfactoria. Ante la persistencia del problema la alcaldía interpuso una acción de tutela con el fin de proteger los derechos que consideraba vulnerados; sin embargo, el Juzgado 12 Penal del Circuito de Bucaramanga declaro la improcedencia de la acción.

Posteriormente se remitieron oficios formales a FINDETER requiriendo la atención inmediata de los pendientes técnicos y contractuales, con el objeto de evitar la configuración de un incumplimiento del convenio. En estos requerimientos de advirtió la necesidad de definir claramente las obligaciones de cada parte y de garantizar la operatividad del escenario deportivo conforme al objeto contractual.

- A febrero 2026, la situación se encuentra en fase de análisis jurídico. Se solicitó concepto a la Oficina Jurídica del Municipio de Bucaramanga, para determinar si las circunstancias presentadas configuran un incumplimiento contractual.

Cabe resaltar que el Convenio se dio por el Contrato de Obra que se relaciona a continuación: A través de contrato de obra N° 3-1-102452-COI-1364-84 (PAF-ATMINDEPORTE O-117-2022) celebrado entre BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. Sociedad Fiduciaria, quien actúa como vocera y administradora del patrimonio Autónomo Matriz de Asistencia Técnica FINDETER y Consorcio Ciudad Bonita.

Según oficio de FINDETER con radicado 2202652001389 del 16 de febrero de 2026 nos informaron que ellos recibieron a satisfacción el 11 de diciembre del 2025
.
A la fecha se ha pagado la suma de $3.689.352.405,32 mediante 10 actas parciales, lo que significa un avance financiero del 90.82% del valor total del contrato: a la fecha está pendiente el pago de $372.893.328,68. De todos los pagos realizados se hizo una rete garantía del 10%

correspondiente a $368.935.240,53 que no ha sido devuelta al contratista.

Marzo 2026
De acuerdo a las indicaciones de secretaria jurídica es necesario documentar e impugnar alguna acta de asamblea, es por eso que la alcaldía como dueña de algunos locales del centro comercial acrópolis citó a la asamblea para poder confirmar la negativa a la conexión de las canchas. Posterior a eso se iniciará el proceso jurídico.

Mayo 2026
El 8 de mayo de 2026 el Dr. Pedro José Quitián Pradilla presentó demanda verbal de impugnación de decisiones de asamblea general de copropietarios contra la persona jurídica SUPERCENTRO COMERCIAL ACRÓPOLIS PROPIEDAD HORIZONTAL con el objeto de "Declarar la nulidad parcial del Acta No. 38 de la Asamblea General Ordinaria de copropietarios del SUPERCENTRO COMERCIAL ACRÓPOLIS frente a la decisión adoptada en el punto 17 "VARIOS", celebrada el 19 de marzo de 2026, por la cual no se aprobó (con votación del 76,71%) la proposición relativa a la conexión eléctrica de las canchas de squash ubicada en los locales comerciales 3-11 y 3-12 del centro comercial, de propiedad del ente territorial, por ser contraria a la Ley 675 de 2001, al Reglamento de Propiedad Horizontal, a la Constitución Política y por constituir abuso del derecho de voto".

Dicha demanda le correspondió al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga con radicación: 68001310300620260014500.

El 11 de junio el juzgado expide un auto que inadmite demanda

El 19 de junio se subsano por parte del apoderado, la doc. Laura Hoyos. Estamos a la espera de la decisión del juez del juzgado sexto civil del circuito

Mediante comunicación de fecha 20260330027976 22 de mayo de 2026 la ESSA da respuesta a la petición elevada por el apoderado de la Secretaría Jurídica relacionada con la certificación sobre capacidad y cargabilidad de la subestación y transformador del SUPERCENTRO COMERCIAL ACROPOLIS, así como la viabilidad técnica de la conexión eléctrica asociada a la Factibilidad No. 67268351, donde informan lo siguiente:

• Responsabilidad de la Subestación: ESSA aclara que la cargabilidad operativa interna es responsabilidad del dueño de la subestación (el Centro Comercial).

Estado de la Factibilidad: La factibilidad del servicio (No. 67268351) para una carga de 45 kVA en Nivel 2 está aprobada y tiene vigencia hasta el 9 de octubre de 2026. Esta factibilidad es una viabilidad técnica preliminar y no garantiza la energización inmediata.

• Trámite de Conexión Compleja: Debido a que la carga supera los 30 kVA en zona urbana, el proyecto se clasifica como una "Conexión Compleja". A la fecha, el proceso solo ha cumplido el primer paso (Factibilidad), por lo que el municipio de Bucaramanga debe completar los siguientes trámites en orden:

1. Presentación de planos o diseño eléctrico.
2. Solicitud de visita técnica.
3. Solicitud de diagnóstico.
4. Solicitud de recibo técnico y conexión definitiva.

OBSERVACION TÉCNICO Y JURÍDICA QUE INDICA ALERTA Y QUE SE DEBE TENER EN CUENTA:


En este mes de septiembre se solcito a jurídica mediante oficio 2-S-SdIB-202609-00081899 la radicación de una demanda contra Findeter por el incumplimiento del convenio 109-2022, por los siguientes pendientes:

Es importante precisar que, si bien la falta de conexión eléctrica constituye uno de los principales inconvenientes del proyecto, **este no es el único incumplimiento o aspecto pendiente por parte de Findeter y de los responsables de la ejecución del proyecto**.

Entre las situaciones identificadas se encuentran las siguientes:

1. **Filtraciones y deterioro de la infraestructura:** Se evidencian problemas de filtraciones al interior de las canchas, algunos de ellos de antigua ocurrencia, incluyendo afectaciones en sectores como el cuarto eléctrico. Asimismo, las condiciones generales del inmueble reflejan un evidente estado de abandono y deterioro, generando una percepción de riesgo e incluso condiciones que podrían ser asociadas con una posible amenaza de ruina.
2. **Falta de conexión eléctrica:** A la fecha, persiste la situación relacionada con la conexión y suministro definitivo del servicio de energía eléctrica, aspecto fundamental para la adecuada puesta en funcionamiento del proyecto.
3. **Otros pendientes técnicos y constructivos:** Adicionalmente, se encuentran pendientes, entre otros, los siguientes aspectos:

- Realización de las pruebas de presión correspondientes al suministro de agua.
- Limpieza de los sifones mediante sonda, una vez culminen las obras.
- Visita y revisión por parte del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bucaramanga respecto de la red contra incendios.
- Reparación del cielo raso del segundo piso.
- Reparación de las goteras y filtraciones provenientes de las cubiertas de los pasillos internos.
- Limpieza general y mantenimiento de las canchas.
- Cambio del medidor de agua.
- Entrega de las certificaciones RETIE y RETILAP correspondientes.
- Entrega de los soportes que acrediten la ejecución del ítem 23.1.03, denominado “Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de salida de luminaria, tomacorriente o interruptor, incluye retiro de tubería de alimentación de la salida”, toda vez que durante las visitas realizadas no fue posible evidenciar la ejecución de dichas actividades.
- Entrega de los planos *as built* o planos finales de obra.
- Entrega de los manuales de operación y mantenimiento correspondientes, incluyendo, de ser necesario, material audiovisual para facilitar la adecuada operación de las instalaciones. En dichos manuales deberá especificarse, entre otros aspectos, el tratamiento y mantenimiento requerido para la madera de las canchas y los demás elementos que conforman el proyecto.
- Retiro de la propaganda instalada en las canchas públicas.
- Entrega al Municipio de Bucaramanga de las garantías correspondientes relacionadas con el material maderable de las canchas y los demás elementos instalados en el proyecto.

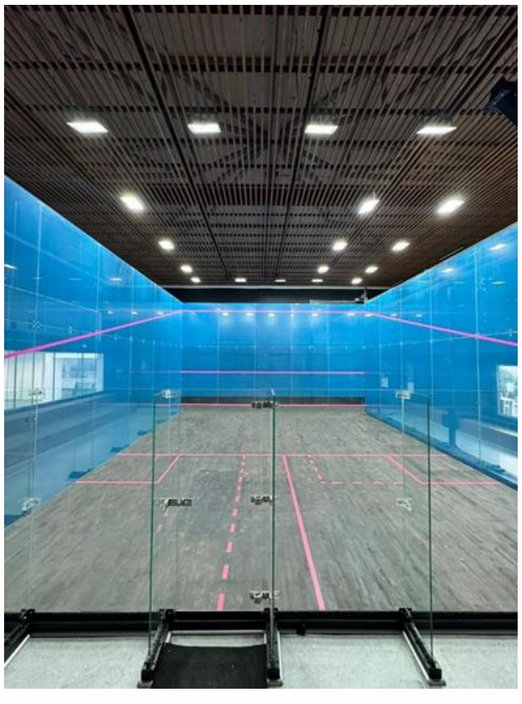



CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 239 DE 2025: “CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA UIMIST DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA (E.S.E. ISABU)”
La debilidad en la infraestructura de la red de centros de salud y unidades hospitalarias de la E.S.E. ISABU constituye un problema profundo que compromete gravemente la calidad y disponibilidad de los servicios de salud para la población de Bucaramanga. Esta situación crítica es especialmente preocupante dado que muchas instalaciones hospitalarias carecen del espacio físico y la capacidad adecuada para responder a la creciente demanda de pacientes.

La UIMIST presentaba una serie de emergencias ocasionadas por el deterioro físico de su infraestructura, toda vez que con las fuertes tormentas que se presentaron en el municipio las cubiertas y áreas de servicio se vieron afectadas provocando inundaciones, caídas de techos y daño de equipos. Para lo cual la Secretaría de Infraestructura del municipio realizó visita de inspección se realizó recorrido y se realizó un diagnóstico y recomendaciones de intervención inmediata por el deterioro acelerado de la infraestructura y dado que la Unidad Intermedia Materno Infantil Santa Teresita – UIMIST es la única institución pública de primer nivel que presta los servicios especializados en ginecobstetricia y pediatría en el municipio, el ISABU se vio en la necesidad inminente de implementar planes de acción estratégicos enfocados en la infraestructura de la UIMIST.

CONVENIDO:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA (E.S.E. ISABU) NIT: 800084206
VALOR INICIAL:	$ 515.820.106
ANTICIPO (%):	$ 0
VALOR ADICIONAL:	$ 0
VALOR TOTAL:	$ 515.820.106
FECHA DE INICIO:	10 DE OCTUBRE DE 2025
PLAZO INICIAL:	2 MESES 20 DIAS
PRORROGA No. 1	29 DE DICIEMBRE DE 2025 (2 MESES Y 2 DIAS)
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	27 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE REINICIO:	22 DE JULIO DE 2026
FECHA DE PRORROGA No. 2 y MODIFICACION No. 1	22 DE JULIO DE 2026 (60 DIAS)
ESTADO DEL CONTRATO:	EN EJECUCION
PRORROGA No. 3	22 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (15 DIAS)
FECHA TERMINACIÓN FINAL:	7 DE OCTUBRE DE 2026
PORCENTAJE AVANCE FÍSICO:	64,35%
AVANCE FINANCIERO:	100%

ESTADO DEL CONVENIO: EN EJECUCION, el avance físico del contrato de obra derivado del presente convenio a la fecha es aproximadamente 64,35 %.

OBSERVACIÓN TÉCNICO Y JURÍDICA QUE INDICA ALERTA Y QUE SE DEBE TENER EN CUENTA:

La ESE ISABU celebró dos contratos con los recursos del presente convenio, uno es la consultoría y el otro es la interventoría de esta consultoría.

-No. 1563-2025, cuyo objeto es: "ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA UIMIST DE LA ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA, EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA", por un valor de cuatrocientos treinta y ocho millones novecientos cuarenta y cuatro mil cuarenta y cuatro pesos m/cte ($438.944.044).
-No. 1565-2025, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y FINANCIERA PARA LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA UIMIST DE LA E.S.E.

INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA.", por un valor de veinticuatro millones ochenta y nueve mil cuatrocientos ocho pesos m/cte ($24.089.408).

ESTADO FINANCIERO: Se tramitó un único desembolso el 29/12/2025 por valor de $515.820.106 (AVANCE: 100%)

Es importante aclarar que ni el contratista de obra ni de interventoría han realizado cobros al ISABU, por lo anterior, el estado financiero para los contratos derivados es 0% a la fecha.

PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Componente Técnico: Durante el período objeto del presente informe se dio continuidad a la ejecución de las actividades constructivas previstas en el convenio, alcanzando el avance físico indicado. En desarrollo de los contratos derivados se ejecutaron labores de demolición, retiro de elementos afectados, adecuación de áreas de intervención y actividades correspondientes a la atención de los primeros auxilios por inundación en la zona de hospitalaria y de parqueaderos en el año 2025 de la infraestructura de la Unidad Hospitalaria UIMIST.

Así mismo, durante la ejecución se identificaron condiciones no previstas inicialmente que hicieron necesaria la revisión técnica del proyecto, la elaboración del balance de obra mediante mayores y menores cantidades, la actualización del presupuesto y los respectivos ajustes documentales requeridos para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual.

Estas actuaciones permitieron definir el alcance definitivo de la intervención y establecer las condiciones para la continuación de la obra.

Se han intervenido parqueadero para mejorar la red de drenaje, cubierta de rayos x para evitar las filtraciones, endurecimiento y drenajes en zonas que comunican la zona de hospitalización con la zona verde; a la fecha se está realizando la intervención de cubierta.

Componente Social: A la fecha se han realizado socializaciones con la comunidad que labora y asiste a la atención de la UIMIST, se han mitigado molestias por ruido, polvo y señalización preventiva orientada a la comunidad en general.

Componente Ambiental y SST: A la fecha se han realizado las actividades en el plan de seguridad de trabajo del contratista

IMPACTO: La ejecución del presente convenio beneficia de manera directa a los usuarios de la Unidad Hospitalaria UIMIST de la E.S.E. Instituto de Salud de Bucaramanga (ISABU), así como a la población del área de influencia que demanda los servicios de salud prestados por esta institución.

La intervención permitirá recuperar la infraestructura afectada por la situación de calamidad presentada a causa de las fuertes lluvias, restableciendo progresivamente las condiciones adecuadas para la prestación de servicios esenciales como hospitalización, pediatría, rayos X y demás áreas asistenciales comprometidas. De esta manera, el proyecto contribuye al fortalecimiento de la capacidad instalada de la red pública de salud del municipio, mejorando las condiciones de atención, la seguridad de pacientes y personal asistencial, y garantizando espacios físicos adecuados para la prestación oportuna y continua de los servicios de salud en beneficio de la comunidad.

OBSERVACIONES:

- Teniendo en cuenta el remanente en el valor total del convenio de aproximadamente $52.781.894 informado por la ESE ISABU conforme a la revisión y aprobación de la interventoría, se actualizó documentalmente el proyecto en la secretaria de planeación a la entidad en el mes de Julio del 2026, en donde se incluyó la redistribución de los recursos en actividades no previstas en el valor remanente antes mencionado, tanto para obra como para interventoría y se realizó la modificación No. 1 y prorroga No. 2 entre las partes.

- En el mes de septiembre nuevamente la ESE ISABU, manifiesta una nueva solicitud de mayores cantidades de obra con el objeto de poder incluir toda la intervención de la cubierta de rayos X, teniendo en cuenta que la lluvia mostró la necesidad de intervenirla

completamente y solicitó un plazo adicional; se procede a actualizar documentalmente el proyecto en planeación municipal y se realizó la prórroga No. 3 entre las partes.

ANEXOS FOTOGRÁFICOS:



Fotografía No. 1. ***Endurecimiento zona parqueadero sótano***



Fotografía No. 2. *Retiro total cubierta área de pediatría*



Fotografía No. 3. *Intervenciones internas pintura Zona de rayos X.*



Fotografía No. 4. *Instalación de cubierta nueva e impermeabilización de canales*



Fotografía No. 5. *Zona de alistamiento de elementos para instalación cubierta de rayos X*

7. RELACION PROCESOS EN CONTRATACION

OBJETO	VALOR	MODALIDAD	ESTADO
INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	$ 350.296.874,00	CONCURSO DE MERITOS ABIERTO	ADJUDICADO
REALIZAR LA CATEGORIZACIÓN, INVENTARIO VIAL Y REPORTE DE INFORMACIÓN AL SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE INFORMACIÓN DE CARRETERAS "SINC" DE LA RED VIAL TERCIARIA A CARGO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	$ 441.332.145,50	CONCURSO DE MERITOS ABIERTO	EL PROCESO NO SE CONTRATARÁ EN LA PRESENTE VIGENCIA
INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA OBRA PUBLICA DE ADECUACIÓN DE ELEMENTOS CONSTITUTIVOS Y COMPLEMENTARIOS DEL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER	$ 1.576.608.504,00 $ 76.100.263,00	CONCURSO DE MERITOS ABIERTO	ADJUDICADO
ADECUACIÓN DE ELEMENTOS CONSTITUTIVOS Y COMPLEMENTARIOS DEL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER	$ 4.000.000.000,00 $ 5.923.599.737,00 $ 922.917.149,00	LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA	CONTRATO CELEBRADO
INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE REVERDECIMIENTO INTEGRAL, RECUPERACIÓN E INSTAURACIÓN DE COMPONENTES VERDES, MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA DE ESPACIO PÚBLICO, PARA MEJORAMIENTO DEL ENTORNO PÚBLICO Y LA SEGURIDAD EN SECTORES DE LAS COMUNAS 6 Y 12 EN EL SECTOR DE LA PUERTA DEL SOL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 540.280.520,50	CONCURSO DE MERITOS ABIERTO	ADJUDICADO

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE REVERDECIMIENTO INTEGRAL, RECUPERACIÓN E INSTAURACIÓN DE COMPONENTES VERDES, MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA DE ESPACIO PÚBLICO, PARA MEJORAMIENTO DEL ENTORNO PÚBLICO Y LA SEGURIDAD EN SECTORES DE LAS COMUNAS 6 Y 12 EN EL SECTOR DE LA PUERTA DEL SOL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 6.793.013.846,33 $ 1.764.016.769,00 $ 822.529.241,67	LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA	CONTRATO CELEBRADO
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE REVERDECIMIENTO INTEGRAL, RECUPERACIÓN E INSTAURACIÓN DE COMPONENTES VERDES, MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA DE ESPACIO PÚBLICO, PARA MEJORAMIENTO DEL ENTORNO PÚBLICO Y LA SEGURIDAD EN SECTORES DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL SECTOR DE PROVENZA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 5.985.173.418,00	LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA	PROCESO EN PÁGINA
INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE REVERDECIMIENTO INTEGRAL, RECUPERACIÓN E INSTAURACIÓN DE COMPONENTES VERDES, MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA DE ESPACIO PÚBLICO, PARA MEJORAMIENTO DEL ENTORNO PÚBLICO Y LA SEGURIDAD EN SECTORES DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL SECTOR DE PROVENZA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 385.914.657,50	LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA	PROCESO EN PÁGINA
MANTENIMIENTO Y MANEJO INTEGRAL ARBÓREO DE ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.	$ 820.125.569,00	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA	PROCESO EN PÁGINA
CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL VIJAGUAL CORREGIMIENTO NO.1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.	$ 1.338.504.567,00	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA	PROCESO EN PÁGINA
ALQUILER DE VEHICULOS TIPO CAMIONETA PARA EL TRANSPORTE EN ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLEN PARA LA SUPERVISION DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS POR EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 154.438.200,00	MÍNIMA CUANTÍA	EN ESTRUCTURACIÓN EVENTO DE COTIZACION

ANEXO

- PRESUPUESTOS EJECUTADOS (Ejecución presupuestal)
- GASTO (Relación personal)
- GASTOS (Relación de Inversión)

ALCALDIA DE BUCARAMANGA
NIT: 890.201.222-0
INFORME DE EJECUCION CONSOLIDADA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES					Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	% Ejecucion
		Presupuesto Inicial	Adicion	Credito	Contracredito	Presupuesto Definitivo			Obligaciones	Pagos Acumulados				
		$ 1,00				3 = 1 + 2	$ 5,00	$ 7,00		$ 9,00	10 = 3 - 5	11 = 5 - 7	12 = 7 - 9	13 = 7 / 3
TOTAL INFORME SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		$ 352.595.437.734,00	$ 757.978.267.076,44	$ 79.778.468.512,08	$ 134.778.525.451,08	$ 1.055.573.647.871,44	$ 257.602.803.260,12	$ 206.823.218.786,11	$ 97.347.455.341,04	$ 95.148.975.660,74	$ 797.970.844.611,32	$ 50.779.584.474,01	$ 109.475.763.445,07	19,59
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INVERSION													
	LINEA 1. TERRITORIO SEGURO QUE INTEGRA													
	DEPORTE Y RECREACION													
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS													
	ADQUISICION DE SERVICIOS													
	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION													
	LINEA 2. TERRITORIO SEGURO QUE PROGRESA													
	MINAS Y ENERGA													
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS													
	ADQUISICION DE SERVICIOS													
	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION													
RUBRO	GASODUCTOS LOCALES													
2.3.2.02.02.005.2024680010210.2.2101016.53251.201	GASODUCTOS LOCALES 201	$ 91.082.517,00	$ -	$ -	$ -	$ 91.082.517,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 91.082.517,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2024680010210.2.2101016.53251.221	GASODUCTOS LOCALES 221	$ 38.917.483,00	$ -	$ -	$ -	$ 38.917.483,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 38.917.483,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2024680010210.2.2101016.53251.327	GASODUCTOS LOCALES 327	$ 20.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 20.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.000.000,00	$ -	$ -	0
	TRANSPORTE													
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS													
	ADQUISICION DE SERVICIOS													
	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION													
RUBRO	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS													
2.3.2.02.02.005.202500000035927.2.2401039.53221.201	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS 201	$ 4.244.795.083,00	$ -	$ -	$ 4.244.795.083,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.202500000035927.2.2401039.53221.501	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS 501	$ -	$ -	$ 1.533.709.955,10	$ -	$ 1.533.709.955,10	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.533.709.955,10	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.202500000035927.2.2401039.53221.567	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS 567	$ -	$ -	$ 345.963.873,90	$ -	$ 345.963.873,90	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 345.963.873,90	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.202500000036178.2.2401039.53221.201	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS 201	$ 3.990.743.822,00	$ -	$ -	$ 3.990.743.822,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0
RUBRO	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES													
2.3.2.02.02.005.202500000035592.2.2402042.53211.289	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 289	$ 1.576.559.594,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.576.559.594,00	$ 1.576.559.594,00	$ 1.576.559.594,00	$ 1.182.419.637,00	$ 1.182.419.637,00	$ -	$ -	$ 394.139.957,00	100
2.3.2.02.02.005.202500000035592.2.2402042.53211.588	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 588	$ 1.057.403.475,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.057.403.475,00	$ 1.057.403.475,00	$ 1.057.403.475,00	$ 1.057.403.475,00	$ 1.057.403.475,00	$ -	$ -	$ -	100
2.3.2.02.02.005.202600000011531.2.2402042.53211.588	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 588	$ -	$ 1.798.328.403,00	$ -	$ -	$ 1.798.328.403,00	$ 1.798.328.403,00	$ 1.798.328.403,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.798.328.403,00	100
RUBRO	CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES													
2.3.2.02.02.005.202600000016817.2.2402062.53211.273	CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS); CALLES 273	$ -	$ 133.731.734.225,00	$ -	$ -	$ 133.731.734.225,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 133.731.734.225,00	$ -	$ -	0
RUBRO	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS													
2.3.2.02.02.005.202500000028779.2.2402083.53221.213	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS 213	$ 2.507.682.615,00	$ -	$ 421.203.511,00	$ -	$ 2.928.886.126,00	$ 2.928.886.126,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.928.886.126,00	$ -	0
RUBRO	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES													
2.3.2.02.02.005.2024680010043.2.2402112.53211.201	CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 201	$ 2.000.000.000,00	$ -	$ -	$ 600.000.000,00	$ 1.400.000.000,00	$ 1.400.000.000,00	$ 1.400.000.000,00	$ 1.370.869.704,23	$ 1.370.869.704,23	$ -	$ -	$ 29.130.295,77	100
2.3.2.02.02.005.202600000018762.2.2402112.53211.201	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 201	$ -	$ -	$ 464.751.181,88	$ -	$ 464.751.181,88	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 464.751.181,88	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.202600000018762.2.2402112.53211.251	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 251	$ -	$ -	$ 735.248.818,12	$ -	$ 735.248.818,12	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 735.248.818,12	$ -	$ -	0

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES							TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	% Ejecucion
		Presupuesto Inicial	Adicion	Credito	Contracredito	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	Obligaciones	Pagos Acumulados				
		$ 1,00				3 = 1 + 2	$ 5,00	$ 7,00		$ 9,00	10 = 3 - 5	11 = 5 - 7	12 = 7 - 9	13 = 7 / 3
RUBRO	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES													
2.3.2.02.02.005.20226800101000.2.2402113.53211.230	CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 230	$ 2.453.550.034,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.453.550.034,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.453.550.034,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20226800101000.2.2402113.53211.255	CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 255	$ 350.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 350.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 350.000.000,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20226800101000.2.2402113.53211.501	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 501	$ -	$ 23.500.000.000,00	$ -	$ 23.500.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20226800101000.2.2402113.53211.530	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 530	$ -	$ 20.027.672.893,09	$ -	$ -	$ 20.027.672.893,09	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.027.672.893,09	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20260000001682 7.2.2402113.53211.273	CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS); CALLES 273	$ -	$ 96.137.695.064,00	$ -	$ -	$ 96.137.695.064,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 96.137.695.064,00	$ -	$ -	0
RUBRO	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES													
2.3.2.02.02.005.20250000002720 7.2.2402114.53211.213	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 213	$ -	$ -	$ 344.097.890,00	$ -	$ 344.097.890,00	$ 344.097.890,00	$ 344.097.890,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 344.097.890,00	100
2.3.2.02.02.005.20250000002720 7.2.2402114.53211.251	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 251	$ 2.532.661.346,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.532.661.346,00	$ 2.493.519.652,00	$ 2.493.519.652,00	$ -	$ -	$ 39.141.694,00	$ -	$ 2.493.519.652,00	98,45
2.3.2.02.02.005.20260000001680 0.2.2402114.53211.273	CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS); CALLES 273	$ -	$ 82.541.043.925,00	$ -	$ -	$ 82.541.043.925,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 82.541.043.925,00	$ -	$ -	0
RUBRO	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES													
2.3.2.02.02.005.20250000003617 4.2.2402115.53211.201	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 201	$ 9.999.999.996,00	$ -	$ 5.101.454.009,00	$ -	$ 15.101.454.005,00	$ 15.101.454.002,83	$ 15.101.454.002,83	$ 14.450.539.582,20	$ 14.450.539.582,20	$ 2,17	$ -	$ 650.914.420,63	99,99
2.3.2.02.02.005.20250000003617 4.2.2402115.53211.213	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 213	$ 243.830.136,00	$ -	$ -	$ -	$ 243.830.136,00	$ 243.830.136,00	$ 243.830.136,00	$ 243.830.136,00	$ 243.830.136,00	$ -	$ -	$ -	100
2.3.2.02.02.005.20250000003617 4.2.2402115.53211.248	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 248	$ 324.358.969,00	$ -	$ -	$ -	$ 324.358.969,00	$ 324.358.969,00	$ 324.358.969,00	$ 324.358.969,00	$ 324.358.969,00	$ -	$ -	$ -	100
2.3.2.02.02.005.20250000003617 4.2.2402115.53211.251	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 251	$ 653.493.068,00	$ -	$ -	$ -	$ 653.493.068,00	$ 653.493.068,00	$ 653.493.068,00	$ 653.493.068,00	$ 653.493.068,00	$ -	$ -	$ -	100
2.3.2.02.02.005.20250000003617 4.2.2402115.53211.318	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 318	$ 250.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 250.000.000,00	$ 250.000.000,00	$ 250.000.000,00	$ 250.000.000,00	$ 250.000.000,00	$ -	$ -	$ -	100
2.3.2.02.02.005.20250000003617 4.2.2402115.53211.319	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 319	$ 2.000.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.000.000.000,00	$ 2.000.000.000,00	$ 2.000.000.000,00	$ 2.000.000.000,00	$ 2.000.000.000,00	$ -	$ -	$ -	100
2.3.2.02.02.005.20250000003617 4.2.2402115.53211.324	CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS); CALLES 324	$ -	$ 5.809.324.828,83	$ -	$ -	$ 5.809.324.828,83	$ 5.704.670.210,00	$ 5.704.670.210,00	$ 1.000.536.099,00	$ 1.000.536.099,00	$ 104.654.618,83	$ -	$ 4.704.134.111,00	98,19
2.3.2.02.02.005.20250000003617 4.2.2402115.53211.501	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 501	$ 1.622.225.536,17	$ -	$ -	$ -	$ 1.622.225.536,17	$ 1.622.225.536,17	$ 1.622.225.536,17	$ 1.622.225.536,17	$ 1.622.225.536,17	$ -	$ -	$ -	100
2.3.2.02.02.005.20250000003617 4.2.2402115.53211.588	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 588	$ -	$ 4.288.356.025,00	$ -	$ -	$ 4.288.356.025,00	$ 4.288.356.025,00	$ 4.288.356.025,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.288.356.025,00	100
2.3.2.02.02.005.20260000001630 3.2.2402115.53211.273	CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS); CALLES 273	$ -	$ 26.446.781.786,00	$ -	$ -	$ 26.446.781.786,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 26.446.781.786,00	$ -	$ -	0
RUBRO	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS													
2.3.2.02.02.005.20236800100600.2.2402119.53221.251	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS 251	$ 5.000.000.000,00	$ 1.977.998.593,62	$ -	$ -	$ 6.977.998.593,62	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.977.998.593,62	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20236800100600.2.2402119.53221.391	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS 391	$ -	$ 60.364.934,00	$ -	$ -	$ 60.364.934,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 60.364.934,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20236800100600.2.2402119.53221.392	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS 392	$ -	$ 322.136.002,59	$ -	$ -	$ 322.136.002,59	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 322.136.002,59	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20260000001681 6.2.2402119.53221.273	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS 273	$ -	$ 32.747.965.091,00	$ -	$ -	$ 32.747.965.091,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 32.747.965.091,00	$ -	$ -	0
RUBRO	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS													
2.3.2.02.02.005.20250000002877 9.2.2402120.53221.201	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS 201	$ 935.882.277,00	$ -	$ -	$ -	$ 935.882.277,00	$ 935.882.277,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 935.882.277,00	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20250000002877 9.2.2402120.53221.213	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 213	$ -	$ -	$ 52.297.027,00	$ -	$ 52.297.027,00	$ 52.297.027,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 52.297.027,00	$ -	0
RUBRO	CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES													

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES							TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS					
		Presupuesto Inicial	Adicion	Credito	Contracredito	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	Obligaciones	Pagos Acumulados	Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	% Ejecucion
		$ 1,00				3 = 1 + 2	$ 5,00	$ 7,00		$ 9,00	10 = 3 - 5	11 = 5 - 7	12 = 7 - 9	13 = 7 / 3
2.3.2.02.02.005.20260000001 4913.2.2409003.53211.273	CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS); CALLES 273	$ -	$ 111.156.555.469,66	$ -	$ -	$ 111.156.555.469,66	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 111.156.555.469,66	$ -	$ -	0
	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION													
RUBRO	**SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION**													
2.3.2.02.02.008.20250000003 5750.2.2402118.83321.201	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 536.988.872,00	$ -	$ -	$ -	$ 536.988.872,00	$ 441.332.145,50	$ -	$ -	$ -	$ 95.656.726,50	$ 441.332.145,50	$ -	0
2.3.2.02.02.008.20250000003 5927.2.2402118.83321.201	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 140.459.886,00	$ -	$ -	$ -	$ 140.459.886,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 140.459.886,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.008.20250000003 5927.2.2402118.83321.501	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501	$ -	$ -	$ 87.549.670,00	$ -	$ 87.549.670,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 87.549.670,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.008.20250000003 6173.2.2402118.83321.201	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 2.019.476.878,00	$ -	$ -	$ 1.696.360.578,00	$ 323.116.300,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 323.116.300,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.008.20250000003 6178.2.2402118.83321.201	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ -	$ -	$ 120.344.831,00	$ -	$ 120.344.831,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 120.344.831,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.008.20250000003 6178.2.2402118.83321.501	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501	$ -	$ -	$ 163.097.411,00	$ -	$ 163.097.411,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 163.097.411,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.008.20250000003 6180.2.2402118.83321.201	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 1.908.253.371,00	$ -	$ -	$ 1.602.932.832,00	$ 305.320.539,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 305.320.539,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.008.20260000001 6303.2.2402118.83321.273	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 273	$ -	$ 76.996.744,00	$ -	$ -	$ 76.996.744,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 76.996.744,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.008.20260000001 6800.2.2402118.83321.273	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 273	$ -	$ 1.871.053.952,00	$ -	$ -	$ 1.871.053.952,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.871.053.952,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.008.20260000001 6816.2.2402118.83321.273	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 273	$ -	$ 580.384.374,00	$ -	$ -	$ 580.384.374,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 580.384.374,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.008.20260000001 6817.2.2402118.83321.273	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 273	$ -	$ 2.510.092.676,00	$ -	$ -	$ 2.510.092.676,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.510.092.676,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.008.20260000001 6827.2.2402118.83321.273	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 273	$ -	$ 1.261.185.624,00	$ -	$ -	$ 1.261.185.624,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.261.185.624,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**SERVICIOS DE INGENIERA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIN**													
2.3.2.02.02.008.20260000001 4913.2.2408053.83321.273	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 273	$ -	$ 4.215.606.042,34	$ -	$ -	$ 4.215.606.042,34	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.215.606.042,34	$ -	$ -	0
	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO													
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS													
	ADQUISICION DE SERVICIOS													
	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION													
RUBRO	**CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES**													
2.3.2.02.02.005.20260000001 8992.2.4002020.53211.289	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 289	$ -	$ -	$ 7.693.007.142,96	$ -	$ 7.693.007.142,96	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.693.007.142,96	$ -	$ -	0
RUBRO	**INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO**													
2.3.2.02.02.005.20260000001 6685.2.4002020.53270.273	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 273	$ -	$ 14.118.928.687,00	$ -	$ -	$ 14.118.928.687,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.118.928.687,00	$ -	$ -	0
	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION													
RUBRO	**SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA EXCEPTO A TRAVES DE LA RED A COMISION O POR CONTRATO**													
2.3.2.02.02.008.20246800100 53.1.4003048.86350.201	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA, EXCEPTO A TRAVES DE LA RED (A COMISION O POR CONTRATO) 201	$ 150.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 150.000.000,00	$ 150.000.000,00	$ 150.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 150.000.000,00	100
	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO													

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES							TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	% Ejecucion
		Presupuesto Inicial	Adicion	Credito	Contracredito	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	Obligaciones	Pagos Acumulados				
		$ 1,00				3 = 1 + 2	$ 5,00	$ 7,00		$ 9,00	10 = 3 - 5	11 = 5 - 7	12 = 7 - 9	13 = 7 / 3
RUBRO	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO													
2.3.2.02.02.005.202600000016857.2.4301011.53270.273	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 273	$ -	$ 31.215.462.286,00	$ -	$ -	$ 31.215.462.286,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 31.215.462.286,00	$ -	$ -	0
	LINEA 3. TERRITORIO SEGURO Y SOSTENIBLE													
	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO													
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS													
	ADQUISICION DE SERVICIOS													
	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION													
RUBRO	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES													
2.3.2.02.02.005.2024680010050.2.4002020.53211.588	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 588	$ 7.734.153.516,00	$ 3.015.212.946,15	$ -	$ -	$ 10.749.366.462,15	$ 10.749.366.462,15	$ 10.749.366.462,15	$ 7.608.416.805,09	$ 7.608.416.805,09	$ -	$ -	$ 3.140.949.657,06	100
2.3.2.02.02.005.2024680010076.2.4002020.53211.532	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 532	$ -	$ 1.158.853.309,00	$ -	$ -	$ 1.158.853.309,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.158.853.309,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2024680010076.2.4002020.53211.533	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 533	$ -	$ 3.727.166.660,00	$ -	$ -	$ 3.727.166.660,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.727.166.660,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2025000000350591.2.4002020.53211.289	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 289	$ 24.906.234.469,00	$ 679.066.452,41	$ -	$ 7.693.007.142,96	$ 17.892.293.778,45	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17.892.293.778,45	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2025000000350591.2.4002020.53211.317	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 317	$ 4.000.000.000,00	$ -	$ -	$ 4.000.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2025000000350591.2.4002020.53211.324	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 324	$ 6.000.000.000,00	$ -	$ -	$ 6.000.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2025000000350591.2.4002020.53211.501	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 501	$ 1.576.608.504,00	$ -	$ -	$ 1.576.608.504,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2025000000350591.2.4002020.53211.588	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 588	$ -	$ 19.968.666.486,16	$ -	$ 7.449.265.028,00	$ 12.519.401.458,16	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.519.401.458,16	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2026000000090765.2.4002020.53211.282	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES	$ -	$ -	$ 922.917.149,00	$ -	$ 922.917.149,00	$ 922.917.149,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 922.917.149,00	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2026000000090765.2.4002020.53211.317	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES	$ -	$ -	$ 4.000.000.000,00	$ -	$ 4.000.000.000,00	$ 4.000.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.000.000.000,00	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2026000000090765.2.4002020.53211.324	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES	$ -	$ -	$ 6.000.000.000,00	$ -	$ 6.000.000.000,00	$ 5.999.700.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 300.000,00	$ 5.999.700.000,00	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2026000000090765.2.4002020.53211.501	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES	$ -	$ -	$ 1.576.608.504,00	$ -	$ 1.576.608.504,00	$ 1.576.608.504,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.576.608.504,00	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2026000000090765.2.4002020.53211.521	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 521	$ -	$ 126.278.659,00	$ -	$ -	$ 126.278.659,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 126.278.659,00	$ -	$ -	0
RUBRO	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO													
2.3.2.02.02.005.2025000000290578.2.4002020.53270.588	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 588	$ 1.047.152.823,00	$ -	$ -	$ 1.047.152.823,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2026000000110370.2.4002020.53270.588	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 588	$ -	$ 731.519.884,00	$ -	$ -	$ 731.519.884,00	$ 731.349.375,00	$ 731.349.375,00	$ -	$ -	$ 170.509,00	$ -	$ 731.349.375,00	99,97
2.3.2.02.02.005.2026000000110371.2.4002020.53270.588	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 588	$ -	$ 1.163.822.622,00	$ -	$ -	$ 1.163.822.622,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.163.822.622,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2026000000110484.2.4002020.53270.588	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 588	$ -	$ 920.301.763,00	$ 118.589.229,00	$ -	$ 1.038.890.992,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.038.890.992,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2026000000110693.2.4002020.53270.501	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 501	$ -	$ 14.619.226.829,60	$ -	$ 14.619.226.829,60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2026000000110693.2.4002020.53270.513	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 513	$ -	$ 1.570.000.000,00	$ -	$ -	$ 1.570.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.570.000.000,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2026000000110693.2.4002020.53270.567	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 567	$ -	$ 810.773.170,40	$ -	$ 345.963.873,90	$ 464.809.296,50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 464.809.296,50	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2026000000110697.2.4002020.53270.588	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 588	$ -	$ 345.497.073,00	$ -	$ -	$ 345.497.073,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 345.497.073,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2026000000150224.2.4002020.53270.588	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 588	$ -	$ -	$ 1.047.152.823,00	$ -	$ 1.047.152.823,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.047.152.823,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2026000000150494.2.4002020.53270.213	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 213	$ -	$ -	$ 822.529.241,67	$ -	$ 822.529.241,67	$ 822.529.241,67	$ 822.529.241,67	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 822.529.241,67	100

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES							TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	% Ejecucion
		Presupuesto Inicial	Adicion	Credito	Contracredito	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	Obligaciones	Pagos Acumulados				
		$ 1,00				3 = 1 + 2	$ 5,00	$ 7,00		$ 9,00	10 = 3 - 5	11 = 5 - 7	12 = 7 - 9	13 = 7 / 3
2.3.2.02.02.005.20260000001 5494.2.4002020.53270.226	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 226	$ -	$ -	$ 1.764.016.769,00	$ -	$ 1.764.016.769,00	$ 1.740.377.774,00	$ 1.740.377.774,00	$ -	$ -	$ 23.638.995,00	$ -	$ 1.740.377.774,00	98,65
2.3.2.02.02.005.20260000001 5494.2.4002020.53270.501	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 501	$ -	$ -	$ 7.333.294.366,83	$ -	$ 7.333.294.366,83	$ 7.232.170.280,83	$ 6.691.889.760,33	$ -	$ -	$ 101.124.086,00	$ 540.280.520,50	$ 6.691.889.760,33	91,25
2.3.2.02.02.005.20260000001 7785.2.4002020.53270.501	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 501	$ -	$ -	$ 6.371.088.075,50	$ -	$ 6.371.088.075,50	$ 6.371.088.075,50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.371.088.075,50	$ -	0
RUBRO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE													
2.3.2.02.02.005.20250000003 0966.2.4002021.85970.501	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE 501	$ 10.976.815.977,00	$ 2.495.011.055,00	$ -	$ 12.799.269.554,00	$ 672.557.478,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 672.557.478,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20250000003 5687.2.4002021.85970.213	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE 213	$ 6.961.570.164,00	$ -	$ -	$ 5.359.355.704,67	$ 1.602.214.459,33	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.602.214.459,33	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20250000003 5687.2.4002021.85970.251	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE 251	$ 538.300.693,00	$ -	$ -	$ -	$ 538.300.693,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 538.300.693,00	$ -	$ -	0
RUBRO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE													
2.3.2.02.02.005.20246800100 45.2.4002022.85970.201	PARQUES MANTENIDOS 201	$ -	$ -	$ 3.013.740.065,00	$ -	$ 3.013.740.065,00	$ 3.013.740.065,00	$ 3.013.740.065,00	$ 496.151.852,37	$ 496.151.852,37	$ -	$ -	$ 2.517.588.212,63	100
2.3.2.02.02.005.20246800100 45.2.4002022.85970.213	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE 213	$ -	$ 804.988.945,00	$ -	$ -	$ 804.988.945,00	$ 804.988.945,00	$ 804.988.945,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 804.988.945,00	100
2.3.2.02.02.005.20246800100 45.2.4002022.85970.251	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE 251	$ -	$ 700.000.000,00	$ -	$ -	$ 700.000.000,00	$ 700.000.000,00	$ 700.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 700.000.000,00	100
2.3.2.02.02.005.20250000003 1111.2.4002022.85970.213	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE 213	$ 11.977.484.557,00	$ -	$ 260.322.048,00	$ -	$ 12.237.806.605,00	$ 12.236.592.614,00	$ 12.236.592.614,00	$ 2.393.596.751,31	$ 2.166.214.241,25	$ 1.213.991,00	$ -	$ 9.842.995.862,69	99,99
2.3.2.02.02.005.20250000003 1111.2.4002022.85970.251	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE 251	$ -	$ 5.510.230.479,18	$ -	$ -	$ 5.510.230.479,18	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.510.230.479,18	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20250000003 1111.2.4002022.85970.324	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE 324	$ -	$ 608.065.827,82	$ -	$ -	$ 608.065.827,82	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 608.065.827,82	$ -	$ -	0
RUBRO	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AGUA EXCEPTO GASODUCTOS													
2.3.2.02.02.005.20246800102 49.2.4003015.53231.215	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AGUA EXCEPTO GASODUCTOS 215	$ 2.426.953.896,17	$ 455.153.475,00	$ -	$ 2.882.107.371,17	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20246800102 49.2.4003015.53231.268	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AGUA EXCEPTO GASODUCTOS 268	$ 30.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 30.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.000.000,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20246800102 49.2.4003015.53231.501	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AGUA EXCEPTO GASODUCTOS 501	$ 9.726.432.633,83	$ -	$ -	$ 9.726.432.633,83	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20246800102 49.2.4003015.53231.515	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AGUA EXCEPTO GASODUCTOS 515	$ -	$ 3.772.624.467,37	$ -	$ 3.744.648.226,83	$ 27.976.240,54	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27.976.240,54	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20250000003 5711.2.4003015.53231.201	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AGUA EXCEPTO GASODUCTOS 201	$ 2.742.815.006,00	$ -	$ -	$ 2.742.815.006,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20250000003 5711.2.4003015.53231.267	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AGUA EXCEPTO GASODUCTOS 267	$ 600.000.000,00	$ -	$ -	$ 600.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20250000003 5711.2.4003015.53231.515	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AGUA EXCEPTO GASODUCTOS 515	$ -	$ 3.209.008.028,00	$ -	$ -	$ 3.209.008.028,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.209.008.028,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20250000003 5711.2.4003015.53231.573	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AGUA EXCEPTO GASODUCTOS 573	$ -	$ 387.099.967,00	$ -	$ -	$ 387.099.967,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 387.099.967,00	$ -	$ -	0
RUBRO	ALCANTARILLADOS OPTIMIZADOS ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA													
2.3.2.02.02.005.20260000001 6974.2.4003020.53253.215	ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA 215	$ -	$ -	$ 2.882.107.371,17	$ -	$ 2.882.107.371,17	$ 2.882.107.371,17	$ 2.882.107.371,17	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.882.107.371,17	100
2.3.2.02.02.005.20260000001 6974.2.4003020.53253.515	ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA 515	$ -	$ -	$ 3.744.648.226,83	$ -	$ 3.744.648.226,83	$ 3.744.648.226,83	$ 3.744.648.226,83	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.744.648.226,83	100
2.3.2.02.02.005.20260000001 6974.2.4003020.53253.588	ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA 588	$ -	$ -	$ 352.467.825,00	$ -	$ 352.467.825,00	$ 352.467.825,00	$ 352.467.825,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 352.467.825,00	100
RUBRO	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL													
2.3.2.02.02.005.20246800102 15.2.4003044.53290.213	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL 213	$ -	$ -	$ 184.150.021,00	$ -	$ 184.150.021,00	$ 184.132.384,00	$ 184.132.384,00	$ -	$ -	$ 17.637,00	$ -	$ 184.132.384,00	99,99
2.3.2.02.02.005.20246800102 15.2.4003044.53290.215	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL 215	$ 2.316.613.470,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.316.613.470,00	$ 2.308.664.290,00	$ 2.308.664.290,00	$ -	$ -	$ 7.949.180,00	$ -	$ 2.308.664.290,00	99,65
	COMERCIO Y DISTRIBUCION ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA													

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES							TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	% Ejecucion
		Presupuesto Inicial	Adicion	Credito	Contracredito	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	Obligaciones	Pagos Acumulados				
		$ 1,00				3 = 1 + 2	$ 5,00	$ 7,00		$ 9,00	10 = 3 - 5	11 = 5 - 7	12 = 7 - 9	13 = 7 / 3
RUBRO	**COMERCIO AL POR MAYOR EXCEPTO EL REALIZADO A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION O POR CONTRATA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MANUALES**													
2.3.2.02.02.006.2026000000010465.2.4002020.61165.501	COMERCIO AL POR MAYOR EXCEPTO EL REALIZADO A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION O POR CONTRATA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MANUALES 501	$ -	$ -	$ 793.138.267,00	$ -	$ 793.138.267,00	$ 793.138.267,00	$ 793.138.267,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 793.138.267,00	100
	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION													
RUBRO	**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE**													
2.3.2.02.02.008.2024680010046.2.4002026.85970.501	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE 501	$ 14.838.630.390,00	$ -	$ 6.714.428.799,00	$ -	$ 21.553.059.189,00	$ 21.552.949.363,00	$ 20.732.823.794,00	$ 9.138.237.391,79	$ 9.138.237.391,79	$ 109.826,00	$ 820.125.569,00	$ 11.594.586.402,21	96,19
	LINEA 4. TERRITORIO SEGURO QUE GENERA VALOR													
	GOBIERNO TERRITORIAL													
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS													
	MATERIALES Y SUMINISTROS													
	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO													
RUBRO	**IMPRESORA MULTIFUNCIONAL**													
2.3.2.02.01.004.2024680010049.2.4599031.4526601.201	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 201	$ -	$ -	$ 96.452.803,00	$ -	$ 96.452.803,00	$ 47.440.064,00	$ 47.440.064,00	$ -	$ -	$ 49.012.739,00	$ -	$ 47.440.064,00	49,18
	ADQUISICION DE SERVICIOS													
	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION													
	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES													
RUBRO														
2.3.2.02.02.005.2025000000035596.2.4502003.53129.251	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 251	$ 2.488.030.658,00	$ -	$ -	$ 2.488.030.658,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0
RUBRO	**OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES**													
2.3.2.02.02.005.2025000000035821.2.4502007.53129.588	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 588	$ -	$ 153.853.179,00	$ -	$ -	$ 153.853.179,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 153.853.179,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES**													
2.3.2.02.02.005.2025000000041555.2.4599011.53129.213	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 213	$ -	$ -	$ 118.971.661,00	$ -	$ 118.971.661,00	$ 114.212.702,00	$ 114.212.702,00	$ -	$ -	$ 4.758.959,00	$ -	$ 114.212.702,00	95,99
	COMERCIO Y DISTRIBUCION ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA													
RUBRO	**SERVICIOS DE ALQUILER DE AUTOMOVILES CON CONDUCTOR**													
2.3.2.02.02.006.2024680010049.2.4599031.64116.201	SERVICIOS DE ALQUILER DE AUTOMOVILES CON CONDUCTOR 201	$ -	$ -	$ 154.438.200,00	$ -	$ 154.438.200,00	$ 154.438.200,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 154.438.200,00	$ -	0
	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION													
RUBRO	**SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION**													
2.3.2.02.02.008.2024680010084.2.4599006.83321.267	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 267	$ -	$ -	$ 126.095.762,00	$ -	$ 126.095.762,00	$ 126.095.762,00	$ 126.095.762,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 126.095.762,00	100
2.3.2.02.02.008.2026000000018687.2.4599006.83321.201	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ -	$ -	$ 135.248.818,12	$ -	$ 135.248.818,12	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 135.248.818,12	$ -	$ -	0
RUBRO	**SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO**													
2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.82120.201	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIN JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 201	$ -	$ -	$ 206.000.000,00	$ -	$ 206.000.000,00	$ 206.000.000,00	$ 181.030.000,01	$ 32.296.666,67	$ 1.200.000,00	$ -	$ 24.969.999,99	$ 148.733.333,34	87,87

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES							TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	% Ejecucion
		Presupuesto Inicial	Adicion	Credito	Contracredito	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	Obligaciones	Pagos Acumulados				
		$ 1,00				3 = 1 + 2	$ 5,00	$ 7,00		$ 9,00	10 = 3 - 5	11 = 5 - 7	12 = 7 - 9	13 = 7 / 3
2.3.2.02.02.008.20246800100 49.2.4599031.82120.251	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 251	$ 1.200.000.000,00	$ 542.000.000,00	$ -	$ -	$ 1.742.000.000,00	$ 1.642.000.000,00	$ 1.364.996.666,66	$ 1.182.509.999,99	$ 1.127.923.333,33	$ 100.000.000,00	$ 277.003.333,34	$ 182.486.666,67	78,35
RUBRO	**SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES**													
2.3.2.02.02.008.20246800100 49.2.4599031.83213.201	SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 201	$ 800.000.000,00	$ -	$ 19.434.000,00	$ -	$ 819.434.000,00	$ 819.434.000,00	$ 819.434.000,00	$ 790.020.000,00	$ 764.760.000,00	$ -	$ -	$ 29.414.000,00	100
2.3.2.02.02.008.20246800100 49.2.4599031.83213.251	SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 251	$ -	$ 311.000.000,00	$ -	$ 100.000.000,00	$ 211.000.000,00	$ 211.000.000,00	$ 207.009.333,33	$ 27.573.333,34	$ -	$ -	$ 3.990.666,67	$ 179.435.999,99	98,1
RUBRO	**SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION**													
2.3.2.02.02.008.20246800100 49.2.4599031.83321.201	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 3.400.000.000,00	$ -	$ 197.000.000,00	$ -	$ 3.597.000.000,00	$ 3.597.000.000,00	$ 3.597.000.000,00	$ 3.409.660.000,00	$ 3.216.766.666,67	$ -	$ -	$ 187.340.000,00	100
2.3.2.02.02.008.20246800100 49.2.4599031.83321.251	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ -	$ 1.402.000.000,00	$ -	$ 250.000.000,00	$ 1.152.000.000,00	$ 1.152.000.000,00	$ 1.151.319.999,98	$ 162.423.333,35	$ -	$ -	$ 680.000,02	$ 988.896.666,63	99,94
RUBRO	**OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P**													
2.3.2.02.02.008.20246800100 49.2.4599031.83990.201	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 3.900.000.000,00	$ -	$ 3.281.175.385,00	$ -	$ 7.181.175.385,00	$ 7.181.175.385,00	$ 7.179.568.718,32	$ 5.189.250.643,67	$ 4.446.937.310,35	$ -	$ 1.606.666,68	$ 1.990.318.074,65	99,97
2.3.2.02.02.008.20246800100 49.2.4599031.83990.251	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ -	$ 1.439.000.000,00	$ -	$ 385.248.818,12	$ 1.053.751.181,88	$ 1.053.751.181,88	$ 1.046.528.592,03	$ 137.276.666,68	$ -	$ -	$ 7.222.589,85	$ 909.251.925,35	99,31
2.3.2.02.02.008.20246800100 49.2.4599031.83990.501	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501	$ -	$ -	$ 598.596.023,00	$ -	$ 598.596.023,00	$ 598.596.023,00	$ 596.696.023,00	$ 450.312.689,68	$ 394.496.023,01	$ -	$ 1.900.000,00	$ 146.383.333,32	99,68
RUBRO	**OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P**													
2.3.2.02.02.008.20246800100 49.2.4599031.85999.201	OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 201	$ 700.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 700.000.000,00	$ 700.000.000,00	$ 698.533.333,33	$ 698.453.333,33	$ 668.193.333,32	$ -	$ 1.466.666,67	$ 80.000,00	99,79
2.3.2.02.02.008.20246800100 49.2.4599031.85999.251	OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ -	$ 306.000.000,00	$ 753.136.469,00	$ -	$ 1.059.136.469,00	$ 959.136.469,00	$ 730.524.666,68	$ 140.836.666,64	$ 21.863.333,33	$ 100.000.000,00	$ 228.611.802,32	$ 589.688.000,04	68,97
	DISMINUCION DE PASIVOS													
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS													
RUBRO	**EDIFICIOS COMERCIALES**													
2.3.7.06.02.202600000011689. 2.4599002.53122.501	EDIFICIOS COMERCIALES 501	$ -	$ 1.056.914.326,18	$ -	$ -	$ 1.056.914.326,18	$ 1.056.914.326,18	$ 1.056.914.326,18	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.056.914.326,18	100
2.3.7.06.02.202600000011689. 2.4599002.53122.573	EDIFICIOS COMERCIALES 573	$ -	$ 663.949.600,48	$ -	$ -	$ 663.949.600,48	$ 663.949.600,48	$ 663.949.600,48	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 663.949.600,48	100
RUBRO	**OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES**													
2.3.7.06.02.202600000011689. 2.4599002.53129.501	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 501	$ -	$ 832.663.052,74	$ -	$ -	$ 832.663.052,74	$ 832.663.052,74	$ 832.663.052,74	$ 62.447.428,86	$ -	$ -	$ -	$ 770.215.623,88	100
2.3.7.06.02.202600000011689. 2.4599002.53129.516	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 516	$ -	$ 259.826.547,30	$ -	$ -	$ 259.826.547,30	$ 259.826.547,30	$ 259.826.547,30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 259.826.547,30	100
2.3.7.06.02.202600000011689. 2.4599002.53129.521	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 521	$ -	$ 32.320.345,00	$ -	$ -	$ 32.320.345,00	$ 32.320.345,00	$ 32.320.345,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 32.320.345,00	100
2.3.7.06.02.202600000011689. 2.4599002.53129.573	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 573	$ -	$ 251.523.966,71	$ -	$ -	$ 251.523.966,71	$ 251.523.966,71	$ 251.523.966,71	$ 30.793.074,71	$ -	$ -	$ -	$ 220.730.892,00	100
RUBRO	**CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES**													
2.3.7.06.02.202600000011689. 2.4599002.53211.501	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 501	$ -	$ 3.977.597.796,66	$ -	$ -	$ 3.977.597.796,66	$ 3.977.597.796,66	$ 3.977.597.796,66	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.977.597.796,66	100
RUBRO	**INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO**													
2.3.7.06.02.202600000011689. 2.4599002.53270.501	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 501	$ -	$ 9.266.883.583,11	$ -	$ -	$ 9.266.883.583,11	$ 9.266.883.583,11	$ 9.266.883.583,11	$ 2.732.886.341,09	$ 2.732.886.341,09	$ -	$ -	$ 6.533.997.242,02	100
2.3.7.06.02.202600000011689. 2.4599002.53270.573	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 573	$ -	$ 294.672.040,75	$ -	$ -	$ 294.672.040,75	$ 294.672.040,75	$ 294.672.040,75	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 294.672.040,75	100
RUBRO	**SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES**													
2.3.7.06.02.202600000011689. 2.4599002.54129.501	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 501	$ -	$ 153.203.540,00	$ -	$ -	$ 153.203.540,00	$ 153.203.540,00	$ 153.203.540,00	$ 78.023.032,86	$ 78.023.032,86	$ -	$ -	$ 75.180.507,14	100
RUBRO	**SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES**													

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES							TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	% Ejecucion
		Presupuesto Inicial	Adicion	Credito	Contracredito	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	Obligaciones	Pagos Acumulados				
		$ 1,00				3 = 1 + 2	$ 5,00	$ 7,00		$ 9,00	10 = 3 - 5	11 = 5 - 7	12 = 7 - 9	13 = 7 / 3
2.3.7.06.02.202600000011689.2.4599002.54211.582	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 582	$ -	$ 284.027.909,09	$ -	$ -	$ 284.027.909,09	$ 284.027.909,09	$ 284.027.909,09	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 284.027.909,09	100
RUBRO	**SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO**													
2.3.7.06.02.202600000011689.2.4599002.54270.501	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 501	$ -	$ 1.797.185.770,76	$ -	$ -	$ 1.797.185.770,76	$ 1.797.185.770,76	$ 1.797.185.770,76	$ 20.521.780,00	$ 20.521.780,00	$ -	$ -	$ 1.776.663.990,76	100
2.3.7.06.02.202600000011689.2.4599002.54270.513	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 513	$ -	$ 339.950.000,00	$ -	$ -	$ 339.950.000,00	$ 339.950.000,00	$ 339.950.000,00	$ 339.950.000,00	$ 339.950.000,00	$ -	$ -	$ -	100
2.3.7.06.02.202600000011689.2.4599002.54270.573	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 573	$ -	$ 1.155.613.438,80	$ -	$ -	$ 1.155.613.438,80	$ 1.155.613.438,80	$ 1.155.613.438,80	$ 976.338.557,10	$ 976.338.557,10	$ -	$ -	$ 179.274.881,70	100
RUBRO	**COMERCIO AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN Y FERRETERA, PRESTADOS A COMISIN O POR CONTRATA**													
2.3.7.06.02.202600000011689.2.4599002.62560.501	COMERCIO AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATA 501	$ -	$ 371.228.146,50	$ -	$ -	$ 371.228.146,50	$ 371.228.146,50	$ 371.228.146,50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 371.228.146,50	100
RUBRO	**SERVICIOS DE ASESORIA EN ARQUITECTURA**													
2.3.7.06.02.202600000011689.2.4599002.83211.501	SERVICIOS DE ASESORIA EN ARQUITECTURA 501	$ -	$ 370.830.776,00	$ -	$ -	$ 370.830.776,00	$ 370.830.776,00	$ 370.830.776,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 370.830.776,00	100
RUBRO	**SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION**													
2.3.7.06.02.202600000011689.2.4599002.83321.306	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 306	$ -	$ 500.000.000,00	$ -	$ -	$ 500.000.000,00	$ 500.000.000,00	$ 500.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 500.000.000,00	100
2.3.7.06.02.202600000011689.2.4599002.83321.501	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 501	$ -	$ 166.941.759,00	$ -	$ -	$ 166.941.759,00	$ 166.941.759,00	$ 166.941.759,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 166.941.759,00	100
RUBRO	**OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P**													
2.3.7.06.02.202600000011689.2.4599002.83990.501	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501	$ -	$ 24.525.000,00	$ -	$ -	$ 24.525.000,00	$ 24.525.000,00	$ 24.525.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 24.525.000,00	100
RUBRO	**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE**													
2.3.7.06.02.202600000011689.2.4599002.85970.501	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE 501	$ -	$ 679.760.749,41	$ -	$ -	$ 679.760.749,41	$ 679.760.749,41	$ 679.760.749,41	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 679.760.749,41	100
RUBRO	**SERVICIOS DE DISTRIBUCIN DE AGUA, EXCEPTO A TRAVS DE LA RED (A COMISIN O POR CONTRATO)**													
2.3.7.06.02.202600000011689.2.4599002.86350.501	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA EXCEPTO A TRAVES DE LA RED A COMISION O POR CONTRATO 501	$ -	$ 188.055.514,00	$ -	$ -	$ 188.055.514,00	$ 188.055.514,00	$ 188.055.514,00	$ 59.725.737,40	$ 59.725.737,40	$ -	$ -	$ 128.329.776,60	100
RUBRO	**SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIN PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS**													
2.3.7.06.02.202600000011689.2.4599002.91123.526	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 526	$ -	$ 839.489.356,00	$ -	$ -	$ 839.489.356,00	$ 839.489.356,00	$ 839.489.356,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 839.489.356,00	100
	FONDO PARA EL ESPACIO PUBLICO													
	LINEA 3. TERRITORIO SEGURO Y SOSTENIBLE													
	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO													
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS													
	ADQUISICION DE SERVICIOS													
	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION													
RUBRO	**CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES**													
2.3.2.02.02.005.2024680010050.2.4002020.53211.582	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 582	$ -	$ 100.000.000,00	$ -	$ -	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100.000.000,00	100
2.3.2.02.02.005.2024680010076.2.4002020.53211.232	CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 232	$ 470.741.930,00	$ -	$ -	$ -	$ 470.741.930,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 470.741.930,00	$ -	$ -	0

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES					Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	% Ejecucion
		Presupuesto Inicial	Adicion	Credito	Contracredito	Presupuesto Definitivo			Obligaciones	Pagos Acumulados				
		$ 1,00				3 = 1 + 2	$ 5,00	$ 7,00		$ 9,00	10 = 3 - 5	11 = 5 - 7	12 = 7 - 9	13 = 7 / 3
2.3.2.02.02.005.202500000035591.2.4002020.53211.282	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 282	$ 922.917.149,00	$ -	$ -	$ 922.917.149,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.202600000009765.2.4002020.53211.582	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 582	$ -	$ 1.027.947.705,29	$ -	$ -	$ 1.027.947.705,29	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.027.947.705,29	$ -	$ -	0
	FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRUBUCION DEL INGRESO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA													
	LINEA 2. TERRITORIO SEGURO QUE PROGRESA													
	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO													
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
	A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS													
	SUBVENCIONES PARA SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO													
RUBRO	**SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS**													
2.3.3.01.02.004.01.202500000035595.1.4003047.91123.215	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 3.066.183.099,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.066.183.099,00	$ 2.633.543.231,00	$ 2.633.543.231,00	$ 2.633.543.231,00	$ 2.633.543.231,00	$ 432.639.868,00	$ -	$ -	85,88
2.3.3.01.02.004.01.202500000035595.1.4003047.91123.268	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIN PBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PBLICOS	$ -	$ 26.532.677,89	$ -	$ -	$ 26.532.677,89	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 26.532.677,89	$ -	$ -	0
2.3.3.01.02.004.01.202500000035595.1.4003047.91123.331	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 16.031.457.032,00	$ -	$ -	$ -	$ 16.031.457.032,00	$ 4.449.979.820,00	$ 4.449.979.820,00	$ 4.449.979.820,00	$ 4.449.979.820,00	$ 11.581.477.212,00	$ -	$ -	27,75
2.3.3.01.02.004.01.202500000035595.1.4003047.91123.528	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 528	$ -	$ 432.271.178,00	$ -	$ -	$ 432.271.178,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 432.271.178,00	$ -	$ -	0
2.3.3.01.02.004.02.202500000035595.1.4003047.91123.515	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 528	$ -	$ 1.276.444.557,66	$ -	$ -	$ 1.276.444.557,66	$ 481.662.340,00	$ 481.662.340,00	$ 481.662.340,00	$ 481.662.340,00	$ 794.782.217,66	$ -	$ -	37,73
2.3.3.01.02.004.02.202500000035595.1.4003047.91123.528	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 528	$ -	$ 184.996.781,34	$ -	$ -	$ 184.996.781,34	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 184.996.781,34	$ -	$ -	0
2.3.3.01.02.004.03.202500000035595.1.4003047.91123.528	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 528	$ -	$ 432.271.178,07	$ -	$ -	$ 432.271.178,07	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 432.271.178,07	$ -	$ -	0
2.3.3.01.02.004.03.202500000035595.1.4003047.91123.568	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 528	$ -	$ 30.000.000,00	$ -	$ -	$ 30.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.000.000,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS**													
2.3.3.01.02.004.02.202500000035595.1.4003047.91123.215	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 277.955.424,88	$ -	$ -	$ -	$ 277.955.424,88	$ 242.618.472,00	$ 242.618.472,00	$ 225.452.553,00	$ 225.452.553,00	$ 35.336.952,88	$ -	$ 17.165.919,00	87,28
2.3.3.01.02.004.02.202500000035595.1.4003047.91123.333	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 9.500.028.621,00	$ -	$ -	$ -	$ 9.500.028.621,00	$ 2.294.166.860,00	$ 2.294.166.860,00	$ 2.294.166.860,00	$ 2.294.166.860,00	$ 7.205.861.761,00	$ -	$ -	24,14
RUBRO	**SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS**													
2.3.3.01.02.004.03.202500000035595.1.4003047.91123.215	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 4.501.842.643,90	$ -	$ -	$ -	$ 4.501.842.643,90	$ 3.541.902.194,00	$ 3.541.902.194,00	$ 3.541.902.194,00	$ 3.541.902.194,00	$ 959.940.449,90	$ -	$ -	78,67
2.3.3.01.02.004.03.202500000035595.1.4003047.91123.260	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 30.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 30.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.000.000,00	$ -	$ -	0
2.3.3.01.02.004.03.202500000035595.1.4003047.91123.332	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 13.620.081.434,65	$ -	$ -	$ -	$ 13.620.081.434,65	$ 4.778.999.309,00	$ 4.778.999.309,00	$ 4.778.999.309,00	$ 4.778.999.309,00	$ 8.841.082.125,65	$ -	$ -	35,08

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES							TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	% Ejecucion
		Presupuesto Inicial	Adicion	Credito	Contracredito	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	Obligaciones	Pagos Acumulados				
		$ 1,00				3 = 1 + 2	$ 5,00	$ 7,00		$ 9,00	10 = 3 - 5	11 = 5 - 7	12 = 7 - 9	13 = 7 / 3
	MINIMO VITAL													
	SUBSIDIOS DE ASEO													
RUBRO	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS													
2.3.3.01.04.004.03.20250000035595.1.4003047.91123.215	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 376.223.024,05	$ -	$ -	$ -	$ 376.223.024,05	$ 323.386.873,00	$ 323.386.873,00	$ 323.386.873,00	$ 323.386.873,00	$ 52.836.151,05	$ -	$ -	85,95
2.3.3.01.04.004.03.20250000035595.1.4003047.91123.332	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 2.216.585.291,35	$ -	$ -	$ -	$ 2.216.585.291,35	$ 866.624.488,00	$ 866.624.488,00	$ 866.624.488,00	$ 866.624.488,00	$ 1.349.960.803,35	$ -	$ -	39,09
	ALUMBRADO PUBLICO													
	LINEA 4. TERRITORIO SEGURO QUE GENERA VALOR													
	GOBIERNO TERRITORIAL													
	DISMINUCION DE PASIVOS													
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS													
RUBRO	SERVICIO DE INGENIERIA 513													
2.3.7.06.02.202600000011719.2.4599002.83324.513	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS ENERGETICOS 513	$ -	$ -	$ 1.250.000.000,00	$ -	$ 1.250.000.000,00	$ 1.250.000.000,00	$ 1.250.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.250.000.000,00	100
	LINEA 5. TERRITORIO SEGURO QUE PROTEGE													
	MINAS Y ENERGIA													
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS													
	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS													
	MATERIALES Y SUMINISTROS													
	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO													
RUBRO	PAPEL BOND													
2.3.2.02.01.003.20246800101922.2102069.3212801.226	PAPEL PARA IMPRESORA O FOTOCOPIADORA 226	$ 40.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 40.000.000,00	$ 40.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 40.000.000,00	$ -	0
2.3.2.02.01.003.20246800101922.2102069.3212801.526	PAPEL BOND 526	$ -	$ 20.000.000,00	$ -	$ -	$ 20.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.000.000,00	$ -	$ -	0
RUBRO	DIESEL OIL ACPM FUEL GAS GASOIL MARINE GAS													
2.3.2.02.01.003.20246800101922.2102069.3336103.226	DIESEL OIL ACPM FUEL GAS GASOIL MARINE GAS 226	$ 20.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00	$ 571.271,25	$ 571.271,25	$ -	$ -	$ 19.428.728,75	100
2.3.2.02.01.003.20246800101922.2102069.3336103.526	DIESEL OIL ACPM FUEL GAS GASOIL MARINE GAS 526	$ -	$ 10.000.000,00	$ -	$ -	$ 10.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.000.000,00	$ -	$ -	0
RUBRO	CARTUCHOS PLASTICOS PARA IMPRESORA DE COMPUTADOR													
2.3.2.02.01.003.20246800101922.2102069.3699060.226	CARTUCHOS PLASTICOS PARA IMPRESORA DE COMPUTADOR 226	$ 60.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 60.000.000,00	$ 60.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 60.000.000,00	$ -	0
2.3.2.02.01.003.20246800101922.2102069.3699060.526	CARTUCHOS PLASTICOS PARA IMPRESORA DE COMPUTADOR 526	$ -	$ 30.000.000,00	$ -	$ -	$ 30.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.000.000,00	$ -	$ -	0
	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO													
RUBRO	INSTALACIONES ELECTRICAS NAVIDEÑAS													
2.3.2.02.01.004.20260000001929.0.2102010.4653201.526	INSTALACIONES ELECTRICAS NAVIDENAS 526	$ -	$ -	$ 5.140.822.215,00	$ -	$ 5.140.822.215,00	$ 5.140.822.215,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.140.822.215,00	$ -	0
RUBRO	APARATOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE Y CALEFACCION.													
2.3.2.02.01.004.20246800101922.2102069.4391201.226	APARATOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE Y CALEFACCION 226	$ 20.000.000,00	$ -	$ -	$ 20.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0
2.3.2.02.01.004.20246800101922.2102069.4391201.526	APARATOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE Y CALEFACCION 526	$ -	$ 10.000.000,00	$ -	$ -	$ 10.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.000.000,00	$ -	$ -	0
RUBRO	HERRAMIENTAS ELECTRICAS DE MANO EXCEPTO SOLDADORES													
2.3.2.02.01.004.20246800101922.2102069.4423201.226	HERRAMIENTAS ELECTRICAS DE MANO EXCEPTO SOLDADORES 226	$ 50.000.000,00	$ -	$ -	$ 50.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0
2.3.2.02.01.004.20246800101922.2102069.4423201.526	HERRAMIENTAS ELECTRICAS DE MANO EXCEPTO SOLDADORES 526	$ -	$ 25.000.000,00	$ -	$ -	$ 25.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25.000.000,00	$ -	$ -	0
RUBRO	FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y MQUINAS DE FAX INDEPENDIENTES													
2.3.2.02.01.004.20246800101922.2102069.4491701.526	MAQUINAS FOTOCOPIADORAS 526	$ -	$ 20.000.000,00	$ -	$ -	$ 20.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.000.000,00	$ -	$ -	0
RUBRO	ACCESORIOS ELECTRICOS N C P													
2.3.2.02.01.004.20246800101892.2102069.4693999.226	ACCESORIOS ELECTRICOS N C P 226	$ 11.618.938.287,00	$ -	$ -	$ -	$ 11.618.938.287,00	$ 11.618.938.287,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.618.938.287,00	$ -	0

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES							TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	% Ejecucion
		Presupuesto Inicial	Adicion	Credito	Contracredito	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	Obligaciones	Pagos Acumulados				
		$ 1,00				3 = 1 + 2	$ 5,00	$ 7,00		$ 9,00	10 = 3 - 5	11 = 5 - 7	12 = 7 - 9	13 = 7 / 3
2.3.2.02.01.004.2024680010189.2.2102069.4693999.253	ACCESORIOS ELECTRICOS N C P 253	$ 4.000.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 4.000.000.000,00	$ 4.000.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.000.000.000,00	$ -	0
2.3.2.02.01.004.2024680010189.2.2102069.4693999.526	ACCESORIOS ELECTRICOS N C P 526	$ 4.120.663.768,00	$ 9.869.801.027,50	$ -	$ 2.236.173.074,00	$ 11.754.291.721,50	$ 1.835.329.867,00	$ -	$ -	$ -	$ 9.918.961.854,50	$ 1.835.329.867,00	$ -	0
2.3.2.02.01.004.2025000000158 97.2.2102069.4693999.526	ACCESORIOS ELECTRICOS N C P 526	$ -	$ -	$ 2.236.173.074,00	$ -	$ 2.236.173.074,00	$ 2.236.173.074,00	$ 2.236.173.074,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.236.173.074,00	100
	ADQUISICION DE SERVICIOS													
	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION													
RUBRO	**OTROS SERVICIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS**													
2.3.2.02.02.005.2025000000135 84.2.2102069.54619.226	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 226	$ 12.093.520.514,00	$ -	$ -	$ -	$ 12.093.520.514,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.093.520.514,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2025000000135 84.2.2102069.54619.526	OTROS SERVICIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS 526	$ 106.364.687,00	$ -	$ -	$ -	$ 106.364.687,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 106.364.687,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2025000000158 97.2.2102069.54619.526	OTROS SERVICIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS 526	$ -	$ 11.527.900.573,50	$ -	$ -	$ 11.527.900.573,50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.527.900.573,50	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2025000000361 92.2.2102069.54619.526	OTROS SERVICIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS 526	$ 22.665.192.063,00	$ -	$ -	$ -	$ 22.665.192.063,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.665.192.063,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2025000000361 97.2.2102069.54619.526	OTROS SERVICIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS 526	$ 5.073.567.072,00	$ -	$ -	$ -	$ 5.073.567.072,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.073.567.072,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.2025000000361 07.2.2102069.54619.526	OTROS SERVICIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS 526	$ 12.481.807.434,00	$ -	$ -	$ -	$ 12.481.807.434,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.481.807.434,00	$ -	$ -	0
	COMERCIO Y DISTRIBUCION ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA													
RUBRO	**SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD POR CUENTA PROPIA**													
2.3.2.02.02.006.2024680010192.2.2102069.69112.226	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD POR CUENTA PROPIA 226	$ 20.500.000.000,00	$ -	$ -	$ 2.095.016.769,00	$ 18.404.983.231,00	$ 11.788.267.977,00	$ 11.783.477.265,00	$ 11.783.477.265,00	$ 11.783.477.265,00	$ 6.616.715.254,00	$ 4.790.712,00	$ -	64,02
2.3.2.02.02.006.2024680010192.2.2102069.69112.526	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD POR CUENTA PROPIA 526	$ -	$ 10.877.803.360,64	$ -	$ -	$ 10.877.803.360,64	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.877.803.360,64	$ -	$ -	0
	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING													
RUBRO	**SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES NO RESIDENCIALES DIFERENTES A VIVIENDA A COMISION O POR CONTRATO**													
2.3.2.02.02.007.2024680010192.2.2102069.72212.226	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES NO RESIDENCIALES DIFERENTES A VIVIENDA A COMISION O POR CONTRATO 226	$ 300.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 300.000.000,00	$ 300.000.000,00	$ 296.928.511,00	$ 192.553.640,47	$ 192.553.640,47	$ -	$ 3.071.489,00	$ 104.374.870,53	98,97
2.3.2.02.02.007.2024680010192.2.2102069.72212.526	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES NO RESIDENCIALES DIFERENTES A VIVIENDA A COMISION O POR CONTRATO 526	$ -	$ 150.000.000,00	$ -	$ -	$ 150.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 150.000.000,00	$ -	$ -	0
	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION													
	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO													
RUBRO														
2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.82120.226	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 226	$ 650.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 650.000.000,00	$ 650.000.000,00	$ 557.500.000,00	$ 408.033.333,33	$ 350.983.333,33	$ -	$ 92.500.000,00	$ 149.466.666,67	85,76
2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.82120.526	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIN JURIICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 526	$ -	$ 325.000.000,00	$ -	$ -	$ 325.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 325.000.000,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**SERVICIOS DE CONSULTORA EN GESTIN ADMINISTRATIVA**													
2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.83115.226	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA 226	$ 90.000.000,00	$ -	$ -	$ 90.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.83115.526	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA 526	$ -	$ 45.000.000,00	$ -	$ -	$ 45.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 45.000.000,00	$ -	$ -	0

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES							TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	% Ejecucion
		Presupuesto Inicial	Adicion	Credito	Contracredito	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	Obligaciones	Pagos Acumulados				
		$ 1,00				3 = 1 + 2	$ 5,00	$ 7,00		$ 9,00	10 = 3 - 5	11 = 5 - 7	12 = 7 - 9	13 = 7 / 3
RUBRO	**SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES**													
2.3.2.02.02.008.202468001019 2.2.2102069.83213.226	SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 226	$ 250.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 250.000.000,00	$ 250.000.000,00	$ 60.000.000,00	$ 49.000.000,00	$ 43.000.000,00	$ -	$ 190.000.000,00	$ 11.000.000,00	24
2.3.2.02.02.008.202468001019 2.2.2102069.83213.526	SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 526	$ -	$ 125.000.000,00	$ -	$ -	$ 125.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 125.000.000,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION**													
2.3.2.02.02.008.202468001019 2.2.2102069.83321.226	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 226	$ 300.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 300.000.000,00	$ 300.000.000,00	$ 182.800.000,00	$ 114.400.000,00	$ 105.400.000,00	$ -	$ 117.200.000,00	$ 68.400.000,00	60,93
2.3.2.02.02.008.202468001019 2.2.2102069.83321.526	SERVICIO DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 526	$ -	$ 150.000.000,00	$ -	$ -	$ 150.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 150.000.000,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P**													
2.3.2.02.02.008.202468001019 2.2.2102069.83990.226	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	$ 2.400.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.400.000.000,00	$ 2.400.000.000,00	$ 1.947.650.000,00	$ 1.504.066.666,01	$ 1.318.633.332,68	$ -	$ 452.350.000,00	$ 443.583.333,99	81,15
2.3.2.02.02.008.202468001019 2.2.2102069.83990.526	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 526	$ -	$ 1.200.000.000,00	$ -	$ -	$ 1.200.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.200.000.000,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**SERVICIOS DE TELEFONA FIJA (ACCESO)**													
2.3.2.02.02.008.202468001019 2.2.2102069.84120.226	SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA ACCESO 226	$ 200.000.000,00	$ -	$ 331.000.000,00	$ -	$ 531.000.000,00	$ 391.858.951,57	$ 388.217.663,10	$ 388.217.663,10	$ 388.217.663,10	$ 139.141.048,43	$ 3.641.288,47	$ -	73,11
2.3.2.02.02.008.202468001019 2.2.2102069.84120.526	SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA ACCESO 526	$ -	$ 100.000.000,00	$ -	$ -	$ 100.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100.000.000,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**SERVICIOS DE PROTECCION (GUARDAS DE SEGURIDAD)**													
2.3.2.02.02.008.202468001019 2.2.2102069.85250.226	SERVICIOS DE PROTECCION GUARDAS DE SEGURIDAD 226	$ 3.100.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.100.000.000,00	$ 3.092.643.344,55	$ 3.092.643.344,55	$ 1.604.863.109,33	$ 1.604.863.109,33	$ 7.356.655,45	$ -	$ 1.487.780.235,22	99,76
2.3.2.02.02.008.202468001019 2.2.2102069.85250.526	SERVICIOS DE PROTECCION GUARDAS DE SEGURIDAD 526	$ -	$ 1.550.000.000,00	$ -	$ -	$ 1.550.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.550.000.000,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL**													
2.3.2.02.02.008.202468001019 2.2.2102069.85330.226	SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL 226	$ 50.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 50.000.000,00	$ 50.000.000,00	$ 50.000.000,00	$ 22.609.345,00	$ 22.609.345,00	$ -	$ -	$ 27.390.655,00	100
2.3.2.02.02.008.202468001019 2.2.2102069.85330.526	SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL 526	$ -	$ 25.000.000,00	$ -	$ -	$ 25.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25.000.000,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**SERVICIOS DE CENTROS DE LLAMADAS TELEFONICAS CALL CENTER**													
2.3.2.02.02.008.202468001019 2.2.2102069.85931.226	SERVICIOS DE CENTROS DE LLAMADAS TELEFONICAS CALL CENTER PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 226	$ 350.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 350.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 350.000.000,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.008.202468001019 2.2.2102069.85931.526	SERVICIOS DE CENTROS DE LLAMADAS TELEFONICAS CALL CENTER 526	$ -	$ 175.000.000,00	$ -	$ -	$ 175.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 175.000.000,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE**													
2.3.2.02.02.008.202468001018 9.2.2102069.85970.226	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE 226	$ 2.000.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.000.000.000,00	$ 894.657.218,00	$ 887.280.046,00	$ 67.947.207,00	$ 67.947.207,00	$ 1.105.342.782,00	$ 7.377.172,00	$ 819.332.839,00	44,36
2.3.2.02.02.008.202468001018 9.2.2102069.85970.526	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE 526	$ -	$ 1.000.000.000,00	$ -	$ -	$ 1.000.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000.000,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P**													
2.3.2.02.02.008.202468001019 2.2.2102069.85999.226	OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 226	$ 500.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 500.000.000,00	$ 500.000.000,00	$ 401.833.333,33	$ 315.389.999,99	$ 273.489.999,99	$ -	$ 98.166.666,67	$ 86.443.333,34	80,36
2.3.2.02.02.008.202468001019 2.2.2102069.85999.526	OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 526	$ -	$ 250.000.000,00	$ -	$ -	$ 250.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 250.000.000,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES N C P**													
2.3.2.02.02.008.202468001019 2.2.2102069.8714199.226	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE VEHICULOS AUTOMOTORES N.C.P.226	$ 80.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 80.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 80.000.000,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.008.202468001019 2.2.2102069.8714199.526	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES N C P 526	$ -	$ 40.000.000,00	$ -	$ -	$ 40.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 40.000.000,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE BATERIAS Y ACUMULADORES ELECTRICOS.**													
2.3.2.02.02.008.202468001019 2.2.2102069.8715204.226	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BATERIAS Y ACUMULADORES ELECTRICOS 226	$ 10.000.000,00	$ -	$ -	$ 10.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.008.202468001019 2.2.2102069.8715204.526	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BATERIAS Y ACUMULADORES ELECTRICOS 526	$ -	$ 5.000.000,00	$ -	$ -	$ 5.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.000.000,00	$ -	$ -	0

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES							TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	% Ejecucion
		Presupuesto Inicial	Adicion	Credito	Contracredito	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	Obligaciones	Pagos Acumulados				
		$ 1,00				3 = 1 + 2	$ 5,00	$ 7,00		$ 9,00	10 = 3 - 5	11 = 5 - 7	12 = 7 - 9	13 = 7 / 3
RUBRO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION.													
2.3.2.02.02.008.20246800101899.2.2102069.8715205.226	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION 226	$ 16.200.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 16.200.000.000,00	$ 8.208.375.139,93	$ 8.208.375.139,18	$ 882.081.081,60	$ 882.081.081,60	$ 7.991.624.860,07	$ 0,75	$ 7.326.294.057,58	50,66
2.3.2.02.02.008.20246800101899.2.2102069.8715205.526	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION 526	$ -	$ 8.727.803.360,64	$ -	$ -	$ 8.727.803.360,64	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.727.803.360,64	$ -	$ -	0
RUBRO	SERVICIOS DE SOPORTE EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TI													
2.3.2.02.02.008.20246800102055.2.2106033.83132.526	SERVICIOS DE SOPORTE EN TECNOLOGAS DE LA INFORMACION TI 526	$ 500.000.000,00	$ 1.133.400.344,62	$ -	$ -	$ 1.633.400.344,62	$ 315.884.890,08	$ -	$ -	$ -	$ 1.317.515.454,54	$ 315.884.890,08	$ -	0
	SECTOR													
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS													
	ADQUISICION DE SERVICIOS													
	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION													
RUBRO	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO													
2.3.2.02.02.005.20250000002018 1.2.4002020.53270.201	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 201	$ 391.948.179,00	$ -	$ -	$ -	$ 391.948.179,00	$ 391.948.179,00	$ 391.948.179,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 391.948.179,00	100
RUBRO	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES													
2.3.2.02.02.005.20250000003597.2.4301011.53129.201	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 201	$ 822.718.839,00	$ -	$ -	$ -	$ 822.718.839,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 822.718.839,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20250000003597.2.4301011.53129.248	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 248	$ 675.641.031,00	$ -	$ -	$ -	$ 675.641.031,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 675.641.031,00	$ -	$ -	0
RUBRO	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS													
2.3.2.02.02.005.20250000003593.2.2402044.53221.201	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS 201	$ 2.753.698.467,00	$ -	$ -	$ 1.855.619.287,00	$ 898.079.180,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 898.079.180,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20250000003593.2.2402044.53221.501	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS 501	$ 131.761.475,00	$ -	$ -	$ -	$ 131.761.475,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 131.761.475,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20250000003678.2.2402044.53221.251	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS 251	$ 2.587.514.235,00	$ -	$ -	$ 1.664.012.468,00	$ 923.501.767,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 923.501.767,00	$ -	$ -	0
RUBRO	OTROS SERVICIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS													
2.3.2.02.02.005.20250000003966.2.4002021.54619.226	OTROS SERVICIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS 226	$ 3.000.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.000.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000.000.000,00	$ -	$ -	0
2.3.2.02.02.005.20250000003687.2.4002021.54619.226	OTROS SERVICIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS 226	$ 2.500.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.500.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.500.000.000,00	$ -	$ -	0
RUBRO	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES													
2.3.2.02.02.005.20250000003821.2.4502007.53129.588	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 588	$ 1.351.924.318,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.351.924.318,00	$ 1.338.504.567,00	$ -	$ -	$ -	$ 13.419.751,00	$ 1.338.504.567,00	$ -	0
	MATERIALES Y SUMINISTROS													
	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO													
RUBRO	GRUAS DE LEVANTAMIENTO													
2.3.2.01.01.003.01.05.2024680010192.2.2102069.4352001.526	GRUAS DE LEVANTAMIENTO 526	$ -	$ 1.600.000.000,00	$ -	$ -	$ 1.600.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.600.000.000,00	$ -	$ -	0
	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO													
RUBRO	MUEBLES METALICOS N C P PARA OFICINA													
2.3.2.01.01.004.01.01.02.2024680010192.2.2102069.3812199.526	MUEBLES METALICOS N C P PARA OFICINA 526	$ -	$ 6.370.000.000,00	$ -	$ 5.140.822.215,00	$ 1.229.177.785,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.229.177.785,00	$ -	$ -	0
RUBRO	CAMIONETAS													
2.3.2.01.01.004.20246800101922.2.2102069.4911401.526	CAMIONETAS 526	$ -	$ 500.000.000,00	$ -	$ -	$ 500.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 500.000.000,00	$ -	$ -	0
RUBRO	MÁQUINAS PORTÁTILES DE PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO DE DATOS QUE NO PESEN MÁS DE 10 KG, COMO COMPUTADORES PORTÁTILES (LAPTOP Y NOTEBOOK)													

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES							TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	% Ejecucion
		Presupuesto Inicial	Adicion	Credito	Contracredito	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	Obligaciones	Pagos Acumulados				
		$ 1,00				3 = 1 + 2	$ 5,00	$ 7,00		$ 9,00	10 = 3 - 5	11 = 5 - 7	12 = 7 - 9	13 = 7 / 3
2.3.2.02.01.004.202468001019 2.2.2102069.45221.526	MAQUINAS PORTATILES DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS QUE NO PESEN MAS DE 10 KG COMO COMPUTADORES PORTATILES LAPTOP Y NOTEBOOK 526	$ -	$ 10.000.000,00	$ -	$ -	$ 10.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.000.000,00	$ -	$ -	0
RUBRO	**MAQUINAS DE PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO DE DATOS, QUE CONTENGAN UNA CAJA Y AL MENOS UNA UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU) Y UNA UNIDAD DE ENTRADA Y DE SALIDA, ESTÉN COMBINADOS O NO**													
2.3.2.02.01.004.202468001019 2.2.2102069.45230.526	MAQUINAS DE PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO DE DATOS, QUE CONTENGAN UNA CAJA Y AL MENOS UNA UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU) Y UNA UNIDAD DE ENTRADA Y DE SALIDA, ESTÉN COMBINADOS O NO 526	$ -	$ 20.000.000,00	$ -	$ -	$ 20.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.000.000,00	$ -	$ -	0
	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA													
RUBRO	**COMERCIO AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONESTRUCCION Y FERRETERIA, PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO 226**													
2.3.2.02.01.006.202468001019 2.2.2102069.62560.226	COMERCIO AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATA 226	$ -	$ -	$ 170.000.000,00	$ -	$ 170.000.000,00	$ 170.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 170.000.000,00	$ -	0
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS													
	DISMINUCION DE PASIVOS													
	FINANCIACION DE DEFICIT FISCAL													
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS													
RUBRO	**INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO**													
2.3.7.06.02.202600000011719. 2.4599002.53270.501	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 501	$ -	$ 420.000.000,00	$ -	$ -	$ 420.000.000,00	$ 420.000.000,00	$ 420.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 420.000.000,00	100
RUBRO	**SERVICIOS DE PROTECCION (GUARDAS DE SEGURIDAD)**													
2.3.7.06.02.202600000011719. 2.4599002.85250.526	SERVICIOS DE PROTECCION GUARDAS DE SEGURIDAD 526	$ -	$ 0,60	$ -	$ -	$ 0,60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0,60	$ -	$ -	0
RUBRO	**OTROS SERVICIOS DE APOYO N.C.P.**													
2.3.7.06.02.202600000011719. 2.4599002.85999.526	OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 526	$ -	$ 83.333,33	$ -	$ -	$ 83.333,33	$ 83.333,33	$ 83.333,33	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 83.333,33	100
RUBRO	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION.**													
2.3.7.06.02.202600000011719. 2.4599002.8715205.526	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION 526	$ -	$ 694.547.116,59	$ -	$ -	$ 694.547.116,59	$ 694.547.116,59	$ 694.547.116,59	$ 99.151.912,43	$ 99.151.912,43	$ -	$ -	$ 595.395.204,16	100
RUBRO	**OTROS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIN PBLICA N.C.P.**													
2.3.7.06.02.202600000011719. 2.4599002.91119.526	OTROS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA N C P 526	$ -	$ 1.473.595.524,26	$ -	$ -	$ 1.473.595.524,26	$ 1.473.595.524,26	$ 1.473.595.524,26	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.473.595.524,26	100
RUBRO	**SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIN PBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PBLICOS**													
2.3.7.06.02.202600000011719. 2.4599002.91123.526	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 526	$ -	$ 3.144.989.848,18	$ -	$ -	$ 3.144.989.848,18	$ 3.144.989.848,17	$ 3.144.989.848,17	$ -	$ -	$ 0,01	$ -	$ 3.144.989.848,17	99,99
RUBRO	**PAPEL BOND**													
2.3.7.06.02.202600000011719. 2.4599002.3212801.526	PAPEL BOND 526	$ -	$ 5.996.886,00	$ -	$ -	$ 5.996.886,00	$ 5.996.886,00	$ 5.996.886,00	$ 5.996.886,00	$ 5.996.886,00	$ -	$ -	$ -	100
RUBRO	**SERVICIOS DE SOPORTE EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI)**													
2.3.7.06.02.202600000011719. 2.4599002.83132.526	SERVICIOS DE SOPORTE EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TI 526	$ -	$ 25.023.612,00	$ -	$ -	$ 25.023.612,00	$ 25.023.612,00	$ 25.023.612,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25.023.612,00	100

Rubro	Descripcion Rubro	MODIFICACIONES							TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	% Ejecucion
		Presupuesto Inicial	Adicion	Credito	Contracredito	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	Obligaciones	Pagos Acumulados				
		$ 1,00				3 = 1 + 2	$ 5,00	$ 7,00		$ 9,00	10 = 3 - 5	11 = 5 - 7	12 = 7 - 9	13 = 7 / 3
RUBRO	**SERVICIOS DE INGENIERÍA EN PROYECTOS ENERGÉTICOS**													
2.3.7.06.02.202500000028264.2.2102008.83324.513	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS ENERGETICOS 513	$ -	$ 1.250.000.000,00	$ -	$ 1.250.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0
RUBRO	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS DE ILUMINACIÓN**													
2.3.7.06.02.202600000011719.2.4599002.8715205.526	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION 526	$ -	$ 36.720.720,76	$ -	$ -	$ 36.720.720,76	$ 36.720.720,76	$ 36.720.720,76	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 36.720.720,76	100
RUBRO	**SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE EQUIPO DE ILUMINACIÓN ELÉCTRICA**													
2.3.7.06.02.202600000011719.2.4599002.88756.501	SERVICIOS DE FABRICACION DE EQUIPO DE ILUMINACION ELECTRICA 501	$ -	$ 689.885.166,86	$ -	$ -	$ 689.885.166,86	$ 689.885.166,86	$ 689.885.166,86	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 689.885.166,86	100

RELACION GASTOS DE INVERSION A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
7564	1/07/2026 10:57		890200162	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA AMB S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 307.248.016,00	2.3.3.01.02.004.01.2025000 00035595.1.4003047.91123 .215 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 307.248.016,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL MES DE FEBRERO DE 2026 SEGUN FACTURA NO. 0006621 $ 307.248.016,00 TOTAL $ 307.248.016,00-ACUEDUCTO METROPOLITANO
7565	1/07/2026 10:58		890200162	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA AMB S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 1.105.845.688,00	2.3.3.01.02.004.01.2025000 00035595.1.4003047.91123 .331 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 1.105.845.688,00	VALOR APORTES SIN SITUACION DE FONDOS- SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO DEL MES FEBRERO DE 2026 SEGÚN BALANCE Y CONTRIBUCIONES $ 1.105.845.688,00 VALOR TOTAL DE APORTES SSF $ 1.105.845.688,00 - ACUEDUCTO
7566	1/07/2026 10:59		900028989	LIMPIEZA URBANA S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 27.490.762,00	2.3.3.01.04.004.03.2025000 00035595.1.4003047.91123 .215 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 27.490.762,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES DE ABRIL DE 2026 SEGÚN FACTURA NO. FEVE-1012 $ 27.490.762,00 VALOR TOTAL $ 27.490.762,00 LIMPIEZA URBANA
7567	1/07/2026 10:59		900028989	LIMPIEZA URBANA S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 86.140.046,00	2.3.3.01.04.004.03.2025000 00035595.1.4003047.91123 .332 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 86.140.046,00	VALOR APORTES SIN SITUACION DE FONDOS- SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES ABRIL DE 2026 SEGÚN BALANCE Y CONTRIBUCIONES $ 86.140.046,00 VALOR TOTAL DE APORTES SSF $ 86.140.046,00 - LIMPIEZA URBANA
7568	1/07/2026 11:12		900221459	PROMOTORA ENERGETICA DEL CENTRO S.A.S. E.S.P.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 1.250.000.000,00	2.3.7.06.02.2026000000117 19.2.4599002.83324.513 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS ENERGETICOS 513	$ 1.250.000.000,00	"REALIZAR EL ESTUDIO TÉCNICO DE REFERENCIA DE DETERMINACIÓN DE COSTOS, OPTIMIZAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y PUESTA EN MARCHA DEL ESQUEMA DE OPERACIÓN PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA."
7579	1/07/2026 14:03		890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 4.192.383,00	2.3.2.02.02.006.202468001 0192.2.2102069.69112.226 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD POR CUENTA PROPIA 226	$ 4.192.383,00	ENERGIA - ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 14/05/2026 AL 12/06/2026- 31 SEGÚN FACTURA 249673939 NUMERO DE CUENTA 32675.
7621	2/07/2026 15:49	112	902071009	CONSORCIO VIAL DIAMANTE II GR 2026	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 2.416.418.960,00	2.3.2.02.02.005.202500000 027207.2.2402114.53211.2 51 - CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 251	$ 2.072.321.070,00	CONSTRUCCIÓN DE LA CONEXIÓN VIAL CARRERA 24 CON ACCESO AL BARRIO DIAMANTE II DE LA ALCALDIA DE BUCARAMANGA, SANTANDER
7621	2/07/2026 15:49	112	902071009	CONSORCIO VIAL DIAMANTE II GR 2026	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ -	2.3.2.02.02.005.202500000 027207.2.2402114.53211.2 13 - CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 213	$ 344.097.890,00	CONSTRUCCIÓN DE LA CONEXIÓN VIAL CARRERA 24 CON ACCESO AL BARRIO DIAMANTE II DE LA ALCALDIA DE BUCARAMANGA, SANTANDER

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
7622	2/07/2026 15:51	118	902078224	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA DIAMANTE 2026	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 421.198.582,00	2.3.2.02.02.005.20250000027207.2.2402114.53211.251 - CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 251	$ 421.198.582,00	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SST-MA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CONEXIÓN VIAL CARRERA 24 CON ACCESO AL BARRIO DIAMANTE II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
7625	2/07/2026 16:19	113	902071493	CONSORCIO ESPACIO PUBLICO BGA 2026	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 10.835.829.108,00	2.3.2.02.02.005.20250000031111.2.4002022.85970.213 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE 213	$ 10.835.829.108,00	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
7626	3/07/2026 10:39		900115931	EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S A ESP EMPAS S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 220.500.702,00	2.3.3.01.02.004.02.20250000035595.1.4003047.91123.515 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 528	$ 220.500.702,00	PAGO DE SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL MES NOVIEMBRE DE 2025 SEGÚN FACTURA NO. 00000982 $ 108.096.175,00 Y MES DE DICIEMBRE DE 2025 SEGÚN FACTURA NO. 000001581 $ 112.404.527,00 VALOR TOTAL $ 220.500.702,00 - EMPAS
7906	8/07/2026 15:42	2850	79845287	JOSE LUIS MORALES CASTRO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 37.100.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501	$ 37.100.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO CON POSGRADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
7907	8/07/2026 15:42	2849	1067730069	CRISTIAN ALEXANDER TRUJILLO OLIVEROS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 27.500.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501	$ 27.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACION PUBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
7937	9/07/2026 11:44	2846	1098778316	PAULA MELISSA CASTRILLON MILLAN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 27.500.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.82120.251 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 251	$ 27.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACION PUBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
7977	10/07/2026 8:03	2858	63561837	DEICY VIVIANA ARDILA CARDENAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 29.150.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501	$ 29.150.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS ESPECIALIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CALIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE INFRAESTRUCTURA .
7978	10/07/2026 8:03	2857	1032499497	JUAN FELIPE QUIROGA MENDEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 37.100.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501	$ 650.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL CON POSGRADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
7978	10/07/2026 8:03	2857	1032499497	JUAN FELIPE QUIROGA MENDEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ -	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501	$ 36.450.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL CON POSGRADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
7979	10/07/2026 8:54	129	804006674	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S A E S P	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 16.334.630.707,00	2.3.2.02.02.008.20246800100046.2.4002026.85970.501 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE 501	$ 16.334.630.707,00	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A E.S.P PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SIEMBRA, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES UBICADAS EN EL ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
7980	10/07/2026 9:20	128	902081065	UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA PARQUES 2026	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 1.400.763.506,00	2.3.2.02.02.005.20250000031111.2.4002022.85970.213 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE 213	$ 1.400.763.506,00	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA OBRA PUBLICA DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
8036	14/07/2026 8:11	2860	1095803147	ANYELIZ EDILCE DIAZ TUESTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 21.200.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501	$ 21.200.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TECNICO PARA FORTALECER EL AREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
8037	14/07/2026 8:12	2863	1030576573	MALORY HURTADO GOMEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 29.150.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501	$ 29.150.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFREASTRUCTURA
8098	15/07/2026 15:44		900115931	EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S A ESP EMPAS S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 103.776.289,00	2.3.3.01.02.004.02.20250000035595.1.4003047.91123.515 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 528	$ 103.776.289,00	PAGO DE SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL MES ENERO DE 2026 SEGÚN FACTURA NO. 00002468 $ 103.776.289,00 VALOR TOTAL $ 103.776.289,00 - EMPAS
8099	15/07/2026 15:45		900115931	EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S A ESP EMPAS S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 771.451.667,00	2.3.3.01.02.004.02.20250000035595.1.4003047.91123.333 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 771.451.667,00	VALOR APORTES SIN SITUACION DE FONDOS- SUBSIDIOS DE ALCANTARILLADO DEL MES ENERO DE 2026 SEGÚN BALANCE Y CONTRIBUCIONES $ 771.451.667,00 VALOR TOTAL DE APORTES SSF $ 771.451.667,00 -EMPAS
8120	16/07/2026 12:12	342	900232348	JALGAVI INGENIEROS SAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 140.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100189.2.2102069.85970.226 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE 226	$ 140.000.000,00	OTROSI NO. 02 EN ADICION, PRORROGA AL CONTRATO NO. 342 DEL 16/12/2025 ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y JALGAVI S.A.S.CUYO OBJETO ES MMANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA –LOTE 03 (COMUNAS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 Y CORREGIMIENTOS 1,2,3)

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
8121	16/07/2026 12:13	341	902009210	CONSORCIO EYC1 2025	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 1.300.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800101 89.2.2102069.8715205.226 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION 226	$ 1.300.000.000,00	OTROSI NO. 02 EN ADICION, PRORROGA Y MODIFICACION AL CONTRATO NO. 341 DEL 16/12/2025 ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y CONSORCIO EYC1 2025 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – LOTE 01 (COMUNAS 1,2,3,4,13,14,15 Y CORREGIMIENTOS 1 Y 2) Y LOTE 02 (COMUNAS 5,6,7,8,9,10,11,12,16,17 Y CORREGIMIENTOS 3)
8122	16/07/2026 12:14	341	902009210	CONSORCIO EYC1 2025	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 2.962.543.204,00	2.3.2.02.02.008.20246800101 89.2.2102069.8715205.226 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION 226	$ 2.962.543.204,00	OTROSI NO. 02 EN ADICION, PRORROGA Y MODIFICACION AL CONTRATO NO. 341 DEL 16/12/2025 ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y CONSORCIO EYC1 2025 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – LOTE 01 (COMUNAS 1,2,3,4,13,14,15 Y CORREGIMIENTOS 1 Y 2) Y LOTE 02 (COMUNAS 5,6,7,8,9,10,11,12,16,17 Y CORREGIMIENTOS 3)
8123	16/07/2026 12:15	342	900232348	JALGAVI INGENIEROS SAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 495.876.168,00	2.3.2.02.02.008.20246800101 89.2.2102069.85970.226 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE 226	$ 495.876.168,00	OTROSI NO. 02 EN ADICION, PRORROGA AL CONTRATO NO. 342 DEL 16/12/2025 ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y JALGAVI S.A.S.CUYO OBJETO ES MMANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA –LOTE 03 (COMUNAS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 Y CORREGIMIENTOS 1,2,3)
8175	16/07/2026 17:16	33	890501510	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 1.256.965.541,25	2.3.2.02.02.008.20246800101 89.2.2102069.8715205.226 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION 226	$ 1.256.965.541,25	OTROSI NO. 01 EN ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO NO. 033 DEL 30/01/2026 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. - LOTE I, II Y III", SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.
8235	17/07/2026 16:02	1298	1098770229	LAURA MELISSA ESPINOSA RAMIREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 8.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100 49.2.4599031.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 8.000.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 1298 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
8236	17/07/2026 16:06	1618	1091666950	LEIDY PEÑA FLOREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 10.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100 49.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501	$ 3.300.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 1618 DE 2026 - CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
8236	17/07/2026 16:06	1618	1091666950	LEIDY PEÑA FLOREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ -	2.3.2.02.02.008.20246800100 49.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501	$ 6.700.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 1618 DE 2026 - CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
8237	17/07/2026 16:07	1241	91356684	JONATHAN CAPACHO SILVA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 1.400.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.85999.201 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 201	$ 1.400.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 1241 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
8240	17/07/2026 16:10	1227	1065875905	JOSE CAMILO ROCHA GUZMAN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 4.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.82120.251 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 251	$ 4.000.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 1227 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
8241	17/07/2026 16:11	1068	91260789	JAIRO ESPINOSA MORENO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 1.300.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.85999.201 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 201	$ 1.300.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 1068 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA”
8307	22/07/2026 11:46		890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 1.321.127.832,00	2.3.2.02.02.006.20246800100192.2.2102069.69112.226 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD POR CUENTA PROPIA 226	$ 1.321.127.832,00	ENERGIA - ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/06/2026- 30/06 /2026 SEGÚN FACTURA 250006662 NUMERO DE CUENTA 1075933.
8315	22/07/2026 15:47	1806	1007193755	JUREINNY DAYANNA LUNA RUEDA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 13.500.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501	$ 13.500.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 1806 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
8336	22/07/2026 16:43	2224	91221194	GERARDO ALFONSO ARDILA FRANCO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 6.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501	$ 6.000.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 2224 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
8439	24/07/2026 15:24		800153993	COMCEL S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 3.641.288,47	2.3.2.02.02.008.20246800100192.2.2102069.84120.226 - SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA ACCESO 226	$ 3.641.288,47	PLAN DE DATOS DE TELEMEDIDA, TELEGESTION Y PLATAFORMA TECNOLOGICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CONSUMO DEL 20 DE MAYO DE 2026 AL 19 DE JUNIO DE 2026 POR VALOR DE $3.641.288.47 SEGÚN FACTURA DE CLARO NO. E6074412293 REFERENCIA 8221383845. FECHA LIMITE 05 DE JULIO 2026
8440	24/07/2026 15:24		830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P BIC	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 85.019.919,25	2.3.2.02.02.008.20246800100192.2.2102069.84120.226 - SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA ACCESO 226	$ 85.019.919,25	SERVICIO DE TELEFONIACONSUMO DE INTERNET-PROTECION 3 MULTIDISPOSITIVOS-UCAAS-WEBEX CALLING-RPVIP ACKUP DISCO - CUENTA # 010 PERIODO FACTURADO 01 AL 30 DE ABRIL 2026.$28,339,972.91 DEL 01 AL 30 DE MAYO $ 56.679.946.08 DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026 POR VALOR DE $85.019.919.25 REFERECIA # 181185077.
8536	28/07/2026 12:56		830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P BIC	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 11.392.618,00	2.3.2.02.02.008.20246800100192.2.2102069.84120.226 - SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA ACCESO 226	$ 11.392.618,00	SERVICIO DE TELEFONIA CONSUMO DE BACKUP EN DISCO DS-02973567 CONSUMO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2026 CUENTA # 17 REFERENCIA # 181195417.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
8537	28/07/2026 12:56		800153993	COMCEL S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 799.685,38	2.3.2.02.02.008.20246800101 92.2.2102069.84120.226 - SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA ACCESO 226	$ 799.685,38	SERVICIO DE TELEFONIACONSUMO DE DATOS. REFERECIA # 8221401343. FACTURA ELECTRONICA E6080444100. CUENTA DOBLE CONSUMO DEL 04 DE MAYO AL 03 DE JUNIO $399,842,69 Y LA CUENTA DL 04 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2026 $399,842,69
8538	28/07/2026 12:57		890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 4.397.824,00	2.3.2.02.02.006.20246800101 92.2.2102069.69112.226 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD POR CUENTA PROPIA 226	$ 4.397.824,00	ENERGIA - ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 13/06/2026 AL 14/07/2026- 31 SEGÚN FACTURA 250884893 NUMERO DE CUENTA 32675.
8634	29/07/2026 8:27	2923	63551864	ASTRID ALIETA QUINTERO VELASCO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 30.550.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100 49.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501	$ 30.550.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR APOYO TECNICO, A LA SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
8786	31/07/2026 16:53		901772778	CONSORCIO ALUMBRADO NLC	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 65.773.277,51	2.3.7.06.02.20260000001171 9.2.4599002.91123.526 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 526	$ 65.773.277,51	INTERVENTORIA A LA MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 - FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. LOTE 3
8787	31/07/2026 16:54		14204110	ESNORALDO MUÑOZ PATIÑO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 89.780.031,95	2.3.7.06.02.20260000001171 9.2.4599002.91123.526 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 526	$ 89.780.031,95	INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
8788	31/07/2026 16:56		901514835	CONSORCIO COPRINCEL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 204.094.038,66	2.3.7.06.02.20260000001171 9.2.4599002.91123.526 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 526	$ 204.094.038,66	MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO N 01
8789	31/07/2026 16:57		901774294	CONSORCIO ILUMINAR BGA R	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.646.901,20	2.3.7.06.02.20260000001171 9.2.4599002.91123.526 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 526	$ 12.646.901,20	MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO VIAS M2 FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE 2

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
8790	31/07/2026 16:58		900930834	SOLUCIONES ELECTRICAS DE COLOMBIA S.A.S	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 61.857.894,44	2.3.7.06.02.2026000000117 19.2.4599002.91123.526 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 526	$ 61.857.894,44	MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS BULEVAR BOLIVAR BULEVAR SANTANDER CALLE 56 FASE 1 CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER LOTE 5
8791	31/07/2026 16:58		901661891	CONSORCIO ALUMBRADO PBFAO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 420.000.000,00	2.3.7.06.02.2026000000117 19.2.4599002.53270.501 - INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 501	$ 420.000.000,00	MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS BULEVAR BOLIVAR BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER LOTE 2
8792	31/07/2026 16:59		890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 215.719.075,72	2.3.7.06.02.2026000000117 19.2.4599002.88756.501 - SERVICIOS DE FABRICACION DE EQUIPO DE ILUMINACION ELECTRICA 501	$ 215.719.075,72	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P., PARA LA IMPLEMENTACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO 2022 EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
8793	31/07/2026 17:00		890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 474.166.091,14	2.3.7.06.02.2026000000117 19.2.4599002.88756.501 - SERVICIOS DE FABRICACION DE EQUIPO DE ILUMINACION ELECTRICA 501	$ 474.166.091,14	ANUDAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P PARA LA IMPLEMENTACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO 2023 EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
8794	31/07/2026 17:01		805023598	COMISIONISTAS FINANCIEROS AGROPECUARIOS S.A.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 1.473.595.524,26	2.3.7.06.02.2026000000117 19.2.4599002.91119.526 - OTROS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA N C P 526	$ 1.473.595.524,26	DESARROLLAR LA PRIMERA FASE PARA LA ADQUISICION, SUMINISTRO, IMPLEMENTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PUNTOS DE GESTION INTELIGENTE Y MEDIDAS PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
8795	31/07/2026 17:01		900506002	WILMAN MORALES REY PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S A S	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 25.023.612,00	2.3.7.06.02.2026000000117 19.2.4599002.83132.526 - SERVICIOS DE SOPORTE EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TI 526	$ 25.023.612,00	VERIFICAR LAS MEDIDAS DE VARIABLES ELECTRICAS QUE REALIZA EL DISPOSITIVO FOTOCONTROL CIMCON ISLC 3100 7P C CUYA CARGA SON LAS DISTINTAS LUMINARIAS QUE SE HAN SELECCIONADO PRODUCTO DEL ANALISIS Y ESPACIO MUESTRAL DE ACUERDO CON LA NORMA ISO NO 2859 1 1999 PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO PARA INSPECCION DE ATRIBUTOS
8796	31/07/2026 17:02		860041968	COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 36.720.720,76	2.3.7.06.02.2026000000117 19.2.4599002.8715205.526 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION 526	$ 36.720.720,76	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - GRUPO 2.
8797	31/07/2026 17:02		1098655902	SERGIO PICO RODRIGUEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 83.333,33	2.3.7.06.02.2026000000117 19.2.4599002.85999.526 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 526	$ 83.333,33	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE MIGRACION COLOMBIA REGIONAL ORIENTE.
8819	3/08/2026 9:09		804006674	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S A E S P	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 481.965.702,00	2.3.3.01.02.004.03.2025000 00035595.1.4003047.91123 .215 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 481.965.702,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES MAYO DE 2026 SEGÚN FACTURA NO. ES 394 $ 481.965.702,00 VALOR TOTAL $ 481.965.702,00 - EMAB

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
8820	3/08/2026 9:09		804006674	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S A E S P	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 814.968.881,00	2.3.3.01.02.004.03.2025000 00035595.1.4003047.91123 .332 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 814.968.881,00	VALOR APORTES SIN SITUACION DE FONDOS- SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES MAYO DE 2026 SEGÚN BALANCE Y CONTRIBUCIONES $ 814.968.881,00 VALOR TOTAL DE APORTES SSF $ 814.968.881,00 - EMAB
8941	4/08/2026 8:19	3042	52432386	FLOR PATRICIA OQUENDO PATIÑO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 32.900.000,00	2.3.2.02.02.008.202468001 0049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501	$ 32.900.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR APOYO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE GESTION A LA SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
8942	4/08/2026 10:04		890200162	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA AMB S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 335.995.324,00	2.3.3.01.02.004.01.2025000 00035595.1.4003047.91123 .215 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 335.995.324,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL MES DE MARZO DE 2026 SEGUN FACTURA NO. 0006646 $ 335.995.324,00 TOTAL $ 335.995.324,00-ACUEDUCTO METROPOLITANO
8943	4/08/2026 10:04		890200162	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA AMB S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 1.099.741.315,00	2.3.3.01.02.004.01.2025000 00035595.1.4003047.91123 .331 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 1.099.741.315,00	VALOR APORTES SIN SITUACION DE FONDOS- SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO DEL MES MARZO DE 2026 SEGÚN BALANCE Y CONTRIBUCIONES $ 1.099.741.315,00 VALOR TOTAL DE APORTES SSF $ 1.099.741.315,00 - ACUEDUCTO
8944	4/08/2026 10:05		900115931	EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S A ESP EMPAS S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 76.176.689,00	2.3.3.01.02.004.02.2025000 00035595.1.4003047.91123 .515 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 528	$ 76.176.689,00	PAGO DE SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL MES FEBRERO DE 2026 SEGÚN FACTURA NO. 00002979 $ 76.176.689,00 VALOR TOTAL $ 76.176.689,00 - EMPAS
8945	4/08/2026 10:05		900115931	EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S A ESP EMPAS S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 740.907.709,00	2.3.3.01.02.004.02.2025000 00035595.1.4003047.91123 .333 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 740.907.709,00	VALOR APORTES SIN SITUACION DE FONDOS- SUBSIDIOS DE ALCANTARILLADO DEL MES FEBRERO DE 2026 SEGÚN BALANCE Y CONTRIBUCIONES $ 740.907.709,00 VALOR TOTAL DE APORTES SSF $ 740.907.709,00 -EMPAS
8988	5/08/2026 8:32	3075	1098731124	LINDA KAREM CHIA MACHUCA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 26.400.000,00	2.3.2.02.02.008.202468001 0049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 26.400.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO, PARA APOYAR Y FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS JURIDICOS, ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTUALES QUE ADELANTE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
8989	5/08/2026 8:33	3077	91488348	HAROLD ANDRES NIÑO VARGAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 22.500.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 22.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
8990	5/08/2026 8:34	3076	37748334	KERLLY LUCERO TOLOZA PRADA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 27.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 27.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES PRESUPUESTALES RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
9066	6/08/2026 9:34	3110	74374860	MANUEL SAUL JAIMES BARRERA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 17.860.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 17.860.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
9067	6/08/2026 9:40	3111	1098675528	LICET MARCELA BOLIVAR SANDOVAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 25.300.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 25.300.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
9068	6/08/2026 9:41	3109	1005220958	ANDRES FERNANDO MORA NIÑO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 22.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 22.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN TODAS LAS ETAPAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
9069	6/08/2026 9:42	3078	1005309562	PAOLA ANDREA MORENO CEPEDA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 22.500.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 22.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS DE GESTION PREDIAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
9104	6/08/2026 14:45		830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P BIC	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 11.392.617,73	2.3.2.02.02.008.20246800100192.2.2102069.84120.226 - SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA ACCESO 226	$ 11.392.617,73	SERVICIO DE TELEFONIA CONSUMO DE BACKUP EN DISCO DS-02973567 CONSUMO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE JULIO 2026 CUENTA # 17 REFERENCIA # 181195417. FACTURA # 580831494096
9105	6/08/2026 14:45		830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P BIC	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 28.339.973,17	2.3.2.02.02.008.20246800100192.2.2102069.84120.226 - SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA ACCESO 226	$ 28.339.973,17	SERVICIO DE TELEFONIACONSUMO DE INTERNET-PROTECION 3 MULTIDISPOSITIVOS-UCAAS-WEBEX CALLING-RPVIP ACKUP DISCO - CUENTA # 010 PERIODO FACTURADO 01 AL 30 DE JULIO 2026 REFERECIA # 181185077. FRA # 580831492126
9106	6/08/2026 14:45		800153993	COMCEL S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 3.641.288,47	2.3.2.02.02.008.20246800100192.2.2102069.84120.226 - SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA ACCESO 226	$ 3.641.288,47	PLAN DE DATOS DE TELEMEDIDA, TELEGESTION Y PLATAFORMA TECNOLOGICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CONSUMO DEL 20 DE JUNIO DE 2026 AL 19 DE JULIO DE 2026 POR VALOR DE $3.641.288.47 SEGÚN FACTURA DE CLARO NO. E6086448865 REFERENCIA 8221383845. FECHA LIMITE INMEDIATO, LA FRA LLEGO DOBLE EL MES ANTERIOR YA SE CANCELO EL2 29/07/2026 CE. 2607004139 POR VR $3,641,288,47

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
9182	10/08/2026 8:52	3149	13870340	IVAN FRANCISCO RAMIREZ GALVIS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 24.200.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 24.200.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRONICO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
9183	10/08/2026 8:53	3150	1098731880	CRISTIAN JAHIR PORTILLA PITA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 17.600.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 17.600.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
9184	10/08/2026 8:54	3128	1098704007	JHON ALEXANDER FIGUEREDO FORERO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 19.800.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 19.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
9185	10/08/2026 8:56	3139	1093785299	CRISTHIAN JAVIER PARADA GARCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 22.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 22.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
9186	10/08/2026 8:57	3140	63365736	LEONOR SINUCO ROJAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 17.600.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 17.600.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA FORTALECER LOS PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARMANGA
9187	10/08/2026 8:58	3142	1095909980	STEVE JOSE VILLABONA BLANCO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 17.600.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 17.600.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE DEFENSA JUDICIAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
9188	10/08/2026 8:58	3138	1098684410	YURY BAYONA HERNANDEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 17.600.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 17.600.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO COMO TECNÓLOGO EN CONTABILIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
9189	10/08/2026 8:59	3126	1098694658	DIEGO FABIAN PATIÑO TRUJILLO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 15.400.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 15.400.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE MAQUINARIA AMARILLA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
9190	10/08/2026 8:59	3119	1095906099	MARIA ANDREA ARENAS SANCHEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 13.200.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 13.200.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
9191	10/08/2026 9:00	3118	64680134	KATY TANIA NAVARRO NAVARRO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 19.800.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 19.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
9192	10/08/2026 9:02	3172	1005335946	CAMILA ANDREA PIÑERES SOLANO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 19.800.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 19.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GEÓLOGO PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE EJECUTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
9193	10/08/2026 9:03	3173	1098644337	SIDNEY ANDREA URIBE DAZA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 22.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 22.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
9194	10/08/2026 9:05	3168	1101175096	ANDRES ORLANDO RODRIGUEZ PINEDA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 24.200.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 24.200.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
9195	10/08/2026 9:05	3154	37896855	MARIA JOSE ARENAS CACERES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 17.600.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 17.600.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE DEFENSA JUDICIAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
9196	10/08/2026 9:06	3169	1096221052	MONICA MARCELA MENESES BUSTAMANTE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 17.600.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 17.600.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
9197	10/08/2026 9:07	3166	91489251	SERGIO AUGUSTO HERNANDEZ MORENO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 17.600.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 17.600.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE DEFENSA JUDICIAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
9198	10/08/2026 9:07	3152	74369912	GIOVANNI ENRIQUE MELO ZAPATA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 22.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 22.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
9199	10/08/2026 9:19	3146	91249193	GERMAN ALBERTO MORENO BREGULLA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 24.200.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 24.200.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
9248	11/08/2026 8:16	3248	1100964488	MARIA NATALIA RUGELES HORMIGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 23.650.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 23.650.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA INDUSTRIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CALIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
9249	11/08/2026 8:17	3276	1234338622	CARLOS HARVEY ROBLES ROMERO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 19.800.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 19.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
9250	11/08/2026 8:18	3269	63368336	LEDDYS SULAY ARDILA GUERRERO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 16.800.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 16.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
9251	11/08/2026 8:20	3255	1098624635	DIANA CAROLINA PEINADO TORRES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 21.500.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 21.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
9252	11/08/2026 8:21	3270	1098745797	LUPITA LARA PEREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 13.200.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 13.200.000,00	ESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
9253	11/08/2026 8:22	3235	28152315	LIZ MONICA LEON SAAVEDRA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 17.600.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 17.600.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACION PUBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
9254	11/08/2026 8:23	3230	91252141	HUGO SUAREZ MANOSALVA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 15.840.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 15.840.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA
9255	11/08/2026 8:24	3219	1098741881	YULI KATHERINE ALFONSO BECERRA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 25.800.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 25.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE DEFENSA JUDICIAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
9256	11/08/2026 8:26	3220	13874784	WILFRED EMILIO PALACIO VERANO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 30.100.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 30.100.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
9257	11/08/2026 8:27	3213	13874347	CRISTHIAN HERNANDO PAREDES CANDELA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 15.400.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 15.400.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE MINICARGADOR Y VIBROCOMPACTADOR EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
9258	11/08/2026 8:28	3212	91225519	GUILLERMO DIAZ SANDOVAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 24.200.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 24.200.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
9259	11/08/2026 8:29	3210	91264446	HENRY GONZALEZ PEREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 15.050.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 15.050.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE MAQUINARIA AMARILLA EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
9260	11/08/2026 8:29	3209	91214583	GUSTAVO LANDAZABAL ARIAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 13.200.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 13.200.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
9261	11/08/2026 8:30	3211	1098800422	RONALD SMITH MORENO LUGO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 22.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 22.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTROMECÁNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
9262	11/08/2026 8:31	3263	1101753834	ANA CATALINA GARCIA GORDILLO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 26.400.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 26.400.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTODEL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
9371	12/08/2026 10:12	3327	1098753134	SANDRA PAOLA SOLANO FLOREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 23.650.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 23.650.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GEÓLOGA PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
9372	12/08/2026 10:13	3323	13541239	WILFER OMAR VERA JAIMES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 23.100.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 23.100.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
9373	12/08/2026 10:14	3325	1096062446	JULIAN ANDRES JAIMES TORRES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501	$ 18.946.023,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
9373	12/08/2026 10:14	3325	1096062446	JULIAN ANDRES JAIMES TORRES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ -	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 1.053.977,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
9374	12/08/2026 10:15	3312	1007407057	RICHARD SANTIAGO HERNANDEZ TORRES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 24.200.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 24.200.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
9375	12/08/2026 10:16	3326	63498324	LUZ NEILA GAMBOA FRANCO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 21.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 21.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS QUE EJECUTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
9436	12/08/2026 14:58		800153993	COMCEL S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 399.842,69	2.3.2.02.02.008.20246800100192.2.2102069.84120.226 - SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA ACCESO 226	$ 399.842,69	SERVICIO DE TELEFONIACONSUMO DE DATOS. REFERECIA # 8221401343. FACTURA ELECTRONICA E6091527477. CUENTA DOBLE CONSUMO DEL 04 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2026
9437	12/08/2026 15:00		901457091	APPIANTICA S.A.S	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 325.158.907,50	2.3.7.06.02.202600000011719.2.4599002.91123.526 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 526	$ 325.158.907,50	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS CAJAS DE INSPECCION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
9438	12/08/2026 15:01		901774294	CONSORCIO ILUMINAR BGA R	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 152.417.959,10	2.3.7.06.02.202600000011719.2.4599002.91123.526 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 526	$ 152.417.959,10	AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONA RURAL - FASE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
9439	12/08/2026 15:01		810002747	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 205.076.334,35	2.3.7.06.02.202600000011719.2.4599002.91123.526 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 526	$ 205.076.334,35	INTERVENTORIA A LA MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS BULEVAR BOLIVAR Y SANTANDER CALLE 56 FASE I Y II Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER LOTE 2
9440	12/08/2026 15:02		901666929	CONSORCIO INTERURBANAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 167.263.648,30	2.3.7.06.02.202600000011719.2.4599002.91123.526 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 526	$ 167.263.648,30	INTERVENTORIA A LA MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS BULEVAR BOLIVAR Y SANTANDER CALLE 56 FASE I Y II Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER LOTE 1

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
9441	12/08/2026 15:02		901661891	CONSORCIO ALUMBRADO PBFAO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 1.187.950.675,27	2.3.7.06.02.2026000000117 19.2.4599002.91123.526 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 526	$ 1.187.950.675,27	MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS BULEVAR BOLIVAR BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER LOTE 2
9459	13/08/2026 10:07	3357	1096948322	SANDRA YENITH RAMIREZ PEÑA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 17.600.000,00	2.3.2.02.02.008.202468001 0049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 17.600.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PETRÓLEOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
9503	13/08/2026 16:18		900293868	VEOLIA ASEO BUCARAMANGA S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 15.732.661,00	2.3.3.01.04.004.03.2025000 00035595.1.4003047.91123 .215 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 15.732.661,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES DE MARZO DE 2026 SEGÚN FACTURA NO. OPE215 $ 7.935.050,00 Y ABRIL DE 2026 SEGÚN FACTURA NO. OPE217 $ 7.797.611,00 VALOR TOTAL $ 15.732.661,00 VEOLIA
9504	13/08/2026 16:19		900293868	VEOLIA ASEO BUCARAMANGA S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 123.934.818,00	2.3.3.01.04.004.03.2025000 00035595.1.4003047.91123 .332 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 123.934.818,00	VALOR APORTES SIN SITUACION DE FONDOS- SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES MARZO DE 2026 SEGÚN BALANCE Y CONTRIBUCIONES $ 61.547.966,00, MES DE ABRIL DE 2026 SEGUN BALANCE Y CONTRIBUCIONES $ 62.386.852,00 VALOR TOTAL DE APORTES SSF $ 116.450.688,00 -VEOLIA
9505	13/08/2026 16:19		900028989	LIMPIEZA URBANA S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 31.190.863,00	2.3.3.01.04.004.03.2025000 00035595.1.4003047.91123 .215 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 31.190.863,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES DE MAYO DE 2026 SEGÚN FACTURA NO. FEVE-1315 $ 31.190.863,00 VALOR TOTAL $ 31.190.863,00 LIMPIEZA URBANA
9506	13/08/2026 16:20		900028989	LIMPIEZA URBANA S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 82.764.947,00	2.3.3.01.04.004.03.2025000 00035595.1.4003047.91123 .332 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 82.764.947,00	VALOR APORTES SIN SITUACION DE FONDOS- SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES MAYO DE 2026 SEGÚN BALANCE Y CONTRIBUCIONES $ 82.764.947,00 VALOR TOTAL DE APORTES SSF $ 82.764.947,00 - LIMPIEZA URBANA
9507	13/08/2026 16:20		804006674	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S A E S P	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 444.617.210,00	2.3.3.01.02.004.03.2025000 00035595.1.4003047.91123 .215 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 444.617.210,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES JUNIO DE 2026 SEGÚN FACTURA NO. ES 395 $ 444.617.210,00 VALOR TOTAL $ 444.617.210,00 - EMAB

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
9508	13/08/2026 16:21		804006674	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S A E S P	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 816.636.933,00	2.3.3.01.02.004.03.2025000 00035595.1.4003047.91123 .332 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 816.636.933,00	VALOR APORTES SIN SITUACION DE FONDOS- SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES JUNIO DE 2026 SEGÚN BALANCE Y CONTRIBUCIONES $ 816.636.933,00 VALOR TOTAL DE APORTES SSF $ 816.636.933,00 - EMAB
9560	14/08/2026 9:58	3421	1095826327	PEDRO LUIS GARCIA AYALA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 19.350.000,00	2.3.2.02.02.008.202468001 0049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 19.350.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE GESTION DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
9622	15/08/2026 8:03	3515	1005339818	RICHARD EDUARDO TASCO PARRA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 37.840.000,00	2.3.2.02.02.008.202468001 0049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 37.840.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA COORDINAR ASUNTOS JURÍDICOS EN CONTRATACIÓN ESTATAL QUE SE ADELANTE POR COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
9650	18/08/2026 8:37	3509	1099940505	LISBETH JOHANNA VILLAMIZAR VALBUENA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.202468001 0049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 800.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA INDUSTRIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
9650	18/08/2026 8:37	3509	1099940505	LISBETH JOHANNA VILLAMIZAR VALBUENA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ -	2.3.2.02.02.008.202468001 0049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 19.200.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA INDUSTRIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
9651	18/08/2026 8:38	3508	1098741177	WENDY JULIETH SERRANO MORENO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.202468001 0049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
9652	18/08/2026 8:42	3449	13959460	OMAR GARCIA GORDILLO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 19.800.000,00	2.3.2.02.02.008.202468001 0049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 19.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO TOPÓGRAFO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
9653	18/08/2026 8:44	3505	1098784327	MARIA PAULA HERRERA NUÑEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 17.200.000,00	2.3.2.02.02.008.202468001 0049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 17.200.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
9654	18/08/2026 8:48	3500	1193127272	JESUS DAVID MARTINEZ SEPULVEDA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 16.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 16.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
9655	18/08/2026 8:50	3502	1098737645	EDGAR GEOVANNY PEREZ MARTINEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 21.500.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 21.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE DEFENSA JUDICIAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
9656	18/08/2026 8:51	3438	1087196962	MARIA FERNANDA CUERO MASIAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.900.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 12.900.000,00	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
9678	18/08/2026 16:10		900293868	VEOLIA ASEO BUCARAMANGA S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 7.522.238,00	2.3.3.01.04.004.03.20250000035595.1.4003047.91123.215 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 7.522.238,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES DE MAYO DE 2026 SEGÚN FACTURA NO. OPE227 $ 7.522.238,00 VALOR TOTAL $ 7.522.238,00 VEOLIA
9681	18/08/2026 16:45		890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 1.435.248.741,00	2.3.2.02.02.006.20246800100192.2.2102069.69112.226 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD POR CUENTA PROPIA 226	$ 1.435.248.741,00	ENERGIA - ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/07/2026- 31/07/2026 SEGÚN FACTURA 251192193 NUMERO DE CUENTA 1075933. $1,435,248,741
9707	19/08/2026 10:55		900293868	VEOLIA ASEO BUCARAMANGA S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 62.360.843,00	2.3.3.01.04.004.03.20250000035595.1.4003047.91123.332 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 62.360.843,00	VALOR APORTES SIN SITUACION DE FONDOS- SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES MAYO DE 2026 SEGÚN BALANCE Y CONTRIBUCIONES $ 62.360.843,00 VALOR TOTAL DE APORTES SSF $ 62.360.843,00 -VEOLIA
9784	20/08/2026 9:28	3641	1098633984	JOSE LUIS GONZALEZ CASTRO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 16.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 16.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
9785	20/08/2026 9:29	3634	63536471	YESENIA SUAREZ PATIÑO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 16.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 16.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRÓNICO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
9786	20/08/2026 9:30	3611	1098758792	SARA ANGELICA MOYANO GOMEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 16.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 16.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GEÓLOGA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
9787	20/08/2026 9:30	3576	1098721130	DAYANA MARCELA VILLAMIZAR GONZALEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 21.500.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 21.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
9794	20/08/2026 11:07	3580	1102369209	JULIETH BOLAÑOS BARANDICA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 22.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 22.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
9882	20/08/2026 17:30		900115931	EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S A ESP EMPAS S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 81.208.660,00	2.3.3.01.02.004.02.2025000 00035595.1.4003047.91123 .515 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 528	$ 81.208.660,00	PAGO DE SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL MES MARZO DE 2026 SEGÚN FACTURA NO. 00003166 $ 81.208.660,00 VALOR TOTAL $ 81.208.660,00 - EMPAS
9883	20/08/2026 17:31		900115931	EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S A ESP EMPAS S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 781.807.484,00	2.3.3.01.02.004.02.2025000 00035595.1.4003047.91123 .333 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 781.807.484,00	VALOR APORTES SIN SITUACION DE FONDOS- SUBSIDIOS DE ALCANTARILLADO DEL MES MARZO DE 2026 SEGÚN BALANCE Y CONTRIBUCIONES $ 781.807.484,00 VALOR TOTAL DE APORTES SSF $ 781.807.484,00 -EMPAS
9884	20/08/2026 17:31	349	1098616380	CLAUDIA AZUCENA RODRIGUEZ CAMACHO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 25.666.666,67	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.82120.201 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIN JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 201	$ 25.666.666,67	ADICIONAL NO. 1 AL CONTRATO NO. 349 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REPARTO, SEGUIMIENTO Y RESPUESTA OPORTUNA DE LAS PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
9885	20/08/2026 17:31		900028989	LIMPIEZA URBANA S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 28.548.505,00	2.3.3.01.04.004.03.2025000 00035595.1.4003047.91123 .215 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 28.548.505,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES DE JUNIO DE 2026 SEGÚN FACTURA NO. FEVE-1329 $ 28.548.505,00 VALOR TOTAL $ 28.548.505,00 LIMPIEZA URBANA
9886	20/08/2026 17:31		900028989	LIMPIEZA URBANA S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 85.394.078,00	2.3.3.01.04.004.03.2025000 00035595.1.4003047.91123 .332 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 85.394.078,00	VALOR APORTES SIN SITUACION DE FONDOS- SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES JUNIO DE 2026 SEGÚN BALANCE Y CONTRIBUCIONES $ 85.394.078,00 VALOR TOTAL DE APORTES SSF $ 85.394.078,00 - LIMPIEZA URBANA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
9887	20/08/2026 17:31	183	1095843401	MARIA LUCIA DURAN AGUIRRE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.800.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.82120.201 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIN JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 201	$ 20.800.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 183 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
9888	20/08/2026 17:32	184	1094948041	MAYCOL ESTIVEN MORALES ARIAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 26.693.333,33	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 26.693.333,33	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 184 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PETRÓLEOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
9890	21/08/2026 8:21	3654	1070305488	CAMILO ANDRES MONTES CUBILLOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 22.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 22.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL PARA LA PUBLICACIÓN, INTERACCIÓN Y PROMOCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
9891	21/08/2026 8:22	3655	1098793640	JOSE LUIS HERNANDEZ SANDOVAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
9892	21/08/2026 8:23	3695	1005042699	JULYETH MARCELA MENDEZ RAMIREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 12.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA, DOCUMENTAL Y TECNICA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
9893	21/08/2026 8:23	3701	1098705821	KAREN DANIELA FUENTES SALAZAR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
9894	21/08/2026 8:24	3668	1098808765	JEFFERSSON FERNANDO LEON VILLAMIZAR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 17.250.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 17.250.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTROMECÁNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DEINFRAESTRUCTURA
10033	22/08/2026 8:07	297	1095828668	ERWING LEONARDO ARIAS CANO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 26.436.666,67	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 26.436.666,67	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 297 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
10034	22/08/2026 8:08	354	1098615471	ADRIANA DEL ROSARIO CUENTAS MORENO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 25.666.666,67	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.82120.201 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIN JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 201	$ 25.666.666,67	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 354 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS TEMAS DE DEFENSA JUDICIAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
10044	24/08/2026 8:44	3729	91521591	ALVARO JULIAN PRADA CAMACHO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 23.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 23.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS DE GESTION PREDIAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
10055	24/08/2026 9:11	3855	63524206	CLAUDIA MILENA PEDRAZA CACERES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 16.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 16.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
10056	24/08/2026 9:12	3840	1098609803	LEIDY JOHANA SANCHEZ ORDOÑEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 19.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 19.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
10243	24/08/2026 18:57	364	63550793	DIANA CAROLINA CARRILLO RIVEROS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 25.666.666,67	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83213.201 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 201	$ 6.900.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 364 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO ESPECIALIZADO PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
10243	24/08/2026 18:57	364	63550793	DIANA CAROLINA CARRILLO RIVEROS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ -	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83213.201 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 201	$ 18.766.666,67	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 364 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO ESPECIALIZADO PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
10244	24/08/2026 18:58	247	1098728508	CATHERIN ROCIO DE ALBA MENDEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 26.436.666,67	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 26.436.666,67	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 247 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTION DOCUMENTAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
10245	24/08/2026 19:00	244	1005155868	DIEGO RAUL VILLAVECES SUAREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 32.616.666,67	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 7.250.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 244 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PETRÓLEOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
10245	24/08/2026 19:00	244	1005155868	DIEGO RAUL VILLAVECES SUAREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ -	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 25.366.666,67	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 244 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PETRÓLEOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
10258	25/08/2026 10:14	3935	1095822897	LUIS JOSE DURAN AGUIRRE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.900.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 20.900.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE LA INGENIERÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
10259	25/08/2026 10:15	3931	63544675	JESSIKA VIVIANA MORENO MARTINEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DECONTRATACIÓN EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
10260	25/08/2026 10:16	3925	1095833579	GERALDINE MARTINEZ CORREDOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 15.200.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 15.200.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
10261	25/08/2026 10:18	3936	1098636327	MARIA XIMENA VEGA CALLEJAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 15.200.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 15.200.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
10262	25/08/2026 10:19	3933	37751108	ESPERANZA TORRES PEREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 13.300.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 13.300.000,00	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
10263	25/08/2026 10:20	3914	1098735134	MARIA FERNANDA OJEDA AMADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 23.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 23.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
10272	25/08/2026 10:49	656	63540189	LEYDY ANDREA MANTILLA CARDONA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 25.153.333,33	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 25.153.333,33	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 656 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS ESPECIALIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
10502	26/08/2026 8:44	3941	1095947876	JHON EDICSON BLANCO FLOREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 14.800.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 14.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTROMECÁNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
10503	26/08/2026 8:45	3947	1098753238	DAVID HERNANDO JAIMES MUÑOZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 14.800.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 14.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA PLANEACION DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
10504	26/08/2026 8:46	3946	1005161299	PAULA ANDREA VILLAMIZAR ARCHILA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 14.800.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 14.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
10505	26/08/2026 8:46	3960	91498037	JAVIER ENRIQUE GARCIA LIZARAZO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 14.060.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 14.060.000,00	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
10508	26/08/2026 9:03	4020	91226095	REYNALDO ALVAREZ LEON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 16.500.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 16.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
10509	26/08/2026 9:04	4014	1002621991	KAREN JULIANA PRIETO MOLINA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 16.650.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 16.650.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
10524	26/08/2026 10:40	4013	1098682046	MARIA FERNANDA QUINTERO PABUENA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 14.800.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 14.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
10525	26/08/2026 10:41	3965	1095805526	IVAN DARIO SEPULVEDA REYES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 15.200.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 15.200.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
10526	26/08/2026 10:42	3961	1098721390	MAYERLY ALEJANDRA MEDINA CHARRY	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 28.490.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 28.490.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
10527	26/08/2026 10:42	3956	63328163	CLAUDIA PATRICIA BERMUDEZ TUTAZAURA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 17.100.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 17.100.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
10528	26/08/2026 10:43	3955	91498049	EDWIN FERNANDO NIÑO OSORIO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 15.200.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 15.200.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
10529	26/08/2026 10:44	3979	1098670611	MARIA FERNANDA DURAN JAIMES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.350.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 20.350.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
10530	26/08/2026 10:44	3981	1005311651	JORGE ENRIQUE MOTTA OSMA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 17.250.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 17.250.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
10656	27/08/2026 10:33	4080	1098672614	VILMA ZULAY GARCIA FONTECHA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 14.400.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 14.400.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
10657	27/08/2026 10:33	4078	1005260112	JUAN FELIPE BELTRAN NIÑO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 22.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 22.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.
10658	27/08/2026 10:36	4077	1065875905	JOSE CAMILO ROCHA GUZMAN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 25.666.666,67	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 25.666.666,67	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PUBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
10659	27/08/2026 10:37	4079	1052405562	DANIEL FELIPE ROJAS CASTRO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 18.500.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 18.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
10660	27/08/2026 10:38	4076	63536972	DIANA JIMENEZ REYES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 14.400.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 14.400.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO FORTALECER PARA LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
10661	27/08/2026 10:39	4054	1098730449	ENAYDER JAVIER VANEGAS JIMENEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 16.500.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 16.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
10662	27/08/2026 10:41	4039	63556776	ADRIANA CAROLINA PICO HERNANDEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 15.200.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 15.200.000,00	PRESTAR SERVICIOS COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PUBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
10663	27/08/2026 10:42	4027	1005136233	SHIRLEY JULITZA BALLESTEROS GUERRERO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 14.800.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 14.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
10664	27/08/2026 10:43	4028	1098669661	FABIAN MAURICIO PORRAS LOPEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 15.200.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 15.200.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
10747	28/08/2026 10:25	4103	13469665	JAIME VILLAMIZAR COGOLLO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 14.800.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 14.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL ÁREA ADMINISTARTIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
10748	28/08/2026 10:26	4093	1098711002	HELMER CORDERO REBOLLEDO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 18.500.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 18.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
10749	28/08/2026 10:27	4094	1012437798	JHONATAN MAURICIO ACOSTA MORENO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.600.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 12.600.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
10750	28/08/2026 10:29	4100	92527416	NICOLAS GABRIEL GONZALEZ DOMINGUEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 22.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 22.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
10852	28/08/2026 23:08	195	37863152	ENELDA GOMEZ NIÑO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 22.880.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 22.880.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 195 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO ESPECIALIZADO PARA APOYAR EL ÁREA PRESUPUESTAL EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
10853	28/08/2026 23:09	217	63486215	NUBIA CONSTANZA VALENCIA PINZON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 22.880.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 22.880.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 217 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA APOYAR LOS SISTEMAS FINANCIEROS Y DE INFORMACION ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
10854	28/08/2026 23:10	196	1098773016	ANDREA JULIANA SUAREZ LEAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 22.880.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 22.880.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 196 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
10855	28/08/2026 23:21	236	1098755560	YEISSON LEANDRO POTES REYES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 22.660.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.82120.201 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIN JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 201	$ 22.660.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 236 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS, PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
10856	28/08/2026 23:22	262	1005163503	PAULA ALEJANDRA CELIS VEGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.016.666,67	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 12.016.666,67	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO.262 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
10858	28/08/2026 23:28	215	1193235341	ANA MARIA LIZARAZO BECERRA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 17.333.333,33	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.82120.201 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIN JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 201	$ 17.333.333,33	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 215 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
10887	31/08/2026 8:13	4159	91151139	JORGE ELIECER BLANCO VESGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 14.400.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 14.400.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
10888	31/08/2026 8:13	4204	91481177	ARMANDO GOMEZ VILLABONA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 21.600.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 21.600.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.
10889	31/08/2026 8:14	4158	91356684	JONATHAN CAPACHO SILVA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.600.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 12.600.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
10890	31/08/2026 8:15	4181	13507908	EDGAR FRANCISCO CABALLERO ORDOÑEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.600.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 12.600.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
10891	31/08/2026 8:17	4179	1098621670	SAMIR ALEXIS SILVA COLMENARES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.600.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 12.600.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
10892	31/08/2026 8:18	4148	91517328	EDINSON ENRIQUE SANDOVAL MANTILLA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 11.500.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 11.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
10893	31/08/2026 8:37	4147	1098820638	ARTURO LONDOÑO ARENAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE NEGOCIOS PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y LA LIQUIDACION DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS QUE EJECUTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
10894	31/08/2026 8:38	4157	91260789	JAIRO ESPINOSA MORENO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.600.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 12.600.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
10896	31/08/2026 10:30	4163	37671172	NURIAN BIBIANA MUNEVAR PEREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 28.490.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 28.490.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL CON MAESTRIA PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y OBRAS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
10905	31/08/2026 14:45		890200162	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA AMB S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 330.823.642,00	2.3.3.01.02.004.01.2025000000035595.1.4003047.91123.215 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 330.823.642,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL MES DE ABRIL DE 2026 SEGUN FACTURA NO. 0006669 $ 330.823.642,00 TOTAL $ 330.823.642,00-ACUEDUCTO METROPOLITANO
10906	31/08/2026 14:46		890200162	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA AMB S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 1.147.390.919,00	2.3.3.01.02.004.01.2025000000035595.1.4003047.91123.331 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 1.147.390.919,00	VALOR APORTES SIN SITUACION DE FONDOS- SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO DEL MES ABRIL DE 2026 SEGÚN BALANCE Y CONTRIBUCIONES $ 1.147.390.919,00 VALOR TOTAL DE APORTES SSF $ 1.147.390.919,00 - ACUEDUCTO
10919	1/09/2026 8:38	4251	1099940044	DANIEL RICARDO JEREZ PLATA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 10.500.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 10.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
10920	1/09/2026 8:39	4248	1098768408	CRISTHIAN FERNANDO SABOGAL VILLAMIZAR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 19.250.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 19.250.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO A LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
10921	1/09/2026 8:40	4247	1095581135	JUAN DAVID PAEZ TRUJILLO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.250.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 12.250.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
10922	1/09/2026 8:40	4256	1098793938	JORGE ELIECER GOMEZ HERRERA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 14.400.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 14.400.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.
10923	1/09/2026 8:41	4255	91511754	DIEGO FERNANDO BECERRA RAMIREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 14.400.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 14.400.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
10969	1/09/2026 11:01	342	1007402713	DAYANA CRISTINA ARENAS BAYONA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 20.000.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 342 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
10970	1/09/2026 11:02	302	1095841758	JUAN SEBASTIAN ARIAS CANO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.600.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 20.600.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 302 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
10971	1/09/2026 11:05	270	37549301	JUDITH BUENO LIZARAZO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 24.376.666,67	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.82120.201 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIN JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 201	$ 24.376.666,67	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 270 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN TODAS SUS ETAPAS, PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
10972	1/09/2026 11:06	271	1005565577	ZARETH YULENY MOTTA PABON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 18.883.333,33	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 18.883.333,33	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 271 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
10973	1/09/2026 11:07	370	1098700548	JUAN FELIPE RODRIGUEZ ARAMBULA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 22.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 22.000.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 370 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
10974	1/09/2026 11:07	351	1098764487	IVONNE VANESSA LANDAZABAL VALBUENA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 18.333.333,33	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 4.333.333,34	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 351 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
10974	1/09/2026 11:07	351	1098764487	IVONNE VANESSA LANDAZABAL VALBUENA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ -	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 13.999.999,99	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 351 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
10975	1/09/2026 11:30	272	1098766174	DANIEL EDUARDO JAIMES RUIZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 22.660.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 22.660.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 272 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
10976	1/09/2026 11:31	4289	1109491959	MARIA MILENA SIERRA RAMIREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 17.500.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 17.500.000,00	RESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO FORTALECER PARA LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
10977	1/09/2026 11:32	4290	79781797	JAIME ANDRES CAICEDO BERRIO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 19.800.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 19.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA EJECUTAR EL DISEÑO, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS; ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS POR LA SECRETARIA DE INFRAETRUCTURA DESDE EL AREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
11092	2/09/2026 8:06	4298	1095530313	BRAHIAN SNEYDER OSORIO JAIMES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 17.500.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 17.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO FINANCIERO PARA APOYAR EL ÁREA DE BANCO DE PROYECTOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
11093	2/09/2026 9:20	238	63339406	MARIA PATRICIA MONSALVE MONSALVE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 15.106.666,67	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 15.106.666,67	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 238 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER EL AREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
11094	2/09/2026 9:20	287	1095801656	ERIKA LILIANA VARGAS ROA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.600.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 20.600.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 287 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA APOYAR EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
11095	2/09/2026 9:21	356	1098642406	MARIA DEL PILAR HOYOS MONT	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 20.000.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 356 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA VERIFICACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD (HSEQ) EN DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
11096	2/09/2026 9:21	383	1098649127	JENNY PAOLA RODRIGUEZ PEREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 23.760.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 23.760.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 383 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS ESPECIALIZADO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTUALES EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS.
11097	2/09/2026 9:22	367	37685339	MARQUEZA GONZALEZ SERENO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.166.666,67	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 20.166.666,67	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 367 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
11098	2/09/2026 9:23	355	37830644	MARIA ELENA GUTIERREZ DUARTE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 21.666.666,67	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.82120.251 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 251	$ 21.666.666,67	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 355 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE DEFENSA JUDICIAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
11099	2/09/2026 9:26	249	1099940164	VIVIANA MARCELA CUADROS VALBUENA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.600.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.82120.201 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIN JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 201	$ 20.600.000,00	ADICIONAL NÚMERO 1 AL CONTRATO 249 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
11100	2/09/2026 9:27	274	1098814504	VALENTINA URIBE PAEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.600.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 20.600.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 274 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
11101	2/09/2026 9:31	281	1098719331	JHON FREDDY RAMIREZ JAIMES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.600.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 20.600.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 281 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
11112	2/09/2026 10:32	372	1098742245	JOSE ANTONIO FLOREZ POVEDA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 19.200.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 19.200.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 372 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
11113	2/09/2026 10:56		890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 4.654.278,00	2.3.2.02.02.006.20246800100192.2.2102069.69112.226 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD POR CUENTA PROPIA 226	$ 4.654.278,00	ENERGIA - ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 13/06/2026 AL 14/07/2026- 31 SEGÚN FACTURA 250884893 NUMERO DE CUENTA 32675
11230	3/09/2026 8:58	4352	63548004	MAYERLY ROCIO FLOREZ PRADA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 11.666.666,67	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 11.666.666,67	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
11231	3/09/2026 8:58	4345	1005564365	KAREN JULIETH TOLOZA LAMUS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 18.333.333,33	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 18.333.333,33	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO TECNICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
11235	3/09/2026 10:26	4381	13511301	ALEXIS RONDON MUNOZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 17.500.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 17.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
11236	3/09/2026 10:26	4372	1098743125	OLGA XIMENA GOMEZ DUARTE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 17.500.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 17.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
11237	3/09/2026 10:27	4367	1005326598	JUAN SEBASTIAN QUINTERO PACHECO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 17.500.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 17.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.
11238	3/09/2026 10:28	4373	1052400451	ANDRES FELIPE LOPEZ BRICEÑO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 24.500.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 24.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO FORTALECER PARA LOSPROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
11239	3/09/2026 10:29	4363	1098746548	SMITH ALEJANDRA PINTO PIMIENTO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 19.250.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 19.250.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
11240	3/09/2026 11:23	358	1102375427	MARIA ALEJANDRA GALAN BARAJAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83213.251 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 251	$ 20.000.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 358 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR LOS PROCESOS DE GESTION DE CALIDAD EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.
11241	3/09/2026 11:24	323	1031132756	XIOMARA YULIANI BERNAL CARDENAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 20.000.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 323 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA APOYAR EL DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
11242	3/09/2026 11:25	326	1098726661	MARIA PAULA APARICIO GARZON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 22.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 22.000.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 326 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.
11243	3/09/2026 11:25	347	1096239826	ANGIE LIZETH ARIAS NIETO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 14.666.666,67	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 14.666.666,67	ADICIONAL NÚMERO 1 AL CONTRATO 347 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
11244	3/09/2026 11:27	359	1095942578	ANGIE DANIELA FIGUEROA TORRES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 14.666.666,67	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 14.666.666,67	ADICIONAL NÚMERO 1 AL CONTRATO 359 DE 2026, CUYO OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
11246	3/09/2026 11:29	344	1098662774	ANDRES FELIPE DUEÑAS SANCHEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 20.000.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 344 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA APOYAR EL AREA DE BANCO DE PROYECTOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
11247	3/09/2026 11:30	332	51845676	SONIA RODRIGUEZ PEDROZA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 10.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 10.000.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 332 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
11248	3/09/2026 11:31	290	63513685	ROSALBA GONZALEZ CORZO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 10.333.333,33	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.85999.201 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 201	$ 80.000,00	ADICIONAL NÚMERO 1 AL CONTRATO 290 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
11248	3/09/2026 11:31	290	63513685	ROSALBA GONZALEZ CORZO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ -	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 10.253.333,33	ADICIONAL NÚMERO 1 AL CONTRATO 290 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
11249	3/09/2026 11:32	343	1098726540	CLAUDIA MILENA SANCHEZ QUIROGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.82120.201 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIN JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 201	$ 8.726.666,67	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 343 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
11249	3/09/2026 11:32	343	1098726540	CLAUDIA MILENA SANCHEZ QUIROGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ -	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.82120.251 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 251	$ 11.273.333,33	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 343 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
11250	3/09/2026 11:33	221	1098821923	IVAN ENRIQUE CASTELLANOS JAIMES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 15.253.333,33	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 15.253.333,33	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO: 221 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS COMO TECNOLOGO PARA BRINDAR APOYO A LA GESTIÓN EN EL AREA DE CONTRATACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
11251	3/09/2026 11:33	241	1093798962	KAREN MARCELA GUTIERREZ BARRAGAN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 17.166.666,67	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 17.166.666,67	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 241 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
11252	3/09/2026 11:34	264	13744164	JHON JAIRO BARAJAS LIZCANO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 15.106.666,67	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 15.106.666,67	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 264 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CALIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
11253	3/09/2026 11:36	170	900115931	EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S A ESP EMPAS S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 6.979.223.423,00	2.3.2.02.02.005.20260000016974.2.4003020.53253.215 - ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA 215	$ 2.882.107.371,17	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P - EMPAS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN SITIOS ESTRATÉGICOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
11253	3/09/2026 11:36	170	900115931	EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S A ESP EMPAS S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ -	2.3.2.02.02.005.20260000016974.2.4003020.53253.515 - ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA 515	$ 3.744.648.226,83	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P - EMPAS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN SITIOS ESTRATÉGICOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
11253	3/09/2026 11:36	170	900115931	EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S A ESP EMPAS S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ -	2.3.2.02.02.005.20260000016974.2.4003020.53253.588 - ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA 588	$ 352.467.825,00	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P - EMPAS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN SITIOS ESTRATÉGICOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
11373	4/09/2026 8:19	4412	63447968	MARIA EDILIA HERNANDEZ PEDRAZA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 19.250.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 19.250.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA LA GESTIÓN SOCIAL DE LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, UTILIZANDO SUS PROPIOS MEDIOS INSTRUMENTOS Y RECURSOS, Y DEMÁS ACCIONES REQUERIDAS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
11374	4/09/2026 8:20	4443	1098811455	FANNY DANIELA CASTRO ROMERO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 21.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 21.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.
11375	4/09/2026 8:21	4459	1095821789	PEDRO IVAN ANGEL CHACON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 19.250.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 19.250.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL APOYO EN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE ESPACIO PÚBLICO, EQUIPAMIENTOS, PARQUES O DE MOVILIDAD Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE DEFINA LA DIRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL.
11390	4/09/2026 9:42	336	1098809098	LINA MARCELA ROMERO GUARGUATI	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 16.666.666,67	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 16.666.666,67	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 336 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
11391	4/09/2026 9:43	277	1095833106	JOSE TOMAS ZULUAGA FLOREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.600.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 20.600.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 277 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
11392	4/09/2026 9:43	346	63461587	CLAUDIA INES PACHECO MEZA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 18.333.333,33	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 18.333.333,33	ADICIONAL NÚMERO 1 AL CONTRATO 346 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO Y RESPUESTA OPORTUNA DE LAS PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
11393	4/09/2026 9:44	401	13540886	RAUL ENRIQUE MERLO ARGUELLO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 14.666.666,67	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 14.666.666,67	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 401 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA .
11394	4/09/2026 9:45	357	1098767800	LUIS CARLOS BARRERA ANGEL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 18.333.333,33	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 18.333.333,33	ADICIONAL NÚMERO 1 AL CONTRATO 357 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
11395	4/09/2026 9:45	400	91256968	BONIFACIO FLOREZ ANTELIZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 20.000.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 400 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
11396	4/09/2026 9:46	251	1014254089	VANESSA CABANZO ARDILA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.600.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 20.600.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 251 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR PÚBLICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
11397	4/09/2026 9:47	283	1098703713	EXNEYQUER VILLAMIZAR BARAJAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 18.883.333,33	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83213.201 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 201	$ 667.333,33	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 283 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE EQUIPAMENTO URBANO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
11397	4/09/2026 9:47	283	1098703713	EXNEYQUER VILLAMIZAR BARAJAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ -	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83213.251 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 251	$ 18.216.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 283 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE EQUIPAMENTO URBANO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
11398	4/09/2026 9:48	501	1098690894	ANDRES FERNANDO MARTINEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 21.780.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83213.251 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 251	$ 21.780.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 501 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO ESPECIALIZADO PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
11399	4/09/2026 9:48	376	1095910863	LINA ANDREA MOSQUERA VARGAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 20.000.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 376 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
11400	4/09/2026 9:49	525	30209795	MABEL NAYIBE RUEDA DELGADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 16.333.333,33	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 16.333.333,33	ADICIONAL NÚMERO 1 AL CONTRATO 525 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER EL AREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
11401	4/09/2026 9:50	1275	1095834715	MARIA ALEJANDRA CARVAJAL GARCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 15.333.333,33	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83213.251 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 251	$ 15.333.333,33	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 1275 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
11402	4/09/2026 9:51	499	1007715085	BRAYAN JESID OVIEDO CASTILLO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 14.850.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 14.850.000,00	ADICIONAL NÚMERO 1 AL CONTRATO 499 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
11403	4/09/2026 9:51	404	63366747	MABEL LUCIA HERRERA AMOROCHO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 19.800.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 19.800.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 404 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
11453	4/09/2026 14:51	4515	1098699039	JENNYFER PAOLA VILLAMIL MANTILLA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 22.750.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	$ 22.750.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO,ARTICULACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, LA CARTERA, LA GESTIÓN FINANCIERA, EL SISTEMA DE GESTIÓN Y LOS INDICADORES DE GESTIÓN DEL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
11595	7/09/2026 9:05	4485	1005107055	DIEGO ANDRES VILLAMIZAR MARTINEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 13.333.333,33	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 13.333.333,33	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
11596	7/09/2026 9:06	4542	37841994	MARIA CAROLINA VESGA AGUDELO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 10.500.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 10.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
11597	7/09/2026 9:06	4523	1005258890	MARIA JOSE PALACIOS CAMARGO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 15.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 15.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS QUE EJECUTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
11598	7/09/2026 9:07	4512	1100971307	YULIETH CAMILA ARDILA ORTIZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 17.500.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 17.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
11599	7/09/2026 9:07	4526	1095816935	KATHERINE MARTINEZ PAREJO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 17.500.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 17.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
11600	7/09/2026 9:08	4529	1098745463	RICARDO ANDRES ZARATE CABEZA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 19.250.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83213.251 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 251	$ 19.250.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA APOYAR EL DISEÑO, FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ESPACIO PÚBLICO, EQUIPAMIENTOS, PARQUES Y MOVILIDAD, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD.
11622	7/09/2026 10:00	4553	91290904	MAURICIO JIMENEZ SANTOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 15.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 15.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
11623	7/09/2026 10:01	806	1098798882	VANESSA ASHLIE BRIGGITH PLATA VARGAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 16.166.666,67	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 16.166.666,67	ADICIONAL NÚMERO 1 AL CONTRATO 806 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
11624	7/09/2026 10:02	704	1101687332	WILLIAM JOSE CALA VALBUENA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 16.333.333,33	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 16.333.333,33	ADICIONAL NÚMERO 1 AL CONTRATO 704 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS QUE EJECUTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
11625	7/09/2026 10:02	710	1094808518	JOSE DAVID VERA GAMBOA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 19.600.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 19.600.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 710 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.
11626	7/09/2026 10:03	827	1098761054	JULIETH ANDREA LEIVA NEIRA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 14.226.666,67	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 14.226.666,67	ADICIONAL NÚMERO 1 AL CONTRATO 827 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNÓLOGO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
11627	7/09/2026 10:03	203	1098711800	FABIO ANDRES BUENO ARAQUE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.800.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 20.800.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 203 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
11628	7/09/2026 10:04	530	37747602	PAOLA ALEJANDRA GARCIA GALAN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 19.600.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 19.600.000,00	ADICIONAL NÚMERO 1 AL CONTRATO 530 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
11678	7/09/2026 16:36		900293868	VEOLIA ASEO BUCARAMANGA S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 5.649.142,00	2.3.3.01.04.004.03.2025000 00035595.1.4003047.91123 .215 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 5.649.142,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES DE JUNIO DE 2026 SEGÚN FACTURA NO. OPE235 $ 5.649.142,00 VALOR TOTAL $ 5.649.142,00 VEOLIA
11679	7/09/2026 16:37		900293868	VEOLIA ASEO BUCARAMANGA S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 63.278.854,00	2.3.3.01.04.004.03.2025000 00035595.1.4003047.91123 .332 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	$ 63.278.854,00	VALOR APORTES SIN SITUACION DE FONDOS- SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES JUNIO DE 2026 SEGÚN BALANCE Y CONTRIBUCIONES $ 63.278.854,00 VALOR TOTAL DE APORTES SSF $ 63.278.854,00 -VEOLIA
11796	9/09/2026 9:00	4672	1098752709	CAMILO ANDRES RODRIGUEZ JAIMES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.202468001 0049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE EQUIPAMIENTO URBANO EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
11797	9/09/2026 9:01	4666	63505805	LAURA PAOLA AMOROCHO MONTAGUT	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 22.100.000,00	2.3.2.02.02.008.202468001 0049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 22.100.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO FINANCIERO PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y LA LIQUIDACION DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS QUE EJECUTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
11798	9/09/2026 9:02	4633	1099209922	ERIKA JOHANA DIAZ SOSSA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 18.333.333,33	2.3.2.02.02.008.202468001 0049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 18.333.333,33	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL APOYO EN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE ESPACIO PÚBLICO, EQUIPAMIENTOS, PARQUES O DE MOVILIDAD, Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE DEFINA LA DIRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL.
11805	9/09/2026 10:03	608	63515462	GRACIELA RODRIGUEZ PEDROZA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 9.800.000,00	2.3.2.02.02.008.202468001 0049.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 9.800.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 608 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
11806	9/09/2026 10:04	802	13743467	GIOVANI GUALTEROS AGUILLON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 17.783.333,33	2.3.2.02.02.008.202468001 0049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 17.783.333,33	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 802 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
11807	9/09/2026 10:04	648	1098731681	DIEGO FERNANDO RAMIREZ SARMIENTO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 19.600.000,00	2.3.2.02.02.008.202468001 0049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 19.600.000,00	ADICIONAL NÚMERO 1 AL CONTRATO 648 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
11808	9/09/2026 10:05	592	63350037	LAURA REGINA LOPEZ PRIETO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 23.193.333,33	2.3.2.02.02.008.202468001 0049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 23.193.333,33	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 592 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
11809	9/09/2026 10:05	707	1090448928	SEIDY JULIETH GARCIA ROZO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 21.560.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 21.560.000,00	ADICIONAL NÚMERO 1 AL CONTRATO 707 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
11810	9/09/2026 10:06	644	37550043	MARLY YOLIMA ARDILA MANTILLA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 19.600.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 19.600.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 644 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA APOYAR EL AREA DE BANCO DE PROYECTOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
11811	9/09/2026 10:07	826	74379477	JAVIER MAURICIO PARRA RODRIGUEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 19.400.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 19.400.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 826 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
11812	9/09/2026 10:07	815	1098772574	RAFAEL ANDRES HINESTROZA MARTINEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 21.340.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 21.340.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 815 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.
11813	9/09/2026 10:08	838	1010246988	CARLOS MAURICIO AREVALO CHINCHILLA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 19.400.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 19.400.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 838 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
11814	9/09/2026 10:09	582	91512507	CRISTIAN CAMILO GARCIA TRUJILLO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 17.966.666,67	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 17.966.666,67	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 582 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PROMOCION Y DIVULGACION EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN TRADICIONALES Y DIGITALES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.
11815	9/09/2026 10:10	832	1098602362	VICTOR ELIAS MENESES AGRESOTH	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 19.400.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 19.400.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 832 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE EQUIPAME URBANO EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
11816	9/09/2026 10:10	898	13874585	JOHN JEFFERSON MORENO RODRIGUEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 15.106.666,67	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 15.106.666,67	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 898 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR APOYO AL SEGUIMIENTO Y RESPUESTA OPORTUNA DE LAS PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
11817	9/09/2026 10:11	922	1098662562	SILVIA ALEJANDRA PINTO BOHORQUEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 19.200.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 19.200.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 922 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
11818	9/09/2026 10:11	552	1098741571	LIZETH ANDREA RENGIFO CASTRO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 19.600.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 19.600.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 552 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
11819	9/09/2026 10:12	518	91274635	JAIME LUIS PARRA VERGARA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 19.600.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 19.600.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 518 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA APOYAR EL ÁREA DE BANCO DE PROYECTOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
11820	9/09/2026 10:13	821	1098729140	JUAN DIEGO NORIEGA CACERES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 19.400.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 19.400.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 821 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
11864	9/09/2026 11:35	4674	91478038	JUAN GREGORIO SIERRA NAVARRO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 23.100.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 23.100.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
11911	10/09/2026 9:08	924	1100962680	KAREN JULIETH GUALDRON CHAPARRO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 19.200.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 19.200.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 924 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
11912	10/09/2026 9:09	849	91235541	EDUARDO TORRES QUINTANA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 16.166.666,67	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 16.166.666,67	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 849 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNOLOGO EN TOPOGRAFIA PARA APOYAR LA PLANEACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
11913	10/09/2026 9:13	4681	63539118	DIANA MARCELA SERRANO ARIZA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 15.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 15.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA DE MERCADOS PARA APOYAR EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
11914	10/09/2026 9:14	4675	1098801553	CRISTIAN LEONARDO PATIÑO VILLADIEGO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 15.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 15.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.
11919	10/09/2026 10:34	4688	1100970960	PAULA ANDREA REMOLINA PORRAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100192.2.2102069.82120.226 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 226	$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN DENTRO DE SUS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
11920	10/09/2026 10:35	4689	1099370053	OLID ANDREA SERRANO PRADA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800101920.2.2102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL REGISTRO, TRÁMITE Y SEGUIMIENTO DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES (PQRS) EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
11921	10/09/2026 10:35	4687	63561044	ADRIANA HIGUERA BLANCO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800101920.2.2102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA APOYAR TÉCNICAMENTE LA GESTIÓN, ESTRUCTURACIÓN, REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS AMBIENTALES, INVENTARIOS FORESTALES Y PLANES DE MANEJO AMBIENTAL REQUERIDOS PARA LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
11944	10/09/2026 13:54		830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P BIC	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 11.392.618,00	2.3.2.02.02.008.20246800101920.2.2102069.84120.226 - SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA ACCESO 226	$ 11.392.618,00	SERVICIO DE TELEFONIA CONSUMO DE BACKUP EN DISCO DS-02973567 CONSUMO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2026 CUENTA # 17 REFERENCIA # 181195417. FACTURA # 580831505107
11945	10/09/2026 13:55		830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P BIC	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 28.339.973,17	2.3.2.02.02.008.20246800101920.2.2102069.84120.226 - SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA ACCESO 226	$ 28.339.973,17	SERVICIO DE TELEFONIACONSUMO DE INTERNET-PROTECION 3 MULTIDISPOSITIVOS-UCAAS-WEBEX CALLING-RPVIP ACKUP DISCO - CUENTA # 010 PERIODO FACTURADO 01 AL 30 DE AGOSTO 2026 REFERECIA # 181185077. FRA # 580831503163
11946	10/09/2026 13:56		800153993	COMCEL S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 3.641.288,47	2.3.2.02.02.008.20246800101920.2.2102069.84120.226 - SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA ACCESO 226	$ 3.641.288,47	PLAN DE DATOS DE TELEMEDIDA, TELEGESTION Y PLATAFORMA TECNOLOGICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CONSUMO DEL 20 DE JULIO DE 2026 AL 19 DE AGOSTO DE 2026 POR VALOR DE $3.641.288.47 SEGÚN FACTURA DE CLARO NO. E6097508941 REFERENCIA 8221383845. FECHA LIMITE DE PGO EL 07 DE SEPTIEMBRE 2026
11954	10/09/2026 15:15		830506952	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 19.440.675,54	2.3.7.06.02.202600000011719.2.4599002.8715205.526 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION 526	$ 19.440.675,54	ADICIONAL NO 03 AL CONTRATO DE OBRA NO 139 CUYO OBJETO ES:MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA GRUPO 2
11955	10/09/2026 15:16		901719756	CONSORCIO CIVING	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 449.343,07	2.3.7.06.02.202600000011719.2.4599002.8715205.526 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION 526	$ 449.343,07	ADICIONAL NO 03 AL CONTRATO DE OBRA NO 140 CUYO OBJETO ES:MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA GRUPO 3
11956	10/09/2026 15:17		860041968	COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 47.381.575,48	2.3.7.06.02.202600000011719.2.4599002.8715205.526 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION 526	$ 47.381.575,48	ADICIONAL NO 03 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 143 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE 2
11957	10/09/2026 15:18	141	829001805	SOSDOM S.A.S.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 59.252.886,40	2.3.7.06.02.202600000011719.2.4599002.8715205.526 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION 526	$ 59.252.886,40	ADICIONAL NO 03 AL CONTRATO DE OBRA NO 141 CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA GRUPO 4

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
11958	10/09/2026 15:19		901719756	CONSORCIO CIVING	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 40.957.593,03	2.3.7.06.02.2026000000117 19.2.4599002.8715205.526 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION 526	$ 40.957.593,03	ADICIONAL NO 03 AL CONTRATO DE OBRA NO 138 CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA GRUPO 1
11959	10/09/2026 15:20		860041968	COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 72.444.740,21	2.3.7.06.02.2026000000117 19.2.4599002.8715205.526 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION 526	$ 72.444.740,21	ADICIONAL NO 04 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 143 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE 2
11960	10/09/2026 15:21		900602753	HCR INGENIEROS S.A.S.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 132.491,33	2.3.7.06.02.2026000000117 19.2.4599002.8715205.526 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION 526	$ 132.491,33	ADICIONAL NO 04 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 142 CUYO OBJETO ES:INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE 1.
11961	10/09/2026 15:22		860041968	COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 236.907.877,42	2.3.7.06.02.2026000000117 19.2.4599002.8715205.526 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION 526	$ 236.907.877,42	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO.1 AL CONTRATO NO. 143 DEL 22/06/2023 INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE 2.
11962	10/09/2026 15:23		860041968	COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 177.680.908,07	2.3.7.06.02.2026000000117 19.2.4599002.8715205.526 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION 526	$ 177.680.908,07	ADICIONAL NO. 2 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE CONSULTORIA MODALIDAD INTERVENTORIA NO. 143 DE 2023, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – LOTE 2”
11963	10/09/2026 15:26	141	829001805	SOSDOM S.A.S.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 39.899.026,04	2.3.7.06.02.2026000000117 19.2.4599002.8715205.526 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE ILUMINACION 526	$ 39.899.026,04	ADICIONAL NO. 2 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 141 DE 2023, CUYO OBJETO ES: “MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO 4”.
11964	10/09/2026 15:28		901767693	UNION TEMPORAL MODERNIZACION FASE 1 BGA.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 192.347.123,57	2.3.7.06.02.2026000000117 19.2.4599002.91123.526 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 526	$ 192.347.123,57	ADICIONAL N°1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE OBRA 285 DE 2023 CUYO OBJETO ES MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 – FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – LOTE 1” CARRERA 27 CALLE 9-CALLE 34

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
11965	10/09/2026 15:29		901767429	UNIÓN TEMPORAL MODERNIZACIÓN BUCARAMANGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.165.468,84	2.3.7.06.02.2026000000117 19.2.4599002.91123.526 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 526	$ 12.165.468,84	ADICIONAL N°1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE OBRA 287 DE 2023 CUYO OBJETO ES MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 – FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – LOTE 3” CALLE 36.
11966	10/09/2026 15:29		901772778	CONSORCIO ALUMBRADO NLC	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 227.253.712,00	2.3.7.06.02.2026000000117 19.2.4599002.91123.526 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 526	$ 227.253.712,00	ADICIONAL N°1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 323 DE 2023 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA A LA MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 - FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. LOTE 3
11967	10/09/2026 15:30		901774294	CONSORCIO ILUMINAR BGA R	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 105.969.026,64	2.3.7.06.02.2026000000117 19.2.4599002.91123.526 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 526	$ 105.969.026,64	ADICIONAL N°1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE OBRA N° 332 DE 2023 CUYO OBJETO ES: AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA RURAL – FASE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
11968	10/09/2026 15:31		901272510	EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 231,24	2.3.7.06.02.2026000000117 19.2.4599002.91123.526 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 526	$ 231,24	ADICIONAL N°2 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO 320-2023 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA A LA MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 - FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO 1
11969	10/09/2026 15:32		901769650	CONSORCIO ELECTRICAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 22.929,48	2.3.7.06.02.2026000000117 19.2.4599002.91123.526 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 526	$ 22.929,48	ADICIONAL N°2 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO 291-2023 CUYO OBJETO ES: MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 – FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – LOTE 4” CARRERA 15.
11970	10/09/2026 15:33		901768360	CONSORCIO ALUMBRADO BUCARAMANGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 11.320.782,32	2.3.7.06.02.2026000000117 19.2.4599002.91123.526 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 526	$ 11.320.782,32	ADICIONAL N°2 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO 288-2023 CUYO OBJETO ES: MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 – FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – LOTE 5” AVENIDA QUEBRADA SECA.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
11971	10/09/2026 15:33		901767403	CONSORCIO CONSTRUELECTRICOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 25.340.441,80	2.3.7.06.02.2026000000117 19.2.4599002.91123.526 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 526	$ 25.340.441,80	ADICIONAL N°2 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO 289-2023 MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 - FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE 6 AVENIDA GONZALES VALENCIA, DESDE EL CRUCE CIAL 7 BOCAS HASTA LA CALLE 63.
11972	10/09/2026 15:34		901772778	CONSORCIO ALUMBRADO NLC	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 76.129.993,00	2.3.7.06.02.2026000000117 19.2.4599002.91123.526 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 526	$ 76.129.993,00	ADICIONAL N°2 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO 323-2023 CUYO OBJETOES : INTERVENTORIA A LA MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 - FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE 3.
11973	10/09/2026 15:35		901768078	CONSORCIO AP 2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 22.420.471,00	2.3.7.06.02.2026000000117 19.2.4599002.91123.526 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 526	$ 22.420.471,00	ADICIONAL N°2 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO 290-2023 CUYO OBJETO ES: MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 - FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE 7. AVENIDA LA ROSITA, DESDE LA CARRERA 17 HASTA LA CARRERA 27.
11981	10/09/2026 16:24		800153993	COMCEL S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 399.842,69	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.84120.226 - SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA ACCESO 226	$ 399.842,69	SERVICIO DE TELEFONIACONSUMO DE DATOS. REFERENCIA # 8221401343. FACTURA ELECTRONICA E6102618537. CUENTA DOBLE CONSUMO DEL 04 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2026
12005	11/09/2026 10:03	4705	1095832875	ALEJANDRO CASTAÑEDA ARENAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
12006	11/09/2026 10:04	4737	1098761721	HERMES JULIAN COTE PLATA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 16.500.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 16.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.
12007	11/09/2026 10:06	4739	1098694741	JOSE LUIS SANABRIA GAMBOA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 16.500.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 16.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
12008	11/09/2026 10:06	4733	1098756313	JUAN SEBASTIAN CABEZA HERNANDEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 28.050.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 28.050.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO TOPOGRAFO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
12009	11/09/2026 10:07	4736	1098809542	CAMILA BRICEÑO CABALLERO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN LA COORDINACIÓN Y EL DESARROLLO DE DISEÑOS HIDROSANITARIOS DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS PRIORIZADOS POR EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, UTILIZANDO SUS PROPIOS MEDIOS INSTRUMENTOS Y RECURSOS, ASÍ COMO APOYAR EN DIFERENTES PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, Y DEMÁS ACCIONES REQUERIDAS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
12010	11/09/2026 10:08	4730	13746614	ELKIN JESUS HERNANDEZ GOMEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 16.500.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.82120.251 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 251	$ 16.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACION PUBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
12011	11/09/2026 10:08	4729	91517510	DIDIER ALEXANDER SUAREZ FAJARDO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 22.750.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 22.750.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA EJECUTAR EL DISEÑO, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS; ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA, CON EL OBJETIVODE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS POR LA SECRETARIA DE INFRAETRUCTURA DESDE EL AREA DE ALUMBRADO PÚBLICO
12012	11/09/2026 10:43	753	91251913	MIGUEL ANTONIO HERRERA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 9.700.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 9.700.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 753 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
12013	11/09/2026 10:43	408	63483023	LILIANA VALBUENA RINCON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 10.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 10.000.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 408 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL Y DE GESTION QUE SE EJECUTAN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.
12014	11/09/2026 10:44	502	1007726234	JENITH KATHERINE DUARTE GALVIS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 14.520.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 14.520.000,00	ADICIONA NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 502 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
12015	11/09/2026 10:44	696	79710194	CARLOS ALBERTO CARDENAS LOPEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 19.600.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 19.600.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 696 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y LA LIQUIDACION DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS QUE EJECUTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
12016	11/09/2026 10:45	928	1098722762	OSCAR MAURICIO COTE VALDERRAMA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 19.200.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83213.251 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 251	$ 19.200.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 928 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
12017	11/09/2026 10:45	366	63318086	JUDITH ORTIZ CELIS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 20.000.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 366 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
12018	11/09/2026 10:46	717	1096206095	CHARO LIZET MANTILLA JARAMILLO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 19.400.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 19.400.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 717 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
12019	11/09/2026 10:47	950	63499554	MONICA JOHANNA IGLESIAS ACEVEDO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 21.120.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 21.120.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 950 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
12020	11/09/2026 10:47	516	1092354965	MANUEL JOSE BRICEÑO VERA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 13.066.666,67	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 13.066.666,67	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 516 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
12021	11/09/2026 10:48	945	1095831058	JUAN DAVID GOMEZ HERNANDEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 17.600.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 17.600.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 945 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL PARA LA PUBLICACIÓN, INTERACCIÓN Y PROMOCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.
12022	11/09/2026 10:49	583	91242153	RAUL CARRILLO ZARATE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 19.600.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 19.600.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 583 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
12023	11/09/2026 10:49	891	1005324483	ASHLYE JOHANNA ORTIZ LARROTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 19.200.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 19.200.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 891 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
12024	11/09/2026 10:50	820	5685121	ARNULFO OROZCO TORRES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 17.783.333,33	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 17.783.333,33	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 820 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
12055	11/09/2026 13:45	66	901702151	MAAS INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 185.239.583,00	2.3.2.02.02.005.20246800100045.2.4002022.85970.251 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE 251	$ 185.239.583,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 66 DEL 15 DE ABRIL DE 2026, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS EQUIPAMIENTO Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
12056	11/09/2026 13:47	65	902043077	CONSORCIO PARQUES 477	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 1.319.749.362,00	2.3.2.02.02.005.20246800100045.2.4002022.85970.213 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE 213	$ 804.988.945,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 3 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 65 DEL 15 DE ABRIL DE 2026, CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS EQUIPAMIENTO Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER
12056	11/09/2026 13:47	65	902043077	CONSORCIO PARQUES 477	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ -	2.3.2.02.02.005.20246800100045.2.4002022.85970.251 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE 251	$ 514.760.417,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 3 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 65 DEL 15 DE ABRIL DE 2026, CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS EQUIPAMIENTO Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER
12065	11/09/2026 18:00	390	13616548	RAUL FERNANDO FONTECHA PEÑA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 20.000.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 390 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
12073	11/09/2026 18:57	378	88208576	JUAN CARLOS BAUTISTA LOBO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 18.333.333,33	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 18.333.333,33	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 378 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
12107	14/09/2026 10:45	699	1085097827	LADYS CONSUELO TORRES TORRES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 21.560.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 21.560.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 699 DE 2026, CUYO OBJETO ES:PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
12108	14/09/2026 10:46	697	79127641	HECTOR ALFONSO RODRIGUEZ GARNICA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 19.763.333,33	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 19.763.333,33	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 697 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
12109	14/09/2026 10:46	745	1005684787	ROXANA CAROLINA ALVAREZ SALCEDO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.933.333,33	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 12.933.333,33	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 745 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.
12110	14/09/2026 10:47	837	1098682097	DIEGO FERNANDO BETANCURT PINZON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 19.400.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 19.400.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 837 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
12111	14/09/2026 10:47	794	1095911046	JAVIER ALEXANDER DURAN VERA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 21.016.666,67	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 21.016.666,67	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 794 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL ÁREA DE BANCO DE PROYECTOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
12112	14/09/2026 10:48	655	91541593	EFRAIN ANDRES SERRANO PLATA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 21.396.666,67	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 21.396.666,67	ADICIONAL NÚMERO 1 AL CONTRATO 655 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
12113	14/09/2026 10:48	612	13721222	BERNARDO ALVAREZ QUINTERO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 19.600.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 19.600.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 612 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
12114	14/09/2026 10:49	1001	1100951529	MARTHA LILIANA CAMACHO ALVAREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 18.800.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 18.800.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 1001 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
12115	14/09/2026 10:50	685	91298539	RAFAEL ANTONIO CHACON RIOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 21.560.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83213.251 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 251	$ 21.560.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 685 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
12147	14/09/2026 14:39	86	902066043	CONSORCIO INTER MALLA VIAL BGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 706.240.849,00	2.3.2.02.02.005.20250000036174.2.2402115.53211.588 - CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 588	$ 316.182.906,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 86 DEL 14 DE MAYO DE 2026, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA OBRA PÚBLICA DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER
12147	14/09/2026 14:39	86	902066043	CONSORCIO INTER MALLA VIAL BGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ -	2.3.2.02.02.005.20250000036174.2.2402115.53211.324 - CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS); CALLES 324	$ 390.057.943,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 86 DEL 14 DE MAYO DE 2026, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA OBRA PÚBLICA DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER
12148	14/09/2026 14:40	85	902059350	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAS BGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 9.286.785.386,00	2.3.2.02.02.005.20250000036174.2.2402115.53211.588 - CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 588	$ 3.972.173.119,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 085 DEL 14 DE MAYO DE 2026, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
12148	14/09/2026 14:40	85	902059350	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAS BGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ -	2.3.2.02.02.005.20250000036174.2.2402115.53211.324 - CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS); CALLES 324	$ 5.314.612.267,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 085 DEL 14 DE MAYO DE 2026, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
12150	14/09/2026 15:41	566	91508951	FERNANDO MIER MARTINEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 19.600.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 19.600.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 566 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
12152	14/09/2026 16:44	182	902102492	CONSORCIO POZO CS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 2.189.319.314,00	2.3.2.02.02.005.20246800100215.2.4003044.53290.215 - OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL 215	$ 2.189.319.314,00	CONSTRUCCION DE POZOS SEPTICOS PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTAL EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
12158	15/09/2026 9:12	1064	1098651339	JUAN LEONARDO PEÑARANDA MANOSALVA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 18.600.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.82120.251 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 251	$ 18.600.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 1064 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES JURIDICAS EN LOS PROYECTOS Y PROCESOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
12159	15/09/2026 9:13	803	91212669	OMAR BALLESTEROS BUENO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 16.166.666,67	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 16.166.666,67	ADICIONAL NÚMERO 1 AL CONTRATO 803 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNOLOGO EN TOPOGRAFIA PARA APOYAR LA PLANEACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
12160	15/09/2026 9:19	4799	1098777962	OMAR LEONARDO BARROSO ORTIZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 16.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.201 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 201	$ 9.240.000,01	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
12160	15/09/2026 9:19	4799	1098777962	OMAR LEONARDO BARROSO ORTIZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ -	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 6.759.999,99	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
12161	15/09/2026 9:20	4796	1102375681	MATEO BOHORQUEZ MUÑOZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 16.500.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 16.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.
12162	15/09/2026 9:21	4789	91226309	CRISTIAN REYES GOMEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 16.500.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83213.251 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 251	$ 16.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.
12214	15/09/2026 16:28	4802	91281345	CARLOS EDUARDO SANCHEZ SANCHEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 17.600.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 17.600.000,00	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
12225	15/09/2026 18:20	824	1098630399	JUAN CARLOS PLATA NAVARRO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 9.700.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 9.700.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 824 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
12226	16/09/2026 8:41	1069	91343327	CARLOS VICENTE PEDRAZA AGUDELO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 9.300.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 9.300.000,00	ADICIONAL NÚMERO 1 AL CONTRATO 1069 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
12227	16/09/2026 8:42	1067	5605285	FEDERICO ARIAS GARCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.460.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 20.460.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 1067 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
12228	16/09/2026 8:43	1023	1098707994	LADY DIANE MORANTES JAIME	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 18.800.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 18.800.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 1023 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
12241	16/09/2026 10:18	4823	1098805306	NARLY YADIRA BOHORQUEZ DURAN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 15.833.333,33	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 15.833.333,33	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO MECANICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
12242	16/09/2026 10:19	4826	1232892541	CRISTIAN SNEIDER BAUTISTA TORRES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 16.500.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 16.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA APOYAR EL DISEÑO, FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ESPACIO PÚBLICO, EQUIPAMIENTOS, PARQUES Y MOVILIDAD, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD
12243	16/09/2026 10:20	4820	13832172	JOSE CLEMENTE CORREA ALFONSO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 10.850.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 10.850.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ZONAS RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA
12244	16/09/2026 10:20	4815	1095930898	SERGIO ANDRES CAMARGO ORDOÑEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 13.200.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 13.200.000,00	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
12249	16/09/2026 10:47	4812	1019085997	JOHN HENRY CARRILLO HERNÁNDEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.85999.226 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 226	$ 12.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR EN TOPOGRAFÍA EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA – ALUMBRADO PÚBLICO, APOYANDO LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE EXPANSIÓN, REPOTENCIACIÓN, REPOSICIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA URBANA Y FUNCIONAL
12250	16/09/2026 10:48	4813	1098682511	JOSE FABIAN VALBUENA MACHUCA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 15.833.333,33	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.85999.226 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 226	$ 15.833.333,33	PRESTAR SERVICIOS COMO TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA –ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS CON LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE EXPANSIÓN, REPOTENCIACIÓN, REPOSICIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, ASÍ COMO EN LAS ACTIVIDADES DE APOYO REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LAS INTERVENCIONES DE ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA, URBANA Y FUNCIONAL”
12269	16/09/2026 16:22	2122	1098759024	DIEGO ALEXANDER LOPEZ OSORIO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 18.700.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 18.700.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 2122 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO EN ENERGIA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
12270	16/09/2026 16:22	1288	91466987	RICARDO BLANCO PEÑA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 10.794.666,67	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 10.794.666,67	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 1288 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE MAQUINARIA AMARILLA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.
12271	16/09/2026 16:23	943	13717147	NELSON ALBA CONTRERAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 14.080.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 14.080.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 943 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNÓLOGO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
12293	17/09/2026 10:27	1362	1098816293	JORGE LUIS BARAJAS CHANAGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 16.683.333,33	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 16.683.333,33	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 1362 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
12294	17/09/2026 10:28	1056	1098669846	ABNER ALEXEY RINCON SUAREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 15.500.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 15.500.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 1056 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.
12295	17/09/2026 10:29	1263	1098692371	JUAN SEBASTIAN REY SUAREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 24.533.333,33	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 24.533.333,33	ADICIONAL NÚMERO 1 AL CONTRATO 1263 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON MAESTRIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CALIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
12296	17/09/2026 10:32	4860	91212780	ALCIDES ACEVEDO ACEVEDO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 12.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNICO AMBIENTAL PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
12297	17/09/2026 10:33	4863	1098752603	MIGUEL ANGEL OSORIO GOMEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 21.700.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 21.700.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.
12298	17/09/2026 10:34	4852	1098743733	EDICSON CORTES RUIZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 17.050.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 17.050.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE OBRA, APU, CÁLCULO DE CANTIDADES, ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, GESTIÓN DE PRESUPUESTOS Y DEMÁS REQUERIDAS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
12299	17/09/2026 10:35	4874	1067867013	TATIANA MEDRANO LOPEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 22.166.666,67	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 22.166.666,67	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
12300	17/09/2026 10:36	4864	1098759226	DEISY CAROLINA JAIMES JAIMES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 26.350.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 26.350.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN LA ELABORACION DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS GEORREFERENCIADOS Y SUS RESPECTIVOS SOPORTES, CON SISTEMAS BASADOS EN TECNOLOGIAS Y VUELOS FOTOGRAMETRICOS, Y DEMÁS ACCIONES REQUERIDAS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
12301	17/09/2026 10:36	4868	1102373525	SERGIO ANDRES MARTINEZ CAMACHO|	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 15.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 15.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO FORTALECER PARA LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
12302	17/09/2026 10:38	4865	91108717	RICARDO ALFONSO RAMIREZ BOHORQUEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 21.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 21.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA COMO RESPONSABLE EN LA GESTION, PLANEAMIENTO Y COORDINACION DEL PROCESO Y ENTREGABLES A BANCO DE PROYECTOS Y PRECONTRACTUAL, DE LOS DIFERENTES PROYECTOS ESTRATEGICOS DEFINIDOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
12303	17/09/2026 10:38	4855	1098655403	EDWARD FABIAN CASTAÑEDA VILLAMIZAR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 23.100.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.82120.251 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 251	$ 23.100.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACION PUBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
12304	17/09/2026 10:39	4856	91208317	JOSE DE JESUS BLANCO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 9.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 9.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTUALES EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
12305	17/09/2026 10:41	161	901352999	LEBOLO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 114.212.702,00	2.3.2.02.02.005.202500000041555.2.4599011.53129.213 - OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 213	$ 114.212.702,00	ADECUACIÓN CENTRO TRANSITORIO JUVENIL CETRA - LA JOYA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”
12325	17/09/2026 14:24	4878	1096230987	JULIANA DEL PILAR DIAZ COBOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.82120.226 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 226	$ 18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN DENTRO DE SUS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
12326	17/09/2026 14:27	4877	1098612966	DAYRA GISELA DAZA BLANCO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.82120.226 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 226	$ 18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR JURÍDICAMENTE LA GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES (PQRS) Y EL SERVICIO AL CIUDADANO, EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PUBLICO
12327	17/09/2026 14:48	4871	1007898252	DAVID LEONARDO GAMBOA BUENO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 15.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010192.2.2102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	$ 15.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
12332	17/09/2026 16:42		890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 1.474.321.325,00	2.3.2.02.02.006.20246800101 92.2.2102069.69112.226 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD POR CUENTA PROPIA 226	$ 1.474.321.325,00	ENERGIA - ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/08/2026 AL30/08/2026 SEGÚN FACTURA 252403844 NUMERO DE CUENTA 1075933. 1
12338	18/09/2026 11:03	4884	37746363	MARTHA INES RINCON DIAZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100 49.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 12.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA APOYAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.
12339	18/09/2026 11:05	4885	1098798546	LUIS ERNESTO LOPEZ FLOREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 15.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100 49.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 15.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
12340	18/09/2026 11:12	4883	91481193	JOSE ALEJANDRO GOMEZ SUAREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 47.500.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100 49.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 47.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO ESPECIALISTA, EXPERTO EN PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EN LA GESTIÓN Y EL PLANTEAMIENTO DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
12341	18/09/2026 11:16	4891	50898735	TIVISAY DEL CARMEN PEREIRA PETRO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 15.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100 49.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 15.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO FORTALECER PARA LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
12342	18/09/2026 11:19	4908	91221923	RUPERTO REY TORRES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 10.500.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100 49.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 10.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
12343	18/09/2026 11:22	4909	1007784749	MARLON JOSE ESPITIA FONSECA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 15.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100 49.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 15.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL APOYO EN DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE ESPACIO PÚBLICO, EQUIPAMIENTOS, PARQUES O DE MOVILIDAD,Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE DEFINA LA DIRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL.
12360	18/09/2026 14:56	1000	1102355951	EMILIANO LARROTA CONDE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 9.400.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100 49.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 9.400.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 1000 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.
12361	18/09/2026 15:02	990	1096228039	JHOSIAS MONTESINOS BALLESTEROS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 15.500.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100 49.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 15.500.000,00	ADICIONAL NÚMERO 1 AL CONTRATO 990 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
12368	18/09/2026 15:35	185	902105214	CONSORCIO SANEAMIENTO AMBIENTAL 26	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 303.477.360,00	2.3.2.02.02.005.20246800102 15.2.4003044.53290.215 - OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL 215	$ 119.344.976,00	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE POZOS SEPTICOS PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTAL EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
12368	18/09/2026 15:35	185	902105214	CONSORCIO SANEAMIENTO AMBIENTAL 26	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ -	2.3.2.02.02.005.20246800102 15.2.4003044.53290.213 - OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL 213	$ 184.132.384,00	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE POZOS SEPTICOS PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTAL EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
12369	18/09/2026 15:37	1140	1098661124	LUIS CARLOS MONSALVE PULGARIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.150.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100 49.2.4599031.83213.251 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 251	$ 20.150.000,00	ADICIONAL NÚMERO 1 AL CONTRATO 1140 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
12371	18/09/2026 15:39	1008	13862036	LUIS FERNANDO QUIÑONES FLOREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 24.126.666,67	2.3.2.02.02.008.20246800100 49.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 24.126.666,67	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 1008 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
12373	18/09/2026 15:43	1244	1005109247	VICTOR DANIEL GALLEGO POSSO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 15.333.333,33	2.3.2.02.02.008.20246800100 49.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 15.333.333,33	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 1244 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA DISEÑO, EDICIÓN Y DIVULGACIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN TRADICIONALES Y DIGITALES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
12402	21/09/2026 9:32	4934	1098689027	MAYERLY PEREZ GALVIS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 10.500.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100 49.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 10.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
12403	21/09/2026 9:33	4920	91498010	ROBINSON MANTILLA GARCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100 49.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
12404	21/09/2026 9:34	4911	1193545801	PAULA LIZETH SUAREZ GONZALEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 9.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100 49.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 9.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
12405	21/09/2026 9:35	4910	91472838	SEGUNDO EXELINO QUITIAN SIFUENTES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 10.500.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100 49.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 10.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE CAMPO REQUERIDAS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, RELACIONADAS CON EL ACOMPAÑAMIENTO, REVISIÓN VISUAL, IDENTIFICACIÓN Y REPORTE DE LAS CONDICIONES DE LAS OBRAS E INTERVENCIONES DE INFRAESTRUCTURA QUE LE SEAN ASIGNADAS, TANTO EN EL SECTOR RURAL COMO URBANO, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD Y LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR EL SUPERVISOR
12406	21/09/2026 9:35	4915	13818263	ARMANDO MOGOLLON ROJAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 13.500.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100 49.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 13.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA – MOTONIVELADORA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
12447	21/09/2026 17:18	1352	13351098	LUIS ARTURO HERNANDEZ ORTIZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.020.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83213.251 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 251	$ 20.020.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 1352 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE EQUIPAMENTO URBANO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
12448	21/09/2026 17:20	1479	77194286	GERSON VEGA VARGAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 26.400.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 26.400.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 1479 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACION PUBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
12449	21/09/2026 17:20	1353	1098725013	DANIEL SANTIAGO SUAREZ CARVAJAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 19.716.666,67	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 19.716.666,67	ADICIONAL NÚMERO 1 AL CONTRATO 1353 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
12458	22/09/2026 8:08	4972	1099371419	SILVIA DANIELA CRUZ CELIS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100192.2.2102069.82120.226 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 226	$ 18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN DENTRO DE SUS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
12459	22/09/2026 8:09	4956	1102725640	NICOLAS ENRIQUE BELLO MARIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 16.500.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100192.2.2102069.82120.226 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 226	$ 16.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO Y DEMÁS ASUNTOS JURÍDICOS EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
12461	22/09/2026 10:06	4995	1098691685	LILIA VIVIANA PORRAS PLATA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 15.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 5.600.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA PUBLICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
12461	22/09/2026 10:06	4995	1098691685	LILIA VIVIANA PORRAS PLATA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ -	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 9.400.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA PUBLICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
12462	22/09/2026 10:07	4969	1096065882	KAROL ADRIANA ROJAS CARREÑO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 9.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 9.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
12463	22/09/2026 10:08	4973	13511138	HENRY DUARTE PRADA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 15.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 15.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
12464	22/09/2026 10:09	4967	1098669713	FREDDY ANDRES HERNANDEZ ACERO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 15.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 15.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTROMECANICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.
12465	22/09/2026 10:10	4987	91476321	CRISTIAN JAVIER ARDILA CARDENAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 24.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 24.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA COMO INGENIERO DE ARTICULACIÓN, INTEGRACIÓN Y APOYO A LA COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN Y EL PLANEAMIENTO DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO DIFERENTES PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, Y DEMÁS ACCIONES REQUERIDAS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
12466	22/09/2026 10:11	4971	91297378	FERNANDO JOSE JAIMES PLATA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 28.500.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 28.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
12539	23/09/2026 10:20	5040	1098688715	DARIO JOSE URIBE RIOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.900.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 12.900.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
12540	23/09/2026 10:21	5030	74243658	ALEX SAMUEL PERALTA SAAVEDRA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 14.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 14.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
12541	23/09/2026 10:22	5018	1099370458	ANDRES FERNNEY BARAJAS BARAJAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 10.500.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 10.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
12542	23/09/2026 10:23	5022	37513355	ADRIANA MARGARITA ESTEVEZ MANRIQUE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.600.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 12.600.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.
12543	23/09/2026 10:24	5005	1005479942	BRAYAN SNEYDER GOMEZ REMOLINA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 15.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83213.251 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO RESIDENCIALES 251	$ 15.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.
12544	23/09/2026 10:18	5001	28151038	LAURA MARCELA CASTILLO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA VERIFICACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SALUD, SEGURIDAD,MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD (HSEQ) EN DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
12545	23/09/2026 10:19	5011	1098695564	ANGELA MARIA CORREA MENDOZA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.600.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 12.600.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
12640	24/09/2026 14:26	5126	63319325	JANNETH CECILIA GARCIA LOZANO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 11.200.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 11.200.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNICO AMBIENTAL PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
12641	24/09/2026 14:26	5122	1098620663	LUDWIN FERNEY VALENCIA JAIMES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 16.800.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 16.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN LA COORDINACION Y EL DESARROLLO DE DISEÑOS HIDROSANITARIOS DE LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS PRIORIZADOS POR EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, UTILIZANDO SUS PROPIOS MEDIOS INSTRUMENTOS Y RECURSOS, ASÍ COMO APOYAR EN DIFERENTES PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, Y DEMÁS ACCIONES REQUERIDAS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
12642	24/09/2026 14:27	5125	1098768589	MONICA TATIANA HERRERA GAMBOA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 14.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 14.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.
12643	24/09/2026 14:29	5121	13740900	JOSE VIRGILIO CORZO VERA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 14.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 14.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
12644	24/09/2026 14:30	5115	1049610599	CARLOS ANDRES GIL RODRIGUEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 14.000.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 14.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
12645	24/09/2026 14:31	5064	91351543	MIGUEL ANGEL REY BECERRA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.600.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 12.600.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
12646	24/09/2026 14:32	5063	71763171	IVAN DARIO BERNAL VELEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 8.400.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 8.400.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
12647	24/09/2026 14:33	5061	13510493	CRISTIAN LEONARDO CAÑAS MARISCAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 9.800.000,00	2.3.2.02.02.008.2024680010049.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 9.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
12649	24/09/2026 14:38	825	63348331	LILIANA CARVAJAL SALAMANCA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.300.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 20.300.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 825 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
12732	25/09/2026 9:27	5179	1102368943	EDGAR MAURICIO MARTINEZ URREA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 14.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 14.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO TOPOGRAFO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
12733	25/09/2026 9:27	5168	1098766059	WENDY JULIETH LUNA RAMIREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 14.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 14.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.
12734	25/09/2026 9:28	5173	1098707991	JHON JESUS PEREZ OLIVELLA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 15.400.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 15.400.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN LA ELABORACION DE PRESUPUESTOS DE OBRA, APU, CALCULO DE CANTIDADES, EN ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PROGRAMACION DE OBRA, GESTION DE PRESUPUESTOS Y DEMÁS REQUERIDAS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
12735	25/09/2026 9:28	5131	91539613	LUIS CARLOS GOMEZ TRIMIÑO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 14.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 14.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.
12848	25/09/2026 17:47	197	800009677	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN IGNACIO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 328.789.994,00	2.3.2.02.02.005.20260000011531.2.2402042.53211.588 - CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 588	$ 328.789.994,00	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN IGNACIO DEL CORREGIMIENTO 1, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, ATRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER
12850	25/09/2026 18:06	196	800008791	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN PEDRO BAJO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 352.467.680,00	2.3.2.02.02.005.20260000011531.2.2402042.53211.588 - CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 588	$ 352.467.680,00	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN PEDRO BAJO DEL CORREGIMIENTO 1, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, ATRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER
12851	25/09/2026 19:18	198	901877357	JUNTA DE ACCION COMUNAL "CUCHILLA ALTA"	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 394.139.686,00	2.3.2.02.02.005.20260000011531.2.2402042.53211.588 - CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 588	$ 394.139.686,00	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CUCHILLA ALTA DEL CORREGIMIENTO DOS (02), PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
12852	25/09/2026 19:25	199	901913158	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BOLARQUI BAJO DEL CORREGIMIENTO DOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 394.139.957,00	2.3.2.02.02.005.20250000035592.2.2402042.53211.289 - CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 289	$ 394.139.957,00	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BOLARQUI BAJO DEL CORREGIMIENTO 2, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, ATRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER
12853	25/09/2026 20:25	200	804004619	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GUALILO PARTE ALTA DEL CORREGIMIENTO TRES (3)	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 394.140.643,00	2.3.2.02.02.005.20260000011531.2.2402042.53211.588 - CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 588	$ 394.140.643,00	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUALILO ALTO DEL CORREGIMIENTO 3, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDE
12854	26/09/2026 9:24	1121	37750599	YAIR GRICELDA LIZARAZO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 6.820.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 6.820.000,00	ADICIONAL NUMERO 1 AL CONTRATO NO. 1121 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
12855	26/09/2026 9:25	201	900299316	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA RETIRO CHIQUITO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANG	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 328.790.400,00	2.3.2.02.02.005.20260000011531.2.2402042.53211.588 - CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS CALLES 588	$ 328.790.400,00	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RETIRO CHIQUITO DEL CORREGIMIENTO TRES (03), DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER
12856	26/09/2026 9:52	5257	901703816	GAMA SERVICIOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS SAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 22.880.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.82120.251 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 251	$ 22.880.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REPRESENTACION JURIDICA Y DE DEFENSA JUDICIAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
12857	26/09/2026 9:54	5254	91219565	JAIRO NUNEZ TRUJILLO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 9.800.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 9.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
12858	26/09/2026 9:55	5258	1091666950	LEIDY PEÑA FLOREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 14.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.82120.251 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 251	$ 14.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
12859	26/09/2026 9:57	5253	1098770229	LAURA MELISSA ESPINOSA RAMIREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 11.200.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 11.200.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
12860	26/09/2026 9:58	5256	1004860195	MANUEL FERNANDO CASTILLA TARAZONA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.500.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83321.251 - SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 251	$ 12.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
12861	26/09/2026 9:59	5255	1005334440	GABRIELA ESTUPIÑAN QUIJANO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 14.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.82120.201 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIN JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 201	$ 14.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
12862	26/09/2026 10:00	5252	1010179006	BLANCA PAOLA MEDINA RAMIREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 15.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.82120.251 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 251	$ 15.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
12863	26/09/2026 10:02	5251	1102361930	DIEGO ESTEBAN SANCHEZ ORTIZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 8.750.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 8.750.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
12864	26/09/2026 10:03	5247	79643218	EDWIN EDUARDO PERILLA SERRANO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.790.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 20.790.000,00	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
12865	26/09/2026 10:05	5248	1102387506	EDWAR JAVIER PEREZ JAIMES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 8.750.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 8.750.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
12866	26/09/2026 10:06	5249	91221194	GERARDO ALFONSO ARDILA FRANCO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 9.800.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 9.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
12867	26/09/2026 10:07	5250	91267192	EDISSON QUIROZ MENDEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 9.800.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 9.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
12868	26/09/2026 10:10	5229	1007193755	JUREINNY DAYANNA LUNA RUEDA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 14.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.82120.251 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 251	$ 14.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
12869	26/09/2026 10:11	5246	1102376476	NORELYSS GAHONA VELANDIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 9.800.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.85999.251 - OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 251	$ 9.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
12870	26/09/2026 10:12	5236	1098761827	GERMAN DARIO BUENAHORA VARGAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 14.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 14.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.
12871	26/09/2026 10:13	5195	1098701902	CARLOS ANDRES ESCOBAR VALBUENA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 15.400.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 15.400.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.
12872	26/09/2026 10:14	5207	1098751599	WALDIR DURFRED DURAN ROJAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 15.400.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 15.400.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN LA ELABORACION DE PRESUPUESTOS DE OBRA, APU, CALCULO DE CANTIDADES, EN ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PROGRAMACION DE OBRA, GESTION DE PRESUPUESTOS Y DEMÁS REQUERIDAS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
12873	26/09/2026 11:49	202	804006540	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LA SALLE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 731.349.375,00	2.3.2.02.02.005.20260000011370.2.4002020.53270.588 - INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO 588	$ 731.349.375,00	UNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL, DEL BARRIO LA SALLE COMUNA 6; PARA LA ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTO PRIORIZADO MEDIANTE EL EJERCICIOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
12915	28/09/2026 12:49	171	902100771	UT COMPU 26 SOCAMUL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 47.440.064,00	2.3.2.02.01.004.20246800100049.2.4599031.4526601.201 - IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 201	$ 47.440.064,00	ADICIONAL EN VALOR NO. 1 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 171 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2026 CUYO OBJETO ES “ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES, IMPRESORA MULTIFUNCIONALES, IMPRESORAS DE TARJETAS Y ESCÁNERES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIDAD Y ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL – CAM.”
12971	28/09/2026 15:53	5241	52337953	MARIA PAOLA URIBE CORDOBA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.500.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100192.2.2102069.83990.226 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 226	$ 12.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DISEÑO, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS Y PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, ORIENTADOS A LA DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, PROYECTOS, PROGRAMAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
12994	29/09/2026 9:14	5322	1098802786	FABIAN ALBERTO RONDON GERARDINO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 26.600.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 26.600.000,00	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
12995	29/09/2026 9:16	5321	1095838599	MATEO ALVAREZ TORRADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 26.600.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501	$ 1.333.333,33	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
12995	29/09/2026 9:16	5321	1095838599	MATEO ALVAREZ TORRADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ -	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.201 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. 201	$ 344.741,32	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
12995	29/09/2026 9:16	5321	1095838599	MATEO ALVAREZ TORRADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ -	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 22.393.333,32	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
12995	29/09/2026 9:16	5321	1095838599	MATEO ALVAREZ TORRADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ -	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 2.528.592,03	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
12996	29/09/2026 9:17	5320	27615207	LUZ MARINA TORRADO GOMEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 26.600.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 26.600.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE ESTABILIDAD DE LOS TALUDES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS.
12997	29/09/2026 9:18	5319	91473815	JOSE ALBERTO RONDON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 26.600.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.501 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 501	$ 1.900.000,00	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
12997	29/09/2026 9:18	5319	91473815	JOSE ALBERTO RONDON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ -	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 24.700.000,00	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
12998	29/09/2026 9:19	5309	1098685534	JUAN LUDWING HERNANDEZ DIAZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 15.000.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.83990.251 - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES N C P 251	$ 15.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
12999	29/09/2026 9:21	5306	1007536606	JEFFERSSON ALEXIS DURAN CARRILLO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.500.000,00	2.3.2.02.02.008.20246800100049.2.4599031.82120.251 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO 251	$ 12.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACION PUBLICA EN TODAS LAS ETAPAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

RELACION PERSONAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	183	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA LUCIA	DURAN AGUIRRE	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 20.800.000,00	19/08/2026	9/09/2026	22/12/2026
2026	184	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MAYCOL ESTIVEN	MORALES ARIAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PETRÓLEOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 26.693.333,33	19/08/2026	9/09/2026	22/12/2026
2026	195	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENELDA	GOMEZ NIÑO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO ESPECIALIZADO PARA APOYAR EL ÁREA PRESUPUESTAL EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 22.880.000,00	28/08/2026	9/09/2026	22/12/2026
2026	196	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANDREA JULIANA	SUAREZ LEAL	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 22.880.000,00	28/08/2026	9/09/2026	22/12/2026
2026	203	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FABIO ANDRES	BUENO ARAQUE	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.800.000,00	4/09/2026	9/09/2026	22/12/2026
2026	215	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANA MARIA	LIZARAZO BECERRA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 17.333.333,33	28/08/2026	9/09/2026	22/12/2026
2026	217	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	NUBIA CONSTANZA	VALENCIA PINZON	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA APOYAR LOS SISTEMAS FINANCIEROS Y DE INFORMACION ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 22.880.000,00	28/08/2026	9/09/2026	22/12/2026
2026	221	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	IVAN ENRIQUE	CASTELLANOS JAIMES	PRESTAR SERVICIOS COMO TECNOLOGO PARA BRINDAR APOYO A LA GESTIÓN EN EL AREA DE CONTRATACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 15.253.333,33	2/09/2026	9/09/2026	22/12/2026
2026	236	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	YEISSON LEANDRO	POTES REYES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS, PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 22.660.000,00	28/08/2026	10/09/2026	22/12/2026
2026	238	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA PATRICIA	MONSALVE MONSALVE	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER EL AREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 15.106.666,67	31/08/2026	10/09/2026	22/12/2026
2026	241	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	KAREN MARCELA	GUTIERREZ BARRAGAN	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 17.166.666,67	2/09/2026	10/09/2026	22/12/2026
2026	244	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIEGO RAUL	VILLAVECES SUAREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PETRÓLEOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 32.616.666,67	21/08/2026	10/09/2026	22/12/2026
2026	247	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CATHERIN ROCIO	DE ALBA MENDEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTION DOCUMENTAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 26.436.666,67	21/08/2026	10/09/2026	22/12/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	249	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	VIVIANA MARCELA	CUADROS VALBUENA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.600.000,00	1/09/2026	10/09/2026	22/12/2026
2026	251	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	VANESSA	CABANZO ARDILA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR PÚBLICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.600.000,00	2/09/2026	10/09/2026	22/12/2026
2026	252	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOHANA ANDREA	ORTIZ OLAGO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 20.600.000,00	1/09/2026	10/09/2026	22/12/2026
2026	262	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PAULA ALEJANDRA	CELIS VEGA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 12.016.666,67	28/08/2026	10/09/2026	22/12/2026
2026	264	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JHON JAIRO	BARAJAS LIZCANO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CALIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 15.106.666,67	2/09/2026	10/09/2026	22/12/2026
2026	270	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUDITH	BUENO LIZARAZO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN TODAS SUS ETAPAS, PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA	$ 24.376.666,67	31/08/2026	10/09/2026	22/12/2026
2026	271	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ZARETH YULENY	MOTTA PABON	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 18.883.333,33	31/08/2026	10/09/2026	22/12/2026
2026	272	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DANIEL EDUARDO	JAIMES RUIZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 22.660.000,00	31/08/2026	10/09/2026	22/12/2026
2026	274	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	VALENTINA	URIBE PAEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 20.600.000,00	31/08/2026	10/09/2026	22/12/2026
2026	277	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE TOMAS	ZULUAGA FLOREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 20.600.000,00	31/08/2026	10/09/2026	22/12/2026
2026	281	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JHON FREDDY	RAMIREZ JAIMES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 20.600.000,00	1/09/2026	10/09/2026	22/12/2026
2026	283	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EXNEYQUER	VILLAMIZAR BARAJAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE EQUIPAMENTO URBANO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 18.883.333,33	2/09/2026	10/09/2026	22/12/2026
2026	287	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ERIKA LILIANA	VARGAS ROA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA APOYAR EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA-	$ 20.600.000,00	31/08/2026	10/09/2026	22/12/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	290	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ROSALBA	GONZALEZ CORZO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 10.333.333,33	1/09/2026	13/09/2026	22/12/2026
2026	297	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ERWING LEONARDO	ARIAS CANO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 26.436.666,67	19/08/2026	10/09/2026	22/12/2026
2026	302	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN SEBASTIAN	ARIAS CANO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 20.600.000,00	31/08/2026	10/09/2026	22/12/2026
2026	323	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	XIOMARA YULIANI	BERNAL CARDENAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA APOYAR EL DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 20.000.000,00	31/08/2026	13/09/2026	22/12/2026
2026	326	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA PAULA	APARICIO GARZON	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 22.000.000,00	31/08/2026	13/09/2026	22/12/2026
2026	332	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SONIA	RODRIGUEZ PEDROZA	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 10.000.000,00	1/09/2026	13/09/2026	22/12/2026
2026	336	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LINA MARCELA	ROMERO GUARGUATI	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 16.666.666,67	2/09/2026	13/09/2026	22/12/2026
2026	342	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DAYANA CRISTINA	ARENAS BAYONA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 20.000.000,00	31/08/2026	13/09/2026	22/12/2026
2026	343	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CLAUDIA MILENA	SANCHEZ QUIROGA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 20.000.000,00	2/09/2026	13/09/2026	22/12/2026
2026	344	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANDRES FELIPE	DUEÑAS SANCHEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA APOYAR EL AREA DE BANCO DE PROYECTOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.000.000,00	1/09/2026	13/09/2026	22/12/2026
2026	346	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CLAUDIA INES	PACHECO MEZA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO Y RESPUESTA OPORTUNA DE LAS PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 18.333.333,33	31/08/2026	13/09/2026	22/12/2026
2026	347	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANGIE LIZETH	ARIAS NIETO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 14.666.666,67	31/08/2026	13/09/2026	22/12/2026
2026	349	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CLAUDIA AZUCENA	RODRIGUEZ CAMACHO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REPARTO, SEGUIMIENTO Y RESPUESTA OPORTUNA DE LAS PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 25.666.666,67	19/08/2026	13/09/2026	22/12/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	351	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	IVONNE VANESSA	LANDAZABAL VALBUENA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 18.333.333,33	31/08/2026	13/09/2026	22/12/2026
2026	354	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ADRIANA DEL ROSARIO	CUENTAS MORENO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS TEMAS DE DEFENSA JUDICIAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA	$ 25.666.666,67	19/08/2026	13/09/2026	22/12/2026
2026	355	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA ELENA	GUTIERREZ DUARTE	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE DEFENSA JUDICIAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 21.666.666,67	1/09/2026	13/09/2026	22/12/2026
2026	356	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA DEL PILAR	HOYOS MONT	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA VERIFICACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD (HSEQ) EN DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA,	$ 20.000.000,00	31/08/2026	13/09/2026	22/12/2026
2026	357	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUIS CARLOS	BARRERA ANGEL	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 18.333.333,33	2/09/2026	13/09/2026	22/12/2026
2026	358	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA ALEJANDRA	GALAN BARAJAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR LOS PROCESOS DE GESTION DE CALIDAD EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 20.000.000,00	31/08/2026	13/09/2026	22/12/2026
2026	359	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANGIE DANIELA	FIGUEROA TORRES	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 14.666.666,67	31/08/2026	13/09/2026	22/12/2026
2026	364	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIANA CAROLINA	CARRILLO RIVEROS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO ESPECIALIZADO PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 25.666.666,67	21/08/2026	13/09/2026	22/12/2026
2026	366	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUDITH	ORTIZ CELIS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 20.000.000,00	9/09/2026	13/09/2026	22/12/2026
2026	367	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARQUEZA	GONZALEZ SERENO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 20.166.666,67	1/09/2026	13/09/2026	22/12/2026
2026	370	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN FELIPE	RODRIGUEZ ARAMBULA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 22.000.000,00	31/08/2026	13/09/2026	22/12/2026
2026	372	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE ANTONIO	FLOREZ POVEDA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 19.200.000,00	1/09/2026	17/09/2026	22/12/2026
2026	376	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LINA ANDREA	MOSQUERA VARGAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 20.000.000,00	31/08/2026	13/09/2026	22/12/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	378	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN CARLOS	BAUTISTA LOBO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 18.333.333,33	11/09/2026	13/09/2026	22/12/2026
2026	383	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JENNY PAOLA	RODRIGUEZ PEREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS ESPECIALIZADO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTUALES EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	$ 23.760.000,00	1/09/2026	13/09/2026	30/12/2026
2026	390	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	RAUL FERNANDO	FONTECHA PEÑA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 20.000.000,00	11/09/2026	13/09/2026	22/12/2026
2026	400	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	BONIFACIO	FLOREZ ANTELIZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 20.000.000,00	2/09/2026	13/09/2026	22/12/2026
2026	401	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	RAUL ENRIQUE	MERLO ARGUELLO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA .	$ 14.666.666,67	1/09/2026	13/09/2026	22/12/2026
2026	404	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MABEL LUCIA	HERRERA AMOROCHO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 19.800.000,00	3/09/2026	14/09/2026	22/12/2026
2026	408	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LILIANA	VALBUENA RINCON	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL Y DE GESTION QUE SE EJECUTAN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 10.000.000,00	8/09/2026	13/09/2026	22/12/2026
2026	499	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	BRAYAN JESID	OVIEDO CASTILLO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 14.850.000,00	3/09/2026	14/09/2026	22/12/2026
2026	501	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANDRES FERNANDO	MARTINEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO ESPECIALIZADO PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 21.780.000,00	2/09/2026	14/09/2026	22/12/2026
2026	502	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JENITH KATHERINE	DUARTE GALVIS	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 14.520.000,00	8/09/2026	14/09/2026	22/12/2026
2026	516	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MANUEL JOSE	BRICEÑO VERA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 13.066.666,67	9/09/2026	15/09/2026	22/12/2026
2026	518	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JAIME LUIS	PARRA VERGARA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA APOYAR EL ÁREA DE BANCO DE PROYECTOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 19.600.000,00	8/09/2026	15/09/2026	22/12/2026
2026	525	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MABEL NAYIBE	RUEDA DELGADO	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER EL AREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 16.333.333,33	3/09/2026	15/09/2026	22/12/2026
2026	530	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PAOLA ALEJANDRA	GARCIA GALAN	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 19.600.000,00	4/09/2026	15/09/2026	22/12/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	552	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LIZETH ANDREA	RENGIFO CASTRO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 19.600.000,00	7/09/2026	15/09/2026	22/12/2026
2026	566	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FERNANDO	MIER MARTINEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 19.600.000,00	3/09/2026	15/09/2026	22/12/2026
2026	582	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CRISTIAN CAMILO	GARCIA TRUJILLO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PROMOCION Y DIVULGACION EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN TRADICIONALES Y DIGITALES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 17.966.666,67	7/09/2026	15/09/2026	22/12/2026
2026	583	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	RAUL	CARRILLO ZARATE	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 19.600.000,00	9/09/2026	15/09/2026	22/12/2026
2026	592	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LAURA REGINA	LOPEZ PRIETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 23.193.333,33	8/09/2026	15/09/2026	22/12/2026
2026	608	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	GRACIELA	RODRIGUEZ PEDROZA	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 9.800.000,00	3/09/2026	15/09/2026	22/12/2026
2026	612	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	BERNARDO	ALVAREZ QUINTERO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 19.600.000,00	10/09/2026	15/09/2026	22/12/2026
2026	644	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARLY YOLIMA	ARDILA MANTILLA	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA APOYAR EL AREA DE BANCO DE PROYECTOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 19.600.000,00	7/09/2026	15/09/2026	22/12/2026
2026	648	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIEGO FERNANDO	RAMIREZ SARMIENTO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 19.600.000,00	4/09/2026	15/09/2026	22/12/2026
2026	655	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EFRAIN ANDRES	SERRANO PLATA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA	$ 21.396.666,67	10/09/2026	15/09/2026	22/12/2026
2026	656	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LEYDY ANDREA	MANTILLA CARDONA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS ESPECIALIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 25.153.333,33	19/08/2026	15/09/2026	22/12/2026
2026	685	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	RAFAEL ANTONIO	CHACON RIOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 21.560.000,00	11/09/2026	15/09/2026	22/12/2026
2026	696	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CARLOS ALBERTO	CARDENAS LOPEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y LA LIQUIDACION DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS QUE EJECUTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 19.600.000,00	9/09/2026	15/09/2026	22/12/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	697	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HECTOR ALFONSO	RODRIGUEZ GARNICA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 19.763.333,33	8/09/2026	15/09/2026	22/12/2026
2026	699	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LADYS CONSUELO	TORRES TORRES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 21.560.000,00	8/09/2026	15/09/2026	22/12/2026
2026	704	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	WILLIAM JOSE	CALA VALBUENA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS QUE EJECUTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 16.333.333,33	3/09/2026	15/09/2026	22/12/2026
2026	707	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SEIDY JULIETH	GARCIA ROZO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 21.560.000,00	4/09/2026	15/09/2026	22/12/2026
2026	710	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE DAVID	VERA GAMBOA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 19.600.000,00	3/09/2026	15/09/2026	22/12/2026
2026	717	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CHARO LIZET	MANTILLA JARAMILLO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 19.400.000,00	9/09/2026	16/09/2026	22/12/2026
2026	745	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ROXANA CAROLINA	ALVAREZ SALCEDO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 12.933.333,33	9/09/2026	16/09/2026	22/12/2026
2026	753	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MIGUEL ANTONIO	HERRERA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 9.700.000,00	4/09/2026	16/09/2026	22/12/2026
2026	794	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JAVIER ALEXANDER	DURAN VERA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL ÁREA DE BANCO DE PROYECTOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 21.016.666,67	9/09/2026	16/09/2026	22/12/2026
2026	802	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	GIOVANI	GUALTEROS AGUILLON	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 17.783.333,33	4/09/2026	16/09/2026	22/12/2026
2026	803	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OMAR	BALLESTEROS BUENO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNOLOGO EN TOPOGRAFIA PARA APOYAR LA PLANEACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 16.166.666,67	14/09/2026	16/09/2026	22/12/2026
2026	806	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	VANESSA ASHLIE BRIGGITH	PLATA VARGAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 16.166.666,67	4/09/2026	16/09/2026	22/12/2026
2026	815	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	RAFAEL ANDRES	HINESTROZA MARTINEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 21.340.000,00	7/09/2026	16/09/2026	22/12/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	820	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ARNULFO	OROZCO TORRES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 17.783.333,33	9/09/2026	16/09/2026	22/12/2026
2026	821	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN DIEGO	NORIEGA CACERES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 19.400.000,00	4/09/2026	16/09/2026	22/12/2026
2026	824	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN CARLOS	PLATA NAVARRO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 9.700.000,00	14/09/2026	16/09/2026	22/12/2026
2026	825	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LILIANA	CARVAJAL SALAMANCA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 20.300.000,00	22/09/2026	26/09/2026	22/12/2026
2026	826	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JAVIER MAURICIO	PARRA RODRIGUEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 19.400.000,00	7/09/2026	16/09/2026	22/12/2026
2026	827	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JULIETH ANDREA	LEIVA NEIRA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNÓLOGO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 14.226.666,67	4/09/2026	16/09/2026	22/12/2026
2026	832	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	VICTOR ELIAS	MENESES AGRESOTH	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE EQUIPAME URBANO EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 19.400.000,00	7/09/2026	16/09/2026	22/12/2026
2026	837	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIEGO FERNANDO	BETANCURT PINZON	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 19.400.000,00	8/09/2026	16/09/2026	22/12/2026
2026	838	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CARLOS MAURICIO	AREVALO CHINCHILLA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 19.400.000,00	7/09/2026	16/09/2026	22/12/2026
2026	849	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EDUARDO	TORRES QUINTANA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNOLOGO EN TOPOGRAFIA PARA APOYAR LA PLANEACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 16.166.666,67	7/09/2026	16/09/2026	22/12/2026
2026	891	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ASHLYE JOHANNA	ORTIZ LARROTA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 19.200.000,00	9/09/2026	17/09/2026	22/12/2026
2026	898	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOHN JEFFERSON	MORENO RODRIGUEZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR APOYO AL SEGUIMIENTO Y RESPUESTA OPORTUNA DE LAS PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 15.106.666,67	4/09/2026	17/09/2026	22/12/2026
2026	922	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SILVIA ALEJANDRA	PINTO BOHORQUEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 19.200.000,00	7/09/2026	17/09/2026	22/12/2026
2026	924	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	KAREN JULIETH	GUALDRON CHAPARRO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 19.200.000,00	7/09/2026	17/09/2026	22/12/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	928	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OSCAR MAURICIO	COTE VALDERRAMA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 19.200.000,00	9/09/2026	17/09/2026	22/12/2026
2026	943	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	NELSON	ALBA CONTRERAS	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNÓLOGO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 14.080.000,00	14/09/2026	17/09/2026	22/12/2026
2026	945	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN DAVID	GOMEZ HERNANDEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL PARA LA PUBLICACIÓN, INTERACCIÓN Y PROMOCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 17.600.000,00	9/09/2026	17/09/2026	22/12/2026
2026	950	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MONICA JOHANNA	IGLESIAS ACEVEDO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 21.120.000,00	9/09/2026	17/09/2026	22/12/2026
2026	990	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JHOSIAS	MONTESINOS BALLESTEROS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 15.500.000,00	16/09/2026	20/09/2026	22/12/2026
2026	1000	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EMILIANO	LARROTA CONDE	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.	$ 9.400.000,00	16/09/2026	19/09/2026	22/12/2026
2026	1001	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARTHA LILIANA	CAMACHO ALVAREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 18.800.000,00	11/09/2026	19/09/2026	22/12/2026
2026	1008	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUIS FERNANDO	QUIÑONES FLOREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 24.126.666,67	17/09/2026	19/09/2026	22/12/2026
2026	1023	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LADY DIANE	MORANTES JAIME	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 18.800.000,00	11/09/2026	19/09/2026	22/12/2026
2026	1056	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ABNER ALEXEY	RINCON SUAREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 15.500.000,00	11/09/2026	20/09/2026	22/12/2026
2026	1064	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN LEONARDO	PEÑARANDA MANOSALVA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES JURIDICAS EN LOS PROYECTOS Y PROCESOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 18.600.000,00	11/09/2026	20/09/2026	22/12/2026
2026	1067	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FEDERICO	ARIAS GARCIA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 20.460.000,00	11/09/2026	20/09/2026	22/12/2026
2026	1068	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JAIRO	ESPINOSA MORENO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA”	$ 1.300.000,00	17/07/2026	20/07/2026	2/08/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	1069	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CARLOS VICENTE	PEDRAZA AGUDELO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA	$ 9.300.000,00	11/09/2026	20/09/2026	22/12/2026
2026	1121	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	YAIR GRICELDA	LIZARAZO	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 6.820.000,00	23/09/2026	21/10/2026	22/12/2026
2026	1140	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUIS CARLOS	MONSALVE PULGARIN	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 20.150.000,00	18/09/2026	20/09/2026	22/12/2026
2026	1227	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE CAMILO	ROCHA GUZMAN	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 4.000.000,00	17/07/2026	21/07/2026	14/08/2026
2026	1241	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JONATHAN	CAPACHO SILVA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 1.400.000,00	17/07/2026	21/07/2026	4/08/2026
2026	1244	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	VICTOR DANIEL	GALLEGO POSSO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA DISEÑO, EDICIÓN Y DIVULGACIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN TRADICIONALES Y DIGITALES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 15.333.333,33	16/09/2026	21/09/2026	22/12/2026
2026	1263	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN SEBASTIAN	REY SUAREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON MAESTRIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CALIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 24.533.333,33	11/09/2026	21/09/2026	22/12/2026
2026	1275	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA ALEJANDRA	CARVAJAL GARCIA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 15.333.333,33	3/09/2026	21/09/2026	22/12/2026
2026	1288	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	RICARDO	BLANCO PEÑA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE MAQUINARIA AMARILLA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 10.794.666,67	14/09/2026	21/09/2026	22/12/2026
2026	1298	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LAURA MELISSA	ESPINOSA RAMIREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 8.000.000,00	16/07/2026	21/07/2026	20/09/2026
2026	1352	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUIS ARTURO	HERNANDEZ ORTIZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE EQUIPAMENTO URBANO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 20.020.000,00	16/09/2026	22/09/2026	22/12/2026
2026	1353	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DANIEL SANTIAGO	SUAREZ CARVAJAL	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 19.716.666,67	15/09/2026	22/09/2026	22/12/2026
2026	1362	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LUIS	BARAJAS CHANAGA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 16.683.333,33	11/09/2026	22/09/2026	22/12/2026
2026	1479	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	GERSON	VEGA VARGAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACION PUBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 26.400.000,00	17/09/2026	23/09/2026	22/12/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	1618	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LEIDY	PEÑA FLOREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA	$ 10.000.000,00	17/07/2026	24/07/2026	23/09/2026
2026	1779	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIEGO ESTEBAN	SANCHEZ ORTIZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 6.000.000,00	17/07/2026	26/07/2026	25/09/2026
2026	1806	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUREINNY DAYANNA	LUNA RUEDA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 13.500.000,00	21/07/2026	27/07/2026	26/10/2026
2026	2044	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EDISSON	QUIROZ MENDEZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 6.000.000,00	17/07/2026	28/07/2026	27/09/2026
2026	2051	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EDWAR JAVIER	PEREZ JAIMES	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 9.600.000,00	21/07/2026	28/07/2026	27/10/2026
2026	2122	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIEGO ALEXANDER	LOPEZ OSORIO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO EN ENERGIA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 18.700.000,00	14/09/2026	28/09/2026	22/12/2026
2026	2224	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	GERARDO ALFONSO	ARDILA FRANCO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 6.000.000,00	17/07/2026	29/07/2026	28/09/2026
2026	2299	CONTRATACIÓN DIRECTA	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JAIRO	NUNEZ TRUJILLO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 6.000.000,00	17/07/2026	29/07/2026	28/09/2026
2026	2846	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PAULA MELISSA	CASTRILLON MILLAN	PRESTAR SERVICIOS COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACION PUBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 27.500.000,00	6/07/2026	9/07/2026	23/12/2026
2026	2849	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CRISTIAN ALEXANDER	TRUJILLO OLIVEROS	PRESTAR SERVICIOS COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACION PUBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 27.500.000,00	7/07/2026	8/07/2026	22/12/2026
2026	2850	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE LUIS	MORALES CASTRO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO CON POSGRADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 37.100.000,00	7/07/2026	8/07/2026	16/12/2026
2026	2857	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN FELIPE	QUIROGA MENDEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL CON POSGRADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 37.100.000,00	9/07/2026	10/07/2026	18/12/2026
2026	2858	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DEICY VIVIANA	ARDILA CARDENAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS ESPECIALIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CALIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE INFRAESTRUCTURA.	$ 29.150.000,00	9/07/2026	10/07/2026	18/12/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	2860	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANYELIZ EDILCE	DIAZ TUESTA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TECNICO PARA FORTALECER EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 21.200.000,00	10/07/2026	14/07/2026	22/12/2026
2026	2863	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MALORY	HURTADO GOMEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 29.150.000,00	10/07/2026	14/07/2026	22/12/2026
2026	2923	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ASTRID ALIETA	QUINTERO VELASCO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO, A LA SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 30.550.000,00	28/07/2026	29/07/2026	19/12/2026
2026	3042	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FLOR PATRICIA	OQUENDO PATIÑO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN A LA SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 32.900.000,00	3/08/2026	4/08/2026	24/12/2026
2026	3075	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LINDA KAREM	CHIA MACHUCA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO, PARA APOYAR Y FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS JURÍDICOS, ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTUALES QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 26.400.000,00	4/08/2026	6/08/2026	17/12/2026
2026	3076	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	KERLLY LUCERO	TOLOZA PRADA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES PRESUPUESTALES RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 27.000.000,00	4/08/2026	6/08/2026	20/12/2026
2026	3077	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HAROLD ANDRES	NIÑO VARGAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 22.500.000,00	4/08/2026	5/08/2026	19/12/2026
2026	3078	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PAOLA ANDREA	MORENO CEPEDA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS DE GESTION PREDIAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 22.500.000,00	5/08/2026	6/08/2026	20/12/2026
2026	3109	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANDRES FERNANDO	MORA NIÑO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN TODAS LAS ETAPAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 22.000.000,00	5/08/2026	6/08/2026	17/12/2026
2026	3110	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MANUEL SAUL	JAIMES BARRERA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 17.860.000,00	5/08/2026	6/08/2026	26/12/2026
2026	3111	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LICET MARCELA	BOLIVAR SANDOVAL	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 25.300.000,00	5/08/2026	6/08/2026	23/12/2026
2026	3118	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	KATY TANIA	NAVARRO NAVARRO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 19.800.000,00	6/08/2026	10/08/2026	21/12/2026
2026	3119	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA ANDREA	ARENAS SANCHEZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 13.200.000,00	6/08/2026	10/08/2026	21/12/2026
2026	3126	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIEGO FABIAN	PATIÑO TRUJILLO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE MAQUINARIA AMARILLA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 15.400.000,00	6/08/2026	10/08/2026	21/12/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	3128	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JHON ALEXANDER	FIGUEREDO FORERO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 19.800.000,00	6/08/2026	11/08/2026	22/12/2026
2026	3138	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	YURY	BAYONA HERNANDEZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO COMO TECNÓLOGO EN CONTABILIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 17.600.000,00	6/08/2026	11/08/2026	22/12/2026
2026	3139	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CRISTHIAN JAVIER	PARADA GARCIA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA	$ 22.000.000,00	6/08/2026	10/08/2026	21/12/2026
2026	3140	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LEONOR	SINUCO ROJAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA FORTALECER LOS PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARMANGA .	$ 17.600.000,00	6/08/2026	11/08/2026	22/12/2026
2026	3142	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	STEVE JOSE	VILLABONA BLANCO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE DEFENSA JUDICIAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 17.600.000,00	6/08/2026	10/08/2026	21/12/2026
2026	3146	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	GERMAN ALBERTO	MORENO BREGULLA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 24.200.000,00	6/08/2026	11/08/2026	22/12/2026
2026	3149	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	IVAN FRANCISCO	RAMIREZ GALVIS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRONICO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 24.200.000,00	6/08/2026	10/08/2026	21/12/2026
2026	3150	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CRISTIAN JAHIR	PORTILLA PITA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 17.600.000,00	6/08/2026	13/08/2026	24/12/2026
2026	3152	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	GIOVANNI ENRIQUE	MELO ZAPATA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 22.000.000,00	6/08/2026	10/08/2026	21/12/2026
2026	3154	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA JOSE	ARENAS CACERES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE DEFENSA JUDICIAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 17.600.000,00	6/08/2026	12/08/2026	23/12/2026
2026	3166	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SERGIO AUGUSTO	HERNANDEZ MORENO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE DEFENSA JUDICIAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 17.600.000,00	6/08/2026	10/08/2026	21/12/2026
2026	3168	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANDRES ORLANDO	RODRIGUEZ PINEDA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 24.200.000,00	6/08/2026	10/08/2026	21/12/2026
2026	3169	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MONICA MARCELA	MENESES BUSTAMANTE	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 17.600.000,00	6/08/2026	11/08/2026	22/12/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	3172	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CAMILA ANDREA	PIÑERES SOLANO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GEÓLOGO PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE EJECUTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 19.800.000,00	6/08/2026	10/08/2026	21/12/2026
2026	3173	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SIDNEY ANDREA	URIBE DAZA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 22.000.000,00	6/08/2026	11/08/2026	22/12/2026
2026	3209	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	GUSTAVO	LANDAZABAL ARIAS	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 13.200.000,00	10/08/2026	11/08/2026	22/12/2026
2026	3210	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HENRY	GONZALEZ PEREZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE MAQUINARIA AMARILLA EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 15.050.000,00	10/08/2026	11/08/2026	19/12/2026
2026	3211	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	RONALD SMITH	MORENO LUGO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTROMECÁNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 22.000.000,00	10/08/2026	11/08/2026	22/12/2026
2026	3212	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	GUILLERMO	DIAZ SANDOVAL	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 24.200.000,00	10/08/2026	11/08/2026	22/12/2026
2026	3213	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CRISTHIAN HERNANDO	PAREDES CANDELA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE MINICARGADOR Y VIBROCOMPACTADOR EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 15.400.000,00	10/08/2026	11/08/2026	22/12/2026
2026	3219	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	YULI KATHERINE	ALFONSO BECERRA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE DEFENSA JUDICIAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 25.800.000,00	10/08/2026	11/08/2026	19/12/2026
2026	3220	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	WILFRED EMILIO	PALACIO VERANO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 30.100.000,00	10/08/2026	11/08/2026	19/12/2026
2026	3230	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HUGO	SUAREZ MANOSALVA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA	$ 15.840.000,00	10/08/2026	12/08/2026	23/12/2026
2026	3235	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LIZ MONICA	LEON SAAVEDRA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACION PUBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA	$ 17.600.000,00	10/08/2026	11/08/2026	22/12/2026
2026	3248	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA NATALIA	RUGELES HORMIGA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA INDUSTRIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CALIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 23.650.000,00	10/08/2026	11/08/2026	19/12/2026
2026	3255	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIANA CAROLINA	PEINADO TORRES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 21.500.000,00	10/08/2026	11/08/2026	19/12/2026
2026	3263	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANA CATALINA	GARCIA GORDILLO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 26.400.000,00	10/08/2026	11/08/2026	22/12/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	3269	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LEDDYS SULAY	ARDILA GUERRERO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 16.800.000,00	10/08/2026	12/08/2026	17/12/2026
2026	3270	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUPITA	LARA PEREZ	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA	$ 13.200.000,00	10/08/2026	11/08/2026	22/12/2026
2026	3276	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CARLOS HARVEY	ROBLES ROMERO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 19.800.000,00	10/08/2026	12/08/2026	23/12/2026
2026	3312	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	RICHARD SANTIAGO	HERNANDEZ TORRES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA	$ 24.200.000,00	11/08/2026	12/08/2026	23/12/2026
2026	3323	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	WILFER OMAR	VERA JAIMES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 23.100.000,00	11/08/2026	12/08/2026	17/12/2026
2026	3325	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JULIAN ANDRES	JAIMES TORRES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA	$ 20.000.000,00	11/08/2026	12/08/2026	11/12/2026
2026	3326	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUZ NEILA	GAMBOA FRANCO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS QUE EJECUTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 21.000.000,00	11/08/2026	12/08/2026	17/12/2026
2026	3327	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SANDRA PAOLA	SOLANO FLOREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GEÓLOGA PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA	$ 23.650.000,00	11/08/2026	12/08/2026	20/12/2026
2026	3357	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SANDRA YENITH	RAMIREZ PEÑA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PETRÓLEOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 17.600.000,00	12/08/2026	13/08/2026	24/12/2026
2026	3421	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PEDRO LUIS	GARCIA AYALA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE GESTION DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 19.350.000,00	13/08/2026	14/08/2026	22/12/2026
2026	3438	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA FERNANDA	CUERO MASIAS	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 12.900.000,00	14/08/2026	18/08/2026	26/12/2026
2026	3449	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OMAR	GARCIA GORDILLO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO TOPÓGRAFO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 19.800.000,00	14/08/2026	20/08/2026	31/12/2026
2026	3500	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JESUS DAVID	MARTINEZ SEPULVEDA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA .	$ 16.000.000,00	14/08/2026	18/08/2026	17/12/2026
2026	3502	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EDGAR GEOVANNY	PEREZ MARTINEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE DEFENSA JUDICIAL EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 21.500.000,00	14/08/2026	18/08/2026	26/12/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	3505	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA PAULA	HERRERA NUÑEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 17.200.000,00	14/08/2026	18/08/2026	26/12/2026
2026	3508	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	WENDY JULIETH	SERRANO MORENO	PRESTAR SERVICIOS COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 20.000.000,00	14/08/2026	19/08/2026	18/12/2026
2026	3509	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LISBETH JOHANNA	VILLAMIZAR VALBUENA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA INDUSTRIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 20.000.000,00	14/08/2026	18/08/2026	17/12/2026
2026	3515	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	RICHARD EDUARDO	TASCO PARRA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA COORDINAR ASUNTOS JURÍDICOS EN CONTRATACIÓN ESTATAL QUE SE ADELANTE POR COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 37.840.000,00	14/08/2026	15/08/2026	23/12/2026
2026	3576	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DAYANA MARCELA	VILLAMIZAR GONZALEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 21.500.000,00	19/08/2026	20/08/2026	28/12/2026
2026	3580	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JULIETH	BOLAÑOS BARANDICA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 22.000.000,00	19/08/2026	21/08/2026	20/12/2026
2026	3611	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SARA ANGELICA	MOYANO GOMEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GEÓLOGA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 16.000.000,00	19/08/2026	21/08/2026	20/12/2026
2026	3634	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	YESENIA	SUAREZ PATIÑO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRÓNICO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 16.000.000,00	19/08/2026	20/08/2026	19/12/2026
2026	3641	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE LUIS	GONZALEZ CASTRO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 16.000.000,00	19/08/2026	21/08/2026	20/12/2026
2026	3654	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CAMILO ANDRES	MONTES CUBILLOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL PARA LA PUBLICACIÓN, INTERACCIÓN Y PROMOCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 22.000.000,00	20/08/2026	21/08/2026	20/12/2026
2026	3655	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE LUIS	HERNANDEZ SANDOVAL	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 18.000.000,00	20/08/2026	21/08/2026	20/12/2026
2026	3668	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JEFFERSSON FERNANDO	LEON VILLAMIZAR	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTROMECÁNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 17.250.000,00	20/08/2026	21/08/2026	15/12/2026
2026	3695	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JULYETH MARCELA	MENDEZ RAMIREZ	PRESTAR SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA, DOCUMENTAL Y TECNICA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.000.000,00	20/08/2026	24/08/2026	23/12/2026
2026	3701	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	KAREN DANIELA	FUENTES SALAZAR	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 20.000.000,00	20/08/2026	21/08/2026	20/12/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	3729	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ALVARO JULIAN	PRADA CAMACHO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS DE GESTION PREDIAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 23.000.000,00	21/08/2026	25/08/2026	19/12/2026
2026	3840	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LEIDY JOHANA	SANCHEZ ORDOÑEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 19.000.000,00	22/08/2026	25/08/2026	18/12/2026
2026	3855	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CLAUDIA MILENA	PEDRAZA CACERES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA	$ 16.000.000,00	22/08/2026	26/08/2026	25/12/2026
2026	3914	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA FERNANDA	OJEDA AMADO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 23.000.000,00	24/08/2026	1/09/2026	25/12/2026
2026	3925	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	GERALDINE	MARTINEZ CORREDOR	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 15.200.000,00	24/08/2026	26/08/2026	19/12/2026
2026	3931	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JESSIKA VIVIANA	MORENO MARTINEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 20.000.000,00	24/08/2026	26/08/2026	25/12/2026
2026	3933	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ESPERANZA	TORRES PEREZ	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 13.300.000,00	24/08/2026	26/08/2026	19/12/2026
2026	3935	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUIS JOSE	DURAN AGUIRRE	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE LA INGENIERÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 20.900.000,00	24/08/2026	26/08/2026	19/12/2026
2026	3936	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA XIMENA	VEGA CALLEJAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 15.200.000,00	24/08/2026	25/08/2026	18/12/2026
2026	3941	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JHON EDICSON	BLANCO FLOREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTROMECÁNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 14.800.000,00	25/08/2026	26/08/2026	16/12/2026
2026	3946	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PAULA ANDREA	VILLAMIZAR ARCHILA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 14.800.000,00	25/08/2026	26/08/2026	16/12/2026
2026	3947	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DAVID HERNANDO	JAIMES MUÑOZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA PLANEACION DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 14.800.000,00	25/08/2026	26/08/2026	16/12/2026
2026	3955	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EDWIN FERNANDO	NIÑO OSORIO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 15.200.000,00	25/08/2026	27/08/2026	20/12/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	3956	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CLAUDIA PATRICIA	BERMUDEZ TUTAZAURA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 17.100.000,00	25/08/2026	27/08/2026	20/12/2026
2026	3960	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JAVIER ENRIQUE	GARCIA LIZARAZO	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 14.060.000,00	25/08/2026	26/08/2026	19/12/2026
2026	3961	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MAYERLY ALEJANDRA	MEDINA CHARRY	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 28.490.000,00	25/08/2026	26/08/2026	16/12/2026
2026	3965	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	IVAN DARIO	SEPULVEDA REYES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 15.200.000,00	25/08/2026	26/08/2026	19/12/2026
2026	3979	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA FERNANDA	DURAN JAIMES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 20.350.000,00	25/08/2026	27/08/2026	17/12/2026
2026	3981	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JORGE ENRIQUE	MOTTA OSMA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 17.250.000,00	25/08/2026	26/08/2026	20/12/2026
2026	4013	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA FERNANDA	QUINTERO PABUENA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 14.800.000,00	25/08/2026	26/08/2026	16/12/2026
2026	4014	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	KAREN JULIANA	PRIETO MOLINA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 16.650.000,00	25/08/2026	27/08/2026	17/12/2026
2026	4020	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	REYNALDO	ALVAREZ LEON	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 16.500.000,00	25/08/2026	27/08/2026	16/12/2026
2026	4027	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SHIRLEY JULITZA	BALLESTEROS GUERRERO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 14.800.000,00	26/08/2026	27/08/2026	17/12/2026
2026	4028	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FABIAN MAURICIO	PORRAS LOPEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 15.200.000,00	26/08/2026	1/09/2026	24/12/2026
2026	4039	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ADRIANA CAROLINA	PICO HERNANDEZ	PRESTAR SERVICIOS COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PUBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 15.200.000,00	26/08/2026	27/08/2026	20/12/2026
2026	4054	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENAYDER JAVIER	VANEGAS JIMENEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA	$ 16.500.000,00	26/08/2026	1/09/2026	20/12/2026
2026	4076	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIANA	JIMENEZ REYES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO FORTALECER PARA LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 14.400.000,00	26/08/2026	27/08/2026	14/12/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	4077	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE CAMILO	ROCHA GUZMAN	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PUBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 25.666.666,67	26/08/2026	28/08/2026	17/12/2026
2026	4078	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN FELIPE	BELTRAN NIÑO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 22.000.000,00	26/08/2026	27/08/2026	16/12/2026
2026	4079	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DANIEL FELIPE	ROJAS CASTRO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 18.500.000,00	26/08/2026	27/08/2026	17/12/2026
2026	4080	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	VILMA ZULAY	GARCIA FONTECHA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 14.400.000,00	26/08/2026	1/09/2026	18/12/2026
2026	4093	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HELMER	CORDERO REBOLLEDO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA	$ 18.500.000,00	27/08/2026	1/09/2026	21/12/2026
2026	4094	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JHONATAN MAURICIO	ACOSTA MORENO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 12.600.000,00	27/08/2026	1/09/2026	18/12/2026
2026	4100	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	NICOLAS GABRIEL	GONZALEZ DOMINGUEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 22.000.000,00	27/08/2026	1/09/2026	20/12/2026
2026	4103	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JAIME	VILLAMIZAR COGOLLO	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL ÁREA ADMINISTARTIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 14.800.000,00	27/08/2026	1/09/2026	21/12/2026
2026	4147	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ARTURO	LONDOÑO ARENAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE NEGOCIOS PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y LA LIQUIDACION DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS QUE EJECUTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 18.000.000,00	28/08/2026	1/09/2026	18/12/2026
2026	4148	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EDINSON ENRIQUE	SANDOVAL MANTILLA	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 11.500.000,00	28/08/2026	1/09/2026	25/12/2026
2026	4157	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JAIRO	ESPINOSA MORENO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.	$ 12.600.000,00	28/08/2026	1/09/2026	18/12/2026
2026	4158	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JONATHAN	CAPACHO SILVA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 12.600.000,00	28/08/2026	1/09/2026	18/12/2026
2026	4159	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JORGE ELIECER	BLANCO VESGA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 14.400.000,00	28/08/2026	1/09/2026	18/12/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	4163	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	NURIAN BIBIANA	MUNEVAR PEREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL CON MAESTRIA PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y OBRAS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 28.490.000,00	28/08/2026	1/09/2026	21/12/2026
2026	4179	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SAMIR ALEXIS	SILVA COLMENARES	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 12.600.000,00	28/08/2026	1/09/2026	18/12/2026
2026	4181	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EDGAR FRANCISCO	CABALLERO ORDOÑEZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 12.600.000,00	28/08/2026	2/09/2026	19/12/2026
2026	4204	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ARMANDO	GOMEZ VILLABONA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 21.600.000,00	28/08/2026	1/09/2026	18/12/2026
2026	4247	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN DAVID	PAEZ TRUJILLO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 12.250.000,00	31/08/2026	1/09/2026	15/12/2026
2026	4248	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CRISTHIAN FERNANDO	SABOGAL VILLAMIZAR	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO A LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 19.250.000,00	31/08/2026	2/09/2026	16/12/2026
2026	4251	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DANIEL RICARDO	JEREZ PLATA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 10.500.000,00	31/08/2026	2/09/2026	16/12/2026
2026	4255	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIEGO FERNANDO	BECERRA RAMIREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 14.400.000,00	31/08/2026	1/09/2026	18/12/2026
2026	4256	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JORGE ELIECER	GOMEZ HERRERA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 14.400.000,00	31/08/2026	2/09/2026	19/12/2026
2026	4289	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA MILENA	SIERRA RAMIREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO FORTALECER PARA LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 17.500.000,00	31/08/2026	2/09/2026	16/12/2026
2026	4290	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JAIME ANDRES	CAICEDO BERRIO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA EJECUTAR EL DISEÑO, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS; ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS POR LA SECRETARIA DE INFRAETRUCTURA DESDE EL AREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.	$ 19.800.000,00	31/08/2026	2/09/2026	19/12/2026
2026	4298	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	BRAHIAN SNEYDER	OSORIO JAIMES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO FINANCIERO PARA APOYAR EL ÁREA DE BANCO DE PROYECTOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 17.500.000,00	1/09/2026	2/09/2026	16/12/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	4345	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	KAREN JULIETH	TOLOZA LAMUS	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO TECNICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS DE LA SECRETARIA D EINFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO D EBUCARAMANGA	$ 18.333.333,33	2/09/2026	3/09/2026	22/12/2026
2026	4352	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MAYERLY ROCIO	FLOREZ PRADA	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 11.666.666,67	2/09/2026	4/09/2026	13/12/2026
2026	4363	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SMITH ALEJANDRA	PINTO PIMIENTO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 19.250.000,00	2/09/2026	3/09/2026	17/12/2026
2026	4367	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN SEBASTIAN	QUINTERO PACHECO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 17.500.000,00	2/09/2026	4/09/2026	18/12/2026
2026	4372	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OLGA XIMENA	GOMEZ DUARTE	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 17.500.000,00	2/09/2026	4/09/2026	18/12/2026
2026	4373	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANDRES FELIPE	LOPEZ BRICEÑO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO FORTALECER PARA LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 24.500.000,00	2/09/2026	4/09/2026	18/12/2026
2026	4381	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ALEXIS	RONDON MUNOZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 17.500.000,00	2/09/2026	4/09/2026	18/12/2026
2026	4412	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA EDILIA	HERNANDEZ PEDRAZA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA LA GESTIÓN SOCIAL DE LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, UTILIZANDO SUS PROPIOS MEDIOS INSTRUMENTOS Y RECURSOS, Y DEMÁS ACCIONES REQUERIDAS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.	$ 19.250.000,00	3/09/2026	4/09/2026	18/12/2026
2026	4443	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FANNY DANIELA	CASTRO ROMERO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 21.000.000,00	3/09/2026	7/09/2026	21/12/2026
2026	4459	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PEDRO IVAN	ANGEL CHACON	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL APOYO EN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE ESPACIO PÚBLICO, EQUIPAMIENTOS, PARQUES O DE MOVILIDAD Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE DEFINA LA DIRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL.	$ 19.250.000,00	3/09/2026	4/09/2026	18/12/2026
2026	4485	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIEGO ANDRES	VILLAMIZAR MARTINEZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 13.333.333,33	4/09/2026	7/09/2026	16/12/2026
2026	4512	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	YULIETH CAMILA	ARDILA ORTIZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 17.500.000,00	4/09/2026	7/09/2026	21/12/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	4515	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JENNYFER PAOLA	VILLAMIL MANTILLA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO, ARTICULACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, LA CARTERA, LA GESTIÓN FINANCIERA, EL SISTEMA DE GESTIÓN Y LOS INDICADORES DE GESTIÓN DEL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 22.750.000,00	4/09/2026	7/09/2026	21/12/2026
2026	4523	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA JOSE	PALACIOS CAMARGO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS QUE EJECUTA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 15.000.000,00	4/09/2026	7/09/2026	16/12/2026
2026	4526	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	KATHERINE	MARTINEZ PAREJO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 17.500.000,00	4/09/2026	7/09/2026	21/12/2026
2026	4529	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	RICARDO ANDRES	ZARATE CABEZA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA APOYAR EL DISEÑO, FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ESPACIO PÚBLICO, EQUIPAMIENTOS, PARQUES Y MOVILIDAD, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD.	$ 19.250.000,00	4/09/2026	8/09/2026	22/12/2026
2026	4542	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA CAROLINA	VESGA AGUDELO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 10.500.000,00	4/09/2026	8/09/2026	22/12/2026
2026	4553	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MAURICIO	JIMENEZ SANTOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 15.000.000,00	4/09/2026	8/09/2026	17/12/2026
2026	4633	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ERIKA JOHANA	DIAZ SOSSA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL APOYO EN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE ESPACIO PÚBLICO, EQUIPAMIENTOS, PARQUES O DE MOVILIDAD, Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE DEFINA LA DIRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL.	$ 18.333.333,33	8/09/2026	9/09/2026	18/12/2026
2026	4666	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LAURA PAOLA	AMOROCHO MONTAGUT	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO FINANCIERO PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y LA LIQUIDACION DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS QUE EJECUTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 22.100.000,00	8/09/2026	9/09/2026	20/12/2026
2026	4672	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CAMILO ANDRES	RODRIGUEZ JAIMES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE EQUIPAMIENTO URBANO EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 20.000.000,00	8/09/2026	9/09/2026	18/12/2026
2026	4674	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN GREGORIO	SIERRA NAVARRO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 23.100.000,00	8/09/2026	11/09/2026	19/12/2026
2026	4675	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CRISTIAN LEONARDO	PATIÑO VILLADIEGO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 15.000.000,00	9/09/2026	15/09/2026	24/12/2026
2026	4681	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIANA MARCELA	SERRANO ARIZA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA DE MERCADOS PARA APOYAR EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 15.000.000,00	9/09/2026	11/09/2026	20/12/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	4687	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ADRIANA	HIGUERA BLANCO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA APOYAR TÉCNICAMENTE LA GESTIÓN, ESTRUCTURACIÓN, REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS AMBIENTALES, INVENTARIOS FORESTALES Y PLANES DE MANEJO AMBIENTAL REQUERIDOS PARA LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 20.000.000,00	9/09/2026	10/09/2026	19/12/2026
2026	4688	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PAULA ANDREA	REMOLINA PORRAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN DENTRO DE SUS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.000.000,00	9/09/2026	10/09/2026	19/12/2026
2026	4689	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OLID ANDREA	SERRANO PRADA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL REGISTRO, TRAMITE Y SEGUIMIENTO DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES (PQRS) EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA SECRETRIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 20.000.000,00	9/09/2026	10/09/2026	19/12/2026
2026	4705	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ALEJANDRO	CASTAÑEDA ARENAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 20.000.000,00	10/09/2026	14/09/2026	23/12/2026
2026	4729	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIDIER ALEXANDER	SUAREZ FAJARDO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA EJECUTAR EL DISEÑO, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS; ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS POR LA SECRETARIA DE INFRAETRUCTURA DESDE EL AREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	$ 22.750.000,00	10/09/2026	16/09/2026	30/12/2026
2026	4730	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ELKIN JESUS	HERNANDEZ GOMEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACION PUBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA	$ 16.500.000,00	10/09/2026	11/09/2026	19/12/2026
2026	4733	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN SEBASTIAN	CABEZA HERNANDEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO TOPOGRAFO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA .	$ 28.050.000,00	10/09/2026	14/09/2026	22/12/2026
2026	4736	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CAMILA	BRICEÑO CABALLERO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN LA COORDINACIÓN Y EL DESARROLLO DE DISEÑOS HIDROSANITARIOS DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS PRIORIZADOS POR EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, UTILIZANDO SUS PROPIOS MEDIOS INSTRUMENTOS Y RECURSOS, ASÍ COMO APOYAR EN DIFERENTES PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, Y DEMÁS ACCIONES REQUERIDAS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.	$ 20.000.000,00	10/09/2026	14/09/2026	23/12/2026
2026	4737	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HERMES JULIAN	COTE PLATA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 16.500.000,00	10/09/2026	16/09/2026	24/12/2026
2026	4739	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE LUIS	SANABRIA GAMBOA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 16.500.000,00	10/09/2026	14/09/2026	22/12/2026
2026	4789	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CRISTIAN	REYES GOMEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 16.500.000,00	14/09/2026	16/09/2026	24/12/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	4796	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MATEO	BOHORQUEZ MUÑOZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 16.500.000,00	14/09/2026	15/09/2026	23/12/2026
2026	4799	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OMAR LEONARDO	BARROSO ORTIZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 16.000.000,00	14/09/2026	15/09/2026	20/12/2026
2026	4802	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CARLOS EDUARDO	SANCHEZ SANCHEZ	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 17.600.000,00	14/09/2026	15/09/2026	20/12/2026
2026	4812	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOHN HENRY	CARRILLO HERNÁNDEZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR EN TOPOGRAFÍA EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA – ALUMBRADO PÚBLICO, APOYANDO LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE EXPANSIÓN, REPOTENCIACIÓN, REPOSICIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA URBANA Y FUNCIONAL.	$ 12.000.000,00	15/09/2026	16/09/2026	15/12/2026
2026	4813	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE FABIAN	VALBUENA MACHUCA	PRESTAR SERVICIOS COMO TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA – ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS CON LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE EXPANSIÓN, REPOTENCIACIÓN, REPOSICIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, ASÍ COMO EN LAS ACTIVIDADES DE APOYO REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LAS INTERVENCIONES DE ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA, URBANA Y FUNCIONAL”	$ 15.833.333,33	15/09/2026	16/09/2026	20/12/2026
2026	4815	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SERGIO ANDRES	CAMARGO ORDOÑEZ	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 13.200.000,00	15/09/2026	16/09/2026	24/12/2026
2026	4820	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE CLEMENTE	CORREA ALFONSO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ZONAS RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA	$ 10.850.000,00	15/09/2026	16/09/2026	18/12/2026
2026	4823	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	NARLY YADIRA	BOHORQUEZ DURAN	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO MECANICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 15.833.333,33	15/09/2026	16/09/2026	20/12/2026
2026	4826	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CRISTIAN SNEIDER	BAUTISTA TORRES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA APOYAR EL DISEÑO, FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ESPACIO PÚBLICO, EQUIPAMIENTOS, PARQUES Y MOVILIDAD, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD	$ 16.500.000,00	15/09/2026	17/09/2026	25/12/2026
2026	4852	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EDICSON	CORTES RUIZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE OBRA, APU, CÁLCULO DE CANTIDADES, ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, GESTIÓN DE PRESUPUESTOS Y DEMÁS REQUERIDAS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	$ 17.050.000,00	16/09/2026	17/09/2026	19/12/2026
2026	4855	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EDWARD FABIAN	CASTAÑEDA VILLAMIZAR	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACION PUBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 23.100.000,00	16/09/2026	17/09/2026	25/12/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	4856	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE DE JESUS	BLANCO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTUALES EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 9.000.000,00	16/09/2026	18/09/2026	17/12/2026
2026	4860	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ALCIDES	ACEVEDO ACEVEDO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNICO AMBIENTAL PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 12.000.000,00	16/09/2026	17/09/2026	16/12/2026
2026	4863	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MIGUEL ANGEL	OSORIO GOMEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 21.700.000,00	16/09/2026	17/09/2026	19/12/2026
2026	4864	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DEISY CAROLINA	JAIMES JAIMES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN LA ELABORACION DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS GEORREFERENCIADOS Y SUS RESPECTIVOS SOPORTES, CON SISTEMAS BASADOS EN TECNOLOGIAS Y VUELOS FOTOGRAMETRICOS, Y DEMÁS ACCIONES REQUERIDAS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	$ 26.350.000,00	16/09/2026	18/09/2026	20/12/2026
2026	4865	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	RICARDO ALFONSO	RAMIREZ BOHORQUEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA COMO RESPONSABLE EN LA GESTION, PLANEAMIENTO Y COORDINACION DEL PROCESO Y ENTREGABLES A BANCO DE PROYECTOS Y PRECONTRACTUAL, DE LOS DIFERENTES PROYECTOS ESTRATEGICOS DEFINIDOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.	$ 21.000.000,00	16/09/2026	18/09/2026	17/12/2026
2026	4868	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SERGIO ANDRES	MARTINEZ CAMACHO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO FORTALECER PARA LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 15.000.000,00	16/09/2026	18/09/2026	17/12/2026
2026	4871	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DAVID LEONARDO	GAMBOA BUENO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 15.000.000,00	16/09/2026	17/09/2026	16/12/2026
2026	4874	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	TATIANA	MEDRANO LOPEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 22.166.666,67	16/09/2026	17/09/2026	21/12/2026
2026	4877	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DAYRA GISELA	DAZA BLANCO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR JURÍDICAMENTE LA GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES (PQRS) Y EL SERVICIO AL CIUDADANO, EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	$ 18.000.000,00	16/09/2026	17/09/2026	16/12/2026
2026	4878	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JULIANA DEL PILAR	DIAZ COBOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN DENTRO DE SUS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 18.000.000,00	16/09/2026	17/09/2026	16/12/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	4883	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE ALEJANDRO	GOMEZ SUAREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA COMO ARQUITECTO ESPECIALISTA, EXPERTO EN PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EN LA GESTIÓN Y EL PLANTEAMIENTO DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 47.500.000,00	17/09/2026	18/09/2026	22/12/2026
2026	4884	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARTHA INES	RINCON DIAZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA APOYAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 12.000.000,00	17/09/2026	23/09/2026	22/12/2026
2026	4885	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUIS ERNESTO	LOPEZ FLOREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA	$ 15.000.000,00	17/09/2026	18/09/2026	17/12/2026
2026	4891	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	TIVISAY DEL CARMEN	PEREIRA PETRO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO FORTALECER PARA LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 15.000.000,00	17/09/2026	21/09/2026	20/12/2026
2026	4908	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	RUPERTO	REY TORRES	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 10.500.000,00	17/09/2026	21/09/2026	20/12/2026
2026	4909	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARLON JOSE	ESPITIA FONSECA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL APOYO EN DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE ESPACIO PÚBLICO, EQUIPAMIENTOS, PARQUES O DE MOVILIDAD,Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE DEFINA LA DIRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL.	$ 15.000.000,00	17/09/2026	29/09/2026	28/12/2026
2026	4910	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SEGUNDO EXELINO	QUITIAN SIFUENTES	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE CAMPO REQUERIDAS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, RELACIONADAS CON EL ACOMPAÑAMIENTO, REVISIÓN VISUAL, IDENTIFICACIÓN Y REPORTE DE LAS CONDICIONES DE LAS OBRAS E INTERVENCIONES DE INFRAESTRUCTURA QUE LE SEAN ASIGNADAS, TANTO EN EL SECTOR RURAL COMO URBANO, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD Y LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR EL SUPERVISOR	$ 10.500.000,00	18/09/2026	21/09/2026	20/12/2026
2026	4911	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PAULA LIZETH	SUAREZ GONZALEZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 9.000.000,00	18/09/2026	21/09/2026	20/12/2026
2026	4915	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ARMANDO	MOGOLLON ROJAS	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA – MOTONIVELADORA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 13.500.000,00	18/09/2026	21/09/2026	20/12/2026
2026	4920	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ROBINSON	MANTILLA GARCIA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA	$ 18.000.000,00	18/09/2026	21/09/2026	20/12/2026
2026	4934	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MAYERLY	PEREZ GALVIS	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 10.500.000,00	18/09/2026	21/09/2026	20/12/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	4956	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	NICOLAS ENRIQUE	BELLO MARIN	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO Y DEMÁS ASUNTOS JURÍDICOS EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 16.500.000,00	21/09/2026	22/09/2026	21/12/2026
2026	4967	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FREDDY ANDRES	HERNANDEZ ACERO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTROMECANICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 15.000.000,00	21/09/2026	22/09/2026	21/12/2026
2026	4969	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	KAROL ADRIANA	ROJAS CARREÑO	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 9.000.000,00	21/09/2026	22/09/2026	21/12/2026
2026	4971	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FERNANDO JOSE	JAIMES PLATA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA	$ 28.500.000,00	21/09/2026	23/09/2026	22/12/2026
2026	4972	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SILVIA DANIELA	CRUZ CELIS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN DENTRO DE SUS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 18.000.000,00	21/09/2026	23/09/2026	22/12/2026
2026	4973	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HENRY	DUARTE PRADA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 15.000.000,00	21/09/2026	22/09/2026	21/12/2026
2026	4987	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CRISTIAN JAVIER	ARDILA CARDENAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA COMO INGENIERO DE ARTICULACIÓN, INTEGRACIÓN Y APOYO A LA COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN Y EL PLANEAMIENTO DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO DIFERENTES PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, Y DEMÁS ACCIONES REQUERIDAS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	$ 24.000.000,00	21/09/2026	22/09/2026	21/12/2026
2026	4995	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LILIA VIVIANA	PORRAS PLATA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA PUBLICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA	$ 15.000.000,00	21/09/2026	22/09/2026	21/12/2026
2026	5001	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LAURA MARCELA	CASTILLO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA VERIFICACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD (HSEQ) EN DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 18.000.000,00	22/09/2026	1/10/2026	30/12/2026
2026	5005	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	BRAYAN SNEYDER	GOMEZ REMOLINA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 15.000.000,00	22/09/2026	24/09/2026	23/12/2026
2026	5011	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANGELA MARIA	CORREA MENDOZA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA	$ 12.600.000,00	22/09/2026	23/09/2026	16/12/2026
2026	5018	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANDRES FERNNEY	BARAJAS BARAJAS	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 10.500.000,00	22/09/2026	23/09/2026	22/12/2026
2026	5022	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ADRIANA MARGARITA	ESTEVEZ MANRIQUE	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 12.600.000,00	22/09/2026	26/09/2026	19/12/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	5030	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ALEX SAMUEL	PERALTA SAAVEDRA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 14.000.000,00	22/09/2026	23/09/2026	16/12/2026
2026	5040	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DARIO JOSE	URIBE RIOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.900.000,00	22/09/2026	24/09/2026	19/12/2026
2026	5061	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CRISTIAN LEONARDO	CAÑAS MARISCAL	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 9.800.000,00	23/09/2026	25/09/2026	18/12/2026
2026	5063	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	IVAN DARIO	BERNAL VELEZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 8.400.000,00	23/09/2026	24/09/2026	17/12/2026
2026	5064	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MIGUEL ANGEL	REY BECERRA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 12.600.000,00	23/09/2026	25/09/2026	18/12/2026
2026	5115	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CARLOS ANDRES	GIL RODRIGUEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 14.000.000,00	23/09/2026	25/09/2026	18/12/2026
2026	5121	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE VIRGILIO	CORZO VERA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA	$ 14.000.000,00	23/09/2026	24/09/2026	17/12/2026
2026	5122	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUDWIN FERNEY	VALENCIA JAIMES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN LA COORDINACION Y EL DESARROLLO DE DISEÑOS HIDROSANITARIOS DE LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS PRIORIZADOS POR EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, UTILIZANDO SUS PROPIOS MEDIOS INSTRUMENTOS Y RECURSOS, ASÍ COMO APOYAR EN DIFERENTES PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, Y DEMÁS ACCIONES REQUERIDAS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.	$ 16.800.000,00	23/09/2026	24/09/2026	17/12/2026
2026	5125	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MONICA TATIANA	HERRERA GAMBOA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 14.000.000,00	23/09/2026	24/09/2026	17/12/2026
2026	5126	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JANNETH CECILIA	GARCIA LOZANO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNICO AMBIENTAL PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 11.200.000,00	23/09/2026	24/09/2026	17/12/2026
2026	5131	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUIS CARLOS	GOMEZ TRIMIÑO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 14.000.000,00	24/09/2026	25/09/2026	18/12/2026
2026	5168	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	WENDY JULIETH	LUNA RAMIREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 14.000.000,00	24/09/2026	28/09/2026	21/12/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	5173	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JHON JESUS	PEREZ OLIVELLA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN LA ELABORACION DE PRESUPUESTOS DE OBRA, APU, CALCULO DE CANTIDADES, EN ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PROGRAMACION DE OBRA, GESTION DE PRESUPUESTOS Y DEMÁS REQUERIDAS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	$ 15.400.000,00	24/09/2026	26/09/2026	19/12/2026
2026	5179	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EDGAR MAURICIO	MARTINEZ URREA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO TOPOGRAFO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 14.000.000,00	24/09/2026	26/09/2026	19/12/2026
2026	5195	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CARLOS ANDRES	ESCOBAR VALBUENA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 15.400.000,00	25/09/2026	1/10/2026	24/12/2026
2026	5207	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	WALDIR DURFRED	DURAN ROJAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN LA ELABORACION DE PRESUPUESTOS DE OBRA, APU, CALCULO DE CANTIDADES, EN ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PROGRAMACION DE OBRA, GESTION DE PRESUPUESTOS Y DEMÁS REQUERIDAS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.	$ 15.400.000,00	25/09/2026	29/09/2026	22/12/2026
2026	5229	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUREINNY DAYANNA	LUNA RUEDA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 14.000.000,00	25/09/2026	1/10/2026	24/12/2026
2026	5236	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	GERMAN DARIO	BUENAHORA VARGAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	$ 14.000.000,00	25/09/2026	1/10/2026	24/12/2026
2026	5241	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA PAOLA	URIBE CORDOBA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DISEÑO, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS Y PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, ORIENTADOS A LA DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, PROYECTOS, PROGRAMAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 12.500.000,00	25/09/2026	28/09/2026	12/12/2026
2026	5246	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	NORELYSS	GAHONA VELANDIA	PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	$ 9.800.000,00	25/09/2026	1/10/2026	24/12/2026
2026	5247	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EDWIN EDUARDO	PERILLA SERRANO	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 20.790.000,00	25/09/2026	29/09/2026	19/12/2026
2026	5248	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EDWAR JAVIER	PEREZ JAIMES	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 8.750.000,00	25/09/2026	29/09/2026	13/12/2026
2026	5249	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	GERARDO ALFONSO	ARDILA FRANCO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 9.800.000,00	25/09/2026	29/09/2026	22/12/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	5250	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EDISSON	QUIROZ MENDEZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 9.800.000,00	25/09/2026	29/09/2026	22/12/2026
2026	5251	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIEGO ESTEBAN	SANCHEZ ORTIZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 8.750.000,00	25/09/2026	29/09/2026	13/12/2026
2026	5252	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	BLANCA PAOLA	MEDINA RAMIREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 15.000.000,00	25/09/2026	1/10/2026	15/12/2026
2026	5253	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LAURA MELISSA	ESPINOSA RAMIREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	$ 11.200.000,00	25/09/2026	29/09/2026	22/12/2026
2026	5254	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JAIRO	NUNEZ TRUJILLO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CUADRILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y ADECUACIONES EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 9.800.000,00	25/09/2026	1/10/2026	24/12/2026
2026	5255	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	GABRIELA	ESTUPIÑAN QUIJANO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 14.000.000,00	25/09/2026	1/10/2026	24/12/2026
2026	5256	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MANUEL FERNANDO	CASTILLA TARAZONA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ELECTRICISTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 12.500.000,00	25/09/2026	28/09/2026	12/12/2026
2026	5257	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REPRESENTACION JURIDICA Y DE DEFENSA JUDICIAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 22.880.000,00	25/09/2026	26/09/2026	13/12/2026
2026	5258	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LEIDY	PEÑA FLOREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 14.000.000,00	25/09/2026	29/09/2026	22/12/2026
2026	5306	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JEFFERSSON ALEXIS	DURAN CARRILLO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACION PUBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 12.500.000,00	28/09/2026	29/09/2026	13/12/2026
2026	5309	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN LUDWING	HERNANDEZ DIAZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 15.000.000,00	28/09/2026	29/09/2026	13/12/2026
2026	5319	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE ALBERTO	RONDON	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 26.600.000,00	28/09/2026	29/09/2026	22/12/2026
2026	5320	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUZ MARINA	TORRADO GOMEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE ESTABILIDAD DE LOS TALUDES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS.	$ 26.600.000,00	28/09/2026	29/09/2026	22/12/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	5321	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MATEO	ALVAREZ TORRADO	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 26.600.000,00	28/09/2026	29/09/2026	22/12/2026
2026	5322	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FABIAN ALBERTO	RONDON GERARDINO	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 26.600.000,00	28/09/2026	29/09/2026	22/12/2026
2026	5329	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	RAFAEL	ROJAS PEÑA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y PROCESOS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 15.000.000,00	29/09/2026	1/10/2026	15/12/2026
2026	5344	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	STEPHANIE EILLEN CECILIA	TELLEZ ROMERO	PRESTAR SERVICIOS COMO INGENIERA CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 12.500.000,00	29/09/2026	1/10/2026	15/12/2026
2026	5345	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	GIOVANNY	QUEZADA SERRANO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.	$ 8.750.000,00	29/09/2026	1/10/2026	15/12/2026
2026	5359	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CIELO DANIELA	MENDEZ PIMIENTO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA COMO EXPERTO AMBIENTAL PARA LA GESTIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y/O AJUSTE DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES, ELABORACIÓN DE INVENTARIOS FORESTALES, PLANES DE MANEJO AMBIENTAL, DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS, UTILIZANDO SUS PROPIOS MEDIOS INSTRUMENTOS Y RECURSOS, ASÍ COMO APOYAR EN DIFERENTES PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, Y DEMÁS ACCIONES REQUERIDAS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.	$ 11.500.000,00	29/09/2026	1/10/2026	9/12/2026
2026	5360	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JAIME SAID	GOMEZ ARIAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO FORESTAL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA	$ 12.500.000,00	29/09/2026	1/10/2026	15/12/2026
2026	5361	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MAIRA ALEJANDRA	SANABRIA TARAZONA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO FORESTAL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA	$ 12.500.000,00	29/09/2026	1/10/2026	15/12/2026
2026	5362	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	IVAN ARTURO	REYES RODRIGUEZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRCUTURA DEL MUNNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 10.000.000,00	29/09/2026	1/10/2026	15/12/2026
2026	5363	CONTRATACIÓN DIRECTA	PERFECCIONADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	YORDYN LEONEL	LIZCANO CARREÑO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COORDINACION, DESARROLLO, AJUSTE, INTEGRACION Y/O DISENO DE LOS ESTUDIOS DE TRANSITO, TRAFICO, MOVILIDAD, PMT Y SENALIZACION VIAL DE LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS DE CORREDORES DE CONECTIVIDAD ZONAL Y LOCAL PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 15.000.000,00	29/09/2026		
2026	5364	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MIGUEL ANGEL	ORDUZ LARGO	PRESTAR SERVICIOS COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 12.500.000,00	29/09/2026	1/10/2026	15/12/2026

Año	Número Contrato	Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2026	5365	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	WILMER YOEL	MEJIAS CAMACHO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRCUTURA DEL MUNNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 10.000.000,00	29/09/2026	1/10/2026	15/12/2026
2026	5366	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FABIO ANDRES	VERGEL PEREZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRCUTURA DEL MUNNICIPIO DE BUCARAMANGA	$ 10.000.000,00	29/09/2026	1/10/2026	15/12/2026
2026	5367	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE LUIS	SUAREZ ANGULO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRCUTURA DEL MUNNICIPIO DE BUCARAMANGA.	$ 10.000.000,00	29/09/2026	1/10/2026	15/12/2026
2026	5368	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN BAUTISTA	VEGA ESPINDOLA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PUBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA	$ 12.500.000,00	29/09/2026	1/10/2026	15/12/2026
2026	5398	CONTRATACIÓN DIRECTA	EN EJECUCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JESUS	SERRANO CORDERO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA	$ 12.500.000,00	30/09/2026	1/10/2026	15/12/2026
